SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$16.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.846.223.529,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 13.560.954.333,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 4.008.328.800,0	$ 8.350.635.192 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 14.561.873.446	$ 13.114.420.113
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 91.259.643.269	$ 21.465.055.305

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 39 (AGO-24)	$ 1.899.304.694,00	$ 13.879.534,00	$ 123.420.766,00	$ 1.789.763.462,00
ACTA DE AJUSTE 39 (AGO-24)	$ 375.588.533,00	$ 2.744.685,00	-	$ 378.333.218,00
ACTA DE OBRA 40 (SEP-24)	$ 1.491.495.138,00	$ 39.539.096,00	$ 86.898.375,00	$ 1.444.135.859,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 40 de fecha 30/09/2024, para el periodo de septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 75.772.464.598,00	31,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 75.104.796.932,00	31,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 16.154.846.337,00	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 91.259.643.269,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 16.407.177.862,00
Amortizado	$ 3.056.542.670,00
Saldo	$ 13.350.635.192,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 31,50%
Meta física ejecutada %: 31,23%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento** **NOMBRE: Nacional de seguros** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 14.084.969.857,00	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 28.169.939.714,00	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2028
Calidad	$ 1.619.280.000	400033673 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de la Obra	$ 42.254.909.572,20	400033673 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$7.042.484.929,00	400033672 ANEXO No. 5	19/12/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024			
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-298	3/9/2024	Respuesta a comunicado 251-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 24 Anticipo/Materiales"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-299	3/9/2024	Respuesta a comunicado 252-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 25 Anticipo/Mano de obra"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-302	3/9/2024	Respuesta a comunicado 253-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 26 Anticipo/Materiales"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-303	3/9/2024	Respuesta a comunicado 279-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 27 Anticipo/Materiales"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-304	4/9/2024	Respuesta a comunicado 280-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 28 Anticipo/Materiales"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-305	4/9/2024	Reiteración de comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-181_Programa de mantenimiento	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
		y registros de Vehículos Trasporte personal	
CREACT2021-OC-1002-2024-306	4/9/2024	Informe de visita de Interventoría a obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-307	4/9/2024	Reiteración de atención de observaciones comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-270 Solicitud envío formato inclusión social.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-308	4/9/2024	Traslado de Oficio INVIAS 2024S-VBOG-061714 observaciones informes de sostenibilidad.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-294	4/9/2024	Respuesta comunicación 298-24-CLI-CVC066-DIR	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-309	4/9/2024	Paro Nacional de transportadores	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-311	5/9/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 39 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 39 - AGOSTO DE 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-312	6/9/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No 37 DE JUNIO 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-313	6/9/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No 38 DE JULIO 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-310	9/9/2024	REITERACIÓN DE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2024-143, ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y FORMATOS MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-314	9/9/2024	Memorando HACE01-013-024_Respuesta Comunicación 015-24-CLI-CVC066-DIR. Remisión de CC-INVCVC066-004-23; Diseño de Mezcla asfáltica MDC-19	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-315	9/9/2024	Respuesta a comunicado 263-24-CLI-CVC066-DIR. Revisión y concepto del informe mensual de gestión ambiental del mes de junio 2024 versión 2.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-316	9/9/2024	Respuesta a comunicado 259-24-CLI-CVC066-DIR. Revisión y concepto del informe mensual de gestión ambiental del mes de mayo 2024, versión 3.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-317	9/9/2024	Respuesta Memorando GT-PT-0101-2022 v3 - Propuesta técnica y económica para la elaboración de los diagnósticos de detalle a nivel de Geología, Hidráulica y Geotecnia para el sector comprendido entre el Pr107 y Pr108	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-318	9/9/2024	Observaciones al Informe Trimestral No. 9 en cumplimiento de la resolución No. 0268 de 2022. EXP 210.10.00016.2022 radicados con los comunicados 271-24-CLI-CVC066 y 305-24-CLI-CVC066-DIR	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-319	9/9/2024	Revisión de documentos: Comunicación 186-24-CLI-CVC066-DIR y MT-1385-C180A-2024. Obras Definitivas Protección La Judía (NAC	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-320	9/9/2024	Respuesta comunicado 256-24-CLI-CVC066-DIR Solicitud de liberación de alcantarillas tramo de Guaca.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-321	9/9/2024	Solicitud autorización ingreso Profesional Valuatorio de Interventoría.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-323	10/9/2024	Respuesta comunicado 308-24-CLI-CVC066-DI, Observaciones formatos de inclusión social.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-324	10/9/2024	Respuesta a comunicado 307-24-CLI-CVC066-DIR Informe de Sostenibilidad Julio de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-328	12/9/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-330	12/9/2024	Respuesta a comunicado 313-24-CLI-CVC066-DIR con asunto “Orden de desembolso No 29 Anticipo/Mano de obra”	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-331	12/9/2024	Respuesta a comunicado 319-24-CLI-CVC066-DIR con asunto “Orden dedesembolso No 30 Anticipo/Materiales”	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-329	13/9/2024	Respuesta comunicado 238-24-CLI-CVC066-DIR, Hoja de vida Ingeniero Residente Auxiliar	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-326	13/9/2024	Respuesta comunicado 233-24-CLI-CVC066-DIR Hoja de vida Inspector SST	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-327	13/9/2024	Respuesta comunicado 234-24-CLI-CVC066-DIR Hoja de vida Inspector SST	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-325	13/9/2024	Respuesta comunicado 228-24-CLI-CVC066-DIR Hoja de vida Auditor Interno de Calidad	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-333	13/9/2024	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-334	13/9/2024	Solicitud autorización ingreso Ingeniero Auxiliar.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-335	13/9/2024	Respuesta comunicación 273-24-CLI-CVC066-DIR – Apremio por incumplimiento programa de obra e inversiones	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-336	17/9/2024	Respuesta comunicación 301-24-CLI-CVC066-DIR Canales de Interconexión obras de alivio, Pr 63 – Pr 73.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-337	17/9/2024	Solicitud soporte de cumplimiento al Parágrafo del artículo Decimo Primero de la resolución DGL No. 000594 del 26 de agosto de 2022.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-332	17/9/2024	REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN. ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY 1755 DE 2015 - SOLICITUD PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO Y LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL TIEMPO LABORADO - SERGIO RODRÍGUEZ PABÓN.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-340	18/9/2024	PROBACIÓN PRESUPUESTO DONACIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y DIDÁCTICOS - DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DEL DR. DANIL ROMAN, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-338	18/9/2024	Reiteración de comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-296, Suministro y reposición de EPPs	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-341	18/9/2024	Respuesta comunicado 290-24-CLI-CVC066-DIR. Solicitud de reconocimiento económico profesionales del área ambiental.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-342	20/9/2024	Reiteración mantenimiento de maquinaria y equipo	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-344	20/9/2024	Respuesta comunicado 288-24-CLI-CVC066-DIR con Asunto: Notificación Especialista Ambiental	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-345	20/9/2024	Respuesta comunicado 299-24-CLI-CVC066-DIR _ Aval Empresa Consultora INTEGRAL S.A.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-346	20/9/2024	Aval empresa consultora para estudios y diseños.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-347	23/9/2024	INGRESO – TOPÓGRAFO INSPECTOR JHON DEYBERTH CASTELLANOS MONSALVE por remplazo de incapacidad	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-348	23/9/2024	Respuesta a comunicado 325-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Repuesta a comunicado CREACT2021-0C-1002-2023-331 "Cancelación Orden de desembolso No 30,Anticipo/Materiales"	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-349	24/9/2024	Respuesta a comunicado 327-24-CLI-CVC066-DIR con asunto "Orden de desembolso No 31 Anticipo/Materiales"	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-350	24/9/2024	Entrega de la Pre-acta Predial Nº40 de septiembre de 2024, aprobada por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-351	25/9/2024	Comunicación 2024S-VBOG-068571 - Programa de obra y cronograma de estudios y diseños	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-352	26/9/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y DIDÁCTICOS - DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DEL DR. DANIL ROMAN, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-353	26/9/2024	INFORME TRIMESTRAL No. 11 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PERIODO ENERO-MARZO DE 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-354	26/9/2024	RESPUESTA OFICIO 241-24-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – JULIO 2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-355	26/9/2024	RESPUESTA OFICIO 283-24-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – AGOSTO 2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-357	27/9/2024	Asunto: Inconformidades Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-359	30/9/2024	Respuesta a los comunicados INVIAS con radicado 2024S-VBOG-057382 del 20 de agosto de 2024 y 2024S-VBOG-051898 del 31 de julio de 2024. Entrega del oficio 318-24-CLI-CVC066-DIR del Contratista como respuesta a la comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-282 del 23 de agosto de 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-360	30/9/2024	Respuesta a comunicado 240-24-CLI-CVC066-DIR. con asunto: Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-161 del 20 de junio de 2024 - Observaciones a informe mensual ambiental de abril de 2024”	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-361	30/9/2024	Respuesta a comunicado 335-24-CLI-CVC066-DIR. Aprobación del informe semestral No. 4 Resolución No. 406 del 30/06/2022. Concesión de agua superficial.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-362	30/9/2024	Respuesta a comunicado 294-24-CLI-CVC066-DIR. Entrega informe Gestión Ambiental mensual Agosto de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	CORREO ENVIO
CREACT2021-OC-1002-2024-363	30/9/2024	Respuesta al oficio 334-24-CLI-CVC066-DIR Aprobación del informe semestral No. 1 Rescate, Traslado y Reubicación de Epífitas Vasculares en cumplimiento al artículo décimo de la Resolución DGL 268 de 2022 – CAS	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-364	30/9/2024	Respuesta a comunicado 247-24-CLI-CVC066-DIR. Entrega informe Gestión Ambiental mensual Julio de 2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-365	30/9/2024	Respuesta a comunicado 339-24-CLI-CVC066-DIR Aprobación de Informe Trimestral No. 9 en cumplimiento de la Resolución No. 0268 de 2022. EXP 210.10.00016.2022.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-366	30/9/2024	Notificación de ingreso del director de Interventoría, ingeniero Wilson René Corredor Parra.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-343	30/9/2024	SOLICITUD DE TRÁMITE DE TRASLADO Y/O REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS 2024 Y 2028 CONTRATO 1002 DE 2021	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co
CREACT2021-OC-1002-2024-367	30/9/2024	Respuesta a comunicado 342-24-CLI-CVC066-DIR con asunto “Orden de desembolso No 32 Anticipo/Materiales”	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>, Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-368	30/9/2024	Respuesta a comunicado 343-24-CLI-CVC066-DIR con asunto “Orden de desembolso No 33 Anticipo/Materiales”	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>, Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DEL 2024			
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-358	30/9/2024	Respuesta comunicado 299-24-CLI-CVC066-DIR, Hoja de vida de profesionales y empresa consultora	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.441.668.372	$ 403.417.865
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 9.176.522.635**	**$ 403.417.865**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 39 (agosto)	$ 152.793.326	$ 29.030.732	$ 0,00	$ 181.824.058
Acta de costos No. 40 (septiembre)	$ 163.708.680	$ 31.104.649	$ 0,00	$ 194.813.329

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 40 de fecha 30/09/2024 para el período de septiembre 2024 el contrato reporta un avance de 44,68%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 9.104.808.350,00 44,33%
Total, inversión ejecutada: $ 9.176.522.635,00 44,68%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.145.494.050	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.290.988.100	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6.161.982.150	400033485 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro del alcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:


METAS FÍSICAS	AVANCE ACUMULADO
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	3,97 Km
Mantenimiento de la vía en afirmado	56 Km
Mantenimiento a la señalización del corredor	60 Km
Sitio crítico La Judía	88,5%
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7%
Atención a emergencias	(PR111, El Canelo - PR88, Puente Chimpatá-PR94, El Tope-PR95, Puente Salaboga, PR32)
Remoción de derrumbe	48.391 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga – Curos

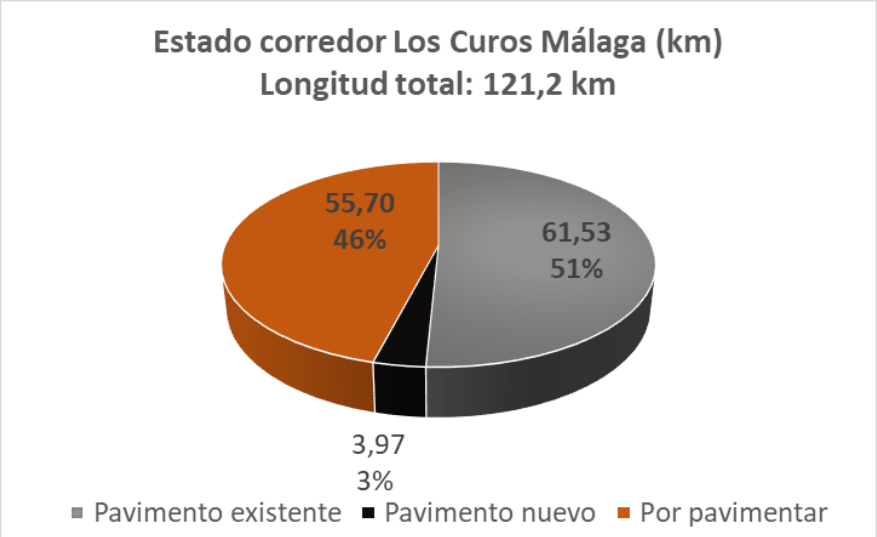

Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

A continuación, se representa gráficamente el avance de la ejecución del sitio crítico La Judía.

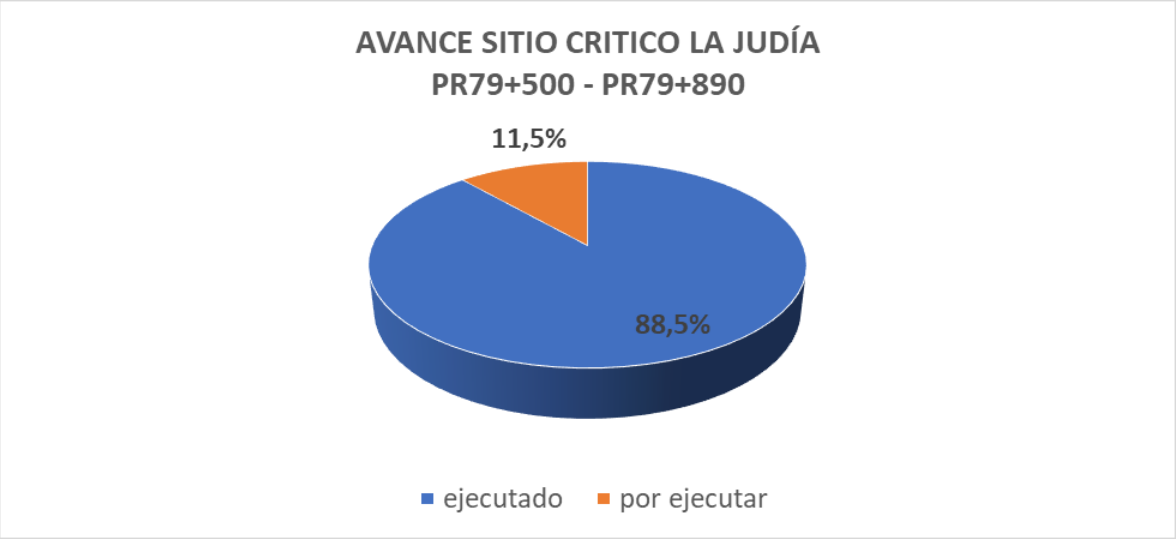

AVANCE SITIO CRÍTICO LA JUDÍA

- Adjunto al presente informe se anexa el seguimiento al cronograma presentado para el cumplimiento del fallo de la acción popular, en el que se evidencia que a la fecha se realiza la ejecución del proyecto, tal y como se describió a lo largo del presente documento.
- La reprogramación del programa de Inversiones No. 9 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 10-04-2024, muestra a corte de septiembre de 2024 un avance de obra programado acumulado de 32,32% y avance ejecutado acumulado de 31,59%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,73%.
- La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000.
- La incidencia de accidentes en las operaciones del corredor Málaga-Los Curos aumentó en septiembre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, registrando 4 accidentes laborales en 2024 frente a 2 en 2023. A continuación, se presenta un resumen detallado que ofrece una visión más completa de la accidentalidad durante todo el año 2023 y hasta la fecha en 2024:

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN			
SECTORES		LONGITUD km	AVANCE %
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	19,18 km	

SITIOS CRÍTICOS (Acción popular No. 68001-23-33-000-2015-00847)		
1	PR 29+720 al PR 30+090(SC43)	100%
2	PR30+492 al PR 30+960	85%
3	PR32+758 al PR 33+098	80%
4	PR 71+688 al PR 71+740	100%
5	PR 79+600 al PR 79+800 la Judía	100%
6	PR88+521 al PR88+531	0%
7*	PR93+510 al PR93+520	-
8	PR106+950 al PR 107+740	0%

SITIOS INESTABLES ATÍPICOS		
1	PR14+220 al PR 14+500	80%
2	PR46+580 al PR 47+107	60%
3	PR 53+690 al PR53+743	80%
4*	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
5*	PR111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
6*	PR111+230 al PR111+350	5%

*Tramo pavimentado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El estado de avance de los Permisos de Intervención Voluntarios es superior al 92%, de la totalidad de los predios requeridos para los tramos y los Sitios Críticos. El Avance general de la Gestión y Adquisición Predial se encuentra en un 27%, loque evidencia, la positiva Gestión que se ha realizado durante este periodo y en lo transcurrido del Contrato.

Nuevamente, se informa que el pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023. El día 2 de octubre 2023, esta interventoría recibió de parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el comunicado 2023S-VBOG-008743, con asunto: Solicitud ejecución pasivo predial de Laura Marcela Delgado, con el cual, sé autorizó la ejecución del mismo por parte del Contratista. A la fecha de corte del presente informe, no se ha ejecutado ninguna actividad correspondiente al presente Pasivo Predial, debido al déficit presupuestal que este proyecto viene presentando desde el mes de agosto de 2023, novedad que fue remitida por esta Interventoría a los Gestores Prediales de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, vía correo electrónico, según su propia solicitud, el pasado 5 de octubre de 2023, por medio del comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-527, con asunto: Respuesta comunicación 016-22-CLI-CVC066-RLG Solicitud de Suspensión del Contrato No. 1042 del 2021 del 26 de septiembre de 2023.

➢El Contratista manifiesta que, en la información remitida por el área técnica, se informa la inclusión de zonas requeridas por la instalación de disipadores en el tramo de Guaca, zonas totales que se resumen de la siguiente forma: Total de disipadores 9, distancia lineal de los mismos 326 metros lineales, y área total a adquirir 626.73 m2. Por lo cual, en la Tira Topográfica y Sábana

Predial correspondiente a este informe, son incluidas estas áreas. Las cuales se deben realizar el trámite de las servidumbres en dichos predios.

Por lo relevante del documento, este mes, se continúa destacando el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-469 del 10/08/2023, mediante el cual, esta Interventoría emitió respuesta al comunicado 284-23-CLI-CVC066-DIR del 6 de julio de 2023 elaborado por el Contratista; relacionado con la Aprobación del Informe de Diagnóstico Predial del Municipio de Santa Bárbara. Contando así, a la fecha de cierre del presente Informe, con dos (2) Diagnósticos Prediales aprobados por esta Interventoría, el Diagnóstico Predial del sector de Los Curos y el del sector del Municipio de Santa Bárbara.

➢Se sigue destacando el Visto Bueno de No Objeción emitido por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado SS 42281 de fecha 24 de julio del presente año referente a los siguientes documentos: Diagnostico Predial para las obras requeridas entre el PR 122 al PR 124 e Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga.

Se sigue destacando la aprobación del Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga, por parte de la Interventoría mediante el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-438 del 21/07/2023, luego de un largo proceso de atención y subsanación por parte del Contratista, de las observaciones efectuadas por el Profesional Valuatorio de esta Interventoría. **Estado de las manifestaciones PQRS:** A la fecha, se cuenta con un acumulado de 305 manifestaciones PQRSD, 98% cerradas. en el periodo reportado se recibieron cinco (5) manifestaciones y se cerraron tres (3).

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de bra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de septiembre se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el 42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde al 58%;de los cuales el 54% pertenecen al área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de septiembre del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 4 # 4-32 Centro.

Divulgación de Información: Se viene cumpliendo con el objetivo de mantener informada a la comunidad de cierres y emergencias en el corredor vial, en el periodo reportado se divulgó de manera oportuna mediante cuñas radiales la emergencia que se presentó de perdida parcial de banca sobre el PR 79+490 se emitió cuña radial sugiriendo el cambio de ruta para los vehículos de categoría C2 y superiores. El 20 de julio se actualizó la cuña radial la resolución INVIAS 03068 del 19 de julio del 2024.

***Contratación de Mano de obra de AIP*:** El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de obra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de septiembre se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el **42%** son de **MONC** de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de **MOC** que corresponde.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN No. 4327 de 18 de septiembre de 2024 – Visita del Director General al proyecto en cumplimiento de las mesas de seguimiento convocadas por la Defensoría del Pueblo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)
