
INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 016 DE 2024,

"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"

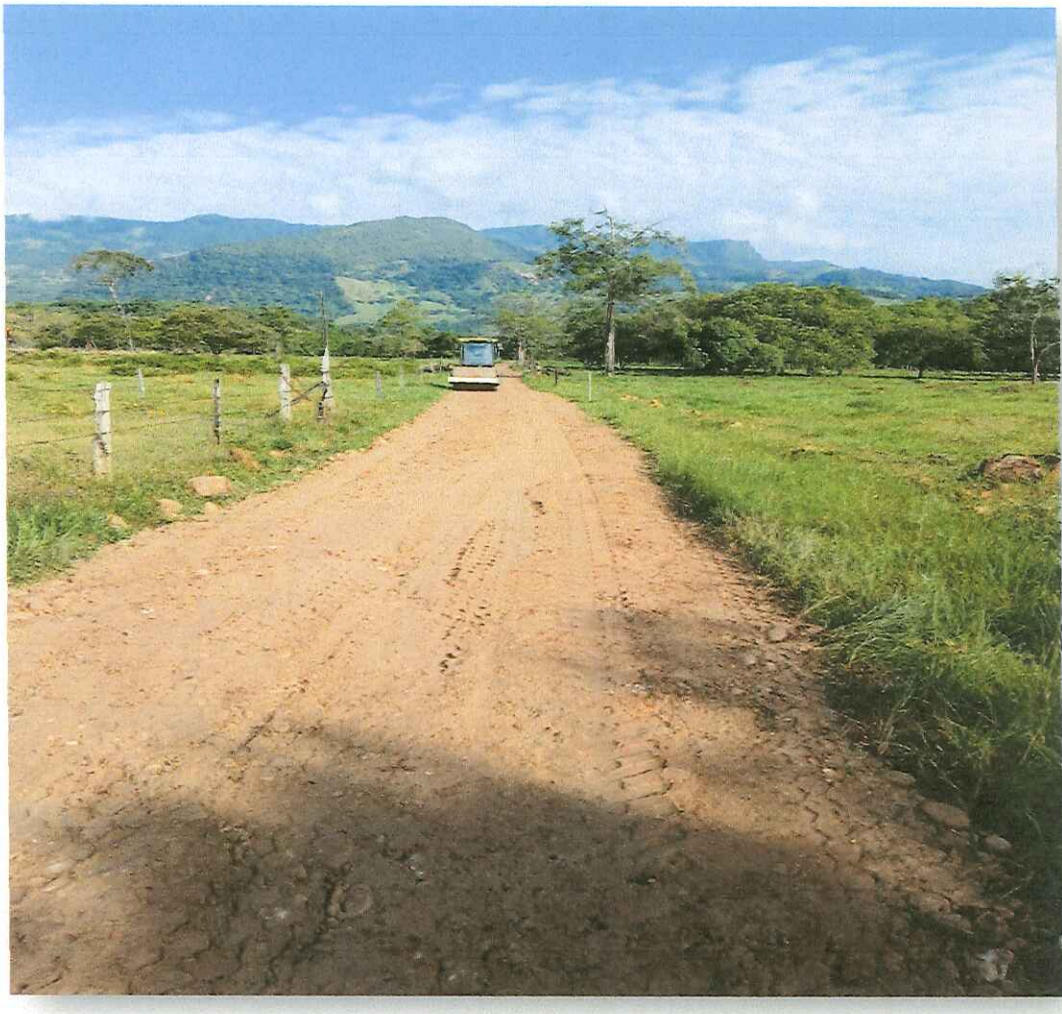

Juridica

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE

07 DE NOVIEMBRE A 06 DE DICIEMBRE 2024

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-056-2024 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", durante el período de ejecución del contrato y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó de acuerdo al cumplimiento de los estatutos de "la ASOJUNTAS" *en el capítulo cuarto numeral 18, según naturaleza de los convenios, ítem 3, "Asamblea General: desde (60) salarios mínimo legales mensuales vigentes, más de un peso ($1,00)..."* se le solicita autorización a la asamblea, para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($295.272.810) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, , elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vías terciarias tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales, para el presente convenio y empleando la maquinaria amarilla de propiedad del Municipio, Asojuntas deberá adelantar los trabajos de mantenimiento en cada uno de los sitios y vías que estén definidos previamente, a través de la secretaria de Infraestructura, para lo cual se realizara el traslado de la maquinaria, de los operadores y del personal profesional vinculados al convenio y se adelantarán las labores principales que son: reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores e afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar, a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, entre otras, así mismo ASOJUNTAS les realiza el mantenimiento de la maquinaria de acuerdo con la programación que ya cuentan cada uno de los equipos. El mejoramiento de las vías se realiza con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte (Ley 1682. Ley de infraestructura)

El Municipio de Tauramena cuenta con diferentes vías de acceso que comunican la zona urbana y la zona rural entre sí. dichas vías de acceso conducen a varios sectores de gran importancia y son la garantía de movilidad para la comunidad de las veredas cuya actividad económica principal es la ganadería y la agricultura, hoy se encuentran en mal estado, dificultando el paso normal de los usuarios lo que conlleva a que el uso de la vía pueda comprometer la seguridad y el bienestar de estos generando la ocurrencia de accidentes el desgaste excesivo de los vehículos de transporte y el aumento del costo de los fletes dadas las deplorables condiciones del carreteable.

Finalmente, este proyecto es necesario para mejoras las condiciones de accesibilidad hacia y desde el área rural del Municipio de Tauramena por medio del mejoramiento de la franja vial de las vías terciarias, recuperando la calzada vial y sus drenajes. Estas vías son esenciales para la movilidad de la comunidad de las Veredas, con el fin de garantizar el acceso de la población rural de esta zona al casco urbano del Municipio y hacia los diferentes sectores de las veredas para movilizarse hacia sus trabajos, en busca de servicios de salud principalmente. Es urgente dar solución al problema presentado actualmente, teniendo en cuenta que la urgencia de este mejoramiento mediante inversiones solidarias, se articula al plan de desarrollo Municipal.

La Asociación, deberá ejecutar dentro del proyecto las siguientes actividades:

Mejoramiento vial: Conformación subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación de 84 km de vías terciarias del Municipio de Tauramena), y la limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (4=3m a cada lado) en 63 km.

BENEFICIARIOS. Habitantes de la zona rural de Tauramena.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA: 47,45%

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a $ 295.272.810,00 (Aporte del Municipio: $206.690.400,00 y Aporte de la asociación $ 88.582.410)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	Registro Presupuestal No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2020854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	$121.848.619	872 07/10/2024	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6.
		$84.841.781		1.3.3.11.08.02 R.B. OTRAS TRANSFERENCIASDE CAPITAL-REGALIAS SISTEMA ANTERIOR
VALOR TOTAL		**$206.690.400**		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	016 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÒN	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS
ACTA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($295.272.810,00)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 206.690.400)
VALOR APORTE DE LA ASOCIACIÓN	OCHENTA Y OCHO MILLONES QUIENITNOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 88.582.410,00)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
165093	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	SEGUREXPO DE COLOMBIA	$ 59.054.562,00	16/10/2024	15/07/2025
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUREXPO DE COLOMBIA	$ 29.527.281,00	16/10/2024	15/01/2028
15685	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUREXPO DE COLOMBIA	$ 260.000.000	16/10/2024	15/01/2025

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA ACTA DE INICIO
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$ 206.690.400	21-10-2024
APORTE DE LA ASOCIACIÓN	$ 88.582.410,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$295.272.810,00**	

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias;

APORTE DEL MUNICIPIO:

ITEM 1. Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación), las maquinas son del Municipio de Tauramena, No incluye costo equipo).

Se adelantaron actividades de reconformación y recuperación de la banca, mediante el empleo de la maquinaria amarilla, la motoniveladora inicio su operación de escarificación ubicándose en uno de los extremos del área donde baja los escarificadores hasta ponerlos en contacto con el material. Iniciará su maniobra lentamente hasta lograr penetrarlos a una profundidad adecuada de acuerdo con el tipo

de material en tratamiento hasta llegar al extremo opuesto donde se da la vuelta y se regresa cubriendo la franja continua. Este proceso se repite hasta lograr cubrir toda el área.


Una vez se escarifico, la motoniveladora repitió la operación similar a la del escarificado, pero con la cuchilla ligeramente sesgada con el fin de acordonar el material a lo largo del área en tratamiento.

El Vibrocompactador inicio su maniobra de compactación previa preparación del área con la motoniveladora. Se ubicó en uno de los extremos de la vía hacia el borde y comenzó a desplazarse lentamente hasta llegar al otro extremo en donde se gira y se devuelve, este proceso se repite las veces que sea necesario hasta que se obtiene el grado de compactación adecuado.

APORTE DE ASOCIACIÓN DE ASOJUNTAS DE TAURAMENA "ASOJUNTAS":

ITEM 2. Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m de cada lado).

Se apoyó en la ejecución de la actividad del mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Tauramena con el fin de garantizar la accesibilidad del área rural hacia la urbana y viceversa, haciendo partea las comunidades el proceso de desarrollo local. Son actividades que de acuerdo con sus especificaciones no son complejas, no requieren tecnología avanzadas y se realizan con mano de obra local. Buscan dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo nacional y territorial y propender por mejorar el acceso vehicular y peatonal de la población para el acceso a bienes y servicios en la población del Municipio, de igual modo mejorando la calidad de vida de los usuarios de estas vías, esto como aporte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena "ASOJUNTAS TAURAMENA", se obtuvo un porcentaje de avance del 50,97%;

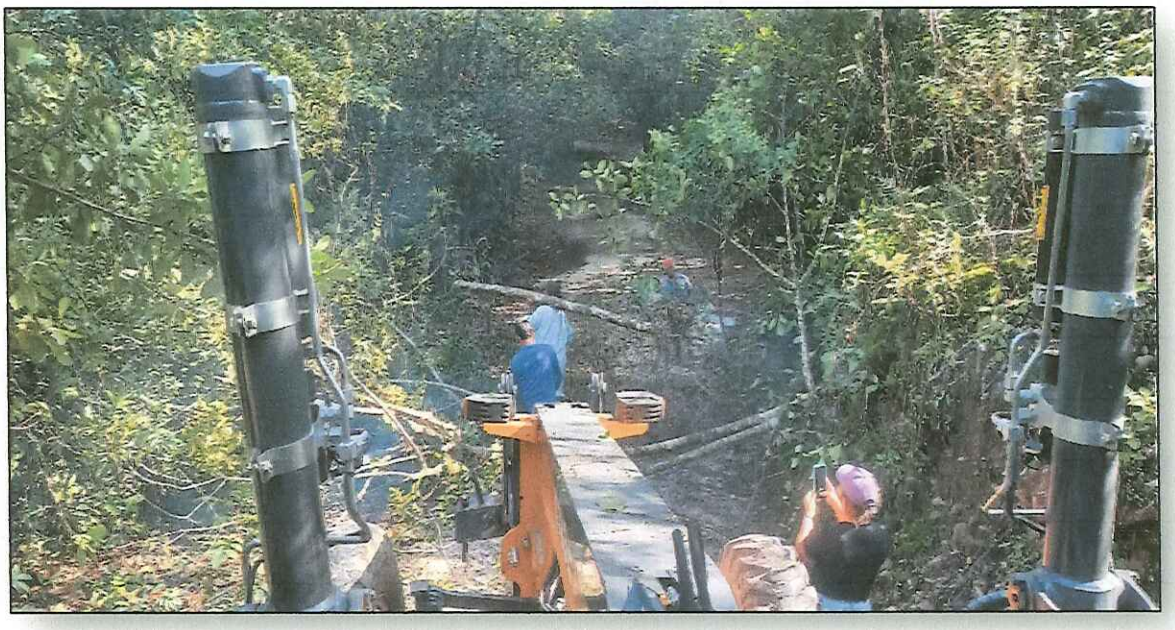






ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO.


- ✓ Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria y el Inspector SST para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir en las Veredas Cabañas, Aguamaco, Jaguito y Aguablanca del Municipio de Tauramena, así mismo se recibió la maquinaria amarilla por parte de la Administración Municipal en la cual se le realizó una inspección de las condiciones de la maquinaria amarilla de acuerdo al formato preoperacional de cada equipo;

- ✓ El inspector SST realizó Control y evaluación al personal de operadores de la maquinaria amarilla en donde se verificaron las afiliaciones al SGSS, Planilla de pagos SGSS, se verifico cumplimiento del cronograma de actividades y charlas al SST, actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, inspección de herramientas manuales, eléctricas y maquinaria, registro de asistencia y estadísticas de accidentalidad. (ver anexos)
- ✓ Se realizó visita técnica de supervisión el día 11 y 18 de Noviembre de 2024 por parte del Ing. Kevin Santiago López Silva, ingeniera Residente de Obra, Coordinador de maquinaria y el Inspector SST para hacer el recorrido de los kilómetros intervenidos y terminados.
- ✓ ASOJUNTAS ha realizado mantenimiento preventivo a la maquinaria amarilla; la Motoniveladora Se realizó el cambio de las cuchillas 13 huecos, 15 huecos, sobre-esquineras derecha e izquierda, filtros de aceite, filtro de combustible, filtro de aire secundario, filtro de aire primario, filtro de aceite hidráulico y filtro de cabina y cuatro llantas 14.00-24 y aceite Diesel 15W40;




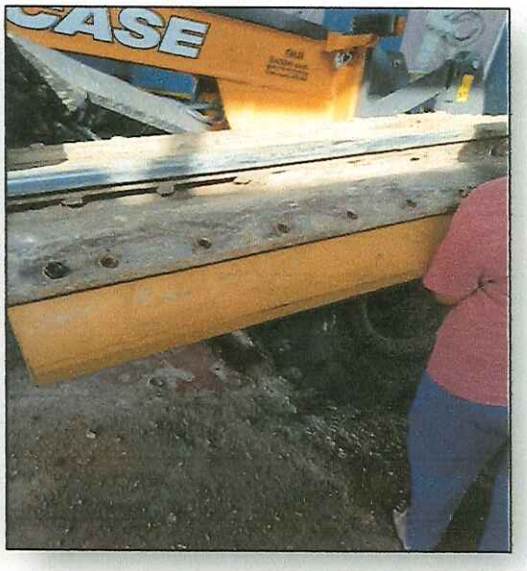




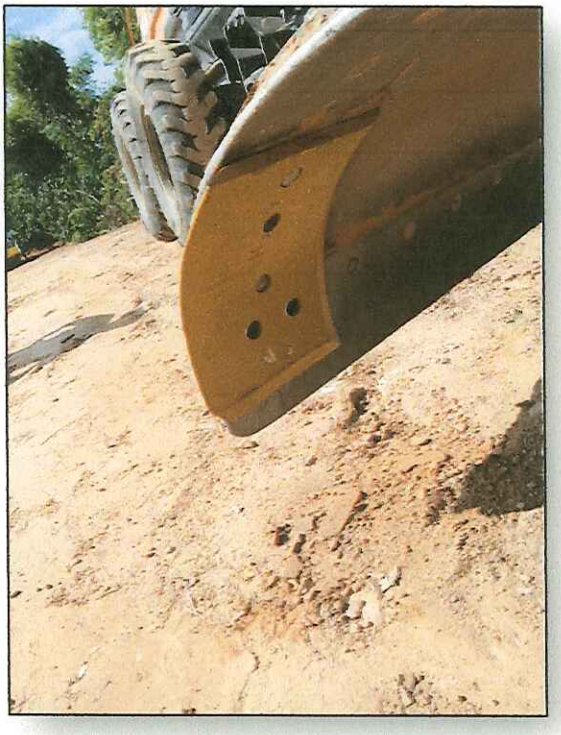



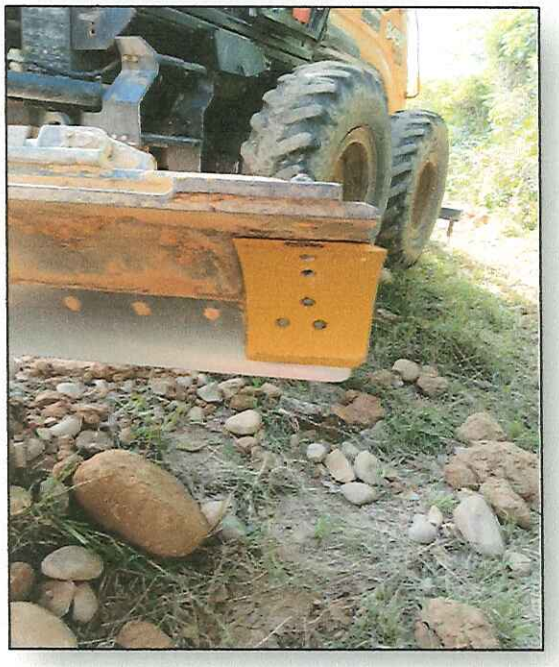

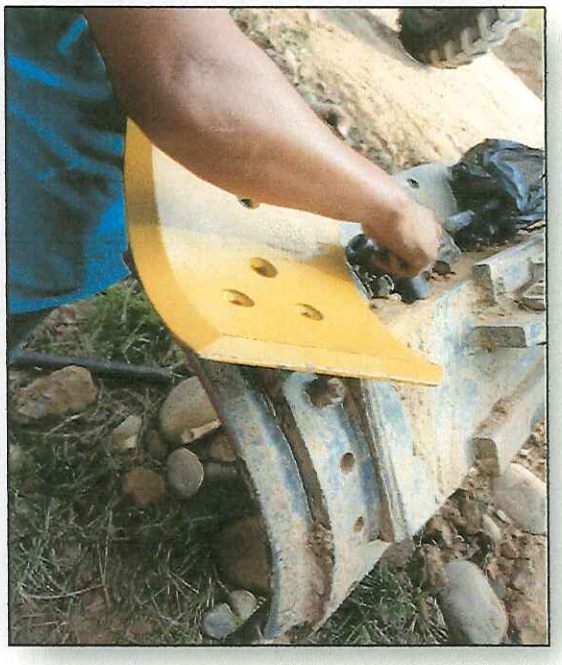





- ✓ Para la Retroexcavadora se realizó la compra de filtro de aire externo, filtro de aire interno, filtro combustible separador de agua, filtro aceite motor y aceite Diesel 15W40;







ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8


DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍAS	KM INTERVENIDO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms		VEREDAS
1	0,45	km	7/11/2024	TRAMO 1	1,04	CABAÑAS
2	0,6	km	8/11/2024			
3	1	km	9/11/2024	TRAMO 2	0,85	
DESCANSO			10/11/2024	DESCANSO		
4	0,45	km	11/11/2024	TRAMO 3	0,9	
5	0,45	km	12/11/2024			
6	2,3	km	13/11/2024	TRAMO 4	4,6	
7	2,3	km	14/11/2024			
8	1,6	km	15/11/2024	TRAMO 5	1,6	
9	1	km	16/11/2024	TRAMO 6	1,0	
DESCANSO			17/11/2024	DESCANSO		
10	1,35	km	18/11/2024	TRAMO 1	3,05	JAGUITO
11	1,70	km	19/11/2024			
12	2,25	km	20/11/2024	TRAMO 2	2,25	
13	2,60	km	21/11/2024	TRAMO 3	2,60	
14	2,30	km	22/11/2024	TRAMO 4	2,30	
15	2,2	km	23/11/2024	TRAMO 5	2,20	
DESCANSO			24/11/2024	DESCANSO		
16	0,92	km	25/11/2024	TRAMO 1	4,20	AGUAMACO
17	0,82	km	26/11/2024			
18	0,6	km	27/11/2024			
19	1,16	km	28/11/2024			
20	0,69	km	29/11/2024			
21	2,93	km	30/11/2024	TRAMO 1	2,93	AGUABLANCA
DESCANSO			1/12/2024	DESCANSO		
22	0,97	km	2/12/2024	TRAMO 2	0,97	
23	1,6	km	3/12/2024	TRAMO 3	1,6	
24	1,65	km	4/12/2024	TRAMO 4	1,65	
25	2,56	km	5/12/2024	TRAMO 5	2,56	
26	3,56	km	6/12/2024	TRAMO 6	3,56	
TOTAL	**39,86**	**km**				

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 016/2024

A continuación, se realiza la localización Geográfica y registros fotográficos de un antes, durante y después de la ejecución de las actividades del Convenio correspondientes en la Vereda Cabañas, Jaguito, Aguamaco y Aguablanca, en donde se obtuvo un total de vía terciaria intervenida de **39,86 kms.**

Fig. 1 Localización Geografica del Tramo 1, de lo cual se intervino 1,04 km, localizado en la Vereda Cabañas.

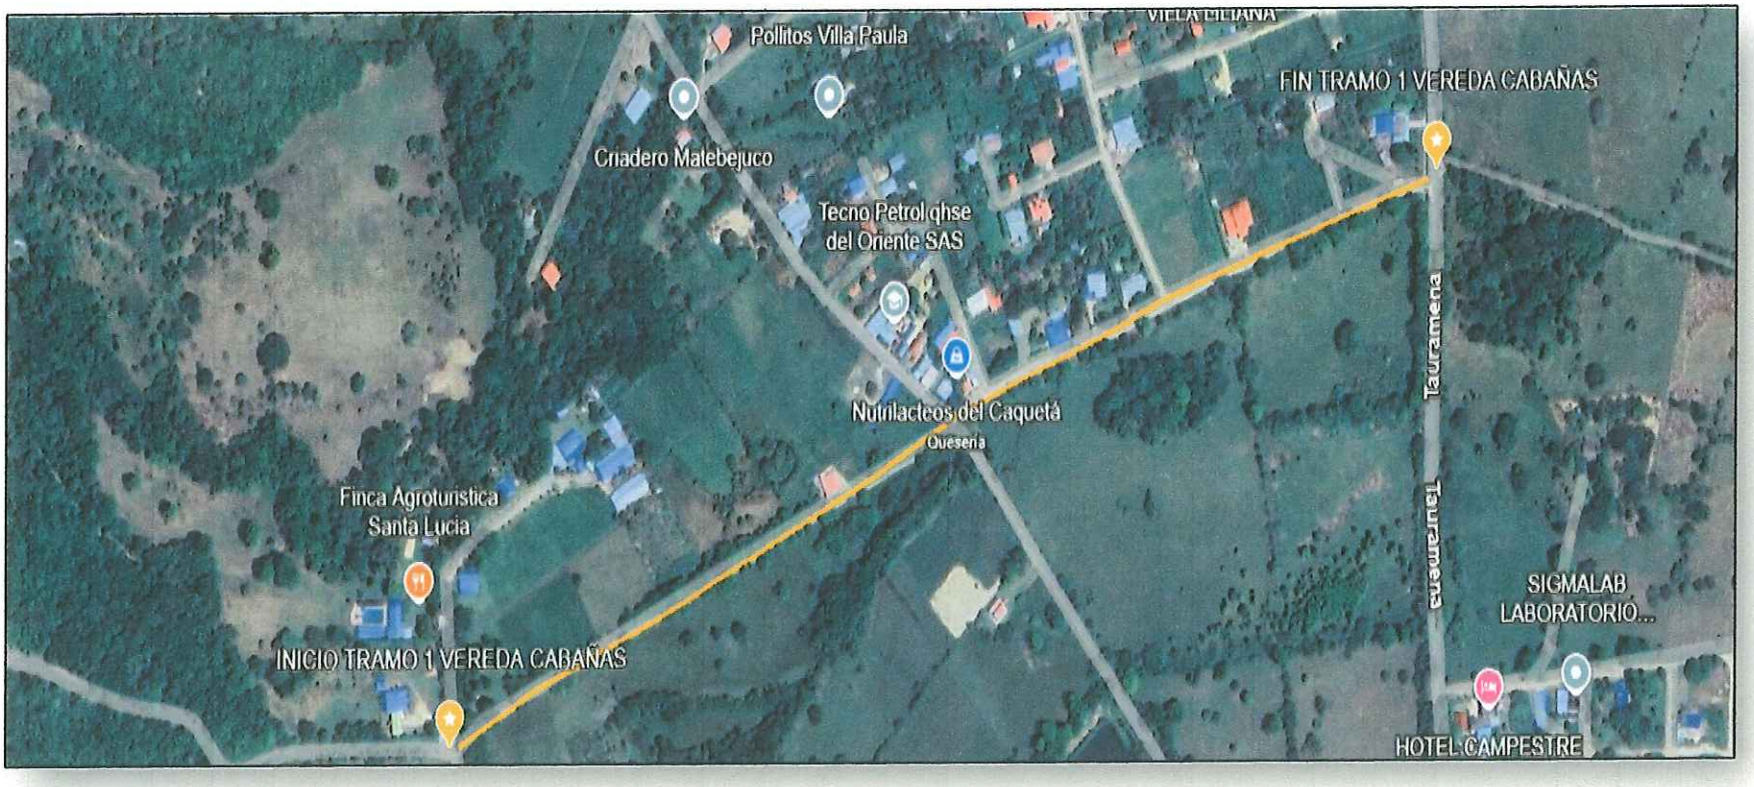

Fuente: Google Earth

Fig. 2 Localización Geografica del Tramo 2, de lo cual se intervino 0,85 km, localizado en la Vereda Cabañas.




Fuente: Google Earth

Fig. 3 Localización Geografica del Tramo 3, de lo cual se intervino 0,9 km, localizado en la Vereda Cabañas.




Fuente: Google Earth

Fig. 4 Localización Geografica del Tramo 4, de lo cual se intervino 4,6 km, localizado en la Vereda Cabañas.

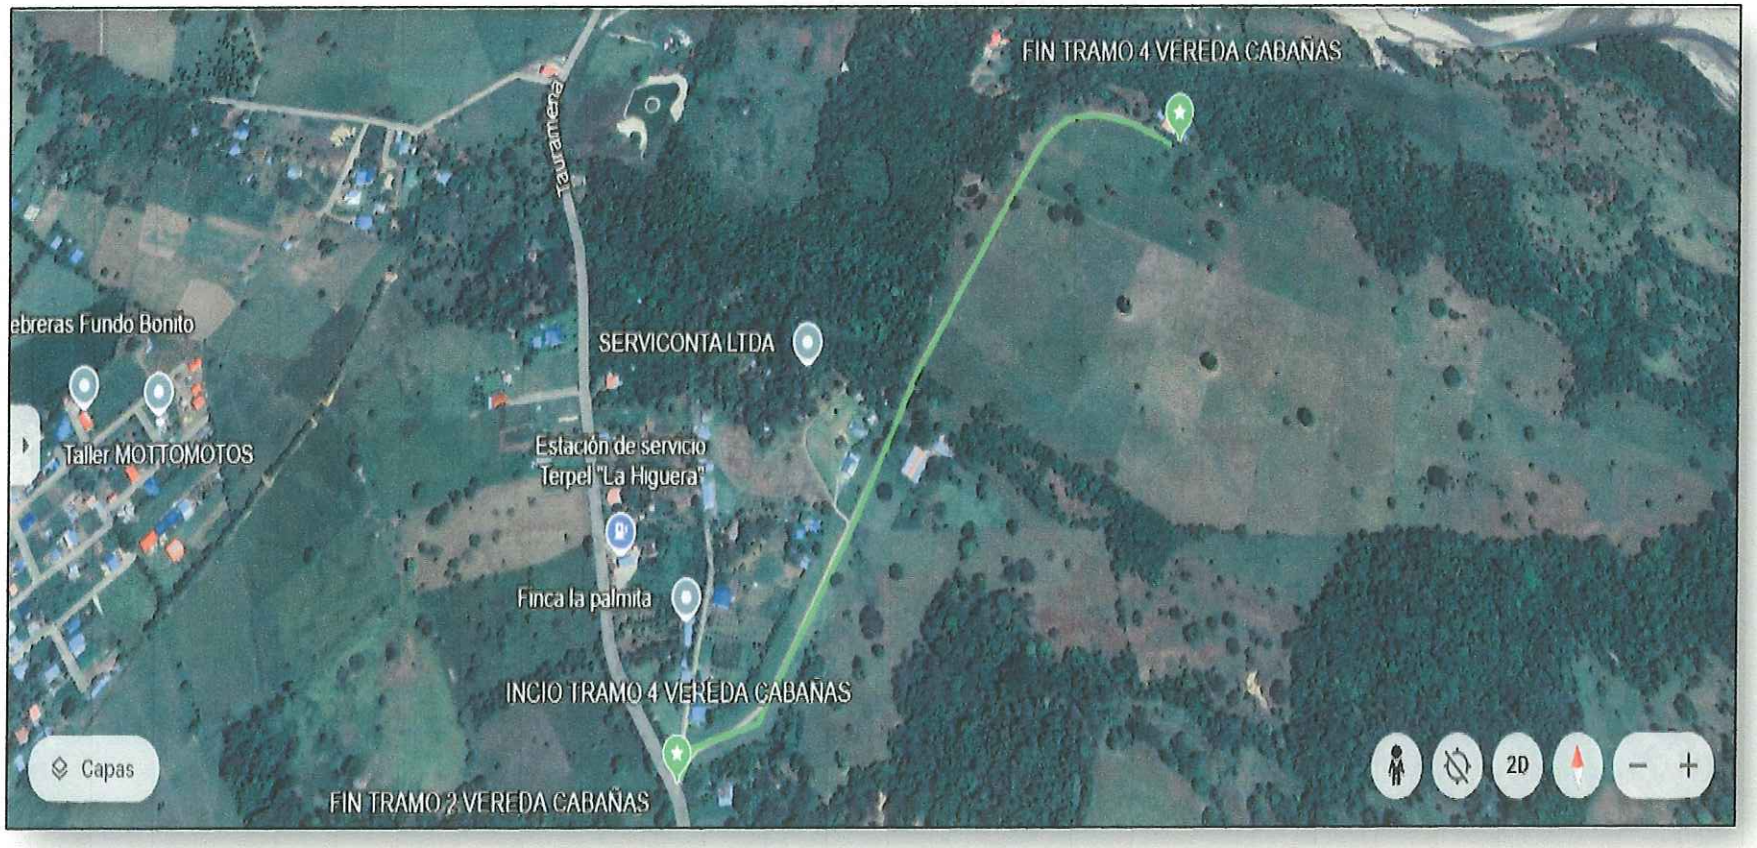


Fuente: Google Earth

Fig. 5 Localización Geográfica del Tramo 5, de lo cual se intervino 1,6 km, localizado en la Vereda Cabañas.

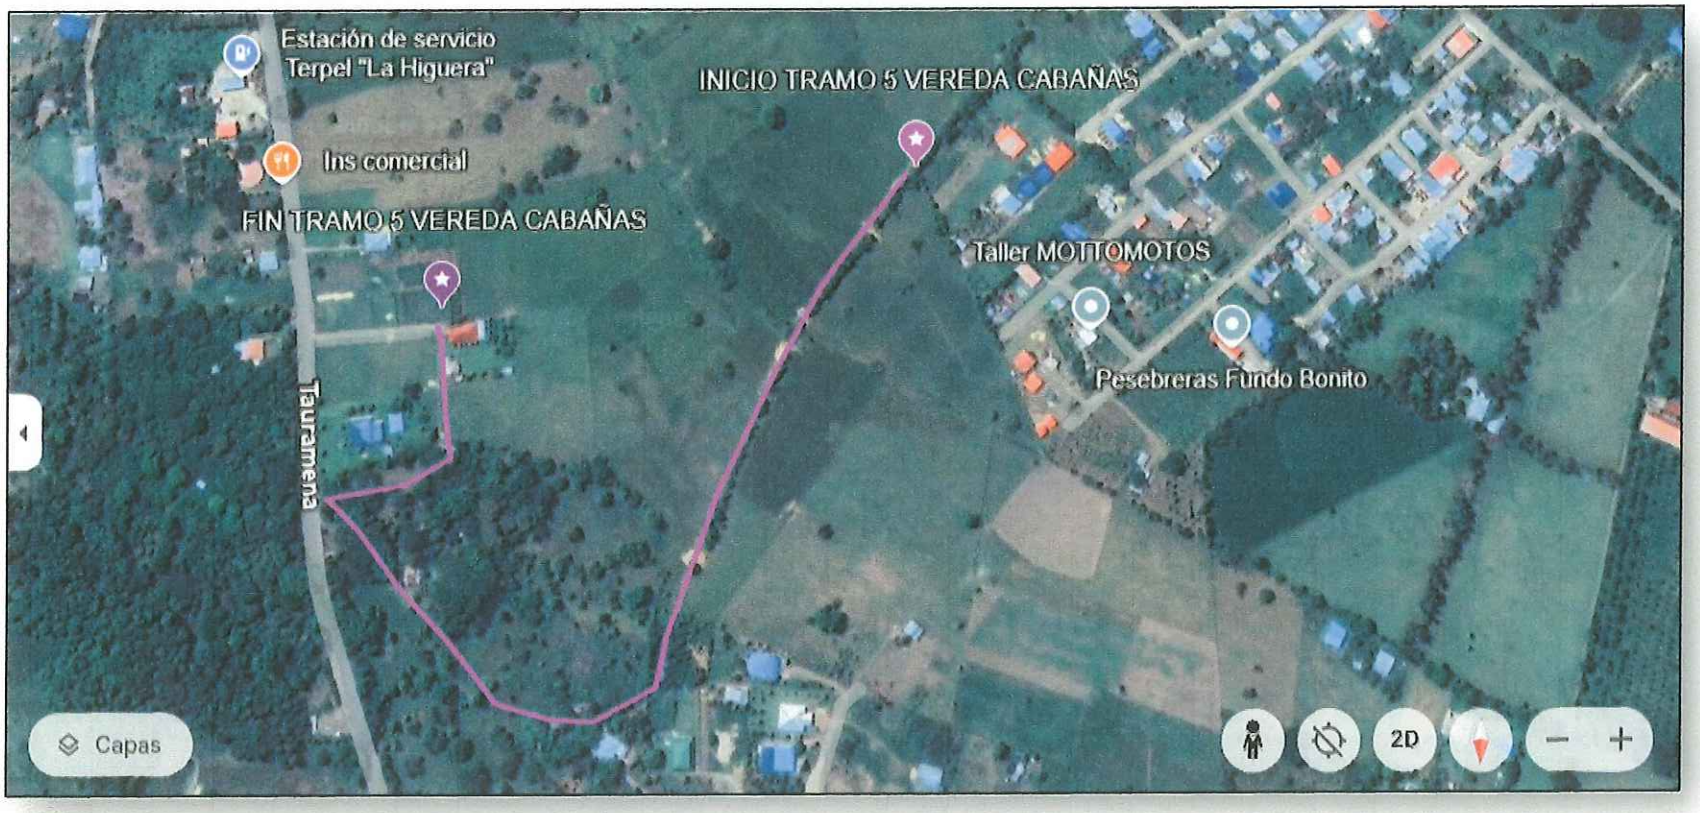


Fuente: Google Earth

Fig. 6 Localización Geografica del tramo 6 de lo cual se intervino 1,0 km, localizado en la Vereda Cabañas.

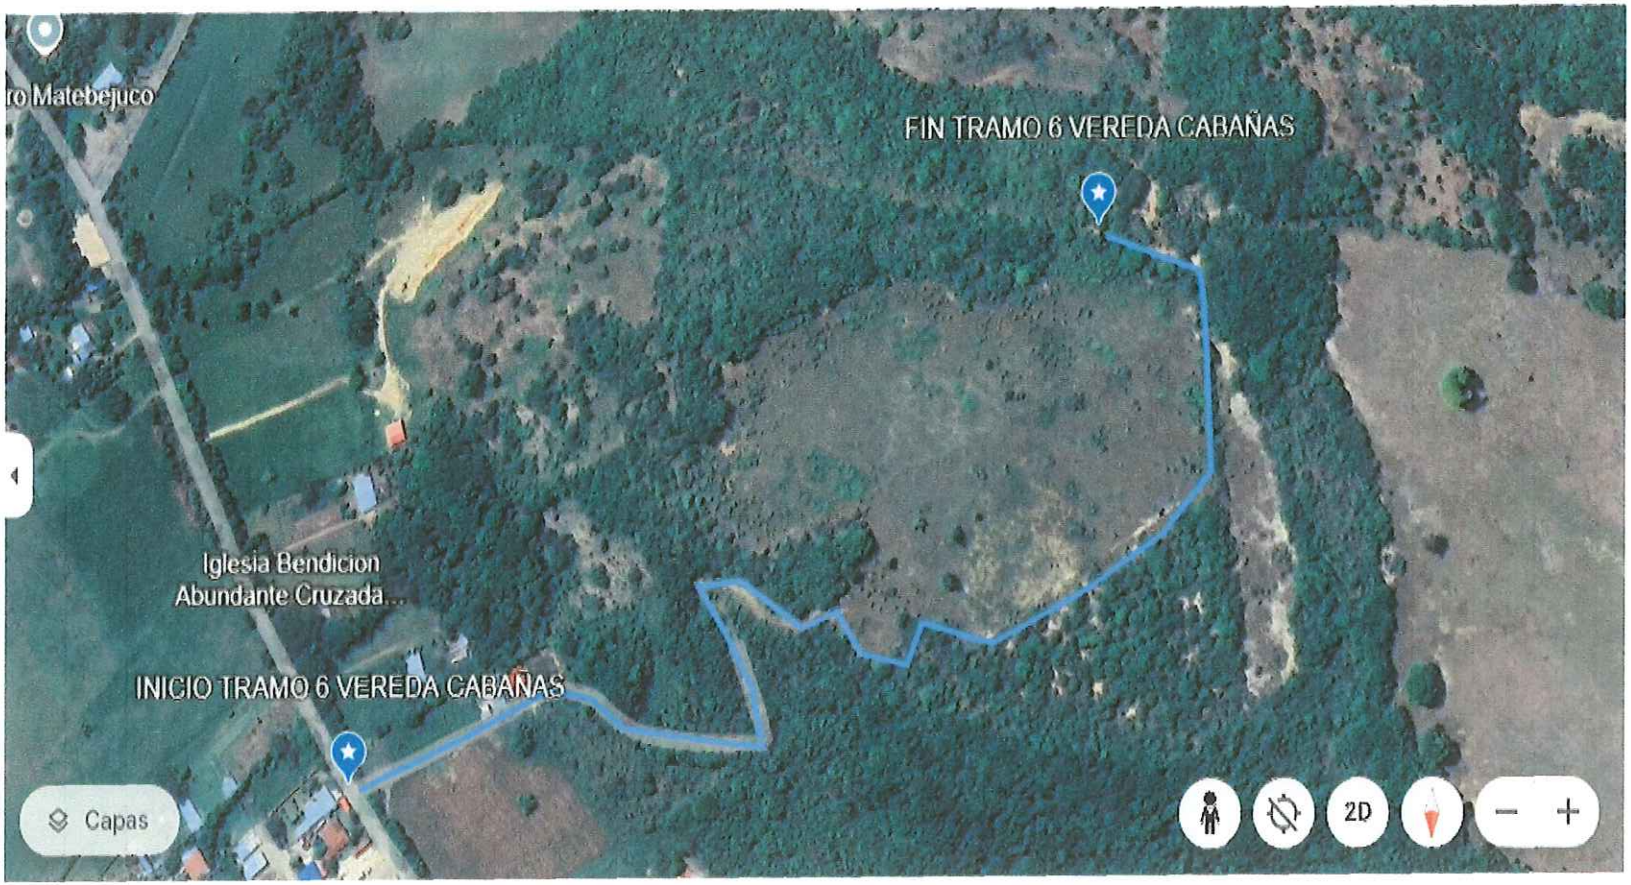

Fuente: Google earth.

Fig. 7 Localización Geografica del tramo 1 de lo cual se intervino 3,05 km, localizado en la Vereda El Jaguito.

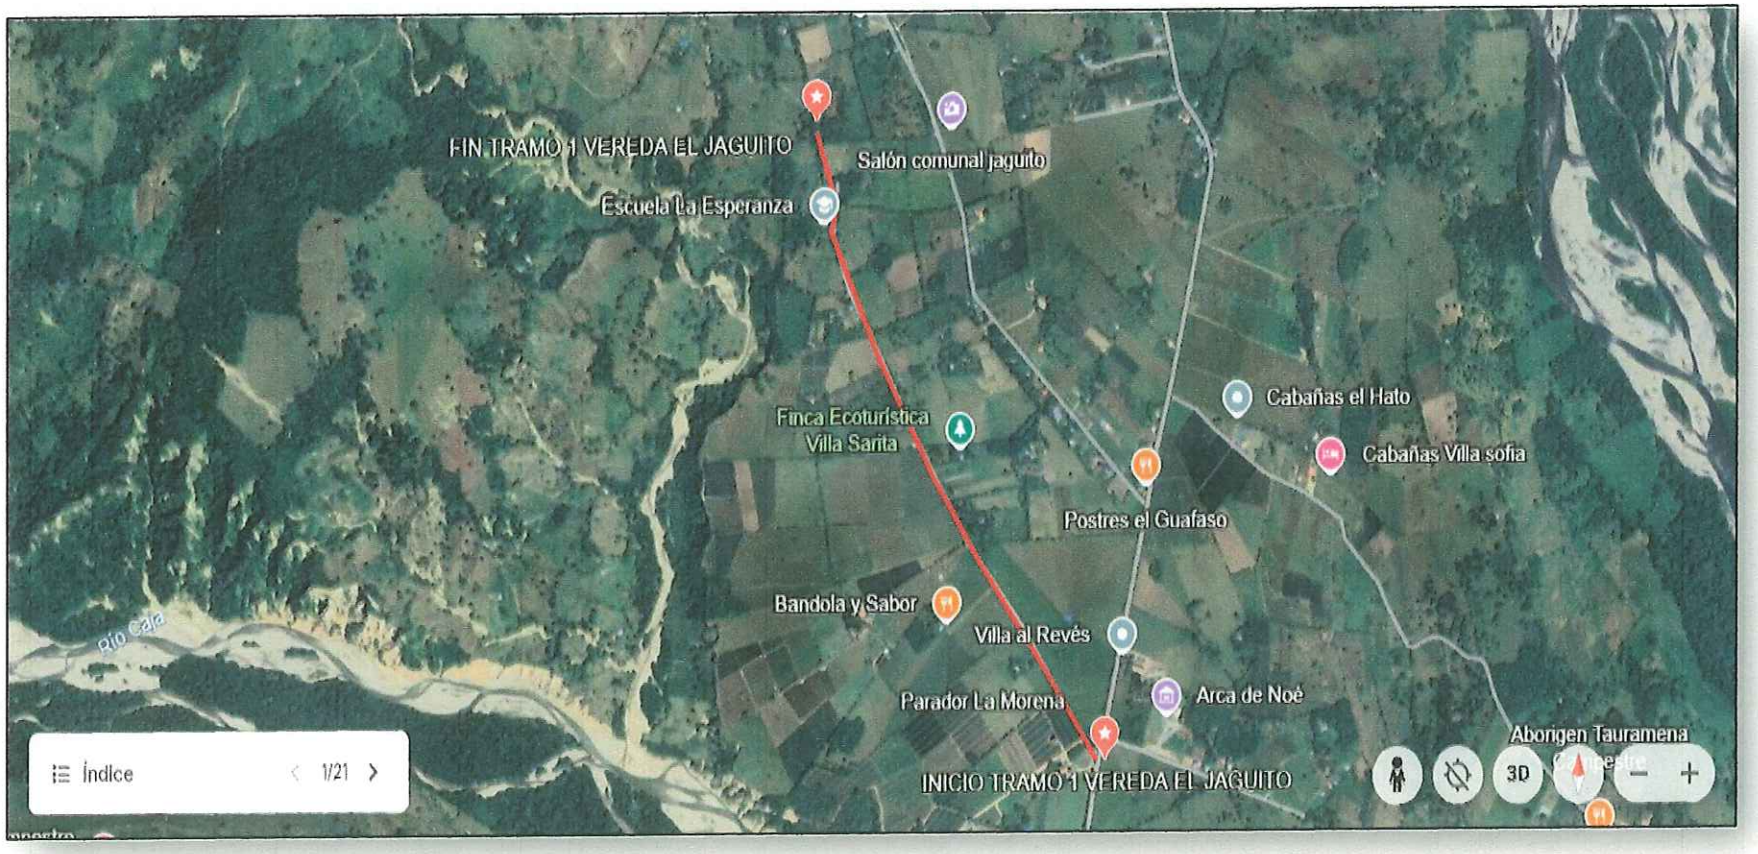


Fuente: Google Earth

Fig. 8 Localización Geografica del tramo 2, de lo cual se intervino 2,25 km, localizado en la Vereda El Jaguito.




Fuente: Google Earth

Fig. 9 Localización Geografica del Tramo 3, de lo cual se intervino 2,6 km, localizado en la Vereda El Jaguito.

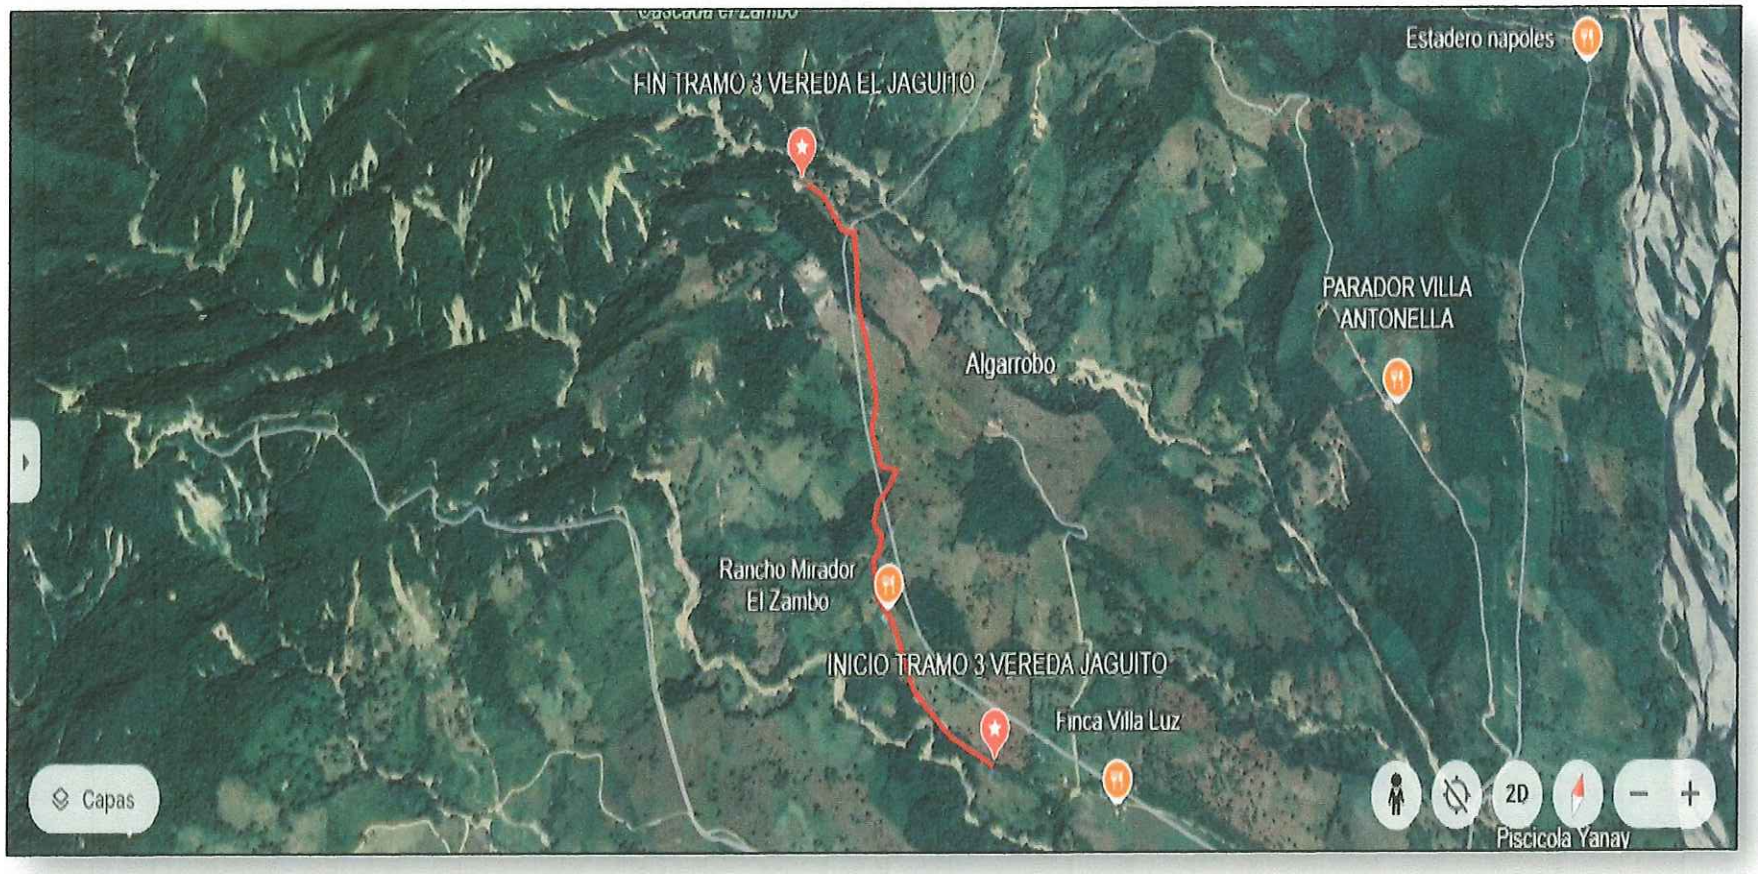

Fuente: Google Earth

Fig. 10 Localización Geográfica del Tramo 4, de lo cual se intervino 2,3 km, localizado en la Vereda El Jaguito.

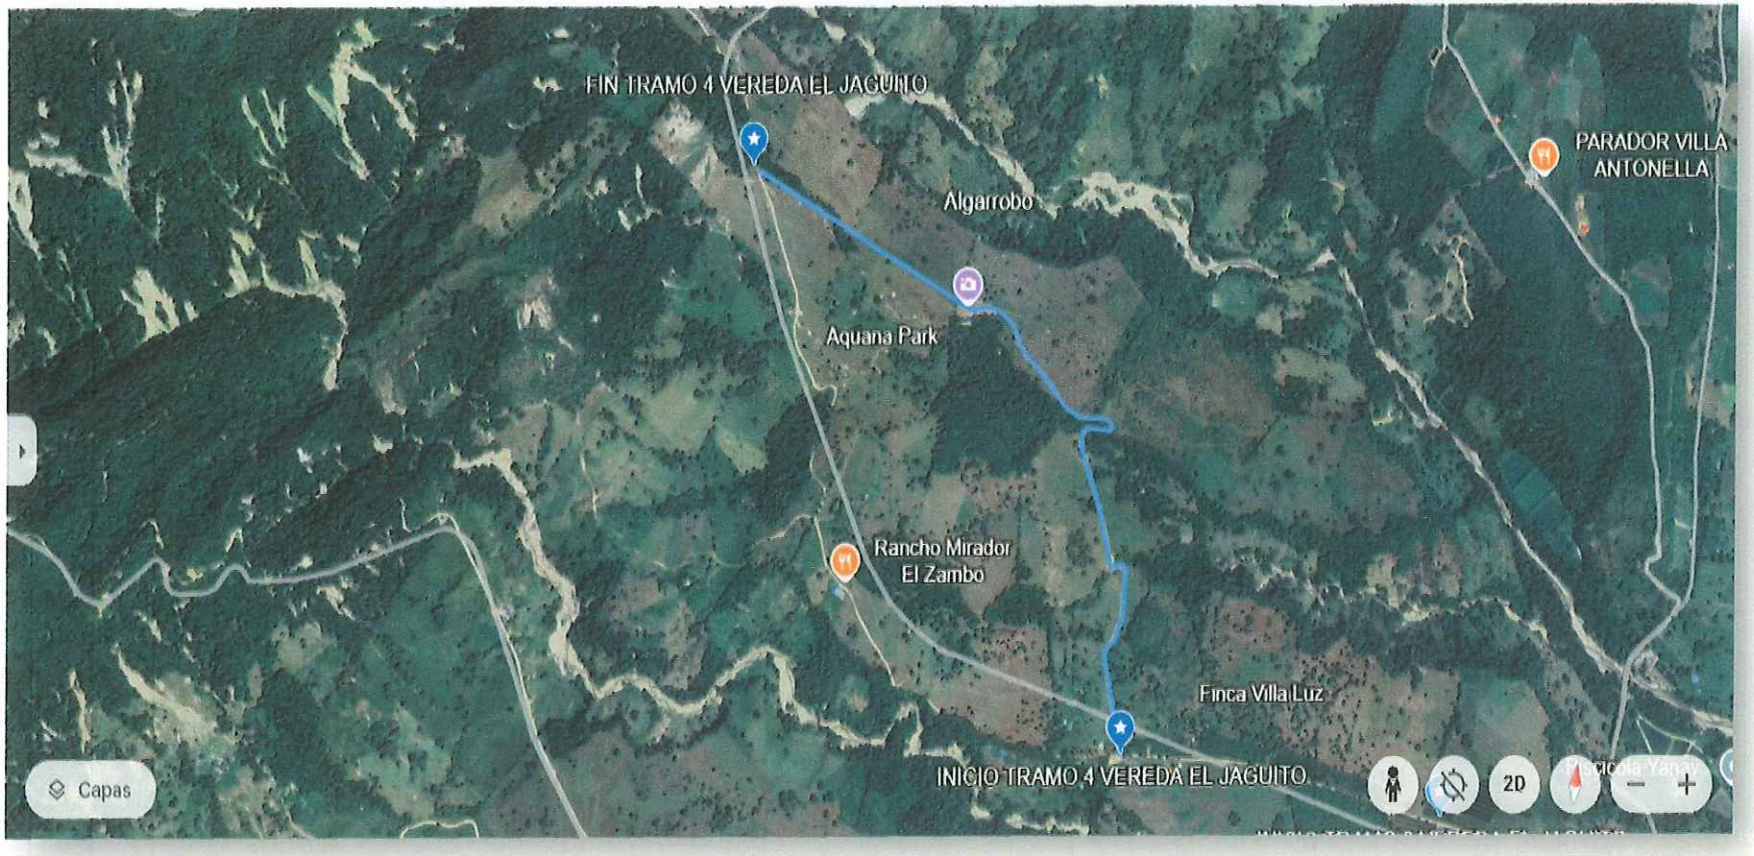


Fuente: Google Earth

Fig. 11 Localización Geografica del Tramo 5, de lo cual se intervino 2 km, localizado en la Vereda El Jaguito.




Fuente: Google Earth

Fig. 12 Localización Geografica del Tramo 1, de lo cual se intervino 4,20 km, localizado en la Vereda Aguamaco.

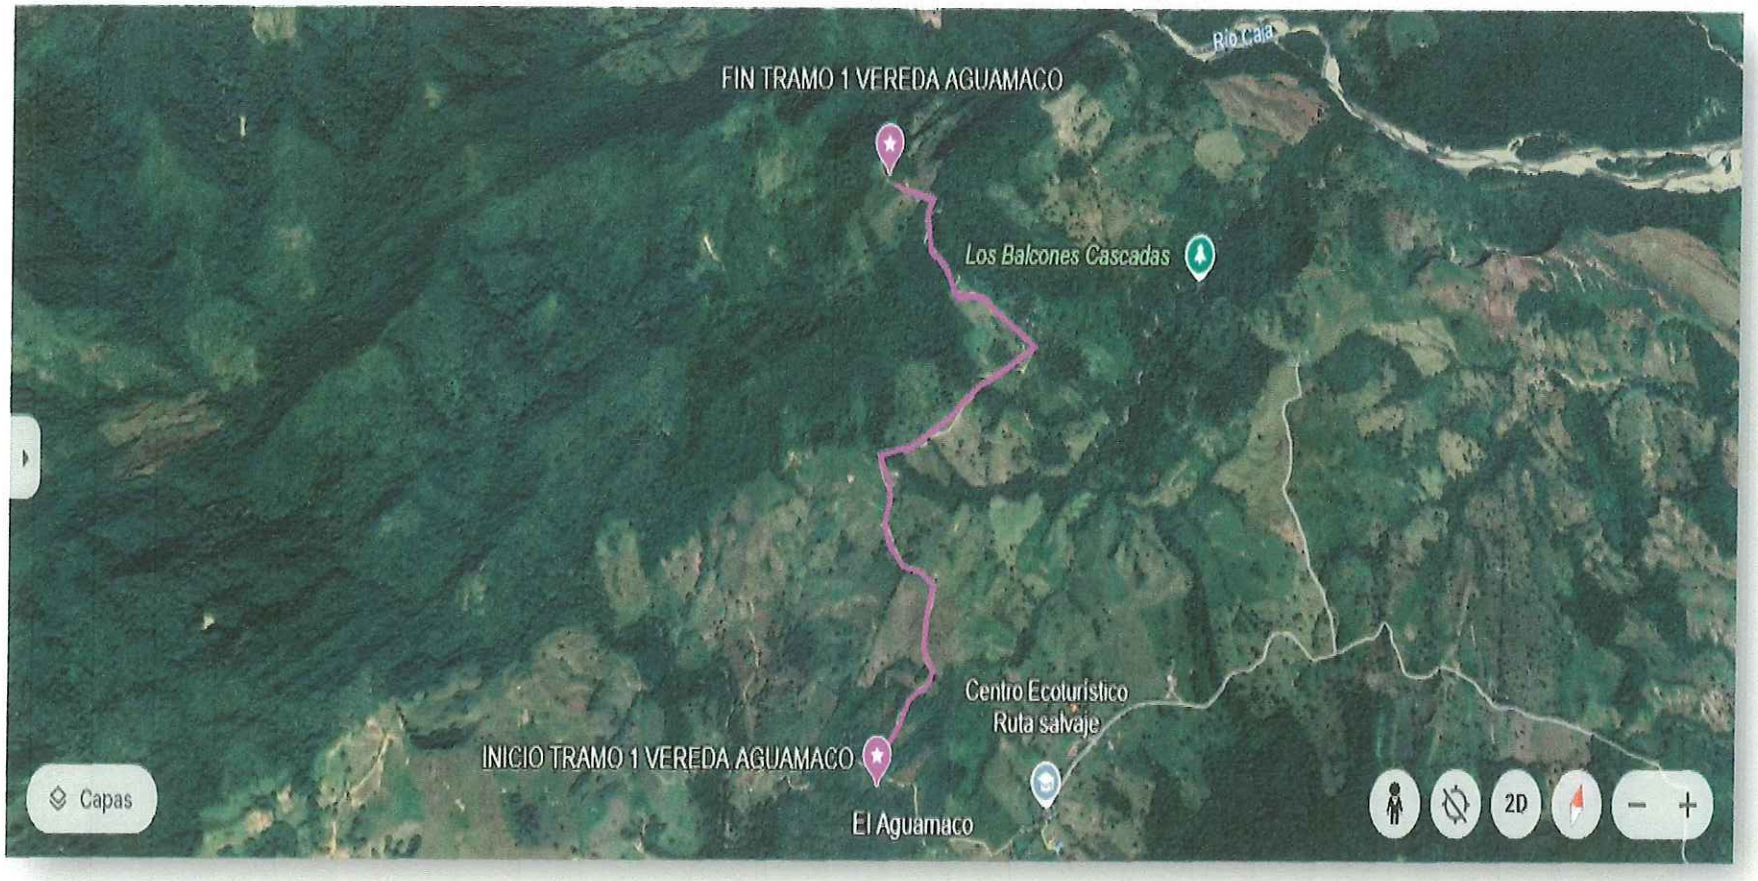


Fuente: Google Earth

Fig. 13 Localización Geográfica del Tramo 1, de lo cual se intervino 2,93 km, localizado en la Vereda Aguablanca.

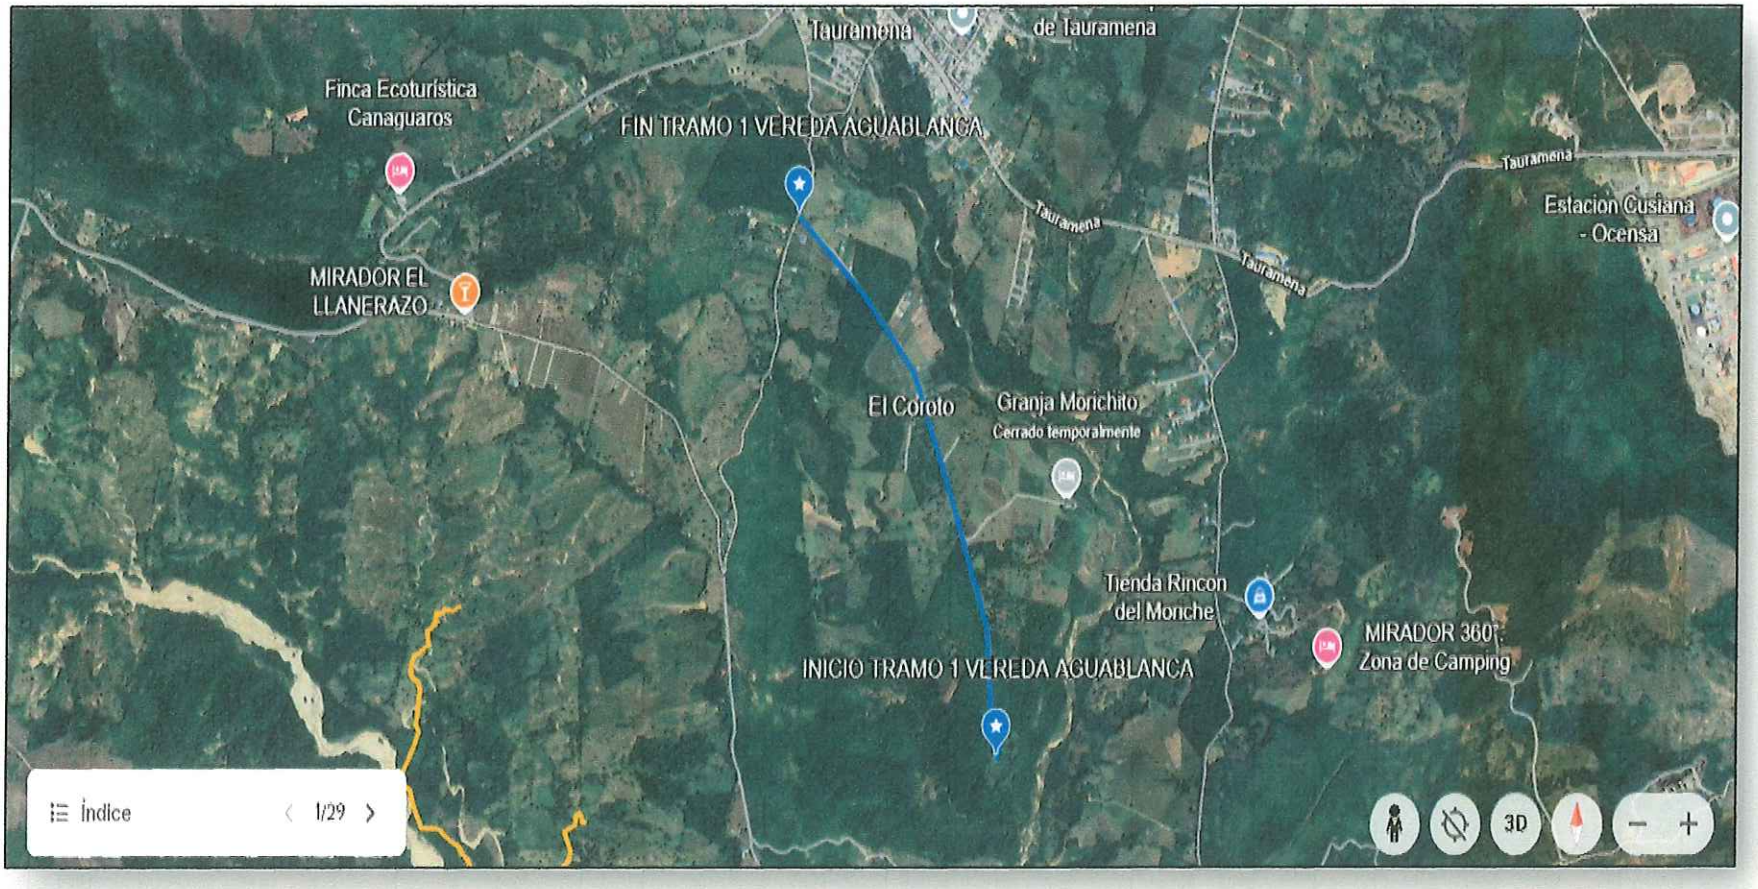

Fuente: Google Earth

Fig. 14 Localización Geográfica del Tramo 2, de lo cual se intervino 0.97 km, localizado en la Vereda Aguablanca.

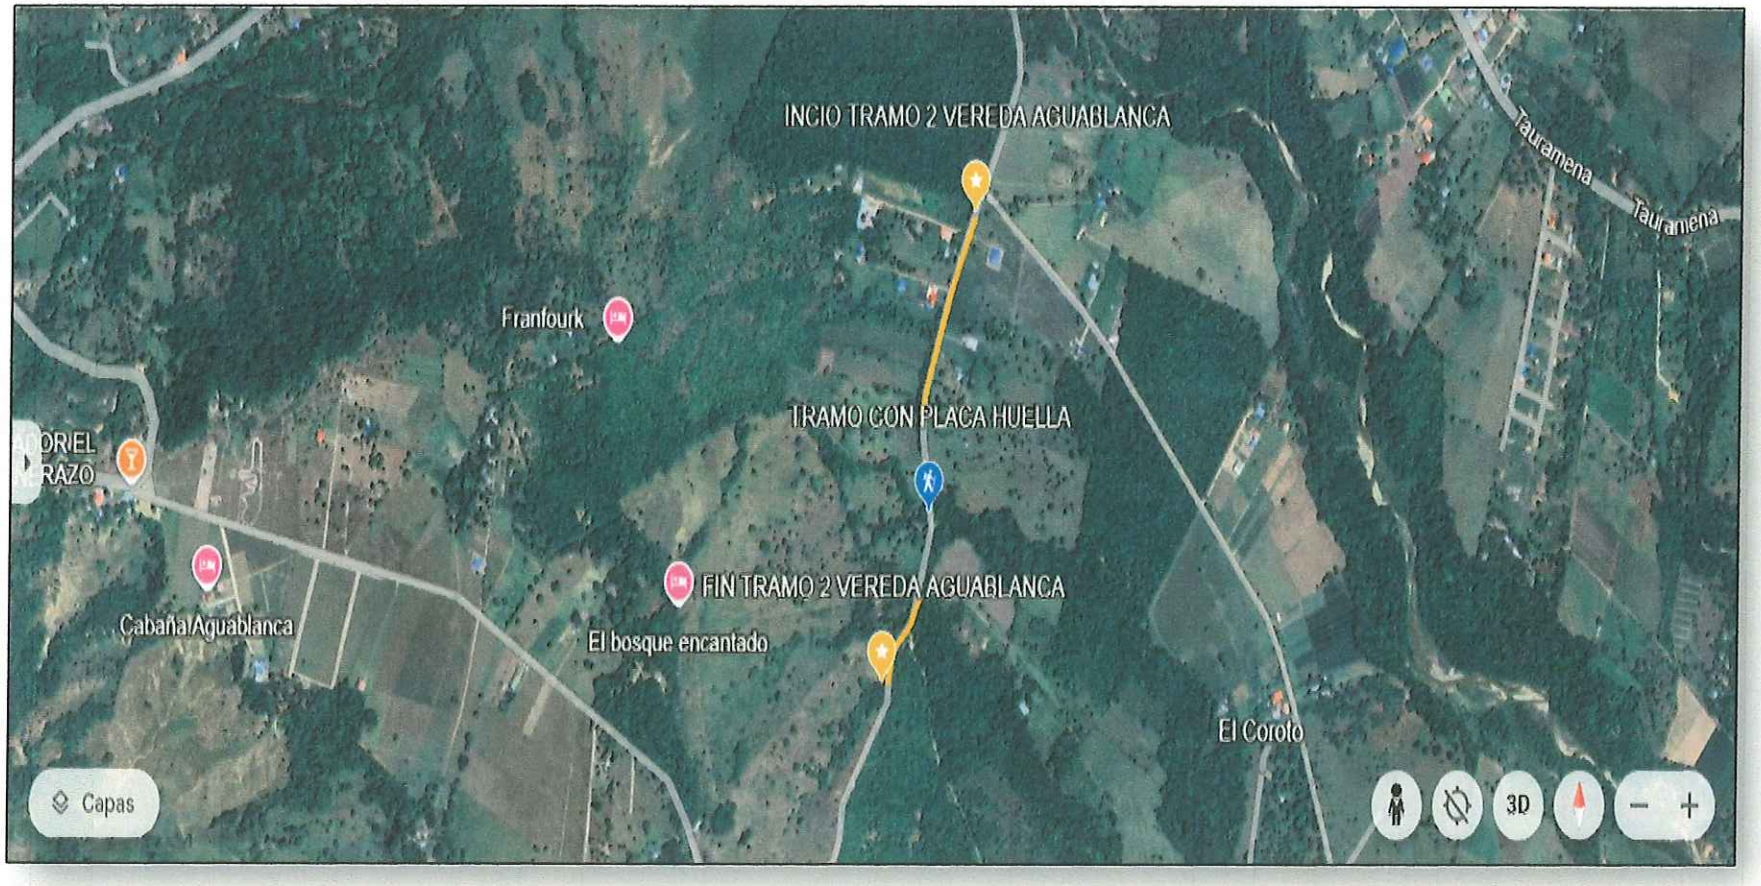

Fuente: Google Earth

Fig. 15 Localización Geográfica del Tramo 3, de lo cual se intervino 1,6 km, localizado en la Vereda Aguablanca.



Fuente: Google Earth

Fig. 16 Localización Geográfica del Tramo 4, de lo cual se intervino 1,65 km, localizado en la Vereda Aguablanca.



Fuente: Google Earth

Fig. 17 Localización Geográfica del Tramo 5, de lo cual se intervino 2,56 km, localizado en la Vereda Aguablanca.



Fuente: Google Earth

Fig. 18. Localización Geográfica del Tramo 6, de lo de lo cual se intervino 3,56 km, localizado en la Vereda Aguablanca.





Fuente: Google Earth


INTERVENCIÓN VEREDA CABAÑAS

ANTES VEREDA CABAÑAS




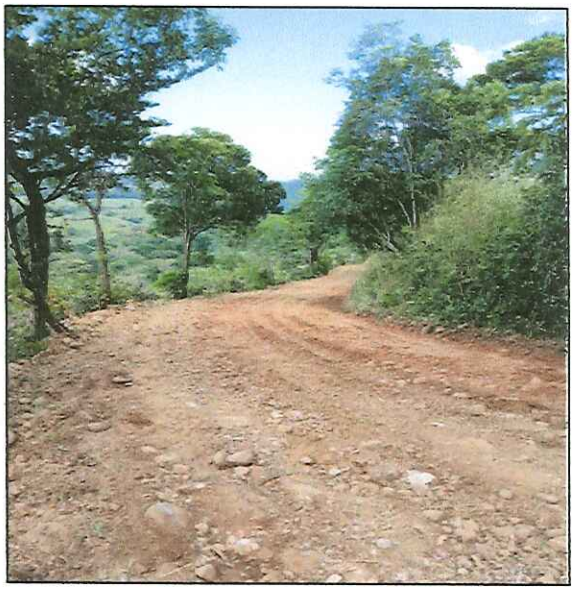


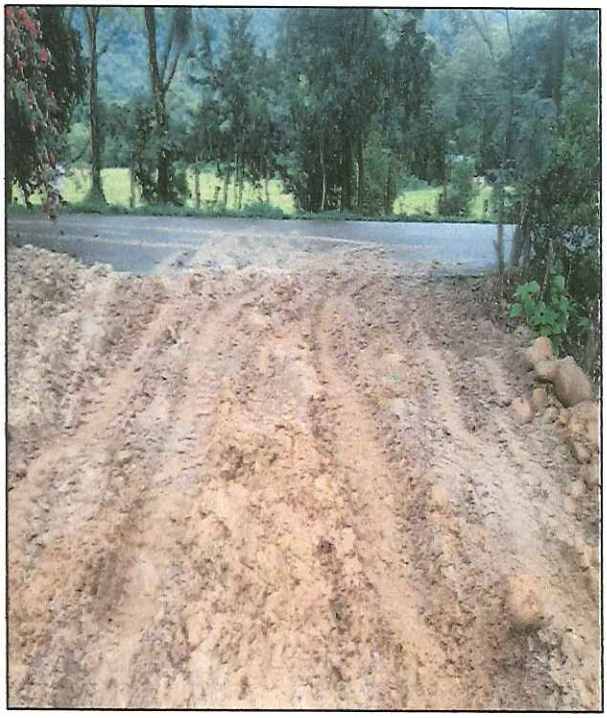

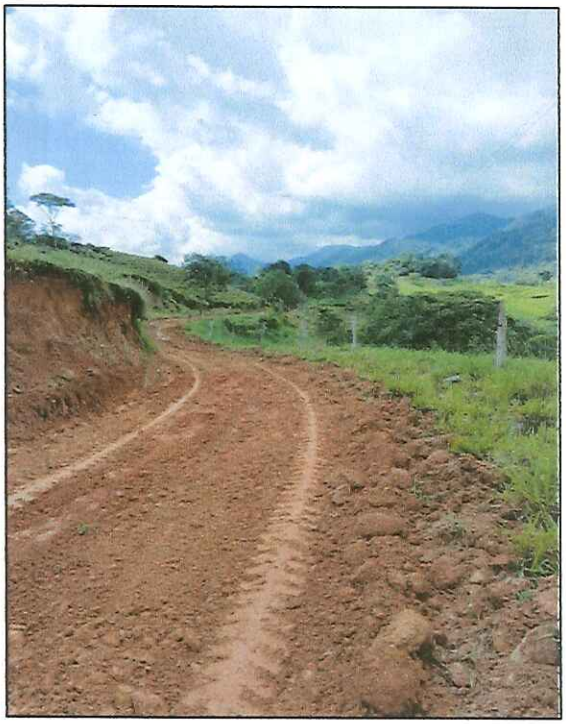


DURANTE VEREDA CABAÑAS

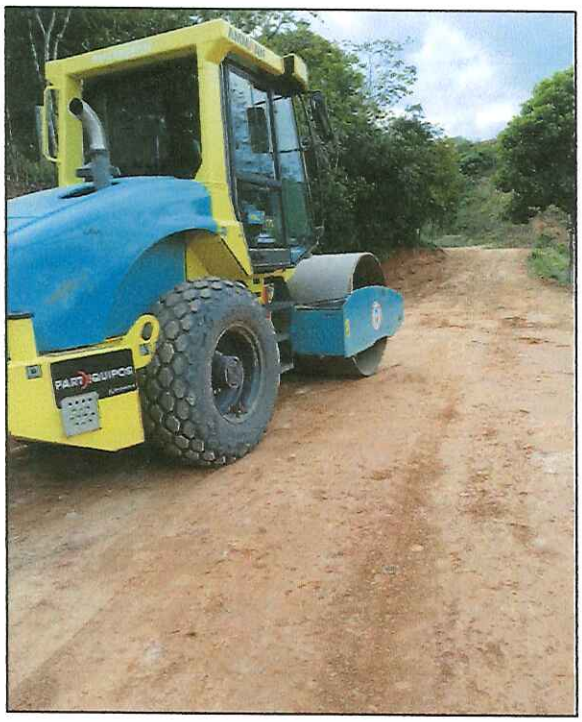


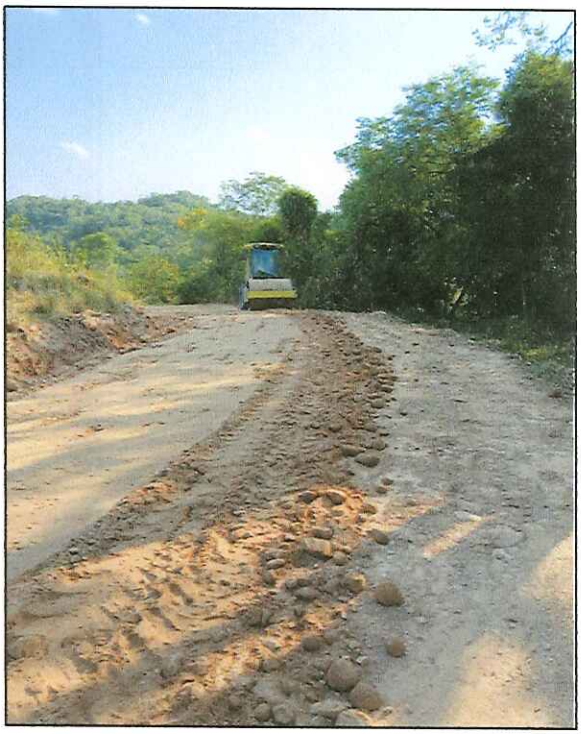





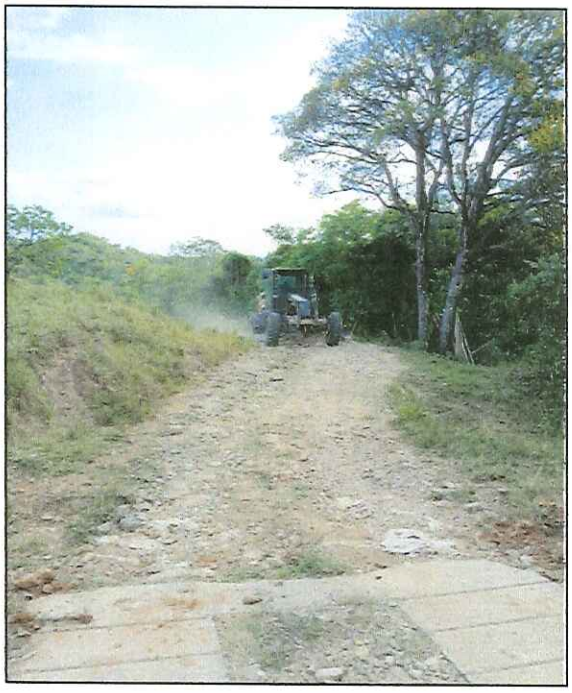

DESPUÉS VEREDA CABAÑAS

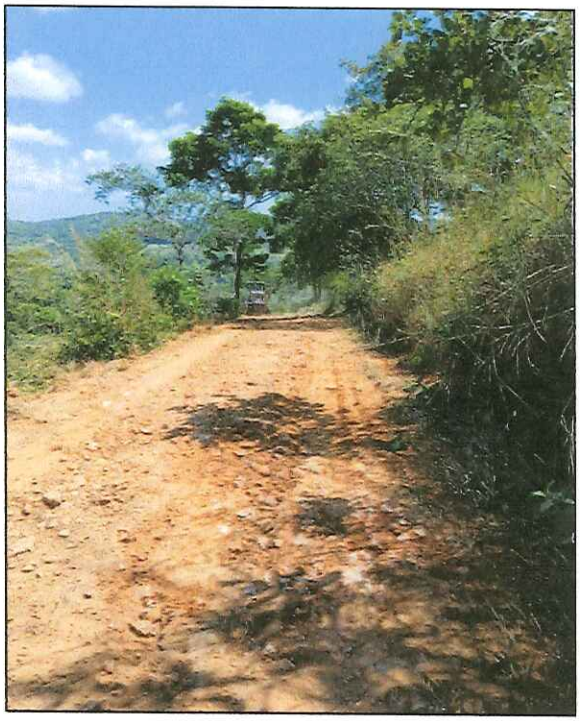


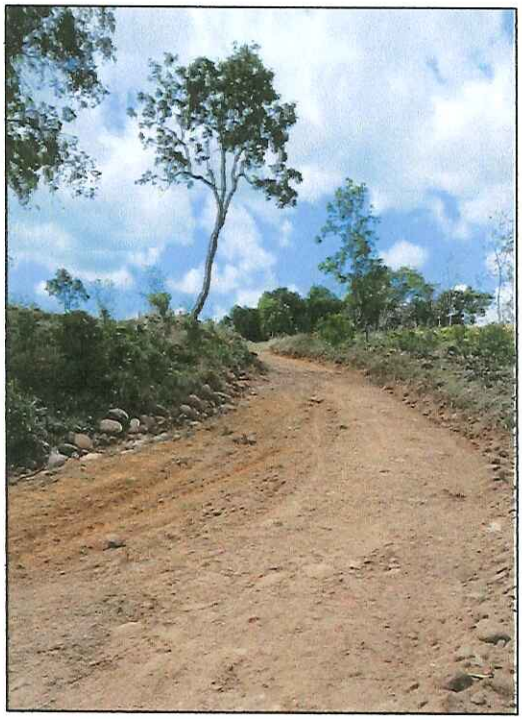


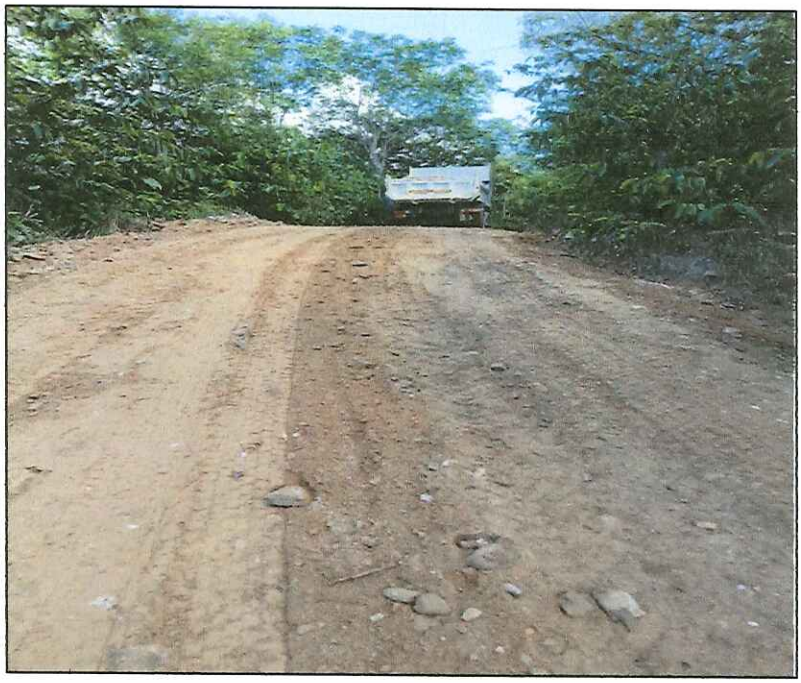



INTERVENCIÓN VEREDA JAGUITO

ANTES VEREDA JAGUITO

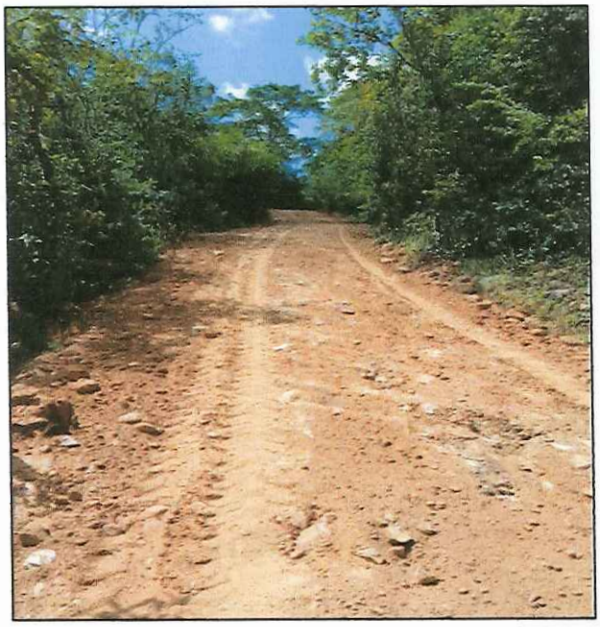


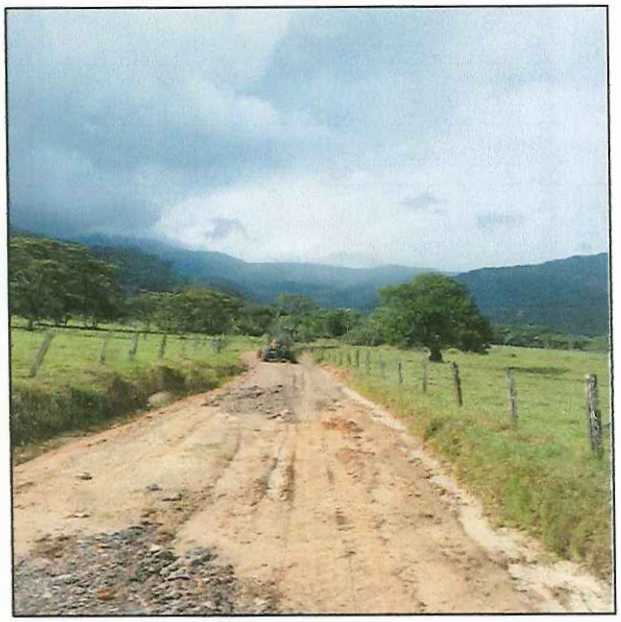


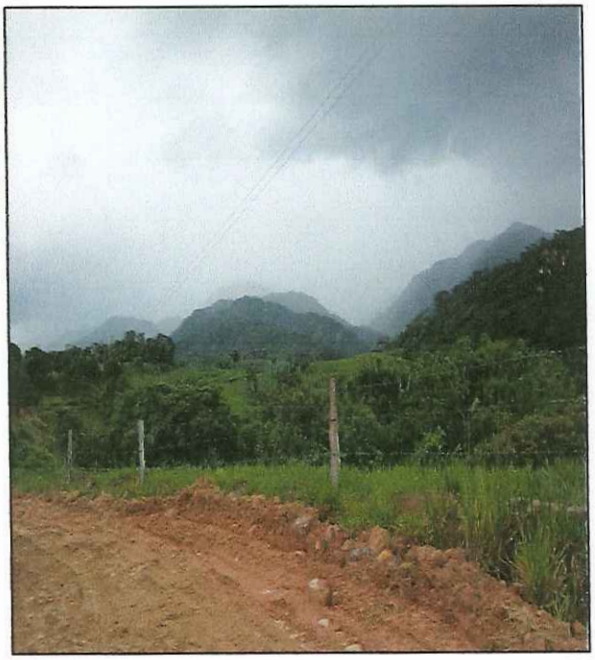


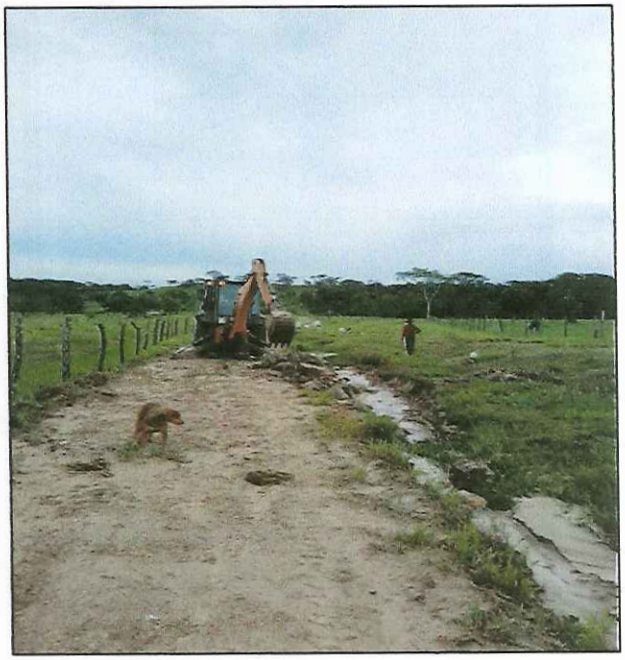

DURANTE VEREDA JAGUITO

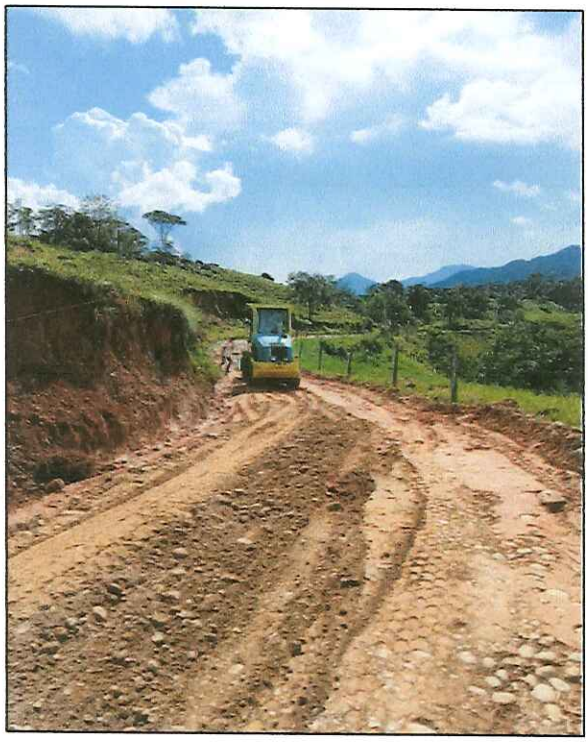


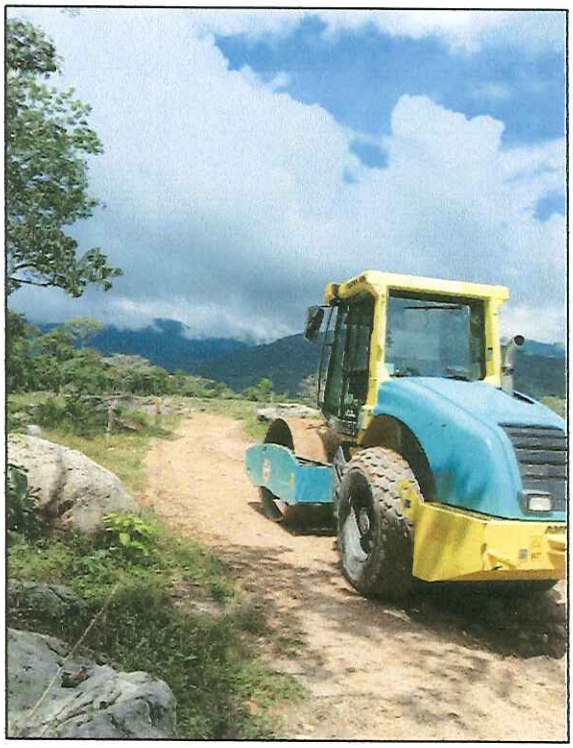


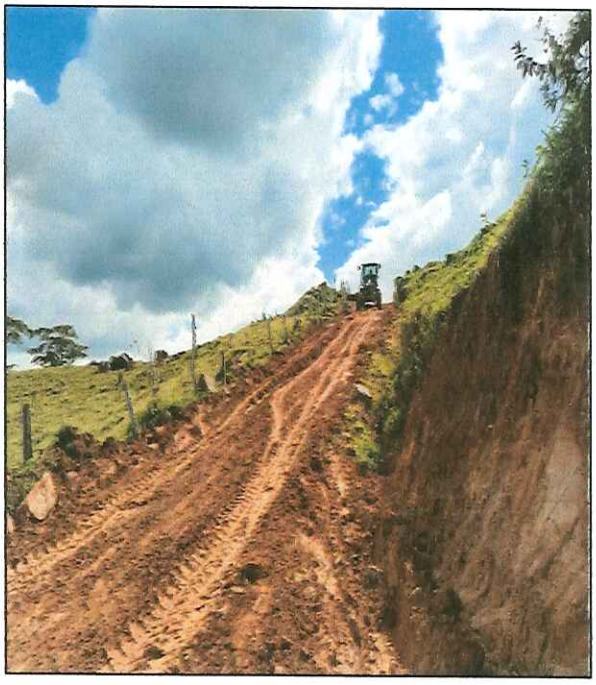



DESPUÉS VEREDA JAGUITO

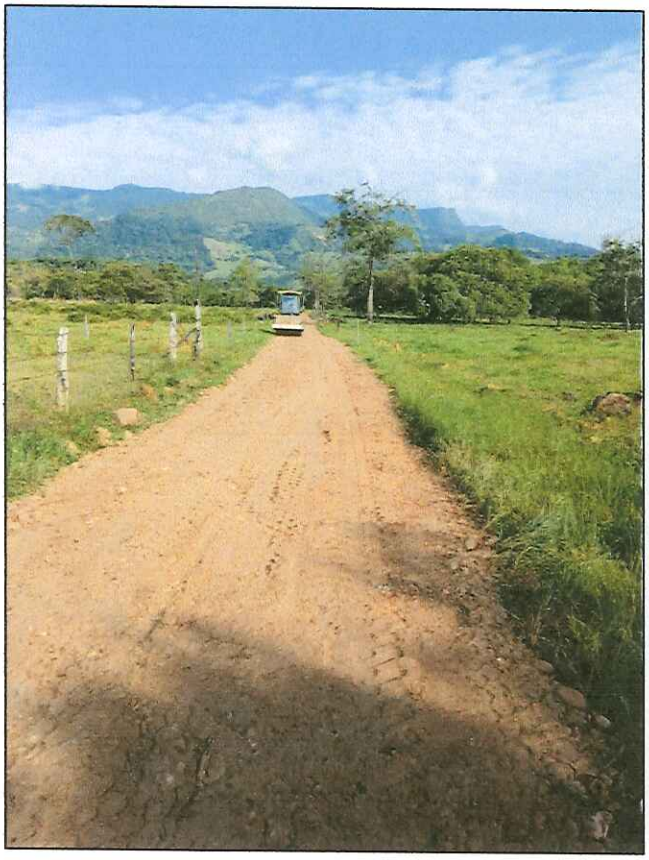

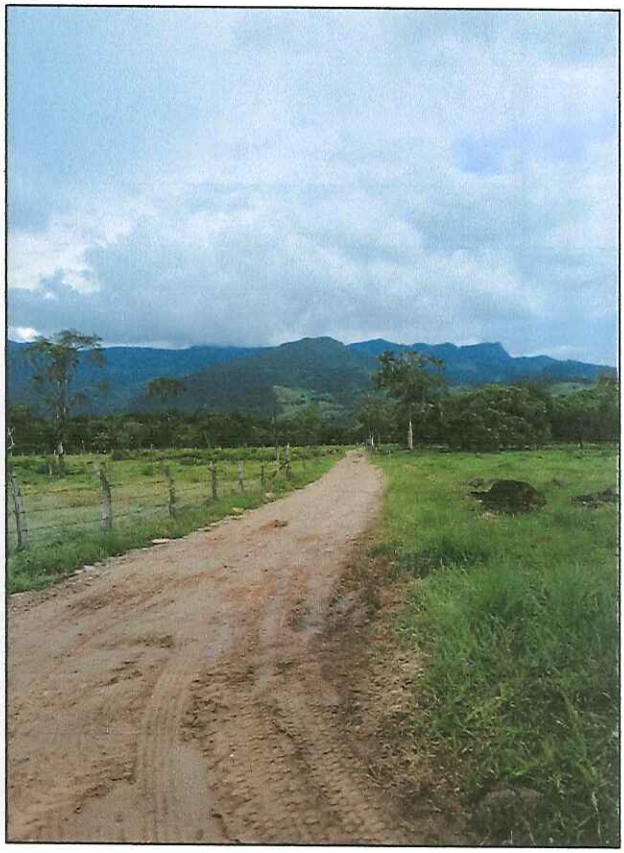




INTERVENCIÓN VEREDA AGUAMACO

ANTES VEREDA AGUAMACO




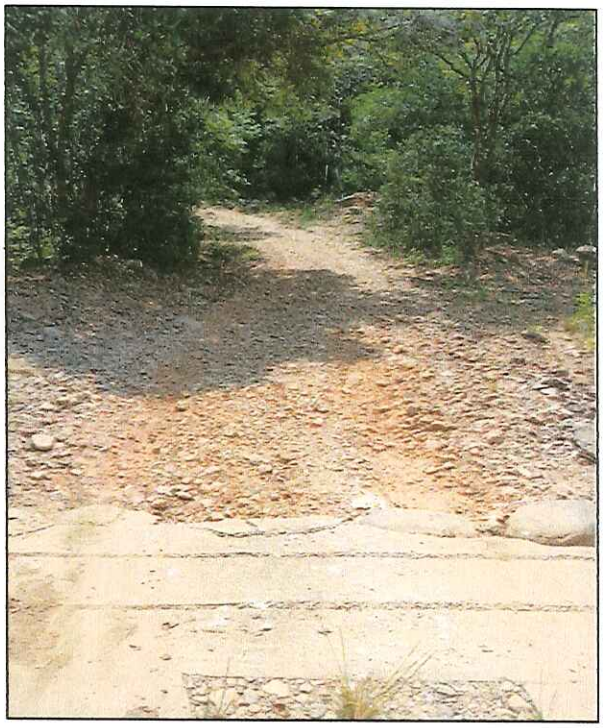





DURANTE VEREDA AGUAMACO



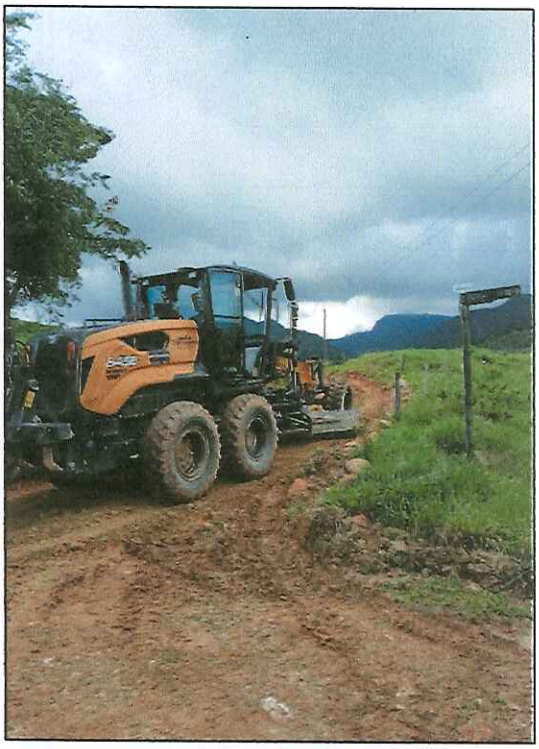


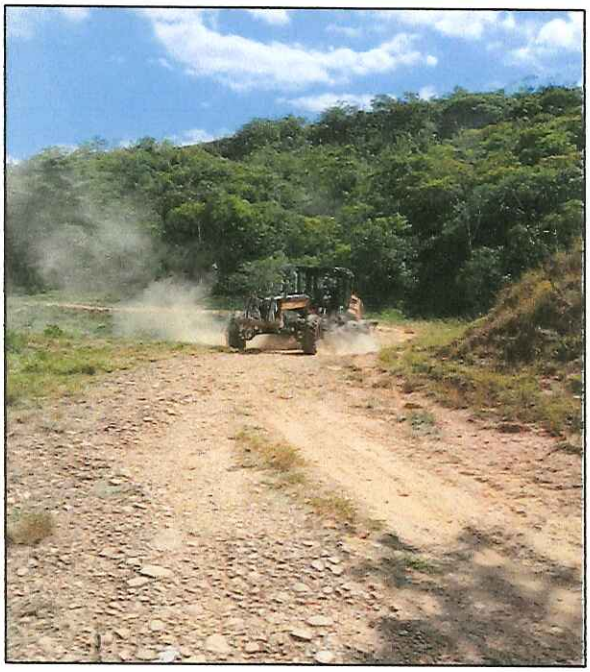

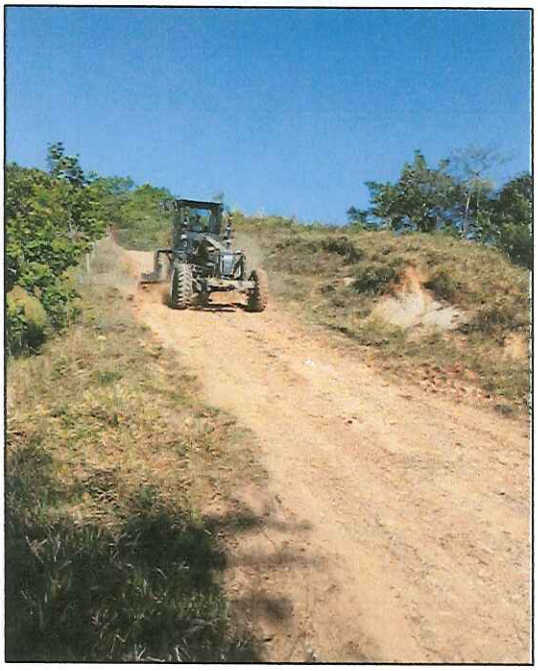

DESPUÉS VEREDA AGUAMACO



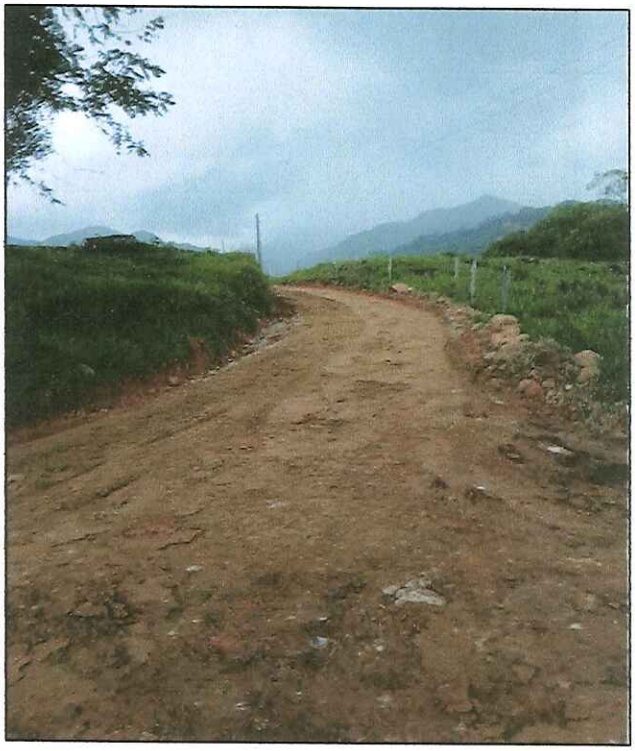




INTERVENCIÓN VEREDA AGUABLANCA

ANTES VEREDA AGUABLANCA



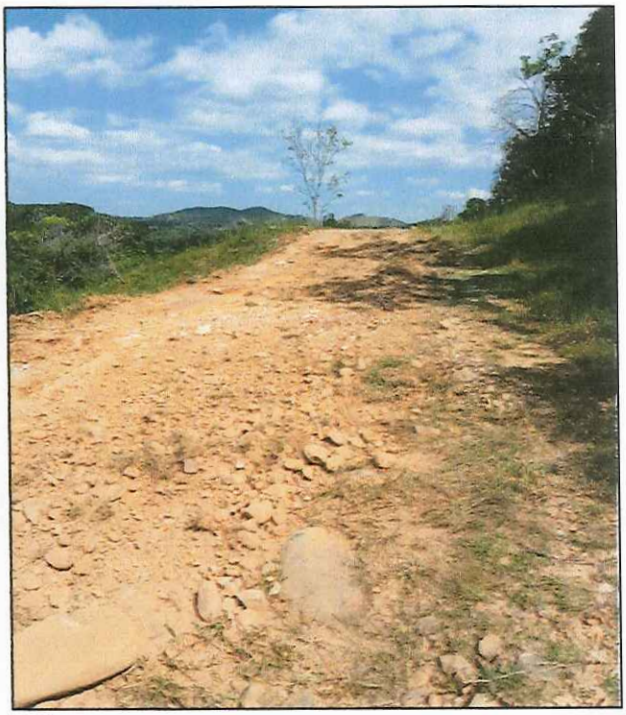




DURANTE VEREDA AGUABLANCA







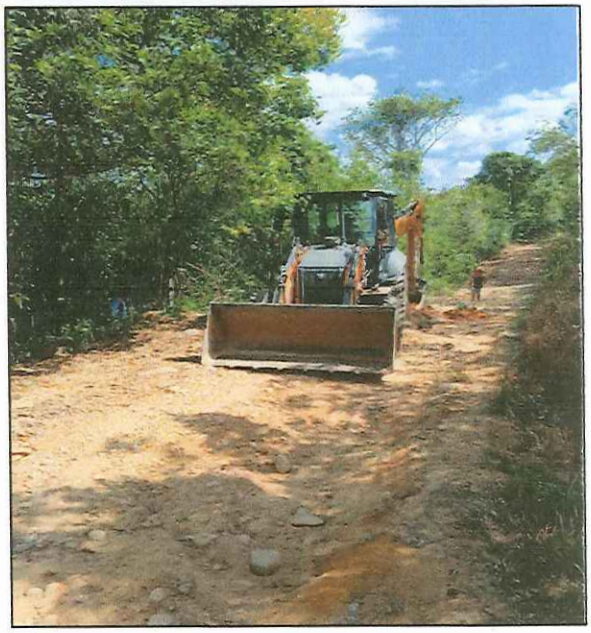

DESPUÉS VEREDA AGUABLANCA









AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

El presente Convenio Solidario No. 016 del 16 de Octubre de 2024, presenta un avance de ejecución para el periodo comprendido entre el 07 de Noviembre de 2024 al 06 de Diciembre de 2024 del 47,45% y 39,86 kms intervenidos para el aporte obtenido por el Municipio de Tauramena y de acuerdo al aporte que realiza ASOJUNTAS se obtuvo un avance de ejecución del 50,97% y 32 kms intervenidos;

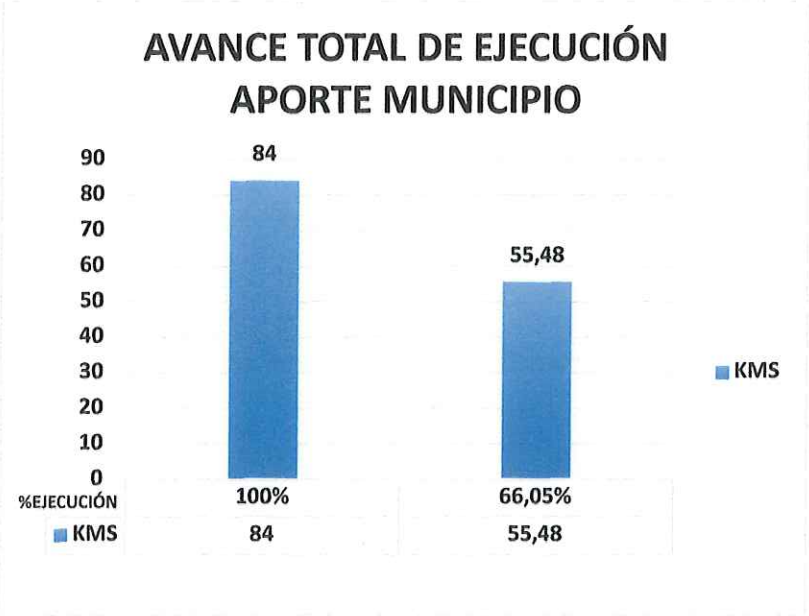

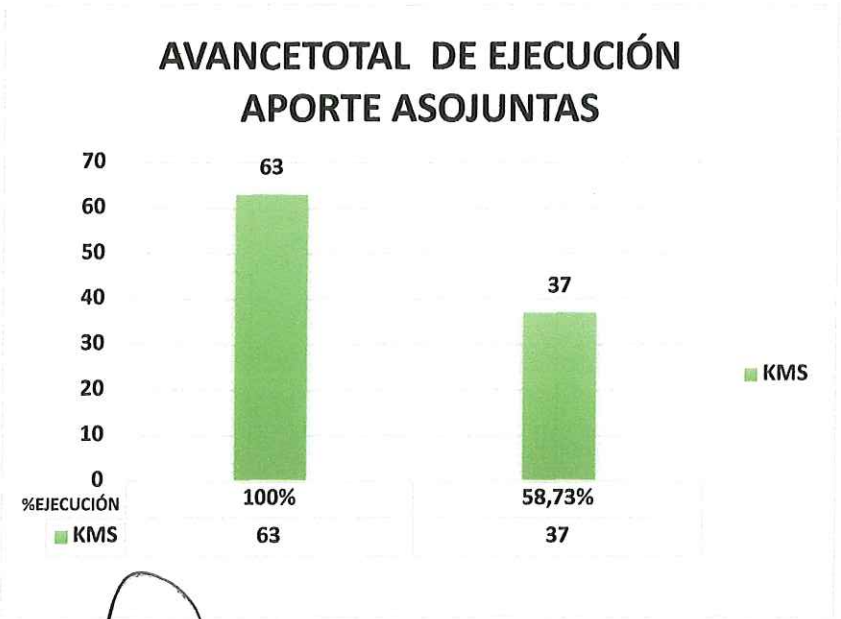

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

ANGIE LORENA GONZALEZ
Ing. Residente
C.S. 016/2024

ANEXO No.1

BITÁCORA

- 07/11/2024

clima: mañana = soleado
tarde = soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinilla
1 inspector SST
personal aporte ASOTUTAI

Se realizan actividades de limpieza con la comunidad, y se retiran 0,45 km de vía en la vereda Cabañas.

Responsable:

Firma presidente

- 08/11/2024

clima: mañana: soleado
tarde: nublado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 inspector SST
personal de ASOTUTAI

Se llevaron a cabo actividades de
erradicacion y compactacion en
0,6 km de malla vial terciaria en
la Vereda. Cabañas.

Responsable. x [illegible]
Ing. Residente

- 09/11/2019

Clima: mañana: nublado
tarde: soleado

personal. 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 inspector SST
Personal aporte ARCHIVOS

Se llevaron a cabo actividades de
erradicacion y compactacion en 1000m
de via en la Vereda Cabañas

Responsable: [illegible]
Ing Residente

· 11/11/2024

Clima mañana - soleado

tarde · nublado

personal 4 operadores

1 coordinador seguridad

1 inspector SST.

Personal ARQUITAL.

Se llevan a cabo actividades de señalización y perfilación en 0.25km de vía intervenida en la vereda Cabañas

Responsable: Ing. Residente

· 12/11/2024

Clima · mañana · soleado

Tarde · nublado

personal · 4 operadores

1 coordinador seguridad

1 inspector SST

personal aporte ASOJUNTA)
Se llevan a cabo actividades de compactación en 0,45 Km intervalo) en la malla vial terciaria de la Vereda Cabañas

Responsable: [signature] fym
Inf. Residente

13/11/2024

clima: mañana - soleado
tarde - Soleado

personal: 1 operadore)
1 coordinador maquinaria
1 inspector SST
Personal aporte ASOJUNTA)

Se llevan a cabo actividades de escarificacion, compactacion y perfilado en 2,3 Km de malla vial terciaria de la Vereda Cabañas.

Responsable: [signature] fym
Inf. Residente

14/11/2024

clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 inspector SST

personal aporte ADJUNTAL

Se llevan a cabo actividades de conformación y compactación en 2,3 km de vía terciaria en la Vereda Cabañas

Responsable: [signature] tgm

Ing. residente

15/11/2024

clima mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinada maquinaria

1 Inpector SST

personal aporte - ASOTUNTAI

Se llevan a cabo actividades de limpieza perfilacion en 1,6 km en via terciaria de la Vereda Cabonas

Responsable: Ing. residente

16/11/2024

clima: mañana: nublado

tarde: Soleado

personal: -4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de compactacion en 1000 m de malla vial terciaria de la Vereda Cabonas.

Responsable: Ing. residente

18/11/2024

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Personal aporte ASOJUNTAS

=> Se llevan a cabo actividades de conformación y compactación en 1,35 Km de vía terciaria intervenida en la Vereda Jaguito.

Responsable: [illegible] Ing residente

19/11/2024

Clima: mañana - Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de compactacion en 1,70 km de malla vial terciaria en la Vereda: Jaguito

Responsable: [illegible]
Ing. Residente

20/11/2024

clima mañana - soleado

tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador mañana

1 Inspector SST

personal aporte ARGOTUNAL

Se llevan a cabo actividades de estabilizacion y compactacion en 2,25 km de malla vial terciaria de la Vereda Jaguito.

Responsable: [illegible]
Ing. Residente

21/11/2024

clima mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Personal a parte ASOPUTAI

Se llevan a cabo actividades de señalización y compactación en 2,80 km de malla vial terciaria en la vereda Jagüito

Responsable: [signature] Ing. Residente

22/11/2024

clima mañana: nublado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se realizan actividades de estabilización, compactación en 2,30 Km de malla vial terciaria en la Vereda Jaguito.

Responsable.

Ing. Residente

23/11/2024

Clima mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se desarrollan actividades de estabilización y compactación en 2,2 Km de vía intervenida en la Vereda Jaguito.

Responsable

Ing. Residente

25/11/2024

Clima: mañana. Soleado

Tarde. Soleado

Personal. 4 Operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Personal aporte ADICIONAL

Se desarrollan actividades de escarificacion, compactacion y perfilacion en 0,92 Km de la via terciaria de la Vereda. Aguacaco

Responsable: [illegible]

Ing. Residente

26/11/2024

Clima: mañana. Soleado

Tarde. Soleado

Personal. 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST.

Se llevaron a cabo actividades de
conformación y compactación en 0,8
Km de la Vereda Aguacaco
Responsable.
Ing. Residente

24/11/2024
clima. mañana - soleado
Tarde: soleado
personal: 1 operador
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Personal aporte ADICIONAL
Se realizan actividades de compactación
y perfilado al lado y lado de la
vía en 0,6 Km de la Vereda. Aguacaco
Responsable:
Ing. Residente

28/11/2024

clima. mañana. soleado

Tarde. soleado

personal. 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se desarrollan actividades de excavación y compactación en 1.16 Km en la Vereda Aguanaco

Responsable. ~~Ing residente~~

29/11/2024

clima mañana. soleado

Tarde. soleado

personal. 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de excavación y compactación en

0,69 Km de via intervenida en la Vereda Aguacaco

Responsable. Ing residente

30/11/2024

clima. mañana: soleado
tarde: soleado

personal: 4 Operadores
1 coordinador cuadrilla
1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificacion y compactacion en 2,93 km de via terciaria en la Vereda Aguacaco

Responsable. Ing residente

02/12/2024

clima mañana: soleado
tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador seguridad
1 Inspector SST
Personal apoyo ADICIONAL

Se llevan a cabo actividades de escarificación y compactación en 0,97 Km de vía intervenida en la Vereda Aguablanca

Responsable

Ing. residente

Condiciones

clima mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal 1 operadores

1 coordinador seguridad

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificación y compactación en 1,6 Km de la Vereda. Aguablanca en su malla vial terciaria.

Responsable: [signature] jgm
Ing. Residente

04/12/2024

clima: mañana: Soleado
Tarde. Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST.

Se llevan a cabo actividades de compactacion en 1,65 Km de la Vereda. Aguablanca

Responsable: [signature] jgm
Ing. Residente

05/12/2024

clima: mañana: Soleado
Tarde. Soleado.

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de adecuación en 2,56 km de la Vereda Aguablanca.

Responsable: Ing. Residente

06/12/2024

clima: mañana: soleado
Tarde: soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificación y perfilación en 3,56 km en la malla vial terciaria de la Vereda Aguablanca.

Responsable: Ing. Residente

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 3 de 10 Del: 4-nov-24 Al: 10-nov-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días. Tiempo faltante: 49 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 30%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	30,00%	30,00%	Obra Ejecutada (%)	30,00%	30,00%
Valor de la Obra programada:	$88.581.843,00	$ 88.581.843,00	Valor de la Obra	$ 88.581.843,00	$ 88.581.843,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	016 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 295.272.810,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	21/10/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	30/12/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$ 88.581.843,00	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	30%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 21 de Octubre de 2024 en el cual se ejecutaron los ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias, asi mismo se les realizo verificacion preoperacion a la maquinaria amarilla y volqueta para dar inicio a sus labores asi como la inspeccion total por parte del Inspector SST

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA



	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 2 DE 2

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ITEM:	Mantenimiento vias terciarias mediante conformacion de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)



FOTOGRAFIA N.01 ANTES



FOTOGRAFIA N.02 DURANTE

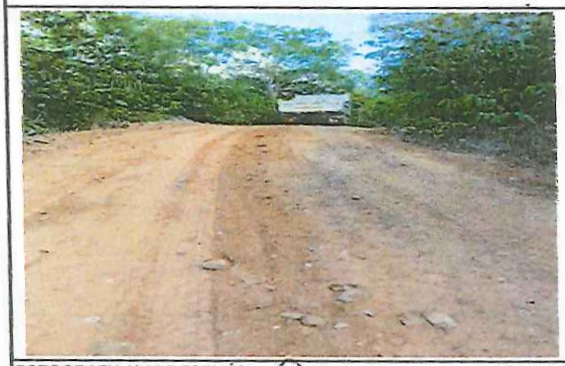

FOTOGRAFIA N.03 DESPUÉS



FOTOGRAFIA N.04 DESPUÉS

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 4 de 10 Del: 11-nov-24 Al: 17-nov-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 28 Días. Tiempo faltante: 42 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 40%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	40,00%	40,00%	Obra Ejecutada (%)	40,00%	40,00%
Valor de la Obra programada:	$118.109.124,00	$ 118.109.124,00	Valor de la Obra	$118.109.124,00	$ 118.109.124,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	016 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 295.272.810,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	21/10/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	30/12/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$ 118.109.124,00	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	40%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 21 de Octubre de 2024 en el cual se ejecutaron los ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias, asi mismo se les realizo verificacion preoperacion a la maquinaria amarilla y volqueta para dar inicio a sus labores asi como la inspeccion total por parte del Inspector SST

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA



Firma

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 2 DE 2

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ITEM:	Mantenimiento vias terciarias mediante conformacion de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)



FOTOGRAFIA N.01 ANTES



FOTOGRAFIA N.02 DURANTE

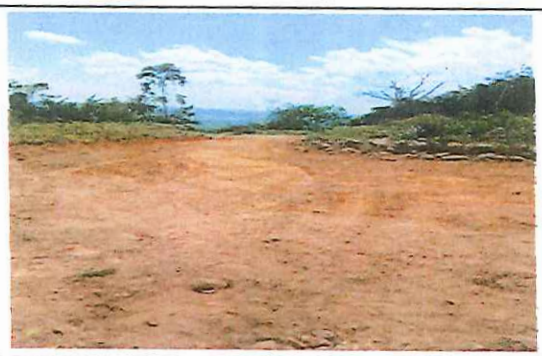

FOTOGRAFIA N.03 DESPUÉS



FOTOGRAFIA N.04 DESPUÉS

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 5 de 10 Del: 18-nov-24 Al: 24-nov-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 Días. Tiempo faltante: 35 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 50%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	50,00%	50,00%	Obra Ejecutada (%)	50,00%	50,00%
Valor de la Obra programada:	$147.636.405,00	$ 147.636.405,00	Valor de la Obra	$147.636.405,00	$ 147.636.405,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	016 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 295.272.810,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	21/10/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	30/12/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$ 147.636.405,00	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	50%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 21 de Octubre de 2024 en el cual se ejecutaron los ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias, asi mismo se les realizo verificacion preoperacion a la maquinaria amarilla y volqueta para dar inicio a sus labores asi como la inspeccion total por parte del Inspector SST

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA

Firma

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 2 DE 2

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM:	Mantenimiento vias terciarias mediante conformacion de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)



FOTOGRAFIA N.01 ANTES



FOTOGRAFIA N.02 DURANTE



FOTOGRAFIA N.03 DESPUÉS



FOTOGRAFIA N.04 DESPUÉS

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 6 de 10 . Del: 25-nov-24 Al: 1-dic-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días. Tiempo faltante: 28 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 60%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	60,00%	60,00%	Obra Ejecutada (%)	60,00%	60,00%
Valor de la Obra programada:	$177.163.686,00	$ 177.163.686,00	Valor de la Obra	$177.163.686,00	$ 177.163.686,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	016 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 295.272.810,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	21/10/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	30/12/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$ 177.163.686,00	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	60%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 21 de Octubre de 2024 en el cual se ejecutaron los ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias, asi mismo se les realizo verificacion preoperacion a la maquinaria amarilla y volqueta para dar inicio a sus labores asi como la inspeccion total por parte del Inspector SST

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA



Firma

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 2 DE 2

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				


DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM:	Mantenimiento vias terciarias mediante conformacion de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)



FOTOGRAFIA N.01 ANTES

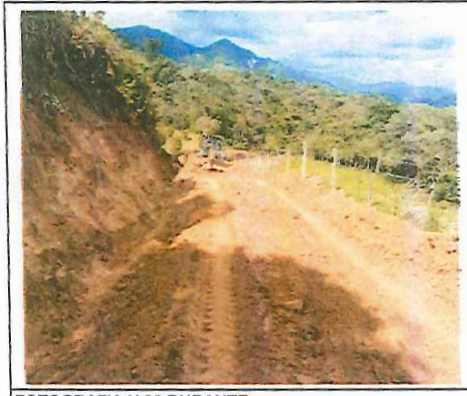

FOTOGRAFIA N.02 DURANTE



FOTOGRAFIA N.03 DESPUES



FOTOGRAFIA N.04 DESPUÉS

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 7 de 10 Del: 2-dic-24 Al: 8-dic-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 Días. Tiempo faltante: 21 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 70%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	70,00%	70,00%	Obra Ejecutada (%)	70,00%	70,00%
Valor de la Obra programada:	$206.690.967,00	$ 206.690.967,00	Valor de la Obra	$206.690.967,00	$ 206.690.967,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	016 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 295.272.810,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	21/10/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	30/12/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$ 206.690.967,00	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	70%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 21 de Octubre de 2024 en el cual se ejecutaron los ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias, asi mismo se les realizo verificacion preoperacion a la maquinaria amarilla y volqueta para dar inicio a sus labores asi como la inspeccion total por parte del Inspector SST

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA



	FORMATO INFORME SEMANAL	COD: AJC-HSEQ-FO-78
		FECHA: 1/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	VERSION 00
		PAGINA 2 DE 2

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	016 DE 2024
		16 DE OCTUBRE DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM:	Mantenimiento vias terciarias mediante conformacion de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)



FOTOGRAFIA N.01 ANTES



FOTOGRAFIA N.02 DURANTE



FOTOGRAFIA N.03 DESPUÉS



FOTOGRAFIA N.04 DESPUÉS

ANGIE LORENA GONZALEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

ANEXO No.2

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, HENRY PAUL ALFONSO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.861.785 de Yopal, en mi condición de **Representante Legal** de LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA identificada con Nit 900.002.220-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio con personería Jurica 1077 DEL 18 MARZO 1999 certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, **ADAN PEÑA PAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.845.703, y con tarjeta profesional no. 68863-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador** de LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA identificada con Nit 900.002.220-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio con personería Jurica 1077 DEL 18 MARZO 1999, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto colombiano de bienestar familiar icbf, servicio nacional de aprendizaje Sena y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Tauramena, a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

HENRY PAUL ALFONSO
C.C. 74.861.785 de Yopal
Representante Legal

ADAN PEÑA PAEZ
T.P 68863-T
Contador Publico

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1108240673	9478636190	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCOLOMBIA	4	$2,794,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1115914284	ACOSTA JHONATAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	74856553	ALFONSO JOSE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	96341464	CORTES BENITO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	80129998	MELO WILLMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	74754960	NIÑO JORGE																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
6	CC	74856459	VIVAS BERNABE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Total Afiliados(6)																							$9,000,000	$1,440,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$626,500		$0	$0		$2,786,500

2024/12/10 09:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1108240673	9478636190	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCOLOMBIA	4	$2,794,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,440,000	$4,000	$0	$1,444,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$496,000	$1,400	$0	$497,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$944,000	$2,600	$0	$946,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$626,500	$1,700	$0	$628,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$626,500	$1,700	$0	$628,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$360,000	$1,000	$0	$361,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$360,000	$1,000	$0	$361,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$360,000	$1,100	$0	$361,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$124,000	$400	$0	$124,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$184,000	$500	$0	$184,500
TOTAL				6	$2,786,500	$7,800	$0	$2,794,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1115916893		GONZALEZ MENDOZA ANGIE LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	verdad cabañas	TAURAMENA-CASANARE	3133179240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1108244811	9477031232	I	2024/12/20	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1115916893	GONZALEZ ANGIE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400

2024/12/11 02:52 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1115916893		GONZALEZ MENDOZA ANGIE LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	verdad cabañas	TAURAMENA-CASANARE	3133179240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1108244811	9477031232	1	2024/12/20	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B95985435F71035

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADAN PEÑA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74845703 de TAURAMENA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 68863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
74.845.703
NUMERO

PEÑA PAEZ
APELLIDOS

ADAN
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1970
TAURAMENA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-1989 TAURAMENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-4685000-70135045-M-0074845703-20050405 03561 05091C 02 147570603

ADAN PEÑA PAEZ
CONTADOR PUBLICO, ESPECIALIZADO EN REVISORIA FISCAL
Revisoria Fiscal, Asesoria Contable Y Tributaria
Sistemas de Control Interno, Contabilidad Sistematizada



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68863-T

ADAN
PEÑA PAEZ
C.C. 74845783
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

FECHA 02/12/98

Presidente

C

FIRMA DEL TITULAR

025838

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional – Junta Central de Contadores.

74845783

Calle 17 No. 15ª-24 Tel.: 6257339, Cel: 320.2341310
Tauramena casanare

ANEXO No.3

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE SUPERVISION No. 02

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 2, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE INFORME	17 de noviembre de 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Décima del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ACTIVIDAD DESARROLLADA	% contratado	% ejecutado
APORTE MUNICIPIO		
Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	100.0%	66.05%
APORTE ASOJUNTAS		
Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	100.0%	58.73%

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**4**		**PORCENTAJE AVANCE EJECUCIÓN TOTAL DEL**	**63.85%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Via terciaria mejorada	No. Km	84	66.05%

INDICADOR DE RESULTADO				
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACION ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Porcentaje de vías terciarias con mantenimiento	%	ND	HAB	26,791

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

¿Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente.
