FLORENCIA, 28 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-CMA-003-2024				
CONTRATO No.	202400001030		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORIA (INTERVENTORIA)				
CONTRATISTA:	MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC S.A.S		**IDENTIFICACIÓN NIT.**	901.359.219-6	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 116.675.849).				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 116.675.849).				
No. DE CDP.	202408 1559	**FECHA DE EXPEDICION**	14 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR**	$ 116.675.849
No. DE RP	202411 4750	**FECHA DE EXPEDICION**	20 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR**	$ 116.675.849
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
PRORROGA 1	N/A				
SUSPENSION	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISO O INTERVENTOR	**HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR** Secretario de Infraestructura-PDA				
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	29-11-2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100034689	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	20-11-2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$23.3353169,80	29/11/2024 hasta 09/07/2025	
Pagos de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales	$5.833.792,45	29/11/2024 hasta 09/01/2028	
Calidad del servicio	$11.667.584,90	09/01/2025 hasta 09/01/2030	

1. **Cantidades entregadas:** En mi calidad de SUPERVISOR y de acuerdo a la Cláusula "***OCTAVA- FORMA DE PAGO: Pagos parciales conforme al avance del contrato objeto de interventoría hasta el 80% de ejecución. El pago estará sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, factura o su documento equivalente, por parte del contratista y certificación de cumplimiento del supervisor. Un último pago, correspondiente al veinte (20%) del valor total del contrato con la liquidación del contrato***". considerando lo anterior, se informa que el avance de obra del contrato 202400001014, sobre el cual se desarrolla la interventoría, es del 100%, según el informe de avance de obra acumulado al mes de diciembre y acta de liquidación presentado por el contratista, verificado en campo y validado por medio de las actas de recibo final de obra, que se anexa a la presente. En virtud de la cláusula anteriormente citada, se establece, el monto a recibir de ejecución de interventoría en la presente acta de recibo es de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 20.917.344,00), tal como se detalla en la siguiente tabla:

2. DESCRIPCION DEL COBRO

ACTA DE RECIBO FINAL			
DESCRIPCION	**VALORES CONDICIONES CONTRACTUALES**	**PORCENTAJE DE AVANCE (%)**	**VALOR TOTAL EN LA PRESENTA ACTA**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	$ 116.675.849	17,93%	$ 20.917.344,00
VALOR PROYECTO	**$ 116.675.849**		
TOTAL A PAGAR			**$ 20.917.344,00**

3. RELACIÓN FOTOGRÁFICA

A continuación, se presenta un resumen fotográfico el paso a paso del desarrollo y ejecución de las actividades de obra verificada por esta interventoría, en campo:












Ubicación y Replanteo red MT y BT





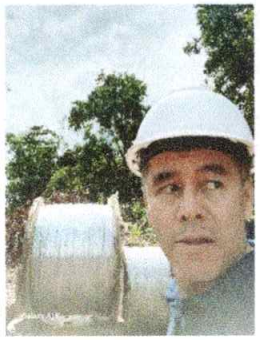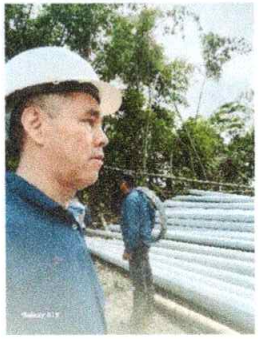










Verificación materiales





Personal de Obra






Hoyada, hincada y aplomada de postes



Vestida de estructuras e Instalación del Conductor

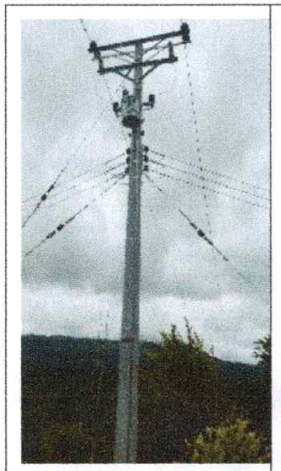


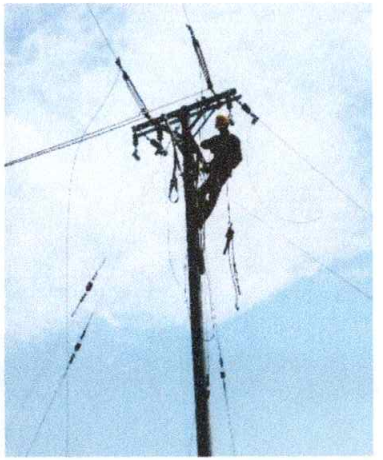NO-PCB

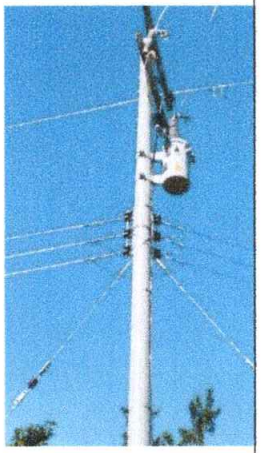

Montaje de Transformadores

***NOTA EXPLICATIVA*:** Se realizó la verificación del total de las actividades contratadas para la terminación a satisfacción de la infraestructura eléctrica registrada en el contrato de Obra referente a la Vda. del Rosario del municipio de San José del Fragua. La inspección de cada una de las estructuras construidas y el montaje de los equipos fue verificada en terreno de tal manera que se evidencio su ejecución cumpliendo las normas técnicas de construcción. Entre ellos, se verifica y se confirma el correcto montaje y construcción de cada una de las subestaciones en poste, de los vanos y longitudes de la red de media y baja tensión cumpliendo diseños y parámetros de seguridad, de los templetes e instalación de amortiguadores en la red de MT.

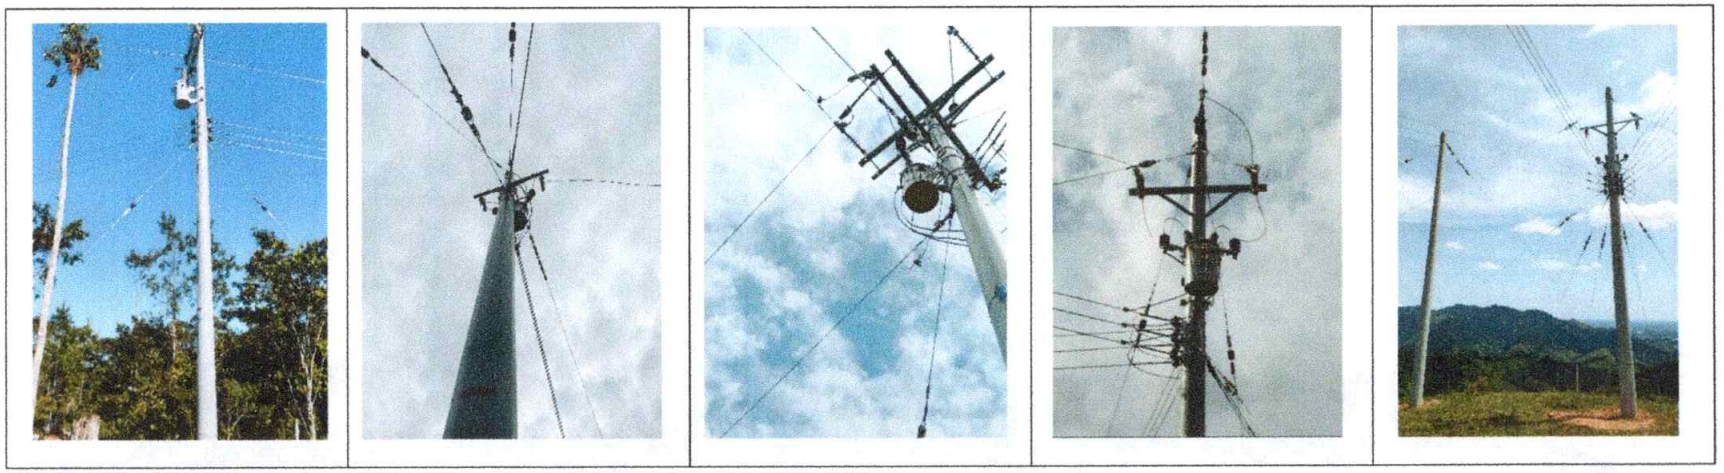Con lo anterior, se completa el 100% del avance del proyecto.

4. OBSERVACIONES:

Dentro de las actividades desarrolladas/ejecutadas y relacionadas con la presente acta, no se presentaron novedades ni observaciones relevantes que afectaran al desarrollo del proyecto.

5. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA:

- ✓ Factura electrónica de Venta
- ✓ Documento de Cámara de Comercio.
- ✓ Cedula del Representante Legal.
- ✓ RUT
- ✓ Certificado de Aportes de seguridad Social-documentos del contador
- ✓ Certificación Bancaria
- ✓ Liquidación de Planilla de aportes de Seguridad Social o Planillas pagadas (diciembre).
- ✓ Actas de liquidación de obra (Contratista de Obra)
- ✓ Acta de recibo final
- ✓ Informe de Interventoría de Pago Final.
- ✓ Tarjeta Profesional del Contador.
- ✓ Cédula del Contador.
- ✓ Certificado de antecedentes del contador.
- ✓ Cedula del Rep. Legal- MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC SAS
- ✓ Informe parcial de Interventoría (FCT-071)
- ✓ Informe ejecutivo del Contrato (FCT-073)
- ✓ Informe Acta de recibo parcial (FCT-84)

6. CONCLUSION:

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR, mediante la presente Acta final, recibe a satisfacción

todas y cada una de las obligaciones ejecutadas en el marco del proyecto. Por lo tanto, se avala el cumplimiento de las condiciones pactadas, y se da visto bueno para proceder con el respectivo pago.

Por la supervisión	Por el contratista
HERLEY SUÁREZ CUELLAR C.C. 17.656.668 Florencia (Caquetá) Secretario de Infraestructura –Gestor PDA	ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CÁRDENAS Rep. Legal MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ZOMAC S.A.S CC 1030.706.894 de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24
