ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	ACTA PARCIAL	VIGENTE DESDE	18/03/2020

MUNICIPIO DE MELGAR	PROYECTO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.: PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024	CONTRATO No	1017 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024
			VALOR CONTRATADO	$1.112.665.444,88
			VALOR ADICIONAL	N.A
	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	VALOR EJECUTADO ACTUAL	
			PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
			FECHA INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INTERVENTOR		FECHA SUSPENSION No 1	N.A
			FECHA REINICIO No 1	N.A
			FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	N.A
	CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P	FECHA ACTA DE REINICIO No 2	N.A
			FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	N.A
			FECHA PRESENTE ACTA	23/12/2024

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA 01		ACUMULADO ACTA 02		POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
I	**MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS**												
1.1	Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	Und	170,0	$ 171.757,51	$ 29.198.775,91	170,00	$ 29.198.775,91					0,00	$ -
1.2	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	Und	86,0	$ 1.059.448,15	$ 91.112.540,50	86,00	$ 91.112.540,50					0,00	$ -
1.3	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	Und	84,0	$ 1.259.449,10	$ 105.793.724,01	84,00	$ 105.793.724,01					0,00	$ -
1.4	Poste de 8 M 510 KGF	Und	5,0	$ 1.554.057,51	$ 7.770.287,53	5,00	$ 7.770.287,53					0,00	$ -
1.5	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	164,76	$ 242.464,46	$ 39.947.705,86	164,76	$ 39.947.705,86					0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 273.823.033,80**								**$ -**
II	**AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)**												
2.1	Excavacion de postes y retenidas	Und	30,0	$ 171.757,51	$ 5.152.725,16	3,00	$ 515.272,52	27,00	$ 4.637.452,64			0,00	$ -
2.2	Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 3.620.677,51	$ 3.620.677,51		$ -	1,00	$ 3.620.677,51			0,00	$ -
2.3	Suministro e instalacion de poste de 10 m 1050 kgf	Und	4,0	$ 2.964.423,51	$ 11.857.694,02		$ -	4,00	$ 11.857.694,02			0,00	$ -
2.4	Suministro e instalacion de poste de 10 m 750 kgf	Und	11,0	$ 2.508.437,51	$ 27.592.812,56	3,00	$ 7.525.312,52	8,00	$ 20.067.500,04			0,00	$ -
2.5	Suministro e instalacion de poste de 10 m 510 kgf	Und	14,0	$ 2.327.557,51	$ 32.585.805,07		$ -	14,00	$ 32.585.805,07			0,00	$ -
2.6	Pintura para poste	Und	30,0	$ 254.182,43	$ 7.625.472,76	3,00	$ 762.547,28	27,00	$ 6.862.925,48			0,00	$ -
2.7	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	13,0	$ 485.521,69	$ 6.311.781,91	13,00	$ 6.311.781,91		$ 0,00			0,00	$ -

2.8	Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Mts	1200,0	$ 195.298,30	$ 234.357.954,39	100,00	$ 19.529.829,53	1.100,00	$ 214.828.124,86			0,00	$ -
2.9	Suministro e instalacion de red de media tension	Mts	50,0	$ 228.434,68	$ 11.421.733,95	50,00	$ 11.421.733,95					0,00	$ -
2.10	Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0	$ 14.816.584,51	$ 14.816.584,51	1,00	$ 14.816.584,51					0,00	$ -
2.11	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 1.845.285,69	$ 1.845.285,69		$ -	1,00	$ 1.845.285,69			0,00	$ -
2.12	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 1050 kgf	Und	4,0	$ 1.845.285,69	$ 7.381.142,74		$ -	4,00	$ 7.381.142,74			0,00	$ -
2.13	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 750 kgf	Und	8,0	$ 1.845.285,69	$ 14.762.285,48		$ -	8,00	$ 14.762.285,48			0,00	$ -
2.14	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 510 kgf	Und	14,0	$ 1.845.285,69	$ 25.833.999,59		$ -	14,00	$ 25.833.999,59			0,00	$ -
2.15	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	10,0	$ 619.480,25	$ 6.194.802,45	10,00	$ 6.194.802,45					0,00	$ -
2.16	Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	40,0	$ 235.134,27	$ 9.405.370,61	40,00	$ 9.405.370,61					0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 420.766.128,41**								**$ -**
III	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**												
3.1	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera autorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	Glb	30,0	$ 462.854,92	$ 13.885.647,47	10,00	$ 4.628.549,16	20,00	$ 9.257.098,31			0,00	$ -
3.2	INSTALACION LUMINARIAS SODIO (70w,150w,250w) SEGUNDA	Glb	60,0	$ 214.136,84	$ 12.848.210,51	60,00	$ 12.848.210,51					0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 26.733.857,99**								**$ -**
IV	**VEHICULOS**												
4.1	Alquiler de Vehiculo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 93.126.666,33	$ 93.126.666,33	0,26	$ 24.197.999,90	0,70	$ 65.188.666,43			0,04	$ 3.740.000,00
4.2	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,0	$ 54.400.000,00	$ 54.400.000,00	0,30	$ 16.320.000,00	0,70	$ 38.080.000,00			0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 147.526.666,33**								**$ 3.740.000,00**
V	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**												
5.1	Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,0	$ 273.815.758,36	$ 273.815.758,36	0,18	$ 48.969.396,15	0,70	$ 191.671.030,85			0,12	$ 33.175.331,36
				COSTOS DIRECTOS	**$ 273.815.758,36**								**$ 33.175.331,36**

VI	ALUMBRADO NAVIDEÑO														
6.1	Alquiler, instalacion y puesta en marcha Alumbrado Navideño	Glo	1,0	$ 370.000.000,00	$ 370.000.000,00	0,10	$ 37.000.000,00	0,90	$ 333.000.000,00			0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 370.000.000,00								
	TOTAL OBRA				$ 1.512.665.444,88		$ 494.270.424,78		$ 981.479.688,73				$ 36.915.331,36

	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 1.512.665.444,88									$ -
	TOTAL OBRA					$ 1.512.665.444,88									$ -
	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							$ 494.270.424,78		$ 981.479.688,73					
	VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN							$ 494.270.424,78		$ 981.479.688,73					$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.112.665.444,88
VALOR ADICIONAL	$ 400.000.000,00
VALOR CONTRATO	$ 1.512.665.444,88
VALOR ANTICIPO	$ 756.332.722,44
VALOR ACTA N° 1	$ 981.479.688,73
VALOR ACTA N° 2	$ 494.270.424,78
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1	$ 490.739.844,37
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 2	$ 247.135.212,39
VALOR POR AMORTIZAR	$ 18.457.665,68
VALOR NETO CANCELADO ACTA PARCIAL N° 1	$ 734.344.476,34
VALOR NETO CANCELADO ACTA PARCIAL N° 2	$ 247.135.212,39
SALDO POR EJECUTAR	$ 36.915.331,36

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

ING. JHON FREDDY ZULUAGA BETANCOURTH
DIRECTOR TECNICO EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

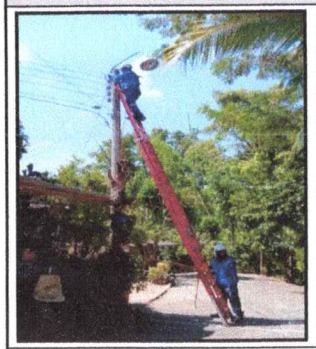
ING. DEIBY BEJARANO LEAL
Secretario Infraestructura y Desarrollo Físico
SUPERVISOR CONTRATO No. 1017 De Octubre Del

ING. SEBASTIAN HENAO MORALES
APOYO A LA SUPERVISON

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	1.1	DESCRIPCION ITEM: Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LA ESPERANZA MZ 3 CASA 21 -30318 - RP					2	2
ICACAL CLL 12 # 8 38 - 30585 - RP					4	4
VEREDA GUACAMAYA SECTOR AGUA FRIA - 30513 - RP					1	1
RESACAS CRA 52 - 30262 - MC					4	4
COLINA SECTOR LA GALLERA - 29949 - MC					1	1
LA SULTANA MZ R CASA 14 - 30551 -MC					5	5
RESACAS FERRETERIA - 30634 - MC					2	2
LA FLORIDA CLL 3 # 7 180 - 30606 - RP					3	3
VILLA CARMENZA - 30604 - RP					1	1
LAS PALMAS -30620- RP					9	9
LA ESPERANZA CASA 7 MZ 3 - 30247 - RP					1	1
LOS CAMBULOS MZ G CASA 11 - 30134 - RP					1	1
VERSALLES -30630 - YB					3	3
SICOMORO CRA 46 # 4 34 - 30300 - YB					1	1
				SUBTOTAL		38
				VIENEN		
				TOTAL		38

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

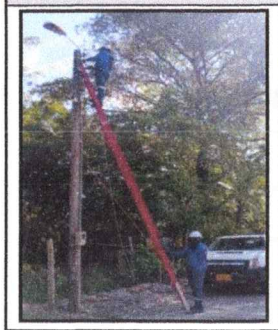
ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

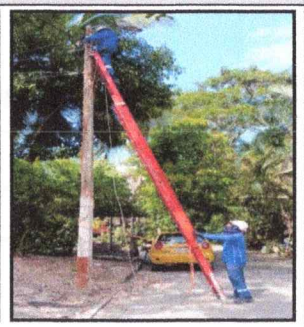
CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	1		MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS			
ITEM N°.	1.1		DESCRIPCION ITEM	Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
GALAN BRISAS - 30601 - JG				UND	1	1
GALAN BRISAS CRA 37 # 7 147 - 29947 - JG				UND	2	2
RESACAS CRA 50 # 5 40 - 30592 - JG				UND	1	1
GALAN ALTO CATARATAS - 30389 - MC				UND	6	6
GALAN ALTO CRA 37 # 12C 36 - 30017 - MC				UND	1	1
GALAN ALTO CATARATAS - 30390 - MC				UND	3	3
SICOMORO CLL 3 # 44 26 - 29986 - MC				UND	1	1
RESACAS - 29951 - MC				UND	1	1
ICACAL CRA 12 # 12 78 - 30517 - RP				UND	11	11
SICOMORO CRA 46 # 4 28 - 30136 - RP				UND	3	3
SAN MIGUEL CLL 15 # 8 09 - 30436 - RP				UND	1	1
VILLA SOFIA MF CASA 5 - 30036 - RP				UND	1	1
LAS VEGAS CLL 1 27 - 29901 - YB				UND	2	2
VEREDA EL SALERO TIENDA EL TURISTA Y YO - 30493 - JG				UND	2	2
				SUBTOTAL		36
				VIENEN		
				TOTAL		36

OBSERVACIONES:

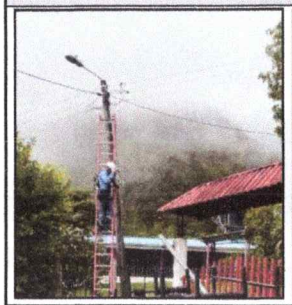
Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

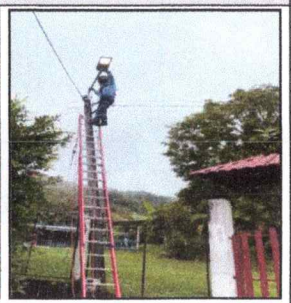
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	1.1	DESCRIPCION ITEM: Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SAN JOSE DE LA COLORADA - 29976 - JG				UND	2	2
LA LAGUNA SECTOR PARTE BAJA - 29884 - MC				UND	8	8
MIRADOR CRA 28 16 97 - 30589 - MC				UND	1	1
VEREDA CHIMBI -30368 - RP				UND	10	10
FLORIDA - 30672 - JG				UND	36	36
17 DE ENERO - 30662 - RP				UND	39	39

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	96
	VIENEN	
	TOTAL	96


Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY MARÉZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

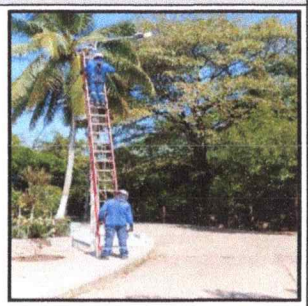
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	1.2	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
RESACAS CRA 50# 5 49 - 30592 - JG				UND	1	1
GALAN ALTO CATARATAS - 30389 - MC				UND	6	6
GALAN ALTO CR 37 # 12C 36 - 30017 - MC				UND	1	1
GALAN ALTO CATARATAS - 30390 - MC				UND	3	3
SICOMOROCLL 3 # 44 26 - 29986 - MC				UND	1	1
RESACAS FRENTE HOTEL LA CASCADA - 29951 - MC				UND	1	1
ICACAL CRA 12 # 12 78 - 30517 - RP				UND	4	4
VEREDA CHIMBI - 30555 - RP				UND	2	2
SICOMORO CRA 46 # 4 28 - 30136 - RP				UND	3	3
SAN MIGUEL CLL 15 # 8 09 - 30436 - RP				UND	1	1
VILLA SOFIA MZ F CASA 5 - 30036 - RP				UND	1	1
MIRADOR CRA 28 # 16 97 -30589 -MC				UND	1	1
VEREDA LA LAGUNA SECTOR PARTE BAJA - 29884 - MC				UND	6	6
SAN JOSE DE LA COLORADA SEGUNDO SECTOR - 29976 - JG				UND	2	2
VEREDA EL SALERO TIENDA EL TURISTA Y YO - 30493 - JG				UND	2	2
				SUBTOTAL		35
				VIENEN		
				TOTAL		35

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	1		MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS			
ITEM N°.	1.2		DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VEREDA CHIMBI - 30671 - RP				UND	2	2
VEREDA GUACAMAYAS - 30672 - RP				UND	1	1
FLORIDA - 30672 - JG				UND	33	33
17 DE ENERO - 30662 - RP				UND	15	15
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
				SUBTOTAL		51
				VIENEN		
				TOTAL		51

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

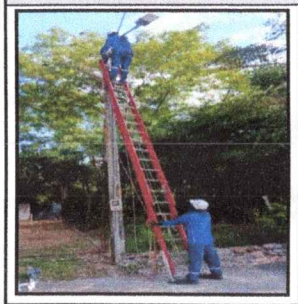
REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS	
ITEM N°.	1.3	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
RESACAS 52 - 30262 - MC				UND	4	4
LA COLINA SECTOR LA GALLERA CR 26 N 13 160 - 29949 - MC				UND	1	1
LA SULTANA MZ R CASA 14 - 30551 - MC				UND	5	5
RESACAS SECTOR CLUB DE LA POLICIA - 30634 - MC				UND	2	2
FLORIDA CLL 3 # 7 180 - 30606 - RP				UND	3	3
VILLA CARMENZA - 30604 - RP				UND	1	1
ICACAL CLL 12 # 8 78 - 30517 - RP				UND	8	8
LAS PALMAS - 30620 - RP				UND	5	5
VILLA ELISA PARTE ALTA MZ 8 CASA 7 - 30119 - RP				UND	1	1
LA ESPERANZA CASA 7 MZ 3 - 30247 - RP				UND	1	1
LOS CAMBULOS MZ G CASA 11 - 30134 - RP				UND	1	1
VERSALLES CRA 13C # 7C 54 - 30630 - YB				UND	3	3
SICOMORO CRA 46 # 4 34 - 30300 - YB				UND	1	1
VEREDA SAN JOSE DE LA COLORADA FINCA EL RODEO CASA 1 -				UND	1	1
				SUBTOTAL		37
				VIENEN		
				TOTAL		37

OBSERVACIONES:

Aprobo:

FIRMA

NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH

Cargo: DIRECTOR TECNICO

Elaboro:

FIRMA

NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ

Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:

FIRMA

NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

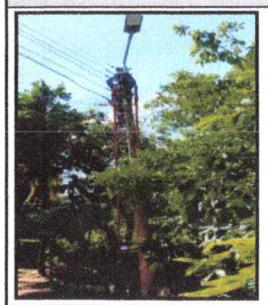
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	1		MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS			
ITEM N°.	1.3		DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			M	M	L			
		GALAN BRISAS - 30601 - JG				UND	1	1
		GALAN BRISA CR 37 # 7 147 - 29947 - JG				UND	2	2
		LAS VEGAS CLL 1 # 27 20 - 29901 - YB				UND	2	2
		VEREDA CHIMBI - 30368 - RP				UND	10	10
		VEREDA LA LAGUNA SECTOR PARTE BAJA - 29884 - MC				UND	2	2
		CALCUTA KM 17 -30651 - YN				UND	3	3
		FLORIDA - 30672 - JG				UND	12	12
		17 DE ENERO - 30662 - RP				UND	15	15
						SUBTOTAL		47
OBSERVACIONES:						VIENEN		
						TOTAL		47

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

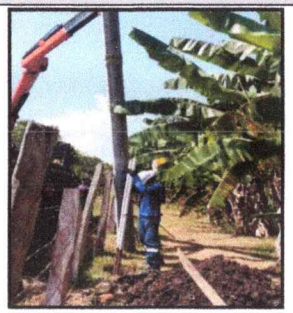
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	
ITEM N°.	1.5	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VEREDA CHIMBI - 30555 - RP				UND	2	2
VEREDA CHIMBI - 30671 - RP				UND	2	2
VEREDA GUACAMAYAS - 30672 - RP				UND	1	1
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
				SUBTOTAL		5
				VIENEN		
				TOTAL		5

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

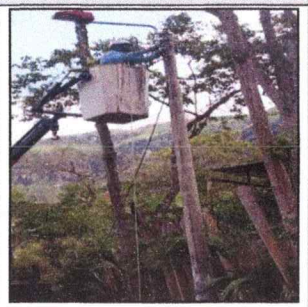
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	1		MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS			
ITEM N°.	1.4		DESCRIPCION ITEM	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	VEREDA CALCULTA - 30178 - RP				ML	26	26
	VEREDA CHIMBI - 30555 - RP				ML	90	90
	VEREDA CHIMBI - 30671 - RP				ML	48,76	48,76
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		164,76
					VIENEN		
					TOTAL		164,76

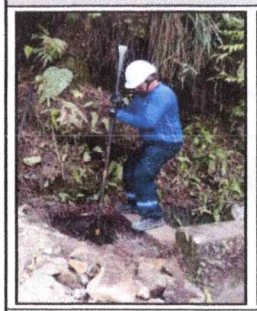
Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.1	DESCRIPCION ITEM: Excavacion de postes y retenidas	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30655 - YN				UND	3	3
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		3
					VIENEN		
					TOTAL		3

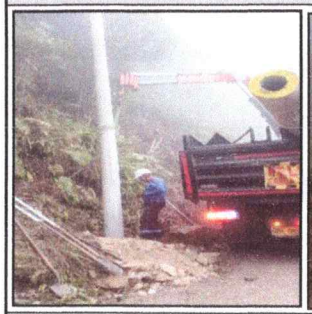
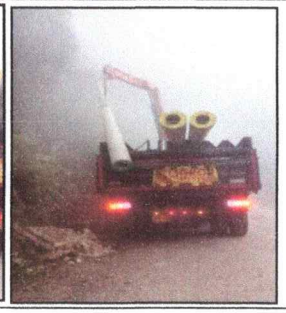
Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.4	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de poste de 10 m 750 kgf	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30656 - YN				UND	3	3
					SUBTOTAL		3
OBSERVACIONES:					VIENEN		
					TOTAL		3

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.6	DESCRIPCION ITEM: Pintura para poste	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30657 - YN				UND	3	3
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		3
					VIENEN		
					TOTAL		3

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESE NTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		abr-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.7	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de estructura para retención	UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30658 - YN				UND	13	13
					SUBTOTAL		13
OBSERVACIONES:					VIENEN		
					TOTAL		13

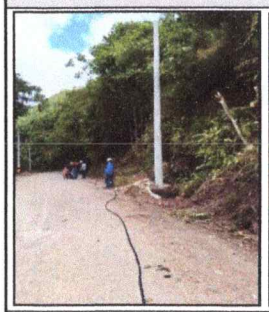
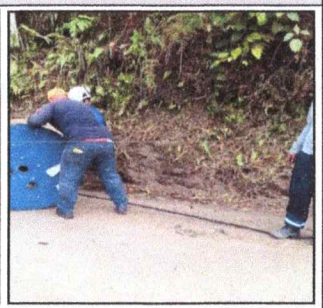
Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.8	DESCRIPCION ITEM: Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	UND / UND

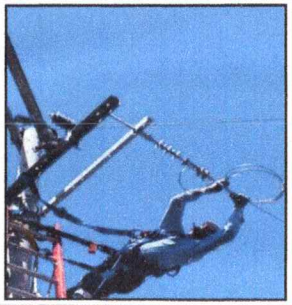
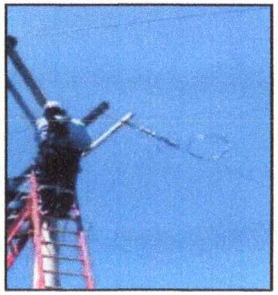
PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30659 - YN				ML	100	100
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		100
					VIENEN		
					TOTAL		100

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESE NTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.9	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de red de media tension	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30660 - YN				ML	50	50
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					SUBTOTAL		50
OBSERVACIONES:					VIENEN		
					TOTAL		50

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.10	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30660 - YN				UND	1	1
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		1
					VIENEN		
					TOTAL		1

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO

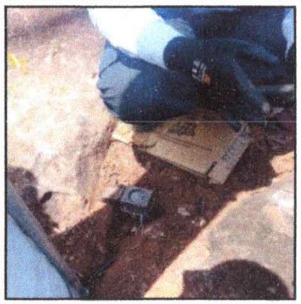
Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		abr-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.15	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30661 - YN					10	10
					SUBTOTAL		10
OBSERVACIONES:					VIENEN		
					TOTAL		10

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	2	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)	
ITEM N°.	2.16	DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	UND


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	CALCUTA KM 17 -30659 - YN				UND	40	40
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					SUBTOTAL		40
OBSERVACIONES:					VIENEN		
					TOTAL		40

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	3	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
ITEM N°.	3.1	DESCRIPCION ITEM	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Mancjo de UND UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	Barrio Rojas Pinilla / 29929				UND	3	3
	Barrio Galan Polideportivo / 30013				UND	3	3
	Barrio Florida / 29843				UND	1	1
	Barrio Galan / 29875				UND	1	1
	Barrio Galan / 29856				UND	2	2
					UND	0	0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
					UND		0
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		10
					VIENEN		
					TOTAL		10

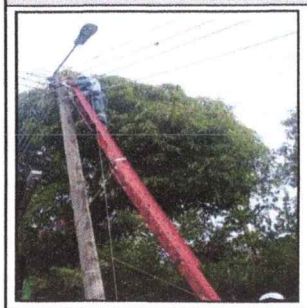
APROBO: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

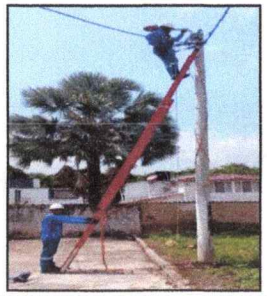
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	3	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
ITEM N°.	3.2	DESCRIPCION ITEM: INSTALACION LUMINARIAS SODIO (70w,150w,250w) SEGUNDA	UND / UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
FLORIDA - CRA 14 # 6- 35 - 30154 - RP				UND	1	1
VIA AL CARMEN SECTOR EL EDEN - 30200 - RP				UND	1	1
LA Y ENTRADA LA PAZ - 29347 - RP				UND	5	5
ROJAS PINILLA - 29142 - RP				UND	1	1
VIA AL CARMEN - 30201 - RP				UND	4	4
LA LAGUNA - 30220 - RP				UND	1	1
RESACAS - 29660 - RP				UND	4	4
SANTA BARBARA MZ T LOTE 1 - 302116 - MC				UND	1	1
PLAZA DE MERCADO CLL 5 CON CRA 7 - 30157 - JG				UND	1	1
GALAN ROJAS DIAGONAL 12 Nº 13 - 140 - 30431 - JG				UND	1	1
LA SULTANA MZ 12 - 30429 - JG				UND	4	4
LA LAGUNA PARTE ALTA - 30367 - JG				UND	4	4
LA COLINA CRA 26 # 09 - 30 - 30183 - YB				UND	2	2
LA LAGUNA -30087 - YB				UND	5	5
				SUBTOTAL		35
				VIENEN		
				TOTAL		35

OBSERVACIONES:

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTE GRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	51	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	3		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
ITEM N°.	3.2		DESCRIPCION ITEM	INSTALACION LUMINARIAS SODIO (70w,150w,250w) SEGUNDA	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	LA SULTANA - 30359 - YB				UND	4	4
	VEREDA GUACAMAYA - 30271 - YB				UND	1	1
	LA ESPERANZA MZ 3 CASA 21 - 30318 - RP				UND	2	2
	VEERDA GUACAMAYA - 30582 - RP				UND	4	4
	ICACAL CLL 12 # 8 38 - 30585 - RP				UND	4	4
	SANTA BARBARA CASA 5 MZ P PARTE ALTA - 29325 - RP				UND	4	4
	VEREDA GUACAMAYA - 30513 - RP				UND	1	1
	BARRIO ROJAS PINILLA SECTOR SALIDA DEL MURO - 30376 - JG				UND	1	1
	LA COLINA CONDOMINIO ACARITAMA - 30489 - JG				UND	4	4

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	25
	VIENEN	
	TOTAL	25

Aprobo:
FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
Cargo: DIRECTOR TECNICO.

Elaboro:
FIRMA
NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ
Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.

REVISO:
FIRMA
NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION


ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS FSPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTE GRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	4		VEHICULOS			
ITEM N°.	4.1		DESCRIPCION ITEM	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	VEHICULOS					0,30	0,30

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0,30
	VIENEN	
	TOTAL	0,30

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	4		VEHICULOS			
ITEM N°:	4.2		DESCRIPCION ITEM	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	VEHICULOS					0,30	0,30

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0,30
	VIENEN	
	TOTAL	0,30

Aprobo: FIRMA NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION



ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESE NTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	5		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
ITEM N°.	5.1		DESCRIPCION ITEM	Gastos Administrativos y Organizacionales	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	Gastos Administrativos y Organizacionales				UND	0,3	0,30

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0,30
	VIENEN	
	TOTAL	0,30


Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ES TABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESE NTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	1017	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO		dic-24
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	6		ALUMBRADO NAVIDEÑO			
ITEM N°.	6.1		DESCRIPCION ITEM	Alquiler, instalacion y puesta en marcha Alumbrado Navideño	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	Alquiler, instalacion y puesta en marcha Alumbrado Navideño				UND	UND	0,10

SUBTOTAL		0,10
VIENEN		
TOTAL		0,10

OBSERVACIONES: De acuerdo con la Circular No. 05 del 26 de diciembre de 2024, expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal, y con el fin de cumplir con el cierre presupuestal correspondiente, la Empresa se compromete a realizar el pago del contrato una vez que se haya cumplido con los plazos y obligaciones específicas establecidas.

En este sentido, se aclara que, aunque el plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024, algunas actividades, por su naturaleza, deberán ejecutarse hasta el primer mes de 2025, como es el caso del desmonte del alumbrado navideño. Por lo tanto, el pago correspondiente se efectuará una vez que se haya presentado el último informe que acredite el cumplimiento total de las actividades estipuladas en el contrato.

El plazo de ejecución se considera cumplido en el momento en que se haya realizado la causación respectiva de las cuentas y se verifique que las obligaciones han sido totalmente cumplidas. Esto garantizará el cumplimiento de todas las disposiciones contractuales y el respectivo pago, conforme a lo establecido en la mencionada circular.

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA
