Compañía de Ingeniería Sanitaria

La solución efectiva

CERTIFICACION No.167-2024

NIT: 890.319.290-1

Certifica a:

COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA S.A.S.

NIT: 890.319.290-1

Carrera 39 #11-166 ACOPI- YUMBO Tel. 317 438 8324

Por la **Disposición Final** y **Aprovechamiento** de Residuos de Construcción y Demolición – **RCD-tierras de excavación** en el predio Parque Ambiental PTAL El Cortijo en el municipio de Yumbo (V).

Volumen	**OCHO (8) m3**
Procedencia	**Carrera 38 entre Calles 12A y 13 ACOPI-YUMBO**
Transportador	**CODINSA** **Placas: CEA 751**
Fecha Disposición	diciembre 21 de 2.024.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 21 de diciembre de 2.024 para ser presentada ante la Autoridad Ambiental, según consta en el cupón No. 0014885 de 8m3, **por un total de 8 m3;** disposición emitida por **CODINSA S.A.S.**

Codinsa
Nit: 890.319.290-1

Administración: Ing. Vladimir Arce

Disposición Final: Luis Fernando Marín

Autorización Ambiental aprobada por la CVC mediante Resolución 0710 No. 0713-02476 de Dic.28 del 2.023.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="5">TIPO DE CONTRATO
Contrato de Obra
SELECCION ABREVIDA MENOR CUANTIA

No PROCESO: SAMC-SI-004-2024</td><td colspan="2">INFORME DEL SUPERVISIÓN:</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:
LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE ,SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">No. CONTRATO:
180-10-06-005-2024.

Vereda: 0

Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Id tramo
0</td><td>FECHA DE INFORME:

20 DE DICIEMBRE DEL 2024</td><td>NUMERO DE INFORME:

2-2024</td></tr>
<tr><td>INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td>FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VIVIANY ORTIZ RICO</td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CODINSA S.A.S.
Gerente
Hugo Duran Pérez
C.C.16.781.993
Ingeniero Sanitario
Matricula Profesional No.
7623767513VLL</td><td>ID Contratista

NIT. 8903192901</td><td>Estado

2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
</table>

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

Razón social nuevo contratista	**ID nuevo contratista**	**Origen de recursos** 10 - RECURSOS PROPIOS	
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	**LINK SECOP** **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index**		
NUMERO PÓLIZA	Responsabilidad civil extra contractual CO1.WRT.15693959, CO1.WRT.15685779, CO1.WRT.15685779 Cumplimiento del contrato CO1.WRT.15686058	**ASEGURADORA NIT**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860.524.654-6

LOCALIZACION DE LA OBRA		
Latitud	**Longitud**	Fin cr 37 cl 15 1. 3.49386 2. -76.50887
Numero vértice	1,2	
Inicio cr 37 cl 12A 1 3.49683 2 -76.5158	Inicio cr 39 cl 12A 1. 3.49397 2. -76.51646	Fin cr 39 cl 15 1. 3.49203 2. -76.50967
Sector ACOPY Y CENCAR	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 202476820063

SEGUIMIENTO FISICO
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): LAVADO ES DEL 44,89% Y EN INSPECCIÓN 44,89%
% AVANCE FISICO EJECUTADO: LAVADO ES DEL 48% Y EN INSPECCIÓN 22%
SEGUIMIENTO FINANCIERO
VALOR CONTRATO (PESOS): **$529.734.749,00**
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 0,00**
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 35,15%

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**	
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**	
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$529.734.749,00**	
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$530.000.000,00**	
VALORCONTRATO INICIAL: **$529.734.749,00**	
VALOR CONTRATO FINAL: **$529.734.749,00**	
DESARROLLO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO:	**2024-11-25**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2024-12-25**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2024-12-31**
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2024-12-31**
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
HITOS: CER0O (0)	
FECHA DE HITO: NO APLICA.	
DETALLE HITO: NO APLICA.	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): UNA (1)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	NO APLICA
CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	una (1)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

TIEMPO DE PRORROGAS	Seis (6) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ÚLTIMA PRORROGA: 18 de diciembre de 2024	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	

PLAN DE ACCION

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

1. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de las redes sanitarias del municipio de Yumbo.

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV formulado para la zona industrial, contiene el programa para la optimización de redes y estructuras marginales a la fuente receptora. En el desarrollo de dicho programa se establece la necesidad de ejecutar proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado.

El proyecto surge a raíz de la problemática planteada en las anteriores y en la actual administración por los empresarios de la zona de ACOPI, en cuanto al deterioro y mal estado de las vías y su apoyo económico para su rehabilitación y mejoramiento. Esta situación, conllevo a

la intervención de la Alcaldía a través del personal técnico e idóneo de la secretaria de Infraestructura y Servicios públicos, de sustentar , y evidenciar la problemática para definir la intervención de varias vías deterioradas, las cuales se encuentran dañadas en su estructura , producto infiltraciones causadas por las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

El deterioro y mal estado las actuales vías de los sectores de ACOPI y CENCAR han ocasionado accidentes y demoras en la movilidad; La Secretaría de Infraestructura, con la intervención del alcantarillado con el lavado, inspección y reparación puntual busca beneficiar a más de 24 empresas, con más de 300 trabajadores, que utilizan las vías del sector; por tal motivo es importante que se realice este tipo de obra para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y empresarios del sector, encaminado en mejorar la economía de los usuarios con la reducción de tiempos de traslado de mercancía y movilidad de trabajadores , mejorando la eficiencia en el sector.

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

Por otra parte, el Municipio de Yumbo mediante el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR AYUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA", tiene como indicadores producto los siguientes:

Indicadores	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Alcantarillados optimizados.	Metros lineales	8	Optimizar 12 acueductos e intervenir 10 sistema de alcantarillado en el municipio, tanto en la zona urbana como rural

Con la ejecución de este proyecto se hará la limpieza e inspección de en 4.673 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 15", 18", 21", 27, 36" y 55" en el sector de ACOPI y 976 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 30", 36", 42", y 1,2 m en el sector de CENCAR.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

El Capítulo 5 De La Finalidad Social del Estado y de Los Servicios Públicos Artículo 365 de la Constitución Política, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Dicha norma se complementa con el mandato del 366 que establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de conformidad con el artículo 3º de la ley 80 de 1993 "*los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

Se demuestra entonces, que los servicios públicos constituyen una finalidad esencial del Estado para proteger y garantizar otros derechos fundamentales en conexidad con la vida, como son la salud, el derecho al saneamiento ambiental y al agua potable.

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de Infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de la infraestructura vial municipal en la zona rural, urbana e industrial, a través de actividades de Mejoramiento y Rehabilitación.

Con relación al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR A YUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA" **El Propósito:** Yumbo Productivo tiene como propósito mejorar la articulación entre la población, la economía y el territorio en el Municipio de Yumbo.

ESTRATEGIA; Mediante procesos de participación para el Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico. SUBPROGRAMA:. Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

METAS PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE
Lavado e inspección de 5.655,73 metros lineales de alcantarillado para verificar si está en malas condiciones	Número de metros lineales lavados e inspeccionados	5.655,73 m

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo cumplirá su objetivo con el contrato No. 180-10-06-005-2024.

La prioridad de la intervención en las vías por medio del mejoramiento que comprende el presente proceso viene dada por la situación de deterioro de pavimento y su estructura de base, además de la realización de lavado e inspección y arreglo puntual de ser necesario en la reposición de las redes de alcantarillado, las cuales son antiguas y que se deben ajustar a la resolución 799 de 2021 del REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Con la ejecución de este proyecto se felicitará la intervención de vías en pavimento flexible, y en la rehabilitación redes de alcantarillado en PVC.

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 180.10.06.005.2024		
VALOR	**$529.734.749,00**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$186.223.546,00
SALDO		$ 343.511.203,00
SUMAS IGUALES	**$529.734.749,00**	**$529.734.749,00**

Nota: el acta parcial No. 1 está en trámite.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
1,6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	36"	ML	259,7	90,27	90,27
1,7	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	18"	ML	253,1	253,07	
1,8	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	55"	ML	86,3	170,78	170,78

1,9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15	15"	ML	226,4	226,39	
1,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	15"	ML	84,9	84,94	
1,11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	21"	ML	53,1	53,14	
1,12	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13	12"	ML	261,6	261,57	261,57
1,13	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	15"	ML	166,2	166,23	166,23
1,14	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	18"	ML	83,0	82,97	82,97
1,15	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	15"	ML	1,15	178,70	36,83
1,16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	18"	ML	77,0	77,00	
1,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	36"	ML	14,1	11,64	11,64
1,21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 38-39	18"	ML	103,8	103,75	103,75
1,22	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 37-38	27"	ML	103,5	103,75	
1,23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	ML	106,0	103,50	

Estos ítems fueron actualizados acorde a las actividades ejecutadas en el sector ACOPI, durante la ejecución del contrato se encontró en la inspección diferencias de los diámetros de las tuberías del contrato con los diámetros de los planos de redes de alcantarilladlo existente suministrados por la ESPY y por EMCALI y las condiciones reales evidenciadas en la investigación y diagnóstico en sitio, de ias tuberías.

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	16"	ML		243,6	243,6
4,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	21"	ML		228,3	228,3
4,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	15"	ML		136,0	136,0
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	21"	ML		257,6	257,6
4.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		68,7	68,7
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 39-40	12"			102,7	102,7
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	12"			85,2	85,2

Una vez realizada la inspección de la tubería de Hormigón simple de 15" en la Carrera 38 entre calles 12A -13, se encontró que presentaba asentamiento y deterioro de un tramo de 5 m, lo que hace necesario debido al alto tráfico vehicular de vehículos pesados, mulas y camiones de transporte, realizar la reparación del tramo. El detalle de los ítems y las cantidades de obra acorde a los precios de la Gobernación del Valle Decreto 1.22-1441 del 14 de agosto de 2024 tomado de la Gaceta Departamental del 16 de agosto de 2024 y en cuanto al precio de retiro de material, el contratista presenta el APU.

CODIGO	NO PREVISTOS	UND	CANT
80107	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA 1,8 M SR	m3	13,50
APU	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA DISTANCIAS > 10 KM	m3	17,55
100616	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO	m3	4,64
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO - RANA	m3	8,78
80201	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR SIN TRANSPORTE	m3	7,02
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14" A 24"	ML	5,00
100623	ACARRRERO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M	m3	20,44
20307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 15" UNION CAUCHO	ML	5,00
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CM 250 MTS	UND	1,00

5.DESARROLLO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los municipios, según lo disponen los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3-5 de la Ley 136 de 1994 y 5-1 de la Ley 142 de 1994. Los artículos 365 a 370 CP tratan de los derechos colectivos a acceder a la infraestructura de servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna. Los servicios públicos son inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que son finalidades sociales del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De esta manera, el municipio de Yumbo, mediante resolución SSPD – 20184010116845 de 2018 se encuentra certificado en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1176 de 2007 y lo reglamentado en el Artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015". El municipio no cuenta con los equipos requeridos y el personal calificado para La reparación de redes de alcantarillado sin apertura de zanja mediante la instalación de una tubería especial para el sellado y estanco de filtraciones en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, para el sector comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39, de la zona industrial de ACOPI, Carrera 20E entre calles 13 y 14 y Carrera 20D, 20E , 20G entre Calles 14 Y 15, de la zona de CENCAR municipio de yumbo


INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA del periodo comprendido entre al 20 de noviembre del 2024 al 18 de diciembre del 2024, el avance de ejecución corresponde a CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($186.223.546,00). equivalente a 35,15%, en los cuales se estipulan las siguientes consideraciones: avance físico del contrato de obra en lavado es del 46% y en inspección 36%, ejecución en cumplimiento del objeto contractual, especificaciones, presupuesto y con las determinaciones que se toman y se hacen cumplir durante la ejecución del contrato de obra No. 180.10.06.001.2024 cuyo objeto limpieza, investigación con CCTV y reparación de redes en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, del sector comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39,mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20d entre calles 14 y 15, carrera 20e entre calles 13 y 15, carrera 20g entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo.

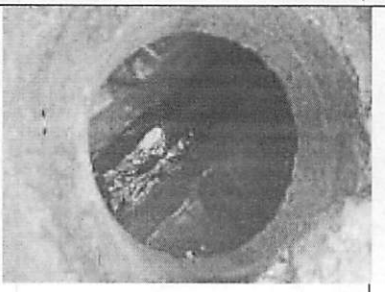
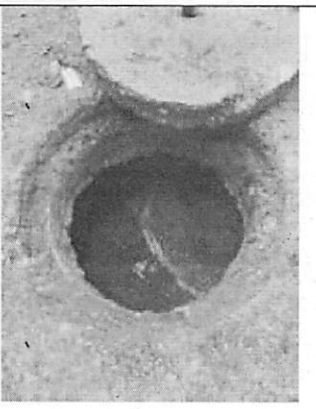

Se recomienda intervenir la tubería con raíces con equipo de corte para retirar raíces y tuberías de conexiones domiciliarias entre otros elementos, para poder completar la investigación del estado interno de las tuberías.
Se sugiere incrementar la frecuencia de los mantenimientos preventivos de las redes, además la limpieza de las vías públicas que estén libres de sólidos, a fin de evitar que los residuos ingresan al sistema de alcantarillado, provocando sedimentación y taponamientos de las tuberías

Se informará a las entidades competentes de Secretaria de Gobierno y Secretaria de Ambiente la situación de vertimiento de hidrocarburos lavadero CAPUL en la cr 38 #14-35, y cr 39 entre cl 13-14, sector de ACOPI Municipio de Yumbo, para que se lleve a cabo el proceso de investigación y sancionatorio si es el caso.

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL: **VIVIANY ORTIZ RICO** PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	**FIRMA:** 

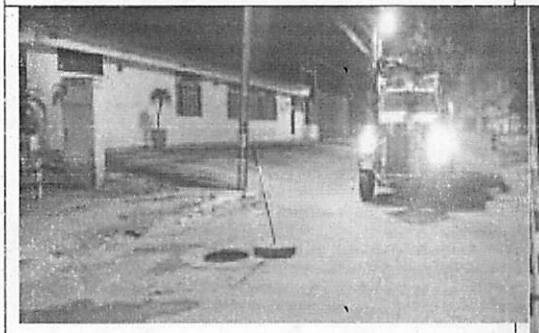
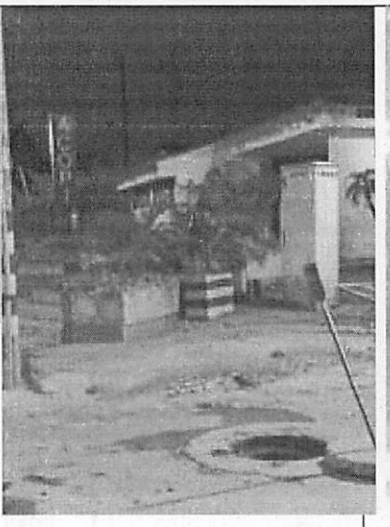
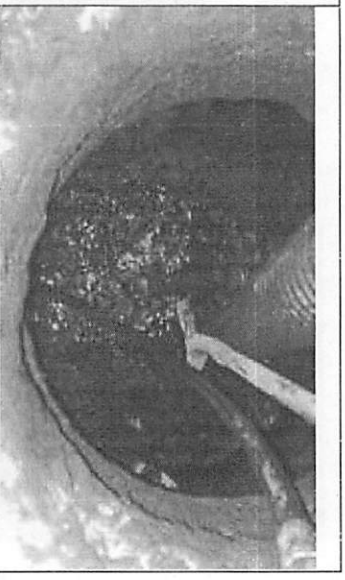
INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO LAVADO E INSPECCION

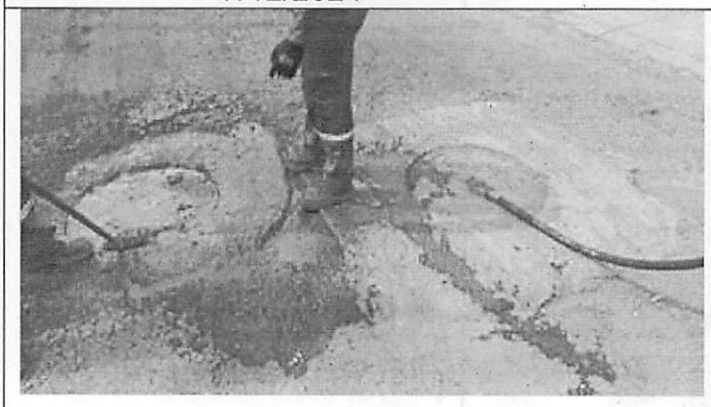
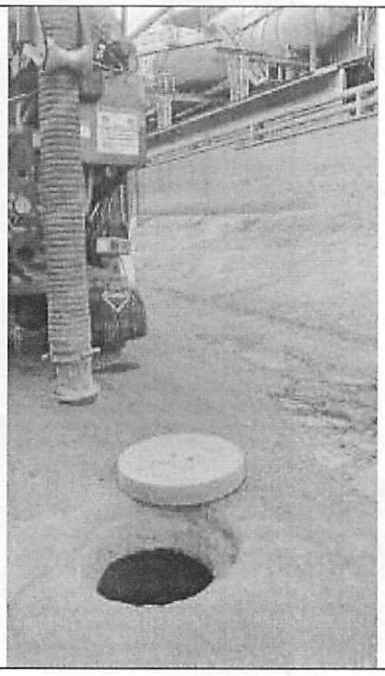
<table>
<tr><td>25/11/2024</td><td colspan="2">Cl 12A entre cr 38-39 Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones optimas</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28/11/2024</td><td>cr 38 cll 12A -13</td><td rowspan="2">Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones optimas</td></tr>
<tr><td>28/11/2024</td><td>cr 39 cll 12A -13 der via</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

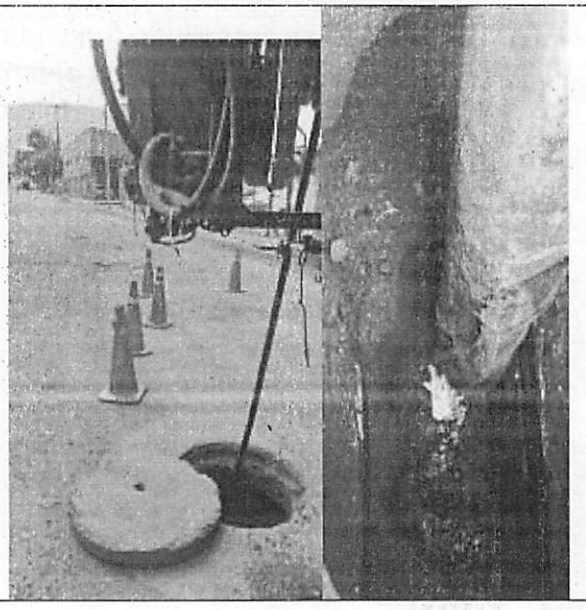
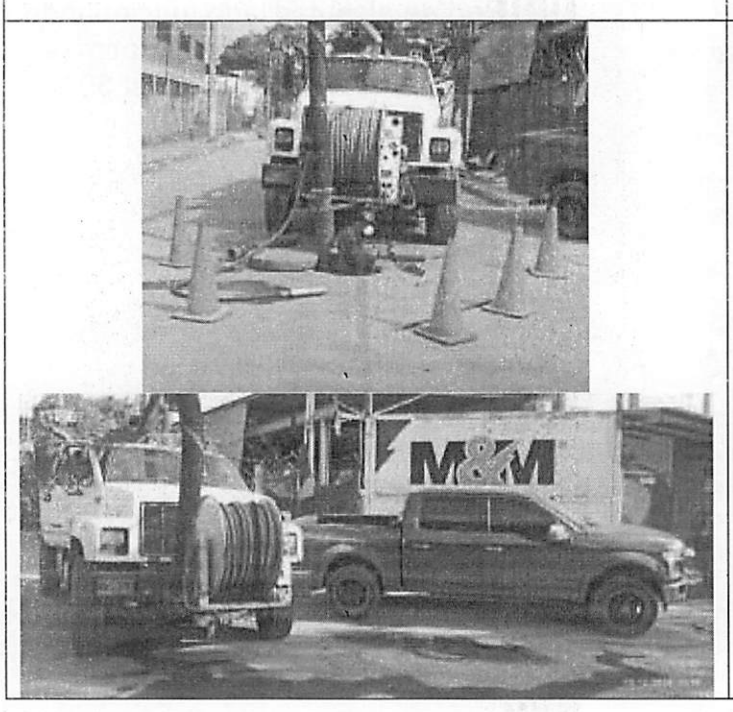
29/11/2024`	cr 39 cll 12A -13	
	Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones óptimas, presenta acometidas penetrantes	
4/12/2024	cr 39 cll 13-14 Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones optimas, presenta cámaras ocultas agua residual con lodos, limadura de acero e hidrocarburos	
		

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

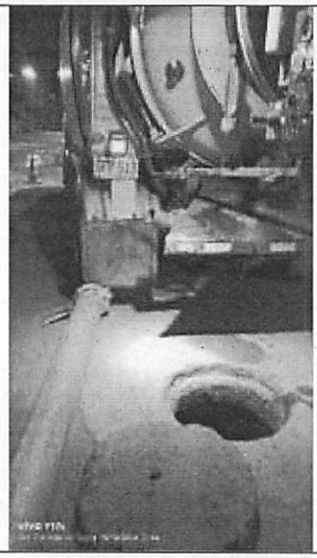
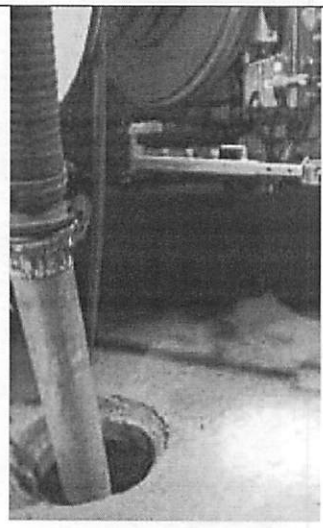
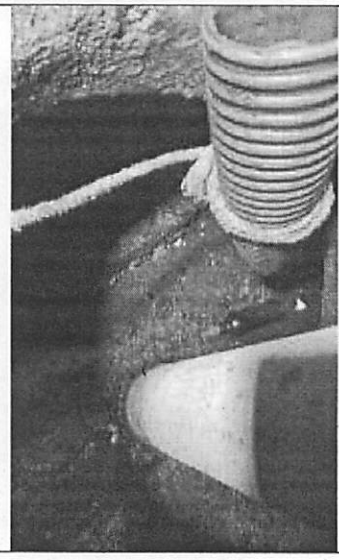
7/12/2024	cr 38 cll 13-14
 	Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones optimas, presenta tapas dañadas en la calle 13 lado izquierdo de al vía y en la calle 14 presenta nivel de agua al 50%
8/12/2024	cr 37 cll 12 -13 izq canal
	Red de alcantarillado funcionando normal, en condiciones optimas, presenta nivel de agua al 50%

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

9/12/2024	cr 39 cll 14 -15 izq
	Red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tubería,
10/12/2024	Cra 39 entre 14 y 15 Red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tubería
	

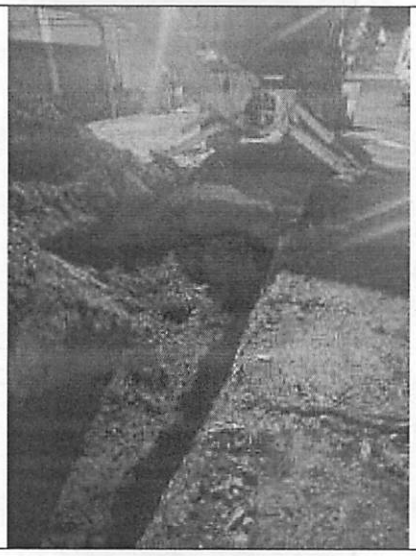
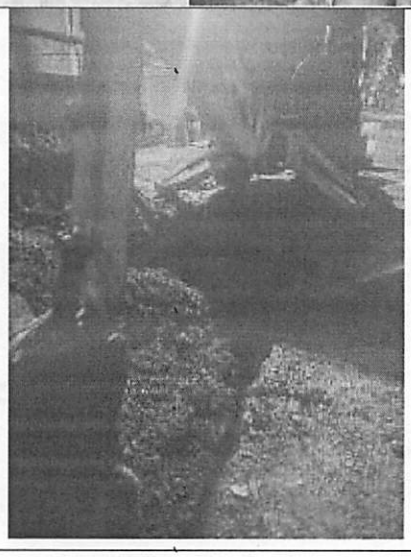
INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

10/12/2024 Cl 12A entre cr 37-38 10/12/2024 Cl 12A entre cr 37-38	Red de alcantarillado funcionando optimo, presenta raíces
	
11/12/2024 cr 39 cll 14 -15 der	Red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tubería
	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

16/12/2024 cr 38 cll 14-15	Red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tubería, se evidencian lodos, y aguas hidrocarburadas
	
16/12/2024 cr 38 cll 13-14	Red de alcantarillado funcionando arrastras interno Evidencia pedazos de tubo
	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

18/12/2024 cr 38 cll 12A-13 frente a CIDELPA	Reemplazo de tubería achatada L=5 m
	
	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 04/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr
04/12/2024		En seco		1
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243128

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0103	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	40,00
Situación		Manhole Final	0001CC0104	Longitud inspeccionada [m]	39,81
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	Evaluación de rutina
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	

1.295	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0103				
	0.80	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	6.77	FC	Fractura Circular de 12 en punto a 12 en punto, junta	2
	12.37	FC	Fractura Circular de 12 en punto a 12 en punto, junta	2
	18.45	FM	Fractura Múltiple de 12 en punto a 12 en punto, junta	4
	25.45	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	27.46	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	28.29	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	30.48	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	31.44	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	32.35	CM	Grieta múltiple de 12 en punto a 12 en punto, junta	3
	34.18	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	37.21	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1
	40.61	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 3 en punto, 150mm diá, 127mm intrusión, junta, 10% del área de corte transversal	5
	40.61	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / TBI	
0001CC0104				
	40.00		Fin de la Tubería	




AMH @ 0,80 m



AMH @ 0,80 m



FC @ 6,77 m


FC @ 6,77 m


FC @ 12,37 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Climo	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				20
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243128

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0103	Longitud de tubería [m]	0
Calle	CLL 12A ENTRE KR 39 Y 40	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	37,69
Situación		Manhole Final	C1	Longitud inspeccionada [m]	37,69
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 450mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	

1:278

m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.00	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
0.18	FC	Fractura Circular de 7 en punto a 6 en punto	2
0.28	S01 FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
2.77	F01 FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Acabado	3
2.77	S02 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
10.25	F02 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
37.69	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 3 en punto, 150mm diá, 100mm intrusión	5
37.69	DSGV	Depósitos Asentados Gravilla,, 30% del área de corte transversal de 4 en punto a 8 en punto	4
37.69	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / DSGV	



AMH @ 0,00 m



MWL @ 0,00 m



FC @ 0,18 m



FL @ 0,28 m



CL @ 2,77 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 05/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
05/12/2024		En seco		5
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243155

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0104	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	16,94
Situación		Manhole Final	0001CC0105A	Longitud inspeccionada [m]	16,94
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	Evaluación de rutina
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	


1:125 m + Op Código Incidencia Observaciones Grade



0.03	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION		
1.16	FC	Fractura Circular de 12 en punto a 12 en punto, junta	2	
2.19	FC	Fractura Circular de 12 en punto a 12 en punto, junta	2	
3.18	FC	Fractura Circular de 12 en punto a 12 en punto, junta	2	
4.14	CC	Grieta circunferencial de 12 en punto a 12 en punto, junta	1	
9.03	MWL	Nivel de agua, 10% del área de corte transversal / AUMENTO NIVEL DE AGUA		
11.78	FM	Fractura Múltiple de 11 en punto a 1 en punto, junta	4	
12.01	D	Deformación, 15% cambiado / DEFORMACION RIGIDA	4	
13.81	FM	Fractura Múltiple de 7 en punto a 9 en punto, junta	4	
14.30	B	Rotura de 12 en punto a 2 en punto, junta	4	
14.71	FM	Fractura Múltiple de 7 en punto a 9 en punto, junta	4	
14.72	FM	Fractura Múltiple de 2 en punto a 5 en punto, junta	4	
16.79	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá, junta		
16.97	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / ACOMETIDA NO PERMITE EL PASO		
16.94		Fin de la Tubería		



AMH @ 0,03 m


FC @ 1,16 m



FC @ 2,19 m



FC @ 3,18 m



CC @ 4,14 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024


Fecha	Cámara	Climo	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				15
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0105	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	4,23
Situación		Manhole Final	0001CC0105A	Longitud inspeccionada [m]	4,23
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:50 m + Op Código Incidencia Observaciones Grade


0001CC0105A




0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.01	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
0.61	RFJ	Raíces Finas en la junta en 3 en punto, junta	1
3.38	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
3.38	RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
4.23	OBZ	Otros Obstáculos,, 40% del área de corte transversal de 3 en punto a 9 en punto / BASURA	5
4.23	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / OBZ	




AMH @ 0,00 m




MWL @ 0,01 m



RFJ @ 0,61 m



TB @ 3,38 m



RFL @ 3,38 m

F

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				16
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0105	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	4,51
Situación		Manhole Final	0001CC0106	Longitud inspeccionada [m]	4,51
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:50 m + 0001CC0105

Op	Código	Incidencia	Observaciones	Grade
0.00	AMH		CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.22	RFJ		Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 2 en punto, junta	1
2.06	RFJ		Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta	1
3.05	RFJ		Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta	1
4.11	RFJ		Raíces Finas en la junta de 2 en punto a 5 en punto, junta	1
4.51	RBJ		Raíces Bola en Junta en 3 en punto, 55% perdido, junta	4
4.51	MSA		INSPECCION TV ABANDONADA / RBJ	



AMH @ 0,00 m



RFJ @ 0,22 m


RFJ @ 2,06 m


RFJ @ 3,05 m



RFJ @ 4,11 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 04/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
04/12/2024		En seco		3
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243128


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0105A	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	5,03
Situación		Manhole Final	0001CC0104	Longitud inspeccionada [m]	5,03
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	Evaluación de rutina
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	

1:50	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0104				
	0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	0.06	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 2 en punto, 150mm diá, 75mm intrusión, junta, 5% del área de corte transversal	5
	4.76	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá, junta	
	5.03	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / TB	



AMH @ 0,00 m


TBI @ 0,06 m



TBA @ 4,76 m



MSA @ 5,03 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				22
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0105A	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	12,42
Situación		Manhole Final	0001CC0105	Longitud inspeccionada [m]	12,42
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:92	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0105A				
	0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	0.98	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	6.73	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	11.93	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 3 en punto, 150mm diá, 150mm intrusión	5
	12.42	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / TBI	



AMH @ 0,00 m


TB @ 0,98 m


TB @ 6,73 m



TBI @ 11,93 m



MSA @ 12,42 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				19
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0106	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 13 Y 12A	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	34,35
Situación		Manhole Final	0001CC0105	Longitud inspeccionada [m]	34,35
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:253


m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0105			
1.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.00	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
3.19	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
14.57	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
32.25	HSV	Agujero Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto, junta	5
32.25	HVV	Agujero Vacío Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto, junta	5
32.25	IW	Infiltración Lagrimeo, en 5 en punto, junta	2
32.28	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
34.55	FM	Fractura Múltiple de 6 en punto a 7 en punto	4
34.64	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá, junta	
35.35	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / TBI, LA CAMARA NO PASA	
34.35		Fin de la Tubería	



AMH @ 1,00 m



MWL @ 1,00 m



TB @ 3,19 m



TB @ 14,57 m



HSV @ 32,25 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				17
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0108	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 13A Y 13	Alcant.Inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	8,06
Situación		Manhole Final	0001CC0107	Longitud inspeccionada [m]	8,06
Número de tubo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 350mm	Motivo de Inspección	
		Método de Inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:80	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0107				
	1,00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	1,28	RFJ	Raices Finas en la junta en 12 en punto, junta	1
	4,80	RFJ	Raices Finas en la junta en 9 en punto, junta	1
	5,76	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm dia	
	5,78	RFL	Raices Finas en Acometida, en 3 en punto	1
	5,49	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm dia	
	8,05	RBJ	Raices Bola en Junta de 3 en punto a 9 en punto, 55% perdido, junta	4
	8,05	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / RBJ	
	8,05		Fin de la Tubería	


AMH @ 1,00 m


RFJ @ 1,28 m


RFJ @ 4,80 m


TB @ 5,76 m


RFL @ 5,78 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				18
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0108	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	73,93
Situación		Manhole Final	0001CC0109	Longitud inspeccionada [m]	73,93
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 450mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	

1:544

m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0108			
0.01	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
18.96	DSGV	Depósitos Asentados Gravilla,, 10% del área de corte transversal en 6 en punto	2
21.59	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
73.94	DSGV	Depósitos Asentados Gravilla,, 20% del área de corte transversal de 4 en punto a 8 en punto	3
73.94	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / DSGV	
73.93		Fin de la Tubería	



AMH @ 0,01 m


DSGV @ 18,96 m



TB @ 21,59 m



DSGV @ 73,94 m



MSA @ 73,94 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				23
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243271

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0109	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 13 Y 12A	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	6,20
Situación		Manhole Final	0001CC0108	Longitud inspeccionada [m]	6,20
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 450mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarilado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:50	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0108				
	0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	4.96	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	5.38	HVV	Agujero Vacío Visible, Más allá del defecto en 2 en punto	5
	6.20	DSC	Depósitos Asentados Duros/Compactado,, 25% del área de corte transversal de 5 en punto a 7 en punto	4
	6.20	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / DSC	


AMH @ 0,00 m



TB @ 4,96 m


HVV @ 5,38 m


DSC @ 6,20 m



MSA @ 6,20 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

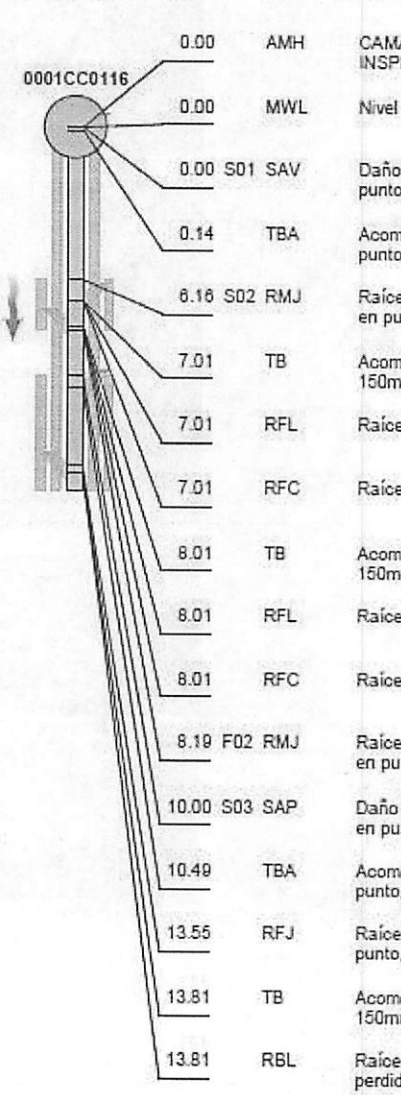
WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024		En seco		13
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243271


Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0116	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 14 Y 15	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	69,16
Situación		Manhole Final	0001CC0117	Longitud inspeccionada [m]	69,16
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 550mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	




m +	Op	Código	Incidencia Observaciones	Grade
0.00		AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.00		MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
0.00	S01	SAV	Daño Superficial Agregado Visible, de 8 en punto a 4 en punto, junta, Arrancar	
0.14		TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá, junta	
6.16	S02	RMJ	Raíces Medianas en la Junta de 1 en punto a 4 en punto, 5% perdido, junta, Arrancar	
7.01		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
7.01		RFL	Raíces Finas en Acometida, en 9 en punto	1
7.01		RFC	Raíces Finas en la conexión en 9 en punto	1
8.01		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá, junta	
8.01		RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
8.01		RFC	Raíces Finas en la conexión en 3 en punto	1
8.19	F02	RMJ	Raíces Medianas en la Junta de 1 en punto a 4 en punto, 5% perdido, junta, Acabado	3
10.00	S03	SAP	Daño Superficial Agregado Protuberante, de 4 en punto a 8 en punto, junta, Arrancar	
10.49		TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá, junta	
13.55		RFJ	Raíces Finas en la junta de 2 en punto a 3 en punto, junta	1
13.81		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá, junta	
13.81		RBL	Raíces Bola en Acometida en 3 en punto, 75% perdido, junta	4


AMH @ 0,00 m


MWL @ 0,00 m



SAV @ 0,00 m


TBA @ 0,14 m



TBA @ 0,14 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024		En seco		14
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243271


Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0120	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 39 ENTRE CLL 14 Y 15	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	8,65
Situación		Manhole Final	0001CC0119	Longitud inspeccionada [m]	8,65
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	


1:64 m + Op Código Incidencia Observaciones Grade





0.00		AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.04		MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
0.04	S01	SAV	Daño Superficial Agregado Visible, de 8 en punto a 4 en punto, junta, Arrancar	
8.39		TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 3 en punto, 150mm diá, 110mm intrusión, junta, 15% del área de corte transversal	5
8.65	F01	SAV	Daño Superficial Agregado Visible, de 8 en punto a 4 en punto, junta, Acabado	3
8.65		MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / TBI	


AMH @ 0,00 m


MWL @ 0,04 m


SAV @ 0,04 m


SAV @ 0,04 m


TBI @ 8,39 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024				7
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0131	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	90,27
Situación		Manhole Final	0001CC0133	Longitud inspeccionada [m]	90,27
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 900mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	

1:664 m + Op Código Incidencia Observaciones Grade




0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION		
30.06	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá, junta		
58.76	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá		
65.49	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal		
88.05	IR	Infiltración Torrente, en 8 en punto, junta	4	
90.27	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION		




AMH @ 0,00 m




TB @ 30,06 m


TB @ 58,76 m



MWL @ 65,49 m


IR @ 88,05 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024


Fecha	Camara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024				8
Project name		**Vehiculo**	**Operador**	**Job Id**
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0131	Longitud de tubería [m]	0
Calle	CLL 12A ENTRE KR 38 Y 37	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	11,64
Situación		Manhole Final	0001CC0138	Longitud inspeccionada [m]	11,64
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 900mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	


1:86

m +	Op Codigo	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0138			
1.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.02	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
5.02	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá	
0001CC0131 12.64	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION	


AMH @ 1,00 m


MWL @ 1,02 m


TBA @ 5,02 m


AMH @ 12,64 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 05/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
05/12/2024		En seco		4
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243155


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0132	Longitud de tubería [m]	0
Calle	CLL 12A ENTRE KR 39 Y 38	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	101,70
Situación		Manhole Final	0001CC0103	Longitud inspeccionada [m]	101,70
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 450mm	Motivo de inspección	Evaluación de rutina
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	

1:748

m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0103			
0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.76	S01 CL	Grieta longitudinal en 11 en punto, junta, Arrancar	
3.13	F01 CL	Grieta longitudinal en 11 en punto, junta, Acabado	2
32.45	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá, junta	
32.45	FM	Fractura Múltiple de 1 en punto a 4 en punto, junta	4
45.25	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 10 en punto, 150mm diá, junta	
45.31	FL	Fractura longitudinal en 9 en punto, junta	3
45.67	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 1 en punto, 150mm diá, junta	
59.76	HSV	Agujero Suelo Visible, Más allá del defecto en 3 en punto, junta	5
78.95	OBB	Obstrucciones con ladrillo,, 10% del área de corte transversal de 6 en punto a 7 en punto	2
87.67	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá, junta	
87.67	IR	Infiltración Torrente, en 3 en punto, junta / INFILTRACION EN LA CONEXION	4
88.58	S02 DAE	Depósitos Adheridos Incrustados, 10% del área de corte transversal en 7 en punto, junta, Arrancar	
100.96	F02 DAE	Depósitos Adheridos Incrustados, 10% del área de corte transversal en 7 en punto, junta, Acabado	2
0001CC0132			
101.70	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION	


AMH @ 0,00 m



CL @ 0,76 m



CL @ 3,13 m



TBA @ 32,45 m


FM @ 32,45 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024


Fecha	Camara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0132	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	158,42
Situación		Manhole Final	0001CC0134	Longitud inspeccionada [m]	158,42
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 400mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:645


m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
-0.09	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
7.71	DSZ	Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto / ESCOMBRO	3
10.01	RFJ	Raíces Finas en la junta de 1 en punto a 4 en punto, junta	1
11.09	RFJ	Raíces Finas en la junta de 11 en punto a 5 en punto, junta	1
15.95	RFJ	Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta	1
27.07	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
27.08	RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
29.67 S01	CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
29.67 S02	D	Deformación, 10% cambiado, Arrancar	
36.49 F01	CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
37.15 F02	D	Deformación, 10% cambiado, Acabado	4
51.20 S03	CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
56.74 F03	CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
74.50	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
75.02	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
80.99	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
85.84	MGO	OBSERVACION GENERAL / CAMARA OCULTA	




AMH @ -0,09 m




DSZ @ 7,71 m


DSZ @ 7,71 m



RFJ @ 10,01 m


RFJ @ 11,09 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

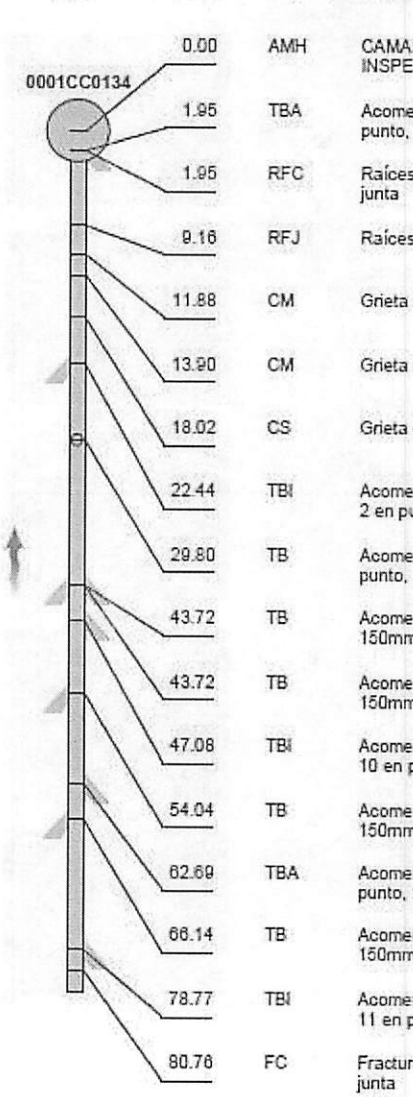
WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024		En seco		10
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243271


Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0136	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 13 Y 12A	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	85,17
Situación		Manhole Final	0001CC0134	Longitud inspeccionada [m]	85,17
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 400mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubo concreto (no armado)	Comentarios general	





m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.95	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá, junta	
1.95	RFC	Raíces Finas en la conexión en 9 en punto, junta	1
9.16	RFJ	Raíces Finas en la junta en 2 en punto, junta	1
11.88	CM	Grieta múltiple de 2 en punto a 4 en punto, junta	3
13.90	CM	Grieta múltiple de 3 en punto a 5 en punto, junta	3
18.02	CS	Grieta espiral, junta de 8 en punto a 10 en punto	2
22.44	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 2 en punto, 150mm diá, 75mm intrusión, junta	5
29.80	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 12 en punto, 150mm diá, junta	
43.72	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá, junta	
43.72	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá, junta	
47.08	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 10 en punto, 150mm diá, 100mm intrusión, junta	5
54.04	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 2 en punto, 150mm diá, junta	
62.69	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá, junta	
66.14	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 2 en punto, 150mm diá, junta	
78.77	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 11 en punto, 75mm diá, 200mm intrusión, junta	5
80.76	FC	Fractura Circular de 7 en punto a 11 en punto, junta	2


AMH @ 0,00 m


TBA @ 1,95 m


RFC @ 1,95 m


RFJ @ 9,16 m


CM @ 11,88 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

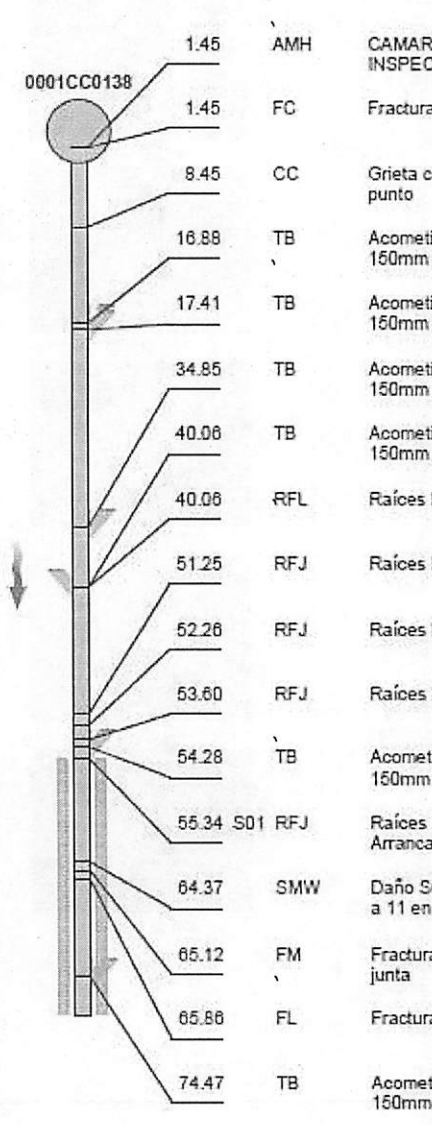
WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024				9
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0138	Longitud de tubería [m]	0
Calle	CLL 12A ENTRE KR 37 Y 38	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	85,20
Situación		Manhole Final	0001CC0139	Longitud inspeccionada [m]	85,20
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 300mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	de Aguas Pluviales	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	





m +	Op Codigo	Incidencia Observaciones	Grade
1.45	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.45	FC	Fractura Circular de 6 en punto a 5 en punto	2
8.45	CC	Grieta circunferencial de 5 en punto a 10 en punto	1
16.88	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
17.41	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
34.85	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
40.06	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
40.06	RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
51.25	RFJ	Raíces Finas en la junta en 7 en punto, junta	1
52.26	RFJ	Raíces Finas en la junta en 1 en punto, junta	1
53.60	RFJ	Raíces Finas en la junta en 12 en punto, junta	1
54.28	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
55.34 S01	RFJ	Raíces Finas en la junta en 6 en punto, junta, Arrancar	
64.37	SMW	Daño Superficial Pared Ausente,de 12 en punto a 11 en punto	5
65.12	FM	Fractura Múltiple de 3 en punto a 9 en punto, junta	4
65.86	FL	Fractura longitudinal en 9 en punto, junta	3
74.47	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	


AMH @ 1,45 m


FC @ 1,45 m


CC @ 8,45 m


TB @ 16,88 m


TB @ 17,41 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 15/12/2024


Fecha	Camara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
15/12/2024				21
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243128

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0139	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 37 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	97,78
Situación		Manhole Final	0001CC0140	Longitud inspeccionada [m]	97,78
Número de dibujo		Alcant.final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 550mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	




1:584	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0139	0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	3.67	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
	17.72	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	30.27	TBI	Acometida por Rotura/Martillado Intromisión en 3 en punto, 150mm diá, 100mm intrusión, junta	5
	37.90	OBP	Obstrucciones por cable o tubería externa, 10% del área de corte transversal de 11 en punto a 1 en punto	2
	41.70	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	48.93	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	57.48	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá	
	58.39	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá	
	59.29	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 9 en punto, 150mm diá	
	64.65	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	67.60	S01 CL	Grieta longitudinal en 9 en punto, Arrancar	
	69.90	F01 CL	Grieta longitudinal en 9 en punto, Acabado	2
	72.72	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	72.76	FM	Fractura Múltiple de 7 en punto a 8 en punto	4
	74.86	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	79.24	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	




AMH @ 0,00 m




MWL @ 3,67 m



TB @ 17,72 m


TBI @ 30,27 m



OBP @ 37,90 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL


WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/12/2024


Fecha	Cámara	Climo	Tubo de referencia del segmento	Nr.
16/12/2024				24
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243272


Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0142	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 37 ENTRE CLL12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	139,88
Situación		Manhole Final	0001CC0140	Longitud inspeccionada [m]	139,88
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 550mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	



m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
1.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.01	MWL	Nivel de agua, 10% del área de corte transversal	
25.99	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
30.75	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
53.99	RFJ	Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 8 en punto	1
59.69	MGO	OBSERVACION GENERAL / CAMARA 0001CC0141	
61.27	RPPD	Reparación Puntual con Parche Defectuosa, en 12 en punto	4
70.92	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
76.50	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
86.87	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 12 en punto, 150mm diá	
88.61	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 12 en punto, 150mm diá	
92.20	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
93.16	RPRD	Reparación Puntual Tubería Reemplazada Defectuosa, en 12 en punto	4
101.35	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
112.61	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá	
113.25	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
115.12	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	


AMH @ 1,00 m




MWL @ 1,01 m



TB @ 25,99 m



TB @ 30,75 m


RFJ @ 53,99 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
16/12/2024				25
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243242


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0142	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 37 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	19,91
Situación		Manhole Final	0001CC0143	Longitud inspeccionada [m]	19,91
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 550mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	

1:147

m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0142			
1.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
1.00	MWL	Nivel de agua, 10% del área de corte transversal	
15.65	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
17.79	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
20.91	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION	
0001CC0143			



AMH @ 1,00 m



MWL @ 1,00 m



TB @ 15,65 m



TB @ 17,79 m



AMH @ 20,91 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
16/12/2024				26
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243242

Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0143	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 37 ENTRE CLL 13 Y 14	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	68,74
Situación		Manhole Final	0001CC0152	Longitud inspeccionada [m]	68,74
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Herradura 900mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	

1:506 m + Op Código Incidencia Observaciones Grade





0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
8.59	MMC	Cambios materiales,, Ladrillo	
26.92	OBP	Obstrucciones por cable o tubería externa, 20% del área de corte transversal de 10 en punto a 2 en punto	3
34.29	MWL	Nivel de agua, 10% del área de corte transversal	
35.97	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá	
47.98	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
68.74	DSGV	Depósitos Asentados Gravilla,, 20% del área de corte transversal de 5 en punto a 7 en punto	3
68.74	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / DSGV	


AMH @ 0,00 m



MMC @ 8,59 m


OBP @ 26,92 m



MWL @ 34,29 m



TBA @ 35,97 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024


Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024		En seco		11
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243271

Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0147	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 13 Y 14	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	83,88
Situación		Manhole Final	0001CC0137	Longitud inspeccionada [m]	83,88
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 1000mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	ContraFlujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	


1:617


m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0137			
0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
3.64	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 2 en punto, 150mm diá. junta	
10.30	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 2 en punto, 150mm diá. junta	
22.08	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 2 en punto, 150mm diá. junta	
48.69	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 2 en punto, 150mm diá. junta	
83.88	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION	
0001CC0147			


AMH @ 0,00 m


TBA @ 3,64 m


TB @ 10,30 m


TBA @ 22,08 m


TB @ 48,69 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 14/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
14/12/2024		En seco		12
Project name		Vehiculo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			MEET	20243271

Ciudad	ACOPI YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0147	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 13 Y 14	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	86,90
Situación		Manhole Final	0001CC0148	Longitud inspeccionada [m]	86,90
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	


Perfil	Circular 1000mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	TV
El uso de alcantarillado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Tubería de concreto reforzado	Comentarios general	


1:639


m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0.00	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
0.00	MWL	Nivel de agua, 5% del área de corte transversal	
1.87	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 11 en punto, 150mm diá, junta	
8.75	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 11 en punto, 150mm diá, junta	
25.89	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 11 en punto, 150mm diá	
26.09	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 11 en punto, 150mm diá, junta	
43.16	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 11 en punto, 150mm diá	
57.34	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 11 en punto, 150mm diá	
58.21	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 11 en punto, 150mm diá	
58.21	RFC	Raíces Finas en la conexión en 11 en punto	1
58.29	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 2 en punto, 150mm diá	
61.25	ISSRB	Sello Penetrante Roto, 5% del área de corte transversal de 11 en punto a 12 en punto	
64.40	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 11 en punto, 150mm diá, junta	
64.40	RFC	Raíces Finas en la conexión en 11 en punto, junta	1
80.37	TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 10 en punto, 150mm diá	
82.65	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 10 en punto, 150mm diá	
86.90	AMH	CAMARA DE INSPECCION / FIN DE INSPECCION	


0001CC0147


0001CC0148


AMH @ 0,00 m


MWL @ 0,00 m


TB @ 1,87 m


TB @ 8,75 m


TBA @ 25,89 m

FORMATO INTERNO SISP

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 798 DE 2002

Que la suscrita **KATHERINE CASAS TRUJILLO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.66.980.860 de Cali-valle; Tarjeta profesional No. 110021-T, en su calidad de **Revisor Fiscal** de la empresa **COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS EN REORGANIZACION**, identificada con Nit.890.319.290-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social, realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar , instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo.

Para constancia se firma en yumbo, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

KATHERINE CASAS TRUJILLO
Revisor Fiscal
C.C 66.980.860
TP.No.110021-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z 9 7 Z 0 9 1 4 B F 1 6 9 4 F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATHERINE CASAS TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66980860 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 110021-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

110021-T



KATHERINE
CASAS TRUJILLO
C.C. 66980860
RES. INSCRIPCION 39 DEL 14/04/2005
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277481 119636

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

USO EXCLUSIVO PROCESO LICITACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.980.860**
CASAS TRUJILLO
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1976**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-1994 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-3100100-00637714-F-0066980860-20141110 0040928933A 3 43720803

USO EXCLUSIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81699779	$48 153 800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	6 837 900	6.837.900
Pensión	4	27 739.700	27 739 700
Riesgos Laborales	1	6.911.400	6 911 400
CCF	1	6 664 800	6 664 800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	48.153.800	48.153.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS	CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81699779	$48.153.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	347.900	0		0		0	0	0	0	347.900	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	609.800	0		0		0	0	0	0	609.800	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.877.400	0		0		0	0	0	0	2.877.400	20
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	402.200	0		0		0	0	0	0	402.200	5
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	607.400	0		0		0	0	0	0	607.400	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.890.900	0		0		0	0	0	0	1.890.900	22
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	76.300	0		0		0	0	0	0	76.300	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	26.000	0		0		0	0	0	0	26.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.088.000	0	0	0	0	0	0		3.088.000	10
230301	Porvenir	800224808-8	13.440.700	0	0	0	0	0	0		13.440.700	42
231001	Colfondos	800227940-6	1.429.700	0	0	0	0	0	0		1.429.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	9.422.100	0	0	179.600	179.600	0	0		9.781.300	14

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.911.400				6.911.400	0	0	6.911.400			69.114	6.911.400	70

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	6.664.800	0	0	6.664.800	70

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81699779	$48 153 800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1010053989	MESA MARIO	1	0		S								x									231001	2 595 401	415 300	0	0	0	0	EPS018	2 595 401	103 900	14-25	2 595 401	5	180 700	CCF56	2 595 401	103 900	0	0	0	0	0
41	CC	1014282160	GAMBA ROJAS MARIA FERNANDA	1	0		S	x							x									230301	920 000	147 200	0	0	0	0	EPS005	920 000	36 800	14-25	920.000	1	4 900	CCF56	920 000	36 800	0	0	0	0	0
42	CC	1061811464	VALENCIA PERLAZA EVA MARIA	1	0		S								x									25-14	2 250 052	360 100	0	0	0	0	EPS010	2 250 052	90.100	14-25	2.250 052	1	11 800	CCF56	2.250 052	90 100	0	0	0	0	0
43	CC	1086054117	OTERO CAICEDO LEWINSON	1	0		S								x									230201	2 217 417	354 800	0	0	0	0	EPS002	2 217 417	88.700	14-25	2.217.417	5	154 400	CCF56	2.217.417	88 700	0	0	0	0	0
44	CC	1089000630	GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO	1	0		S								x									230301	2.219.586	355 200	0	0	0	0	EPS010	2 219 586	88.800	14-25	2 219 586	5	154 500	CCF56	2 219 586	88 800	0	0	0	0	0
45	CC	1107034988	RINCON POLANCO JAVIER ANTONIO	1	0		S								x									231001	2.047.188	327 600	0	0	0	0	EPS010	2 047 188	81 900	14-25	2 047.188	5	142 500	CCF56	2 047.188	81 900	0	0	0	0	0
46	CC	1107512806	JIMENEZ DIAZ ERIKA LIZETH	1	0		S								x									230301	2 520 000	403 200	0	0	0	0	EPS010	2 520 000	100 800	14-25	2.520.000	1	13.200	CCF56	2.520.000	100 800	0	0	0	0	0
47	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0		S													x				230301	2 041 334	326 700	0	0	0	0	EPS037	2 041 334	81.700	14-25	2.041.334	2	0	CCF56	2.144 879	85 800	0	0	0	0	0
48	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0		S								x									230301	2 895 447	463 300	0	0	0	0	EPS037	2 895 447	115.900	14-25	2 895.447	2	30.300	CCF56	2 895 447	115.900	0	0	0	0	0
49	CC	1112465125	RIASCOS CAICEDO HECTOR EVERT	1	0		S									x								230201	86.667	10.500	0	0	0	0	EPS018	86 667	0	14-25	86 667	5	0	CCF56	83.678	0	0	0	0	0	0
50	CC	1112465125	RIASCOS CAICEDO HECTOR EVERT	1	0		S										x							230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS018	86 667	3 500	14-25	86 667	5	0	CCF56	86.667	0	0	0	0	0	0
51	CC	1112465125	RIASCOS CAICEDO HECTOR EVERT	1	0		S								x									230201	1 550 862	248.200	0	0	0	0	EPS018	1 550 862	62.100	14-25	1 550 862	5	108 000	CCF56	1 550 862	62 100	0	0	0	0	0
52	CC	1112497173	SINISTERRA MARTINEZ ROBINSON	1	0		S								x									230301	2 344 943	375.200	0	0	0	0	EPS037	2 344 943	93.800	14-25	2.344 943	5	163 300	CCF56	2 344 943	93 800	0	0	0	0	0
53	CC	1113039563	MORENO ORTIZ CARLOS EFREN	1	0		S								x									230301	1.965.693	314.600	0	0	0	0	EPS037	1 965 693	78 700	14-25	1.965 693	5	136 900	CCF56	1 965 693	78 700	0	0	0	0	0
54	CC	1113533697	REINA SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO	1	0		S																	230301	1.512.000	242 000	0	0	0	0	EPS010	1.512.000	60 500	14-25	1 512 000	1	7 900	CCF56	1 512 000	60 500	0	0	0	0	0
55	CC	1113537862	DIAZ CALLE LINDA MELANNY	1	0		S								x									230301	1 551 902	248 400	0	0	0	0	EPS010	1 551 902	62.100	14-25	1 551 902	1	8 200	CCF56	1 551 902	62 100	0	0	0	0	0
56	CC	1113673736	PERLAZA OCORO DALLANA ANDREA	1	0		S								x									230301	2 359 565	377.600	0	0	0	0	EPS037	2 359.565	94 400	14-25	2 359 565	5	164 300	CCF56	2 359 565	94 400	0	0	0	0	0
57	CC	1116259447	RAMIREZ BORBON DIANA CRISTINA	1	0		S								x									230301	2.290 000	366 400	0	0	0	0	EPS010	2.290.000	91 600	14-25	2 290 000	1	12 000	CCF56	2 290 000	91 600	0	0	0	0	0
58	CC	1118290088	RIVAS SERNA STEVENSON SAUL	1	0		S								x									230301	1 670 314	267 300	0	0	0	0	EPS018	1 670 314	66 900	14-25	1 670 314	5	116 300	CCF56	1 670 314	66 900	0	0	0	0	0
59	CC	1118306208	ESCOBAR TAMAYO MIGUEL ENRIQUE	1	0		S									x								230301	152 795	18 400	0	0	0	0	EPS018	152 795	0	14-25	152 795	5	0	CCF56	152 795	0	0	0	0	0	0
60	CC	1118306208	ESCOBAR TAMAYO MIGUEL ENRIQUE	1	0		S								x									230301	1.618.767	259 100	0	0	0	0	EPS018	1 618 767	64 800	14-25	1 618 767	5	112 700	CCF56	1 618 767	64 800	0	0	0	0	0
61	CC	1130662576	MENDOZA BENITEZ OSCAR ANDRES	1	0		S								x									230301	1.741.289	278 700	0	0	0	0	EPS037	1 741 289	69 700	14-25	1 741 289	5	121 200	CCF56	1 741 289	69 700	0	0	0	0	0
62	CC	1143850532	BEDOYA ANGULO DIEGO FERNANDO	1	0		S									x								230301	43.334	5 300	0	0	0	0	EPS005	43 334	0	14-25	43 334	5	0	CCF56	43 333	0	0	0	0	0	0
63	CC	1143850532	BEDOYA ANGULO DIEGO FERNANDO	1	0		S									x								230301	43 334	5 300	0	0	0	0	EPS005	43 334	0	14-25	43 334	5	0	CCF56	43 333	0	0	0	0	0	0
64	CC	1143850532	BEDOYA ANGULO DIEGO FERNANDO	1	0		S								x									230301	1 213 334	194 200	0	0	0	0	EPS005	1 213 334	48 600	14-25	1 213 334	5	84 500	CCF56	1 213 333	48 600	0	0	0	0	0
65	CC	1143927023	ANGULO GARCES JEFFERSON	1	0		S								x									230301	2 680 958	429 000	0	0	0	0	EPS037	2 680 958	107 300	14-25	2 680 958	5	186 600	CCF56	2 680 958	107 300	0	0	0	0	0
66	CC	1143935301	VILLEGAS MOSQUERA EDWIN	1	0		S													x				231001	843 227	135 000	0	0	0	0	EPS037	843 227	33 800	14-25	843 227	5	0	CCF56	772 812	31 000	0	0	0	0	0
67	CC	1143935301	VILLEGAS MOSQUERA EDWIN	1	0		S								x									231001	1 576 304	252 300	0	0	0	0	EPS037	1 576 304	63 100	14-25	1 576 304	5	109 800	CCF56	1 576 304	63 100	0	0	0	0	0
68	CC	1143958489	ARROYO WILMAR FERNANDO	1	0		S								x									230301	2 142 243	342 800	0	0	0	0	EPS037	2 142 243	85 700	14-25	2 142 243	5	149 200	CCF56	2 142 243	85 700	0	0	0	0	0
69	CC	1143959543	CASTAÑO CHAVERRA DANIEL ESTIVEN	1	0		S	x							x									230301	1 256 313	201 100	0	0	0	0	EPS037	1 256 313	50 300	14-25	1 256 313	5	87 500	CCF56	1 256 313	50 300	0	0	0	0	0
70	CC	1144067680	FLOREZ ALVAREZ ANDREA ESTEFANNIA	1	0		S								x									230301	2 045 347	327 300	0	0	0	0	EPS010	2 045 347	81 900	14-25	2 045 347	5	142 400	CCF56	2 045 347	81 900	0	0	0	0	0
71	CC	1144079801	RIVERA OCAMPO CATALINA	1	0		S																	230301	1 500 000	240 000	0	0	0	0	EPS005	1 500 000	60 000	14-25	1 500 000	1	7 900	CCF56	1 500 000	60 000	0	0	0	0	0
72	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	1	0		S													x				230301	148 168	23 800	0	0	0	0	EPS002	148 168	6 000	14-25	148 168	5	0	CCF56	135 870	5 500	0	0	0	0	0
73	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	1	0		S								x									230301	1 892 255	302 800	0	0	0	0	EPS002	1 892 255	75 700	14-25	1 892 255	5	131 800	CCF56	1 892 255	75 700	0	0	0	0	0
74	CC	1144092861	RESTREPO MUÑOZ SEBASTIAN	1	0		S								x									230301	1 583 457	253 400	0	0	0	0	EPS037	1 583 457	63 400	14-25	1 583 457	5	110 300	CCF56	1 583 457	63 400	0	0	0	0	0
75	CC	1144175950	GARZON DEVIA CRISTIAN JULIAN	1	0		S								x									230301	2 347 067	375 600	0	0	0	0	EPS010	2 347 067	93 900	14-25	2 347 067	2	24 600	CCF56	2 347 067	93 900	0	0	0	0	0
76	CC	1144180358	MORENO GUTIERREZ MARIA FERNANDA	1	0		S								x									230301	1 703 117	272 500	0	0	0	0	EPS010	1 703 117	68 200	14-25	1 703 117	5	118 600	CCF56	1 703 117	68 200	0	0	0	0	0
77	CC	1150935219	VARGAS LOPEZ JOEL ANDRES	1	0		S								x									230301	1 704 977	272 800	0	0	0	0	EPS037	1 704 977	68 200	14-25	1 704 977	5	118 700	CCF56	1 704 977	68 200	0	0	0	0	0
78	CC	1151447926	MONTOYA CORAL JEISON ALEXANDER	1	0		S								x									230301	1 381 250	221 000	0	0	0	0	EPS005	1 381 250	55 300	14-25	1 381 250	1	7 300	CCF56	1 381 250	55 300	0	0	0	0	0
79	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0		S										x							230301	606 667	97 100	0	0	0	0	EPS037	606 667	24 300	14-25	606 667	1	0	CCF56	606 667	0	0	0	0	0	0
80	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0		S								x									230301	693 334	111 000	0	0	0	0	EPS037	693 334	27 800	14-25	693 334	1	3 700	CCF56	671 667	26 900	0	0	0	0	0
81	CC	1151958797	LOPEZ HURTADO FABIAN JOSE	1	0		S								x									230301	1 882 164	301 200	0	0	0	0	EPS005	1 882 164	75 300	14-25	1 882 164	5	131 000	CCF56	1 882 164	75 300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS	CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 70 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E		81699779	$48 153 800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	6097197	GOMEZ MACICAYA JAIME	1	0			S									x								230301	1 300 000	208 000	0	0	0	0	EPS005	1 300 000	52.000	14-25	1 300.000	5	0	CCF56	1.300.000	0	0	0	0	0
2	CC	6102111	MOSCOSO SANCHEZ JOHN EDWIN	1	0			S	x																230201	390 000	62 400	0	0	0	0	EPS002	390 000	15 600	14-25	390.000	5	27 200	CCF56	390.000	15 600	0	0	0	0	0
3	CC	6333013	RAMOS BENAVIDES EULISES	1	0			S								x								230301	1.747.510	279 700	0	0	0	0	EPS012	1 747 510	70.000	14-25	1.747 510	4	76 100	CCF56	1 747 510	70 000	0	0	0	0	0
4	CC	6626711	BERMUDEZ NIEVA HECTOR JAIRO	1	0			S								x								25-14	1.676.152	268 200	0	0	0	0	EPS012	1 676 152	67 100	14-25	1 676.152	1	8.800	CCF56	1 676.152	67.100	0	0	0	0	0
5	CC	11708195	VARELA MOSQUERA JABER	1	0			S												x				230301	498.286	79 800	0	0	0	0	EPS037	498 286	20 000	14-25	498.286	5	0	CCF56	344.523	13.800	0	0	0	0	0
6	CC	11708195	VARELA MOSQUERA JABER	1	0			S								x								230301	2 302 998	368 500	0	0	0	0	EPS037	2 302 998	92 200	14-25	2.302.998	5	160 300	CCF56	2.302 998	92 200	0	0	0	0	0
7	CC	12918326	SEVILLANO TEODORO	1	0			S								x								25-14	2 534 031	405.500	0	0	0	0	EPS002	2 534 031	101.400	14-25	2 534.031	5	176.400	CCF56	2 534 031	101.400	0	0	0	0	0
8	CC	14575682	CHITO GUZMAN ALONSO	1	0			S								x								25-14	1 584 022	253 500	0	0	0	0	EPS010	1 584 022	63 400	14-25	1 584 022	5	110.300	CCF56	1 584 022	63.400	0	0	0	0	0
9	CC	16765921	GARCIA GRAJALES EDINSON	1	0			S								x								25-14	1 473.333	235 800	0	0	0	0	EPS037	1 473 333	59 000	14-25	1 473 333	4	64 100	CCF56	1.473.333	59 000	0	0	0	0	0
10	CC	16781993	DURAN PEREZ HUGO	1	0			S																25-14	6 372 000	1 019 600	0	0	31 900	31 900	EPS010	6 372 000	254 900	14-25	6 372 000	1	33 300	CCF56	6 372 000	254 900	0	0	0	0	0
11	CC	16796605	CHATES RAMIREZ MARLON JAIR	1	0			S							x	x								25-14	2 787 783	446.100	0	0	0	0	EPS010	2 787 783	111 600	14-25	2.787 783	5	194.100	CCF56	2 787 783	111 600	0	0	0	0	0
12	CC	16948772	ALEGRIA LUIS FELIPE	1	0			S												x				230301	336.234	53.800	0	0	0	0	EPS012	336.234	13 500	14-25	336 234	1	0	CCF56	284 542	11 400	0	0	0	0	0
13	CC	16948772	ALEGRIA LUIS FELIPE	1	0			S								x								230301	1.618.028	258 900	0	0	0	0	EPS012	1.618 028	64 800	14-25	1 618 028	1	8 500	CCF56	1 618 028	64 800	0	0	0	0	0
14	CC	31572778	RAMIREZ CAMPO PAOLA ANDREA	1	0			S								x								230301	2 543 000	405.900	0	0	0	0	EPS005	2 543.000	101.800	14-25	2 543 000	4	110 700	CCF56	2 543 000	101 800	0	0	0	0	0
15	CC	66814852	CARCES TORRES MAGDA VIVIANA	1	0			S								x								230301	4 694 425	751.200	0	0	0	0	EPS010	4 694.425	187 800	14-25	4 694 425	5	326 800	CCF56	4 694 425	187 800	0	0	0	0	0
16	CC	66956054	DURAN PEREZ ELIZABETH	1	0			3								x								25-14	10.372 243	1 659 600	0	0	51 900	51.900	EPS010	10.372 243	414 900	14-25	10 372 243	5	722 000	CCF56	10.372 243	414 900	0	0	0	0	0
17	CC	66954100	PAQUE ROJAS MABEL	1	0			S								x								25-14	4 500 000	720 000	0	0	0	0	EPS005	4 500 000	180 000	14-25	4 500 000	1	23 500	CCF56	4 500 000	180 000	0	0	0	0	0
18	CC	66987711	ASTUDILLO MEJIA ANGELA MARIA	1	0			S																25-14	1.890 000	302 400	0	0	0	0	EPS010	1 890 000	75 600	14-25	1 890 000	1	9 900	CCF56	1 890 000	75 600	0	0	0	0	0
19	CC	67006959	DURAN PEREZ MARCELA	1	0			S												x				25-14	1.126.160	180 200	0	0	5.700	5 700	EPS010	1 126 160	45 100	14-25	1 126 160	1	0	CCF56	900 000	36 000	0	0	0	0	0
20	CC	67006959	DURAN PEREZ MARCELA	1	0			S								x								25-14	7 213 920	1 154 300	0	0	36 100	36 100	EPS010	7 213 920	288 600	14-25	7 213 920	1	37 700	CCF56	7 213 920	288 600	0	0	0	0	0
21	CC	76140801	FORY MERA CARLOS ANDRES	1	0			S		x						x								230201	2 800.998	448 200	0	0	0	0	EPS037	2 800 998	112 100	14-25	2 800 998	5	195 000	CCF56	2 800 998	112 100	0	0	0	0	0
22	CC	94071833	GAMBOA GUZMAN JIMY	1	0			S								x								231001	1 871.435	299 500	0	0	0	0	EPS037	1 871 435	74 900	14-25	1 871 435	1	9 800	CCF56	1 871 435	74 900	0	0	0	0	0
23	CC	94361713	BOJORGE APOLINDAR JOSE INEL	1	0			S								x								230301	2.105.769	337 000	0	0	0	0	EPS037	2 105 769	84 300	14-25	2 105 769	5	145 600	CCF56	2 105 769	84 300	0	0	0	0	0
24	CC	94370979	IBARRA LEONARDO FABIO	1	0			S								x								230301	1.693 815	271 100	0	0	0	0	EPS037	1 693 815	67 800	14-25	1 693 815	5	117 900	CCF56	1 693 815	67 800	0	0	0	0	0
25	CC	94421026	ZAPATA FIGUEROA LUIS ALFREDO	1	0			S								x								230201	2 898 813	463 900	0	0	0	0	EPS012	2 898 813	116 000	14-25	2 898 813	5	201 800	CCF56	2 898 813	116 000	0	0	0	0	0
26	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S													L			230301	130 000	20 800	0	0	0	0	EPS018	130 000	5 200	14-25	130 000	1	0	CCF56	130 000	5 200	0	0	0	0	0
27	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S										x						230301	130 000	20 800	0	0	0	0	EPS018	130 000	5 200	14-25	130 000	1	0	CCF56	130 000	0	0	0	0	0	0
28	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S															24	230301	1 040 000	166 400	0	0	0	0	EPS018	1 040 000	41 600	14-25	1 040 000	1	0	CCF56	1 040 000	0	0	0	0	0	0
29	CC	94458904	MOSQUERA VALENCIA NELSON FABIO	1	0			S								x								25-14	2 554 754	408 800	0	0	0	0	EPS037	2 554 754	102 200	14-25	2 554 754	5	177 900	CCF56	2 554 754	102 200	0	0	0	0	0
30	CC	94459463	ARCE ESPINOSA BLADIMIR	1	0			S								x								25-14	10 780 894	1 725 000	0	0	54 000	54 000	EPS010	10 780 894	431 300	14-25	10 780 894	1	56 300	CCF56	10 780 894	431 300	0	0	0	0	0
31	CC	94529079	GARCIA CAMAÑO NEIR	1	0			S								x								25-14	1 768 315	283 000	0	0	0	0	EPS012	1 768 315	70 800	14-25	1 768 315	1	9 300	CCF56	1 768 315	70 800	0	0	0	0	0
32	CC	1002946450	BALLESTEROS MINA DUVAN YESID	1	0			S								x								230201	2 759 672	441 600	0	0	0	0	EPS010	2 759 672	110 400	14-25	2 759 672	1	14 500	CCF56	2 759 672	110 400	0	0	0	0	0
33	CC	1005866633	PALACIOS MOSQUERA KEVIN	1	0			S													x			230301	1 362 650	218 100	0	0	0	0	EPS018	1 362 650	54 600	14-25	1 362 650	5	0	CCF56	1 030 724	41 300	0	0	0	0	0
34	CC	1005866633	PALACIOS MOSQUERA KEVIN	1	0			S		x					x	x								230301	1 568 233	251 000	0	0	0	0	EPS018	1 568 233	62 800	14-25	1 568 233	5	109 200	CCF56	1 568 233	62 800	0	0	0	0	0
35	CC	1005944956	DINAS MONTAÑO JUAN CAMILO	1	0			S								x								230301	1 480 869	237 000	0	0	0	0	EPS037	1 480 869	59 300	14-25	1 480 869	5	103 100	CCF56	1 480 869	59 300	0	0	0	0	0
36	CC	1006054434	URRUTIA CUESTAS CARLOS MAURICIO	1	0			S									x							230201	43 334	7 000	0	0	0	0	EPS018	43 334	1 800	14-25	43.334	5	0	CCF56	43 333	0	0	0	0	0	0
37	CC	1006054434	URRUTIA CUESTAS CARLOS MAURICIO	1	0			S		x						x								230201	1 588 744	254 200	0	0	0	0	EPS018	1 588 744	63 600	14-25	1 588 744	5	110 600	CCF56	1 588 744	63 600	0	0	0	0	0
38	CC	1007517299	CONGOLINO BONILLA DAMIAN	1	0			S													L			230301	107 678	17 300	0	0	0	0	EPS010	107 678	4 400	14-25	107 678	5	0	CCF56	86 667	3 500	0	0	0	0	0
39	CC	1007517299	CONGOLINO BONILLA DAMIAN	1	0			S								x								230301	1 738 278	278 200	0	0	0	0	EPS010	1 738 278	69 600	14-25	1 738 278	5	121 000	CCF56	1 738 278	69 600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS	CRA 39 No 11-166	6853151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81699779	$48 153 800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Corresidente	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1151968819	BETANCOURTH FREIRE LUIS FERNANDO	1	0			S					x												230201	1 512 000	242 000	0	0	0	0	EPS002	1 512 000	60 500	14-25	1 512 000	1	7 900	CCF56	1 512 000	60 500	0	0	0	0	0
83	CC	1192911700	CORDOBA MONDRAGON TERESA	1	0			S	x							x									230301	650 000	104 000	0	0	0	0	ESSC18	650 000	26 000	14-25	650 000	1	3 400	CCF56	325 000	13 000	0	0	0	0	0
84	CC	1193043782	PALACIOS CAICEDO XIOMARA	1	0			S								x									230201	1 784 000	285 500	0	0	0	0	EPS018	1 784 000	71 400	14-25	1 784 000	1	9 400	CCF56	1 784 000	71 400	0	0	0	0	0
85	CC	1193205741	BAÑOL ZAPATA KEVIN STIVEN	1	0			S								x									230301	2 423 183	387 800	0	0	0	0	EPS037	2 423 183	97 000	14-25	2 423 183	5	168 700	CCF56	2 423 183	97 000	0	0	0	0	0
86	CC	1193394854	CORREA REBOLLEDO DAVID	1	0			S								x									230301	1 905 187	304 900	0	0	0	0	EPS042	1 905 187	76 300	14-25	1 905 187	5	132 700	CCF56	1 905 187	76 300	0	0	0	0	0
87	CC	1214745918	DORADO ZEMANATE LIZETH GABRIELA	1	0			S								x									230201	1 598 400	255 800	0	0	0	0	EPS037	1 598 400	64 000	14-25	1 598 400	4	69 600	CCF56	1 598 400	64 000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS	CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53 526 700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	394 100	0		0		0	0	0	0	394 100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	603 300	0		0		0	0	0	0	603 300	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4 373 100	0		0		0	0	0	0	4 373 100	22
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	420 000	0		0		0	0	0	0	420 000	5
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	468 200	0		0		0	0	0	0	468 200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2 036 500	0		0		0	0	0	0	2 036 500	22
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	115 000	0		0		0	0	0	0	115 000	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	52 000	0		0		0	0	0	0	52 000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3 105 800	0	0	0	0	0	0		3 105 800	9
230301	Porvenir	800224808-8	14 008 600	0	0	56 600	56 600	0	0		14 121 800	42
231001	Colfondos	800227940-6	1 454 600	0	0	0	0	0	0		1 454 600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	10 542 100	0	0	210 200	210 200	0	0		10 962 500	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7 631 800				7 631 800	0	0	7 631 800			76 318	7 631 800	70

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	7 090 500	0	0	7 090 500	70

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53.526.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
279.000	0	0	279.000	1
ICBF				
418.500	0	0	418.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	8.462.200	8.462.200
Pensión	4	29.644.700	29.644.700
Riesgos Laborales	1	7.631.800	7.631.800
CCF	1	7.090.500	7.090.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	418.500	418.500
MEN	0	0	0
SENA	1	279.000	279.000
TOTALES	16	53.526.700	53.526.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53.526.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	6097197	GOMEZ MACICAYA JAIME	1	0			S										X							25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	0	CCF56	1.300.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	6102111	MOSCOSO SANCHEZ JOHN EDWIN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF56	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	6333013	RAMOS BENAVIDES EULISES	1	0			S								X									230301	1.662.445	266.000	0	0	0	0	EPS012	1.662.445	66.500	14-25	1.662.445	4	72.400	CCF56	1.662.445	66.500	0	0	0	0	0
4	CC	6626711	BERMUDEZ NIEVA HECTOR JAIRO	1	0			S								X									25-14	1.665.554	266.500	0	0	0	0	EPS012	1.665.554	66.700	14-25	1.665.554	1	8.700	CCF56	1.665.554	66.700	0	0	0	0	0
5	CC	11708195	VARELA MOSQUERA JABER	1	0			S								X									230301	2.467.062	394.800	0	0	0	0	EPS037	2.467.062	98.700	14-25	2.467.062	5	171.800	CCF56	2.467.062	98.700	0	0	0	0	0
6	CC	12918326	SEVILLANO TEODORO	1	0			S								X									25-14	2.426.322	388.300	0	0	0	0	EPS002	2.426.322	97.100	14-25	2.426.322	5	168.900	CCF56	2.426.322	97.100	0	0	0	0	0
7	CC	14575682	CHITO GUZMAN ALONSO	1	0			S										X							25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-25	86.667	5	0	CCF56	86.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	14575682	CHITO GUZMAN ALONSO	1	0			S								X									25-14	1.722.444	275.600	0	0	0	0	EPS010	1.722.444	68.900	14-25	1.722.444	5	119.900	CCF56	1.722.444	68.900	0	0	0	0	0
9	CC	16765921	GARCIA GRAJALES EDINSON	1	0			S												X					25-14	540.222	86.500	0	0	0	0	EPS037	540.222	21.700	14-25	540.222	4	0	CCF56	479.693	19.200	0	0	0	0	0
10	CC	16765921	GARCIA GRAJALES EDINSON	1	0			S								X									25-14	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-25	823.334	4	35.900	CCF56	650.000	26.000	0	0	0	0	0
11	CC	16781993	DURAN PEREZ HUGO	1	0			S																	25-14	6.372.000	1.019.600	0	0	31.900	31.900	EPS010	6.372.000	254.900	14-25	6.372.000	1	33.300	CCF56	6.372.000	254.900	0	0	0	0	0
12	CC	16796605	CHATES RAMIREZ MARLON JAIR	1	0			S								X									25-14	2.727.428	436.400	0	0	0	0	EPS010	2.727.428	109.100	14-25	2.727.428	5	189.900	CCF56	2.727.428	109.100	0	0	0	0	0
13	CC	16948772	ALEGRIA LUIS FELIPE	1	0			S								X									230301	1.899.893	304.000	0	0	0	0	EPS012	1.899.893	76.000	14-25	1.899.893	1	10.000	CCF56	1.899.893	76.000	0	0	0	0	0
14	CC	31572778	RAMIREZ CAMPO PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230301	2.311.826	369.900	0	0	0	0	EPS005	2.311.826	92.500	14-25	2.311.826	4	100.600	CCF56	2.311.826	92.500	0	0	0	0	0
15	CC	66814952	GARCES TORRES MAGDA VIVIANA	1	0			S								X									230301	6.024.107	963.900	0	0	30.200	30.200	EPS010	6.024.107	241.000	14-25	6.024.107	5	419.300	CCF56	6.024.107	241.000	0	0	0	0	0
16	CC	66858054	DURAN PEREZ ELIZABETH	1	0			N								X									25-14	13.947.838	2.231.700	0	0	69.800	69.800	EPS010	13.947.838	1.743.500	14-25	13.947.838	5	970.800	CCF56	13.947.836	558.000	13.947.836	279.000	418.500	0	0
17	CC	66954100	PAQUE ROJAS MABEL	1	0			S								X									25-14	4.450.000	712.000	0	0	0	0	EPS005	4.450.000	178.000	14-25	4.450.000	1	23.300	CCF56	4.450.000	178.000	0	0	0	0	0
18	CC	66987711	ASTUDILLO MEJIA ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	1.890.000	302.400	0	0	0	0	EPS010	1.890.000	75.600	14-25	1.890.000	1	9.900	CCF56	1.890.000	75.600	0	0	0	0	0
19	CC	67006959	DURAN PEREZ MARCELA	1	0			S								X									25-14	10.149.360	1.623.900	0	0	50.800	50.800	EPS010	10.149.360	406.000	14-25	10.149.360	1	53.000	CCF56	10.149.360	406.000	0	0	0	0	0
20	CC	76140801	FORY MERA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	3.100.630	496.200	0	0	0	0	EPS037	3.100.630	124.100	14-25	3.100.630	5	215.900	CCF56	3.100.630	124.100	0	0	0	0	0
21	CC	94071833	GAMBOA GUZMAN JIMY	1	0			S								X									231001	1.995.781	319.400	0	0	0	0	EPS037	1.995.781	79.900	14-25	1.995.781	1	10.500	CCF56	1.995.781	79.900	0	0	0	0	0
22	CC	94361713	BOJORGE APOLINDAR JOSE INEL	1	0			S								X									230301	2.075.945	332.200	0	0	0	0	EPS037	2.075.945	83.100	14-25	2.075.945	5	144.500	CCF56	2.075.945	83.100	0	0	0	0	0
23	CC	94370979	IBARRA LEONARDO FABIO	1	0			S								X									230301	1.736.206	277.800	0	0	0	0	EPS037	1.736.206	69.500	14-25	1.736.206	5	120.900	CCF56	1.736.206	69.500	0	0	0	0	0
24	CC	94421026	ZAPATA FIGUEROA LUIS ALFREDO	1	0			S								X									230201	3.404.021	544.700	0	0	0	0	EPS012	3.404.021	136.200	14-25	3.404.021	5	237.000	CCF56	3.404.021	136.200	0	0	0	0	0
25	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S										X							230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS018	996.667	39.900	14-25	996.667	1	0	CCF56	996.667	0	0	0	0	0	0
26	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S																	230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS018	303.334	12.200	14-25	303.334	1	1.600	CCF56	303.333	12.200	0	0	0	0	0
27	CC	94458904	MOSQUERA VALENCIA NELSON FABIO	1	0			S												X					25-14	851.585	136.300	0	0	0	0	EPS037	851.585	34.100	14-25	851.585	5	0	CCF56	759.780	30.400	0	0	0	0	0
28	CC	94458904	MOSQUERA VALENCIA NELSON FABIO	1	0			S								X									25-14	1.828.062	292.500	0	0	0	0	EPS037	1.828.062	73.200	14-25	1.828.062	5	127.300	CCF56	1.828.062	73.200	0	0	0	0	0
29	CC	94459463	ARCE ESPINOSA BLADIMIR	1	0			S								X									25-14	11.528.531	1.844.600	0	0	57.700	57.700	EPS010	11.528.531	461.200	14-25	11.528.531	1	60.200	CCF56	11.528.531	461.200	0	0	0	0	0
30	CC	94529079	GARCIA CAMAÑO NEIR	1	0			S								X									25-14	1.863.217	298.200	0	0	0	0	EPS012	1.863.217	74.600	14-25	1.863.217	1	9.800	CCF56	1.863.217	74.600	0	0	0	0	0
31	CC	1002946450	BALLESTEROS MINA DUVAN YESID	1	0			S								X									230201	2.419.130	387.100	0	0	0	0	EPS010	2.419.130	96.800	14-25	2.419.130	1	12.700	CCF56	2.419.130	96.800	0	0	0	0	0
32	CC	1005866633	PALACIOS MOSQUERA KEVIN	1	0			S								X									230301	2.151.660	344.300	0	0	0	0	EPS018	2.151.660	86.100	14-25	2.151.660	5	149.800	CCF56	2.151.660	86.100	0	0	0	0	0
33	CC	1005944956	DINAS MONTAÑO JUAN CAMILO	1	0			S								X									230301	1.634.043	261.500	0	0	0	0	EPS037	1.634.043	65.400	14-25	1.634.043	5	113.800	CCF56	1.634.043	65.400	0	0	0	0	0
34	CC	1007517299	CONGOLINO BONILLA DAMIAN	1	0			S								X									230301	1.736.942	278.000	0	0	0	0	EPS010	1.736.942	69.500	14-25	1.736.942	5	120.900	CCF56	1.736.942	69.500	0	0	0	0	0
35	CC	1010053989	MESA MARIO	1	0			S								X									231001	2.878.874	460.700	0	0	0	0	EPS018	2.878.874	115.200	14-25	2.878.874	5	200.400	CCF56	2.878.874	115.200	0	0	0	0	0
36	CC	1061811464	VALENCIA PERLAZA EVA MARIA	1	0			S								X									25-14	1.711.675	273.900	0	0	0	0	EPS010	1.711.675	68.500	14-25	1.711.675	1	9.000	CCF56	1.711.675	68.500	0	0	0	0	0
37	CC	1086054117	OTERO CAICEDO LEWINSON	1	0			S								X									230201	2.516.154	402.600	0	0	0	0	EPS002	2.516.154	100.700	14-25	2.516.154	5	175.200	CCF56	2.516.154	100.700	0	0	0	0	0
38	CC	1089000630	GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.687.878	430.100	0	0	0	0	EPS010	2.687.878	107.600	14-25	2.687.878	5	187.100	CCF56	2.687.878	107.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B - menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 70 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53 526 700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	1092357221	CARABALI MINDINERO KEYLA YELISA	1	0			S	x																230301	720 000	115 200	0	0	0	0	EPS010	720 000	28 800	14-25	720 000	1	3 800	CCF56	720 000	28 800	0	0	0	0	0
40	CC	1107034988	RINCON POLANCO JAVIER ANTONIO	1	0			S								x									231001	1 974 303	315 900	0	0	0	0	EPS010	1 974 303	79 000	14-25	1 974 303	5	137 500	CCF56	1 974 303	79 000	0	0	0	0	0
41	CC	1107512806	JIMENEZ DIAZ ERIKA LIZETH	1	0			S								x									230301	2 500 000	400 000	0	0	0	0	EPS010	2 500 000	100 000	14-25	2 500 000	1	13 100	CCF56	2 500 000	100 000	0	0	0	0	0
42	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0			S												x					230301	816 533	130 700	0	0	4 100	4 100	EPS037	816 533	32 700	14-25	816 533	2	0	CCF56	857 952	34 400	0	0	0	0	0
43	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0			S								x									230301	4 447 886	711 700	0	0	22 300	22 300	EPS037	4 447 886	178 000	14-25	4 447 886	2	46 500	CCF56	4 447 886	178 000	0	0	0	0	0
44	CC	1112465125	RASCOS CAICEDO HECTOR EVERT	1	0			S								x									230201	1 665 272	266 500	0	0	0	0	EPS018	1 665 272	66 700	14-25	1 665 272	5	116 000	CCF56	1 665 272	66 700	0	0	0	0	0
45	CC	1112497173	SINISTERRA MARTINEZ ROBINSON	1	0			S								x									230301	2 302 591	368 500	0	0	0	0	EPS037	2 302 591	92 200	14-25	2 302 591	5	160 300	CCF56	2 302 591	92 200	0	0	0	0	0
46	CC	1113039563	MORENO ORTIZ CARLOS EFREN	1	0			S								x									230301	2 481 231	397 000	0	0	0	0	EPS037	2 481 231	99 300	14-25	2 481 231	5	172 700	CCF56	2 481 231	99 300	0	0	0	0	0
47	CC	1113533697	REINA SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	1 512 000	242 000	0	0	0	0	EPS010	1 512 000	60 500	14-25	1 512 000	1	7 900	CCF56	1 512 000	60 500	0	0	0	0	0
48	CC	1113537662	DIAZ CALLE LINDA MELANNY	1	0			S																	230301	1 512 000	242 000	0	0	0	0	EPS010	1 512 000	60 500	14-25	1 512 000	1	7 900	CCF56	1 512 000	60 500	0	0	0	0	0
49	CC	1113673736	PERLAZA OCORO DALLANA ANDREA	1	0			S								x									230301	2 726 956	436 400	0	0	0	0	EPS037	2 726 956	109 100	14-25	2 726 956	5	189 800	CCF56	2 726 956	109 100	0	0	0	0	0
50	CC	1116258447	RAMIREZ BORBON DIANA CRISTINA	1	0			S								x									230301	2 290 000	366 400	0	0	0	0	EPS010	2 290 000	91 600	14-25	2 290 000	1	12 000	CCF56	2 290 000	91 600	0	0	0	0	0
51	CC	1118290088	RIVAS SERNA STEVENSON SAUL	1	0			S								x									230301	1 936 703	309 900	0	0	0	0	EPS018	1 936 703	77 500	14-25	1 936 703	5	134 800	CCF56	1 936 703	77 500	0	0	0	0	0
52	CC	1118306208	ESCOBAR TAMAYO MIGUEL ENRIQUE	1	0			S								x									230301	2 433 520	389 400	0	0	0	0	EPS037	2 433 520	97 400	14-25	2 433 520	5	169 400	CCF56	2 433 520	97 400	0	0	0	0	0
53	CC	1130662578	MENDOZA BENITEZ OSCAR ANDRES	1	0			S									x								230301	116 086	14 000	0	0	0	0	EPS037	116 086	0	14-25	116 086	5	0	CCF56	116 086	0	0	0	0	0	0
54	CC	1130662578	MENDOZA BENITEZ OSCAR ANDRES	1	0			S								x									230301	2 155 100	344 900	0	0	0	0	EPS037	2 155 100	86 300	14-25	2 155 100	5	150 000	CCF56	2 155 100	86 300	0	0	0	0	0
55	CC	1143850532	BEDOYA ANGULO DIEGO FERNANDO	1	0			S								x									230301	1 754 152	280 700	0	0	0	0	EPS005	1 754 152	70 200	14-25	1 754 152	5	122 100	CCF56	1 754 152	70 200	0	0	0	0	0
56	CC	1143927023	ANGULO GARCES JEFFERSON	1	0			S								x									230301	2 290 975	366 600	0	0	0	0	EPS037	2 290 975	91 700	14-25	2 290 975	5	159 500	CCF56	2 290 975	91 700	0	0	0	0	0
57	CC	1143928796	CHAVERRA SANCHEZ RUBEN DARIO	1	0			S	x																230301	780 000	124 800	0	0	0	0	EPS042	780 000	31 200	14-25	780 000	4	34 000	CCF56	780 000	31 200	0	0	0	0	0
58	CC	1143935301	VILLEGAS MOSQUERA EDWIN	1	0			S								x									231001	2 241 033	358 600	0	0	0	0	EPS037	2 241 033	89 700	14-25	2 241 033	5	156 000	CCF56	2 241 033	89 700	0	0	0	0	0
59	CC	1143956489	ARROYO WILMAR FERNANDO	1	0			S								x									230301	2 564 300	410 300	0	0	0	0	EPS037	2 564 300	102 600	14-25	2 564 300	5	178 500	CCF56	2 564 300	102 600	0	0	0	0	0
60	CC	1144067680	FLOREZ ALVAREZ ANDREA ESTEFANNA	1	0			S								x									230301	1 960 043	313 700	0	0	0	0	EPS010	1 960 043	78 500	14-25	1 960 043	5	136 500	CCF56	1 960 043	78 500	0	0	0	0	0
61	CC	1144079801	RIVERA OCAMPO CATALINA	1	0			S																	230301	1 500 000	240 000	0	0	0	0	EPS005	1 500 000	60 000	14-25	1 500 000	1	7 900	CCF56	1 500 000	60 000	0	0	0	0	0
62	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	1	0			S								x									230301	2 095 000	335 200	0	0	0	0	EPS002	2 095 000	83 800	14-25	2 095 000	5	145 900	CCF56	2 095 000	83 800	0	0	0	0	0
63	CC	1144092861	RESTREPO MUÑOZ SEBASTIAN	1	0			S								x									230301	1 878 104	300 500	0	0	0	0	EPS037	1 878 104	75 200	14-25	1 878 104	5	130 800	CCF56	1 878 104	75 200	0	0	0	0	0
64	CC	1144175950	GARZON DEVIA CRISTIAN JULIAN	1	0			S												x					230301	704 120	112 700	0	0	0	0	EPS010	704 120	28 200	14-25	704 120	2	0	CCF56	501 295	20 100	0	0	0	0	0
65	CC	1144175950	GARZON DEVIA CRISTIAN JULIAN	1	0			S								x									230301	1 061 482	169 900	0	0	0	0	EPS010	1 061 482	42 500	14-25	1 061 482	2	11 100	CCF56	1 061 482	42 500	0	0	0	0	0
66	CC	1144177056	CALDERON CHIRAN VIVIAN ANDREA	1	0			S	x	x															230301	476 667	76 300	0	0	0	0	EPS010	476 667	19 100	14-25	476 667	1	2 500	CCF56	476 667	19 100	0	0	0	0	0
67	CC	1144180358	MORENO GUTIERREZ MARIA FERNANDA	1	0			S								x									230301	1 955 339	312 900	0	0	0	0	EPS010	1 955 339	78 300	14-25	1 955 339	5	136 100	CCF56	1 955 339	78 300	0	0	0	0	0
68	CC	1150935219	VARGAS LOPEZ JOEL ANDRES	1	0			S												L					230301	284 163	45 500	0	0	0	0	EPS037	284 163	11 400	14-25	284 163	5	0	CCF56	433 335	17 400	0	0	0	0	0
69	CC	1150935219	VARGAS LOPEZ JOEL ANDRES	1	0			S								x									230301	1 577 926	252 500	0	0	0	0	EPS037	1 577 926	63 200	14-25	1 577 926	5	109 900	CCF56	1 577 926	63 200	0	0	0	0	0
70	CC	1151447926	MONTOYA CORAL JEISON ALEXANDER	1	0			S								x									230301	1 416 576	226 700	0	0	0	0	EPS005	1 416 576	56 700	14-25	1 416 576	1	7 400	CCF56	1 416 576	56 700	0	0	0	0	0
71	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0			S										x							230301	1 256 667	201 100	0	0	0	0	EPS037	1 256 667	50 300	14-25	1 256 667	1	0	CCF56	1 256 667	0	0	0	0	0	0
72	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0			S								x									230301	43 334	7 000	0	0	0	0	EPS037	43 334	1 800	14-25	43 334	1	300	CCF56	21 667	900	0	0	0	0	0
73	CC	1151956797	LOPEZ HURTADO FABIAN JOSE	1	0			S								x									230301	2 346 770	375 500	0	0	0	0	EPS005	2 346 770	93 900	14-25	2 346 770	5	163 400	CCF56	2 346 770	93 900	0	0	0	0	0
74	CC	1151966819	BETANCOURTH FREIRE LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1 512 000	242 000	0	0	0	0	EPS002	1 512 000	60 500	14-25	1 512 000	2	15 800	CCF56	1 512 000	60 500	0	0	0	0	0
75	CC	1192911700	CORDOBA MONDRAGON TERESA	1	0			S								x									230301	1 300 000	208 000	0	0	0	0	ESSC18	1 300 000	52 000	14-25	1 300 000	1	6 800	CCF56	650 000	26 000	0	0	0	0	0
76	CC	1193043782	PALACIOS CAICEDO XIOMARA	1	0			S																	230201	1 764 000	282 300	0	0	0	0	EPS018	1 764 000	70 600	14-25	1 764 000	1	9 300	CCF56	1 764 000	70 600	0	0	0	0	0
77	CC	1193205741	BAÑOL ZAPATA KEVIN STIVEN	1	0			S								x									230301	2 594 117	415 100	0	0	0	0	EPS037	2 594 117	103 800	14-25	2 594 117	5	180 600	CCF56	2 594 117	103 800	0	0	0	0	0
78	CC	1193394854	CORREA REBOLLEDO DAVID	1	0			S								x									230301	2 092 913	334 900	0	0	0	0	EPS042	2 092 913	83 800	14-25	2 092 913	5	145 700	CCF56	2 092 913	83 800	0	0	0	0	0
79	CC	1214745918	DORADO ZEMANATE LIZETH GABRIELA	1	0			S					x			x									230201	1 727 000	276 400	0	0	0	0	EPS037	1 727 000	69 100	14-25	1 727 000	4	75 200	CCF56	1 727 000	69 100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	GCT-FO-0030
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		

TRD: 180.10.06

CONTRATO No. :	180-10-06-005-2024
NÚMERO DE PROCESO:	SAMC-SI-004-2024
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA,
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA S.A.S NIT 890.319.290-1 Representante legal Hugo Duran Pérez
OBJETO:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS (CALENDARIO)
FECHA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE OTRO SÍ No. 1:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE OTRO SÍ No. 1:	SEIS (6) DÍAS (CALENDARIO)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Dentro de los precios del contrato de Obra Pública No. 180-10-06-005-2024 cuyo objeto es "limpieza, investigación con CCTV y reparación de puntual sin zanja de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente

mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20D entre calles 14 y 15, carrera 20E entre calles 13 y 15, carrera 20G entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo", y en el cual los ítems enumerados a continuación **NO** se encontraban como ítems aprobados.

Estos ítems fueron actualizados acorde a las actividades ejecutadas en el sector ACOPI, durante la ejecución del contrato se encontró en la inspección diferencias de los diámetros de las tuberías del contrato con los diámetros de los planos de redes de alcantarilladlo existente suministrados por la ESPY y por EMCALI y las condiciones reales evidenciadas en la investigación y diagnóstico en sitio, de las tuberías.

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	16"	ML		243,6	243,6
4,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	21"	ML		228,3	228,3
4,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	15"	ML		136,0	136,0
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	21"	ML		257,6	257,6
4.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		68,7	68,7
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 39-40	12"	ML		102,7	102,7
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	12"	ML		85,2	85,2

Una vez realizada la inspección de la tubería de Hormigón simple de 15" en la Carrera 38 entre calles 12A -13, se encontró que presentaba asentamiento y deterioro de un tramo de 5 m, lo que hace necesario debido al alto tráfico vehicular de vehículos pesados, mulas y camiones de transporte, realizar la reparación del tramo. El detalle de los ítems y las cantidades de obra acorde a los precios de la Gobernación del Valle Decreto 1.22-1441 del 14 de agosto de 2024 tomado de la Gaceta Departamental del 16 de agosto de 2024 y en cuanto al precio de retiro de material, el contratista presenta el APU.

Código	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD EJECUTADA
80107	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA 1,8 M SR	m3	13,5
APU	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA DISTANCIAS > 10 KM	m3	17,55
100616	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO	m3	4,6449
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO - RANA	m3	8,775
80201	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR SIN TRANSPORTE	m3	7,02
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14" A 24"	ML	5
100623	ACARRRERO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M	m3	20,4399

20307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 15" UNION CAUCHO	ML	5
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CM 250 MTS	UND	1

Los ítems de mayor cantidad de obra, a la contractual se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
			LAVADO	INSPECCION
ITEMS DE MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA				
1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14 DIAMETRO 36"	ML	170,78	170,78

Para constancia se firma en Yumbo a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma:

Carlos Eduardo Brion Molina
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura
y Servicios Públicos

Firma:

Hugo Duran Pérez
Representante Legal
Compañía de ingeniería sanitaria
CODINSA S.A.S

Firma:

Viviany Ortiz Rico
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura Servicios Públicos

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Sur - Cali

CERTIFICA QUE:

La Empresa COMPANIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.890319290 de CALI (VALLE DEL CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.011100775806, con apertura el día 2015/04/24 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 18 de mes de Diciembre del año 2024.

Atentamente,

Tatiana Manzano

Colaborador Bancoomeva
Usuario:TAMM3422

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 24-11-2024 Lavado tubería 12" en la calle 12A entre cra 40 y 39, red en optimas condiciones. 102.73 mts	Cristian Castro	Vladimir Mace	
- 25-11-2024 Lavado tubería 18" en la calle 12A entre cra 38-39. red en optimas condiciones 103.75 mts.	Cristian Castro	Vladimir Mace	
- 28-11-2024 Lavado tubería 16" en la cra 38 entre cll 12A y calle 13 243,59 mts red en optimas condiciones, lavado tubería 36" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 259.73 mts red en optimas condiciones, lavado tubería 15" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 166,23 mts red en optimas condiciones.	Cristian Castro	Vladimir Mace	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 29-11-2024 Lavado tuberia 12" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 red en optimas condiciones, presenta acometidas penetrantes. 261.57 mts	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
- 4-12-2024 Lavado tuberia 18" en la cra 39 entre cll 13 y cll 14, durante el lavado se evidencia presencia de lodos hidrocarburados y camaras ocultas. que no permitieron un optimo lavado. 77.4 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
- 7-12-2024 Lavado tuberia 55" en la cra 38 entre cll 13 y cll 14, red en optimas condiciones, presenta tapas olañadas. en la cll 13 lado izquierdo y en la cll 14 presenta nivel de agua al 50%. 253.07 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	8 - 12 - 2024 lavado tuberia 27" en la cra 37 entre cll 12 y cll 13, red en optimas condiciones, presenta nivel de agua 50% 381.93 mts.	CristianCastan	Vladimir Arce	
-	9 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado. funcionando represada. presenta más del 50%. de material al interior de la tuberia. 228.29 mts	CristianCastan	Vladimir Arce	
-	10 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado presenta más del 50% de material al interior de la tuberia. 228.29 mts. Lavado tuberia 27" en la cll 12A entre cra 37 y cra 38, red funcionando en optimas condiciones, presenta raices, en la misma direccion se lava tuberia de 36" red en optimas condiciones 99.28 mts.	CristianCastan	Vladimir Arce	

	Técnico	Supervisor	Interventor
- 11-12-2024. Lavado tubería 21" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15 lado derecho, red de alcantarillado funcionando represada, presenta más del 50% de material al interior de la tubería. 135.95 mts	Cristian Cortés	Vladimir Arce	
- 16-12-2024 Lavado tubería 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado represada, se evidencia ladrillo, lavado tubería 12" en la cara 38 entre cll 14 y 15, red de alcantarillado presenta lodos hidrocarburados.	Cristian Cortés	Vladimir Arce	
- 17-12-2024. Lavado tubería 20" en la calle 13 entre cra 39 y cra 38, red de alcantarillado funcionando en optimas condiciones, presenta acumulación de solidos pesados. 100 mts		Vladimir Arce	

	Tecnico	Supervisor	Interventor.
- 18-12-2024. Lavado tubería 24" en la calle 15 entre cra 38 y cra 37 100 mts Aprox, Lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material al interior de la tubería 150 mts Aprox.		Vladimir Lince	
- 20-12-2024. Lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material con hidrocarburos de los cuales se hace disposición en la Ptar cercar, la tubería aun tiene material.		Vladimir Lince	
- 21-12-2024. Se realiza reparación de tubería 15" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 5.08 mts, Se realiza apertura de zanja, Se retira la tubería dañada y se procede a adecuar el terreno para la instalación de la tubería nueva, se instala tubería a las 16:00, se espera reanudar labores por fuerte lluvia, Se inicia 19:00 a la instalación de la grava y la retroexcavadora Se termina labor a las 23:00.		Vladimir Lince	

REPORTE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES

SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	**FECHA REPORTE:**	/ 20	/ 12	/ 2024

1. DATOS GENERALES.

Contrato No:	180-10-06-005-2024	Fecha: / 20 / 11 / 2024
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA-RIA CODINSA S.A.S Representante legal: Hugo Duran Pérez	C.C. o NIT: 890.319.290-1
Certificado de disponibilidad:	Nº 20243908	Fecha: / 16 / 09 / 2024
Valor contrato:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)	
Objeto del contrato:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	
Ubicación:	ZONA INDUSTRIAL DE ACOPI Y CENCAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO	

2. FORMA DE PAGO.

Primer desembolso (Anticipo)	Acta parcial 1	Acta parcial 2	Acta parcial 3	Pago Final	Total, a pagar (deducida amortización parcial anticipo)
0	**$186.223.546,00**				**$186.223.546,00**

3. IDENTIFICACION DEL BIEN.

El bien está legalizado:		Si	x	No
No. de escritura:		Fecha: / DIA / / AÑO		
No. Matricula Inmobiliaria:				

4. EL CONTRATO CORRESPONDE A:

(Marque con X según corresponda)

-Adquisición		-Mantenimiento	X
-Adecuación		-Reposición	
-Adición		-Reparación	X
-Mejoramiento		-Construcción	X
		-Otro	

5. CUENTAS CONTABLES Y VALORES QUE AFECTAN EL CONTRATO.

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1605	**TERRENOS**		
160501	Urbanos		
160502	Rurales		
160503	Terrenos con destinación ambiental		
160504	Terrenos pendientes de legalizar		
160505	Terrenos de propiedad de terceros		
1615	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**		
161501	Edificaciones		
16150100100	Edificios y casas		
16150100100	Edificación CAMY		
16150100100	Casas - Juntas de acción comunal		
16150100100	Plaza de mercado		
16150100100	CAI - POLICIA		
161501002	Oficinas		
161501003	Locales		
16150100400	Colegios y escuelas		
16150100400	Centros de desarrollo infantil CDI		
161501005	Clínicas y hospitales		
16150100500	Puestos de salud		
161501006	Parqueaderos y garajes		
161501007	Bodegas		
161501008	Instalaciones deportivas y recreacionales		
161501009	Tanques de almacenamiento		
1640	**EDIFICACIONES**		
164001001	Edificios y casas		
164001002	Edificación CAMY		
164001003	Casas - Juntas de acción comunal		
164001004	Plaza de mercado		
164001005	CAI - POLICIA		
164002	Oficinas		
164004	Locales		
164009001	Colegios y escuelas		
164009002	Centros de desarrollo infantil CDI		
164010	Clínicas y hospitales		
164010001	Puestos de salud		
164015	Casetas y campamentos		
164017	Parqueaderos y garajes		
164018	Bodegas		
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales		
164024	Tanques de almacenamiento		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar		
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		
164090	Otras edificaciones		
1645	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**		
164502	Plantas de tratamiento		
164513	Acueducto y canalización		
164515	Plantas, ductos y túneles pendientes de legalizar		
164516	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros		
164590	Otras plantas, ductos y túneles		
1650	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**		
165002	Redes de distribución		
165003	Redes de recolección de aguas		
165003001	Alcantarillado	**$186.223.546,00**	**$186.223.546,00**

165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar		
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros		
165090	Otras redes, líneas y cables		
1705	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**		
170501	Red carretera		
170501001	Red carretera - Vías vehiculares urbanas		
170501002	Red carretera - Vías vehiculares rurales		
170501003	Puentes		
170501004	Muros		
170501005	Zonas verdes		
170501006	Andenes		
170501007	Canales - Aguas lluvias		
170501008	Gradas		
170501009	Huellas		
170501010	Semaforización y señalización vías		
170504	Plazas públicas		
170504001	Parques públicos		
170505	Parques recreacionales		
170510	Bibliotecas		
170516	Terrenos		
170516001	Urbanos		
170516002	Rurales		
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**		
171001001	Red carretera - vías vehiculares urbanas		
171001002	Red carretera - vías vehiculares rurales		
171001003	Puentes		
171001004	Muros		
171001005	Zonas verdes		
171001006	Andenes		
171001007	Canales - Aguas lluvias		
171001008	Gradas		
171001009	Huellas		
171001010	Semaforización y señalización vías		
171004	Plazas públicas		
171004001	Parques públicos		
171005	Parques recreacionales		
171010	Bibliotecas		
171014	Terrenos		
171014001	Urbanos		
171014002	Rurales		
171090	Otros bienes de uso público en servicio		

Firma
Nombre: **CARLOS EDUARDO BRION MOLINA**

Secretaria de Infraestructura y servicios públicos

Elaboró: Viviany Ortiz Rico -Profesional de Apoyo a la Supervisión SISP

carpeta

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Entrada
27/12/2024
No. de Comprobante de Entrada
2024.CEN.01.000025

No. Programación de Compras: 2024.CEN.01.000055 **Fecha de Programación de Compras:** 27 / 12 / 2024

ENTRADA DE BIENES INMUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
CODINSA LTDA.	890.319.290	20 / 12 / 2024	REPORTE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES

Teléfono	Dirección	Ciudad
668 10 74	AVEN. 9A norte 10-117	

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS	BODEGA DE BIENES INMUEBLES	MUÑOZ FABRA SILVIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
951216330071	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO ACOPI CALLE 12, 12A,13, 14 Y 15 ENTRE CRA 37 Y 39; CENCAR CRA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CRA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CRA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE YUMBO	BIEN-00373	186.223.546,00	186.223.546,00	0

Valor en Letras:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12 A, 13,14Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20 E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

SUBTOTAL	$ 186.223.546,00
DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL	**$ 186.223.546,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
16150500020001 - ALCANTARILLADO	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 186.223.546,00	$ 0,00
2401010007 - CUENTA PUENTE -ENTRADAS DE ALMA	890319290 - CODINSA LTDA.	$ 0,00	$ 186.223.546,00
TOTALES			

Elaborado:

MUÑOZ FABRA SILVIA
TÉCNICO OPERATIVO

Aprobado:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido:

SECRETARIO DE DESPACHO

CODINSA SAS-EN REORGANIZACION

NIT : 890,319,290 - 1
CRA 39 11 166 ACOPI
YUMBO - COLOMBIA
6026574031
CONTABILIDAD@CODINSA COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3307 Tarifa 10,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVC 8932

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-27 11:54:57
Expedición 2024-12-27 12:12:30
Vencimiento 2025-01-27

Cliente ALCALDIA DE YUMBO
NIT 890,399,025 - 6
Dirección CLL 5 4 40
Ciudad NO USAR - COLOMBIA
Correo infraestructura@yumbo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6516600
Vendedor ARCE ESPINOSA
Centro Costo 1.008
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	IVA
0090001000001	ACTA DE PAGO NO.1 CONTRATO NO. 180-10-06-005-2024 OBJETO: LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.	UND	1.00	186,223,546.00	186,223,546.00	0,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto 186,223,546.00
Total a Pagar **$ 186.223.546,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Cxc Fuera De Cali Efectivo 186.223.546,00 Cuota 15 Vence el 2025-01-27

Firma Elaborado por : KEYLA CARABALI

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOOMEVA No. 011100775806 - BOGOTA 249037870 O PAGO EN LINEA POR BOTON PSE ATRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.CODINSA.COM REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082010261 aprobado en 2024-10-23 vigente 24 Meses, prefijo FEVC desde el número 8505 al 9505

CUFE :35a3455b3f859d5447ca0d3fc0236061ed0f6ae6c012ff5740f4910e04087acfe67865b5aead399d3546f3263a80a636

ORIGINAL



CODINSA SAS-EN REORGANIZACION

NIT : 890,319,290 - 1
CRA 39 11 166 ACOPI
YUMBO - COLOMBIA
6026574031
CONTABILIDAD@CODINSA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3307 Tarifa 10,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVC 8932

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-27 11:54:57
Expedición 2024-12-27 12:12:30
Vencimiento 2025-01-27

Cliente ALCALDIA DE YUMBO
NIT 890,399,025 - 6
Dirección CLL 5 4 40
Ciudad NO USAR - COLOMBIA
Correo infraestructura@yumbo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6516600
Vendedor ARCE ESPINOSA
Centro Costo 1.008
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	IVA

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Seis Millones Doscientos Veintitres Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDENADO POR: CARLOS EDUARDO BRION MOLINA (SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA)

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEYLA CARABALI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082010261 aprobado en 2024-10-23 vigente 24 Meses, prefijo FEVC desde el número 8505 al 9505

CUFE 35a3455b3f859d5447ca0d3fc0236061ed0f6ae6c012ff5740f4910e04087acfe67865b5aead399d3546f3263a80a636

ORIGINAL

Alcaldia de Yumbo

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 TRD: VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

30 DIC 2024

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº FEVC-8932

por valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS** **$ 186.223.546,00**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO ACTA PARCIAL 1 AL CONTRATO No: 180-10-06-005-2024 CORRESPONDIENTE LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALADO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. QUE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12,12A,13,14,Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 186.223.546,00	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARA CODINSA SAS	890.319.290-1

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

POR CONCEPTO DE:

ACTA PARCIAL 1 AL CONTRATO No.180-10-06-005-2024 CORRESPONDIENTE LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLIUVIAL Y COMBINADO, INSTALDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO.QUE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE12,12A,13,14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15 CARRERA 20E CALLES 13 Y 15 CARRERA 20G CALLE 14 Y 15)EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

VALOR TOTAL		$	
BASE LIQUIDACION $	529.734.749,00	$	186.223.546,00
BASE IVA			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2 %	$	3.724.471,00
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	1.862.235,00
(-) ESTAMPILLA UNI PACIFICO			
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5 %	$	2.648.674
(-) ESTAMPILLA PRODEPORTE	2.5 %	$	4.655.587,00
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2 %	$	10.594.695
(-)PLAN VIAL	5 %	$	9.311.177,00
(-) RETE ICA	0.6 %	$	1.117.341,00
VALOR NETO		$	152.309.364,00

CODIFICACION CONTABLE	
DEBITO	CREDITO

CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los,

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. **001**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE-23-2024		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	180-10-06-005-2024		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		
NIT.	890.319.290-1		
DIRECCIÓN	CARRERA 39 # 11-166 ACOPI		
TELEFONO	602-6574031		
OBJETO DEL CONTRATO	LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PLUVIAL Y COMBINADO,INSTALADO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL,COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO,QUE SE UNE EN LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12,12A,13,14 Y 15ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR(CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.		
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 25-2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE-31-2024		
PRORROGA	SI		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO X	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El municipio de Yumbo pagará el valor del contrato, teniendo en cuenta el respectivo registro presupuestal, de la siguiente manera: El noventa (90) por ciento del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de la mismas a la supervisión. La primera de las actas parciales no se podrá realizar en tanto el avance de la obra,		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No.20242908	Fecha:2024-09-12	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No.20243681	25/11/2024	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. FEVC-8932 $ 186.223.546,00 FECHA:DICIEMBRE-23-2024		Documento equivalente No.	
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 529.734.749		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 186.223.546,01	$ 343.511.202,99
ACTA DE PAGO Nº 2			
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACTA DE PAGO Nº 5			
ACUMULADO		$ 186.223.546,01	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - 99,84 % TOTAL ACUMULADO 64,684%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Rsolucion de aprobacion polizas	
Acta Parcial No. 1	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) el dia (27) mes de DICIEMBRE del 2024

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Cargo: Secretario de Infraestructura y servicios publicos

Elaboró: - Luz Yanelly garcia - secretaria
