Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO:	GCT-FO-0036
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO		

TRD: 180.10.06

CONTRATO NÚMERO:	180-10-06-005-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE YUMBO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA S.A.S
VALOR: (Número y Letras)	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20243908 de 16 de septiembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 20243681 de Noviembre 25 de 2024
FUENTE DE FINANCIACION:	04.06.04.09.03.01.133100.40.4003.1400.2024768920063.400 3020.2.3.2.01. 01.001.03 SGP APSB. SDO/2023
PLAZO:	30 DÍAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
OBJETO:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

Los suscritos Carlos Eduardo Brion Molina identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.292.569 de Yumbo, actuando como Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos y **SUPERVISOR**, Viviany Ortiz Rico Profesional de Apoyo a la Supervisión, y Hugo Duran Pérez - portador de la cédula de ciudadanía 16.781.993 de Cali, Representante Legal de Compañía de Ingeniería Sanitaria CODINSA S.A.S con Nit 890.319.290-1, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en la instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos con el objetivo de suscribir el con el fin de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato:

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del contratista los cuales se determinaron en

El avance físico en lavado es del 94% y en inspección del 91% y el avance presupuestal del contrato es del 99,84%

El plazo inicial era de 30 días y mediante otrosí en tiempo se prorroga 6 días más hasta el 31 de diciembre de 2024.

Que, conformidad con lo anterior, de 5656,0 m de inspección y lavado de tubería proyectados, el contratista realiza en total 5.309,47 m de lavado de tuberías y 5.167,84 m de inspección, esto debido a que en sitio no fue posible localizar varias cámaras en el sector de la calle 14 entre carreras 37 y 39.; dentro de las actividades realizadas como ítems no contemplados se hizo necesario la reposición de 5 m de tubería HS de 15 pulg, en la cr 38 entre calles 12A y 13, debido a que en la inspección de la tubería esta estaba achatada y con ruptura.

En cuanto al corte/perfilamiento con equipo robótico de fresado de tubería se hacen 16 unidades y 19 unidades de reparación puntual de tubería entre 350 a 400 mm

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$529.734.749.00
Valor ejecutado:	$528.875.185,00
Valor no ejecutado:	$ 859.564,00
Porcentaje de Ejecución:	**99,84%**

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$529.734.749.00
Anticipo	$ 0.00
Amortización anticipo:	$ 0.00
Pago anticipado:	$ 0.00
Pagos parciales:	$186.223.546,00
Interés moratorio:	$ 0.00
Total pagado:	$186.223.546,00
Saldo a favor del contratista:	$342.651.639,00
Saldo a favor del municipio:	$ 859.564,00

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ESTADO FISCAL	CÓDIGO:	GCT-FO-0033
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ESTADO FISCAL		

RD: 180.10.06

ESTADO FISCAL No. 1	
CONTRATO No.:	180-10-06-005-2024
NÚMERO DE PROCESO:	SAMC-SI-004-2024
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA,
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA S.A.S NIT 890.319.290-1 Representante legal Hugo Duran Pérez
OBJETO:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS (CALENDARIO)
FECHA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE OTRO SÍ No. 1:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE OTRO SÍ No. 1:	SEIS (6) DÍAS (CALENDARIO)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca), a los veinte y siete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, Carlos Eduardo Brion Molina, en calidad de Jefe de Despacho y supervisor, Viviany Ortiz Rico

Profesional de Apoyo a la Supervisión, y el señor Hugo Duran Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 16.781.993 expedida en Cali (Valle del Cauca), Representante Legal de Compañía de Ingeniería Sanitaria CODINSA S.A.S con Nit 890.319.290-1, en calidad de Contratista, con el fin de establecer el ESTADO FISCAL No.1 del Contrato de Obra Pública, No. 180-10-06-005-2024 cuyo objeto es "limpieza, investigación con CCTV y reparación de puntual sin zanja de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20D entre calles 14 y 15, carrera 20E entre calles 13 y 15, carrera 20G entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo".

Al respecto se certifica que el avance físico ejecutado en lavado es del 94% y en inspección del 91%, esto debido a que en sitio no fue posible localizar varias cámaras en el sector de la calle 14 entre carreras 37 y 39; sin embargo debido a que en la inspección en la cr 38 entre calles 12A y 13 un tramo de la tubería esta estaba achatada y con ruptura, lo que conllevo a la necesidad de reponer de 5 m de tubería HS de 15 pulgadas, y cobrarlo como actividad no contemplada I

En cuanto al corte/perfilamiento con equipo robótico de fresado de tubería se hizo necesario realizar 16 unidades de corte de raíces y domiciliarias y de reparación puntual, 19 unidades de tubería entre 350 a 400 mm, logrando que el avance presupuestal del contrato sea del 99,98%.

ESTADO FISCAL No.2 DEL CONTRATO No.180-10-06-005-2024 ACTA FINAL		
VALOR	$529.734.749.00	
ACTA PARCIAL N°1		$186.223.546,00
ACTA FINAL		$ 342.651.639,00
SALDO		$ 859.564,00
SUMAS IGUALES	**$529.734.749.00**	**$529.734.749.00**

Para constancia se firma en Yumbo a los veinte y siete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma:


Carlos Eduardo Brion Molina
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura
y Servicios Públicos

Firma:

Hugo Duran Pérez
Representante Legal
Compañía de ingeniería sanitaria CODINSA
S.A.S

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ESTADO FISCAL	CÓDIGO:	GCT-FO-0033
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ESTADO FISCAL		

Firma:



Viviany Ortiz Rico
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura Servicios Públicos

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en el municipio de Yumbo, a los veinte y siete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma:

Carlos Eduardo Brion Molina
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Firma:

Hugo Duran Pérez
Representante Legal
Compañía de ingeniería sanitaria CODINSA S.A.S

Firma:

Viviany Ortiz Rico
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura Servicios Públicos

Elaboró Viviany Ortiz Rico–profesional de Apoyo– Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

	Alcaldía de Yumbo	MUNICIPIO DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATO No.180-10-06-005-2024	ACTA DE PAGO FINAL
Objeto	"LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y COMBINADO INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO QUE SE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12, 12A 13, 14 y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20 E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G CALLE 14 Y 16) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"		FECHA	27-DIC-24

CONTRATO								ACTA DE PAGO #1					ACTA DE PAGO FINAL					
1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO PAGADO	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
1.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	27"	M.	361.9	$ 55.000	$ 12.100	$ 25.627.503,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ 17.624.486
1.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 DER VIA	27"	M.	262.7	$ 55.000	$ 12.100	$ 17.624.486,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	262.66	$ 55.000	262.66	$ 12.100	$ 17.624.486	$ 17.624.486
1.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14 IZQ CANAL	[illegible]	M.	224.9	$ 85.000	$ 12.100	$ 21.840.703,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	224.93	$ 85.000	224.93	$ 12.100	$ 21.840.703	$ 21.840.703
1.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	[illegible]	M.	262.4	$ 85.000	$ 12.100	$ 25.480.982,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	262.42	$ 85.000	262.42	$ 12.100	$ 25.480.982	$ 25.480.982
1.5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 ZQ CANAL	27"	M.	56.6	$ 55.000	$ 12.100	$ 3.795.847,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	56.57	$ 55.000	56.57	$ 12.100	$ 3.795.847	$ 3.795.847
1.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	24"	ML	259.7	$ 55.000	$ 12.100	$ 17.427.883,00	90.27	$ 55.000	90.27	$ 12.100	$ 6.057.117		$ 55.000		$ 12.100		$ 6.057.117
1.7		15"	ML	253.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 10.654.247,00	253.07	$ 30.000		$ 12.100	$ 7.591.100		$ 30.000	253.07	$ 12.100	$ 3.062.147	$ 10.654.247
1.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	24"	ML	86.3	$ 85.000	$ 12.100	$ 8.361.672,00	-	-	-	$ 12.100	$ 16.582.738		$ 85.000		$ 12.100		$ 16.582.738
1.9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15	15"	ML	226.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 9.531.019,00	226.39	$ 30.000		$ 12.100	$ 6.791.700		$ 30.000	226.39	$ 12.100	$ 2.739.319	$ 9.531.019
1.11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	15"	ML	84.9	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.575.974,00	84.94	$ 30.000		$ 12.100	$ 2.548.200		$ 30.000	84.94	$ 12.100	$ 1.027.774	$ 3.575.974
1.11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 26 CALLE 14-15 DER VIA	21"	M.	53.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 2.237.194,00	53.14	$ 30.000		$ 12.100	$ 1.594.200		$ 30.000	53.14	$ 12.100	$ 642.994	$ 2.237.194
1.12	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13	12"	M.	261.6	$ 30.000	$ 12.100	$ 11.012.097,00	261.57	$ 30.000		$ 12.100	$ 11.012.097		$ 30.000		$ 12.100		$ 11.012.097
1.13	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	15"	M.	166.2	$ 30.000	$ 12.100	$ 6.998.283,00	166.23	$ 30.000	166.23	$ 12.100	$ 6.998.283		$ 30.000		$ 12.100		$ 6.998.283
1.14	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	18"	M.	83.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.493.037,00	82.97	$ 30.000	82.97	$ 12.100	$ 3.493.037		$ 30.000		$ 12.100		$ 3.493.037
1.15	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	15"	M.	178.7	$ 30.000	$ 12.100	$ 7.523.691,00	178.71	$ 30.000	36.83	$ 12.100	$ 5.806.684		$ 30.000		$ 12.100		$ 5.806.684
1.16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	18"	ML	77.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.243.364,00	77.00	$ 30.000		$ 12.100	$ 2.312.300		$ 30.000	77.00	$ 12.100	$ 931.100	$ 3.243.700
1.17	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14-15 UZQ	15"	ML	226.3	$ 30.000	$ 12.100	$ 9.531.009,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.18	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14-15 DER	21"	ML	136.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 5.725.496,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.19	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	27"	ML		$ 55.000	$ 12.100	$ 4.947.243,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	36"	M.	14.1	$ 55.000	$ 12.100	$ 944.758,00	11.64	$ 55.000	11.64	$ 12.100	$ 781.044		$ 55.000		$ 12.100		$ 781.044
1.21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 38-39	18"	M.	103.8	$ 30.000	$ 12.100	$ 4.967.875,00	103.75	$ 30.000		$ 12.100	$ 4.367.875		$ 30.000	103.75	$ 12.100	$ 1.255.375	$ 5.623.250
1.22	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 37-38	27"	M.	103.5	$ 55.000	$ 12.100	$ 6.944.852,00	103.75	$ 55.000	103.75	$ 12.100	$ 5.756.250		$ 55.000		$ 12.100		$ 5.756.250
1.23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	M.	103.8	$ 30.000	$ 12.100	$ 4.967.875,00	103.75	$ 30.000		$ 12.100	$ 3.105.000		$ 30.000	103.75	$ 12.100	$ 1.255.375	$ 4.360.375
1.24	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-38	60"	ML	214.8	$ 85.000	$ 12.100	$ 20.853.033,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0		$ 85.000		$ 12.100		$ -
1.25	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-39	27"	M.	214.4	$ 55.000	$ 12.100	$ 14.851.756,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.26	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	21"	M.	31.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 1.312.803,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.27	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	21"	M.	26.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 1.180.963,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.28	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	27"	M.	201.5	$ 55.000	$ 12.100	$ 13.528.702,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	18"	M.	2.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 87.568,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0	2.08	$ 30.000	2.08	$ 12.100	$ 87.568	$ 87.568
1.31	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	M.	3.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 144.824,00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0	3.44	$ 30.000	3.44	$ 12.100	$ 144.824	$ 144.824
1.32	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	27"	M.	106.1	$ 55.000	$ 12.100	$ 7.147.297,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	106.07	$ 55.000	106.07	$ 12.100	$ 7.147.297	$ 7.147.297
1.33	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	M.	110.4	$ 55.000	$ 12.100	$ 7.410.524,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	110.44	$ 55.000	110.44	$ 12.100	$ 7.410.524	$ 7.410.524
	SUBTOTAL			4615.7			$ 287.088.333,00	1867.71		924.04		$ 84.748.324,75	1028.61		1930.65		$ 84.418.918,00	$ 169.183.238,75

CONTRATO								ACTA DE PAGO #1					ACTA DE PAGO FINAL					
2	ALCANTARILLADO CENCAR	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
2.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	12"	M.	126	$ 55.000	$ 12.100	$ 8.475.401,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	126.31	$ 55.000	126.31	$ 12.100	$ 8.475.401	$ 8.475.401,00
2.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 16	12"	M.	196	$ 85.000	$ 12.100	$ 18.060.500,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	196.00	$ 85.000	196.00	$ 12.100	$ 18.060.500	$ 18.060.500,00
2.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	12"	M.	279	$ 85.000	$ 12.100	$ 27.129.740,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	279.40	$ 85.000	279.40	$ 12.100	$ 27.129.740	$ 27.129.740,00
2.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 14 Y 15	12"	M.	153	$ 85.000	$ 12.100	$ 14.856.300,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	153.00	$ 85.000	153.00	$ 12.100	$ 14.856.300	$ 14.856.300,00
2.5	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 14 Y 15	12"	M.	129	$ 55.000	$ 12.100	$ 8.881.128,00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	122.84	$ 55.000	122.84	$ 12.100	$ 8.881.128	$ 8.881.128,00
2.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	12"	M.	129	$ 85.000	$ 12.100	$ 12.525.900,00		$ 85.000		$ 12.100	$ 0	129.00	$ 85.000	129.00	$ 12.100	$ 12.525.900	$ 12.525.900,00
												$ 0						
	SUBTOTAL			913.7			$ 87.928.048,00						979.28		979.28		$ 87.928.048,00	$ 87.928.048,00

CONTRATO							ACTA DE PAGO #1			ACTA DE PAGO FINAL			
3	REPARACIONES	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
3.1	MONTE/DESMONTE CON EQUIPO ROBOTICO DE FRESADO DE TUBERIA	150 a 200 mm	UND	1	$ 999.912	$ 999.912,00		$ 999.749		16.00	$ 999.749	$ 15.995.984	$ 15.995.984,00
3.2	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	150 a 200 mm	UND	1	$ 2.398.150	$ 2.398.150,00		$ 2.398.150			$ 2.398.150		$ -
3.3	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	250 a 300 mm	UND	1	$ 2.398.098	$ 2.398.098,00		$ 2.398.098			$ 2.398.098		$ -
3.4	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	350 a 400 mm	UND	1	$ 2.644.576	$ 2.644.576,00		$ 2.644.576		19.00	$ 2.644.576	$ 50.246.944	$ 50.246.944,00
3.5	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	450 a 500 mm	UND	1	$ 3.005.200	$ 3.005.200,00		$ 3.005.200			$ 3.005.200		$ -
3.6	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	600 mm	UND	1	$ 3.322.094	$ 3.322.094,00		$ 3.322.094			$ 3.322.094		$ -
3.7	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	675 a 750 mm	UND	1	$ 3.870.698	$ 3.870.698,00		$ 3.870.698			$ 3.870.698		$ -
3.8	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	mayor 750 mm	UND	1	$ 3.870.698	$ 3.870.698,00		$ 3.784.699			$ 3.784.699		$ -
	SUBTOTAL			8.0		$ 22.678.425,00	0.00					$ 66.242.928,00	$ 66.242.928,00

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR.TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO PAGADO	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	16"	ML		$ 30 000	$ 12 100		243.6	$ 30 000.00	243.59	$ 12 100	$ 10 255 139		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 10 255 139
4.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	21"	ML		$ 30 000	$ 12 100		228.3	$ 30 000.00	228.29	$ 12 100	$ 9 611 009		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 9 611 009
4.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	15"	ML		$ 30 000	$ 12 100		136.0	$ 30 000.00	135.95	$ 12 100	$ 5 723 495		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 5 723 495
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	21"	ML		$ 30 000	$ 12 100		257.6	$ 30 000.00	257.57	$ 12 101	$ 10 843 955		$ 30 000.00		$ 12 101		$ 10 843 955
4.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		$ 55 000	$ 12 100		68.7	$ 55 000.00	68.74	$ 12 100	$ 4 612 454		$ 55 000.00		$ 12 100		$ 4 612 454
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 35-40	12"	ML		$ 30 000	$ 12 100		100.7	$ 30 000.00	100.73	$ 12 100	$ 4 324 933		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 4 324 933
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	12"	ML		$ 30 000	$ 12 100		85.2	$ 30 000.00	85.20	$ 12 100	$ 3 586 920		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 3 586 920
4.9	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-38	18"	ML		$ 30 000	$ 12 100							214.8	$ 30 000.00	214.82	$ 12 100	$ 9 043 922	$ 9 043 922
				5656.0				1122,07		1122,07			214,82		214,82			
	SUBTOTAL							3089,78	55%	824,04	16%	$ 48.857.804,57	5309,47	94%	5167,84	91%	$ 9.043.922,00	$ 58.001.826,57
								5057,48										

5	NO PREVISTOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO			VR.TOTAL EJECUTADO PAGADO						VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
60107	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA 1 6 M SR	m3		$ 26 555		13 50	$ 26 555			$ 358 492 50						$ 358 492 50
APU	EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICION FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA D STANCIAS > 10 KM	m3		$ 55 020		17 55	$ 55 020			$ 965 601 00						$ 965 601 00
100516	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO	m3		$ 174 523		4 64	$ 174 523			$ 810 641 88						$ 810 641 88
100519	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	m3		$ 76 265		8 78	$ 76 265			$ 669 225 38						$ 669 225 38
60201	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR S/N TRANSPORTE	m3		$ 122 433		7 02	$ 122 433			$ 859 479 66						$ 859 479 66
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14" A 24"	ML		$ 29 373		5 00	$ 29 373			$ 146 865 00						$ 146 865 00
100623	ACARREREO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M	m3		$ 70 973		20 44	$ 70 973			$ 1 450 681 02						$ 1 450 681 02
20307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 15" UNION CAUCHO	ML		$ 178 508		5 00	$ 178 508			$ 892 540 00						$ 892 540 00
336301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CV 250 MTS	UND		$ 159 948		1 00	$ 159 948			$ 159 948 00						$ 159 948 00
										$ -						$ -
	SUBTOTAL									$ 8.313.474,44						$ 8.313.474,44

CONTRATO				ACTA DE PAGO #1				ACTA DE PAGO FINAL				VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	6656,99	$	390.298.934,00	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADO	24,00%	$	140.017.703,78	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADO	24,00%	$	257.632.811,00	$ 397.650.914,78
ADMINISTRACION	24,00%	$	95 591 233 00	ADMINISTRACION	24,00%	$	33 604 248 90	ADMINISTRACION	24,00%	$	61 831 674 64	$ 95 436 123 54
IMPREVISTOS	1,00%	$	3 982 968 00	IMPREVISTOS	1,00%	$	1 400 177 04	IMPREVISTOS	1,00%	$	2 576 328 11	$ 3 976 505 15
UTILIDAD	8,00%	$	31 863 744 00	UTILIDAD	8,00%	$	11 201 416 30	UTILIDAD	8,00%	$	20 610 624 88	$ 31 812 041 18
TOTAL AIU	33,00%	$	131 437 945,00	TOTAL AIU	33,00%	$	46 205 842,24	TOTAL AIU	33,00%	$	85 018 627,63	$ 131.224 669,87
VALOR TOTAL OBRA		$	629.734.749,00	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO		$	186.223.545,00	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO		$	342.651.439,00	$ 528.875.185,00
VALOR INTERVENTORIA		SISP		VALOR INTERVENTORIA				VALOR INTERVENTORIA				SISP

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 629.734.749,00
PLAZO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (DIAS CALENDARIO)	30

Nota 1 Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizara con base al principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervision y el contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervision

Nota 2 El supervisor certifica (revisó), verificó y constato el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
infraestructura@yumbo.gov.co

HUGO DURAN PEREZ
Representante Legal
coonsa S A S

VIVIANY ORTIZ RICO
Profesional de apoyo a la supervision
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="4">TIPO DE CONTRATO
Contrato de Obra
SELECCION ABREVIDA MENOR CUANTIA

No PROCESO: SAMC-SI-004-2024</td><td colspan="2">INFORME DEL SUPERVISIÓN:</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:
LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INFORME:

27 DE DICIEMBRE DEL 2024</td><td>NUMERO DE INFORME:

3-2024</td></tr>
<tr><td>No. CONTRATO:
180-10-06-005-2024.</td><td rowspan="3">INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td rowspan="3">FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VIVIANY ORTIZ RICO</td></tr>
<tr><td>Vereda: 0</td></tr>
<tr><td>Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</td></tr>
<tr><td>Id tramo
0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CODINSA S.A.S.
Gerente
Hugo Duran Pérez
C.C.16.781.993
Ingeniero Sanitario
Matricula Profesional No.
7623767513VLL</td><td>ID Contratista

NIT. 8903192901</td><td>Estado

2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>Razón social nuevo contratista</td><td>ID nuevo contratista</td><td>Origen de recursos
10 - RECURSOS PROPIOS</td></tr>
</table>

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	**LINK SECOP** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index		
NUMERO PÓLIZA	Responsabilidad civil extra contractual CO1.WRT.15693959, CO1.WRT.15685779, CO1.WRT.15685779 Cumplimiento del contrato CO1.WRT.15686058	**ASEGURADORA** **NIT**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860.524.654-6

LOCALIZACION DE LA OBRA		
Latitud	**Longitud**	Fin cr 37 cl 15 1. 3.49386 2. -76.50887
Numero vértice	1,2	
Inicio cr 37 cl 12A 1 3.49683 2 -76.5158	Inicio cr 39 cl 12A 1. 3.49397 2. -76.51646	Fin cr 39 cl 15 1. 3.49203 2. -76.50967
Sector ACOPY Y CENCAR	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 202476820063

SEGUIMIENTO FISICO
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): LAVADO ES DEL 100% Y EN INSPECCIÓN 100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO: LAVADO ES DEL 94% Y EN INSPECCIÓN 91%
SEGUIMIENTO FINANCIERO
VALOR CONTRATO (PESOS): **$529.734.749,00**
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 0,00**
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 99,84**%**
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$529.734.749,00**
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$530.000.000,00**
VALORCONTRATO INICIAL: **$529.734.749,00**
VALOR CONTRATO FINAL: **$529.734.749,00**

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

DESARROLLO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO:	**2024-11-25**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2024-12-25**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2024-12-31**
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2024-12-31**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
HITOS: CER0O (0)	
FECHA DE HITO: NO APLICA.	
DETALLE HITO: NO APLICA.	
NUMERO DE OTRO SI: UNA (1)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	**2024-11-18**
CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	una (1)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)
TIEMPO DE PRORROGAS	Seis (6) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ULTIMA PRORROGA: 18 de diciembre de 2024	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAN DE ACCION

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

1. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de las redes sanitarias del municipio de Yumbo.

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV formulado para la zona industrial, contiene el programa para la optimización de redes y estructuras marginales a la fuente receptora. En el desarrollo de dicho programa se establece la necesidad de ejecutar proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado.

El proyecto surge a raíz de la problemática planteada en las anteriores y en la actual administración por los empresarios de la zona de ACOPI, en cuanto al deterioro y mal estado de las vías y su apoyo económico para su rehabilitación y mejoramiento. Esta situación, conllevo a la intervención de la Alcaldía a través del personal técnico e idóneo de la secretaria de Infraestructura y Servicios públicos, de sustentar , y evidenciar la problemática para definir la intervención de varias vías deterioradas, las cuales se encuentran dañadas en su estructura , producto infiltraciones causadas por las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

El deterioro y mal estado las actuales vías de los sectores de ACOPI y CENCAR han ocasionado accidentes y demoras en la movilidad; La Secretaría de Infraestructura, con la intervención del alcantarillado con el lavado, inspección y reparación puntual busca beneficiar a más de 24 empresas, con más de 300 trabajadores, que utilizan las vías del sector; por tal motivo es importante que se realice este tipo de obra para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y empresarios del sector, encaminado en mejorar la economía de los usuarios con la reducción de tiempos de traslado de mercancía y movilidad de trabajadores , mejorando la eficiencia en el sector.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

Por otra parte, el Municipio de Yumbo mediante el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR AYUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA", tiene como indicadores producto los siguientes:

Indicadores	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Alcantarillados optimizados.	Metros lineales	8	Optimizar 12 acueductos e intervenir 10 sistema de alcantarillado en el municipio, tanto en la zona urbana como rural

Con la ejecución de este proyecto se hará la limpieza e inspección de en 4.673 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 15", 18", 21", 27, 36" y 55" en el sector de ACOPI y 976 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 30", 36", 42", y 1,2 m en el sector de CENCAR.

El Capítulo 5 De La Finalidad Social del Estado y de Los Servicios Públicos Artículo 365 de la Constitución Política, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Dicha norma se complementa con el mandato del 366 que establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de conformidad con el artículo 3º de la ley 80 de 1993 "*los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

Se demuestra entonces, que los servicios públicos constituyen una finalidad esencial del Estado para proteger y garantizar otros derechos fundamentales en conexidad con la vida, como son la salud, el derecho al saneamiento ambiental y al agua potable.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de Infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de la infraestructura vial municipal en la zona rural, urbana e industrial, a través de actividades de Mejoramiento y Rehabilitación.

Con relación al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR A YUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA" **El Propósito:** Yumbo Productivo tiene como propósito mejorar la articulación entre la población, la economía y el territorio en el Municipio de Yumbo.

ESTRATEGIA; Mediante procesos de participación para el Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico. SUBPROGRAMA:. Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lavado e inspección de 5.655,73 metros lineales de alcantarillado para verificar si está en malas condiciones	Número de metros lineales lavados e inspeccionados	5.655,73 m

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo cumplirá su objetivo con el contrato No. 180-10-06-005-2024.

La prioridad de la intervención en las vías por medio del mejoramiento que comprende el presente proceso viene dada por la situación de deterioro de pavimento y su estructura de base, además de la realización de lavado e inspección y arreglo puntual de ser necesario en la reposición de las redes de alcantarillado, las cuales son antiguas y que se deben ajustar a la resolución 799 de 2021 del REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Con la ejecución de este proyecto se felicitará la intervención de vías en pavimento flexible, y en la rehabilitación redes de alcantarillado en PVC.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 180.10.06.005.2024		
VALOR	**$529.734.749,00**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$186.223.546,00
VALOR ACTA FINAL		$342.651.639,00
SALDO		$ 859.564,00
SUMAS IGUALES	**$529.734.749,00**	**$529.734.749,00**

Nota: el acta parcial No. 1 está en trámite de pago y el acta final está en trámite.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO				ACTA DE PAGO FINAL	
1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
1,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 DER VIA	27"	ML	262,66	262,66
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	224,93	224,93
1,4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	262,42	262,42
1,5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	27	ML	56,57	56,57
1,7	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	18"	ML		253,07
1,9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15	15"	ML		226,39
1,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	15"	ML		84,94
1,11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	21"	ML		53,14
1,16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	18"	ML		77,00
1,21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 38-39	18"	ML		103,75
1,23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	ML		103,75
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	18"	ML	2,08	2,08
1,31	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	ML	3,44	3,44
1,32	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	27"	ML	106,07	106,07
1,33	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	27"	ML	110,44	110,44

ALCANTARILLADO CENCAR	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	30"	ML	126,31	126,31
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	42"	ML	186,00	186,00
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	1,20	ML	279,40	279,40
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	42"	ML	153,00	153,00
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	36"	ML	102,55	102,55
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	42"	ML	129,00	129,00

Estos ítems fueron actualizados acorde a las actividades ejecutadas en el sector ACOPI, durante la ejecución del contrato se encontró en la inspección diferencias de los diámetros de las tuberías del contrato con los diámetros de los planos de redes de alcantarilladlo existente suministrados por la ESPY y por EMCALI y las condiciones reales evidenciadas en la investigación y diagnóstico en sitio, de las tuberías.

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-38	18"	ML	214,8	214,8

Revisada la información de la tubería en la Carrera 38 entre calles 12A -13 (Hormigón simple de 15"), se evidencio que presentaba interferencias de la raíces y acometidas de tubería, lo que hace necesario, realizar 16 unidades del ítem de corte/perfilamiento con equipo robótico de fresado de tubería y 19 unidades de reparación puntual de tubería entre 350 a 400 mm.

5.DESARROLLO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los municipios, según lo disponen los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3-5 de la Ley 136 de 1994 y 5-1 de la Ley 142 de 1994. Los artículos 365 a 370 CP tratan de los derechos colectivos a acceder a la infraestructura de servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna. Los servicios públicos son inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que son finalidades sociales del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De esta manera, el municipio de Yumbo, mediante resolución SSPD – 20184010116845 de 2018 se encuentra certificado en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1176 de 2007 y lo reglamentado en el Artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015". El municipio no cuenta con los equipos requeridos y el personal calificado para La reparación de redes de alcantarillado sin apertura de zanja mediante la instalación de una tubería especial para el sellado y estanco de filtraciones en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, para el sector

comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39, de la zona industrial de ACOPI, Carrera 20E entre calles 13 y 14 y Carrera 20D, 20E , 20G entre Calles 14 Y 15, de la zona de CENCAR municipio de yumbo

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el INFORME PARCIAL DE SUPERVISION del periodo comprendido entre al 20 de diciembre del 2024 al 27de diciembre del 2024, el avance Total de ejecución corresponde a QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 528.875.185,00) equivalente a 99,84% en los cuales se estipulan las siguientes consideraciones:

El valor a cobrar en el acta final corresponde a TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($342.651.639,00). equivalente a 64,684%, el porcentaje físico del contrato de obra ejecutado en lavado es del 94% y en inspección 36%, ejecución en cumplimiento del objeto contractual, especificaciones, presupuesto y con las determinaciones que se toman y se hacen cumplir durante la ejecución del contrato de obra No. 180.10.06.001.2024 cuyo objeto limpieza, investigación con CCTV y reparación de redes en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, del sector comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39, mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20d entre calles 14 y 15, carrera 20e entre calles 13 y 15, carrera 20g entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo.


Se interviene la tubería Hormigón simple de 15" sobre la Carrera 38 entre calles 12A -13, se realizar 16 unidades de corte/perfilamiento de la raíces y acometidas de tubería con equipo robótico de fresado de tubería y 19 unidades de reparación puntual de tubería entre 350 a 400 mm.

Se sugiere intervenir las tuberías con fisuras del sistema de alcantarillado de acuerdo a la inspección, evitando su posible colapso y el deterioro de la estructura de las vías

DNOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL: **VIVIANY ORTIZ RICO** PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	**FIRMA:**

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO LAVADO E INSPECCION

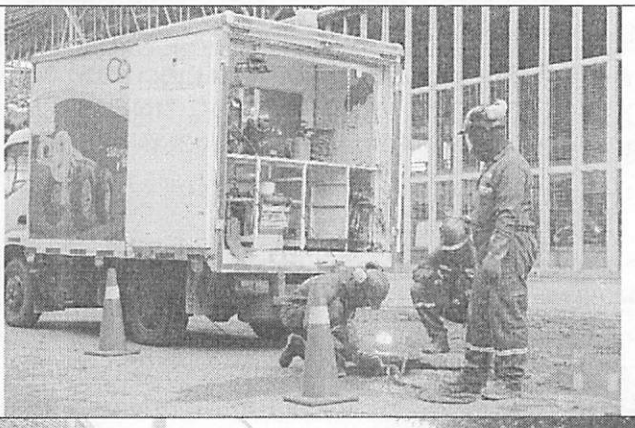25/11/2024	Cr 37 entre cl13-14 inspección de Red de alcantarillado
	
	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

TRAMO A INTERVENIR EN CORTES DE RAICES Y TUBERIAS DOMICILIARIAS

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261


Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0132	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	158,42
Situación		Manhole Final	0001CC0134	Longitud inspeccionada [m]	158,42
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 400mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarilado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:645	m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
0001CC0132	-0.09	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
	7.71	DSZ	Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 8 en punto / ESCOMBRO	3
	10.01	RFJ	Raíces Finas en la junta de 1 en punto a 4 en punto, junta	1
	11.09	RFJ	Raíces Finas en la junta de 11 en punto a 5 en punto, junta	1
	15.95	RFJ	Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta	1
	27.07	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	27.08	RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
	29.67	S01 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
	29.67	S02 D	Deformación, 10% cambiado, Arrancar	
	36.49	F01 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
	37.15	F02 D	Deformación, 10% cambiado, Acabado	4
	51.20	S03 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
	56.74	F03 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
	74.50	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	75.02	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
	80.99	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
	85.84	MGO	OBSERVACION GENERAL / CAMARA OCULTA	



AMH @ -0,09 m



DSZ @ 7,71 m


DSZ @ 7,71 m



RFJ @ 10,01 m


RFJ @ 11,09 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL


WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261


1:645

m +		Op Codigo	Incidencia Observaciones	Grade
89.60		FL	Fractura longitudinal en 12 en punto	3
89.60	S04	FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
89.60	S05	D	Deformación, 20% cambiado, Arrancar	
90.51		FM	Fractura Múltiple de 10 en punto a 2 en punto	4
96.42	F04	FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Acabado	3
96.57	F05	D	Deformación, 20% cambiado, Acabado	4
102.05		TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá	
109.31		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
119.03		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto en 8 en punto	5
119.03		FM	Fractura Múltiple de 7 en punto a 8 en punto	4
120.10		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 9 en punto, junta	5
127.13		FC	Fractura Circular de 6 en punto a 9 en punto, junta	2
129.44		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
129.61	S06	CH3	Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Arrancar	
131.22		CC	Grieta circunferencial de 3 en punto a 5 en punto	1
131.22		IW	Infiltración Lagrimeo, de 3 en punto a 5 en punto, junta	2
131.96		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
131.96		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto	5
132.71	F06	CH3	Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Acabado	5
139.69		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
153.79		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	



RFJ @ 15,95 m




TB @ 27,07 m




RFL @ 27,08 m




CL @ 29,67 m



D @ 29,67 m



CL @ 36,49 m



D @ 37,15 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL


WinCan


Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261


1:645 m +

	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
158.33	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
158.33	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / SE AGOTA EXTENCION DE CABLE	
158.42		Fin de la Tubería	


CL @ 51,20 m



CL @ 56,74 m


TB @ 74,50 m




TB @ 75,02 m




TB @ 80,99 m



MGO @ 85,84 m



FL @ 89,60 m




D @ 89,60 m



FM @ 90,51 m



FL @ 96,42 m



D @ 96,57 m



TBA @ 102,05 m




TB @ 109,31 m


BSV @ 119,03 m




FM @ 119,03 m


BSV @ 120,10 m




FC @ 127,13 m




TB @ 129,44 m




CH3 @ 129,61 m



CC @ 131,22 m


IW @ 131,22 m


TB @ 131,96 m

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan


Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261



BSV @ 131,96 m



CH3 @ 132,71 m




TB @ 139,69 m


TB @ 153,79 m




TB @ 158,33 m


MSA @ 158,33 m


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

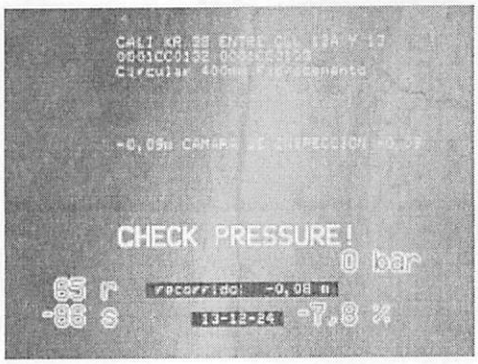


0eff2709-286e-41b4-a27b-7b0277d43c3a_20241213_230002_279.jpg, 00:00:00, -0.09m
CAMARA DE INSPECCION

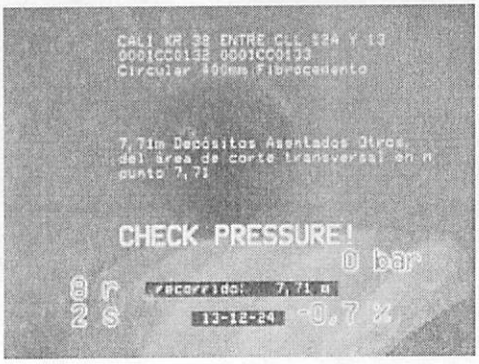

7758c047-f4c8-4800-b982-5d04f5fe38c9_20241213_230838_071.jpg, 00:00:00, 7.71m
Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto

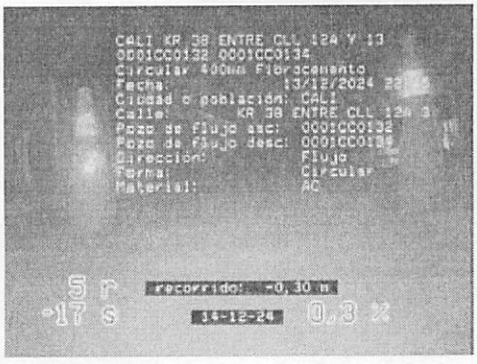

31ca51ff-4566-4129-ab57-14e7a64c8d13_20241214_005423_785.jpg, 00:00:00, 7.71m
Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto

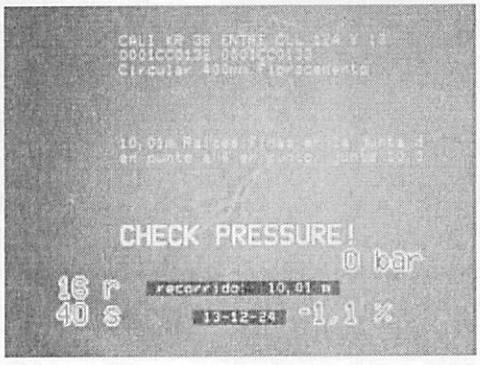


5434612c-0381-47a5-abcb-b98aa20439a8_20241213_230925_089.jpg, 00:03:35, 10.01m
Raíces Finas en la junta de 1 en punto a 4 en punto, junta


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

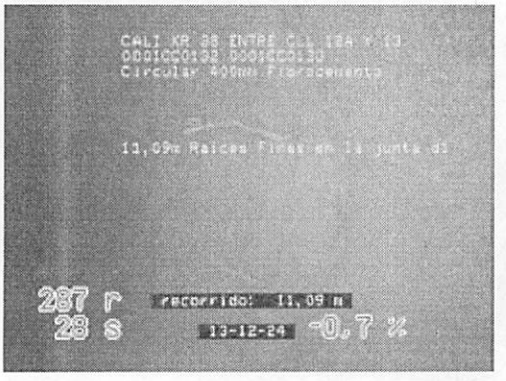


cc0a4836-6e7d-40db-8bd7-121b33f241c7_20241213_231015_166.jpg, 00:04:26, 11.09m
Raices Finas en la junta de 11 en punto a 5 en punto, junta

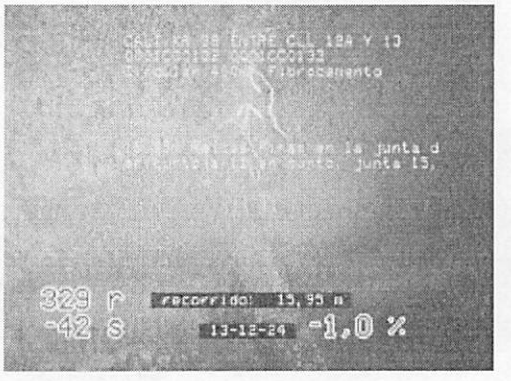

101d78b8-5c96-48bf-837e-38092d186076_20241213_231104_244.jpg, 00:05:15, 15.95m
Raices Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta

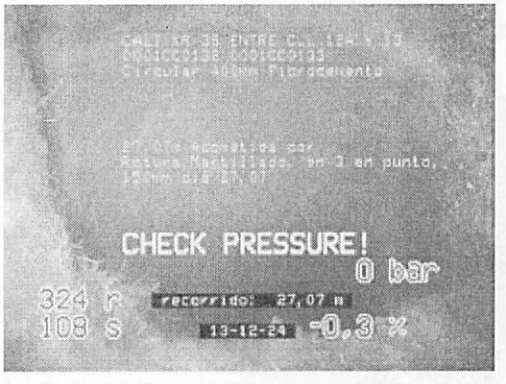

fdfae0cd-bbd4-450c-915b-67fb5eeab7b4_20241213_231251_359.jpg, 00:07:02, 27.07m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

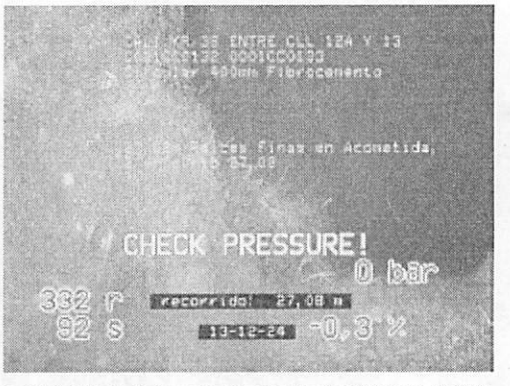


5e8193d4-fee0-40cb-aba0-e9da498a5eeb_20241213_231332_960.jpg, 00:07:44, 27.08m
Raices Finas en Acometida, en 3 en punto


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

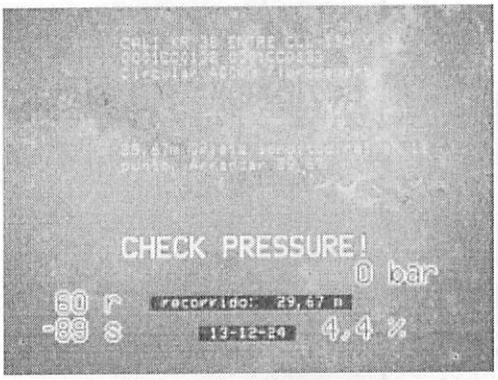


9522986b-b2ab-47ce-9c13-7b0140fe1546_20241213_231643_872.jpg, 00:09:30, 29.67m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar

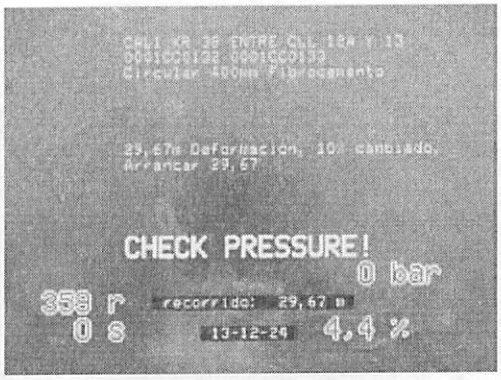

3256379b-0534-4467-b4b5-cadafbed53d3_20241213_232141_177.jpg, 00:11:30, 29.67m
Deformación, 10% cambiado, Arrancar

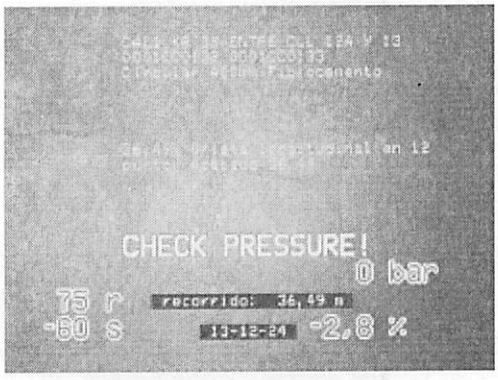

468257ea-7c45-4335-913e-2de0a8b32171_20241213_232306_175.jpg, 00:12:53, 36.49m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado

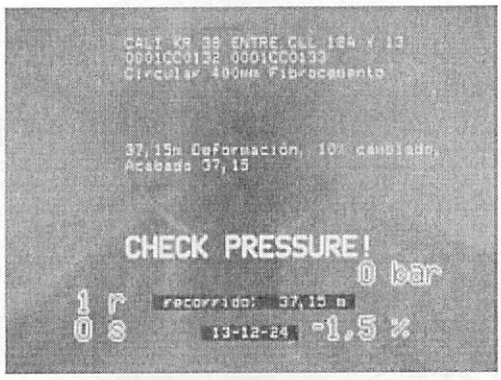


dc665768-aec1-4ddd-a585-ce32e4174ce4_20241213_232326_379.jpg, 00:13:13, 37.15m
Deformación, 10% cambiado, Acabado


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

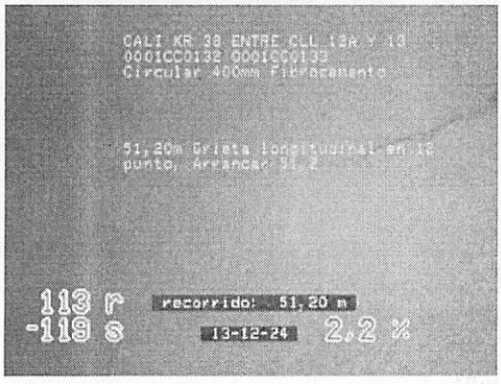


4b94ff69-776f-4877-9ff5-cbbacd5af2a9_20241213_232449_117.jpg, 00:14:36, 51.20m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar

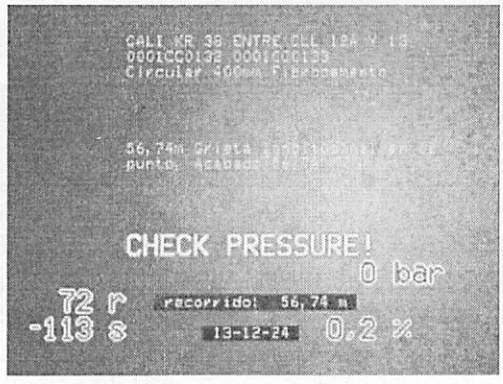

d1b01ddd-1d1e-47c2-bd52-0c8f88129c96_20241213_232633_806.jpg, 00:16:21, 56.74m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado

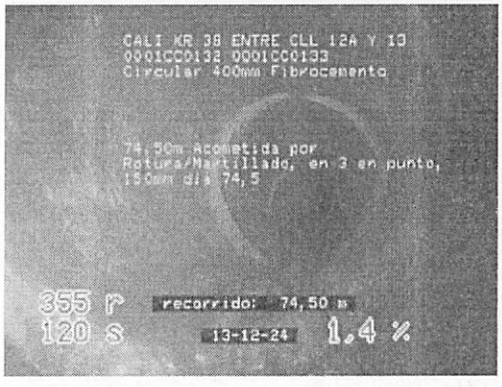

68039f78-6b5d-43a7-8683-00818902f6f4_20241213_232903_585.jpg, 00:18:51, 74.50m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

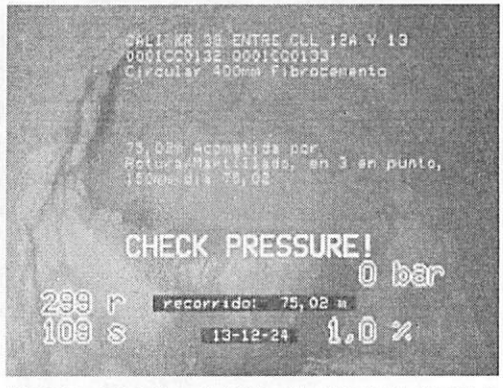


433d47bb-c903-4af2-bc4f-d21ff2ca3f9a_20241213_232953_600.jpg, 00:19:41, 75.02m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

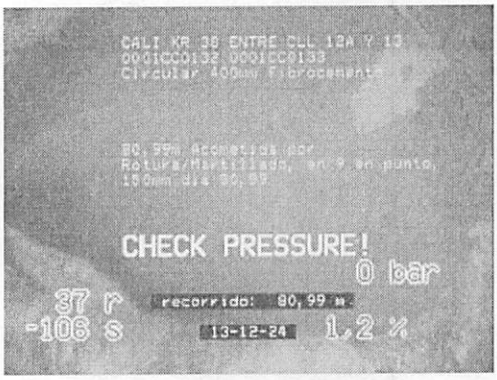


7004d90c-3b63-4fb2-8742-aebba92cfa9c_20241213_233122_211.jpg, 00:21:09, 80.99m
Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá

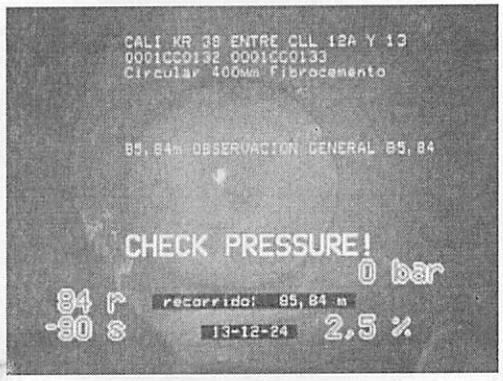

62f024f2-deff-4fb2-a4d2-b63ea45ceae8_20241213_233341_138.jpg, 00:23:28, 85.84m
OBSERVACION GENERAL

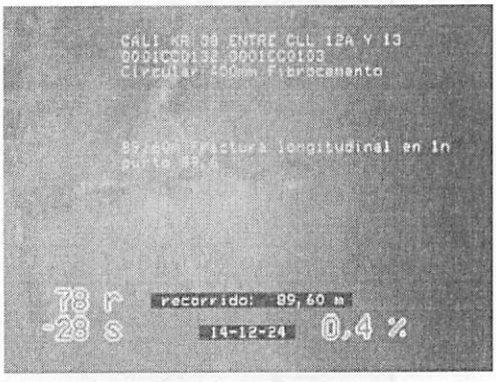

38349602-f51f-4a00-bf00-2e1158711f3d_20241213_234426_752.jpg, 00:24:57, 89.60m
Fractura longitudinal en 12 en punto

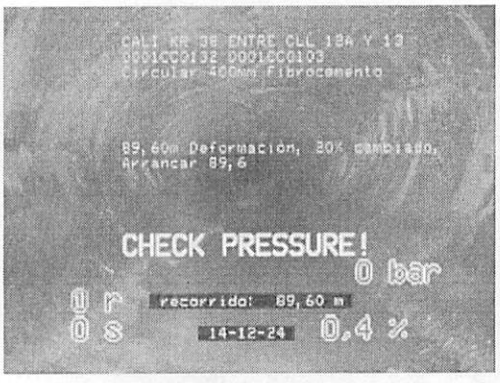


a31d574e-61b7-4a8f-91e0-84d94d528d7a_20241213_234526_904.jpg, 00:25:58, 89.60m
Deformación, 20% cambiado, Arrancar


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

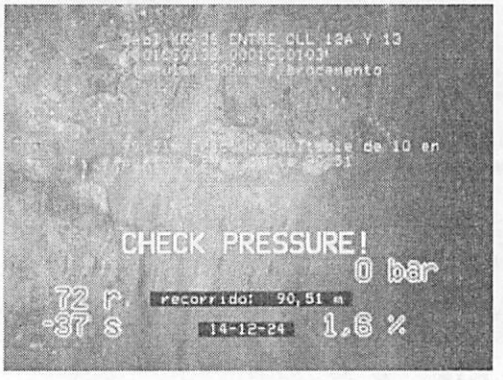


6bf3b581-b2a4-4aad-84d1-b30075b20864_20241213_234620_190.jpg, 00:26:52, 90.51m
Fractura Múltiple de 10 en punto a 2 en punto

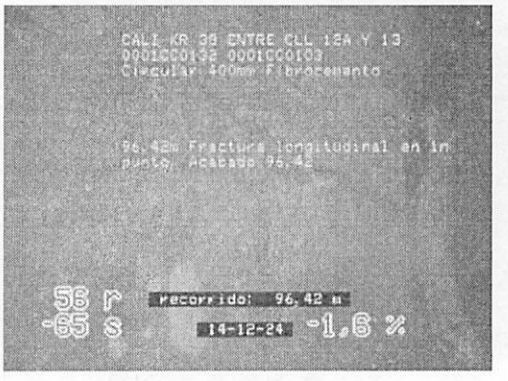

4d7a8022-9260-4acc-84a2-dbfd2c1ba4c2_20241213_235009_906.jpg, 00:30:42, 96.42m
Fractura longitudinal en 12 en punto, Acabado

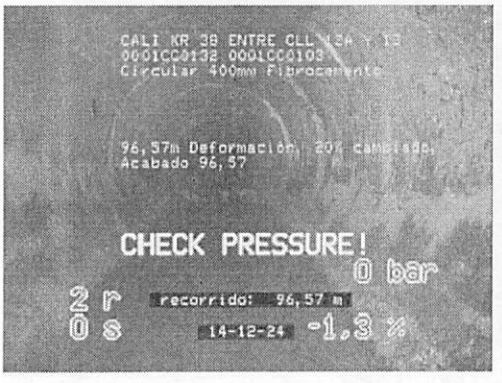

8419ef8b-d465-4213-b000-b54814265b1a_20241213_235100_206.jpg, 00:31:31, 96.57m
Deformación, 20% cambiado, Acabado

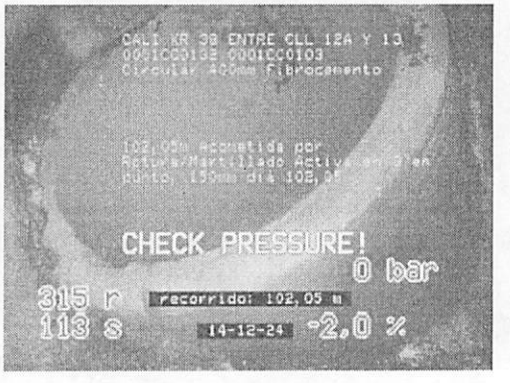


95ba1f00-8c22-4330-a86a-f92a935c96b9_20241213_235244_065.jpg, 00:33:15, 102.05m
Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

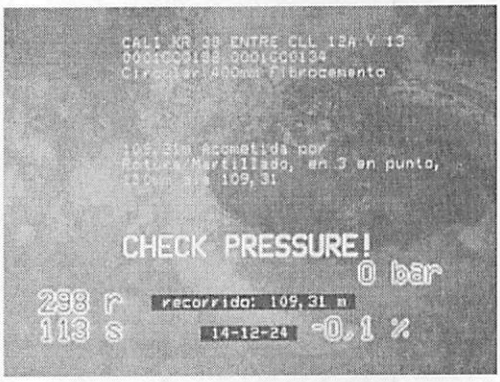


f6c1fe61-7023-4dad-9e76-65e6cc2fea5d_20241213_235733_949.jpg, 00:37:47, 109.31m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

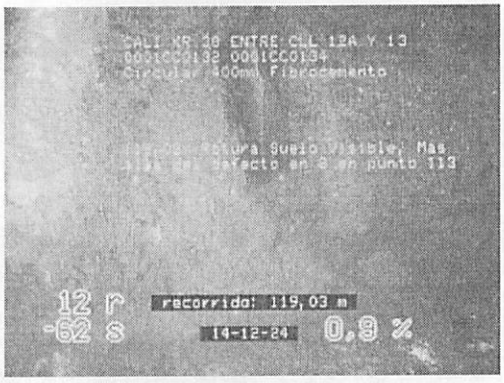

6828cb73-49db-4916-aa1b-f55726036fcc_20241214_000242_788.jpg, 00:42:57, 119.03m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto en 8 en punto

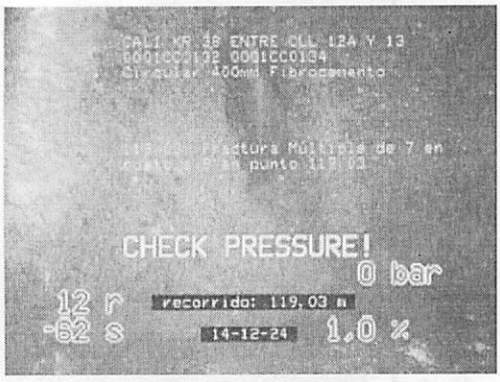

30f12a1c-f09d-4e4d-8619-a58e2c671b2b_20241214_000312_097.jpg, 00:43:26, 119.03m
Fractura Múltiple de 7 en punto a 8 en punto

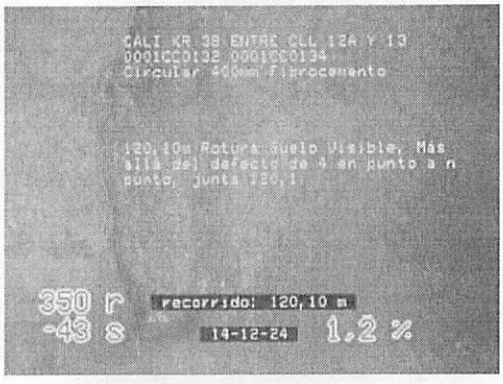


3a91bfe9-d272-4887-bd0c-a22894a75652_20241214_000459_634.jpg, 00:45:13, 120.10m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 9 en punto, junta

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

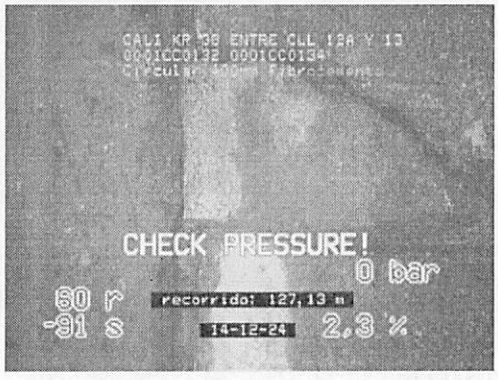


977f9a5b-2733-4d06-b0fb-a65340dff07c_20241214_000920_033.jpg, 00:48:09, 127.13m
Fractura Circular de 6 en punto a 9 en punto, junta



d147d04a-c775-4a9f-bad7-ba523577fe5b_20241214_001031_782.jpg, 00:49:20, 129.44m
Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá

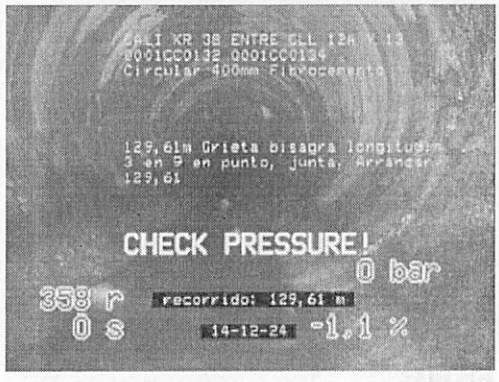

cca1d910-a134-436e-a353-7cfa4ad7ecd4_20241214_001203_024.jpg, 00:50:50, 129.61m
Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Arrancar

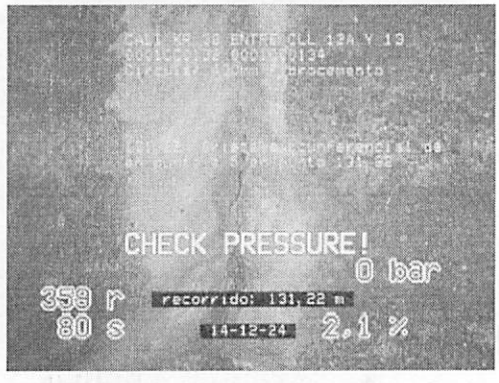

a4c91df3-f774-48c7-8326-ccd7e71bfda2_20241214_001344_910.jpg, 00:52:34, 131.22m
Grieta circunferencial de 3 en punto a 5 en punto


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024

Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6




f383896c-c7fb-4c4c-b56e-80cf97dd72d1_20241214_001419_486.jpg, 00:53:08, 131.22m
Infiltración Lagrimeo, de 3 en punto a 5 en punto, junta

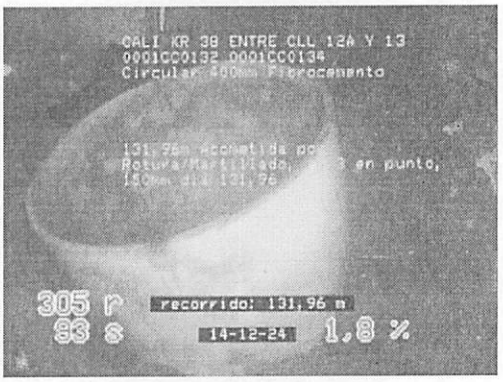

dbcf22de-4e25-4ed2-95dc-cee8b90bfeb2_20241214_001508_039.jpg, 00:53:56, 131.96m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



75631565-9760-4e0a-99fd-c25d1b094524_20241214_001555_539.jpg, 00:54:44, 131.96m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto

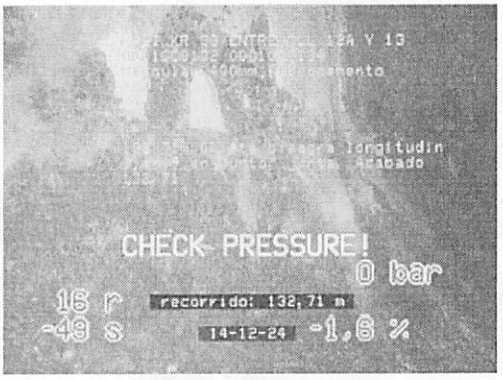

da0dd086-d9f4-4911-a5f3-5c6efe50e666_20241214_001640_967.jpg, 00:55:29, 132.71m
Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Acabado


INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FORMATO INTERNO SISP

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

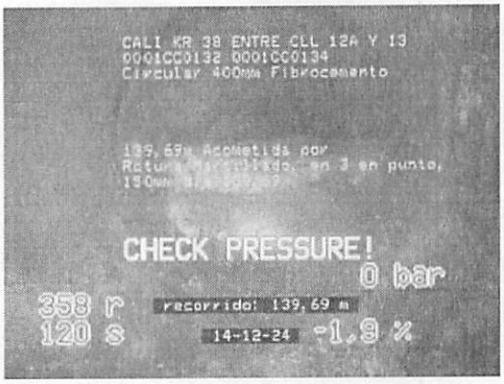

c534bfc3-346e-4315-ab65-4da7de9fdeaa_20241214_001800_237.jpg, 00:56:48, 139.69m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



cda9ad9a-1352-44b3-924f-e0e77966a8e0_20241214_002229_573.jpg, 01:00:57, 153.79m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

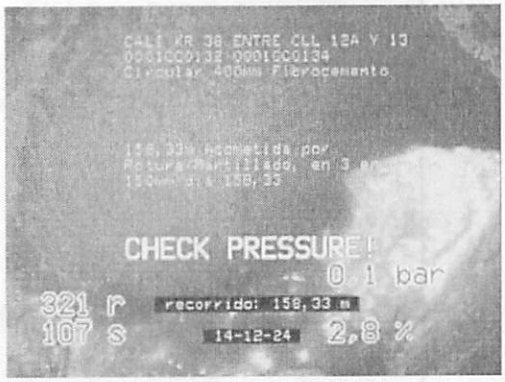

1667691e-e269-4a58-b4ca-0e00dbef95bf_20241214_002350_275.jpg, 01:02:17, 158.33m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



b6013a0f-da72-4a47-b158-2e8254d06766_20241214_002548_309.jpg, 01:04:15, 158.33m
INSPECCION TV ABANDONADA

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FORMATO INTERNO SISP

TRD: 180.10.06

CONTRATO No. :	180-10-06-005-2024
NÚMERO DE PROCESO:	SAMC-SI-004-2024
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA,
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA S.A.S NIT 890.319.290-1 Representante legal Hugo Duran Pérez
OBJETO:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS (CALENDARIO)
FECHA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE OTRO SÍ No. 1:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE OTRO SÍ No. 1:	SEIS (6) DÍAS (CALENDARIO)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Dentro de los precios del contrato de Obra Pública No. 180-10-06-005-2024 cuyo objeto es "limpieza, investigación con CCTV y reparación de puntual sin zanja de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente

mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20D entre calles 14 y 15, carrera 20E entre calles 13 y 15, carrera 20G entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo", y en el cual los ítems enumerados a continuación **NO** se encontraban como ítems aprobados.

Estos ítems fueron actualizados acorde a las actividades ejecutadas en el sector ACOPI, durante la ejecución del contrato se encontró en la inspección diferencias de los diámetros de las tuberías del contrato con los diámetros de los planos de redes de alcantarilladlo existente suministrados por la ESPY y por EMCALI y las condiciones reales evidenciadas en la investigación y diagnóstico en sitio, de las tuberías.

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	16"	ML		243,6	243,6
4,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	21"	ML		228,3	228,3
4,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	15"	ML		136,0	136,0
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	21"	ML		257,6	257,6
4.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		68,7	68,7
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 39-40	12"	ML		102,7	102,7
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	12"	ML		85,2	85,2

Una vez realizada la inspección de la tubería de Hormigón simple de 15" en la Carrera 38 entre calles 12A -13, se encontró que presentaba asentamiento y deterioro de un tramo de 5 m, lo que hace necesario debido al alto tráfico vehicular de vehículos pesados, mulas y camiones de transporte, realizar la reparación del tramo. El detalle de los ítems y las cantidades de obra acorde a los precios de la Gobernación del Valle Decreto 1.22-1441 del 14 de agosto de 2024 tomado de la Gaceta Departamental del 16 de agosto de 2024 y en cuanto al precio de retiro de material, el contratista presenta el APU.

Código	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD EJECUTADA
80107	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA 1,8 M SR	m3	13,5
APU	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA DISTANCIAS > 10 KM	m3	17,55
100616	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO	m3	4,6449
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO - RANA	m3	8,775
80201	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR SIN TRANSPORTE	m3	7,02
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14" A 24"	ML	5
100623	ACARRRERO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M	m3	20,4399

20307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 15" UNION CAUCHO	ML	5
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CM 250 MTS	UND	1

Los ítems de mayor cantidad de obra, a la contractual se detallan a continuación:

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
			LAVADO	INSPECCION
ITEMS DE MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA				
1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14 DIAMETRO 36"	ML	170,78	170,78

Para constancia se firma en Yumbo a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma:

Carlos Eduardo Brion Molina
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura
y Servicios Públicos

Firma:

Hugo Duran Pérez
Representante Legal
Compañía de ingeniería sanitaria
CODINSA S.A.S

Firma:

Viviany Ortiz Rico
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura Servicios Públicos

Alcaldía de Yumbo	MUNICIPIO DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATO No.180-10-06-005-2024	ACTA DE PAGO #1
Obra	"LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12, 12A, 13, 14 y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20 E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO."		FECHA 18-dic-24

	CONTRATO							ACTA DE PAGO #1					
1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR.TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO	
1,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	27"	ML	381,9	$ 55 000	$ 12 100	$ 25 627 503,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 DER VIA	27"	ML	262,7	$ 55 000	$ 12 100	$ 17 624 486,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	224,9	$ 85 000	$ 12 100	$ 21 840 703,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
1,4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	262,4	$ 85 000	$ 12 100	$ 25 480 982,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
1,5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	27	ML	56,6	$ 55 000	$ 12 100	$ 3 795 847,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	36"	ML	259,7	$ 55 000	$ 12 100	$ 17 427 883,00	90,27	$ 55 000	90,27	$ 12 100	$	6 057 117,00
1,7	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	18"	ML	253,1	$ 30 000	$ 12 100	$ 10 654 247,00	253,07	$ 30 000		$ 12 100	$	7 592 100
1,8	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	55"	ML	86,3	$ 85 000	$ 12 100	$ 8 381 672,00	170,78	$ 85 000	170,78	$ 12 100	$	16 582 738,00
1,9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15	15"	ML	226,4	$ 30 000	$ 12 100	$ 9 531 019,00	226,39	$ 30 000		$ 12 100	$	6 791 700,00
1,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	15"	ML	84,9	$ 30 000	$ 12 100	$ 3 575 974,00	84,94	$ 30 000		$ 12 100	$	2 548 200,00
1,11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	21"	ML	53,1	$ 30 000	$ 12 100	$ 2 237 194,00	53,14	$ 30 000		$ 12 100	$	1 594 200,00
1,12	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13	12"	ML	261,6	$ 30 000	$ 12 100	$ 11.012 097,00	261,57	$ 30 000	261,57	$ 12 100	$	11 012 097
1,13	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	15"	ML	166,2	$ 30 000	$ 12 100	$ 6 998 283,00	166,23	$ 30 000	166,23	$ 12 100	$	6 998 283
1,14	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER VIA	18"	ML	83,0	$ 30 000	$ 12 100	$ 3 493 037,00	82,97	$ 30 000	82,97	$ 12 100	$	3 493 037
1,15	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	15"	ML	178,7	$ 30 000	$ 12 100	$ 7 523 691,00	178,70	$ 30 000	36,83	$ 12 100	$	5 806 683,75
1,16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	18"	ML	77,0	$ 30 000	$ 12 100	$ 3 243 384,00	77,000	$ 30 000		$ 12 100	$	2 310 000
1,17	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	15"	ML	228,3	$ 30 000	$ 12 100	$ 9 611 009,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,18	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	21"	ML	136,0	$ 30 000	$ 12 100	$ 5 723 495,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,19	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	27"	ML	73,73	$ 55.000	$ 12 100	$ 4 947 283,00		$ 55.000		$ 12 100	$	-
1,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	36"	ML	14,1	$ 55 000	$ 12 100	$ 944 768,00	11,64	$ 55 000	11,64	$ 12 100	$	781 044
1,21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 38-39	18"	ML	103,8	$ 30 000	$ 12 100	$ 4 367 875,00	103,75	$ 30 000	103,75	$ 12 100	$	4 367 875,00
1,22	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 37-38	27"	ML	103,5	$ 55 000	$ 12 100	$ 6 944 850,00	103,75	$ 55 000		$ 12 100	$	5 706 250,00
1,23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	ML	106,0	$ 30 000	$ 12 100	$ 4 463 442,00	103,50	$ 30 000		$ 12 100	$	3 105 000,00
1,24	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-38	55"	ML	214,8	$ 85 000	$ 12 100	$ 20 859 022,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
1,25	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-39	27"	ML	216,4	$ 55 000	$ 12 100	$ 14 517 756,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,26	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	21"	ML	7,4	$ 30 000	$ 12 100	$ 312 803,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,28	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	21"	ML	28,0	$ 30 000	$ 12 100	$ 1 180 063,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,29	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	27"	ML	201,6	$ 55 000	$ 12 100	$ 13 528 702,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	18"	ML	2,1	$ 30 000	$ 12 100	$ 87 568,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,31	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	ML	3,4	$ 30 000	$ 12 100	$ 144 824,00		$ 30 000		$ 12 100	$	-
1,32	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	27"	ML	106,1	$ 55 000	$ 12 100	$ 7 117 297,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
1,33	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	27"	ML	110,4	$ 55 000	$ 12 100	$ 7 410 524,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
	SUBTOTAL			4679,7			$ 287.688.333,00	1967,70		924,04		$	84.746.324,75

2	ALCANTARILLADO CENCAR	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR.TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO	
2,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	30"	ML	126	$ 55 000	$ 12 100	$ 8 475 401,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
2,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	42"	ML	186	$ 85 000	$ 12 100	$ 18 060 600,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
2,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	1,20	ML	279	$ 85 000	$ 12 100	$ 27 129 740,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
2,4	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	42"	ML	153	$ 85 000	$ 12 100	$ 14 856 300,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
2,5	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	36"	ML	103	$ 55 000	$ 12 100	$ 6 881 105,00		$ 55 000		$ 12 100	$	-
2,6	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	42"	ML	129	$ 85 000	$ 12 100	$ 12 525 900,00		$ 85 000		$ 12 100	$	-
	SUBTOTAL			976,3			$ 87.929.046,00					$	-

3	REPARACIONES	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL
3,1	CORTE/PERFILAMIENTO CON EQUIPO ROBÓTICO DE FRESADO DE TUBERÍA	150 a 200 mm	UND	1	$ 999.912	$ 999.912,00		$ 999.749	$ -
3,2	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	150 a 200 mm	UND	1	$ 2.398.150	$ 2.398.150,00		$ 2.398.150	$ -
3,3	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	250 a 300 mm	UND	1	$ 2.368.098	$ 2.368.098,00		$ 2.368.098	$ -
3,4	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	350 a 400 mm	UND	1	$ 2.644.576	$ 2.644.576,00		$ 2.644.576	$ -
3,5	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	450 a 500 mm	UND	1	$ 3.005.200	$ 3.005.200,00		$ 3.005.200	$ -
3,6	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	600 mm	UND	1	$ 3.522.094	$ 3.522.094,00		$ 3.442.094	$ -
3,7	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	675 a 750 mm	UND	1	$ 3.870.698	$ 3.870.698,00		$ 3.670.698	$ -
3,8	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERÍA	mayor 750 mm	UND	1	$ 3.870.698	$ 3.870.698,00		$ 3.784.699	$ -
	SUBTOTAL			6,0		**$ 22.679.425,00**	**0,00**		**$ -**

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR.TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 12A -13	16"	ML		$ 30.000	$ 12.100		243,6	$ 30.000,00	243,59	$ 12.100	$ 10.255.139
4,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	21"	ML		$ 30.000	$ 12.100		228,3	$ 30.000,00	228,29	$ 12.100	$ 9.611.009
4,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	15"	ML		$ 30.000	$ 12.100		136,0	$ 30.000,00	135,95	$ 12.100	$ 5.723.495
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	21"	ML		$ 30.000	$ 12.100		257,6	$ 30.000,00	257,57	$ 12.101	$ 10.843.955
4.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		$ 55.000	$ 12.100		68,7	$ 55.000,00	68,74	$ 12.100	$ 4.612.454
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 39-40	12"	ML		$ 30.000	$ 12.100		102,7	$ 30.000,00	102,73	$ 12.100	$ 4.324.933
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-38	12"	ML		$ 30.000	$ 12.100		85,2	$ 30.000,00	85,20	$ 12.100	$ 3.586.920
								607,83		1122,07		
	SUBTOTAL							**2575,53**	46%	**2046,11**	36%	**$ 48.957.904,57**

5	NO PREVISTOS		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL
80107	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA 1,8 M SR		m3		$ 26.555		13,50	$ 26.555			$ 358.492,50
APU	EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA DISTANCIAS > 10 KM		m3		$ 55.020		17,55	$ 55.020			$ 965.601,00
100616	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO		m3		$ 174.523		4,64	$ 174.523			$ 810.641,88
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO - RANA		m3		$ 76.265		8,78	$ 76.265			$ 669.225,38
80201	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR SIN TRANSPORTE		m3		$ 122.433		7,02	$ 122.433			$ 859.479,66
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14" A 24"		ML		$ 29.373		5,00	$ 29.373			$ 146.865,00
100623	ACARRRERO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M		m3		$ 70.973		20,44	$ 70.973			$ 1.450.681,02
20307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 15" UNION CAUCHO		ML		$ 178.508		5,00	$ 178.508			$ 892.540,00
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CM 250 MTS		UND		$ 159.948		1,00	$ 159.948			$ 159.948,00
											$ -
	SUBTOTAL										**$ 6.313.474,44**

COSTOS INDIRECTOS						
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**5655,99**		**$ 398.296.804,00**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADO**		**$ 140.017.703,76**
	ADMINISTRACION	24,00%	$ 95.591.233,00	ADMINISTRACION	24,00%	$ 33.604.248,90
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.982.968,00	IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.400.177,04
	UTILIDAD	8,00%	$ 31.863.744,00	UTILIDAD	8,00%	$ 11.201.416,30
	TOTAL AIU	**33,00%**	**$ 131.437.945,00**	**TOTAL AIU**	**33,00%**	**$ 46.205.842,24**
	VALOR TOTAL OBRA		**$ 529.734.749,00**	**VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO**		**$ 186.223.546,00**

VALOR INTERVENTORIA	SISP	VALOR INTERVENTORIA	SISP

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 529.734.749,00**
PLAZO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (DIAS CALENDARIO)	**30**

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
infraestructura@yumbo.gov.co
(602) 6516600

HUGO DURAN PEREZ
Representante Legal
CODINSA S.A.S.

VIVIAN ORTIZ RICO
Profesional de apoyo a la supervision
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

	Alcaldía de Yumbo	MUNICIPIO DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATO No 180-10-06-005-2024	ACTA DE PAGO FINAL
Obra	"LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO QUE SE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12, 12A, 13, 14 y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLE 14 Y 16, CARRERA 20 E CALLES 13 Y 16 CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO "		FECHA	27-dic-24

	CONTRATO							ACTA DE PAGO #1					ACTA DE PAGO FINAL					
1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR TOTAL	CANT LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADOS	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO PAGADO	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADOS	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
1.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 12 -13 IZQ CANAL	27"	ML	381.9	$ 55.000	$ 12.100	$ 25.627.503.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 DER V/A	27"	ML	262.7	$ 55.000	$ 12.100	$ 17.624.466.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	262.66	$ 55.000	262.66	$ 12.100	$ 17.624.466	$ 17.624.466
1.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14 ZQ CANAL	BOX 2x1.7	ML	324.9	$ 65.000	$ 12.100	$ 21.840.723.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	324.93	$ 65.000	324.93	$ 12.100	$ 21.840.723	$ 21.840.723
1.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	BOX 2x1.7	ML	262.4	$ 65.000	$ 12.100	$ 25.480.982.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	262.42	$ 65.000	262.42	$ 12.100	$ 25.480.982	$ 25.480.982
1.5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 ZQ CANAL	27"	ML	56.6	$ 55.000	$ 12.100	$ 3.795.647.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	56.57	$ 55.000	56.57	$ 12.100	$ 3.795.647	$ 3.795.647
1.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 12A -13	36"	ML	259.7	$ 55.000	$ 12.100	$ 17.421.883.00	90.27	$ 55.000	90.27	$ 12.100	$ 6.057.117		$ 55.000		$ 12.100		$ 6.057.117
1.7		18"	ML	253.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 10.654.247.00	253.07	$ 30.000		$ 12.100	$ 7.592.100		$ 30.000	253.07	$ 12.100	$ 3.062.147	$ 10.654.247
1.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 13-14	55"	ML	86.3	$ 65.000	$ 12.100	$ 6.381.672.00	-	-	-	$ 12.100	$ 16.582.738		$ 65.000		$ 12.100		$ 16.582.738
1.9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 14-15	15"	ML	226.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 9.531.019.00	226.39	$ 30.000		$ 12.100	$ 6.791.700		$ 30.000	226.39	$ 12.100	$ 2.739.319	$ 9.531.019
1.11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 14-15 DER V/A	15"	ML	84.9	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.575.974.00	84.94	$ 30.000		$ 12.100	$ 2.548.200		$ 30.000	84.94	$ 12.100	$ 1.027.774	$ 3.575.974
1.11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 14-15 DER V/A	21"	ML	53.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 2.237.194.00	53.14	$ 30.000		$ 12.100	$ 1.564.200		$ 30.000	53.14	$ 12.100	$ 642.994	$ 2.237.194
1.12	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13	12"	ML	261.6	$ 30.000	$ 12.100	$ 11.012.097.00	261.57	$ 30.000	261.57	$ 12.100	$ 11.012.097		$ 30.000		$ 12.100		$ 11.012.097
1.13	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER V/A	15"	ML	166.2	$ 30.000	$ 12.100	$ 6.998.283.00	166.23	$ 30.000	166.23	$ 12.100	$ 6.998.283		$ 30.000		$ 12.100		$ 6.998.283
1.14	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 12A -13 DER V/A	18"	ML	83.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.493.037.00	82.97	$ 30.000	82.97	$ 12.100	$ 3.493.037		$ 30.000		$ 12.100		$ 3.493.037
1.15	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	15"	ML	178.7	$ 30.000	$ 12.100	$ 7.523.691.00	178.71	$ 30.000	36.83	$ 12.100	$ 5.806.684		$ 30.000		$ 12.100		$ 5.806.684
1.16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 13-14	18"	ML	77.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 3.243.384.00	77.00	$ 30.000		$ 12.100	$ 2.310.000		$ 30.000	77.00	$ 12.100	$ 931.700	$ 3.241.700
1.17	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 IZQ	15"	ML	228.3	$ 30.000	$ 12.100	$ 9.611.009.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.18	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14 -15 DER	21"	ML	136.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 5.723.496.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.19	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-36	27"	ML		$ 55.000	$ 12.100	$ 4.647.293.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 37-36	36"	ML	14.1	$ 55.000	$ 12.100	$ 944.768.00	11.64	$ 55.000	11.64	$ 12.100	$ 781.044		$ 55.000		$ 12.100		$ 781.044
1.21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	ML	103.8	$ 30.000	$ 12.100	$ 4.367.875.00	103.75	$ 30.000		$ 12.100	$ 4.367.875		$ 30.000	103.75	$ 12.100	$ 1.255.375	$ 5.623.250
1.22	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 37-38	27"	ML	103.8	$ 55.100	$ 12.100	$ 6.844.850.00	103.75	$ 55.000	103.75	$ 12.100	$ 6.706.250		$ 55.000		$ 12.100		$ 6.706.250
1.23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 36-35	18"	ML	106.0	$ 30.100	$ 12.100	$ 4.463.442.00	103.50	$ 30.000		$ 12.100	$ 3.105.000		$ 30.000	103.75	$ 12.100	$ 1.255.375	$ 4.360.375
1.24	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-36	55"	ML	214.8	$ 65.000	$ 12.100	$ 20.659.022.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0		$ 65.000		$ 12.100		$ -
1.25	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-39	27"	ML	216.4	$ 55.000	$ 12.100	$ 14.517.756.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.26	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 36-39	21"	ML	7.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 312.803.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.28	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 36-39	21"	ML	28.0	$ 30.000	$ 12.100	$ 1.180.963.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0		$ 30.000		$ 12.100		$ -
1.29	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 38-39	27"	ML	201.6	$ 55.000	$ 12.100	$ 13.628.702.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0		$ 55.000		$ 12.100		$ -
1.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-36	18"	ML	2.1	$ 30.000	$ 12.100	$ 87.568.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0	2.06	$ 30.000	2.06	$ 12.100	$ 87.568	$ 87.568
1.31	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	ML	3.4	$ 30.000	$ 12.100	$ 144.824.00		$ 30.000		$ 12.100	$ 0	3.44	$ 30.000	3.44	$ 12.100	$ 144.824	$ 144.824
1.32	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	27"	ML	106.1	$ 55.000	$ 12.100	$ 7.117.297.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	106.07	$ 55.000	106.07	$ 12.100	$ 7.117.297	$ 7.117.297
1.33	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 36-39	27"	ML	110.4	$ 55.000	$ 12.100	$ 7.410.524.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	110.44	$ 55.000	110.44	$ 12.100	$ 7.410.524	$ 7.410.524
	SUBTOTAL			4679.7			$ 287.608.333,00	1967.71		924.04		$ 84.748.324,75	1028.81		1930.65		$ 84.416.916,00	$ 179.163.239,75
													2996.52		2854.69			

	CONTRATO							ACTA DE PAGO #1					ACTA DE PAGO FINAL					
2	ALCANTARILLADO CENCAR	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR TOTAL	CANT LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADOS	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO	CANT LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADOS	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
2.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	30"	ML	126	$ 55.000	$ 12.100	$ 8.475.401.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	126.31	$ 55.000	126.31	$ 12.100	$ 8.475.401	$ 8.475.401.00
2.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	42"	ML	186	$ 65.000	$ 12.100	$ 18.060.600.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	186.00	$ 65.000	186.00	$ 12.100	$ 18.060.600	$ 18.060.600.00
2.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 16	42"	ML	279	$ 65.000	$ 12.100	$ 27.129.740.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	279.40	$ 65.000	279.40	$ 12.100	$ 27.129.740	$ 27.129.740.00
2.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 16	42"	ML	153	$ 65.000	$ 12.100	$ 14.856.300.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	153.00	$ 65.000	153.00	$ 12.100	$ 14.856.300	$ 14.856.300.00
2.5	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	36"	ML	103	$ 55.000	$ 12.100	$ 6.881.105.00		$ 55.000		$ 12.100	$ 0	103.55	$ 55.000	103.55	$ 12.100	$ 6.881.105	$ 6.881.105.00
2.6	LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	42"	ML	129	$ 65.000	$ 12.100	$ 12.525.900.00		$ 65.000		$ 12.100	$ 0	129.00	$ 65.000	129.00	$ 12.100	$ 12.525.900	$ 12.525.900.00
												$ 0						
	SUBTOTAL			976.3			$ 87.929.046,00						976.26		976.26		$ 87.929.046,00	$ 87.929.046,00

	CONTRATO						ACTA DE PAGO #1				ACTA DE PAGO FINAL				
3	REPARACIONES	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL	CANT	VALOR DE LA REPARACION	VALOR TOTAL		CANT	VALOR DE LA REPARACION		VR TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
3.1	CORTE APERTURAMIENTO CON EQUIPO ROBOTICO DE FRESADO DE TUBERIA	150 a 200 mm	UND	1	$ 999.912	$ 999.912,00		$ 999.749			16.00	$ 999.749		$ 15.995.984	$ 15.995.984,00
3.2	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	150 a 200 mm	UND	1	$ 2.398.150	$ 2.398.150,00		$ 2.398.150				$ 2.398.150			$ -
3.3	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	250 a 300 mm	UND	1	$ 2.368.098	$ 2.368.098,00		$ 2.368.098				$ 2.368.098			$ -
3.4	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	350 a 400 mm	UND	1	$ 2.644.576	$ 2.644.576,00		$ 2.644.576			19.00	$ 2.644.576		$ 50.246.944	$ 50.246.944,00
3.5	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	450 a 500 mm	UND	1	$ 3.005.200	$ 3.005.200,00		$ 3.005.200				$ 3.005.200			$ -
3.6	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	600 mm	UND	1	$ 3.522.094	$ 3.522.094,00		$ 3.442.094				$ 3.442.094			$ -
3.7	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	675 a 750 mm	UND	1	$ 3.870.696	$ 3.870.696,00		$ 3.670.696				$ 3.670.696			$ -
3.8	REPARACIÓN PUNTUAL EN TUBERIA	mayor 750 mm	UND	1	$ 3.870.696	$ 3.870.696,00		$ 3.784.699				$ 3.784.699			$ -
	SUBTOTAL			6.0		$ 22.679.425,00	0.00							$ 66.242.928,00	$ 66.242.928,00

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT	VALOR UNITARIO LAVADO	VALOR UNITARIO INSPECCION	VR.TOTAL	CANT. LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO PAGADO	CANT LAVADO EJECUTADO	VALOR UNITARIO LAVADO EJECUTADO	CANT INSPECCION EJECUTADO	VALOR UNITARIO INSPECCION EJECUTADO	VR.TOTAL EJECUTADO A PAGAR PRESENTE ACTA	VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
4.1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 12A-12	18"	ML		$ 30 000	$ 12 100		243.6	$ 30 000.00	243.59	$ 12 100	$ 10 255 139		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 10 255 139
4.2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 36 CALLE 14-15 IZQ	21"	ML		$ 30 000	$ 12 100		228.3	$ 30 000.00	228.29	$ 12 100	$ 9 611 009		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 9 611 009
4.3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 14-15 DER	15"	ML		$ 30 000	$ 12 100		136.0	$ 30 000.00	135.95	$ 12 100	$ 5 723 495		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 5 723 495
4.4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA. 37 CALLE 12-13 IZQ CANAL	21"	ML		$ 30 000	$ 12 100		257.6	$ 30 000.00	257.57	$ 12 101	$ 10 843 955		$ 30 000.00		$ 12 101		$ 10 843 955
4.5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14	36"	ML		$ 55 000	$ 12 100		68.7	$ 55 000.00	68.74	$ 12 100	$ 4 612 454		$ 55 000.00		$ 12 100		$ 4 612 454
4.7	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A CR 39 40	12"	ML		$ 30 000	$ 12 100		102.7	$ 30 000.00	102.73	$ 12 100	$ 4 324 933		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 4 324 933
4.8	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 12A ENTRE CR 37 38	12"	ML		$ 30 000	$ 12 100		85.2	$ 30 000.00	85.20	$ 12 100	$ 3 586 920		$ 30 000.00		$ 12 100		$ 3 586 920
4.9	LIMPIEZA DE TUBERIA CL 14 ENTRE CR 37 38	18"	ML		$ 30 000	$ 12 100							214.8	$ 30 000.00	214.82	$ 12 100	$ 9 043 922	$ 9 043 922
				5656.0				1122.07		1122.07			214.82		214.82			
	SUBTOTAL							3089.78	55%	924.04	16%	$ 48 867 804,67	5309.47	94%	6167.84	91%	$ 9 043 922,00	$ 58 001 826,67
								5057.49									

5	NO PREVISTOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO			VR.TOTAL EJECUTADO PAGADO						VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
6010?	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA Y M SH	m3		$ 26 555		13.50	$ 26 555			$ 358 492,50						$ 358 492,50
APU	EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL CON DISPOSICION FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA PARA DISTANCIAS > 10 KM	m3		$ 55 000		17.55	$ 55 000			$ 965 601,00						$ 965 601,00
1306*6	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTADO	m3		$ 174 523		4.64	$ 174 523			$ 810 641,58						$ 810 641,58
1306*9	RELLENO RECAMBERTA COMPACTADO ARENA	m3		$ 76 265		8.78	$ 76 265			$ 669 205,38						$ 669 205,38
80001	BASE COMPACTADO MATERIAL TRITURADO GRANULAR SIN TRANSPORTE	m3		$ 122 433		7.03	$ 122 433			$ 859 479,66						$ 859 479,66
10111	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 14 A 24	ML		$ 29 373		5.00	$ 29 373			$ 146 865,00						$ 146 865,00
130623	ACARREREO MATERIALES PETREOS HASTA 10 M	m3		$ 76 973		20.44	$ 70 973			$ 1 450 681,02						$ 1 450 681,02
20307	TUBERIA CONCRETO S MPLE DN 15 UNION CAUCHO	ML		$ 178 508		5.00	$ 178 508			$ 892 540,00						$ 892 540,00
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A A R CM 250 MTS	UNO		$ 159 948		1.00	$ 159 948			$ 159 948,00						$ 159 948,00
										$						$
	SUBTOTAL									$ 6.313.474,44						$ 6.313.474,44

CONTRATO				ACTA DE PAGO #1				ACTA DE PAGO FINAL				VR.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$469.09		$ 388.296 804,00	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADO			$ 160 017 703,76	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADO			$ 257 833 811,00	$ 337 850 514,76
	ADMINISTRACION	24.00%	$ 95 591 233,92	ADMINISTRACION	24.00%		$ 33 604 248,90	ADMINISTRACION	24.00%		$ 61 831 874,64	$ 95 436 123,54
	IMPREVISTOS	1.00%	$ 3 982 968,00	IMPREVISTOS	1.00%		$ 1 400 177,04	IMPREVISTOS	1.00%		$ 2 576 328,11	$ 3 976 505,15
	UTILIDAD	8.00%	$ 31 863 744,00	UTILIDAD	8.00%		$ 11 201 416,30	UTILIDAD	8.00%		$ 20 610 624,88	$ 31 812 041,18
	TOTAL AIU	33.00%	$ 131 437 945,92	TOTAL AIU	33.00%		$ 46 205 842,24	TOTAL AIU	33.00%		$ 85 018 827,63	$ 131 224 669,87
	VALOR TOTAL OBRA		$ 629.734.749,00	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO			$ 188 223 546,00	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO			$ 342.851 639,00	$ 629 076 185,00
	VALOR INTERVENTORIA		$/SP	VALOR INTERVENTORIA				VALOR INTERVENTORIA				$/SP

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 629.734.749,00
PLAZO DE ENTREGA CUARENTA Y CINCO (DIAS CALENDARIO)	30

Nota 1 Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor El pago de la presente acta se realizara con base al principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervision y el contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervision

Nota 2 El supervisor certifica que verifico y constato el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
infraestructura@yumbo.gov.co

HUGO DURAN PEREZ
Representante Legal
COONSA S A S

VIVIANA ORTIZ RICO
Profesional de apoyo a la supervision
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 798 DE 2002

Que la suscrita **KATHERINE CASAS TRUJILLO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.66.980.860 de Cali-valle; Tarjeta profesional No. 110021-T, en su calidad de **Revisor Fiscal** de la empresa **COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS EN REORGANIZACION**, identificada con Nit.890.319.290-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social, realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar , instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo.

Para constancia se firma en yumbo, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

KATHERINE CASAS TRUJILLO
Revisor Fiscal
C.C 66.980.860
TP.No.110021-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.980.860**

CASAS TRUJILLO

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1976**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-1994 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-3100100-00637714-F-0066980860-20141110 0040928933A 3 43720803

USO EXCLUSIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

110021-T



KATHERINE
CASAS TRUJILLO
C.C. 66980860
RES. INSCRIPCION 39 DEL 14/04/2005
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277481 119636

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

USO EXCLUSIVO PROCESO LICITACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 Z 4 6 4 7 3 3 A 8 5 7 1 5 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATHERINE CASAS TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66980860 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 110021-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS	CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53 526 700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	394 100	0		0		0	0	0	0	394 100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	603 300	0		0		0	0	0	0	603 300	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4 373 100	0		0		0	0	0	0	4 373 100	22
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	420 000	0		0		0	0	0	0	420 000	5
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	468 200	0		0		0	0	0	0	468 200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2 036 500	0		0		0	0	0	0	2 036 500	22
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	115 000	0		0		0	0	0	0	115 000	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	52 000	0		0		0	0	0	0	52 000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3 105 800	0	0	0	0	0	0		3 105 800	9
230301	Porvenir	800224808-8	14 008 600	0	0	56 600	56 600	0	0		14 121 800	42
231001	Colfondos	800227940-6	1 454 600	0	0	0	0	0	0		1 454 600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	10 542 100	0	0	210 200	210 200	0	0		10 962 500	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7 631 800				7 631 800	0	0	7 631 800			76 318	7 631 800	70

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	7 090 500	0	0	7 090 500	70

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53.526.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
279.000	0	0	279.000	1
ICBF				
418.500	0	0	418.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	8.462.200	8.462.200
Pensión	4	29.644.700	29.644.700
Riesgos Laborales	1	7.631.800	7.631.800
CCF	1	7.090.500	7.090.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	418.500	418.500
MEN	0	0	0
SENA	1	279.000	279.000
TOTALES	16	53.526.700	53.526.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53.526.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	6097197	GOMEZ MACICAYA JAIME	1	0			S										X							25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	0	CCF56	1.300.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	6102111	MOSCOSO SANCHEZ JOHN EDWIN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF56	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	6333013	RAMOS BENAVIDES EULISES	1	0			S								X									230301	1.662.445	266.000	0	0	0	0	EPS012	1.662.445	66.500	14-25	1.662.445	4	72.400	CCF56	1.662.445	66.500	0	0	0	0	0
4	CC	6626711	BERMUDEZ NIEVA HECTOR JAIRO	1	0			S								X									25-14	1.665.554	266.500	0	0	0	0	EPS012	1.665.554	66.700	14-25	1.665.554	1	8.700	CCF56	1.665.554	66.700	0	0	0	0	0
5	CC	11708195	VARELA MOSQUERA JABER	1	0			S								X									230301	2.467.062	394.800	0	0	0	0	EPS037	2.467.062	98.700	14-25	2.467.062	5	171.800	CCF56	2.467.062	98.700	0	0	0	0	0
6	CC	12918326	SEVILLANO TEODORO	1	0			S								X									25-14	2.426.322	388.300	0	0	0	0	EPS002	2.426.322	97.100	14-25	2.426.322	5	168.900	CCF56	2.426.322	97.100	0	0	0	0	0
7	CC	14575682	CHITO GUZMAN ALONSO	1	0			S										X							25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-25	86.667	5	0	CCF56	86.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	14575682	CHITO GUZMAN ALONSO	1	0			S								X									25-14	1.722.444	275.600	0	0	0	0	EPS010	1.722.444	68.900	14-25	1.722.444	5	119.900	CCF56	1.722.444	68.900	0	0	0	0	0
9	CC	16765921	GARCIA GRAJALES EDINSON	1	0			S												X					25-14	540.222	86.500	0	0	0	0	EPS037	540.222	21.700	14-25	540.222	4	0	CCF56	479.693	19.200	0	0	0	0	0
10	CC	16765921	GARCIA GRAJALES EDINSON	1	0			S								X									25-14	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-25	823.334	4	35.900	CCF56	650.000	26.000	0	0	0	0	0
11	CC	16781993	DURAN PEREZ HUGO	1	0			S																	25-14	6.372.000	1.019.600	0	0	31.900	31.900	EPS010	6.372.000	254.900	14-25	6.372.000	1	33.300	CCF56	6.372.000	254.900	0	0	0	0	0
12	CC	16796605	CHATES RAMIREZ MARLON JAIR	1	0			S								X									25-14	2.727.428	436.400	0	0	0	0	EPS010	2.727.428	109.100	14-25	2.727.428	5	189.900	CCF56	2.727.428	109.100	0	0	0	0	0
13	CC	16948772	ALEGRIA LUIS FELIPE	1	0			S								X									230301	1.899.893	304.000	0	0	0	0	EPS012	1.899.893	76.000	14-25	1.899.893	1	10.000	CCF56	1.899.893	76.000	0	0	0	0	0
14	CC	31572778	RAMIREZ CAMPO PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230301	2.311.826	369.900	0	0	0	0	EPS005	2.311.826	92.500	14-25	2.311.826	4	100.600	CCF56	2.311.826	92.500	0	0	0	0	0
15	CC	66814952	GARCES TORRES MAGDA VIVIANA	1	0			S								X									230301	6.024.107	963.900	0	0	30.200	30.200	EPS010	6.024.107	241.000	14-25	6.024.107	5	419.300	CCF56	6.024.107	241.000	0	0	0	0	0
16	CC	66858054	DURAN PEREZ ELIZABETH	1	0			N								X									25-14	13.947.838	2.231.700	0	0	69.800	69.800	EPS010	13.947.838	1.743.500	14-25	13.947.838	5	970.800	CCF56	13.947.836	558.000	13.947.836	279.000	418.500	0	0
17	CC	66954100	PAQUE ROJAS MABEL	1	0			S								X									25-14	4.450.000	712.000	0	0	0	0	EPS005	4.450.000	178.000	14-25	4.450.000	1	23.300	CCF56	4.450.000	178.000	0	0	0	0	0
18	CC	66987711	ASTUDILLO MEJIA ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	1.890.000	302.400	0	0	0	0	EPS010	1.890.000	75.600	14-25	1.890.000	1	9.900	CCF56	1.890.000	75.600	0	0	0	0	0
19	CC	67006959	DURAN PEREZ MARCELA	1	0			S								X									25-14	10.149.360	1.623.900	0	0	50.800	50.800	EPS010	10.149.360	406.000	14-25	10.149.360	1	53.000	CCF56	10.149.360	406.000	0	0	0	0	0
20	CC	76140801	FORY MERA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	3.100.630	496.200	0	0	0	0	EPS037	3.100.630	124.100	14-25	3.100.630	5	215.900	CCF56	3.100.630	124.100	0	0	0	0	0
21	CC	94071833	GAMBOA GUZMAN JIMY	1	0			S								X									231001	1.995.781	319.400	0	0	0	0	EPS037	1.995.781	79.900	14-25	1.995.781	1	10.500	CCF56	1.995.781	79.900	0	0	0	0	0
22	CC	94361713	BOJORGE APOLINDAR JOSE INEL	1	0			S								X									230301	2.075.945	332.200	0	0	0	0	EPS037	2.075.945	83.100	14-25	2.075.945	5	144.500	CCF56	2.075.945	83.100	0	0	0	0	0
23	CC	94370979	IBARRA LEONARDO FABIO	1	0			S								X									230301	1.736.206	277.800	0	0	0	0	EPS037	1.736.206	69.500	14-25	1.736.206	5	120.900	CCF56	1.736.206	69.500	0	0	0	0	0
24	CC	94421026	ZAPATA FIGUEROA LUIS ALFREDO	1	0			S								X									230201	3.404.021	544.700	0	0	0	0	EPS012	3.404.021	136.200	14-25	3.404.021	5	237.000	CCF56	3.404.021	136.200	0	0	0	0	0
25	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S										X							230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS018	996.667	39.900	14-25	996.667	1	0	CCF56	996.667	0	0	0	0	0	0
26	CC	94426070	LUNA DELGADO EINER ARIEL	1	0			S																	230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS018	303.334	12.200	14-25	303.334	1	1.600	CCF56	303.333	12.200	0	0	0	0	0
27	CC	94458904	MOSQUERA VALENCIA NELSON FABIO	1	0			S												X					25-14	851.585	136.300	0	0	0	0	EPS037	851.585	34.100	14-25	851.585	5	0	CCF56	759.780	30.400	0	0	0	0	0
28	CC	94458904	MOSQUERA VALENCIA NELSON FABIO	1	0			S								X									25-14	1.828.062	292.500	0	0	0	0	EPS037	1.828.062	73.200	14-25	1.828.062	5	127.300	CCF56	1.828.062	73.200	0	0	0	0	0
29	CC	94459463	ARCE ESPINOSA BLADIMIR	1	0			S								X									25-14	11.528.531	1.844.600	0	0	57.700	57.700	EPS010	11.528.531	461.200	14-25	11.528.531	1	60.200	CCF56	11.528.531	461.200	0	0	0	0	0
30	CC	94529079	GARCIA CAMAÑO NEIR	1	0			S								X									25-14	1.863.217	298.200	0	0	0	0	EPS012	1.863.217	74.600	14-25	1.863.217	1	9.800	CCF56	1.863.217	74.600	0	0	0	0	0
31	CC	1002946450	BALLESTEROS MINA DUVAN YESID	1	0			S								X									230201	2.419.130	387.100	0	0	0	0	EPS010	2.419.130	96.800	14-25	2.419.130	1	12.700	CCF56	2.419.130	96.800	0	0	0	0	0
32	CC	1005866633	PALACIOS MOSQUERA KEVIN	1	0			S								X									230301	2.151.660	344.300	0	0	0	0	EPS018	2.151.660	86.100	14-25	2.151.660	5	149.800	CCF56	2.151.660	86.100	0	0	0	0	0
33	CC	1005944956	DINAS MONTAÑO JUAN CAMILO	1	0			S								X									230301	1.634.043	261.500	0	0	0	0	EPS037	1.634.043	65.400	14-25	1.634.043	5	113.800	CCF56	1.634.043	65.400	0	0	0	0	0
34	CC	1007517299	CONGOLINO BONILLA DAMIAN	1	0			S								X									230301	1.736.942	278.000	0	0	0	0	EPS010	1.736.942	69.500	14-25	1.736.942	5	120.900	CCF56	1.736.942	69.500	0	0	0	0	0
35	CC	1010053989	MESA MARIO	1	0			S								X									231001	2.878.874	460.700	0	0	0	0	EPS018	2.878.874	115.200	14-25	2.878.874	5	200.400	CCF56	2.878.874	115.200	0	0	0	0	0
36	CC	1061811464	VALENCIA PERLAZA EVA MARIA	1	0			S								X									25-14	1.711.675	273.900	0	0	0	0	EPS010	1.711.675	68.500	14-25	1.711.675	1	9.000	CCF56	1.711.675	68.500	0	0	0	0	0
37	CC	1086054117	OTERO CAICEDO LEWINSON	1	0			S								X									230201	2.516.154	402.600	0	0	0	0	EPS002	2.516.154	100.700	14-25	2.516.154	5	175.200	CCF56	2.516.154	100.700	0	0	0	0	0
38	CC	1089000630	GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.687.878	430.100	0	0	0	0	EPS010	2.687.878	107.600	14-25	2.687.878	5	187.100	CCF56	2.687.878	107.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890319290-1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		CRA 39 No 11-166	6653151	contabilidad2@codinsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	YUMBO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/12/2024	82655055	$53.526.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	1092357221	CARABALI MINDINERO KEYLA YELISA	1	0			S	X																230301	720.000	115.200	0	0	0	0	EPS010	720.000	28.800	14-25	720.000	1	3.800	CCF56	720.000	28.800	0	0	0	0	0
40	CC	1107034988	RINCON POLANCO JAVIER ANTONIO	1	0			S								X									231001	1.974.303	315.900	0	0	0	0	EPS010	1.974.303	79.000	14-25	1.974.303	5	137.500	CCF56	1.974.303	79.000	0	0	0	0	0
41	CC	1107512806	JIMENEZ DIAZ ERIKA LIZETH	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF56	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
42	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0			S													X				230301	816.533	130.700	0	0	4.100	4.100	EPS037	816.533	32.700	14-25	816.533	2	0	CCF56	857.952	34.400	0	0	0	0	0
43	CC	1111200624	PALACIO GONZALEZ JUAN DAVID	1	0			S								X									230301	4.447.886	711.700	0	0	22.300	22.300	EPS037	4.447.886	178.000	14-25	4.447.886	2	46.500	CCF56	4.447.886	178.000	0	0	0	0	0
44	CC	1112465125	RIASCOS CAICEDO HECTOR EVERT	1	0			S								X									230201	1.665.272	266.500	0	0	0	0	EPS018	1.665.272	66.700	14-25	1.665.272	5	116.000	CCF56	1.665.272	66.700	0	0	0	0	0
45	CC	1112487173	SINISTERRA MARTINEZ ROBINSON	1	0			S								X									230301	2.302.591	368.500	0	0	0	0	EPS037	2.302.591	92.200	14-25	2.302.591	5	160.300	CCF56	2.302.591	92.200	0	0	0	0	0
46	CC	1113039563	MORENO ORTIZ CARLOS EFREN	1	0			S								X									230301	2.481.231	397.000	0	0	0	0	EPS037	2.481.231	99.300	14-25	2.481.231	5	172.700	CCF56	2.481.231	99.300	0	0	0	0	0
47	CC	1113533697	REINA SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS010	1.512.000	60.500	14-25	1.512.000	1	7.900	CCF56	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
48	CC	1113537662	DIAZ CALLE LINDA MELANNY	1	0			S																	230301	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS010	1.512.000	60.500	14-25	1.512.000	1	7.900	CCF56	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
49	CC	1113673736	PERLAZA OCORO DALLANA ANDREA	1	0			S								X									230301	2.726.956	436.400	0	0	0	0	EPS037	2.726.956	109.100	14-25	2.726.956	5	189.800	CCF56	2.726.956	109.100	0	0	0	0	0
50	CC	1116259447	RAMIREZ BORBON DIANA CRISTINA	1	0			S								X									230301	2.290.000	366.400	0	0	0	0	EPS010	2.290.000	91.600	14-25	2.290.000	1	12.000	CCF56	2.290.000	91.600	0	0	0	0	0
51	CC	1118290088	RIVAS SERNA STEVENSON SAUL	1	0			S								X									230301	1.936.703	309.900	0	0	0	0	EPS016	1.936.703	77.500	14-25	1.936.703	5	134.800	CCF56	1.936.703	77.500	0	0	0	0	0
52	CC	1118306208	ESCOBAR TAMAYO MIGUEL ENRIQUE	1	0			S								X									230301	2.433.520	389.400	0	0	0	0	EPS037	2.433.520	97.400	14-25	2.433.520	5	169.400	CCF56	2.433.520	97.400	0	0	0	0	0
53	CC	1130662578	MENDOZA BENITEZ OSCAR ANDRES	1	0			S									X								230301	116.086	14.000	0	0	0	0	EPS037	116.086	0	14-25	116.086	5	0	CCF56	116.086	0	0	0	0	0	0
54	CC	1130662578	MENDOZA BENITEZ OSCAR ANDRES	1	0			S								X									230301	2.155.100	344.800	0	0	0	0	EPS037	2.155.100	86.300	14-25	2.155.100	5	150.000	CCF56	2.155.100	86.300	0	0	0	0	0
55	CC	1143850532	BEDOYA ANGULO DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.754.152	280.700	0	0	0	0	EPS005	1.754.152	70.200	14-25	1.754.152	5	122.100	CCF56	1.754.152	70.200	0	0	0	0	0
56	CC	1143927023	ANGULO GARCES JEFFERSON	1	0			S								X									230301	2.290.975	366.600	0	0	0	0	EPS037	2.290.975	91.700	14-25	2.290.975	5	159.500	CCF56	2.290.975	91.700	0	0	0	0	0
57	CC	1143928796	CHAVERRA SANCHEZ RUBEN DARIO	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS042	780.000	31.200	14-25	780.000	4	34.000	CCF56	780.000	31.200	0	0	0	0	0
58	CC	1143935301	VILLEGAS MOSQUERA EDWIN	1	0			S								X									231001	2.241.033	358.600	0	0	0	0	EPS037	2.241.033	89.700	14-25	2.241.033	5	156.000	CCF56	2.241.033	89.700	0	0	0	0	0
59	CC	1143958489	ARROYO WILMAR FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.564.300	410.300	0	0	0	0	EPS037	2.564.300	102.600	14-25	2.564.300	5	178.500	CCF56	2.564.300	102.600	0	0	0	0	0
60	CC	1144067680	FLOREZ ALVAREZ ANDREA ESTEFANNIA	1	0			S								X									230301	1.960.043	313.700	0	0	0	0	EPS010	1.960.043	78.500	14-25	1.960.043	5	136.500	CCF56	1.960.043	78.500	0	0	0	0	0
61	CC	1144079801	RIVERA OCAMPO CATALINA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF56	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
62	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	1	0			S								X									230301	2.095.000	335.200	0	0	0	0	EPS002	2.095.000	83.800	14-25	2.095.000	5	145.900	CCF56	2.095.000	83.800	0	0	0	0	0
63	CC	1144092861	RESTREPO MUÑOZ SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.878.104	300.500	0	0	0	0	EPS037	1.878.104	75.200	14-25	1.878.104	5	130.800	CCF56	1.878.104	75.200	0	0	0	0	0
64	CC	1144175950	GARZON DEVIA CRISTIAN JULIAN	1	0			S													X				230301	704.120	112.700	0	0	0	0	EPS010	704.120	28.200	14-25	704.120	2	0	CCF56	501.295	20.100	0	0	0	0	0
65	CC	1144175950	GARZON DEVIA CRISTIAN JULIAN	1	0			S								X									230301	1.061.482	169.900	0	0	0	0	EPS010	1.061.482	42.500	14-25	1.061.482	2	11.100	CCF56	1.061.482	42.500	0	0	0	0	0
66	CC	1144177056	CALDERON CHIRAN VIVIAN ANDREA	1	0			S	X	X															230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS010	476.667	19.100	14-25	476.667	1	2.500	CCF56	476.667	19.100	0	0	0	0	0
67	CC	1144180358	MORENO GUTIERREZ MARIA FERNANDA	1	0			S								X									230301	1.955.339	312.900	0	0	0	0	EPS010	1.955.339	78.300	14-25	1.955.339	5	136.100	CCF56	1.955.339	78.300	0	0	0	0	0
68	CC	1150935219	VARGAS LOPEZ JOEL ANDRES	1	0			S													L				230301	284.163	45.500	0	0	0	0	EPS037	284.163	11.400	14-25	284.163	5	0	CCF56	433.335	17.400	0	0	0	0	0
69	CC	1150935219	VARGAS LOPEZ JOEL ANDRES	1	0			S								X									230301	1.577.926	252.500	0	0	0	0	EPS037	1.577.926	63.200	14-25	1.577.926	5	109.900	CCF56	1.577.926	63.200	0	0	0	0	0
70	CC	1151447926	MONTOYA CORAL JEISON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.416.576	226.700	0	0	0	0	EPS005	1.416.576	56.700	14-25	1.416.576	1	7.400	CCF56	1.416.576	56.700	0	0	0	0	0
71	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0			S											X						230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-25	1.256.667	1	0	CCF56	1.256.667	0	0	0	0	0	0
72	CC	1151936237	HOLGUIN CAICEDO SUSANA	1	0			S								X									230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-25	43.334	1	300	CCF56	21.667	900	0	0	0	0	0
73	CC	1151958797	LOPEZ HURTADO FABIAN JOSE	1	0			S								X									230301	2.346.770	375.500	0	0	0	0	EPS005	2.346.770	93.900	14-25	2.346.770	5	163.400	CCF56	2.346.770	93.900	0	0	0	0	0
74	CC	1151968819	BETANCOURTH FREIRE LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS002	1.512.000	60.500	14-25	1.512.000	2	15.800	CCF56	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
75	CC	1192911700	CORDOBA MONDRAGON TERESA	1	0			S								X									230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF56	650.000	26.000	0	0	0	0	0
76	CC	1193043782	PALACIOS CAICEDO XIOMARA	1	0			S																	230201	1.764.000	282.300	0	0	0	0	EPS018	1.764.000	70.600	14-25	1.764.000	1	9.300	CCF56	1.764.000	70.600	0	0	0	0	0
77	CC	1193205741	BAÑOL ZAPATA KEVIN STIVEN	1	0			S								X									230301	2.594.117	415.100	0	0	0	0	EPS037	2.594.117	103.800	14-25	2.594.117	5	180.600	CCF56	2.594.117	103.800	0	0	0	0	0
78	CC	1193394854	CORREA REBOLLEDO DAVID	1	0			S								X									230301	2.092.913	334.900	0	0	0	0	EPS042	2.092.913	83.800	14-25	2.092.913	5	145.700	CCF56	2.092.913	83.800	0	0	0	0	0
79	CC	1214745918	DORADO ZEMANATE LIZETH GABRIELA	1	0			S					X			X									230201	1.727.000	276.400	0	0	0	0	EPS037	1.727.000	69.100	14-25	1.727.000	4	75.200	CCF56	1.727.000	69.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="2">TIPO DE CONTRATO
Contrato de Obra
SELECCION ABREVIDA MENOR CUANTIA

No PROCESO: SAMC-SI-004-2024</td><td colspan="2">INFORME DEL SUPERVISIÓN:</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:
LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No. CONTRATO:
180-10-06-005-2024.

Vereda: 0

Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Id tramo
0</td><td>FECHA DE INFORME:

27 DE DICIEMBRE DEL 2024</td><td>NUMERO DE INFORME:

3-2024</td></tr>
<tr><td>INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td>FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VIVIANY ORTIZ RICO</td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CODINSA S.A.S.
Gerente
Hugo Duran Pérez
C.C.16.781.993
Ingeniero Sanitario
Matricula Profesional No.
7623767513VLL</td><td>ID Contratista

NIT. 8903192901</td><td>Estado

2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>Razón social nuevo contratista</td><td>ID nuevo contratista</td><td>Origen de recursos
10 - RECURSOS PROPIOS</td></tr>
</table>

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	**LINK SECOP** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index		
NUMERO PÓLIZA	Responsabilidad civil extra contractual CO1.WRT.15693959, CO1.WRT.15685779, CO1.WRT.15685779 Cumplimiento del contrato CO1.WRT.15686058	**ASEGURADORA** **NIT**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860.524.654-6

LOCALIZACION DE LA OBRA		
Latitud	**Longitud**	Fin cr 37 cl 15 1. 3.49386 2. -76.50887
Numero vértice	1,2	
Inicio cr 37 cl 12A 1 3.49683 2 -76.5158	Inicio cr 39 cl 12A 1. 3.49397 2. -76.51646	Fin cr 39 cl 15 1. 3.49203 2. -76.50967
Sector ACOPY Y CENCAR	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 202476820063

SEGUIMIENTO FISICO
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): LAVADO ES DEL 100% Y EN INSPECCIÓN 100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO: LAVADO ES DEL 94% Y EN INSPECCIÓN 91%
SEGUIMIENTO FINANCIERO
VALOR CONTRATO (PESOS): **$529.734.749,00**
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 0,00**
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 99,84**%**
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$529.734.749,00**
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$530.000.000,00**
VALORCONTRATO INICIAL: **$529.734.749,00**
VALOR CONTRATO FINAL: **$529.734.749,00**

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

DESARROLLO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO:	**2024-11-25**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2024-12-25**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2024-12-31**
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2024-11-20**
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2024-12-31**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
HITOS: CER0O (0)	
FECHA DE HITO: NO APLICA.	
DETALLE HITO: NO APLICA.	
NUMERO DE OTRO SI: UNA (1)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	**2024-11-18**
CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	una (1)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)
TIEMPO DE PRORROGAS	Seis (6) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ULTIMA PRORROGA: 18 de diciembre de 2024	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAN DE ACCION

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

1. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de las redes sanitarias del municipio de Yumbo.

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV formulado para la zona industrial, contiene el programa para la optimización de redes y estructuras marginales a la fuente receptora. En el desarrollo de dicho programa se establece la necesidad de ejecutar proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado.

El proyecto surge a raíz de la problemática planteada en las anteriores y en la actual administración por los empresarios de la zona de ACOPI, en cuanto al deterioro y mal estado de las vías y su apoyo económico para su rehabilitación y mejoramiento. Esta situación, conllevo a la intervención de la Alcaldía a través del personal técnico e idóneo de la secretaria de Infraestructura y Servicios públicos, de sustentar , y evidenciar la problemática para definir la intervención de varias vías deterioradas, las cuales se encuentran dañadas en su estructura , producto infiltraciones causadas por las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

El deterioro y mal estado las actuales vías de los sectores de ACOPI y CENCAR han ocasionado accidentes y demoras en la movilidad; La Secretaría de Infraestructura, con la intervención del alcantarillado con el lavado, inspección y reparación puntual busca beneficiar a más de 24 empresas, con más de 300 trabajadores, que utilizan las vías del sector; por tal motivo es importante que se realice este tipo de obra para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y empresarios del sector, encaminado en mejorar la economía de los usuarios con la reducción de tiempos de traslado de mercancía y movilidad de trabajadores , mejorando la eficiencia en el sector.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo.

Por otra parte, el Municipio de Yumbo mediante el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR AYUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA", tiene como indicadores producto los siguientes:

Indicadores	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Alcantarillados optimizados.	Metros lineales	8	Optimizar 12 acueductos e intervenir 10 sistema de alcantarillado en el municipio, tanto en la zona urbana como rural

Con la ejecución de este proyecto se hará la limpieza e inspección de en 4.673 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 15", 18", 21", 27, 36" y 55" en el sector de ACOPI y 976 metros lineales de redes de alcantarillado en diámetros de 30", 36", 42", y 1,2 m en el sector de CENCAR.

El Capítulo 5 De La Finalidad Social del Estado y de Los Servicios Públicos Artículo 365 de la Constitución Política, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Dicha norma se complementa con el mandato del 366 que establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de conformidad con el artículo 3º de la ley 80 de 1993 "*los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

Se demuestra entonces, que los servicios públicos constituyen una finalidad esencial del Estado para proteger y garantizar otros derechos fundamentales en conexidad con la vida, como son la salud, el derecho al saneamiento ambiental y al agua potable.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, es la dependencia que tiene la misión de "Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de inversión para la ejecución de los programas y proyectos relacionados con las obras institucionales del Municipio de Yumbo". Para alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de Infraestructura debe desarrollar funciones para la conservación y mejoramiento de la infraestructura vial municipal en la zona rural, urbana e industrial, a través de actividades de Mejoramiento y Rehabilitación.

Con relación al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "TRANSFORMAR A YUMBO CON VIDA PLENA: LA CIUDAD CUIDADORA" **El Propósito:** Yumbo Productivo tiene como propósito mejorar la articulación entre la población, la economía y el territorio en el Municipio de Yumbo.

ESTRATEGIA; Mediante procesos de participación para el Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico. SUBPROGRAMA:. Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

METAS PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE
Lavado e inspección de 5.655,73 metros lineales de alcantarillado para verificar si está en malas condiciones	Número de metros lineales lavados e inspeccionados	5.655,73 m

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo cumplirá su objetivo con el contrato No. 180-10-06-005-2024.

La prioridad de la intervención en las vías por medio del mejoramiento que comprende el presente proceso viene dada por la situación de deterioro de pavimento y su estructura de base, además de la realización de lavado e inspección y arreglo puntual de ser necesario en la reposición de las redes de alcantarillado, las cuales son antiguas y que se deben ajustar a la resolución 799 de 2021 del REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Con la ejecución de este proyecto se felicitará la intervención de vías en pavimento flexible, y en la rehabilitación redes de alcantarillado en PVC.

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 180.10.06.005.2024		
VALOR	**$529.734.749,00**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$186.223.546,00
VALOR ACTA FINAL		$342.651.639,00
SALDO		$ 859.564,00
SUMAS IGUALES	**$529.734.749,00**	**$529.734.749,00**

Nota: el acta parcial No. 1 está en trámite de pago y el acta final está en trámite.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO				ACTA DE PAGO FINAL	
1	ALCANTARILLADO ACOPI	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
1,2	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 DER VIA	27"	ML	262,66	262,66
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 13 -14IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	224,93	224,93
1,4	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	BOX 2x 1,7	ML	262,42	262,42
1,5	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 37 CALLE 14 -15 IZQ CANAL	27	ML	56,57	56,57
1,7	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 13-14	18"	ML		253,07
1,9	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15	15"	ML		226,39
1,1	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	15"	ML		84,94
1,11	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 38 CALLE 14-15 DER VIA	21"	ML		53,14
1,16	LIMPIEZA DE TUBERIA CRA 39 CALLE 13-14	18"	ML		77,00
1,21	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 12A ENTRE CR 38-39	18"	ML		103,75
1,23	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 13 ENTRE CR 38-39	18"	ML		103,75
1,3	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	18"	ML	2,08	2,08
1,31	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	21"	ML	3,44	3,44
1,32	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 37-38	27"	ML	106,07	106,07
1,33	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 15 ENTRE CR 38-39	27"	ML	110,44	110,44

ALCANTARILLADO CENCAR	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	30"	ML	126,31	126,31
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15	42"	ML	186,00	186,00
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	1,20	ML	279,40	279,40
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 E CALLE 13 Y 15	42"	ML	153,00	153,00
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	36"	ML	102,55	102,55
LIMPIEZA DE TUBERIA CARRERA 20 D CALLE 14 Y 15	42"	ML	129,00	129,00

Estos ítems fueron actualizados acorde a las actividades ejecutadas en el sector ACOPI, durante la ejecución del contrato se encontró en la inspección diferencias de los diámetros de las tuberías del contrato con los diámetros de los planos de redes de alcantarilladlo existente suministrados por la ESPY y por EMCALI y las condiciones reales evidenciadas en la investigación y diagnóstico en sitio, de las tuberías.

4	ITEMS NUEVOS	DIAMETRO	UND	CANT. LAVADO EJECUTADO	CANT. INSPECCION EJECUTAD0
	LIMPIEZA DE TUBERIA CLL 14 ENTRE CR 37-38	18"	ML	214,8	214,8

Revisada la información de la tubería en la Carrera 38 entre calles 12A -13 (Hormigón simple de 15"), se evidencio que presentaba interferencias de la raíces y acometidas de tubería, lo que hace necesario, realizar 16 unidades del ítem de corte/perfilamiento con equipo robótico de fresado de tubería y 19 unidades de reparación puntual de tubería entre 350 a 400 mm.

5.DESARROLLO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los municipios, según lo disponen los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3-5 de la Ley 136 de 1994 y 5-1 de la Ley 142 de 1994. Los artículos 365 a 370 CP tratan de los derechos colectivos a acceder a la infraestructura de servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna. Los servicios públicos son inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que son finalidades sociales del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De esta manera, el municipio de Yumbo, mediante resolución SSPD – 20184010116845 de 2018 se encuentra certificado en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1176 de 2007 y lo reglamentado en el Artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015". El municipio no cuenta con los equipos requeridos y el personal calificado para La reparación de redes de alcantarillado sin apertura de zanja mediante la instalación de una tubería especial para el sellado y estanco de filtraciones en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, para el sector

comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39, de la zona industrial de ACOPI, Carrera 20E entre calles 13 y 14 y Carrera 20D, 20E , 20G entre Calles 14 Y 15, de la zona de CENCAR municipio de yumbo

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el INFORME PARCIAL DE SUPERVISION del periodo comprendido entre al 20 de diciembre del 2024 al 27de diciembre del 2024, el avance Total de ejecución corresponde a QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 528.875.185,00) equivalente a 99,84% en los cuales se estipulan las siguientes consideraciones:

El valor a cobrar en el acta final corresponde a TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($342.651.639,00). equivalente a 64,684%, el porcentaje físico del contrato de obra ejecutado en lavado es del 94% y en inspección 36%, ejecución en cumplimiento del objeto contractual, especificaciones, presupuesto y con las determinaciones que se toman y se hacen cumplir durante la ejecución del contrato de obra No. 180.10.06.001.2024 cuyo objeto limpieza, investigación con CCTV y reparación de redes en el sistema de drenaje de colectores de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, del sector comprendido entre las calles 12 a la 15 y entre las carreras 37 a la 39, mediante sellado y estanco de ex filtraciones e infiltraciones, instalando en el punto defectuoso una tubería especial compuesta de un material resistente mecánica y químicamente que contiene fibra de vidrio y resina de isocianato/silicato; que se une a la tubería antigua, en los sectores comprendidos de ACOPI (calles 12, 12a, 13, 14 y 15 entre carreras 37 y 39) y de CENCAR (carrera 20d entre calles 14 y 15, carrera 20e entre calles 13 y 15, carrera 20g entre calles 14 y 15) en el municipio de Yumbo.


Se interviene la tubería Hormigón simple de 15" sobre la Carrera 38 entre calles 12A -13, se realizar 16 unidades de corte/perfilamiento de la raíces y acometidas de tubería con equipo robótico de fresado de tubería y 19 unidades de reparación puntual de tubería entre 350 a 400 mm.

Se sugiere intervenir las tuberías con fisuras del sistema de alcantarillado de acuerdo a la inspección, evitando su posible colapso y el deterioro de la estructura de las vías

DNOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL: **VIVIANY ORTIZ RICO** PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	**FIRMA:**

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO LAVADO E INSPECCION

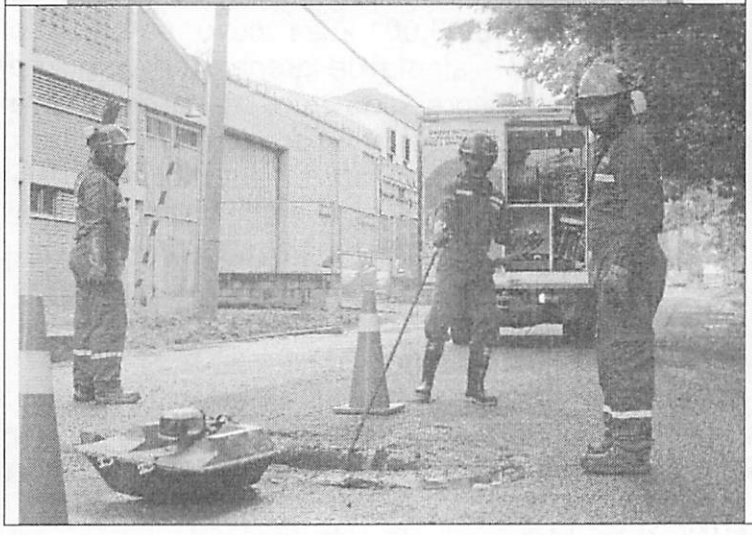25/11/2024	Cr 37 entre cl13-14 inspección de Red de alcantarillado
	
	

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

TRAMO A INTERVENIR EN CORTES DE RAICES Y TUBERIAS DOMICILIARIAS

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261

Ciudad	ACOPI-YUMBO	Manhole Inicio	0001CC0132	Longitud de tubería [m]	0
Calle	KR 38 ENTRE CLL 12A Y 13	Alcant.inicio tipo	Manhole	Longitud de sección [m]	158,42
Situación		Manhole Final	0001CC0134	Longitud inspeccionada [m]	158,42
Número de dibujo		Alcant. final tipo	Manhole	Año Construido	

Perfil	Circular 400mm	Motivo de inspección	
		Método de inspección	
El uso de alcantarilado	Combinada	Dirección de la Encuesta	Flujo
		La limpieza previa	Limpieza Pesada
Material	Fibrocemento	Comentarios general	

1:645

m +	Op Codigo	Incidencia Observaciones	Grade
-0.09	AMH	CAMARA DE INSPECCION / INICIO DE INSPECCION	
7.71	DSZ	Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto / ESCOMBRO	3
10.01	RFJ	Raíces Finas en la junta de 1 en punto a 4 en punto, junta	1
11.09	RFJ	Raíces Finas en la junta de 11 en punto a 5 en punto, junta	1
15.95	RFJ	Raíces Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta	1
27.07	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
27.08	RFL	Raíces Finas en Acometida, en 3 en punto	1
29.67	S01 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
29.67	S02 D	Deformación, 10% cambiado, Arrancar	
36.49	F01 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
37.15	F02 D	Deformación, 10% cambiado, Acabado	4
51.20	S03 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
56.74	F03 CL	Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado	2
74.50	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
75.02	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
80.99	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
85.84	MGO	OBSERVACION GENERAL / CAMARA OCULTA	



AMH @ -0,09 m



DSZ @ 7,71 m


DSZ @ 7,71 m



RFJ @ 10,01 m


RFJ @ 11,09 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261

1:645

m +	Op	Código	Incidencia Observaciones	Grade
89.60		FL	Fractura longitudinal en 12 en punto	3
89.60	S04	FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Arrancar	
89.60	S05	D	Deformación, 20% cambiado, Arrancar	
90.51		FM	Fractura Múltiple de 10 en punto a 2 en punto	4
96.42	F04	FL	Fractura longitudinal en 12 en punto, Acabado	3
96.57	F05	D	Deformación, 20% cambiado, Acabado	4
102.05		TBA	Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá	
109.31		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
119.03		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto en 8 en punto	5
119.03		FM	Fractura Múltiple de 7 en punto a 8 en punto	4
120.10		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 9 en punto, junta	5
127.13		FC	Fractura Circular de 6 en punto a 9 en punto, junta	2
129.44		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá	
129.61	S06	CH3	Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Arrancar	
131.22		CC	Grieta circunferencial de 3 en punto a 5 en punto	1
131.22		IW	Infiltración Lagrimeo, de 3 en punto a 5 en punto, junta	2
131.96		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
131.96		BSV	Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto	5
132.71	F06	CH3	Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Acabado	5
139.69		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
153.79		TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	



RFJ @ 15,95 m



TB @ 27,07 m



RFL @ 27,08 m



CL @ 29,67 m



D @ 29,67 m



CL @ 36,49 m



D @ 37,15 m

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261

1:645

m +	Op Código	Incidencia Observaciones	Grade
158.33	TB	Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá	
158.33	MSA	INSPECCION TV ABANDONADA / SE AGOTA EXTENCION DE CABLE	
158.42		Fin de la Tubería	


CL @ 51,20 m



CL @ 56,74 m


TB @ 74,50 m



TB @ 75,02 m



TB @ 80,99 m



MGO @ 85,84 m


FL @ 89,60 m



D @ 89,60 m



FM @ 90,51 m


FL @ 96,42 m



D @ 96,57 m



TBA @ 102,05 m



TB @ 109,31 m


BSV @ 119,03 m



FM @ 119,03 m


BSV @ 120,10 m



FC @ 127,13 m



TB @ 129,44 m




CH3 @ 129,61 m



CC @ 131,22 m


IW @ 131,22 m


TB @ 131,96 m

WinCan

Resumen de la Inspección de Colectores - 13/12/2024

Fecha	Cámara	Clima	Tubo de referencia del segmento	Nr.
13/12/2024				6
Project name		Vehículo	Operador	Job Id
ALCALDIA YUMBO-ACOPI			DCB	20243261



BSV @ 131,96 m



CH3 @ 132,71 m



TB @ 139,69 m


TB @ 153,79 m




TB @ 158,33 m


MSA @ 158,33 m


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

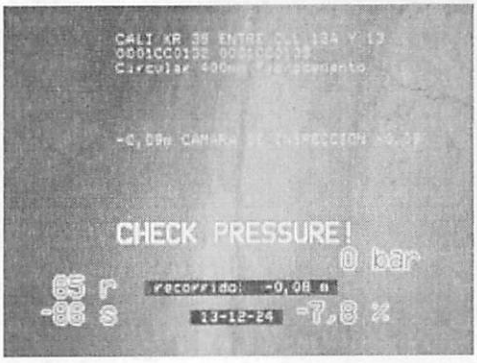


0eff2709-28de-41b4-a27b-7b0277d43c3a_20241213_230002_279.jpg, 00:00:00, -0.09m
CAMARA DE INSPECCION

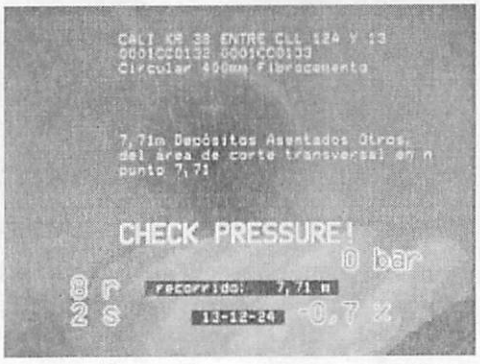

7758c047-f4c6-4800-b982-5d04f5fe38c9_20241213_230838_071.jpg, 00:00:00, 7.71m
Depositos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto

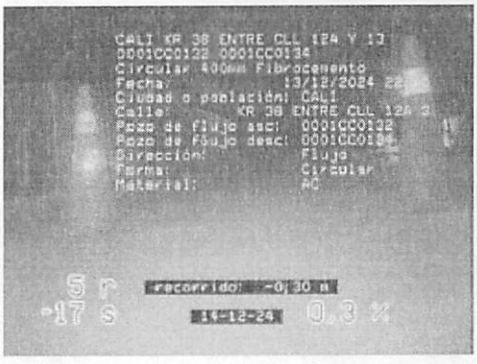

31ca51ff-4566-4129-ab57-14e7a64c8d13_20241214_005423_785.jpg, 00:00:00, 7.71m
Depósitos Asentados Otros, 20% del área de corte transversal en 6 en punto

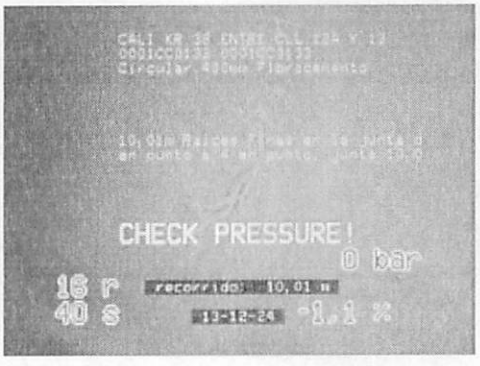


5434612c-0381-47a5-abcb-b96aa20439a8_20241213_230925_089.jpg, 00:03:35, 10.01m
Raíces Finas en la junta de 1 en punto a 4 en punto, junta

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

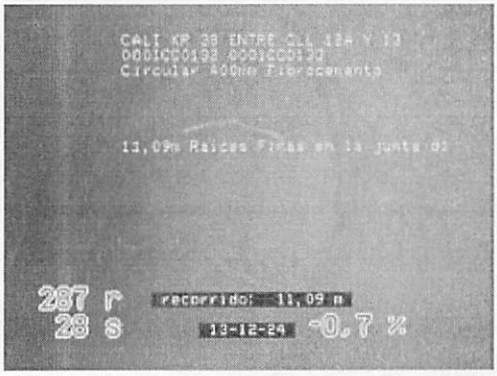

cc0a4836-8e7d-40db-8bd7-121b33f241c7_20241213_231015_166.jpg, 00:04:26, 11.09m
Raices Finas en la junta de 11 en punto a 5 en punto, junta



101d78b8-5c96-48bf-837e-38092d186076_20241213_231104_244.jpg, 00:05:15, 15.95m
Raices Finas en la junta de 7 en punto a 11 en punto, junta

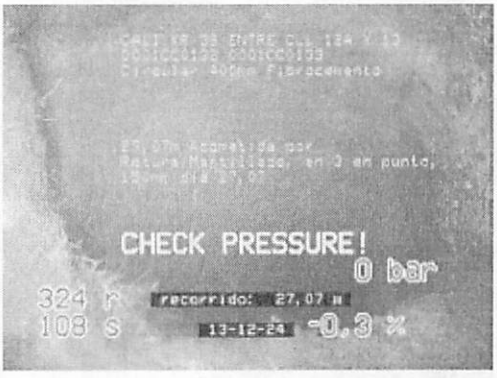

fdfae0cd-bbd4-450c-915b-67fb5eeab7b4_20241213_231251_359.jpg, 00:07:02, 27.07m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá




5e8193d4-fee0-40db-aba0-e9da498a5eeb_20241213_231332_980.jpg, 00:07:44, 27.08m
Raices Finas en Acometida, en 3 en punto


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

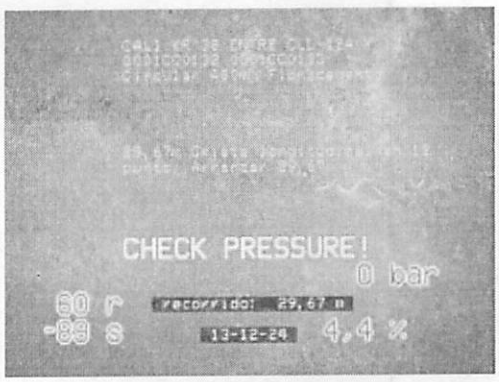


9522986b-b2ab-47ce-9c13-7b0140fe1646_20241213_231643_872.jpg, 00:09:30, 29.67m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar

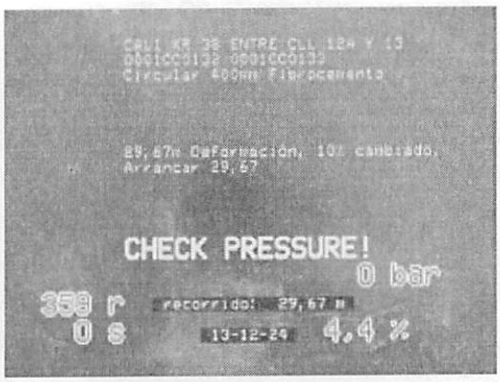

3256379b-0634-4467-b4b5-cadafbed53d3_20241213_232141_177.jpg, 00:11:30, 29.67m
Deformación, 10% cambiado, Arrancar

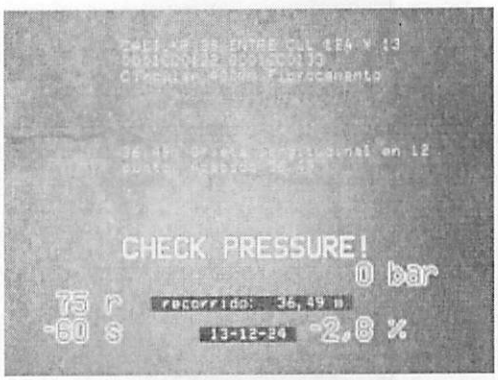

468257ea-7c45-4335-913e-2de0a8b32171_20241213_232306_175.jpg, 00:12:53, 36.49m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado

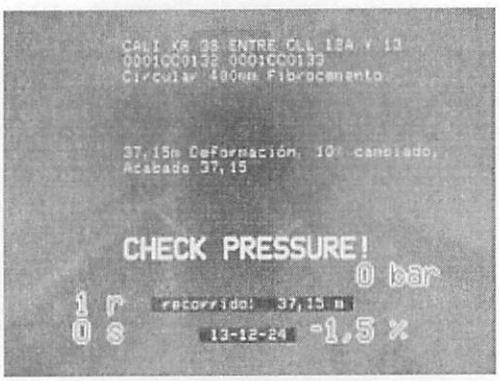


dc665768-aec1-4ddd-a586-ce32e4174ce4_20241213_232326_379.jpg, 00:13:13, 37.15m
Deformación, 10% cambiado, Acabado


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

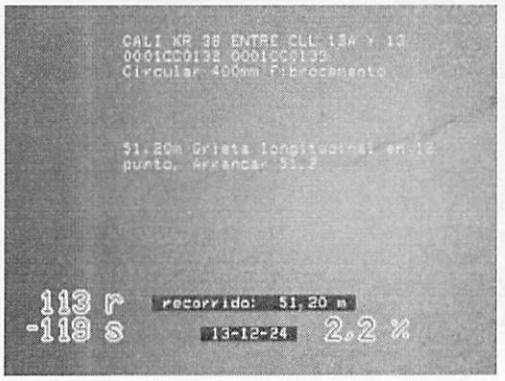


4b94ff69-776f-4877-9ff5-cbbacd5af2a9_20241213_232449_117.jpg, 00:14:36, 51.20m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Arrancar

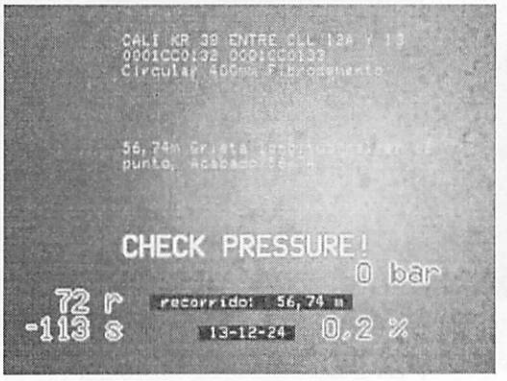

d1b01ddd-1d1e-47c2-bd52-0c8f88129c96_20241213_232633_806.jpg, 00:16:21, 56.74m
Grieta longitudinal en 12 en punto, Acabado

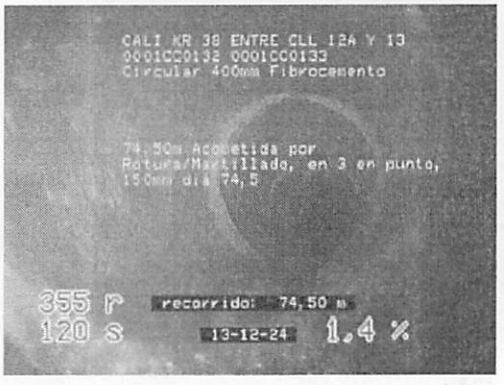

68039f78-6b5d-43a7-8683-00818902f6f4_20241213_232903_585.jpg, 00:18:51, 74.50m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

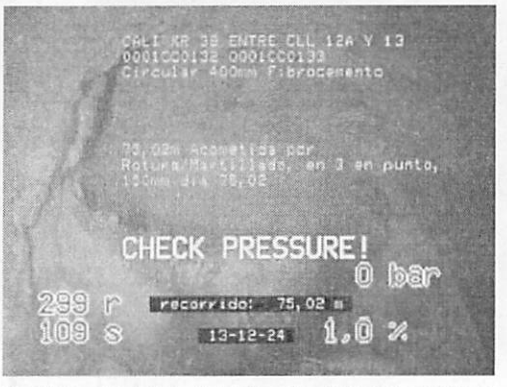


433d47bb-c903-4af2-bc4f-d21ff2ca3f9a_20241213_232953_600.jpg, 00:19:41, 75.02m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

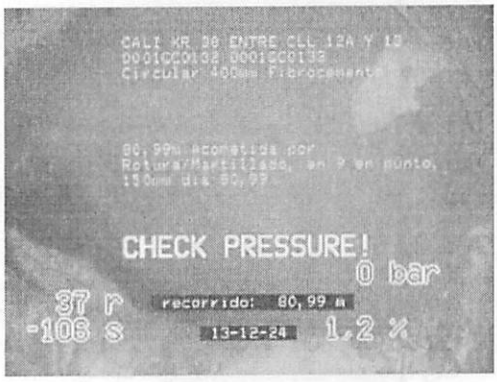

7004d90c-3b63-4fb2-8742-aebba92cfa9c_20241213_233122_211.jpg, 00:21:09, 80.99m
Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá

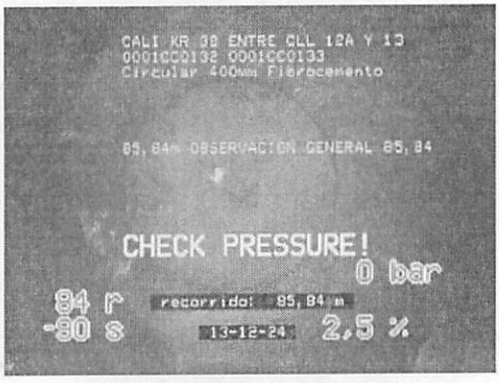

62f024f2-deff-4fb2-a4d2-b63ea45ceae8_20241213_233341_138.jpg, 00:23:28, 85.84m
OBSERVACION GENERAL

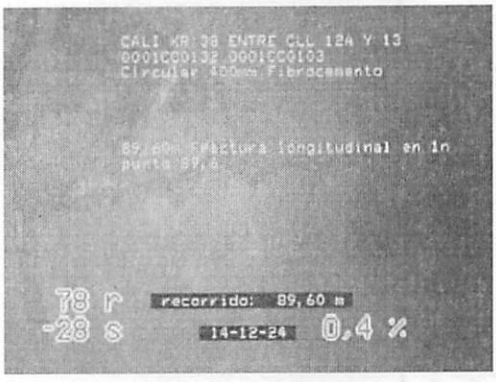

38349602-f51f-4a00-bf00-2e1158711f3d_20241213_234426_752.jpg, 00:24:57, 89.60m
Fractura longitudinal en 12 en punto




a31d574e-61b7-4a8f-91e0-84d94d528d7a_20241213_234526_904.jpg, 00:25:58, 89.60m
Deformación, 20% cambiado, Arrancar


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

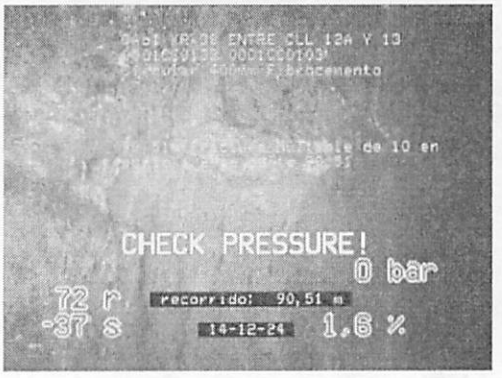


6bf3b581-b2a4-4aad-84d1-b30075b20864_20241213_234620_190.jpg, 00:26:52, 90.51m
Fractura Múltiple de 10 en punto a 2 en punto

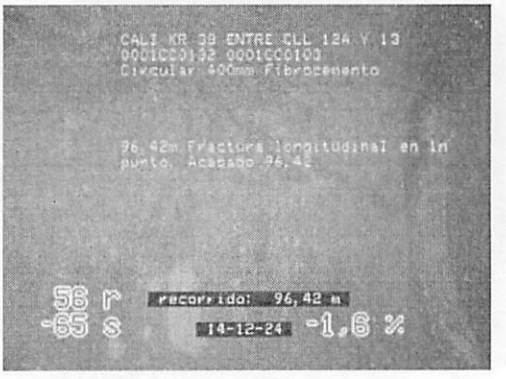

4d7a8022-9260-4acc-84a2-dbfd2c1ba4c2_20241213_235009_906.jpg, 00:30:42, 96.42m
Fractura longitudinal en 12 en punto, Acabado

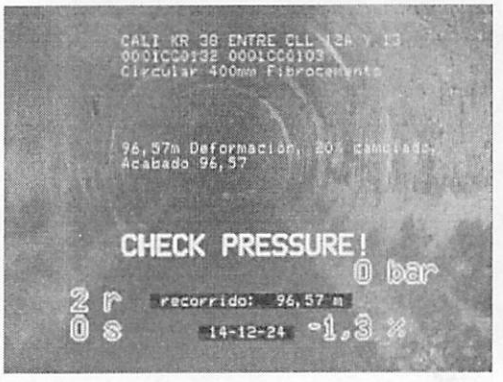

8419ef8b-d465-4213-b000-b54814265b1a_20241213_235100_206.jpg, 00:31:31, 96.57m
Deformación, 20% cambiado, Acabado

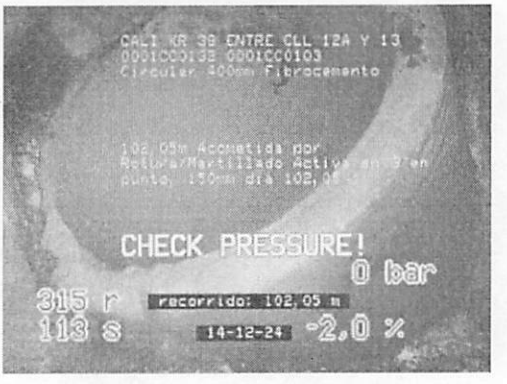


95ba1f00-8c22-4330-a86a-f92a935c96b9_20241213_235244_065.jpg, 00:33:15, 102.05m
Acometida por Rotura/Martillado Activa en 3 en punto, 150mm diá

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

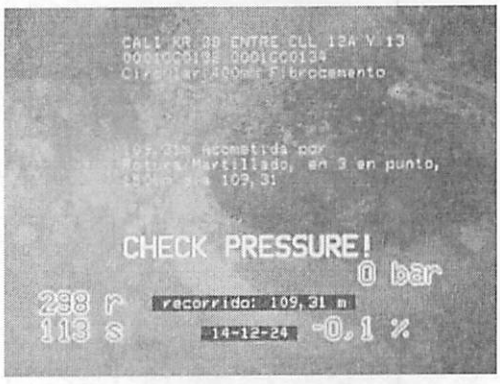


f6c1fe61-7023-4dad-9e76-65e6cc2fea5d_20241213_235733_949.jpg, 00:37:47, 109.31m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



6828cb73-49db-4916-aa1b-f55726036fcc_20241214_000242_788.jpg, 00:42:57, 119.03m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto en 8 en punto

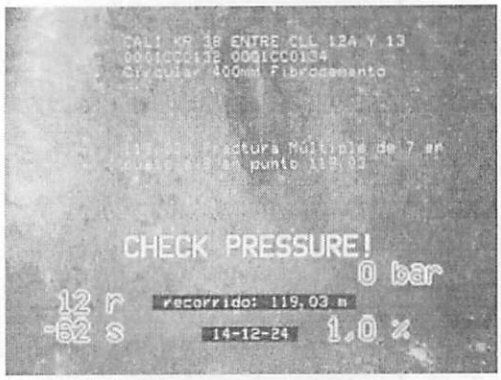

30f12a1c-f09d-4e4d-8619-a58e2c671b2b_20241214_000312_097.jpg, 00:43:26, 119.03m
Fractura Múltiple de 7 en punto a 8 en punto

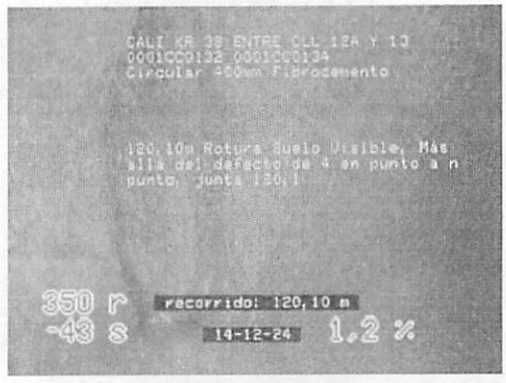


3a91bfe9-d272-4887-bd0c-a22894a75652_20241214_000459_634.jpg, 00:45:13, 120.10m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 9 en punto, junta


WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024

Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

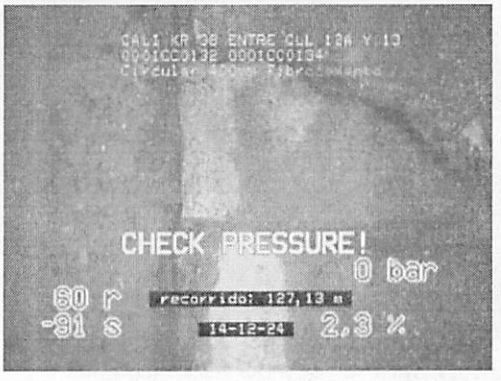


977f9a5b-2733-4d06-b0fb-a65340dff07c_20241214_000920_033.jpg, 00:48:09, 127.13m
Fractura Circular de 6 en punto a 9 en punto, junta

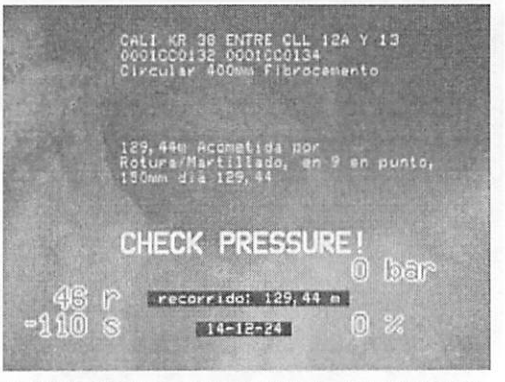

d147d04a-c775-4a9f-bad7-ba523577fe5b_20241214_001031_782.jpg, 00:49:20, 129.44m
Acometida por Rotura/Martillado, en 9 en punto, 150mm diá



cca1d910-a134-436e-a353-7cfa4ad7ecd4_20241214_001203_024.jpg, 00:50:50, 129.61m
Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Arrancar

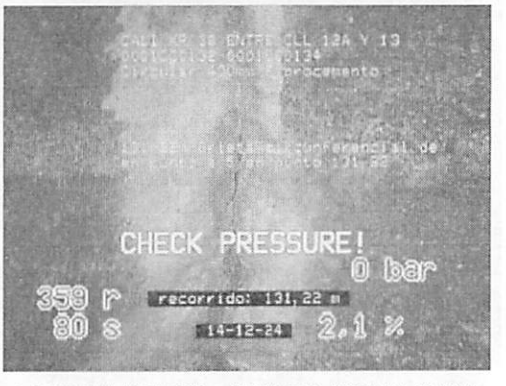

a4c91df3-f774-48c7-8326-ccd7e71bfda2_20241214_001344_910.jpg, 00:52:34, 131.22m
Grieta circunferencial de 3 en punto a 5 en punto

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024

Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6




f383896c-c7fb-4c4c-b56e-80cf97dd72d1_20241214_001419_486.jpg, 00:53:08, 131.22m
Infiltración Lagrimeo, de 3 en punto a 5 en punto, junta



dbcf22de-4e25-4ed2-95dc-cee8b90bfeb2_20241214_001508_039.jpg, 00:53:56, 131.96m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



75631565-9760-4e0a-99fd-c25d1b094524_20241214_001555_539.jpg, 00:54:44, 131.96m
Rotura Suelo Visible, Más allá del defecto de 4 en punto a 5 en punto

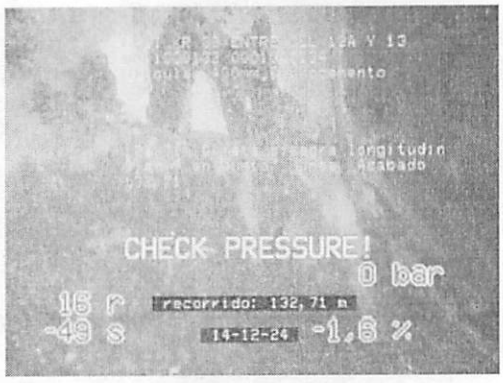

da0dd086-d9f4-4911-a5f3-5c6efe50e666_20241214_001640_967.jpg, 00:55:29, 132.71m
Grieta bisagra longitudinal, 3 en 9 en punto, junta, Acabado


INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FORMATO INTERNO SISP

WinCan

Fotos de la sección - 13/12/2024


Ciudad	Calle	Fecha	Tubo de referencia del	Nr.
ACOPI-YUMBO	KR 38 ENTRE CLL 12A Y	13/12/2024		6

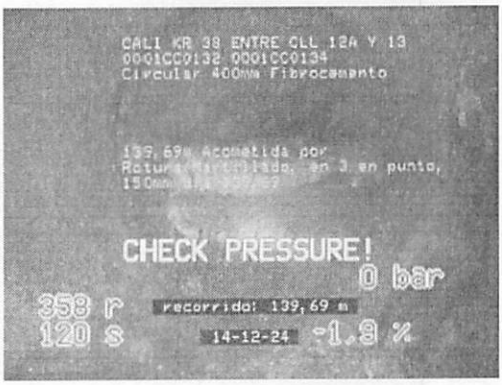

c534bfc3-346e-4315-ab65-4da7de9fdeaa_20241214_001800_237.jpg, 00:56:48, 139.69m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



cda9ad9a-1352-44b3-924f-e0e77966a8e0_20241214_002229_573.jpg, 01:00:57, 153.79m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá

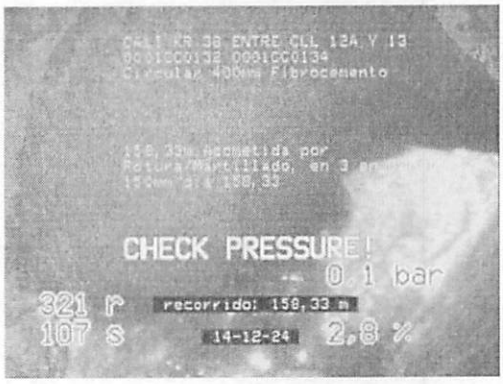

1667691e-e269-4a58-b4ca-0e00dbef95bf_20241214_002350_275.jpg, 01:02:17, 158.33m
Acometida por Rotura/Martillado, en 3 en punto, 150mm diá



b6013a0f-da72-4a47-b158-2e8254d06766_20241214_002548_309.jpg, 01:04:15, 158.33m
INSPECCION TV ABANDONADA

INFORME DE SUPERVICION REPORTE MENSUAL

FORMATO INTERNO SISP

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	24-11-2024 Lavado tuberia 12" en la calle 12A entre cra 40 y 39, red en optimas condiciones. 102.73 mts	Cristian Gaona	Vladimir Ince	
-	25-11-2024 Lavado tuberia 18" en la calle 12A entre cra 38-39. red en optimas condiciones 103.75 mts.	Cristian Gaona	Vladimir Ince	
-	28-11-2024 Lavado tuberia 16" en la cra 38 entre cll 12A y calle 13 243,59 mts red en optimas condiciones, lavado tuberia 36" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 259.73 mts red en optimas condiciones, lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 166,23 mts red en optimas condiciones.	Cristian Gaona	Vladimir Ince	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	29-11-2024 Lavado tubería 12" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 red en optimas condiciones, presenta acometidas penetrantes. 261.57 mts	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
-	4-12-2024 Lavado tubería 18" en la cra 39 entre cll 13 y cll 14, durante el lavado se evidencio presencia de lodos hidrocarburados y camaras ocultas. que no permitieron un optimo lavado. 77.4 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
-	7-12-2024 Lavado tubería 55" en la cra 38 entre cll 13 y cll 14; red en optimas condiciones, presenta tapas dañadas. en la cll 13 lado izquierdo y en la cll 14 presenta nivel de agua al 50%., 253.07 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	8 - 12 - 2024 lavado tuberia 27" en la cra 37 entre cll 12 y cll 13, red en optimas condiciones, presenta nivel de agua 50% 381.93 mts.	Cristian Gaitan	Vladimir Arce	
-	9 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado. funcionando represada. presenta más del 50%. de material al interior de la tuberia. 228.29 mts	Cristian Gaitan	Vladimir Arce	
-	10 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado presenta más del 50% de material al interior de la tuberia. 228.29 mts. Lavado tuberia 27" en la cll 12A entre cra 37 y cra 38, red funcionando en optimas condiciones, presenta raices, en la misma direccion se lava tuberia de 36" red en optimas condiciones 99.28 mts.	Cristian Gaitan	Vladimir Arce	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	11-12-2024. Lavado tuberia 21" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15 lado derecho, red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tuberia. 135.95 mts	Cristian Castaño	Vladimir Arce	
-	16-12-2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado represada, se evidencia ladrillo, lavado tuberia 12" en la cara 38 entre cll 14 y 15, red de alcantarillado presenta lodos hidrocarburados.	Cristian Castaño	Vladimir Arce	
-	17-12-2024. Lavado tuberia 20" en la calle 13 entre cra 39 y cra 38, red de alcantarillado funcionando en optimas condiciones, presenta acumulacion de solidos pesados. 100 mts		Vladimir Arce	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	18-12-2024 lavado tubería 24" en la calle 13 entre cra 38 y cra 37 100mts aprox, lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material al interior 150 mts aprox. Se realiza reparación de tubería 15" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 S.S. mts, Se realiza apertura de zanja, Se retira la tubería dañada y Se procede a adecuar el terreno para la instalación de la tubería nueva, Se instala tubería a las 16:00, Se espera reanudar por fuerte lluvia, Se inicia 19:00 a la instalación de la grava y la recamenta, Se termina labor a las 23:00.	Cristian Castro	Vladimir Arce
-	20-12-2024 lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material con hidrocarburos de los cuales Se hace disposición en la PTAR Cencar, la tubería contiene material.	Cristian Castro	Vladimir Arce

		Técnico	Supervisor	Interventor
-	21-12-2024. Lavado tubería 16" cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería presenta lodos hidrocarburados. Se hace disposición en PTAR Concar.	Cristian Castro	Wladimir Arrieta	
-	23-12-2024. lavado e inspección tubería 15" cra 38 entre cll 14 y cll 15 80 mts Aprox.	Cristian Castro	Wladimir Arrieta	
-	24-12-2024. lavado tubería 55" cra 37 entre cll 15 y cll 14, tubería presenta nivel de agua 50%.	Cristian Castro	Wladimir Arrieta	
-	25-12-2024. Inspección tubería 55" con baldosa box culvert. cra 37 cll 14 y cll 15	Cristian Castro	Wladimir Arrieta	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 24-11-2024 Lavado tubería 12" en la calle 12A entre cra 40 y 39, red en optimas condiciones. 102.73 mts	Cristian Gaitán	Vladimir Ince	
- 25-11-2024 Lavado tubería 18" en la calle 12A entre cra 38-39. red en optimas condiciones 103.75 mts.	Cristian Gaitán	Vladimir Ince	
- 28-11-2024 Lavado tubería 16" en la cra 38 entre cll 12A y calle 13 243,59 mts red en optimas condiciones, lavado tubería 36" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 259.73 mts red en optimas condiciones, lavado tubería 15" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 166,23 mts red en optimas condiciones.	Cristian Gaitán	Vladimir Ince	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 29-11-2024 Lavado tuberia 12" en la cra 39 entre cll 12A y cll 13 red en optimas condiciones, presenta acometidas penetrantes. 261.57 mts	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
- 4-12-2024 Lavado tuberia 18" en la cra 39 entre cll 13 y cll 14, durante el lavado se evidencio presencia de lodos hidrocarburados y camaras ocultas. que no permitieron un optimo lavado. 77.4 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	
- 7-12-2024 Lavado tuberia 55" en la cra 38 entre cll 13 y cll 14, red en optimas condiciones, presenta tapas dañadas. en la cll 13 lado izquierdo y en la cll 14 presenta nivel de agua al 50%. 253.07 mts.	Cristian Cotan	Vladimir Arce	

		Tecnico	Supervisor	Interventor
-	8 - 12 - 2024 lavado tuberia 27" en la cra 37 entre cll 12 y cll 13, red en optimas condiciones, presenta nivel de agua 50% 381.93 mts.	Cristian Gaona	Vladimir Arce	
-	9 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado funcionando represada. presenta más del 50% de material al interior de la tuberia. 228.29 mts	Cristian Gaona	Vladimir Arce	
-	10 - 12 - 2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado presenta más del 50% de material al interior de la tuberia. 228.29 mts. Lavado tuberia 27" en la cll 12A entre cra 37 y cra 38, red funcionando en optimas condiciones, presenta raices, en la misma direccion se lava tuberia de 36" red en optimas condiciones 99.28 mts.	Cristian Gaona	Vladimir Arce	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 11-12-2024. Lavado tuberia 21" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15 lado derecho, red de alcantarillado funcionando represada, presenta mas del 50% de material al interior de la tuberia. 135.95 mts	Cristian Cortes	Vladimir Perez	
- 16-12-2024 Lavado tuberia 15" en la cra 39 entre cll 14 y cll 15, red de alcantarillado represada, se evidencia ladrillo, lavado tuberia 12" en la cra 38 entre cll 14 y 15, red de alcantarillado presenta lodos hidrocarburados.	Cristian Cortés	Vladimir Perez	
- 17-12-2024. Lavado tuberia 20" en la calle 13 entre cra 39 y cra 38, red de alcantarillado funcionando en optimas condiciones, presenta acumulacion de solidos pesados. 100 mts		Vladimir Perez	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 18-12-2024 lavado tubería 24" en la calle 13 entre cra 38 y cra 37 100 mts aprox, lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material al interior 150 mts aprox. Se realiza reparación de tubería 15" en la cra 38 entre cll 12A y cll 13 S.S. mts, Se realiza apertura de zanja, Se retira la tubería dañada y Se procede a adecuar el terreno para la instalación de la tubería nueva, Se instala tubería a las 16:00, Se espera reanudar por fuerte lluvia, Se inicia 19:00 a la instalación de la grava y la recamentera, Se termina labor a las 23:00.	Cristian Castro	Vladimir Arce	
- 20-12-2024 lavado tubería 15" en la cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería con el 30% de material con hidrocarburos de los cuales Se hace disposición en la PTAR Cencar, la tubería contiene material.	Cristian Castro	Vladimir Arce	

	Tecnico	Supervisor	Interventor
- 21-12-2024. Lavado tubería 16" cra 38 entre cll 14 y cll 15 tubería presenta lodos hidrocarburados. Se hace disposicion en PTAR Cancer.	Cristian Castro	Wladimir Arce	
- 23-12-2024. lavado e inspeccion tubería 15" cra 38 entre cll 14 y cll 15 80 mts Aprox.	Cristian Castro	Wladimir Arce	
- 24-12-2024. lavado tubería 55" cra 37 entre cll 15 y cll 14, tubería presenta nivel de agua 50%.	Cristian Castro	Wladimir Arce	
- 25-12-2024. Inspeccion tubería 55" con baldoa box culvert. Cra 37 cll 14 y cll 15	Cristian Cancer	Wladimir Arce	

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Compañía de Seguros

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209849761

PÓLIZA No: 420 - 47 - 994000043940 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI NORTE** COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2024	26	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA TELÉFONO: 6653151

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	30/04/2025	105,946,949.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/11/2024	31/12/2027	52,973,474.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	105,946,949.80

BENEFICIARIOS
NIT 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NRO 180-10-06-005-2024, DE FECHA 20/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

CONTRATISTA: CODINSA SAS NIT 890.319.290-1
DEPENDENCIA: SECRETARIOA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***264,867,374.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	5241	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420984976

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA20710706FA7D58

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000043940 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL INICIO DE EJECUCION ES DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE Y FECHA DE FINALIZACION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209850041

PÓLIZA No: 420 -74 - 994000011090 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI NORTE** COD. AGE: 420 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
26	12	2024	25	11	2024	23:59	31	12	2024	23:59	36		26	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
25	11	2024	23:59	31	12	2024	23:59	36	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA TELÉFONO: 6653151

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO CIUDAD: **YUMBO, VALLE DEL CAUCA** TELÉFONO: 6653151

BENEFICIARIO: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODI NIT : 890319290

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: CARRERA 220 No. 14-15

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 14-220

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	260,000,000.00		
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	CONTAMINACION	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	260,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 890319290 - COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS
NIT 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL INICIO DE EJECUCION ES DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE Y FECHA DE FINALIZACION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	5241	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CÓN OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420985004

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JMELGAREJOPATRI 0

CADA20710706FA7D56 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000011090 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS IDENTIFICACION: 890.319.290-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANIT	890319290-1	CARRERA 220 No. 14-15	MEDELLÍN	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Alcaldía de Yumbo	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CÓDIGO:	GCT-FO-0025
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	APROBACIÓN DE GARANTÍAS		

TRD: 180.10.06

En el municipio de Yumbo a los 26 días del mes de Diciembre del año 2024 y de conformidad con el Manual de Contratación de la entidad, el suscrito procedió a verificar los requerimientos en cuanto a garantías exigidos en el contrato/ convenio que a continuación se detalla:

No. Contrato o convenio	180-10-06-005-2024
Contratista o conveniante	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA – CODINSA S.A.S
Identificación Cedula o Nit	NIT 890.319.290-1
Represente legal (si aplica)	HUGO DURAN PEREZ
Identificación representante legal	C.C 16.781.993
Objeto	LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACIÓN PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12, 12A, 13, 14 y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20 E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Valor	$ 529.734.749

Por lo anterior, se verifican los amparos, montos y vigencias de la póliza allegada y que a continuación se detallan:

GARANTÍA NÚMERO:	420-47-994000043940
ANEXO O CERTIFICADO:	3
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/12/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO: **Cumplimiento.**
VALOR ASEGURADO: $ 105.946.949.80
VIGENCIA: Desde el 25 / 11 / 2024 hasta el 30 / 04 / 2024

AMPARO: **Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.**
VALOR ASEGURADO: $ 52.973.474,90
VIGENCIA: Desde el 25 / 11 / 2024 hasta el 31 / 12 / 2027

AMPARO: **Estabilidad y calidad de la obra.**
VALOR ASEGURADO: $ 105.946.949.80
VIGENCIA: Desde el Nota Aclaratoria (Cumple) hasta el Nota Aclaratoria (Cumple)

GARANTÍA NÚMERO:	420-74-994000011090
ANEXO O CERTIFICADO:	3
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/12/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO: **Responsabilidad Civil Extracontractual.**
VALOR ASEGURADO: $ 260.000.000
VIGENCIA: Desde el 25 / 11 / 2024 hasta el 31 / 12 / 2024

En consecuencia se aprueban las garantías al verificar, que la póliza reúne los requisitos exigidos en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes y aquellos que lo modifiquen y por tanto se ordena la aprobación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Firma:

Nombre Ordenador del Gasto: CARLOS EDUARDO BRION MOLINA

Cargo: Secretario de Despacho

Dependencia: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: Jorge Hernelio Saldarriaga Romero – Abogado Contratista SISP

REPORTE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES

SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	**FECHA REPORTE:**	/ 27	/ 12	/ 2024

1. DATOS GENERALES.

Contrato No:	180-10-06-005-2024	Fecha: / 20 / 11 / 2024
Nombre o razón social del contratista:	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA-RIA CODINSA S.A.S Representante legal: Hugo Duran Pérez	C.C. o NIT: 890.319.290-1
Certificado de disponibilidad:	Nº 20243908	Fecha: / 16 / 09 / 2024
Valor contrato:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($529.734.749,oo)	
Objeto del contrato:	LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	
Ubicación:	ZONA INDUSTRIAL DE ACOPI Y CENCAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO	

2. FORMA DE PAGO.

Primer desembolso (Anticipo)	Acta parcial 1	Acta parcial 2	Acta parcial 3	Pago Final	Total, a pagar (deducida amortización parcial anticipo)
0	**$186.223.546,00**			**$342.651.639,00**	**$528.875.185,00**

3. IDENTIFICACION DEL BIEN.

El bien está legalizado:	Si x	No	
No. de escritura:		Fecha: / DIA /	/ AÑO
No. Matricula Inmobiliaria:			

4. EL CONTRATO CORRESPONDE A:

(Marque con X según corresponda)

-Adquisición		-Mantenimiento	X
-Adecuación		-Reposición	
-Adición		-Reparación	X
-Mejoramiento		-Construcción	X
		-Otro	

5. CUENTAS CONTABLES Y VALORES QUE AFECTAN EL CONTRATO.

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1605	**TERRENOS**		
160501	Urbanos		
160502	Rurales		
160503	Terrenos con destinación ambiental		
160504	Terrenos pendientes de legalizar		
160505	Terrenos de propiedad de terceros		
1615	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**		
161501	Edificaciones		
16150100100	Edificios y casas		
16150100100	Edificación CAMY		
16150100100	Casas - Juntas de acción comunal		
16150100100	Plaza de mercado		
16150100100	CAI - POLICIA		
161501002	Oficinas		
161501003	Locales		
16150100400	Colegios y escuelas		
16150100400	Centros de desarrollo infantil CDI		
161501005	Clínicas y hospitales		
16150100500	Puestos de salud		
161501006	Parqueaderos y garajes		
161501007	Bodegas		
161501008	Instalaciones deportivas y recreacionales		
161501009	Tanques de almacenamiento		
1640	**EDIFICACIONES**		
164001001	Edificios y casas		
164001002	Edificación CAMY		
164001003	Casas - Juntas de acción comunal		
164001004	Plaza de mercado		
164001005	CAI - POLICIA		
164002	Oficinas		
164004	Locales		
164009001	Colegios y escuelas		
164009002	Centros de desarrollo infantil CDI		
164010	Clínicas y hospitales		
164010001	Puestos de salud		
164015	Casetas y campamentos		
164017	Parqueaderos y garajes		
164018	Bodegas		
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales		
164024	Tanques de almacenamiento		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar		
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		
164090	Otras edificaciones		
1645	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**		
164502	Plantas de tratamiento		
164513	Acueducto y canalización		
164515	Plantas, ductos y túneles pendientes de legalizar		
164516	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros		
164590	Otras plantas, ductos y túneles		
1650	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**		
165002	Redes de distribución		
165003	Redes de recolección de aguas		
165003001	Alcantarillado	$342.651.639,00	$528.875.185,00

165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar		
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros		
165090	Otras redes, líneas y cables		
1705	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**		
170501	Red carretera		
170501001	Red carretera - Vías vehiculares urbanas		
170501002	Red carretera - Vías vehiculares rurales		
170501003	Puentes		
170501004	Muros		
170501005	Zonas verdes		
170501006	Andenes		
170501007	Canales - Aguas lluvias		
170501008	Gradas		
170501009	Huellas		
170501010	Semaforización y señalización vías		
170504	Plazas públicas		
170504001	Parques públicos		
170505	Parques recreacionales		
170510	Bibliotecas		
170516	Terrenos		
170516001	Urbanos		
170516002	Rurales		
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**		
171001001	Red carretera - vías vehiculares urbanas		
171001002	Red carretera - vías vehiculares rurales		
171001003	Puentes		
171001004	Muros		
171001005	Zonas verdes		
171001006	Andenes		
171001007	Canales - Aguas lluvias		
171001008	Gradas		
171001009	Huellas		
171001010	Semaforización y señalización vías		
171004	Plazas públicas		
171004001	Parques públicos		
171005	Parques recreacionales		
171010	Bibliotecas		
171014	Terrenos		
171014001	Urbanos		
171014002	Rurales		
171090	Otros bienes de uso público en servicio		

Firma

Nombre: **CARLOS EDUARDO BRION MOLINA**

Secretaria de Infraestructura y servicios públicos

Elaboró: Viviany Ortiz Rico Profesional de Apoyo a la Supervisión SISP

Rec'd
Public W.F.
DEC 27 2024
At 11:35 AM

carpeta

DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha
27 DE DICIEMBRE DEL 2024
Cambio de Valor No.
2024.CEN.01.000026

CAMBIO DE VALOR

Proveedor: CODINSA LTDA.
NIT: 890.319.290
Área/Bodega: BODEGA DE BIENES INMUEBLES
Responsable: MUÑOZ FABRA SILVIA

ITEM	PRODUCTO	PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	951216330071 - REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO ACOPI CALLE 12, 12A,13, 14 Y 15 ENTRE CRA 37 Y 39; CENCAR CRA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CRA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CRA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE YUMBO	BIEN-00373	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12 A, 13,14Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20 E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	342.651.639,00

Valor en Letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **342.651.639,00**

Detalle:

CONTRATO NO. 180.10.06.005-2024 REALIZADO POR CODINSA LTDA. REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12 A, 13,14Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20 E ENTRE CALLES 13

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
16150500020001 - ALCANTARILLADO	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 342.651.639,00	$ 0,00
2401010007 - CUENTA PUENTE -ENTRADAS DE ALMA	890319290 - CODINSA LTDA.	$ 0,00	$ 342.651.639,00
TOTALES		**$ 342.651.639,00**	**$ 342.651.639,00**

Elaborado:
MUÑOZ FABRA SILVIA
TÉCNICO OPERATIVO

Aprobado:
DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido:
SECRETARIO DE DESPACHO

Codinsa
Compañía de Ingeniería Sanitaria

CODINSA SAS-EN REORGANIZACION

NIT : 890,319,290 - 1
CRA 39 11 166 ACOPI
YUMBO - COLOMBIA
6026574031
CONTABILIDAD@CODINSA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3307 Tarifa 10,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVC 8933

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-27 11:59:44
Expedición 2024-12-27 12:16:12
Vencimiento 2025-01-27

Cliente ALCALDIA DE YUMBO
NIT 890,399,025 - 6
Dirección CLL 5 4 40
Ciudad NO USAR - COLOMBIA
Correo infraestructura@yumbo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6516600
Vendedor ARCE ESPINOSA
Centro Costo 1.008
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	IVA
0090001000001	ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO NO. 180-10-06-005-2024 OBJETO: LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN CON CCTV Y REPARACIÓN DE PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, MEDIANTE SELLADO Y ESTANCO DE EXFILTRACIONES E INFILTRACIONES, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO; QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLES 12, 12A, 13, 14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLES 14 Y 15, CARRERA 20E ENTRE CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G ENTRE CALLES 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.	UND	1.00	342,651,639.00	342,651,639.00	0,00

Total Bruto 342,651,639.00
Total a Pagar **$ 342.651.639,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Cxc Fuera De Cali Efectivo 342.651.639,00 Cuota 15 Vence el 2025-01-27

Firma Elaborado por : KEYLA CARABALI

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOOMEVA No. 011100775806 - BOGOTA 249037870 O PAGO EN LINEA POR BOTON PSE ATRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.CODINSA.COM REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082010261 **aprobado en** 2024-10-23 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 8505 **al** 9505

CUFE 4c7f7a602ecfe5c6756bda47aade250aab69cf9c95413a5d79d3abe2b0c6751683b34ffe1cc8ae76e4ba40a83501d519

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Codinsa
Compañía de Ingeniería Sanitaria

CODINSA SAS-EN REORGANIZACION

NIT : 890,319,290 - 1
CRA 39 11 166 ACOPI
YUMBO - COLOMBIA
6026574031
CONTABILIDAD@CODINSA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3307 Tarifa 10,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVC 8933

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-27 11:59:44
Expedición 2024-12-27 12:16:12
Vencimiento 2025-01-27

Cliente ALCALDIA DE YUMBO
NIT 890,399,025 - 6
Dirección CLL 5 4 40
Ciudad NO USAR - COLOMBIA
Correo infraestructura@yumbo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6516600
Vendedor ARCE ESPINOSA
Centro Costo 1 008
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	IVA

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDENADO POR: CARLOS EDUARDO BRION MOLINA (SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA)

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEYLA CARABALI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082010261 **aprobado en** 2024-10-23 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 8505 **al** 9505

CUFE 4c7f7a602ecfe5c6756bda47aade250aab69cf9c95413a5d79d3abe2b0c6751683b34ffe1cc8ae76e4ba40a83501d519

ORIGINAL

Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 TRD: VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

30 DIC 2024
Maria E 7:40.

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº FEVC-8933

por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** **$ 342.651.639,00**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO ACTA FINAL CONTRATO No: 180-10-06-005-2024 CORRESPONDIENTE LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALADO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. QUE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12,12A,13,14,Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 342.651.639,00	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARA CODINSA SAS	890.319.290-1

VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**

POR CONCEPTO DE:

ACTA FINAL AL CONTRATO No.180-10-06-005-2024 CORRESPONDIENTE LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLIUVIAL Y COMBINADO, INSTALDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO.QUE UNE A LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE12,12A,13,14 Y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15 CARRERA 20E CALLES 13 Y 15 CARRERA 20G CALLE 14 Y 15)EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

VALOR TOTAL		$	
BASE LIQUIDACION $		$	342.651.639,00
BASE IVA			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2 %		6.853.033,00
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	3.426.516,00
(-) ESTAMPILLA UNI PACIFICO			
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5 %	$	
(-) ESTAMPILLA PRODEPORTE	2.5 %	$	8.566.291,00
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2 %	$	
(-)PLAN VIAL	5 %	$	17.132.582,00
(-) RETE ICA	0.6 %	$	2.055.910,00
VALOR NETO		$	304.617.307,00

CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

CODIFICACION CONTABLE	
DEBITO	CREDITO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los,

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. **002**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE-30-2024		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCION DEL CONTRATO			
CONTRATO N°	180-10-06-005-2024		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS		
NIT.	890.319.290-1		
DIRECCIÓN	CARRERA 39 # 11-166 ACOPI		
TELEFONO	602-6574031		
OBJETO DEL CONTRATO	LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PLUVIAL Y COMBINADO,INSTALADO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL,COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO,QUE SE UNE EN LA TUBERIA ANTIGUA EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12,12A,13,14 Y 15ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR(CARRERA 20D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.		
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 25-2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE-31-2024		
PRORROGA	SI		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO X	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El municipio de Yumbo pagara el valor del contrato, teniendo en cuenta el respectivo registro presupuestal, de la siguiente manera: El noventa (90) por ciento del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de la mismas a la supervisión. La primera de las actas parciales no se podrá realizar en tanto el avance de la obra, previa presentación, entrega y aprobación de las mismas a la supervisión. La primera de las actas parciales no se podrá realizar en tanto el avance de la obra no alcance el 30%. El diez (10) por ciento restantes a la liquidación del contrato, una vez se haya firmado el acta a satisfacción.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No.20242908	Fecha:2024-09-12	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No.20243681	25/11/2024	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. FEVC-8933 $ 342.651.639,00 FECHA:DICIEMBRE-27-2024		Documento equivalente No.	
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 529.734.749		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO N° 1		$ 186.223.546,01	$ 343.511.202,99
ACTA DE PAGO N° 2		$ 342.651.639,00	$ 859.554,00
ACTA DE PAGO N° 3			
ACTA DE PAGO N° 4			
ACTA DE PAGO N° 5			
ACUMULADO		$ 528.875.185,01	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - 99,84 % TOTAL ACUMULADO 99,98%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta FINAL 1	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) el dia treinta (30) mes de DICIEMBRE del 2024

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Cargo: Secretario de Infraestructura y servicios publicos
