ACTA No. 4182.010.26.1.12	**FECHA:**	26/Nov/2024
	HORA INICIAL:	6:15
OBJETIVO: Comité N°10 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024, correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	6:32
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Andrea Debías – UAESP – Apoyo administrativo
Camilo Murcia – UAESP – Director

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Fernando Obregón – Interventor
Diego Sánchez – Residente Constructor
Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista
Luis Fernando García – UAESP – Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado contratista de la UAESP hace apertura de la reunión, presentando a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato. Igualmente se presentan los residentes del contratista proponente de la obra y de la interventoría.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°9 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:


Se inicia la reunión, con la presentación de las empresas contratistas a cargo de la interventoría y de la ejecución de la obra.

El Ing. Jurado recuerda al director Camilo que se trata de un contrato que abarca tres (3) frentes, el sistema de acueducto Vorágine, PTAP la reforma y PTAP La Paz.

El Ing. Jurado pregunta sobre el avance del contrato en los tres (3) frentes en comparación con lo programado, e informa que la cuenta parcial ya está en proceso de revisión y radicación por un porcentaje de avance del (43%).

El Ing. Obregón informa que el avance de la obra ejecutada es del 85,63%. En el frente de Vorágine, se está finalizando la instalación de la tubería en el tercer tramo, y actualmente se están llevando a cabo las pruebas hidráulicas necesarias para instalar las válvulas y completar las conexiones de manera correcta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

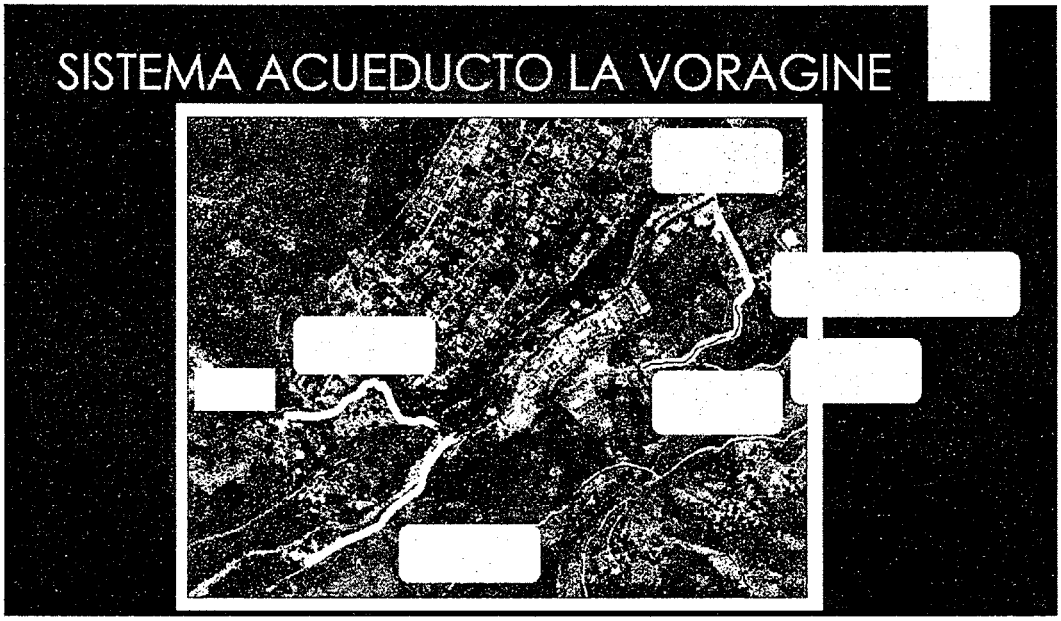


Fotografia 1. Distribucion de los 3 tramos del sistema de acueducto voragine.



Fotografía 2. Avance sistema de acueducto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.


El Ing. Jurado informa que, para la entrega del contrato, es necesario seguir un orden específico. Primero, se realizará un recorrido con la JAAC en la obra; luego, se redactará el acta de entrega de la obra a la interventoría. Posteriormente, se procederá con la entrega de la interventoría a la UAESP y se programará la socialización de la entrega final con la comunidad, asegurando que todo quede al día.

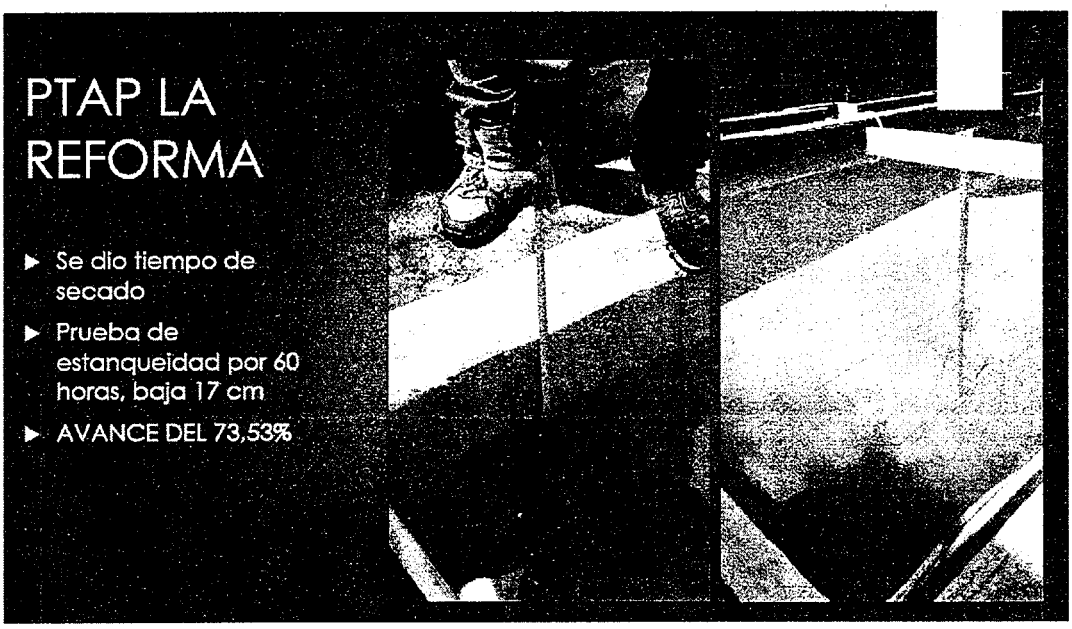

Fotografía 3. Avance PTAP La Reforma

El Ing. Obregón informa que, en la reforma, el avance es del 73,53%. Sin embargo, durante la intervención del concreto y la prueba de estanqueidad, se presentó una complicación, ya que el nivel del agua sigue descendiendo. Se llevará a cabo un trabajo de impermeabilización con tela en las zonas más afectadas del tanque de concreto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

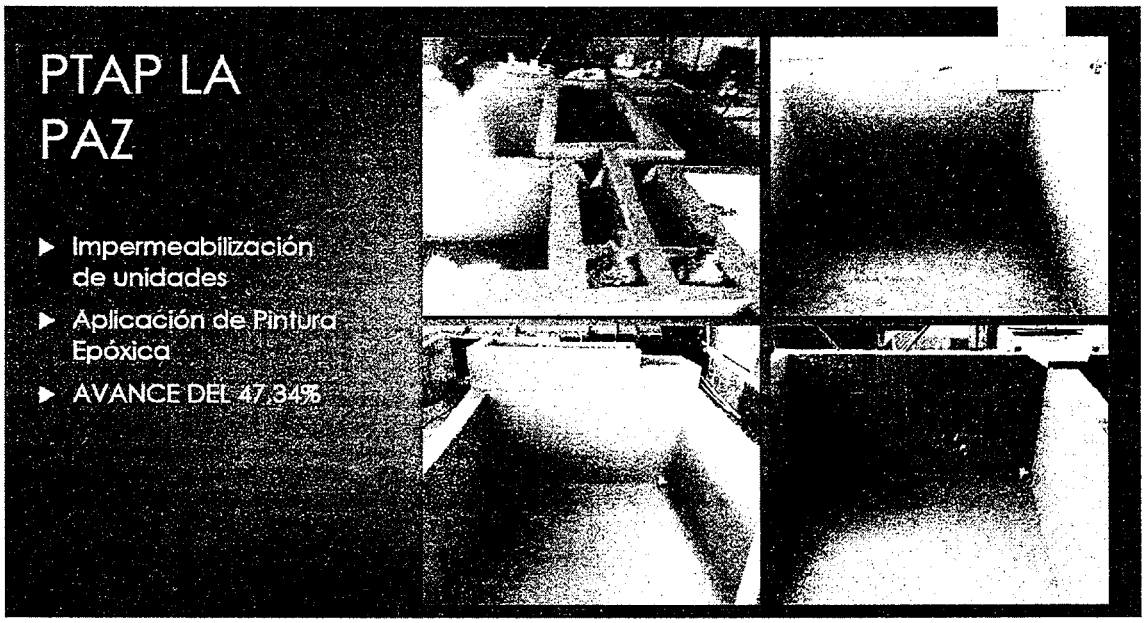

Fotografía 4. Avance PTAP La Paz

El Ing. Diego informa que en la PTAP La Paz, el avance alcanza el 47,34%. Actualmente se está llevando a cabo la impermeabilización, y se ha comprobado que el concreto se encuentra en buen estado. Se detectaron algunas tuberías con filtraciones, pero ya se están solucionando. Queda pendiente el relleno con material filtrante y las actividades de instalación de válvulas.

El Ing. Jurado solita dar respuesta a una solicitud que la comunidad esta haciendo sobre los siguientes ítems:

1. Remplazo de tres (3) kilómetros de tubería PVC de 3 pulgadas desde el nacimiento hasta la planta de tratamiento
2. Implementación de un sistema de detección de turbiedad en las aguas y bypass a través de electroválvulas para evitar que el lodo contamine los filtros del sistema
3. Implementación de lavado de filtros para aumentar su vida útil y evitar la presencia de agentes contaminantes y peligrosos en el agua
4. Implementación de un sistema automático de cloración que permita una dosificación adecuada ante las diferentes variaciones del caudal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Revisemos con la interventoría el balance de la obra, especialmente lo relacionado con la tubería. En cuanto al embellecimiento, pueden coordinarlo directamente con ellos.

La Ing. Angie informa que el contratista de obra ha presentado la cuenta, la cual será revisada por la supervisión antes de ser entregada al área administrativa para su respectiva radicación.

El director Camilo solicita a interventoría hacer un presupuesto del arreglo del tanque de la reforma, para aprobar un posible adicional y dejar funcional el tanque.

Se cierra la reunión.


OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe presentar informes semanales y un informe mensual con el consolidado de las actividades ejecutadas	Interventoría	02/Dic/2024
Revisión del tanque la PTAP la Reforma, con personal capacitado en impermeabilización	Interventoría	02/Dic/2024
Realizar balance de obra con las solicitudes que envió la comunidad de la PAZ	Obra e Interventoría	02/Dic/2024
Realizar presupuesto del arreglo del tanque de la reforma.	Obra e Interventoría	02/Dic/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Firmas (responsables)



Líder Agua Potable UAESP
Ing. Juan Carlos Jurado



Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.12

FECHA:	26 NOV / 2024
HORA INICIAL:	6:15
HORA FINAL:	6:32
LUGAR:	UAESP TALLER #2

OBJETIVO: COMITE N°10 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4182.010.26.1.566 REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP REFORMA, PAZ Y VORAGINE.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Consuelo Gralda Jara	UAESP	3164910514	Consuelo9@gmail.com	
2	Gustavo Adolfo Bonilla	UAESP	3156701980	tecto_arquitectura@hotmail.com	
3	Luis Fernando Garcia	UAESP	3155766168	[illegible]	
4	ANGIE NATALIA MURILLO	UAESP	3132554138	angiemurillo_28@hotmail.com	
5	Stephany Montoya Cardona	Uaesp	3173747201	mskphony2810@hotmail.com	
6	Luis Fdo Obregon P	Interventoria	3147158312	fernandoobregon2@hotmail.com	
7	Diego Sanchez J	Interventoria Obras M	3137412763	sandiego773@gmail.com	
8	Andrea Vivas	Uaesp	3148923724	andrea000011@hotmail	
9	Walter Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter-murcia@cali.gov.co	
10	JUAN C. TAMAYO A.	UAESP	3104245162	juanc.tamayo@	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
