Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SGRD-25000

San José de Cúcuta,

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2024-25000-035804-3
2024-12-23 07:54 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: TRAMITE DE PAGO IMA
Folios: 161
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

Doctor
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaria de hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: TRAMITE DE PAGÓ **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO quien se identifica con NIT **901.266.624-6,** la suma de **CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($129.558.446,00)** por concepto de Acta N°4 con fecha de 20 de diciembre de 2024, contrato **RE-SGRD-01885-2CIENTO 024**, suscrito el 30 DE AGOSTO 2024, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**, con registro presupuestal **N°00000072 del 30 de agosto de 2024, fuente de financiación 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**

Atentamente,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretaria de Despacho
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Paola Ramírez Montañez**	**Ingeniera Civil Contratista**	
Revisión jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya Novoa**	**Contratista**	
Aprobación Jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya Novoa**	**Contratista**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

CONSTRUCTORES S.A.S

ACTA PARCIAL #4

CONTRATO DE OBRA No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATISTA:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

PERIODO

11 DE DICIEMBRE DE 2024 A 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

1. FACTURA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA

Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70 Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **IV - 87**

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
NIT ó C.C: 900978341
DIRECCION:
Ciudad: CUCUTA
Telefono:
EMAIL:
VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA EMISION
20/12/2024 - 2:45:48 p. m.
Forma de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento:

CANT.	DESCRIPCION	BOD	UND	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	COSTO DIRECTO		UND	0	99,660,343.00	99,660,343.00
1.00	ADMINISTRACION 25%		UND	0	24,915,086.00	24,915,086.00
1.00	IMPREVISTOS 0.5%		UND	0	498,302.00	498,302.00
1.00	UTILIDAD 4.5%		UND	0	4,484,715.00	4,484,715.00

OBSERVACIONES : ACTA N°4 CONSTRRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO,MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CLAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO001287 DEL 06 DE JUNO DE 2024

SON : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos

CUFE:

SUBTOTAL	129,558,446.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**129,558,446.00**

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

CONSTRUCTORES S.A.S

2. AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2%

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

San José de Cúcuta, 20 de diciembre de 2024

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
San José de Cúcuta

REFERENCIA: RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Asunto: **Autorización Descuento Estampilla 2%**

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el 2% correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 04 de fecha 20 de diciembre de 2024

Sin otro particular

IVM CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.266.624-6
R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
CC. 88.279.674
Contratista de Obra.

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

3. CERTIFICACION BANCARIA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CUCUTA 2022/08/26

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS con Nit número 9012666246 de CUCUTA-NORTE DE SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969964056
Fecha Apertura	2022/08/26

Cordialmente,

DAVIVIENDA
660-OF. PRINCIPAL CUCUTA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

4. RUT

CONSTRUCTORES S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 6 6 2 4	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO	IVM CONSTRUCTORES SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
MODULO 4 SEC NUEVA SEXTA LC 21

42. Correo electrónico ivmconstructoressas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 0 7 2 0 3 1	3 2 2 9 1 0 1 7 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 2 0	2 0 2 4 0 5 3 0	4 2 1 0	2 0 1 9 0 3 1 5		0 8 1 1	0 9 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	4	8	5	2	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 30 / 14 : 38: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VACCA MACHADO IMAR ORLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 6 6 2 4	6	Impuestos de Cúcuta	7	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 4 6 1 9 0	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 1 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 6 6 2 4	6	Impuestos de Cúcuta	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 1 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 7 9 6 7 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VACCA	MACHADO	IMAR	ORLANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 6 6 2 4	6	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 1 1 6 2 6 9 3	0	1 9 7 1 5 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GERARDINO	SALCEDO	FRANKI	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 6 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 4 4 7 4 7 7	7	2 2 0 7 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONSALVE	CHAUSTRE	ERIKA	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTRUCTORES S.A.S

5. COPIA DEL CONTRATO

CONSTRUCTORES S.A.S

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6692624
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (29/08/2024 7:31:44 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	RE-SGRD-01885-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	29/12/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	29/04/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IVM CONSTRUCTORES SAS

COLOMBIA, Cúcuta

Número de documento 901266624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	Banco de Bogotá	Ahorros	303285241

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Imar Orlando Vacca Machado *Fecha de aprobación:* 29/08/2024 8:55:30 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: William Vera Arias *Fecha de aprobación:* 29/08/2024 9:46:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☐Si ☑No

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2025 11:59:00 PM

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2027 11:59:00 PM

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2029 11:59:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar | Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6692624
Proveedor IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cucutilla

1 CO1.PCCNTR.6692624

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.499.910.681,00	1.499.000.749,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141107	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR EL GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 1267 DEL 6 DE	1,00	UN	1.499.910.681,00	1.499.000.749,00	1.499.910.681,00	1.499.000.749,00

17

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido (29/08/2024 9:53:29 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf	ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf	(detalle)
☐	CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf	CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf	(detalle)
☐	ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL..pdf	ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL..pdf	(detalle)
☐	ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf	ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf	(detalle)
☐	DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf	DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf	(detalle)
☐	EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf	EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88158521	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	30/08/2024 9:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Willian Vera Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Si ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Si ☐ No *	1.499.000.749
Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☑ No *	
	Total	1.499.000.749

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004540151	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00000079	CDP	No se ha iniciado		1.499.910.681 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

CONSTRUCTORES S.A.S

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2	

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1

FECHA DEL ACTA	**28 DE OCTUBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C.	88.279.674 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) Meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de desig)	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de desg)	No Aplica
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	10 DE ENERO DE 2025
ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO	No Aplica
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024

En San José de Cúcuta el 28 de octubre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de acordar la modificación de las cantidades de obra No. 01 del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 2	

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1

Una vez finalizada la revisión a los diseños iniciales y ejecutada la localización y replanteo de las estructuras que componen la obra, se evidenció la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades con respecto a las inicialmente contratadas, teniendo en cuenta las condiciones encontradas en campo con respecto a la necesidad de ampliación del paso provisional, para facilitar la movilidad de los vehículos que por allí transitan sin que la ejecución de las actividades constructivas impidan el paso o que se ponga en riesgo la integridad de los trabajadores de la obra, adicionalmente dadas las condiciones del terreno se hace necesario aumentar la cantidad de días en el manejo de aguas necesario para la ejecución de las demás actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen la modificación de cantidades del contrato en referencia, contenidas en el Anexo No. 01, que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA | 28/10/2024

CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL						MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024			CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	+ -	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	**PUENTE VEHICULAR**									
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2	285,36	$ 6.781,00	$1.935.026,00				285,36	$ 1.935.026,00
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m.	M3	1376,88	$ 32.969,00	$45.394.357,00	+	494,37	$ 16.298.884,53	1.871,25	$ 61.693.241,00
1,03	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	38,35	$ 748.682,00	$28.711.955,00				38,35	$ 28.711.955,00
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	89,49	$ 1.419.525,00	$127.033.292,00				89,49	$ 127.033.292,00
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	94,44	$ 1.519.012,00	$143.455.493,00				94,44	$ 143.455.493,00
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3	34,83	$ 1.419.525,00	$49.442.056,00				34,83	$ 49.442.056,00
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16253,02	$ 10.385,00	$168.787.613,00				16.253,02	$ 168.787.613,00
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm.	M3	1004,60	$ 42.073,00	$42.266.536,00				1.004,60	$ 42.266.536,00
1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND	4,00	$ 2.311.720,00	$9.246.880,00				4,00	$ 9.246.880,00
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M	9,80	$ 444.040,00	$4.351.592,00				9,80	$ 4.351.592,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 1.419.525,00	$12.520.211,00				8,82	$ 12.520.211,00
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m)	UND	4,00	$ 356.976,00	$1.427.904,00				4,00	$ 1.427.904,00
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	32,40	$ 722.301,00	$23.402.552,00				32,40	$ 23.402.552,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	90,00	$ 286.800,00	$25.812.000,00				90,00	$ 25.812.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	60,00	$ 1.419.525,00	$85.171.500,00				60,00	$ 85.171.500,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	154,00	$ 6.730,00	$1.036.420,00				154,00	$ 1.036.420,00
1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	3047,93	$ 39.448,00	$120.234.743,00	-	89,96	$ 3.548.677,63	2.957,97	$ 116.686.065,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	134,00	$ 42.789,00	$5.733.726,00				134,00	$ 5.733.726,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA									
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	60,00	$ 156.008,00	$9.360.480,00				60,00	$ 9.360.480,00

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA: 28/10/2024

CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL						MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024			CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	+-	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1,20	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia	60,00	$ 538.226,00	$32.293.560,00	+	18,00	$ 9.688.068,00	78,00	$ 41.981.628,00
1,21	Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion	M³	840,00	$ 48.190,00	$40.479.600,00				840,00	$ 40.479.600,00
1,22	Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional)	M³	1600,00	$ 32.411,00	$51.857.600,00	-	406,67	$ 13.180.581,37	1.193,33	$ 38.677.019,00
1,23	Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal)	M²	117,60	$ 772.005,00	$90.787.788,00				117,60	$ 90.787.788,00
				Subtotal	***$1.120.742.884,00***					**$ 1.130.000.577,00**
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.120.742.884,00**					***$ 1.130.000.577,00***
	ADMINISTRACIÓN			25,00%	$ 280.185.721,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.500.144,00
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 5.603.714,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.650.003,00
	UTILIDAD			4,50%	$ 50.433.430,00	$ -	$ -	$ -		$ 50.850.026,00
	COSTO INDIRECTO DE LA OBRA				**$ 336.222.865,00**					***$ 339.000.173,00***
	SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE				**$ 12.035.000,00**					
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL				**$ 30.000.000,00**					**$ 30.000.000,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 1.499.000.749,00**					**$ 1.499.000.749,00**

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #2

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.2

FECHA DEL ACTA	**13 DE DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C.	88.279.674 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) Meses
PLAZO ADICIONAL	No aplica
PLAZO TOTAL	Cuatro (04) Meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de desig)	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de desg)	No Aplica
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	10 DE ENERO DE 2025
ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO	No Aplica

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.2

PRORROGA	No aplica
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024

En San José de Cúcuta el 13 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de acordar la modificación de las cantidades de obra No. 02 del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

Dado el incremento de las precipitaciones en la zona de ejecución del contrato, se evidenció la necesidad de realizar un manejo de las aguas que actualmente en momentos de lluvia están fluyendo sobre la vía, toda vez que la última obra de drenaje encargada de dar manejo a las aguas se encuentra aproximadamente a 135 mt de distancia por el lado aledaño al talud, generando que a lo largo de esta distancia las aguas lluvias no tengan ningún manejo, cauce o control sobre la vía y desemboquen en el sector en donde se construye el puente sin ninguna estructura (descole) que garantice una adecuada entrega de estas aguas en el sector, lo que podría llegar a afectar los rellenos a ejecutarse en la estructura objeto del contrato.

Por ello, con el personal de topografía el contratista de obra realizó un levantamiento de la zona que permitiera identificar distancias, peraltes y demás datos de la topografía del sector desde la última alcantarilla existente hasta el punto de intervención en la construcción del puente que permitió presentar una opción viable y favorable para el manejo de estas aguas de tal manera que se pueda garantizar que su desembocadura en la zona de construcción del puente no causara daños a las obras ejecutadas.

Por lo anteriormente descrito de determino la necesidad de construir 195 mt cunetas en concreto reforzado de 3000 PSI distribuidos en 135 mt en la margen aledaña al talud y 60 mt en la margen del costado de la escuela, que permitirán desde la última alcantarilla existente conducir el agua hasta el punto de entrega determinado en campo para el caso de las cunetas construidas en el costado del talud y en el costado contrario estos 60 mts de cuneta entregaran las aguas a una gradas disipadoras con el ánimo de evitar situaciones de erosión sobre los rellenos del puente y sobre la cimentación de los estribos, así mismo, se construirán 29,90 mt lineales de filtro adicionales a los 60 mt ya contratados en las condiciones iniciales del contrato de obra, adicionalmente a lo ya descrito surge la necesidad de realizar la construcción de un muro en gaviones que permitan la contención de los rellenos realizados en la parte posterior de los estribos del puente esto con el fin de garantizar el soporte de los estribos y la contención de los rellenos efectuados para tal fin.

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.2

Una vez determinadas las actividades constructivas necesarias para dar manejo a la situación evidenciada en campo durante el incremento de las precipitaciones en la zona, (*hechos ya descritos en el párrafo inicial*), se realizó un balance financiero que dado la imposibilidad de tener recursos adicionales para la ejecución de estas nuevas obras complementarias obligo a realizar un replanteo sobre el alcance del contrato determinado en el acta de modificación de cantidades No. 02 al contrato de obra en mención.

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen la modificación de cantidades del contrato en referencia, contenidas en el Anexo No. 01, que forma parte integral de la presente acta

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DEL ACTA	13/12/2024

			CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 del 28 de octubre del 2024			MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 13 DEDICIEMBRE DE 2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	+ -	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	PUENTE VEHICULAR									
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2	285,36	$ 6.781,00	$1.935.026,00				285,36	$ 1.935.026,00
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m.	M3	1871,25	$ 32.969,00	$61.693.241,00				1.871,25	$ 61.693.241,00
1,03	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	38,35	$ 748.682,00	$28.711.955,00				38,35	$ 28.711.955,00
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	89,49	$ 1.419.525,00	$127.033.292,00				89,49	$ 127.033.292,00
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	94,44	$ 1.519.012,00	$143.455.493,00				94,44	$ 143.455.493,00
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3	34,83	$ 1.419.525,00	$49.442.056,00				34,83	$ 49.442.056,00
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16253,02	$ 10.385,00	$168.787.613,00	+	531,32	5.517.758,00	16.784,34	$ 174.305.371,00
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm.	M3	1004,60	$ 42.073,00	$42.266.536,00				1.004,60	$ 42.266.536,00
1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND	4,00	$ 2.311.720,00	$9.246.880,00				4,00	$ 9.246.880,00
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M	9,80	$ 444.040,00	$4.351.592,00				9,80	$ 4.351.592,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 1.419.525,00	$12.520.211,00				8,82	$ 12.520.211,00
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m)	UND	4,00	$ 356.976,00	$1.427.904,00				4,00	$ 1.427.904,00
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	32,40	$ 722.301,00	$23.402.552,00				32,40	$ 23.402.552,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	90,00	$ 286.800,00	$25.812.000,00	-	60,00	17.208.000,00	30,00	$ 8.604.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	60,00	$ 1.419.525,00	$85.171.500,00	-	40,00	56.781.000,00	20,00	$ 28.390.500,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	154,00	$ 6.730,00	$1.036.420,00	-	80,00	538.400,00	74,00	$ 498.020,00
1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	2957,97	$ 39.448,00	$116.686.065,00				2.957,97	$ 116.686.065,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	134,00	$ 42.789,00	$5.733.726,00	-	66,67	2.852.743,00	67,33	$ 2.880.983,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA									
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	60,00	$ 156.008,00	$9.360.480,00	+	29,90	4.664.639,20	89,90	$ 14.025.119,00

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DEL ACTA	13/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 del 28 de octubre del 2024						MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 13 DEDICIEMBRE DE 2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	+ -	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1,20	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia	78,00	$ 538.226,00	$41.981.628,00				78,00	$ 41.981.628,00
1,21	Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion	M³	840,00	$ 48.190,00	$40.479.600,00				840,00	$ 40.479.600,00
1,22	Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional)	M³	1193,33	$ 32.411,00	$38.677.019,00				1.193,33	$ 38.677.019,00
1,23	Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal)	M²	117,60	$ 772.005,00	$90.787.788,00				117,60	$ 90.787.788,00
	ITEMS NO PREVISTOS									
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3		$ 1.024.622,00		+	38,45	39.396.716,00	38,45	$ 39.396.716,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3		$ 95.039,00		+	39,98	3.799.659,00	39,98	$ 3.799.659,00
NP 03	GAVIONES	M2		$ 400.000,00		+	60,00	24.000.000,00	60,00	$ 24.000.000,00
				Subtotal	***$1.130.000.577,00***					**$ 1.129.999.206,00**
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.130.000.577,00**					***$ 1.129.999.206,00***
	ADMINISTRACIÓN		25,00%		$ 282.500.144,00					$ 282.499.802,00
	IMPREVISTOS		0,50%		$ 5.650.003,00					$ 5.649.996,00
	UTILIDAD		4,50%		$ 50.850.026,00					$ 50.849.964,00
	COSTO INDIRECTO DE LA OBRA				**$ 339.000.173,00**					***$ 338.999.762,00***
	SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE									
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL				**$ 30.000.000,00**					**$ 30.000.000,00**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE									**$ 1.782,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 1.499.000.750,00**					**$ 1.499.000.750,00**

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:


IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,07	Acero de refuerzo Grado 60	UNIDAD DE MEDIDA	KG	UBICACIÓN	CUCUTILLA

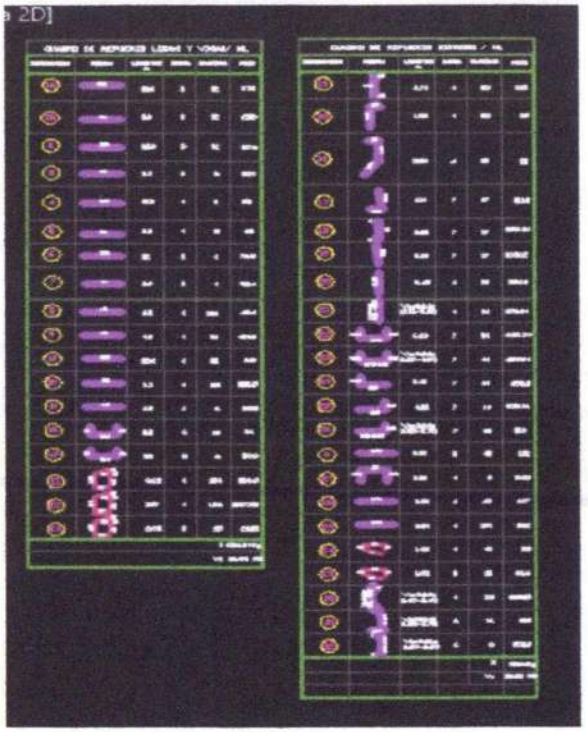

DETALLE	Dimensiones					Total
	Diámetro					
Diámetro	# 4	# 5	# 7	# 8	Cant	
Kg / ml	1,00	1,6	3,04	4	(Und)	
1A				12,00	12,00	576
1B				6,00	12,00	288
2				12,00	12,00	576
3				8,50	6,00	204
4	12,00				8,00	96
5	6,00				8,00	48
6		12,00			4,00	76,8
7		6,00			4,00	38,4
8	0,45				108,00	48,6
9	4,80				96,00	460,8
10	12,00				55,00	660
10	5,50				55,00	302,5
11	4,80				6,00	28,8
12	3,00				18,00	54
13		3,00			6,00	26,8
14	6,75				40,00	270
15	1,95				40,00	78
16	2,55				40,00	102
17			4,10		34,00	423,78
18			6,85		34,00	708,02
19			2,00		34,00	206,72
20	11,40				64,00	729,6
21	11,16				28,00	312,48
22			6,40		68,00	1323,01
23			6,25		88,00	1672
24			3,40		88,00	909,57
25			4,05		38,00	467,86
26			3,85		36,00	421,34
27	1,20				16,00	19,2
28	3,50				84,00	294
29	2,80				380,00	1064
30	8,45				26,00	219,7
31				5,25	32,00	672
32				8,55	16,00	547,2
E1	3,22				104,00	334,88
E2	1,97				136,00	267,92
E3	2,35				15,00	35,25
E4	1,45				80,00	116
E5		1,85			30,00	88,8
A	112,00				2,00	224
						14994,03
Acero de transferencia Via						140
Acero cunetas						1548,78
Acero gradas disipadoras						101,53

OBSERVACIONES:	Subtotal	16.784,34
	Vienen	
	TOTAL	16.784,34

Elaboró
EL CONTRATISTA


Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024							
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,14	Base granular (INV. 330.1)	UNIDAD DE MEDIDA	M³	UBICACIÓN	CUCUTILLA

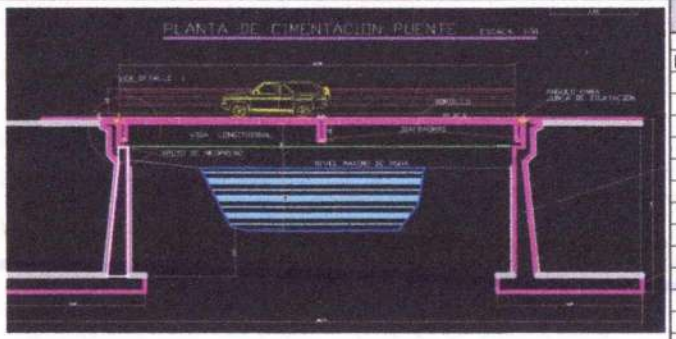


DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Base granular del pavimento	5,00	20,00	0,30		**30,00**

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	**MODIIFICACION DE CANTIDADES #2**	**FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:**	**13 DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	**ITEM**	**1,15**	Losa de pavimento en Concreto resistencia 245 kg/cm²-3500 psi e=0.20 m	**UNIDAD DE MEDIDA**	M²	**UBICACIÓN**	**CUCUTILLA**

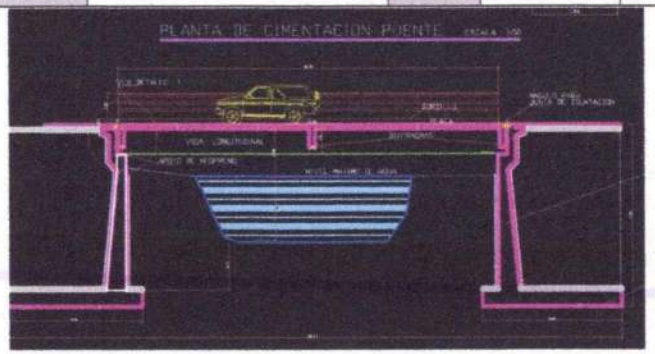


DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Losa de pavimento	5,00	20,00	0,20		**20,00**

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	**MODIIFICACION DE CANTIDADES #2**	**FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:**	**13 DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	**ITEM**	**1,16**	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	**UNIDAD DE MEDIDA**	M	**UBICACIÓN**	**CUCUTILLA**

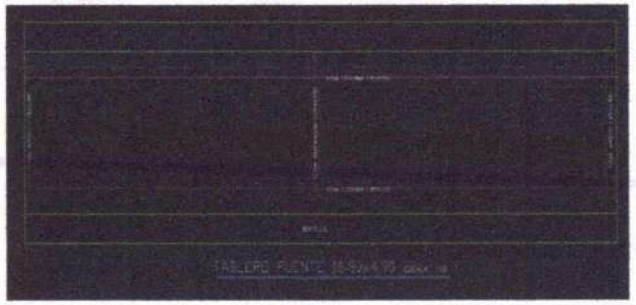

DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Via	20,00			2,00	40,00
Puente	17,00			2,00	34,00
Subtotal					74,00
Vienen					0,00
TOTAL					74,00

Elaboró
EL CONTRATISTA


Firma
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024							
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,18	Junta de dilatacion de 6 mm x 35 mm (Cortada, inducida y sellada)	UNIDAD DE MEDIDA	M	UBICACIÓN	CUCUTILLA

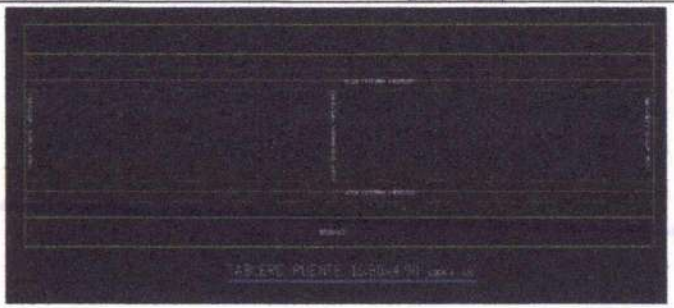

DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	S(m)	Cant	Total
Via	5,00	20,00	3,00		33,33
Puente	5,00	17,00	2,50		34,00
Subtotal					67,33
Vienen					0,00
TOTAL					67,33

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024							
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	UNIDAD DE MEDIDA	M	UBICACIÓN	CUCUTILLA

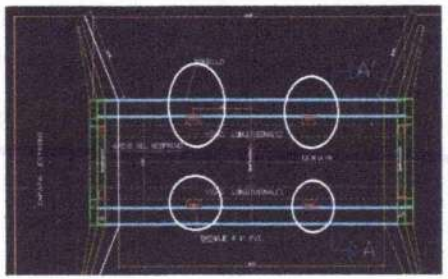

DETALLE	Dimensiones B(m)	Dimensiones L(m)	Dimensiones S(m)	Cant	Total
Via		60,00			60,00


Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPITULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	NP01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² paracunetas y gradas disipadora	UNIDAD DE MEDIDA	M3	UBICACIÓN	CUCUTILLA

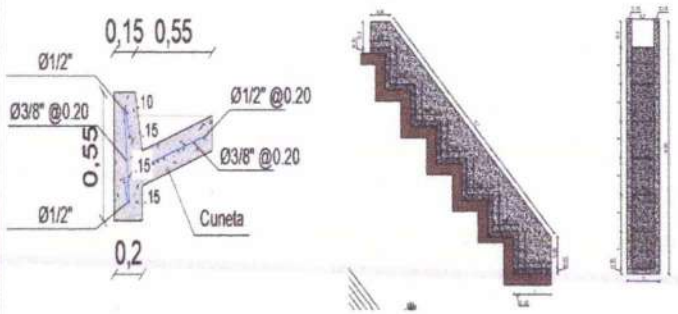

DETALLE	Dimensiones B(m)	H(m)	AREA	L(m)	Total
CUNETAS					
CUNETA MARGEN TALUD	0,70	0,25	0,18	135,00	24,30
CUNETA MARGEN ESCUELA	0.70	0,25	0,18	60,00	10,80
GRADAS DISIPADORAS					

DETALLE	Dimensiones AREA (m2)	L(m)	VOLUMEN	CANTIDAD	Total
GRADAS DISIPADORAS	1,72	0,70	1,20	1,00	1,20
PAREDES LATERALES GRADAS	7,15	0,15	1,07	2,00	2,15

OBSERVACIONES:

Subtotal	38,45
Vienen	0,00
TOTAL	38,45

Elaboró
EL CONTRATISTA


Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024								
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024				SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS			
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S				INTERVENTORIA	N.A			
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ÍTEM	NP02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	UNIDAD DE MEDIDA	M3		UBICACIÓN	CUCUTILLA

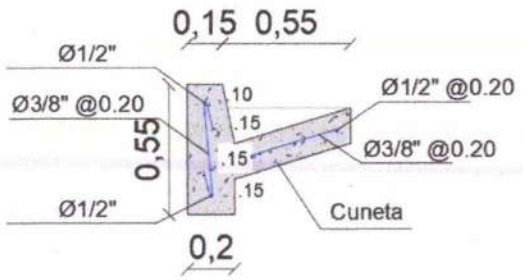

distancia	ANCHO	PROFUNDIDAD	MD	ACUMULADO
EXCACACION CUNETAS				
195	0,7	0,25	34,125	34,13
195	0,2	0,15	5,85	39,98

OBSERVACIONES:

Subtotal	39,98
Vienen	
TOTAL	39,98


Elaboró
EL CONTRATISTA

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Gobernación de Norte de Santander	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	IVM CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	MODIIFICACION DE CANTIDADES #2	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	13 DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPITULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	NP03	GAVIONES	UNIDAD DE MEDIDA	M2	UBICACIÓN	CUCUTILLA

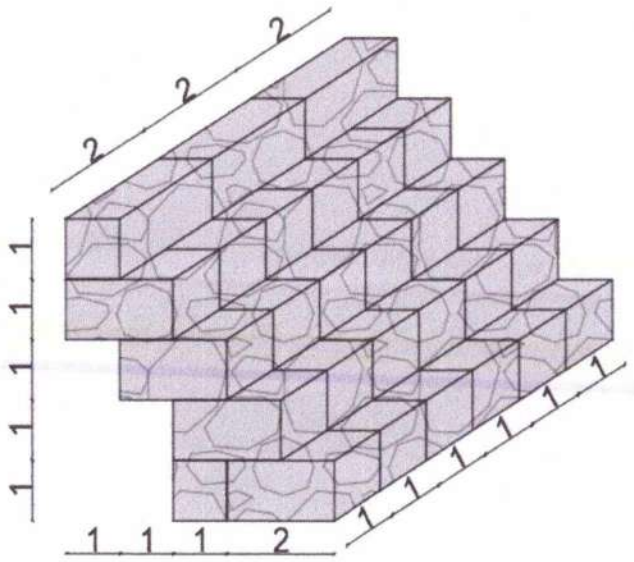


DETALLE	Dimensiones H(M)	L(m) Ó e(M)	AREA (M2)	CANT	Total
LINEA 1	1,00	2,00	2,00	3,00	6,00
LINEA 2	1,00	2,00	2,00	6,00	12,00
LINEA 3	1,00	2,00	2,00	6,00	12,00
LINEA 4	1,00	2,00	2,00	6,00	12,00
LINEA 5	1,00	2,00	2,00	9,00	18,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	60,00
Vienen	0,00
TOTAL	60,00

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

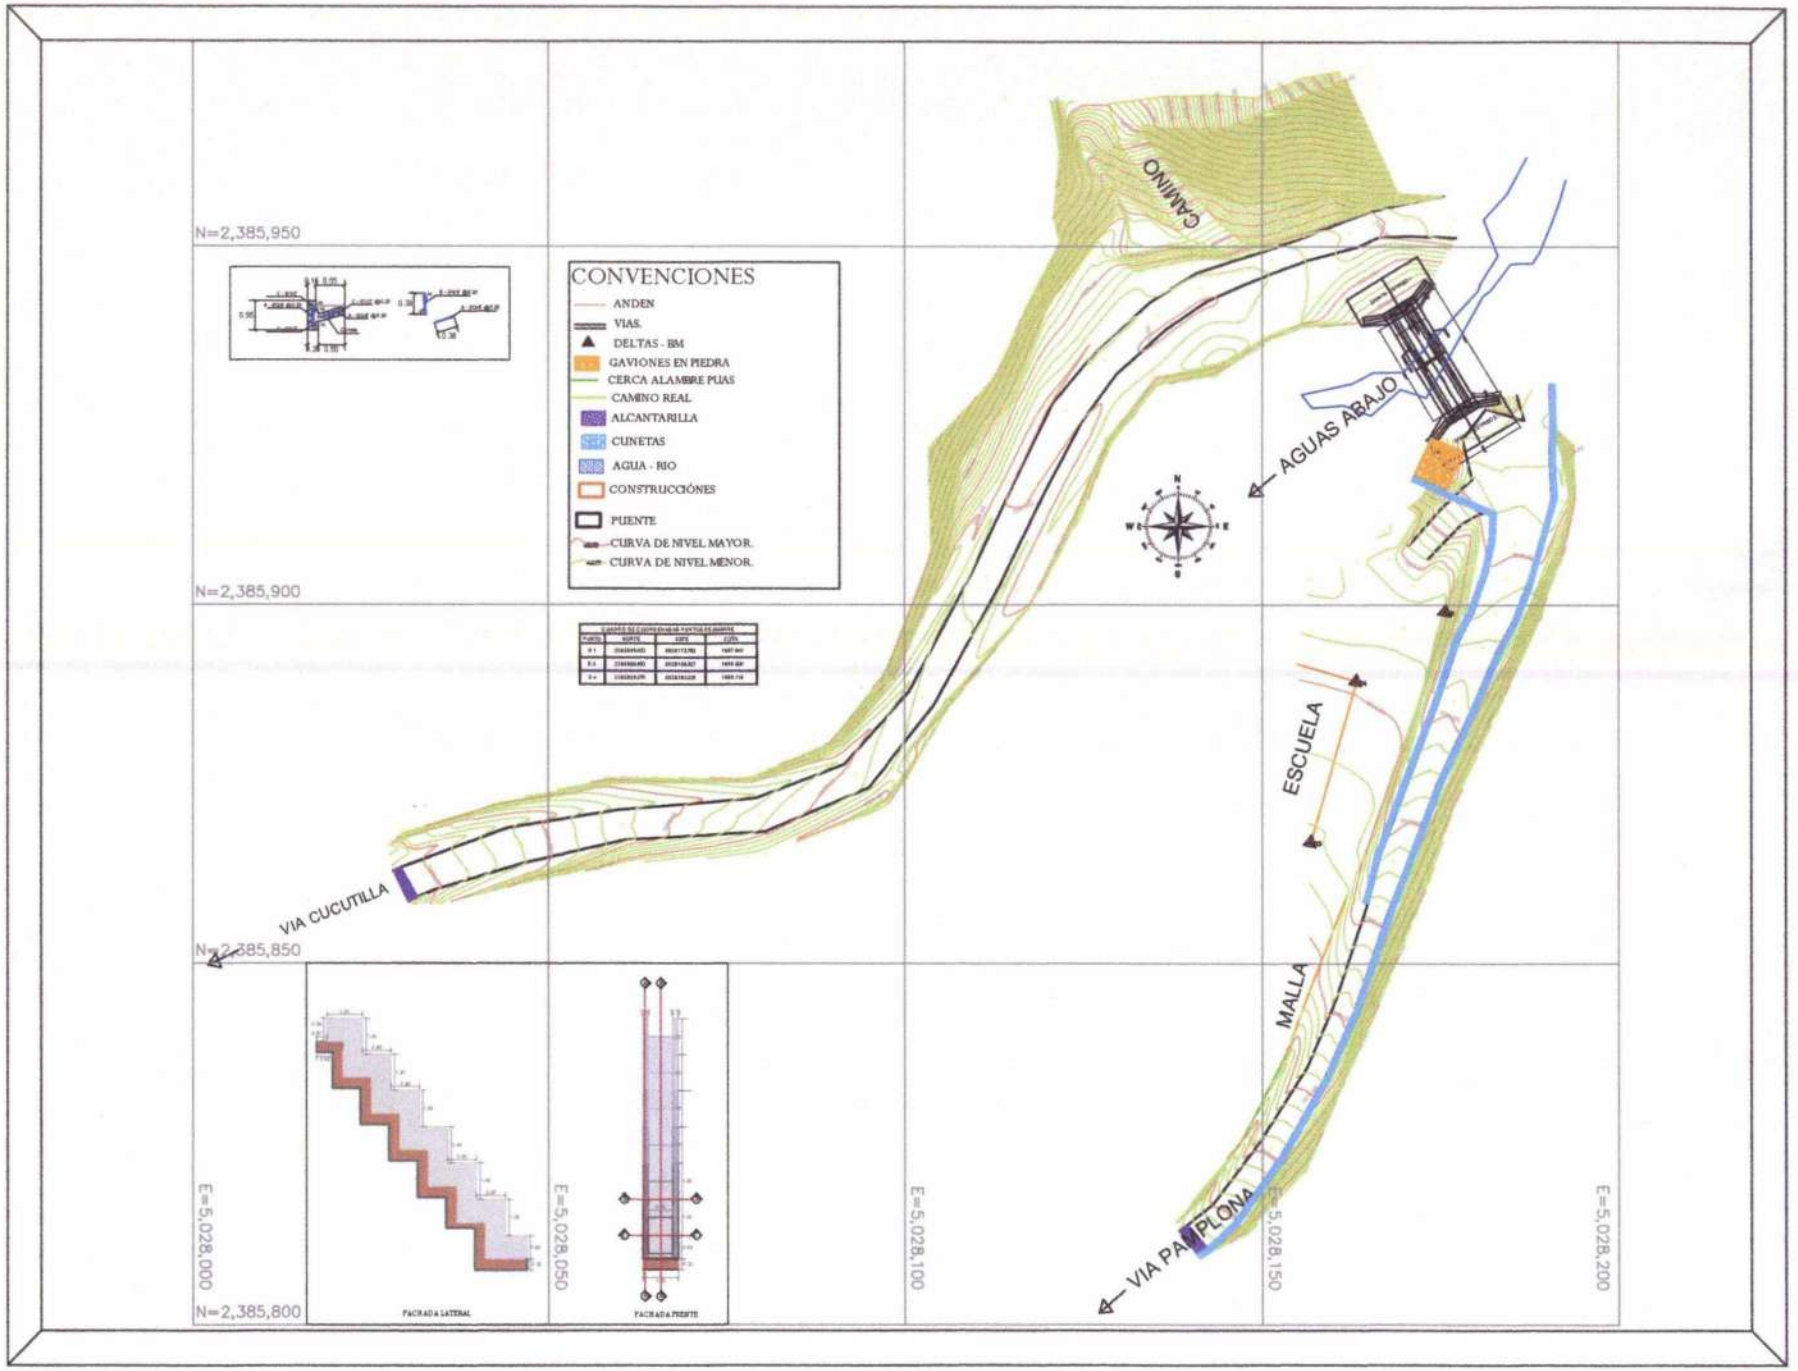
N=2,385,950
N=2,385,900
N=2,385,850
N=2,385,800
E=5,028,000
E=5,028,050
E=5,028,100
E=5,028,150
E=5,028,200
CONVENCIONES
ANDEN
VIAS.
DELTAS - BM
GAVIONES EN PIEDRA
CERCA ALAMBRE PUAS
CAMINO REAL
ALCANTARILLA
CUNETAS
AGUA - RIO
CONSTRUCCIÓNES
PUENTE
CURVA DE NIVEL MAYOR.
CURVA DE NIVEL MENOR.
CAMINO
AGUAS ABAJO
ESCUELA
MALLA
VIA CUCUTILLA
VIA PA
PLONA
FACHADA LATERAL
FACHADA FRENTE

PUENTE GUAYABITO MUNICIPIO CUCUTILLA			
COORDENADAS LOCALIZACION CUNETA PROYECTADA			
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
1	2385930,893	5028191,084	CUNETA
2	2385925,419	5028191,135	CUNETA
3	2385920,130	5028191,094	CUNETA
4	2385914,901	5028191,364	CUNETA
5	2385902,157	5028187,721	CUNETA
6	2385897,504	5028185,894	CUNETA
7	2385893,218	5028183,544	CUNETA
8	2385885,347	5028180,221	CUNETA
9	2385874,737	5028175,324	CUNETA
10	2385863,240	5028170,897	CUNETA
11	2385856,996	5028168,471	CUNETA
12	2385843,060	5028163,631	CUNETA
13	2385833,953	5028159,480	CUNETA
14	2385822,976	5028153,221	CUNETA
15	2385813,623	5028146,488	CUNETA
16	2385810,088	5028142,787	CUNETA
17	2385809,130	5028141,350	CUNETA
18	2385917,960	5028171,341	CUNETA
19	2385915,851	5028175,875	CUNETA
20	2385912,977	5028182,814	CUNETA
21	2385908,974	5028182,621	CUNETA
22	2385904,507	5028181,636	CUNETA
23	2385898,879	5028179,624	CUNETA
24	2385895,264	5028177,730	CUNETA
25	2385887,064	5028175,035	CUNETA
26	2385877,537	5028171,400	CUNETA
27	2385864,938	5028166,619	CUNETA
28	2385858,400	5028164,938	CUNETA

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2	

ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.01

FECHA DEL ACTA	**13 DE DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C.	88.279.674 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) Meses
PLAZO ADICIONAL	No aplica
PLAZO TOTAL	Cuatro (04) Meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de desig)	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de desg)	No Aplica
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	10 DE ENERO DE 2025
ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO	No Aplica

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 2	

ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.01

PRORROGA	No aplica
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 02 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

En San José de Cúcuta el 13 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de acordar y aprobar los siguientes precios unitarios no previstos dentro del contrato en referencia:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/TOTAL
	ITEM NO PREVISTOS				
NP-01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm^2 PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	38,45	$1.024.622,00	$ 6.288.962.00
NP-02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	39,98	$95.039,00	$12.088.965,00
NP-03	GAVIONES	M2	60	$400.000,00	$24.000.000,00

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto:

Municipio de Cucutilla: Sector de El Guayabito. Estudios y Diseños de la infraestructura de paso elevado sobre una quebrada debido a colapso de Box Culvert por avenida torrencial.

ITEM:	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	UND:	M³

1. MATERIALES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Concreto 3000 Psi	M³	1,0300	809.850,00	834.146,00
Formaleta (1 uso)	M²	0,6600	87.000,00	57.420,00
			SUB TOTAL	**891.566,00**

2. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UND	CANTIDAD	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
Cuadrilla AA (Albañilería)	Hr	5,7480	20.253,00	116.415,00
			SUB TOTAL	**116.415,00**

3. EQUIPO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O A.A.	Hr	5,7480	2.025,30	11.641,00
Vibrador de concreto	Hr	1,00	$ 5.000	5.000,00
			SUB TOTAL	**16.641,00**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
			SUB TOTAL	-
			TOTAL COSTO DIRECTO	**1.024.622,00**

Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto:

Municipio de Cucutilla: Sector de El Guayabito. Estudios y Diseños de la infraestructura de paso elevado sobre una quebrada debido a colapso de Box Culvert por avenida torrencial.

ITEM:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	UND:	M^3

1. MATERIALES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
			SUB TOTAL	-

2. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UND	CANTIDAD	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
Ayudante de construccion	Hr	6,5000	10.663,00	69.310,00
			SUB TOTAL	**69.310,00**

3. EQUIPO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 5% M.O A.A.	%	5,0000		3.465,50
Volqueta (6 M^3)	Hr	0,2300	96.800,00	22.264,00
			SUB TOTAL	**25.729,50**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
			SUB TOTAL	-
			TOTAL COSTO DIRECTO	**95.039,50**

Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto:

Municipio de Cucutilla: Sector de El Guayabito. Estudios y Diseños de la infraestructura de paso elevado sobre una quebrada debido a colapso de Box Culvert por avenida torrencial.

ITEM: gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 c.12 **UND:** M^3

1. MATERIALES

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
malla gavión 2x1x1 8x10 d=2,75 mm	und	0,5000	125.000,00	62.500,00
piedra rajon	m3	1,1000	48.000,00	52.800,00
alambre galvanizado cal. 16	kg	2,00	6880,00	13.760,00
			SUB TOTAL	**129.060,00**

2. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UND	CANTIDAD	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
cuadrilla 1x6	Hr	5,0000	575.580,00	115.116,00
			SUB TOTAL	**115.116,00**

3. EQUIPO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Herramienta menor 5% M.O A.A.	%	5,0000		5.755,80
tableros de madera	un	196,0000	8,00	1.568,00
			SUB TOTAL	**7.323,80**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UND	KM	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
transporte volqueta piedra rajon	m3-km	90,00	1,10	1500,00	148500
				SUB TOTAL	**148.500,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**400.000,00**

Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

6. POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

POLIZAS INICIALES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA:	RE-SGRD-01885-2024 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024			
VALOR INICIAL (En números):	$ 1.499.000.749			
PLAZO:	**4 Meses**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 00000079 DEL 26 JULIO 2024			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento.				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	5		
Estabilidad de la obra.	X	10		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	260 SMMLV		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
VALOR TOTAL (En números):	$ 1.499.000.749			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
POLIZA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO N°:	No. 21-44-101449740 Anexo No.0			
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	No. 21-40-101238693 Anexo No 0			
VIGENCIA RCivilextracontr. (dd/mm/aa):	29/08/2024 al 29/12/2029	VIGENCIA RCumplimiento. (dd/mm/aa):	29/08/2024 al 29/12/2024	

En San José de Cúcuta, a los 09 días del mes de septiembre 2024, en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS**, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** Con C.C. No. **88.279.674**, como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, a los nueve (09) días de septiembre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

POR EL CONTRATISTA

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista
C.C. 91.523.850

Proyectó: Alejandro Suarez Villamizar – Asesor Jurídico Externo SGRD
Revisó: William Vera Arias – secretario SGRD

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	08	2024	29	08	2024	00:00	29	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	NIT: 901.266.624-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2024	28/04/2025	$149,991,068.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2024	28/12/2027	$74,995,534.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$149,991,068.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,749,151.00	$ ******20,000.00	$ *****526,138.00	$ *********3,295,290.00	$ ******374,977,670.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	08	2024	29	08	2024	00:00	29	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/08/2024	29/12/2024	$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****217,260.00	$ *******3,000.00	$ ******41,849.00	$ **********262,109.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCTORES S.A.S

POLIZAS ACTUALIZADAS
ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES					
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	**RE – SGRD – 01885 - 2024**				
VALOR INICIAL (En números):	**$ 1.499.000.749**				
PLAZO TOTAL	**Cuatro (04) Meses**				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No. 00000079 del 26 de julio de 2024**				
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**	
Garantía de seriedad del ofrecimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.					
Pago anticipado.					
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	**10**			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	**5**			
Estabilidad de la obra.	X	**10**			
Calidad de los bienes y equipos suministrados.					
Correcto funcionamiento de los equipos.					
Calidad del servicio.					
Provisión de repuestos y accesorios.					
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria cuando se han pactado en el contrato.					
Responsabilidad civil extracontractual.	X	**260 SMMLV**			
Otros amparos.					
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)					
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)					
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)					
VALOR TOTAL (En números):	**$ 1.499.000.749**				
ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**				
-POLIZA DE GARANTIA Nº:	No. 21-44-101449740 Anexo No.2				
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	No. 21-40-101238693 Anexo No.2				
VIGENCIA G (dd/mm/aa):	DEL 10/09/2024 a 10/01/2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	DEL 10/09/2024 AL 10/01/2025		

En San José de Cúcuta, a los 08 días del mes de octubre del año 2024, en La Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander, se reunieron Los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS,** Secretario para la Gestión Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO con C.C No. 88.279.674** de Ocaña **R/L de IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S,** NIT **901.266.624-6**; actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, el 08 de octubre de 2024

POR EL DEPARTAMENTO

WILLIAM VERA ARIAS
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Nit 901.266.624-6
R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. **88.279.674** de Ocaña.
Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	NIT: 901.266.624-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2024	10/05/2025	$149,991,068.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/09/2024	09/01/2028	$74,995,534.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$149,991,068.10	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,749,151.00	$ ******20,000.00	$ *****526,138.00	$ *********3,295,290.00	$ ******374,977,670.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5710290
ADICIONAL:			

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,749,151.00	$ ******20,000.00	$ *****526,138.00	$ *********3,295,290.00	$ ******374,977,670.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100513654825 5(3900)000003295290(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513654825-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710290

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	NIT: 901.266.624-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/09/2024	10/01/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****217,260.00	$ *******3,000.00	$ ******41,849.00	$ **********262,109.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	NIT: 901.266.624-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****217,260.00	$ *******3,000.00	$ ******41,849.00	$ **********262,109.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100513654926O(3900)000000262109(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513654926-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2024	10	09	2024	00:00	10	01	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF163788A 2

CONSTRUCTORES S.A.S

POLIZAS ACTUALIZADAS
PRORROGA No.01

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	10	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 5710290
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010S, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2024	25/06/2025	$149,991,068.10	$149,991,068.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/09/2024	25/02/2028	$74,995,534.05	$74,995,534.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$149,991,068.10	$149,991,068.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO N 01 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 2 MES Y 15 DIAS POR LO CUAL SE AJUSTAN LAS VIGNCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,399.00	$ *******8,000.00	$ ******15,085.00	$ **********94,485.00	$ ******374,977,670.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	10	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5710290
ADICIONAL:			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,399.00	$ *******8,000.00	$ ******15,085.00	$ **********94,485.00	$ ******374,977,670.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100513715948 5(3900)000000094485(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513715948-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101449740	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	10	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		**NIT: 901.266.624-6**	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		**NIT: 800.103.927-7**	
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710290

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	25	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍNITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/09/2024	25/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MOFIFICATORIO NO 01 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 1 MES Y 15 DIA MAS POR LO CUAL SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,917.00	$ *******3,000.00	$ ******16,134.00	$ **********101,052.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	25	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.266.624-6
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5710290

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,917.00	$ *******3,000.00	$ ******16,134.00	$ **********101,052.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA MILENA CAMACHO TORRES	163788	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100513715957 1(3900)000000101052(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513715957-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238693	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2024	10	09	2024	00:00	25	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.		NIT: 901.266.624-6	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710503

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AVDA 15 CALLES 13 Y 14 CENTRO CUCUTA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. COPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

CONSTRUCTORES S.A.S

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
NIT : 800103927-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000079

Fecha: jul-26/2024 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1.2	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,499,910,681.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Código BPIN: 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

TOTALES **1,499,910,681.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: WILLIAM VERA ARIAS
CARGO: SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPENDENCIA: SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 2222

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
IDALY ROMERO MANTILLA

Powered by CamScanner

8. COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander

FONDO DE RIESGOS
NIT : 800103927-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000072

FECHA : ago-30/2024
A FAVOR DE : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. NIT: 901266624-6
COMPROMISO : CONTRATO DE OBRA No.01885 DE 2024. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.
DISPONIBILIDAD : 00 000079 -- jul-26/2024
DEPENDENCIA : SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
N°. CONTRATO : 01885 DE 2024
TIPO CONTRATO : C.O - CONTRATO DE OBRA
DURACION : 4 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1.2	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	000079 - jul-26/2024	1,499,000,749.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Código BPIN: 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

TOTALES **1,499,000,749.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
IDALY ROMERO MANTILLA

9. COPIA ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 10/07/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	
FECHA DEL ACTA	10 de septiembre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-01885-2024, del 30 de agosto de 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C.	88.279.624
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	1.499.000.749
PLAZO O DURACIÓN	4 meses
FORMA DE PAGO	El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 1.499.000.749) M/CTE** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000079 del 26 de julio de 2024
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante memorando de

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

	designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024.
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	No aplica.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	30 de agosto de 2024
Registro Presupuestal	N° 00000072 DEL 30 de agosto de 2024

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Impuesto de timbre	No Aplica		
Publicación Gaceta	No Aplica		
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.0 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 30/08/2024 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	29/08/2024 al 28/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	29/08/2024 al 28/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Ampara 5 años
Garantía Responsabilidad civil No. 21-40-101238693 Anexo No.0 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 30/08/2024 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Valor asegurado	Vigencia	
	$ 260.000.000	18/06/2024 al 18/08/2024	
Otros (según el contrato):			

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 10/07/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

En San José de Cúcuta a los 10 días del mes de septiembre 2024, en las oficinas de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO, se reunieron los suscritos a saber: **WILLIAM VERA ARIAS**, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno NO APLICA, Interventor Externo NO APLICA, **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.**, con NIT 901.266.624-6; Representada Legalmente por **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.279.624, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
NIT: 901.266.624-6
R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. 88.279.624
Contratista

***Nota 1**: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
***Nota 2**: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

CONSTRUCTORES S.A.S

10. COPIA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 CON ANEXO 1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/2010	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE PARCIAL No.4

FECHA DEL ACTA	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS		
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6		
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO		
C.C.	88.279.674 DE OCAÑA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000079 del 26 de julio de 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000072 del 30 de agosto de 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749		
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) Meses		
PLAZO ADICIONAL	UN (1) Mes y quince (15) días		
PLAZO TOTAL	Cinco (5) meses y Quince (15) dias		
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de desig)	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024		
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de desg)	No Aplica		
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A		
ACTA DE REINICIO	N.A		
FECHA DE TERMINACION	25 DE FEBRERO DE 2025		
PRORROGA	PRORROGA No. 1 del 17 de diciembre 2024		
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.2	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**

ACTA DE PARCIAL No.4

Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 07/10/2024 Fecha de aprobación: 08/10/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	10/09/2024 al 10/05/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	10/09/2024 al 09/01/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Cinco años, 0 meses y 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101238693 Anexo No.2 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 07/10/2024 Fecha de aprobación: 08/10/2024	**Amparos**	**Valor Asegurado**	Vigencia
	Predios , labores y operaciones	$ 260.000.000	10/09/2024 al 10/01/2025
ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO	Acta de aprobación de precios unitarios N1 del 13 de diciembre de 2024		
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 DEL 13 DE DIEMBRE DE 2024		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 DEL 13 DE DIEMBRE DE 2024		
	ACTA PARCIAL No. 02 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024		
	ACTA PARCIAL No. 03 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	8,64%		
% EJECUTADO ACUMULADO	93,34%		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	102 días trabajados / 168 Total días: 60,71%		

En San José de Cúcuta el 20 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador

ACTA DE PARCIAL No.4

del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de realizar Acta Parcial de Obra No. 4 al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 | FECHA DEL ACTA | 20/12/2024

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRAO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADDES No. 2 del 13 de diciembre de 2024						ACUMULADO EJECUTADO ACTA 1, 2 Y 3		ACTA PARCIAL No 4		EJECUTADO ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	PUENTE VEHICULAR												
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2	285,36	$ 6.781,00	$1.935.026,00	285,36	$ 1.935.026,00			285,36	$ 1.935.026,00	0,00	$ -
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m.	M3	1871,25	$ 32.969,00	$61.693.241,00	1.871,25	$ 61.693.241,00			1.871,25	$ 61.693.241,00	0,00	$ -
1,03	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	38,35	$ 748.682,00	$28.711.955,00	38,35	$ 28.711.955,00			38,35	$ 28.711.955,00	0,00	$ -
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	89,49	$ 1.419.525,00	$127.033.292,00	89,49	$ 127.033.292,00			89,49	$ 127.033.292,00	0,00	$ -
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	94,44	$ 1.519.012,00	$143.455.493,00	94,44	$ 143.455.493,00			94,44	$ 143.455.493,00	0,00	$ -
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3	34,83	$ 1.419.525,00	$49.442.056,00	34,83	$ 49.442.056,00			34,83	$ 49.442.056,00	0,00	$ -
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16784,34	$ 10.385,00	$174.305.371,00	14.994,03	$ 155.713.002,00	1.790,31	$ 18.592.369,00	16.784,34	$ 174.305.371,00	0,00	$ -
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm.	M3	1004,60	$ 42.073,00	$42.266.536,00	1.004,60	$ 42.266.536,00			1.004,60	$ 42.266.536,00	0,00	$ -
1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND	4,00	$ 2.311.720,00	$9.246.880,00	4,00	$ 9.246.880,00			4,00	$ 9.246.880,00	0,00	$ -
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M	9,80	$ 444.040,00	$4.351.592,00	9,80	$ 4.351.592,00			9,80	$ 4.351.592,00	0,00	$ -
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 1.419.525,00	$12.520.211,00	0,00	$ -	8,82	$ 12.520.211,00	8,82	$ 12.520.211,00	0,00	$ -
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m)	UND	4,00	$ 356.976,00	$1.427.904,00	4,00	$ 1.427.904,00			4,00	$ 1.427.904,00	0,00	$ -
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	32,40	$ 722.301,00	$23.402.552,00	0,00	$ -	15,00	$ 10.834.515,00	15,00	$ 10.834.515,00	17,40	$ 12.568.037,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	30,00	$ 286.800,00	$8.604.000,00	0,00	$ -	15,00	$ 4.302.000,00	15,00	$ 4.302.000,00	15,00	$ 4.302.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	20,00	$ 1.419.525,00	$28.390.500,00	0,00	$ -	10,00	$ 14.195.250,00	10,00	$ 14.195.250,00	10,00	$ 14.195.250,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	74,00	$ 6.730,00	$498.020,00	0,00	$ -			0,00	$ -	74,00	$ 498.020,00
1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	2957,97	$ 39.448,00	$116.686.065,00	2.957,97	$ 116.686.065,00			2.957,97	$ 116.686.065,00	0,00	$ -
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	67,33	$ 42.789,00	$2.880.983,00	0,00	$ -	33,67	$ 1.440.706,00	33,67	$ 1.440.706,00	33,66	$ 1.440.278,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA												
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	89,90	$ 156.008,00	$14.025.119,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.560.080,00	10,00	$ 1.560.080,00	79,90	$ 12.465.039,00
1,20	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia	78,00	$ 538.226,00	$41.981.628,00	78,00	$ 41.981.628,00		$ -	78,00	$ 41.981.628,00	0,00	$ -
1,21	Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion	M³	840,00	$ 48.190,00	$40.479.600,00	840,00	$ 40.479.600,00			840,00	$ 40.479.600,00	0,00	$ -

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 | FECHA DEL ACTA: 20/12/2024

CONTRATO DE OBRA No RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRAO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADDES No. 2 del 13 de diciembre de 2024						ACUMULADO EJECUTADO ACTA 1, 2 Y 3		ACTA PARCIAL No 4		EJECUTADO ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1,22	Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional)	M³	1193,33	$ 32.411,00	$38.677.019,00	1.193,33	$ 38.677.019,00			1.193,33	$ 38.677.019,00	0,00	$ -
1,23	Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal)	M²	117,60	$ 772.005,00	$90.787.788,00	117,60	$ 90.787.788,00			117,60	$ 90.787.788,00	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	38,45	$ 1.024.622,00	$39.396.716,00			35,10	$ 35.964.232,00	35,10	$ 35.964.232,20	3,35	$ 3.432.483,70
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	39,98	$ 95.039,00	$3.799.659,00			39,98	$ 3.799.659,00	39,98	$ 3.799.659,22	0,00	$ -
NP 03	GAVIONES	M2	60,0	$ 400.000,00	$24.000.000,00							60,00	$ 24.000.000,00
				Subtotal			$ 957.437.756,00		$ 99.660.343,00				
				Subtotal	***$1.129.999.206,00***						**$ 1.057.098.099,00**		**$72.901.107,00**
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.129.999.206,00**		**$ 957.437.756,00**		**$99.660.343,00**		***$ 1.057.098.099,00***		***$ 72.901.107,00***
	ADMINISTRACIÓN		25,00%		$ 282.499.802,00		$ 239.359.439,00		$24.915.086,00		$ 264.274.525,00		$ 18.225.277,00
	IMPREVISTOS		0,50%		$ 5.649.996,00		$ 4.787.189,00		$498.302,00		$ 5.285.490,00		$ 364.506,00
	UTILIDAD		4,50%		$ 50.849.964,00		$ 43.084.699,00		$4.484.715,00		$ 47.569.414,00		$ 3.280.550,00
	COSTO INDIRECTO DE LA OBRA				**$ 338.999.762,00**		**$ 287.231.327,00**		**$29.898.103,00**		***$ 317.129.429,00***		***$ 21.870.332,00***
	SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE										$ -		
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL				**$ 30.000.000,00**		**$ 25.000.000,00**				**$ 25.000.000,00**		**$5.000.000,00**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				**$ 1.782,00**								**$1.783,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 1.499.000.750,00**		**$ 1.269.669.083,00**		**$129.558.446,00**		**1.399.227.528,00**		**99.773.222,00**
							84,70%		8,64%		93,34%		6,66%

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

OMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R/L DE OMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

11. MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSTRUCTORES S.A.S


Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A.

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,07	Acero de refuerzo Grado 60	UNIDAD DE MEDIDA	KG	UBICACIÓN	CUCUTILLA

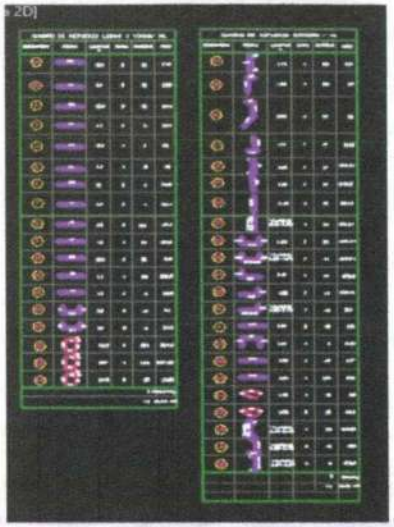





DETALLE	Dimensiones Diámetro					Total
Diámetro	# 4	# 5	# 7	# 8	Cant	
Kg / ml	1,00	1,6	3,04	4	(Und)	
1A				12,00	12,00	576
1B				6,00	12,00	288
2				12,00	12,00	576
3				8,50	6,00	204
4	12,00				8,00	96
5	6,00				8,00	48
6		12,00			4,00	76,8
7		6,00			4,00	38,4
8	0,45				108,00	48,6
9	4,80				96,00	460,8
10	12,00				55,00	660
10	5,50				55,00	302,5
11	4,80				6,00	28,8
12	3,00				18,00	54
13		3,00			6,00	28,8
14	6,75				40,00	270
15	1,95				40,00	78
16	2,55				40,00	102
17			4,10		34,00	423,78
18			6,85		34,00	708,02
19			2,00		34,00	206,72
20	11,40				64,00	729,6
21	11,16				28,00	312,48
22			6,40		68,00	1323,01
23			6,25		88,00	1672
24			3,40		88,00	909,57
25			4,05		38,00	467,86
26			3,85		36,00	421,34
27	1,20				16,00	19,2
28	3,50				84,00	294
29	2,80				380,00	1064
30	8,45				26,00	219,7
31				5,25	32,00	672
32				8,55	16,00	547,2
E1	3,22				104,00	334,88
E2	1,97				136,00	267,92
E3	2,35				15,00	35,25
E4	1,45				80,00	116
E5		1,85			30,00	88,8
A	112,00				2,00	224
						14994,03
Acero de transferencia Via						140
Acero cunetas						1548,78
Acero gradas disipadoras						101,53

Subtotal	1.790,31
Vienen DE ACTAS 1, 2 Y 3	14.994,03
TOTAL	16.784,34

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024						
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA	N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	UNIDAD DE MEDIDA	M³	UBICACIÓN	CUCUTILLA

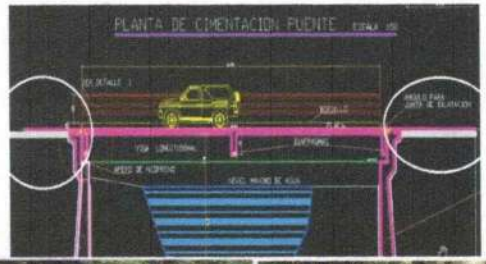





DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	4,50	4,90	0,20	2,00	8,82
Subtotal					8,82
Vienen					0,00
TOTAL					8,82

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR


Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024								
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS			
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A			
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	UNIDAD DE MEDIDA	M		UBICACIÓN	CUCUTILLA

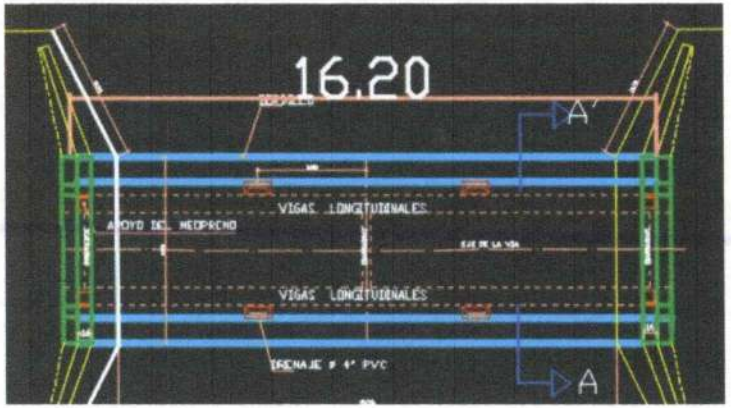

DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Longitud de la baranda. Por los dos costados		15,00		1,00	**15,00**

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	**ACTA PARCIAL N. 4**	**FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:**	**20 DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024	SUPERVISION	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	INTERVENTORIA	N.A

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,14	Base granular (INV. 330.1)	UNIDAD DE MEDIDA	M³	UBICACIÓN	CUCUTILLA



DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Base granular del pavimento	5,00	10,00	0,30		**15,00**

OBSERVACIONES:

Subtotal	**15,00**
Vienen	**0,00**
TOTAL	**15,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS	
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A	
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 245 kg/cm²-3500 psi e=0.20 m	UNIDAD DE MEDIDA	M²	UBICACIÓN: CUCUTILLA






DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	H(m)	Cant	Total
Losa de pavimento	5,00	10,00	0,20		**10,00**

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024								
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS			
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A			
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,18	Junta de dilatacion de 6 mm x 35 mm (Cortada, inducida y sellada)	UNIDAD DE MEDIDA	M		UBICACIÓN	CUCUTILLA

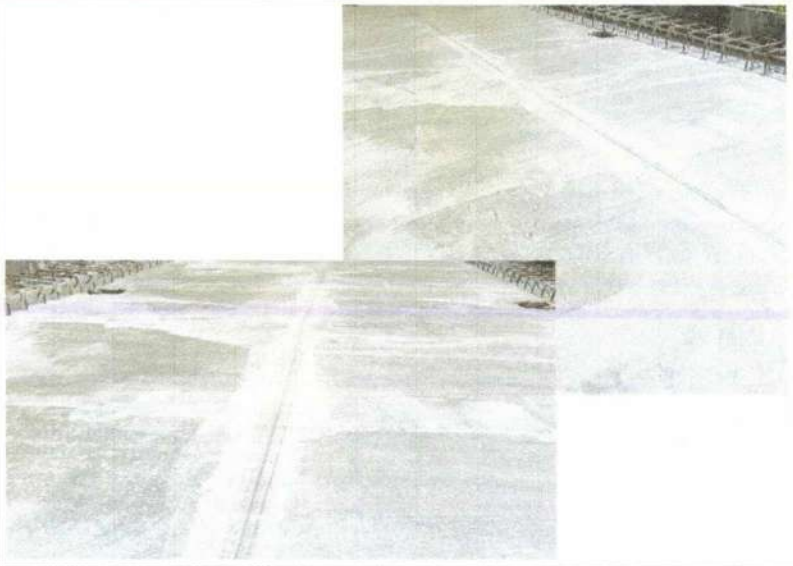

DETALLE	Dimensiones B(m)	L(m)	S(m)	Cant	Total
Puente	5,00	16,84	2,50		33,67
				Subtotal	33,67
				Vienen	0,00
				TOTAL	33,67

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024							
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024			SUPERVISION		WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S			INTERVENTORIA		N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	UNIDAD DE MEDIDA	M	UBICACIÓN	CUCUTILLA





DETALLE	Dimensiones B(m)	Dimensiones L(m)	Dimensiones S(m)	Cant	Total
Vía margen derecha - adyacente al talud		10,00			**10,00**

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL No. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024 — SUPERVISION — WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S — INTERVENTORIA — N.A

CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	ITEM	NP01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² paracunetas y gradas disipadora	UNIDAD DE MEDIDA	M3	UBICACIÓN	CUCUTILLA





DETALLE	Dimensiones B(m)	H(m)	AREA	L(m)	Total
CUNETAS					
CUNETA MARGEN TALUD	0,70	0,25	0,18	135,00	**24,30**
CUNETA MARGEN ESCUELA	0.70	0,25	0,18	60,00	**10,80**

OBSERVACIONES:

Subtotal	**35,10**
Vienen	**0,00**
TOTAL	**35,10**

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL No. 4	FECHA DEL ACTA CORRESPONDIENTE:	20 DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024									
CONTRATO No.	RE-SGRD-01885-2024				SUPERVISION			WILLIAM VERA ARIAS		
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S				INTERVENTORIA			N.A		
CAPÍTULO	PUENTE VEHICULAR	**ITEM**	**NP02**	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	**UNIDAD DE MEDIDA**	M3		**UBICACIÓN**	**CUCUTILLA**	





LONG	Dimensiones ANCHO	PROFUN	VOL (M3)	CANT	Total
195	0,70	0,25	34,13		**34,13**
195	0,20	0,15	5,85		**39,98**

OBSERVACIONES:

Subtotal	**39,98**
Vienen	**0,00**
TOTAL	**39,98**

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

12. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

CONSTRUCTORES S.A.S

En mi calidad de Revisor fiscal - Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional No. 197156-T emitida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

QUE: El Sr. **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía N° 88.279.674 representante legal de la empresa **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS** identificado con NIT 901.266.624-6, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social según el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y Ley 828 de 2003 y se encuentra al día a la fecha del presente documento, en cuanto a salud, riesgos laborales pensiones y aportes a cajas de compensación para el contrato RE-SGRD-01885-2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Se expide a los ocho (20) días del mes de diciembre de 2024 a solicitud del interesado

FRANKI GERARDINO SALCEDO
REVISOR FISCAL
T.P. 197156-T
C.C 1.091.162.693

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.162.693
GERARDINO SALCEDO

APELLIDOS
FRANKI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-ABR-2008 TEORAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL



P-2509100-01140672-M-1091162693-20200605 0070862572A 1 9912306584

Escaneado con CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197156-T
FRANKI
GERARDINO SALCEDO
C.C. 1091162693
RESOLUCION INSCRIPCION 1519
FECHA 14/11/2014
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
209425


198644
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 0 B D 0 8 E 0 3 C D B 8 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANKI GERARDINO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091162693 de TEORAMA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901731704	1	CONSTRUCTORA INCONORT SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-673	CARRERA 4 0E 42		5760851			CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31438636	E	2024-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.849.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	31438636	2024-11-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5440698	IBAÑEZ CONTRERAS PEDRO PABLO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
2	CC 5440870	IBAÑEZ CONTRERAS ISIDRO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
3	CC 13492157	PALENCIA RIVERA LUIS ORLANDO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
4	CC 13492314	BLANCO PARRA ASCENCION	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
5	CC 88145288	GARCIA MONCADA DANIEL	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
6	CC 88145927	LUCIANO SUAREZ MARCO ANTONIO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
7	CC 88171326	FLOREZ VEGA EDILBERTO	1.300.000	F	X														0				11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	476.667	76.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	476.667	19.100	COMFANORTE-CCF37	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.700	S	5429001
8	CC 88233087	COLLANTES CHAUSTRE JUAN RAMÓN	1.300.000	F	X														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
9	CC 88240965	SANCHEZ SANCHEZ ALEXANDER	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
10	CC 88312157	GELVES VALERO JOSE FERNEY	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
11	CC 1005011574	ORTEGA GELVES BRAYAN SNEYFFER	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
12	CC 1005011706	MONCADA ORTEGA CIRO ALFONSO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
13	CC 1093412156	GARCIA GELVES VICTOR DANILO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
14	CC 1093412663	PEREZ URBINA MIGUEL ALEXIS	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
15	CC 1093413878	GARCIA GELVES JHOEDISON DEYMAR	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
16	CC 1093413879	ORTEGA MONTES ERICKSSON STEVEN	1.300.000	F	X														0				5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	216.667	8.700	COMFANORTE-CCF37	216.667	8.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	67.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901731704	1	CONSTRUCTORA INCONORT SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-673	CARRERA 4 0E 42		5760851			CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31436636	E	2024-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.849.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	31436636	2024-11-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.893.334	18.893.334	18.893.334	18.893.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	3.023.000	0	0	0	3.023.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.116.300	0	0	0	1.116.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.698.700	0	0	0	1.698.700
EPS(Administradoras: 7)				16	755.800	0	0	0	755.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	7	320.700	0	0	0	320.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	104.000	0	0	0	104.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	156.000	0	0	0	156.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.100	0	0	0	19.100
ARP(Administradoras: 1)				16	1.315.300	0	0	0	1.315.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	1.315.300	0	0	0	1.315.300
CCF(Administradoras: 1)				16	755.800	0	0	0	755.800
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	16	755.800	0	0	0	755.800
Gran Total					5.849.900	0	0	0	5.849.900

CONSTRUCTORES S.A.S

13. INFORME DE CONTRATISTA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

INFORME PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.04 DE OBRA DE FECHA 20 DICIEMBRE DE 2024

PERIODO: 11 DE DICIEMBRE DE 2024 A 20 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
Nit. 901.266.624-6
R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. No. 88.279.624 DE OCAÑA

CONTRATANTE:

SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta – Norte de Santander

DICIEMBRE DE 2024

CONSTRUCTORES S.A.S

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2022 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Cucutilla, específicamente en la vía que comunica al municipio con la vía nacional de la ruta Pamplona - Bucaramanga. Actualmente la población de la zona rural y de la cabecera municipal se ve afectada en el desplazamiento, debido al colapso de un box Culvert, que por causa de las fuertes lluvias que hicieron presencia en esta zona geográfica se deterioró hasta ocasionar su colapso.

La siguiente imagen muestra la localización del municipio de Cucutilla en Colombia, y la ubicación de la obra

.

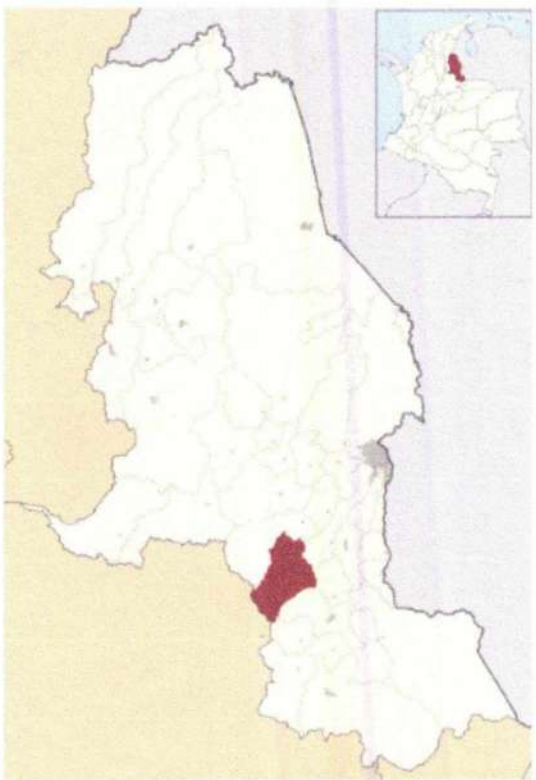


Ilustración No 1: *Localización de la obra a nivel Nacional y Departamental – fuente Wikipedia*

CONSTRUCTORES S.A.S



ilustración no 2: área de intervención del contrato de obra- fuente: consultoría

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas importantes, etc.

Información Contractual **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024	OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024	
	VALOR CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.499.000.749,00)	
	CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS	**R/L** IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
	NIT Y C.C.	**NIT.** 901-266-624-6	**CC No.** 88.279.624 DE OCAÑA
	SUPERVISOR	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024.	
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	No. 00 000079 de Fecha 26 julio de 2024	

CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024	PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL	No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024
	FECHA DE INICIO	10 de septiembre de 2024
	PLAZO PACTADO CONTRATO PRINCIPAL	Cuatro (04) Meses
	PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes y Quince (15) días
	PLAZO TOTAL	Cinco (5) meses y Quince (15) días
	ACTA DE MODIFICACION	Acta de modificación de cantidades #1 del 28 de octubre de 2024
		Acta de modificación de cantidades #2 del 13 de diciembre de 2024
	% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	8,64%
	% EJECUTADO ACUMULADO	93,34%

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

A LA FIRMA DEL CONTRATO

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 30/08/2024 Fecha de aprobación: 09/09/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	29/08/2024 al 28/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	29/08/2024 al 28/12/2027

	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Cinco años, 0 meses y 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101238693 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 30/08/2024 Fecha de aprobación: 09/09/2024	**Valor asegurado**		**Vigencia**
	$260.000.000		18/06/2024 al 18/08/2024

A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.2 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 07/10/2024 Fecha de aprobación: 08/10/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	10/09/2024 al 10/05/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	10/09/2024 al 09/01/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Cinco años, 0 meses y 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101238693 Anexo No.2 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 07/10/2024 Fecha de aprobación: 08/10/2024	**Valor asegurado**		**Vigencia**
	$260.000.000		10/09/2024 al 10/01/2025

CONSTRUCTORES S.A.S

A LA FIRMA DEL PRORROGA #1

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.3 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 17/12/2024 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	10/09/2024 al 25/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	10/09/2024 al 25/02/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Cinco años, 0 meses y 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101238693 Anexo No.3 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 17/12/2024 Fecha de aprobación: 17/12/2024	**Valor asegurado**		**Vigencia**
	$260.000.000		10/09/2024 al 25/02/2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relacionan los actos administrativos del **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
ACTA DE INICIO	10 Septiembre de 2024
ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1	08 Octubre de 2024
ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2	05 Noviembre de 2024
ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3	10 Diciembre de 2024
ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	20 Diciembre de 2024

CONSTRUCTORES S.A.S

ASPECTOS FINANCIEROS

Anticipos, Actas parciales y/o Acta Final

ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-CDGRD- 04093-2022 SUSCRITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022:

Para la ejecución de este contrato de obra no se contó con recursos de anticipo.

Avance Financiero	Valor contractual	Parcial No. 1	Parcial No. 2	Parcial No. 3	Parcial No. 4	Valor restante por ejecutar
VALOR CONTRATO	$ 1.499.000.749		-	-		
VALOR ACTA No. 1		$ 449.654.942,00				
VALOR ACTA No. 2			$523.667.735			
VALOR ACTA No.3				$296.346.405		
VALOR ACTA 4 A COBRAR					$129.558.446,00	
Total	$ 1.499.000.749		-	-		$99.773.222,00

ASPECTOS TECNICOS

- **Actas de obra:**

A corte de este informe se proyecta el trámite Acta Parcial de Obra No. 04 De fecha 20 de diciembre de 2024 al Contrato de Obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, con las actividades ejecutadas a la fecha.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el desarrollo de la obra, para el periodo del **11 de diciembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024**, se ejecutaron los siguientes ítems del contrato, sus cantidades y avances se describen en la tabla que se relaciona a continuación los cuales cumplieron con los requerimientos y exigencias solicitados por la supervisión.

ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	**PUENTE VEHICULAR**					
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16784,34	$ 10.385,00	1.790,31	$ 18.592.369,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 1.419.525,00	8,82	$ 12.520.211,00

CONSTRUCTORES S.A.S

1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	32,40	$ 722.301,00	15,00	$ 10.834.515,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	30,00	$ 286.800,00	15,00	$ 4.302.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	20,00	$ 1.419.525,00	10,00	$ 14.195.250,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	67,33	$ 42.789,00	33,67	$ 1.440.706,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA					
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	89,90	$ 156.008,00	10,00	$ 1.560.080,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	38,45	$ 1.024.622,00	35,10	$ 35.964.232,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	39,98	$ 95.039,00	39,98	$ 3.799.659,00
				Subtotal		$ 99.660.343,00
				Subtotal		

CONSTRUCTORES S.A.S

COSTO DIRECTO DE LA OBRA			**$99.660.343,00**
ADMINISTRACIÓN	25,00%		$24.915.086,00
IMPREVISTOS	0,50%		$498.302,00
UTILIDAD	4,50%		$4.484.715,00
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA			**$29.898.103,00**
SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE			
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			**$129.558.446,00**
Porcentaje de obra acumulado en el periodo informado			8,64%

Dadas las condiciones climatológicas debido al incremento en las precipitaciones en la zona de ejecución del contrato de obra el normal avance y ejecución de las actividades se vio afectado por la imposibilidad de ejecutar actividades constructivas por la presencia de lluvias en el sector. Durante las tres primeras semanas del mes de noviembre las lluvias han aumentado en frecuencia, duración e intensidad lo que ha incrementado el cese de actividades afectando así de forma directa el desarrollo de la obra y los tiempos contractuales para su ejecución, por ello durante el periodo reportado en el presente informe los rendimientos y las obras ejecutadas son menores a los programados, siendo esto un hecho no imputable a la responsabilidad del contratista.
Hecho por el cual se solicitó prorroga #1 al contrato, la cual fue aprobada por la supervisión del contrato por un periodo de un (1) mes y quince (15) días

De igual manera durante el incremento de las precipitaciones se pudo evidenciar la necesidad de realizar unas obras complementarias, por lo que una vez terminadas las actividades de levantamiento topográfico y teniendo en cuenta lo evidenciado en campo durante el incremento de las precipitaciones en la zona se determinó la necesidad de construir 195 mt de cunetas en concreto reforzado de 3000 PSI distribuidos en 135 mt en la margen aledaña al talud y 60 mt en la margen del costado de la escuela, que permitirán desde la última alcantarilla existente conducir el agua hasta el punto de entrega determinado en campo, esto para el caso de las cunetas construidas en el costado del talud y en el costado contrario 60 mts de cuneta reforzada entregaran las aguas a una gradas disipadoras con el ánimo de evitar situaciones de erosión sobre los rellenos del puente y sobre la cimentación de los estribos, así mismo, se construirán 29,90 mt lineales de filtro adicionales a los 60 mt ya contratados en las condiciones iniciales del contrato de obra, adicionalmente a lo ya descrito surge la necesidad de realizar la construcción de un muro en gaviones (60 m2) que permitan la contención de los rellenos realizados en la parte

posterior de los estribos del puente esto con el fin de garantizar el soporte de los estribos y la contención de los rellenos efectuados para tal fin.

Una vez determinadas las actividades constructivas necesarias para dar manejo a la situación evidenciada en campo durante el incremento de las precipitaciones en la zona, (hechos ya descritos en el párrafo inicial), se realizó un balance financiero que dado la imposibilidad de tener recursos adicionales para la ejecución de estas nuevas obras complementarias obligo a realizar un replanteo sobre el alcance del contrato determinado en el acta de modificación de cantidades No. 02 al contrato de obra en mención.

Es así, como es necesario realizar una modificación al alcance del contrato en lo que respecta a la losa de pavimento en concreto resistencia 4500 PSI ya que inicialmente se encontraba contratados 30 ml lineales de losa a cada lado del puente, dicha modificación se requiere con el ánimo de poder asignar estos recursos necesarios para la construcción de las obras complementarias descritas en el párrafo anterior las cuales son fundamentales para garantizar el manejo de las aguas lluvias sobre la vía y proteger de una posible socavación la estructura de cimentación del puente,

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se requiere suscribir al presente contrato el acta de modificación de cantidades No.02 en la que se determinen las siguientes condiciones actualizadas del contrato

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS ACUMULADAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME

MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 13 DEDICIEMBRE DE 2024						CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	+ -	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	**PUENTE VEHICULAR**						
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2				285,36	$ 1.935.026,00
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m.	M3				1.871,25	$ 61.693.241,00

CONSTRUCTORES S.A.S

1,03	Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3				38,35	$	28.711.955,00
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3				89,49	$	127.033.292,00
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3				94,44	$	143.455.493,00
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3				34,83	$	49.442.056,00
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	+	531,32	5.517.758,00	16.784,34	$	174.305.371,00
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactación en capas de 30 cm.	M3				1.004,60	$	42.266.536,00
1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND				4,00	$	9.246.880,00
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M				9,80	$	4.351.592,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3				8,82	$	12.520.211,00
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes	UND				4,00	$	1.427.904,00

CONSTRUCTORES S.A.S

	(con rejilla 0.15 x 0.45 m)							
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M				32,40	$	23.402.552,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	-	60,00	17.208.000,00	30,00	$	8.604.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	-	40,00	56.781.000,00	20,00	$	28.390.500,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	-	80,00	538.400,00	74,00	$	498.020,00
1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3				2.957,97	$	116.686.065,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	-	66,67	2.852.743,00	67,33	$	2.880.983,00

CONSTRUCTORES S.A.S

ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	PUENTE VEHICULAR			
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2	285,36	$ 1.935.026,00
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m.	M3	1.871,25	$ 61.693.241,00
1,03	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3	38,35	$ 28.711.955,00
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	89,49	$ 127.033.292,00
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3	94,44	$ 143.455.493,00
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3	34,83	$ 49.442.056,00
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16.784,34	$ 174.305.371,00
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm.	M3	1.004,60	$ 42.266.536,00
1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND	4,00	$ 9.246.880,00
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M	9,80	$ 4.351.592,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 12.520.211,00
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m)	UND	4,00	$ 1.427.904,00
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	15,00	$ 10.834.515,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	15,00	$ 4.302.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	10,00	$ 14.195.250,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	0,00	$ -

CONSTRUCTORES S.A.S

1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	2.957,97	$ 116.686.065,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	33,67	$ 1.440.706,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA			
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	10,00	$ 1.560.080,00
1,20	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia	78,00	$ 41.981.628,00
1,21	Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion	M^3	840,00	$ 40.479.600,00
1,22	Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional)	M^3	1.193,33	$ 38.677.019,00
1,23	Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal)	M^2	117,60	$ 90.787.788,00
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	35,10	$ 35.964.232,20
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	39,98	$ 3.799.659,22
NP 03	GAVIONES	M2		
				$ 1.057.098.099,00

COSTO DIRECTO DE LA OBRA		***$ 1.057.098.099,00***
ADMINISTRACIÓN		$ 264.274.525,00
IMPREVISTOS		$ 5.285.490,00
UTILIDAD		$ 47.569.414,00
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA		***$ 317.129.429,00***
SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE		**$ -**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL		**$ 25.000.000,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**1.399.227.528,00**
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:		93,34%

CONSTRUCTORES S.A.S

DESCRIPCIÓN FINANCIERA EJECUTADA SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 03 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

Concepto:	Acta Parcial No.01	Acta Parcial No.02	Acta Parcial No.03	Acta Parcial No.04	Pendiente por ejecutar
Fecha:	08 Agosto de 2024	05 noviembre de 2024	10 diciembre de 2024	20 diciembre de 2024	
Valor del contrato:	$ 1.499.000.749	$ 1.499.000.749	$ 1.499.000.749	$ 1.499.000.749	
Valor ejecutado según acta parcia	$ 449.654.942,00	$523.667.735,0	$ 296.346.405,00	$129.558.446,00	$ 99.773.222,00
% de ejecución del acta:	30,00 %	34,93%	19,77%	8,64%	6,66%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					$1793,00
% de ejecución acumulado a la fecha:	30,00 %	64,93%	84,70%	93,34%	6,66%%

AVANCE DE TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION : 4 Meses
PLAZO ADICIONAL 1 MES y 15 DÍAS
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO : 102 Dias
AVANCE PORCENTUAL :**102 Dias trabajados / 168 Total Dias: 60,71 %**

Manejo del personal para la obra

La firma contratista hizo llegar cada una de las afiliaciones del personal que está en campo realizando las actividades y ejecutando los ítems del contrato.

PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

Se realizó cada una de las afiliaciones del personal y estas mismas afiliaciones fueron entregadas al supervisor del contrato.

En el desarrollo del contrato se realizó seguimiento permanente de los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales laborales) del personal que participó en la ejecución del contrato.

Se anexa el pago de seguridad social de los empleados y del contratista.

CONSTRUCTORES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

A corte de este informe el contratista contó con la siguiente maquinaria y equipos en obra:

- Rana, vibrador para concreto, Carmix, motobomba

CONTROL DE CALIDAD

Sobre los concretos empleados en obra, previo al inicio de las actividades de preparación y vaciado de concreto, se realizaron los diseños de mezclas para las resistencias requeridas en obra según las especificaciones técnicas del proyecto, una vez se dan inicio a las actividades constructivas relacionados con concreto construcción de zarpas, estribos y estructura de puente, se tomaron muestras de concreto ara ser ensayadas a los 7 , 14 y 28 días, dichos resultados serán entregados a la entidad contratante en los soportes del acta parcial No. 4 y en ellos se evidencia que si se dio cumplimiento en cada uno de los concretos empleados en obra de las resistencias requeridas, dado que las resistencias obtenidas de las muestras de concreto alcanzaron la resistencia de diseño.


CONCLUSIONES

El contratista cuenta con un avance de ejecución de obra acumulado a corte del 20 de diciembre de 2024 del 93,34%, en cuanto al tiempo estipulado para el desarrollo de las actividades constructivas derivadas del objeto contractual se encuentra en un 60,71% del tiempo contractual, dadas las condiciones climatológicas en la zona de ejecución del contrato debido al incremento en la precipitaciones, se ha visto afectado el normal desarrollo y ejecución de las actividades constructivas contractuales, esto debido a los ceses de trabajo que se han tenido que realizar a consecuencia de las lluvias.
El contratista mediante el presente informe soporta el pago de la presente Acta Parcial de Obra No. 04 de fecha 20 de diciembre de 2024 al Contrato de obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 por valor: **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 296.346.405,00)**


IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
Nit.. 901266.624-6
R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
C.C. No. 88.279.624
CONTRATISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACERO DE REFUERZO GRADO 60. cantidad ejecutada (1790,31 Kg)

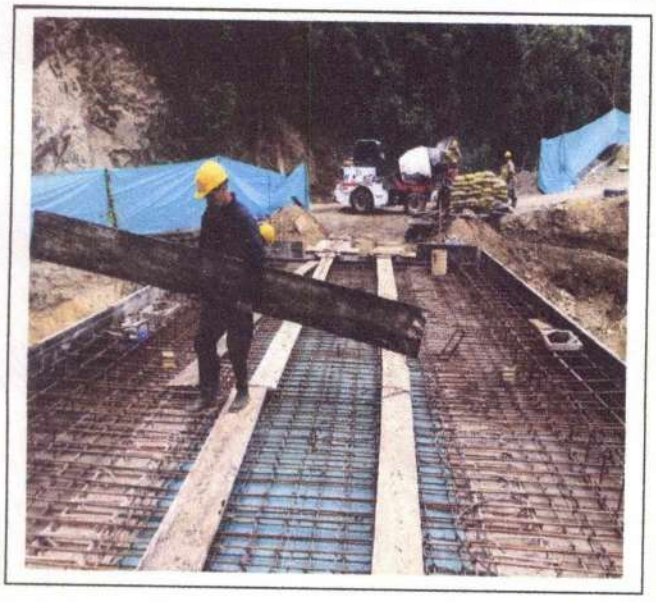





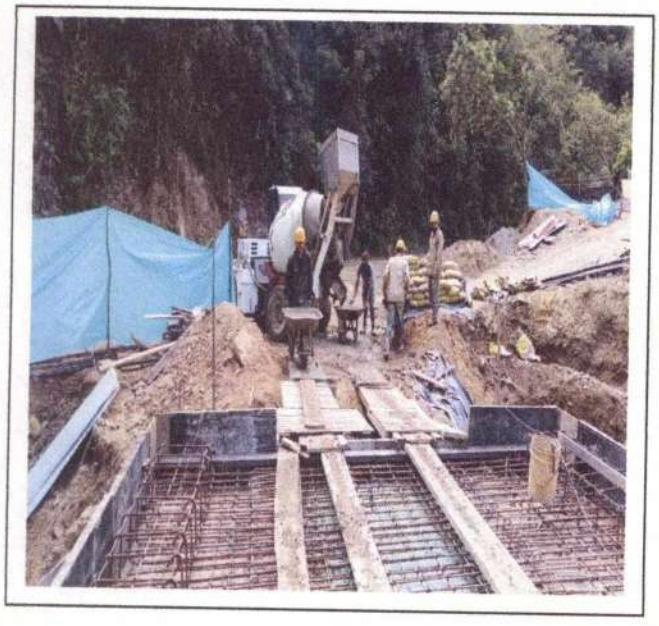





PLACA DE APROXIMACION CONCRETO DE 4000 PSI cantidad ejecutada (8,82 m3)

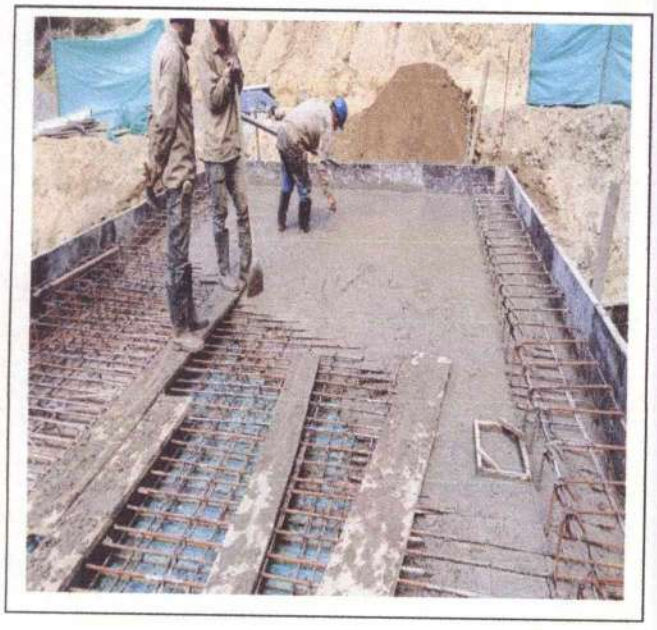


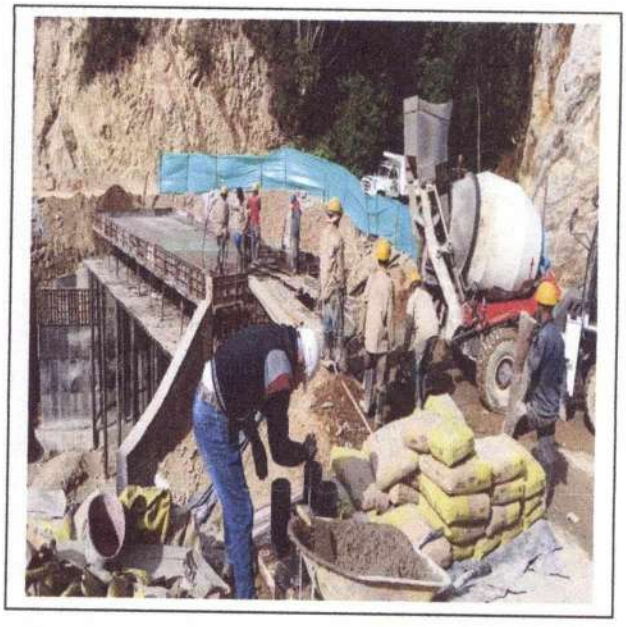


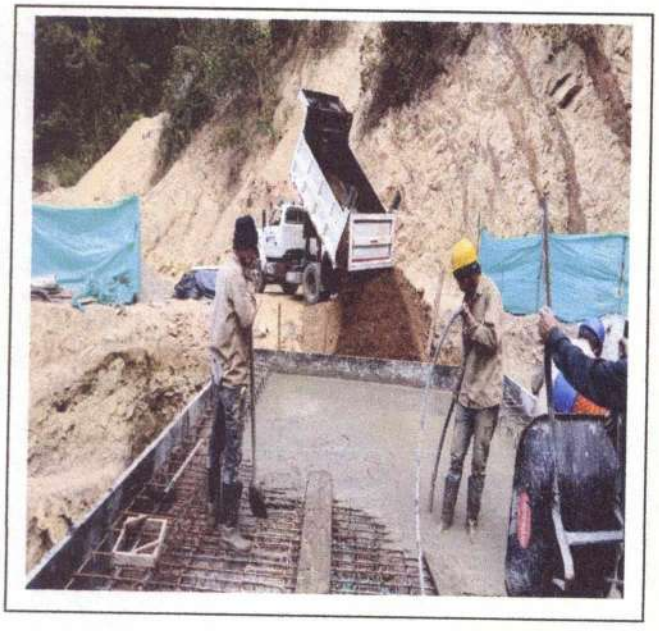

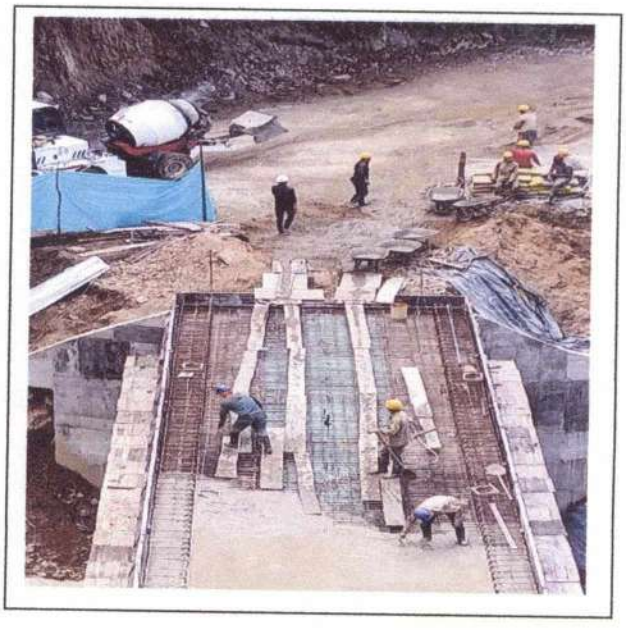



BASE GRANULAR cantidad ejecutada (15 M3)

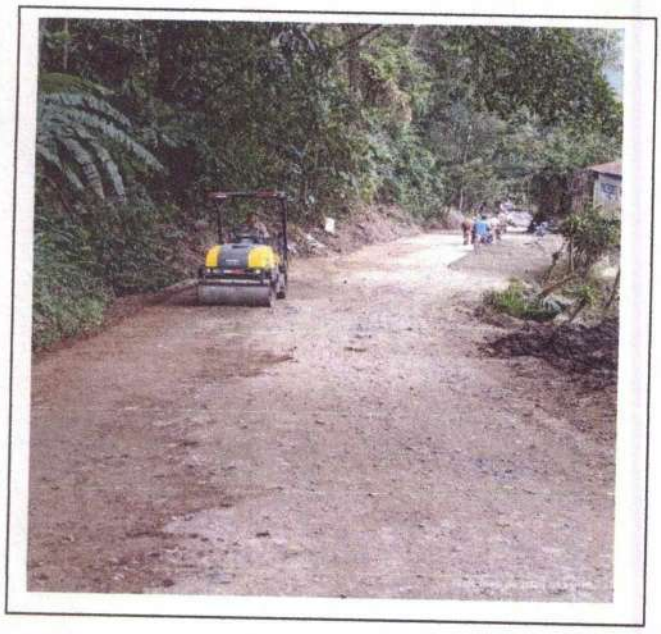

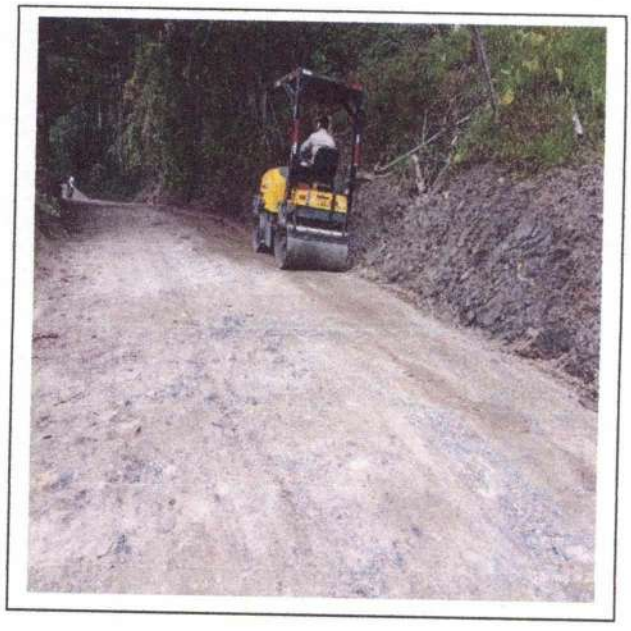

LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 4500 PSI: cantidad ejecutada (10 M3)

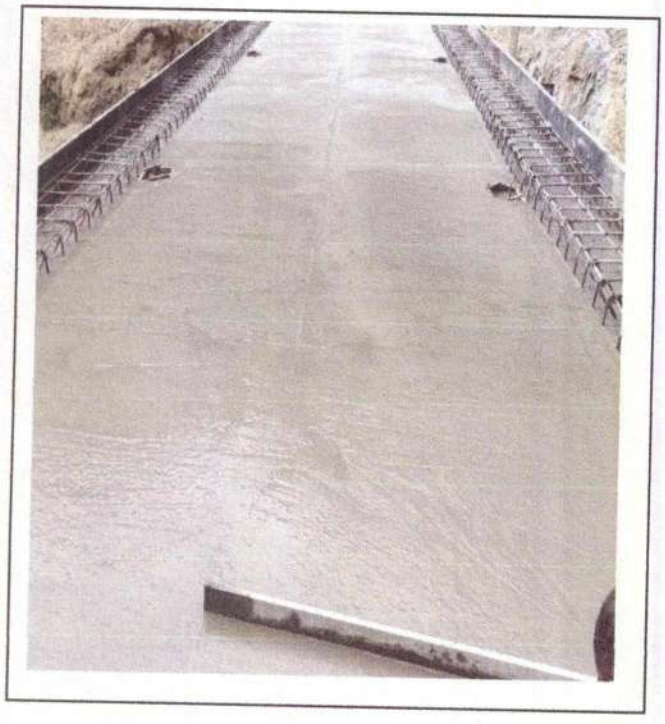

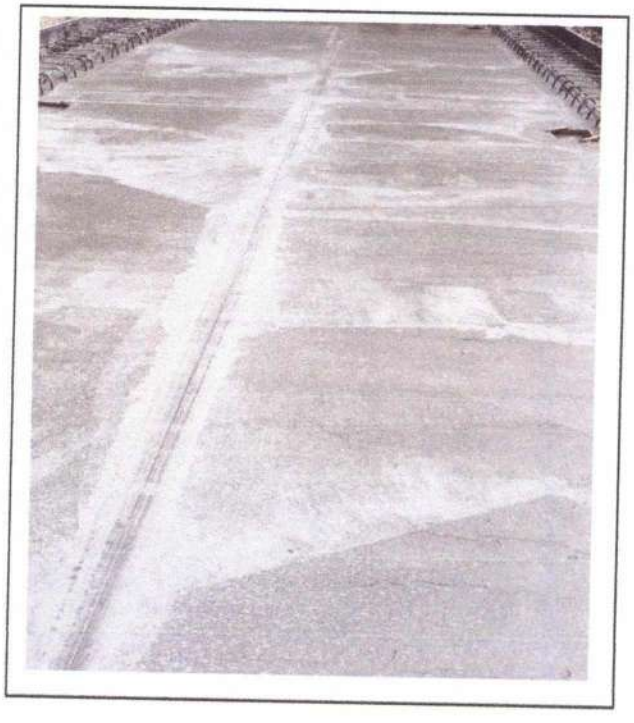

JUNTA DE DILATACION cantidad ejecutada (33,67 ml)





SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN: cantidad ejecutada (10 M)





CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS, cantidad ejecutada (35,10 m3)





CONSTRUCTORES S.A.S

14. INFORME DE SUPERVISION

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 6	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA :	20 de diciembre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	RE-SGRD- 01885-2022 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
C.C. o N.I.T.	901-266-624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C	88.279.624
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749
VALOR ADICIONAL CONTRATO	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) Meses
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes y Quince (15) días
PLAZO TOTAL	Cinco (05) Meses y Quince (15) días
FORMA DE PAGO	El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749,** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000079 del 26 de julio de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024	
SUPERVISOR	WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024.	
INTERVENTOR EXTERNO	-	
ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	-	
ACTA DE REINICIO	-	
ACTAS PARCIALES DE OBRAS	-	**FECHA**
	ACTA PARCIAL DE OBRA #1	08 DE OCTUBRE DE 2024
	ACTA PARCIAL DE OBRA #2	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
	ACTA PARCIAL DE OBRA #3	10 DE DICIEMBRE DE 2024
	ACTA PARCIAL DE OBRA #4	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTAS DE MODIFICACIÓN	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024	
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	ACTA DE APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024	

RELACIÓN DE GARANTÍAS

	Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencia**
Garantía Única. No. 21-44-101449740 Anexo No.3 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición: 17/12/2024 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 149.991.068,10	10/09/2024 al 25/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 74.995.534,05	10/09/2024 al 25/02/2028

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 149.991.068,10	Cinco años, 0 meses y 0 días
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101238693 Anexo No.3 Aseguradora: Seguros del Estado S.A Fecha de Expedición:17/12/2024 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia
	Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000	10/09/2024 al 10/01/2025

2. ESTADO FINANCIERO				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR ACTA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR PAGADO**
ACTA PARCIAL No. 1	**08 DE OCTUBRE DE 2024**	$ 449.654.942,00		
ACTA PARCIAL No. 2	**05 DE NOVIEMBRE DE 2024**	$523.667.735,00		
ACTA PARCIAL No. 3	**10 DE DICIEMBRE DE 2024**	$296.346.405,00		
ACTA PARCIAL No. 4	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**	$129.558.446,00	**EN TRAMITE**	

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.499.000.749
ACTA PARCIAL No.01 DE FECHA 03 OCTUBRE DE 2024	$ 449.654.942,00
ACTA PARCIAL No.02 DE FECHA 05 NOVIEMBRE DE 2024	$ 523.667.735,00
ACTA PARCIAL No.03 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024	$296.346.405,00
ACTA PARCIAL No.04 DE FECHA 20 DICIEMBRE DE 2024	$129.558.446,00
SALDO POR EJECUTAR	**$** 99.773.222,00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el periodo reportado en el presente informe se logró dar continuidad al proceso constructivo del puente mediante la ejecución de las actividades reportadas en el cuadro expuesto a continuación

Las obras ejecutadas durante el periodo reportado en acta parcial #4 que corresponde desde el 11 de diciembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024 y están descritas en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	**PUENTE VEHICULAR**					
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	16784,34	$ 10.385,00	1.790,31	$ 18.592.369,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3	8,82	$ 1.419.525,00	8,82	$ 12.520.211,00
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M	32,40	$ 722.301,00	15,00	$ 10.834.515,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	30,00	$ 286.800,00	15,00	$ 4.302.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	20,00	$ 1.419.525,00	10,00	$ 14.195.250,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	67,33	$ 42.789,00	33,67	$ 1.440.706,00
	OBRAS COMPLEMENTARIA					
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	89,90	$ 156.008,00	10,00	$ 1.560.080,00

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	38,45	$ 1.024.622,00	35,10	$ 35.964.232,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	39,98	$ 95.039,00	39,98	$ 3.799.659,00
				Subtotal		$ 99.660.343,00
				Subtotal		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA						**$99.660.343,00**
ADMINISTRACIÓN				25,00%		$24.915.086,00
IMPREVISTOS				0,50%		$498.302,00
UTILIDAD				4,50%		$4.484.715,00
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA						**$29.898.103,00**
SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE						
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL						
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$129.558.446,00**
Porcentaje de obra acumulado en el periodo informado						8,64%

Alcanzando un porcentaje en ejecución de actividades constructivas contractuales durante el periodo reportado en el presente informe de periodo desde el 11 de diciembre de 2024 con corte al 20 de diciembre de 2024 de 8,64% lo que implica un acumulado de ejecución de obra desde la firma del acta de inicio a la fecha de corte 20 de diciembre de 2024 de un 93,34% en ejecución de obra en un tiempo transcurrido de 92 días lo que representa un 60,71% del tiempo contractualmente estipulado para la ejecución de la obra, dadas las condiciones de clima en la zona debido al incremento de las precipitaciones en la región la normal ejecución de las actividades constructivas se ha visto afectada debido a los ceses de trabajos que se han generado debido al aumento en frecuencia, intensidad y duración de las lluvias en el sector.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL No.04 – 20 DICIEMBRE DE 2024

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAN VERA ARIAS con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de Cúcuta en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra No RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, **CERTIFICO** que:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO en calidad de Representante Legal de la IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **11 DE DIIEMBRE DE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 y** pagar es la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 129.558.446,00) correspondiente al pago Acta Parcial No. 04 del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

Supervisor
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO SGRD

Contratista
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
R.L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Edgar Fabian Labrador Valcárcel**	**Ing. Civil Contratista**	**10-12-2024**
Revisión jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Juridica Externa**	**10-12-2024**
Aprobación Jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Juridica Externa**	**10-12-2024**
Revisión área técnica:	**William Vera Arias**	**Secretario SGRD**	**10-12-2024**

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACERO DE REFUERZO GRADO 60. cantidad ejecutada (1790,31 Kg)













PLACA DE APROXIMACION CONCRETO DE 4000 PSI cantidad ejecutada (8,82 m3)

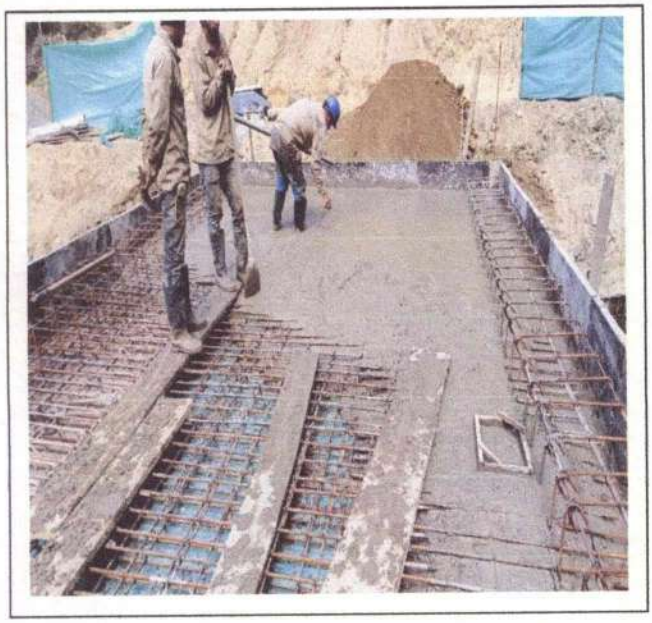


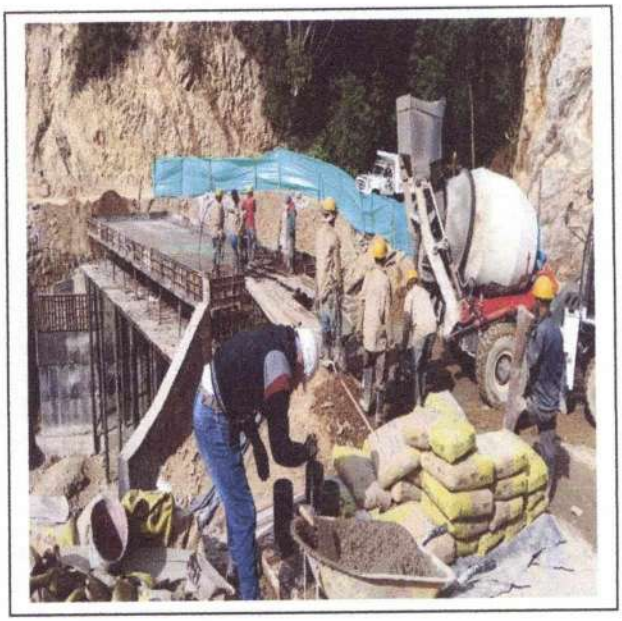


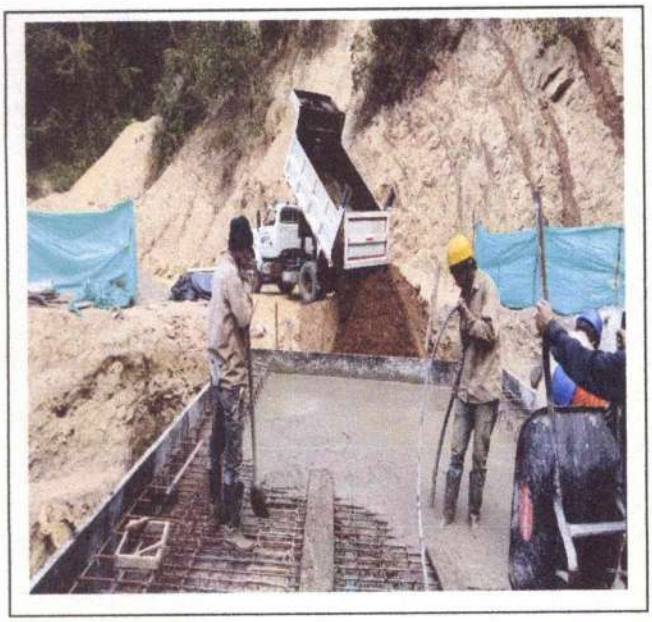

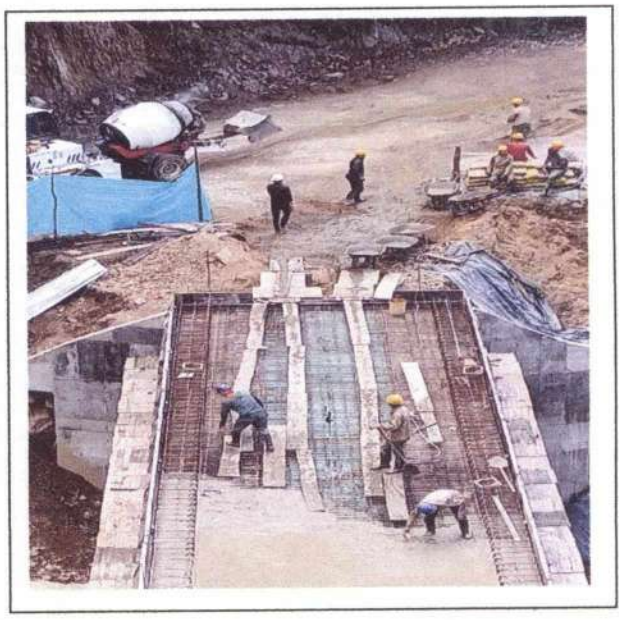


BASE GRANULAR cantidad ejecutada (15 M3)

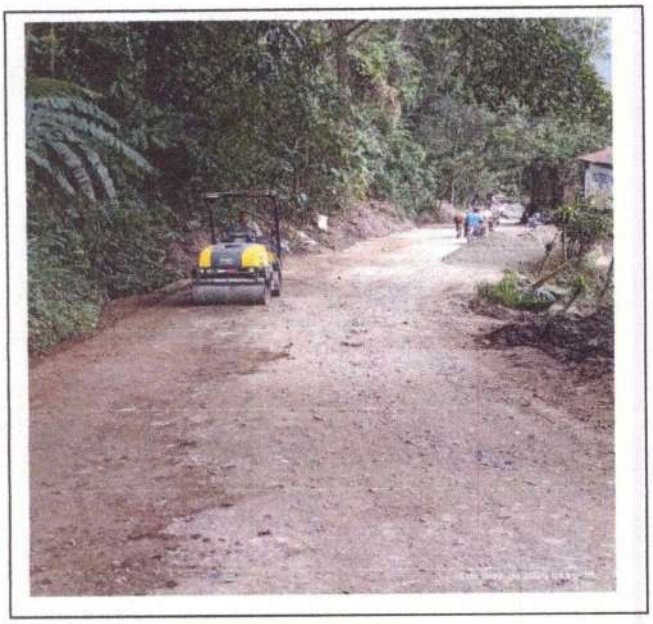

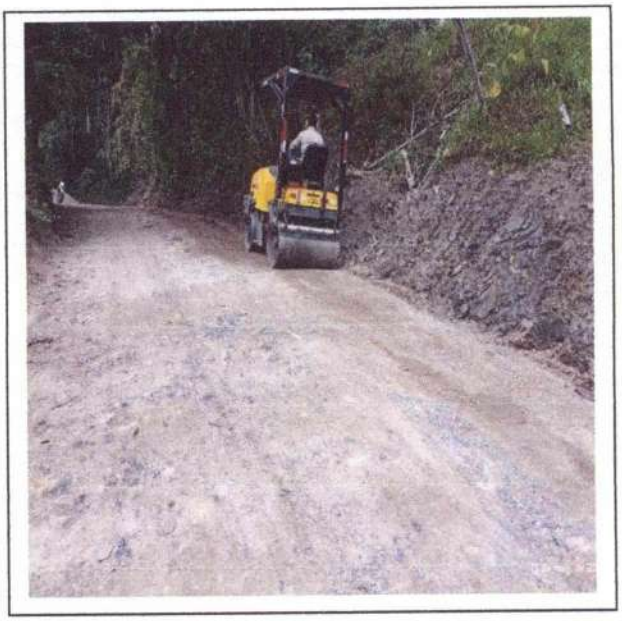


LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 4500 PSI: cantidad ejecutada (10 M3)

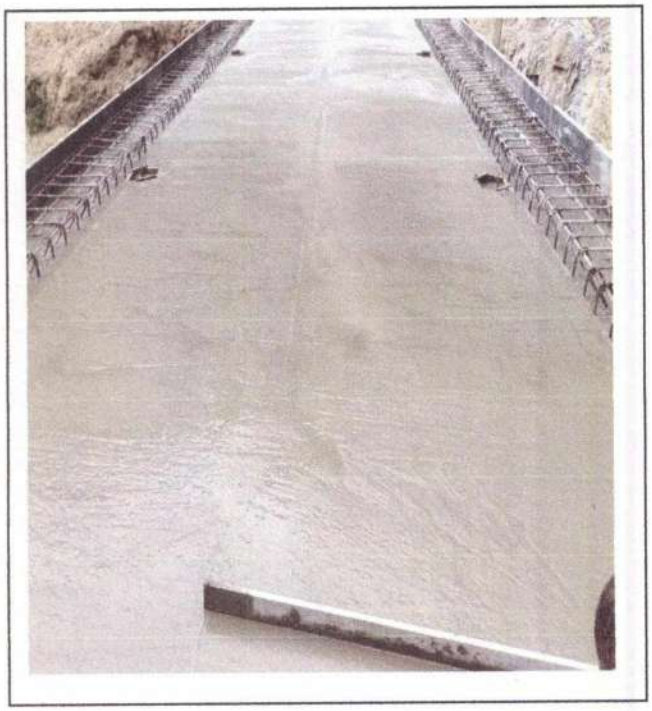



JUNTA DE DILATACION cantidad ejecutada (33,67 ml)



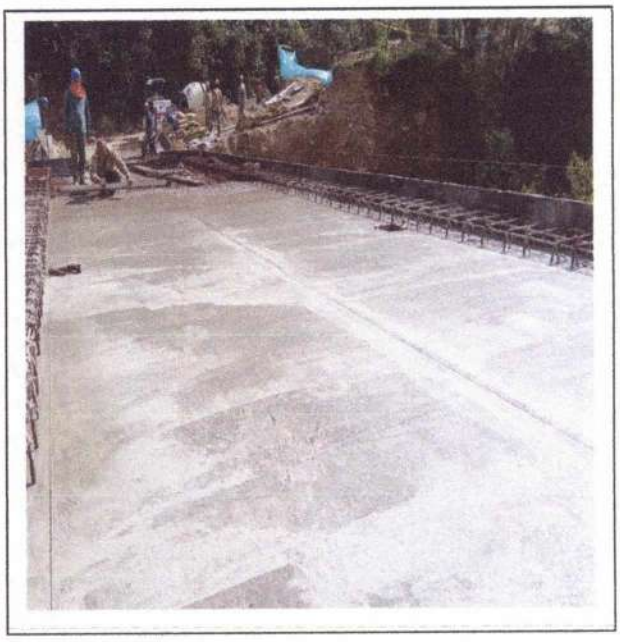

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN: cantidad ejecutada (10 M)





CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS, cantidad ejecutada (35,10 m3)





15. BITACORA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

SABADO 23 NOVIEMBLE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES:

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1).
- (SST.) (1)
- MAESTRO G/RAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (3)
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1).

H Y E:
- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA.
- VOLQUETA. SAC-H9.
- VIBROCOMPACTADOR
- EQUIPO TOPOGRAFIA.
- TRONZADORA.
- PULIDORA
- H Y E MENOR.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- SOLDADURA 6013-7018.
- FORMALETA METALICA.
- COSTALES.

CLIMA:
- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (3:00 - 5:00 PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- RELLENO SELECCIONADO
- OBRA FALSA.
- CHARLA SST.
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

LUNES 25 NOVIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1)

H Y E:

- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- TRONZADORA.
- PLANCHA
- H Y E MENOR

MATERIALES:

- COSTALES
- ACPM.
- ACERO VARILLA
- ALAMBRE NEGRO.

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON
- RELLENO SELECCIONADO
- ACERO REFUERZO. VIGAS
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MARTES 26 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO CIVIL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (3)
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1)

H Y E:

- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA.
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- TRONTADORA
- PULIDORA
- H Y E MENOR.

MATERIALES:

- COSTALES
- ACPM.
- ACERO VARILLA
- ALAMBRE NEGRO
- COSTALES.

CLIMA:

- SOLEADO AM.
- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (2:00 PM : 5:00 PM).

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS.
- DANILON
- RELLENO SELECCIONADO
- ACERO REFUERZO. VIGAS.
- CHARLA SST.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

MIERCOLES 27 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN OBRAS

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST. (1)
- MAESTRO EBAN (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR (1)
- VOLQUETERO (1).

H Y E:
- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA SME-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- TRONZADORA
- PULIDORA.
- H Y E MENOR.

MATERIALES:
- ACPM.
- ACERO MALLA.
- COSTALES
- ALAMBRE NEGRO.
- BOLSA ASEO
-

CLIMA:
- SOLEADO

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- RELLENO SELECCIONADO
- PMT.
-

- MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

SIN OTRO PUNTUALIAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

JUEVES 28 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR (1)
- VOLQUETERO (1)

HYE:
- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA.
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- TROMPADORA
- PULIDORA
- HYE MENOR.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES.
- ACERO VARILLA.
- ALAMBRE NEGRO.
- DISCOS CORTE ABRAS.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- RELLENO SELECCIONADO
- ACERO REFUERZO

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 29 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- LABORATORISTAS (2).
- ALBAÑILISTA (1)
- CONDUCTOR (1).
- OPERADOR (1).

H Y E:

- MOTOBOMBA.
- TRONTADORA
- PULIDORA.
- EQUIPO LABORATORIO.

DENSIDADES.

- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- ACERO VARILLA.
- ALAMBRE NEGRO.

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- RELLENO SELECCIONADO
- MARTILLON.
- CHARLA SEGURIDAD.

- SE REALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD EN LOS RELLENOS (COSTADO PANAMERICANA).

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

SABADO 30 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/RAL. (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1).

HYE:
- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- TRONTADORA.
- PULIDORA.
- HYE MENOR.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- VARILLA ACERO
- MANGUERA NEGRA.
- GRASA - ACEITE.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- RELLENO SELECCIONADO
- VARILLON.
- ACERO REFUERZO.
- PMT.
- MANTENIMIENTO CAMPIX.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

LUNES 02 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1).
- SOLDADOR (1).
- CONDUCTOR (1)
- OPERADOR (1).

HYE:

- MOTOBOMBA
- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBRO COMPACTADOR
- FORMALETA METALICA
- FORMALETA MADERA
- HYE MENOR.

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- VARILLA ACERO
- ALAMBRE NEGRO.
- FORMALETA

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- PELILLO SELECCIONADO
- CAMILLON.
- CARGUE Y RETIRO
- CHARLA SST.
- PMT.
- ENCOFRADO VIGAS.
- APOYOS NEOPRENO.
- DRENAJE TUB. PVC Ø4"

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MARTES 03 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- ALMACENISTA (1).
- LABORATORISTAS (2)

H Y E:
- MOTOBOMBA.
- TRONADORA.
- PULIDORA.
- TACADRO
- EQUIPO SOLDADURA.
- EQUIPO CARBONATOPRO DENSIDADES.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- VARILLAS ACERO
- ALAMBRE NEGRO.
- FORMALETA.
- ANGULO UPN.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS.
- JAMILLON.
- RELLENO.
- ENCOFRADO VIGAS.

- SE REALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD EN RELLENO (CONTRATO CONCONCRETO).
- CANCHA RETIRO
- ACERO REFUERZO.
- ENCOFRADO VIGAS.

Y/N OTRO PARTICULARES SE CERTIFICAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MIERCOLES 04 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING RESIDENTE (1)
- SST (1).
- MAESTRO GRAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- OPERADOR (1).
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1).

HYT:
- MOTOBOMBA.
- RETRO EXCAVADORA.
- VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADOR.
- CARMIX.
- CARRETAS.
- HYPE MENOR.

MATERIALES:
- ACPM
- COSTALES
- MADERA.
- ALAMBRE GALVANIZADO.

CAMA:
- SOCAVADO.

ACTIVIDADES:
- MANTEO MANUAL
- JARILLON.
- VACIADO CONCRETO. VIGA-VIGA DIAFRAGMA (TOMA MUESTRAS CON
- RELLENO SELECCIONADO.
- CHARLA SST. -PMT.

-SE RECIBEN 100 BULTOS CEMENTO GRIS CARGOS 42.5 KG | REMISION 599335.
-JUNTA DILATACION UAN.
-DRENAJE TUB. PVC ϕ4"

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES POR DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

JUEVES 05 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL DE OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO 6/MAL (1)
- OFICIALES (5)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1).
- CONDUCTOR. (1).

HYE:

- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- EQUIPO SOLDADURA..
- HYE MENOR.
- ELECTROBOMBA.
- ANDAMIOS.

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES.
- ALAMBRE. GALVANIZADO.
- AGUA
- MANGUERA

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- AGUA CURADO.
- CARGUE Y RETIRO.
- CHARLA SST.

-SE RECIBE VISITA DEL ING. WILLIAN VERA DELEGADO UNGL DEPARTAMENTO, SE REALIZA RECORRIDO E INSPECCION DE OBRA DE MANERA SATISFACTORIA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 06 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES.

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAR (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- ALMACENISTA (1).
- CONDUCTOR (1).

AYE:

- MOTOBOMBA.
- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179.
- ELECTROBOMBA.
- H Y E MENOR

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES.
- PALETA PALE-SUGA.
- ALAMBRE GALVANIZADO.
-

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON
- AGUA CERRADO
- CAMARA SEQUMADAS
- PMT.
- CHAFLE Y BOCIRO.

SIN OTRO PARTICULAR SE CLAUSURAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

SABADO 07 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1).
- MAESTRO 1/ARL (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- ALMACENISTA (1).
- CONDUCTOR (1).

H Y E:

- MOTOBOMBA.
- RETROEXCAVADORA.
- VOLQUETA SAC-179.
- CARRETAS
- H Y E MENOR.

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- ALAMBRE GALVANIZADO
- BOLSA ASEO.
- COSTALES.

CLIMA:

-SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JAMILTON
- AGUA LAVADO
- CAMBIO Y RETIRO.
- CHARLA SEGURIDAD - PTA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES.
DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

LUNES 09 DICIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

PERSONAL DE OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/MAL (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8).
- ALMACENISTA (1).
- CONDUCTOR (1).

HYE:

- MOTOBOMBA.
- RETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179
- HYE MENOR.

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES.
- ALAMBRE GALVANIZADO.
- AGUA CORTADO.

CLIMA:

- SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- CARGUE Y DESCARGUE.
- CHARLA SEGURIDAD - PMT.
- AGUA CORTADO.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

MARTES 10 DICIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO CAM (1).
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (3)
- ALBAÑILERIA (1).
- CERRAJERIA (1).

HYE:
- RETROEXCAVADORA.
- RETROEXCAVADORA.
- CAMIONETA SAC-179.
- HYE MENOR.

MATERIALES:
- ACPM.
- CONTRATES.
- MADERA ORDENADO.
- MATERIAL DIDACTICO CHARLA SST.

CLIMA:
- SOLEADO.

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS.
- JAMMON.
- CARGUE RETIRO.
- CHARLA SEGURIDAD
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CERTIFICAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

16. ENSAYOS DE LABORATORIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	**INFORME DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: LA-H-038**	
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	VERSIÓN: 07	FECHA: 2024/06/25
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1	


Informe No.: OS3720-24-CC-01

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-12-10
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-14
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-17
FECHA DE INFORME: 2024-12-19
No. ORDEN: OS-3720

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO DE LOSA TARIMA PUENTE - 28 MPA	152,85	153,15	153,00	311,45	311,54	311,59	311,53	18385,4	13135	2310	-	07	463,1	47223	24,9	253,9	3611	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

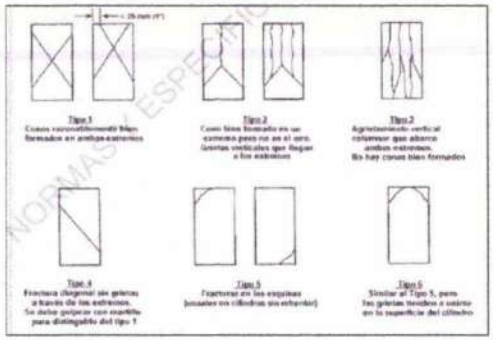

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: LA-H-038	
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	VERSIÓN: 07	FECHA: 2024/06/25
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1	


Informe No.: OS3717-24-CC-01

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-12-04
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-11
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-11
FECHA DE INFORME: 2024-12-14
No. ORDEN: OS-3717

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO DE VIGAS TARIMA PUENTE - 28 MPA	153,74	152,85	153,29	311,65	311,69	311,62	311,65	18164,9	13063	2290	-	07	454,3	46325	24,5	249,8	3553	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

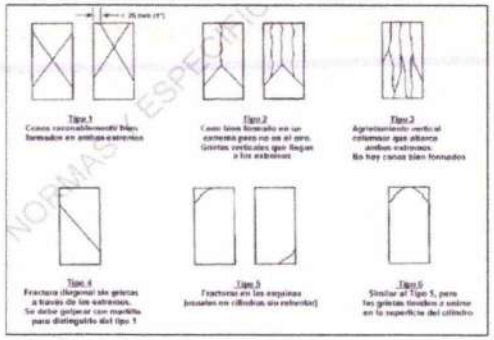

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó: Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó: Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	**INFORME DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: LA-H-038**
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	**VERSIÓN: 07** / **FECHA: 2024/06/25**
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1


Informe No.: OS3725-24-CC-01

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-11-20
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-17
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-18
FECHA DE INFORME: 2024-12-19
No. ORDEN: OS-3725

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO CICLÓPEO APOYO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN DERECHA - 21 MPA	151,53	152,64	152,09	308,52	312,29	311,84	310,88	18166,1	12921	2290	-	28	515,2	52535	28,1	286,3	4075	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

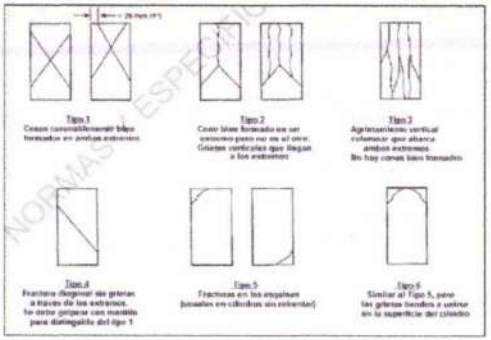

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

149

GEOTECNICAS DEL NORTE / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	**INFORME DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: LA-H-038**
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	**VERSIÓN: 07** / **FECHA: 2024/06/25**
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1


Informe No.: OS3725-24-CC-02

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-11-20
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-17
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-18
FECHA DE INFORME: 2024-12-19
No. ORDEN: OS-3725

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN DERECHA - 28 MPA	151,84	152,32	152,08	311,60	311,69	311,62	311,64	18164,9	13063	2310	-	28	529,8	54024	29,2	297,7	4235	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

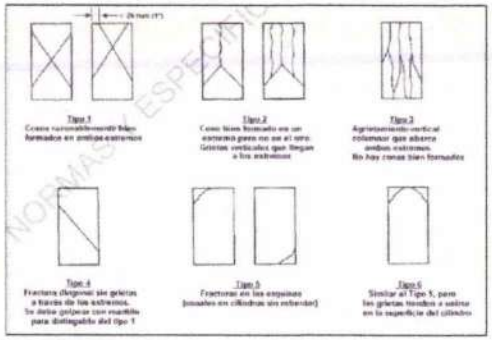

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: LA-H-038
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	VERSIÓN: 07 / FECHA: 2024/06/25
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1


Informe No.: OS3725-24-CC-03

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-11-20
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-17
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-18
FECHA DE INFORME: 2024-12-19
No. ORDEN: OS-3725

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO CICLÓPEO APOYO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN IZQUIERDA - 21 MPA	152,35	152,22	152,28	313,86	313,56	313,57	313,66	18197,2	13065	2290	-	28	501,5	51138	27,9	284,5	4046	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

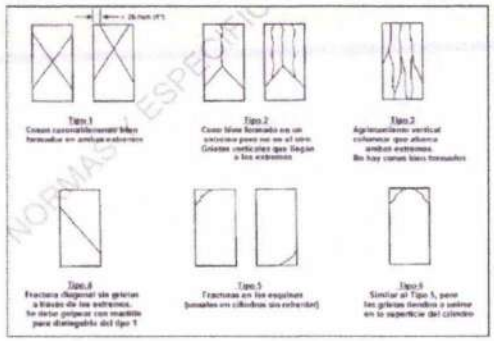

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024	**INFORME DE RESULTADOS**	CÓDIGO: LA-H-038
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	VERSIÓN: 07 / FECHA: 2024/06/25
	NORMA INV E-410-13	PÁGINA 1 DE 1


Informe No.: OS3725-24-CC-04

PROYECTO*: Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
SOLICITANTE*: Constructora Inconort S.A.S.
CONTACTO*: Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
MATERIAL*: Concreto Mezclado en Obra
PROCEDENCIA*: Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

FECHA TOMA*: 2024-11-20
FECHA DE RECIBIDO: 2024-12-17
FECHA DE ENSAYO: 2024-12-18
FECHA DE INFORME: 2024-12-19
No. ORDEN: OS-3725

CILINDRO #	ELEMENTO*	D - DIÁMETRO (mm)			h - ALTURA (mm)				ÁREA	PESO	DENSIDAD	SLUMP*	EDAD	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			TIPO DE FALLA
		D1	D2	Promedio	h1	h2	h3	Promedio	(mm^2)	(g)	(kg/m^3)	cm	(Días)	kN	kg	MPa	kg/cm^2	PSI	
1	CONCRETO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN IZQUIERDA - 28 MPA	152,42	152,23	152,32	313,59	313,45	313,60	313,55	18188,8	12811	2250	-	28	552,5	56339	29,6	301,8	4293	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

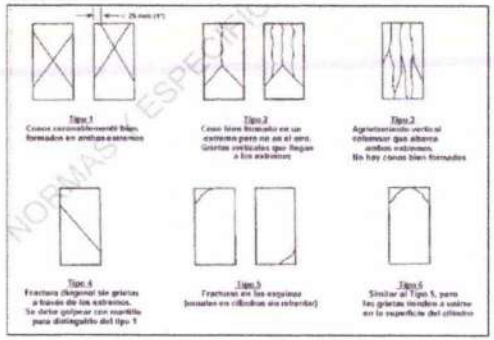

TIPOS DE FALLA:

Tipo 1 Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
Tipo 3 Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
Tipo 4 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
Tipo 5 Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
Tipo 6 Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

Revisó:
Gabriela Araque Lizarazo
Director Técnico

Autorizó:
Cristian Agudelo R.
Gerente

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

CONSTRUCTORES S.A.S

17. COMITES DE OBRA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 1 de 8	

ACTA DE REUNION

Fecha: 12 de diciembre de 2024	Hora de inicio: 2:45 PM	Hora de finalización: 3:45 PM
Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD	Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD	
Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024		Comité Obra No.11 – seguimiento de obra –

TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.11

1. Presentación balance financiero, modificación de cantidades.
2. Avance de obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 11 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaría para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente recordando los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 10, solicita al contratista de obra información referente a las acciones a tomar frente al manejo de las aguas sobre la vía, hecho que se evidencio luego de realizada la visita a campo con el personal de la secretaria para la gestión del riesgo de desastres y el personal del contratista en terreno.

ACTA DE REUNION

A lo que el Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, informa que una vez terminada las actividades de levantamiento topográfico y teniendo en cuenta lo evidenciado en campo durante el incremento de las precipitaciones en la zona se determinó la necesidad de construir 195 mt de cunetas en concreto reforzado de 3000 PSI distribuidos en 135 mt en la margen aledaña al talud y 60 mt en la margen del costado de la escuela, que permitirán desde la última alcantarilla existente conducir el agua hasta el punto de entrega determinado en campo, esto para el caso de las cunetas construidas en el costado del talud y en el costado contrario 60 mts de cuneta reforzada entregaran las aguas a una gradas disipadoras con el ánimo de evitar situaciones de erosión sobre los rellenos del puente y sobre la cimentación de los estribos, así mismo, se construirán 29,90 mt lineales de filtro adicionales a los 60 mt ya contratados en las condiciones iniciales del contrato de obra, adicionalmente a lo ya descrito surge la necesidad de realizar la construcción de un muro en gaviones (60 m2) que permitan la contención de los rellenos realizados en la parte posterior de los estribos del puente esto con el fin de garantizar el soporte de los estribos y la contención de los rellenos efectuados para tal fin.

Una vez determinadas las actividades constructivas necesarias para dar manejo a la situación evidenciada en campo durante el incremento de las precipitaciones en la zona, (*hechos ya descritos en el párrafo inicial*), se realizó un balance financiero que dado la imposibilidad de tener recursos adicionales para la ejecución de estas nuevas obras complementarias obligo a realizar un replanteo sobre el alcance del contrato determinado en el acta de modificación de cantidades No. 02 al contrato de obra en mención.

Es así, como es necesario realizar una modificación al alcance del contrato en lo que respecta a la losa de pavimento en concreto resistencia 4500 PSI ya que inicialmente se encontraba contratados 30 ml lineales de losa a cada lado del puente, dicha modificación se requiere con el ánimo de poder asignar estos recursos necesarios para la construcción de las obras complementarias descritas en el párrafo anterior las cuales son fundamentales para garantizar el manejo de las aguas lluvias sobre la vía y proteger de una posible socavación la estructura de cimentación del puente,

ACTA DE REUNION

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se requiere suscribir al presente contrato el acta de modificación de cantidades No.02 en la que se determinen las siguientes condiciones actualizadas del contrato:

MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 13 DEDICIEMBRE DE 2024						CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	+ -	CANT.	V.R PARCIAL	CANT.	V.R PARCIAL
1.0	**PUENTE VEHICULAR**						
1,01	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2				285,36	$ 1.935.026,00
1,02	Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m.	M3				1.871,25	$ 61.693.241,00
1,03	Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²	M3				38,35	$ 28.711.955,00
1,04	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3				89,49	$ 127.033.292,00
1,05	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi	M3				94,44	$ 143.455.493,00
1,06	Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....)	M3				34,83	$ 49.442.056,00
1,07	Acero de refuerzo Grado 60	KG	+	531,32	5.517.758,00	16.784,34	$ 174.305.371,00
1,08	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm.	M3				1.004,60	$ 42.266.536,00

1,09	Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm)	UND				4,00	$	9.246.880,00
1,10	Junta de dilatacion con angulo UPN 160	M				9,80	$	4.351.592,00
1,11	Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	M3				8,82	$	12.520.211,00
1,12	Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m)	UND				4,00	$	1.427.904,00
1,13	Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	M				32,40	$	23.402.552,00
1,14	Base granular (INV. 330.1)	M3	-	60,00	17.208.000,00	30,00	$	8.604.000,00
1,15	Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m	M3	-	40,00	56.781.000,00	20,00	$	28.390.500,00
1,16	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	M	-	80,00	538.400,00	74,00	$	498.020,00
1,17	Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado	M3				2.957,97	$	116.686.065,00
1,18	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	M	-	66,67	2.852.743,00	67,33	$	2.880.983,00

	OBRAS COMPLEMENTARIA							
1,19	Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2"	M	+	29,90	4.664.639,20	89,90	$	14.025.119,00
1,20	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia				78,00	$	41.981.628,00
1,21	Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion	M³				840,00	$	40.479.600,00

1,22	Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional)	M³				1.193,33	$	38.677.019,00
1,23	Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal)	M²				117,60	$	90.787.788,00
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	+	38,45	39.396.716,00	38,45	$	39.396.716,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	+	39,98	3.799.659,00	39,98	$	3.799.659,00
NP 03	GAVIONES	M2	+	60,00	24.000.000,00	60,00	$	24.000.000,00
							$	**1.129.999.206,00**
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA						***$***	***1.129.999.206,00***
	ADMINISTRACIÓN						$	282.499.802,00
	IMPREVISTOS						$	5.649.996,00
	UTILIDAD						$	50.849.964,00
	COSTO INDIRECTO DE LA OBRA						***$***	***338.999.762,00***
	SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE							
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL							**$30.000.000,00**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							**$1.782,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$**	**1.499.000.750,00**

Resultado del ejercicio de balance financiero realizado se obtienen MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.782,00) que quedan a favor de la entidad contratante una vez se alcance el cumplimiento del objeto contractual al 100%

El contratista realiza la entrega del balance de obra y las respectivas memorias de calculo que soportan la necesidad de realizar la modificación No. 2 al contrato de obra, y realiza en el presente comité la aclaración del nuevo alcance del contrato en donde ante la necesidad

de asignar recursos a las obras complementarias requeridas disminuye los metros lineales de losa en concreto de 4500 PSI pasando de 30 mt a las do y lado del puente a 10 mt lineales a cada lado del puente. Y la inclusión de ítems no previstos como lo son:

	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 01	CONCRETO DE 3000 PSI o 210 Kg/cm² PARA CUNETAS Y GRADAS DISIPADORAS	M3	+	38,45
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO	M3	+	39,98
NP 03	GAVIONES	M2	+	60,00

La variación de las demás actividades constructivas afectadas por la modificación de cantidades No. 02 como el acero de refuerzo, la base granular, losa de pavimento en concreto 4500 PSI, líneas de demarcación, juntas de dilatación y la de construcción de filtro se manejan en el balance mediante mayores y menores cantidades de obra dado que ya son ítems contractuales por lo que solo varia su cantidad y costo total.

Hecho seguido el Ing. William Vera, indica que dadas las circunstancias presentadas en campo y evidenciadas una vez se incrementan las precipitaciones en la zona, se considera pertinente la suscrición del acta de modificación de cantidades No. 02 al contrato de obra RE-SGRD- 01885-2024 suscrito el 30 de agosto de 2024, toda vez que es importante garantizar el correcto manejo de aguas lluvias en el sector aledaño a la estructura del puente construido, con el fin de evitar acciones erosivas sobre los rellenos y en el terreno sobre el que se encuentra cimentado el puente construido en el marco del contrato en mención.
Por lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que no es posible la asignación de recursos adicionales al contrato de obra se aprueba la modificación del alcance del contrato y su nuevo alcance, la modificación No. 02 de las cantidades de obra contractuales y la inclusión de los ítems no previsto presentados, por lo que en el presente comité se aprueba la suscripción del acta de modificación de cantidades No. 02 y se aprueba la suscripción del

acta de aprobación de APU de no previstos, entregados por el contratistas junto con el balance de obra

En cuanto al avance de obra el contratista toma nuevamente la palabra para informar a la entidad contratante en cabeza del sr supervisor del contrato, que se vienen desarrollando las actividades constructivas de manera normal, que las precipitaciones en lo que respecta a frecuencia, intensidad y duración han disminuido en el transcurso del periodo comprendido entre 11 de diciembre al 20 de diciembre. Así mismo, todas las actividades constructivas a la fecha se han realizado dando cumplimiento a la normativa vigente y cada proceso constructivo se ha realizado bajo los estándares de calidad de tal manera que se puede garantizar el aseguramiento de la calidad del proyecto,

Siendo las 03:45 pm se da por terminado el comité de obra #11

COMPROMISOS y CONCLUSIONES

COMPROMISO

Continuar con el avance y proceso constructivo de la obra
Firmar y suscribir el acta de modificación de cantidades No. 02
Firmar y suscribir el acta de aprobación de APU´s no previstos

CONCLUSIONES

1. El contrato continúa con su ejecución en la medida en que la presencia de lluvia lo permite, el contrato de obra dada la necesidad de realizar un manejo de aguas lluvias que permita evitar y prevenir daños por socavación en la estructura del puente en construcción
   Y en vista de la imposibilidad de conseguir recursos adicionales, se aprueba por parte de la entidad contratante la suscrición del acta de modificación No. 02 con su respectiva acta de aprobación de apu´s no previstos.

   Dentro de las modificaciones realizadas al contrato se encuentra:

   - El recorte del alcance de la losa de pavimento de 4500 psi pasando a ejecutarse 10 mt lineales a lado y lado del puente,
   - La construcción de 195 mt de cuneta reforzada
   - La construcción de 29,90 mt lineales de filtro
   - La construcción de 60 mt2 de gaviones
   - Construcción de gradas disipadoras según diseño
   - Una vez realizado el balance de obra se evidencia que queda un saldo a favor de la entidad contratante por un valor de $1.782,00

Gobernación de Norte de Santander SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 8 de 8	


ACTA DE REUNION

- Las demás variaciones en cantidades contractuales se realizan mediante la mayor o menor cantidad de obra generada .

ANEXOS SI ( ) NO ( )	Fecha de aprobación del acta:

Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión	*Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD*	*Próxima Reunión:*

Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:

NOMBRE	WILLIAM VERA ARIAS	 Firma
En Representación de	SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Ing IMAR ORLANDO VACCA	 Firma
En Representación de	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S	
Correo electrónico		
Teléfono		

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA

Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70 Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **IV - 87**

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
NIT ó C.C: 900978341
DIRECCION:
Ciudad: CUCUTA
Telefono:
EMAIL:
VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA EMISION
23/12/2024 - 8:21:31 a. m.

Forma de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento:

CANT.	DESCRIPCION	BOD	UND	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	COSTO DIRECTO		UND	0	99,660,343.00	99,660,343.00
1.00	ADMINISTRACION 25%		UND	0	24,915,086.00	24,915,086.00
1.00	IMPREVISTOS 0.5%		UND	0	498,302.00	498,302.00
1.00	UTILIDAD 4.5%		UND	0	4,484,715.00	4,484,715.00

OBSERVACIONES : ACTA N°4 CONSTRRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO,MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CLAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO001287 DEL 06 DE JUNO DE 2024

SON : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos

SUBTOTAL	129,558,446.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**129,558,446.00**

CUFE:214ec5a131fbabad6a047d758de0a7f3d8d65db799f1499221b20a0a5e9eac85e0b4cfee588cbf1960e6cb04ae9b01da

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA
