	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-064
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA (ESTRUCTURA)		Versión	4
			Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	121-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO FAC 2309, INTEGRADO POR: -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTVS.A.S (50%)-CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS.A.S (50%)
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO SI	REVISADO Y APROBADO NO	FECHA DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
9	MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA					
9.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL	X		20 DE AGOSTO 2024	SE VISUALIZA QUE LOS MUROS PRESENTAN ACABADOS FINOS LO QUE GENERA UNA MAYOR ESTETICA ARQUIRECTONICA	
9.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE	X		20 DE AGOSTO 2024	EL BLOQUE ESTA ALMACENADO EN OPTIMAS CONDICIONES	
9.3	CURADO EN OBRA Y PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD	X		20 DE AGOSTO 2024	UNA VES LLEGA A OBRA ES ACOPIADO EN BUENAS CONDICIONES Y PROTEGIDO ADECUADAMANETE	
9.4	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE E IZADO	X		20 DE AGOSTO 2024	EL MATERIAL ES TRANSPORTADO EN BLOQUES TIPO ESTIBA, DEBIDAMETE PROTEGIDO Y ASEGURADO HASTA EL LUGAR DE USO	
9.5	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE E IZADO		X	20 DE AGOSTO 2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE IZADO YA QUE NO SE REQUIERE EN LA OBRA	
9.6	SISTEMA Y SECUENCIA DE COLOCACIÓN	X		20 DE AGOSTO 2024	SE HACE LA RESPECTIVA MODULACION DE ACUERDO A LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES	
9.7	ALINEAMIENTO PLOMO	X		20 DE AGOSTO 2024	SE REALIXA LA DEBIDA INSPECCION DE PLOMO PARA LOS MUROS A MEDIDA DEL LEVANTAMIENTO	

9.8	EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE ABURDAJADO				ANCHO	LARGO	ALTO	VANOS	m2 MURO MAMPOSTERIA	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
9.8.1	ESCUADRÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA	X		20 DE AGOSTO 2024	3,56		3,43	0,00	12,2108	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.2		X		20 DE AGOSTO 2024	4,43		3,43	2,40	12,7949	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.3		X		20 DE AGOSTO 2024	1,07		3,43	0,00	3,6701	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.4		X		20 DE AGOSTO 2024	4,02		3,43	0,00	13,7886	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.5		X		20 DE AGOSTO 2024	1,02		3,43	1,02	2,4786	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.5.1		X		21 DE AGOSTO 2024	1,61		3,43	1,44	4,0823	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.6		X		21 DE AGOSTO 2024	5,64		3,43	4,32	15,0252	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.7		X		21 DE AGOSTO 2024	5,59		3,43	4,32	14,8537	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.8		X		22 DE AGOSTO 2024	5,36		3,43	2,44	15,9448	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	

9.8.9	HABITACIÓN # 2	X		23 DE AGOSTO 2024	3,82		3,43	0,50	12,6026	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.10	SALA DE DESCANSO	X		23 DE AGOSTO 2024	6,06		3,43	2,88	17,9058	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.11		X		23 DE AGOSTO 2024	0,9		3,43	0,00	3,0870	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.12	HABITACIÓN # 1	X		23 DE AGOSTO 2024	1,45		3,43	0,00	4,9735	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.11		X		23 DE AGOSTO 2024	3,82		3,43	2,88	10,2226	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.12	CUARTO DE EQUIPOS	X		23 DE AGOSTO 2024	5,61		3,43	4,32	14,9223	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.13	CUARTO DE REGULADORES	X		24 DE AGOSTO 2024	5,49		3,43	2,88	15,9507	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.14	BANCO DE BATERIAS Y CUARTO DE TABLREROS ELECTRICOS	X		24 DE AGOSTO 2024	5,58		3,43	2,10	17,0394	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.13	CUARTO TRANSFORMADOR	X		24 DE AGOSTO 2024	1,77		3,43		6,0711	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.14		X		26 DE AGOSTO 2024	5,97		3,43	13,63	6,8521	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.15		X		26 DE AGOSTO 2024	1,77		3,43		6,0711	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.16		X		26 DE AGOSTO 2024	1,16		3,43		3,9788	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.17	CUARTO PLANTA ELECTRICA	X		26 DE AGOSTO 2024	3,28		3,43	7,50	3,7504	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.18		X		27 DE AGOSTO 2024	3,66		3,43	1,50	11,0538	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.19	CUARTO DE BATERIAS	X		27 DE AGOSTO 2024	3,49		3,43	5,00	6,9707	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.20	CUARTO DE REGULADORES	X		27 DE AGOSTO 2024	3,59		3,43	5,00	7,3137	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.21	CUARTO DE EQUIPOS	X		27 DE AGOSTO 2024	3,54		3,43		12,1422	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.22	HAB # 1	X		27 DE AGOSTO 2024	3,82		3,43	2,88	10,2226	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.23	SALA DE DESCANSO	X		28 DE AGOSTO 2024	4,7		3,43	2,40	13,7210	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.24		X		28 DE AGOSTO 2024	4,7		3,43	4,20	11,9210	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.25		X		29 DE AGOSTO 2024	6,06		3,43	2,88	17,9058	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.26		X		30 DE AGOSTO 2024	0,9		3,43		3,0870	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.27	HAB # 2	X		30 DE AGOSTO DE 2024	1,6		3,43		5,4880	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.28		X		31 DE AGOSTO DE 2024	3,82		3,43	2,88	10,2226	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.29	OFICINAS ESCUADRON DE NAVEGACION	X		31 DE AGOSTO DE 2024	3,54		3,43		12,1422	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.











9.8.29	AEREA	X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	3,59		3,43	4,20	8,1137	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.30		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	3,50		3,43	4,20	7,8050	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.31	ABUJARDADO SOBRE VIGA AEREA	X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	ANCHO	LARGO	ALTO	# ELEMENTOS	m2 MURO MAMPOSTERIA	
9.8.31	ENTRE LOS EJES A-Ñ Y LOS EJES 1-13	X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	6,00		1,50	0,50	4,500	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.32		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	5,97		1,50	1,00	8,955	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.33		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	1,77		1,50	0,50	1,328	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.34		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	11,69		1,30	1,00	15,197	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.35		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	9,93		1,30	1,00	12,909	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.36		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	1,70		1,30	0,50	1,105	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.37		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	1,15		0,90	1,00	1,035	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.38		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	12,38		0,90	1,00	11,142	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.39		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	1,15		0,90	1,00	1,035	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.40		X		09/SEPTIEMBRE DE 2024	1,70		1,30	0,50	1,105	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.41		X		09/SEPTIEMBRE DE 2024	9,93		1,30	1,00	12,909	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.42		X		09/SEPTIEMBRE DE 2024	11,78		1,30	1,00	15,314	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.43		X		09/SEPTIEMBRE DE 2024	1,86		1,30	1,00	2,418	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.44		X		09/SEPTIEMBRE DE 2024	1,01		1,50	0,50	0,758	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.43		X		26/SEPTIEMBRE DE 2024	4,02		1,50	1,00	6,030	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
9.8.44		X		26/SEPTIEMBRE DE 2024	5,30		1,50	0,50	3,975	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.
				TOTAL M2 MUROS					456,10	


9.8.45	EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE LISO	X			ANCHO	LARGO	ALTO	VANOS	m2 MURO MAMPOSTERIA	OBSERVACIONES
9.8.46	CUCHILLAS									
9.8.47	CUCHILLA EJES (3-4) AL EJE (N-Ñ)	X		23 AGOSTO DE 2024	4,60		1,10		2,53	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.48	CUCHILLA EJE 5 AL EJE (N-Ñ)	X		23 AGOSTO DE 2024	4,18		1,10		2,30	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.49	CUCHILLA EJES (6-7) AL EJE (N-Ñ)	X		23 AGOSTO DE 2024	4,51		1,10		2,48	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.50	CUCHILLA EJES (10-12) AL EJE G	X		23 AGOSTO DE 2024	2,50		0,60		0,75	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.51	CUCHILLA EJES (8-10) AL EJE (B-E)	X		23 AGOSTO DE 2024	4,18		1,10		2,30	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.52	CUCHILLA EJES (6-7) AL EJE (A-B)	X		24 AGOSTO DE 2024	4,55		1,10		2,50	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.53	CUCHILLA EJE 5 AL EJE (A-B)	X		24 AGOSTO DE 2024	4,18		1,10		2,30	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
9.8.54	CUCHILLA EJES (3-4) AL EJE (A-B)	X		24 AGOSTO DE 2024	4,56		1,10		2,51	SE REALIZA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TECNICAS DEL PLANO Y LAS ESPECIFICACIONES
	TOTAL									







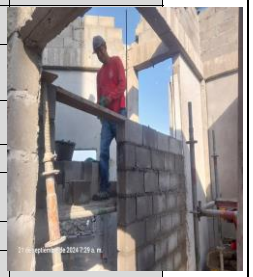

9.8.55	CUARTO DE PLANTA ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y TABLEROS ELECTRICOS	X		5 SEPTIEMBRE DE 2024	3,66		3,43		12,55	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.56		X		5 SEPTIEMBRE DE 2024	2,71		3,43		9,30	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.57		X		5 SEPTIEMBRE DE 2024	2,49		3,43		8,54	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.58	CUARTO BANCO DE BATERIAS Y REGULADORES	X		9 SEPTIEMBRE DE 2024	4,60		3,43		15,78	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.59		X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	4,70		3,43		16,12	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.60	CUARTO DE EQUIPOS Y HAB # 1	X		12 SEPTIEMBRE DE 2024	5,02		3,43	2,52	14,70	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.61		X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	4,49		3,43		15,40	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.62		X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	2,36		3,43	1,47	6,62	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.63		X		17 SEPTIEMBRE DE 2024	1,4		3,43		4,80	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.64	SALA DE DESCANSO	X		17 SEPTIEMBRE DE 2024	2,9		3,43	1,89	8,06	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.65		X		17 SEPTIEMBRE DE 2024	2,9		3,43	1,89	8,06	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.66	HAB # 2 OFICINAS DEL ESCUADRON NAVEGACION AEREA Y OFICINA DEL COMANDANTE	X		17 SEPTIEMBRE DE 2024	1,4		3,43		4,80	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.67		X		18 SEPTIEMBRE DE 2024	2,36		3,43	1,47	6,62	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.68		X		18 SEPTIEMBRE DE 2024	4,5		3,43		15,44	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.69		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	1,79		3,43	1,47	4,67	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.70		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	2,55		3,43	1,47	7,28	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.71		X		23 SEPTIEMBRE DE 2024	2,17		3,43		7,44	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.72		X		23 SEPTIEMBRE DE 2024	2,55		3,43		8,75	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
9.8.73		X		23 SEPTIEMBRE DE 2024	4,71		3,43	1,89	14,27	SE REALIZA VERIFICACION , SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTRUCCION.	
TOTAL									206,86		
9.8.74	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM.	X			ANCHO	LARGO	ALTO	#ELEMTOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIONES	
9.8.75	ENTRE LOS EJES (2-9) Y LOS (C-M) PARTE FRONTAL VIGA AEREA	X		21 AGOSTO DE 2024	3,81		0,70	2,00	5,33	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 AGOSTO DE 2024	7,64		0,70	4,00	21,39	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.76		X		21 AGOSTO DE 2024	9,64		0,70	1,00	6,75	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS	X		28 AGOSTO DE 2024	ANCHO	LARGO	ALTO	VANOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIONES	
9.8.77	BAÑO HAB # 1	X		28 AGOSTO DE 2024	2,35		3,43	1,47	6,5905	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.78		X		28 AGOSTO DE 2024	1,15		3,43		3,9445	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.79		X		28 AGOSTO DE 2024	2,31		3,43	0,50	7,4233	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.80		X		28 AGOSTO DE 2024	1,25		3,43		4,2875	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.81	BAÑO HAB # 2	X		28 AGOSTO DE 2024	1,25		3,43		4,2875	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.82		X		28 AGOSTO DE 2024	2,35		3,43	1,47	6,5905	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.83		X		28 AGOSTO DE 2024	1,15		3,43		3,9445	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	

9.8.84		X		28 AGOSTO DE 2024	2,31		3,43	0,50	7,4233	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.85	BAÑO DAMAS	X		29 AGOSTO DE 2024	1,18		3,43		4,0474	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.86		X		29 AGOSTO DE 2024	1,73		3,43	0,50	5,4339	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.87		X		29 AGOSTO DE 2024	1,28		3,43		4,3904	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.88		X		29 AGOSTO DE 2024	1,79		3,43	1,47	4,6697	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.89	BAÑO CABALLEROS	X		30 AGOSTO DE 2024	2,55		3,43	1,47	7,2765	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.90		X		30 AGOSTO DE 2024	2,55		3,43		8,7465	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.91		X		30 AGOSTO DE 2024	1,87		3,43	0,50	5,9141	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.92		X		30 AGOSTO DE 2024	1,87		3,43		6,41753	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	TOTAL								124,86		
	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM				ANCHO	LARGO	ALTO	VANOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIONES	
9.8.93	CUARTO DEL TRANSFORMADOR	X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	5,67		3,43	13,63	5,82	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.94		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	1,33		3,43		4,56	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.95		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	2,49		3,43		8,54	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.96		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	0,33		3,43		1,13	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.97		X		31 AGOSTO DE 2024	3,66		3,43		12,55	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.98		X		31 AGOSTO DE 2024	0,97		3,43		3,33	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.99		X		31 AGOSTO DE 2024	1,61		3,43		5,52	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.100	CUARTO PLANTA ELECTRICA	X		31 AGOSTO DE 2024	3,28		3,43	7,50	3,75	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.101		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	3,54		3,43		12,14	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.102		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	2,65		3,43		9,09	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.103		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	2,21		3,43		7,58	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.104		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	3,67		3,43	1,50	11,09	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.105	CUARTO TABLEROS ELECTRICOS	X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	2,24		3,43		7,68	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.106		X		02 SEPTIEMBRE DE 2024	2,23		3,43		7,65	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.107		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	2,13		3,43		7,31	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.108		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	1,96		3,43	2,10	4,62	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.109	CUARTO DE BATERIAS	X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	2,72		3,43	5,00	4,33	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.110		X		05/SEPTIEMBRE DE 2024	4,60		3,43		15,78	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.111		X		16/SEPTIEMBRE DE 2024	2,69		3,43		9,23	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.112		X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	4,70		3,43		16,12	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.113	CUARTO DE REGULADORES	X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	4,22		3,43	5,00	9,47	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.114		X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	4,70		3,43		16,12	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.115		X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	6,11		3,43	2,88	18,08	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.116		X		11 SEPTIEMBRE DE 2024	4,87		3,43	2,52	14,18	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	

9.8.117	CUARTO DE EQUIPOS	X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	3,45		3,43		11,83	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.118		X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	5,03		3,43	2,52	14,73	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.119		X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	5,46		3,43	4,32	14,41	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.120		X		16 SEPTIEMBRE DE 2024	4,50		3,43		15,44	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.121	HAB # 1	X		18 SEPTIEMBRE DE 2024	3,82		3,43	2,88	10,22	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.122		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	3,20		3,43		10,98	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.123		X		18 SEPTIEMBRE DE 2024	2,50		3,43	1,47	7,11	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.124		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	1,40		3,43		4,80	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.125		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	1,36		3,43		4,66	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
9.8.126		X		19 SEPTIEMBRE DE 2024	4,50		3,43	1,89	13,55	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	SALA DE DESCANSO	X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	2,90		3,43	1,89	8,06	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	0,90		3,43		3,09	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	5,91		3,43	2,88	17,39	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	5,89		3,43	2,88	17,32	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	0,90		3,43		3,09	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		20 SEPTIEMBRE DE 2024	2,90		3,43	1,89	8,06	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	4,55		3,43	2,40	13,21	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		22 SEPTIEMBRE DE 2024	4,55		3,43	4,20	11,41	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	HAB # 2	X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	3,82		3,43	2,88	10,22	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	4,50		3,43	1,89	13,55	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		22 SEPTIEMBRE DE 2024	1,35		3,43		4,63	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	1,40		3,43		4,80	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	2,50		3,43	1,47	7,11	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	3,20		3,43		10,98	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	OFICINAS ESCUADRON DE NAVEGACIÓN AÉREA	X		21 SEPTIEMBRE DE 2024	3,18		3,43		10,91	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	1,79		3,43	1,47	4,67	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	1,21		3,43	1,47	2,68	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	3,45		3,43		11,83	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	2,17		3,43		7,44	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	2,70		3,43		9,26	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	1,46		3,43	1,44	3,57	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	3,59		3,43	4,20	8,11	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		24 SEPTIEMBRE DE 2024	5,59		3,43	4,32	14,85	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		25 SEPTIEMBRE DE 2024	3,49		3,43	4,20	7,77	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		25 SEPTIEMBRE DE 2024	5,64		3,43	4,32	15,03	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		25 SEPTIEMBRE DE 2024	4,71		3,43	1,89	14,27	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		25 SEPTIEMBRE DE 2024	1,61		3,43	1,44	4,08	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
	OFICINA COMANDANTE	X		25 SEPTIEMBRE DE 2024	3,63		3,43		12,45	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		26 SEPTIEMBRE DE 2024	5,70		3,43	2,91	16,64	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		26 SEPTIEMBRE DE 2024	4,43		3,43	2,40	12,79	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		26 SEPTIEMBRE DE 2024	3,78		3,43		12,97	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	
		X		26 SEPTIEMBRE DE 2024	0,92		3,43		3,16	ESTA ACTIVIDAD SE ADELANTO CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES	

9.8.131					**TOTAL**		**628,79**		
9.9	CELDAS PARA INYECCIÓN (ESTRUCTURAL)	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE VERIFICAN SIN NOVEDAD ALGUNA				
9.10	LIMPIEZA VENTANAS DE INSPECCIÓN	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE HACEN LAS RESPECTIVAS LIMPIEZAS				
9.11	ESPESOR JUNTAS DE PEGA	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	LAS JUNTAS DE PEGA SE HACEN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS				
9.12	TRABA ADECUADA (TIPO UTILIZADO)	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SEGÚN SU UTILIZACION EN CONSECUENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES				
9.13	ALTURAS DE INYECCIÓN (ESTRUCTURAL)	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE VERIFICA EN BASE DE LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS				
9.14	JUNTAS DE CONTROL	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE REALIZA SEGUIMIENTO ACORDE A LOS PLANOS				
9.15	COLOCACIÓN DE ESPIGOS O ANCLAJES O GRAFILES, TRASLAPO Y UBICACIÓN	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE HACEN LOS ANCLAJES DOVELAS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PLANOS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES				
9.16	APUNTALAMIENTOS PROVISIONALES	X		**23 SEPTIEMBRE DE 2024**	SE REALIZA EN MARCOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA RESPECTIVA CONSTRUCCION DE ESTOS ELEMENTOS				
9.17	INFORME SUPERVISOR								

ELABORÓ:



Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

REVISÓ:



Director de Interventoria
Firma y Posfirma
