CONTRATO 4806 DEL 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1

DICIEMBRE DEL 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____ **MES O PERIODO:** _____

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 MINFRA-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1 MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE APROBACIÓN

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 1
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	31/12/2023		
Revisión			
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
JORGE MEDINA	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1		
2		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1 LOCALIZACIÓN 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
3.1.1 Información contractual 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 10
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 10
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 10
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 10
3.4.3 Estado de pólizas 11
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 12
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 14
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 14
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 14
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 14
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 15
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 16
5.1.1 Aspectos legales del contrato 16
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 17
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 18

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 18

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 19

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 21

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 21

8. ANEXOS 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 13-31 de diciembre de 2023, para el proyecto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL POGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al convenio No. 4806 de 2023 en proceso de revisión y aprobación de documentos, cuyo objeto es: "**Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total."** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de reuniones y recorridos en conjunto con la OAC de la vereda de El Ramal, Director territorial y supervisor de INVIAS, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 4927 de 2023 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN



Imagen 1. Localización del proyecto

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rosas del departamento de Cauca, en la vereda El Ramal, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.2129, longitud: -76.6932 y punto de referencia final en el PR 0 + 899 con coordenadas latitud: 2.2099, longitud: - 76.6884, de la vía Loma el Coco - Cruce Buena vista, la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de la vereda El Ramal, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa

huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONTRATO No. - FECHA	4806 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RAMAL, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
C.C. o N.I.T.	901050095-1
REPRESENTANTE LEGAL	HERNEY ORDOÑEZ HOYOS
C.C. o N.I.T	76.296.896
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..
VALOR DEL CONTRATO	$200.818.019.00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (3) meses.
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: “Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más”.
LUGAR DE EJECUCIÓN	VÍA LOMA EL COCO - CRUCE BUENA VISTA
SUPERVISOR	JORGE MEDINA - territorial INVIAS Cauca.

(Acto administrativo y fecha de designación)	
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	13 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 13-31 de diciembre de 2023 de ejecución del contrato 4927 de 2023. El representante legal de la JAC El Ramal, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza socialización con el director territorial de INVIAS
- Se realizan las solicitudes de prórroga de los convenios.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

✔ Hasta el momento no se han desarrollado actividades de obra.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha no se han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de

obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100026288, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.130.524,00	22/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.032.631,00	22/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.195.786,00	31/11/2023	31/12/2028

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100005593, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación del Cauca. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO


A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 13-31 de diciembre de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°1. (13 -31 dic)

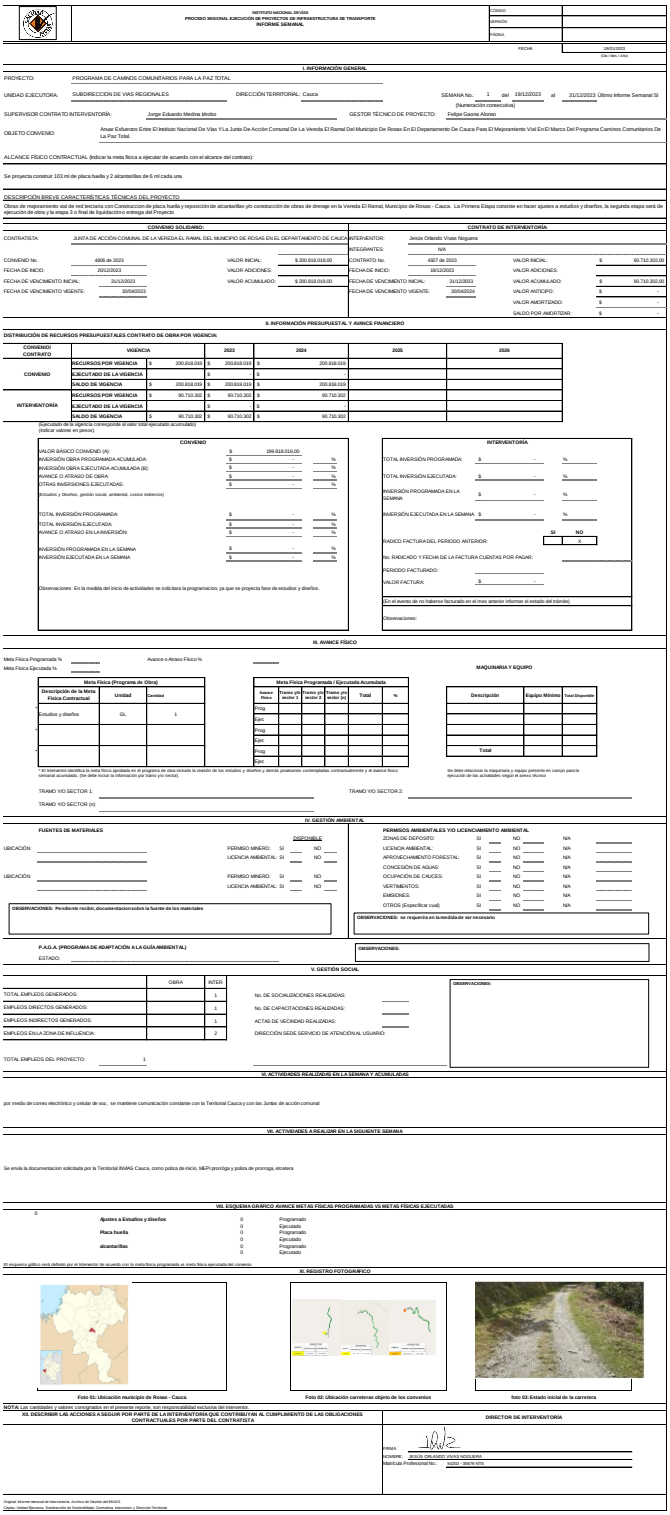

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
FECHA: 19/01/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca — SEMANA No.: 1 del 19/12/2023 al 31/12/2023 (Ultimo Informe Semanal Si) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Felipe Gaona Alonso

OBJETO CONVENIO: Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Ramal Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se proyecta construir 103 ml de placa huella y 2 alcantarillas de 6 ml cada una

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Obras de mejoramiento vial de vial terciaria con Construcción de placa huella y reposición de alcantarillas y/o construcción de obras de drenaje en la Vereda El Ramal, Municipio de Rosas - Cauca. La Primera Etapa consiste en hacer ajustes a estudios y diseños, la segunda etapa será de ejecución de obra y la etapa 3 o final de liquidación o entrega del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONVENIO No. 4906 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.818.019,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.818.019,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Jesús Orlando Vivas Noguera
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 4927 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019	$ 200.818.019	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.818.019	$ 200.818.019	$ 200.818.019	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.710.302	$ 90.710.302	$ 90.710.302	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A)	$ 199.818.019,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ — Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o Sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluido la inversión de los estudios y diseños y demás prestaciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el avance técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ____ — TRAMO Y/O SECTOR 2: ____
TRAMO Y/O SECTOR (n): ____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	NA ___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	NA ___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	NA ___	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	NA ___	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	NA ___	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	NA ___	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	NA ___	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	NA ___	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

por medio de correo electrónico y celular de voz , se mantiene comunicación constante con la Territorial Cauca y con las Juntas de acción comunal

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se envia la documentacion solicitada por la Territorial INVAS Cauca, como poliza de inicio, NEPI prorroga y poliza de prorroga, etcetera

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01: Ubicación municipio de Rosas - Cauca

Foto 02: Ubicación carreteras objeto de los convenios

foto 03: Estado inicial de la carretera

NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54208 - 76479 VITA

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Gestión Misional, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Hasta el momento no se han ejecutado actividades con maquinaria o equipos.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

En el presente período no se reporta personal contratado.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 13-31 de diciembre de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no se han generado actas ni ejecución de obra.

Hasta el momento no se han realizado movimiento presupuestal o financiero.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1-31 de diciembre de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”


Desde la fecha aun no se tiene seguimiento del tiempo debido a que no han empezado actividades.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

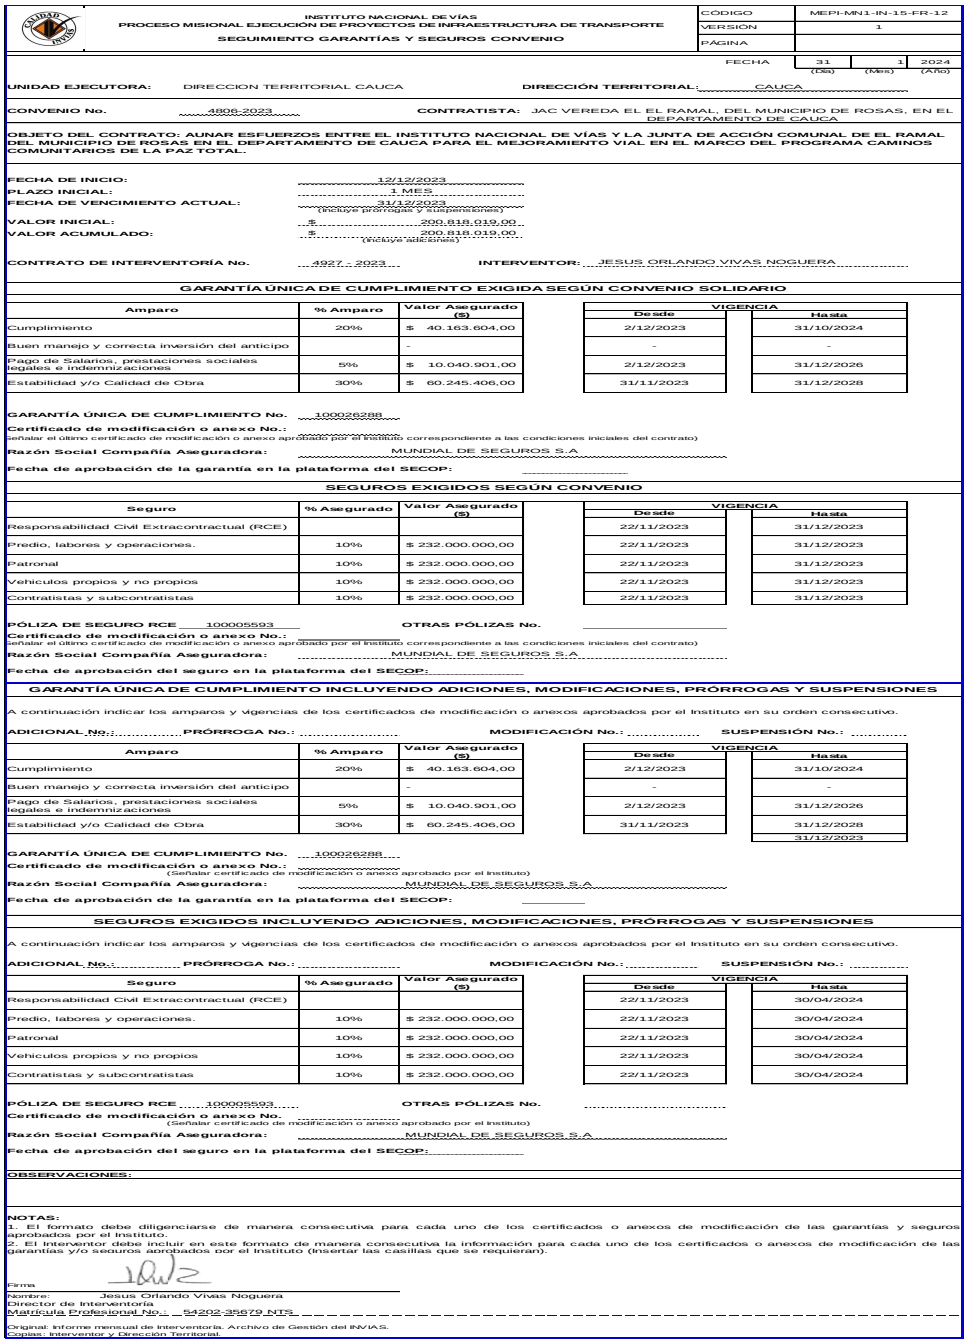

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4806-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL EL RAMAL, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prorrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.818.019,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.818.019,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.163.604,00	2/12/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.040.901,00	2/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.245.406,00	31/11/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1000262288
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100005593 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.163.604,00	2/12/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.040.901,00	2/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.245.406,00	31/11/2023	31/12/2028
				31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1000262288
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			22/11/2023	30/04/2024
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	22/11/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100005593 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se han entregado los documentos del plan de calidad por parte del contratista de obra a la interventoría.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	4927-2023
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
PLAZO INICIAL:	Tres meses
FECHA INICIO:	13/12/2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	31/12/2023
FECHA DE PRORROGA	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 90.710.302

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan

las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 49-44-101032611 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 13-31 de diciembre de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del convenio de obra N° 4927 de 2023

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✔ Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✔ Comités de seguimiento y control con la territorial de INVIAS.
- ✔ Seguimiento, control y aprobación de cuentas.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✔ Hasta el momento no se han realizado labores técnicas.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	30%

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

Hasta el momento no se han hecho movimientos financieros.

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 90.710.302,00

VALOR ACUMULADO: $ 90.710.302,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 101032611

Certificado de modificación o anexo No.: 0
último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 9.071.030,20	12/12/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 27.213.090,60	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 101032611

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 4927-2023 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega oportuna de la documentación solicitada, con el fin de avanzar lo más pronto en la ejecución de actividades de obra.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Hasta el momento no se han ejecutado actividades de obra.



Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
