CONTROL INFORMES CTO 2150-2024 SNR

INFORMES SEMANALES			CENTRO								ORINOQUIA	ANDINA	
			BOGOTA	CUNDINAMARCA		BOYACA		SANTANDER	HUILA		GUAVIARE	ANTIOQUIA	QUINDIO
			FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	FRENTE 7	FRENTE 8	FRENTE 9	FRENTE 10	FRENTE 11
			BOGOTA	AGUA DE DIOS	LA PALMA	SANTA ROSA DE VITERBO	GUATEQUE	CONVENCION	NEIVA	GARZON	SAN JOSE GUAVIARE	SANTO DOMINGO	FILANDIA
0	3-sep-24	martes											
1	10-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	17-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	24-sep-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	1-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	8-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	15-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	22-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	29-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	5-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	12-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	19-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	26-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	3-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	10-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	17-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	24-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	31-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			$ 213.115.377,00	$ 59.371.523,00	$ 126.341.463,00	$ 129.729.468,00	$ 140.521.985,00	$ 105.053.125,00	$ 200.238.984,00	$ 143.094.539,00	$ 202.730.968,00	$ 70.411.191,00	$ 46.740.812,00
			SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL	OFICINA ORIP AGUA DE DIOS (Cundinamarca)	OFICINA ORIP LA PALMA (Cundinamarca)	ORIP SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca)	ORIP GUATEQUE (Boyaca)	ORIP CONVENCION (Norte de Santander)	ORIP NEIVA (Huila)	ORIP GARZON (Huila)	ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)	ORIP SANTO DOMINGO (Antioquia)	ORIP FILANDIA (Quindio)

$ 1.437.349.435,00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 213.115.377,00
Valor Actualizado:	$ 213.115.377,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DOS SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN EL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES REMITIDA A LA INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE AVANZAR EL LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO IDONEO PARA CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR.

IMAGENES AVANCE



Comentario: TOMA DE MEDIDAS Y REVISION DE CANTIDADES PARA DAR ALCANCE AL BALANCE INCIAL



Comentario: VISITA TECNICA SEDE PRINCIPAL BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 213.115.377,00
Valor Actualizado:	$ 213.115.377,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024




Comentario: AREA DE INTERVENCION CIELO RASO PVC EN TABLILLA



Comentario: AREA DE INTERVENCION A DEMOLER PISO Y ALISTADO DE PISO TERRAZA PISO 3



Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA



Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PENARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 10 de septiembre de 2024 Al: 17 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: AGUA DE DIOS SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.371.523,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 59.371.523,00
Valor Actualizado:	$ 59.371.523,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA




AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DOS SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE.

IMAGENES AVANCE



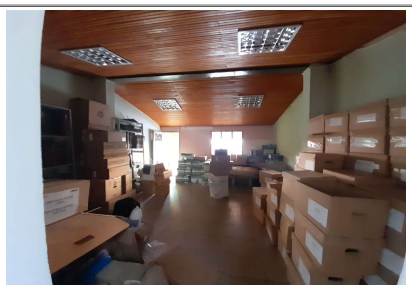

Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.371.523,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 59.371.523,00
Valor Actualizado:	$ 59.371.523,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024




Comentario:



Comentario:



Comentario:



Comentario:

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 126.341.463,00
Valor Actualizado:	$ 126.341.463,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DOS SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE.

IMAGENES AVANCE





SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 10 de septiembre de 2024 Al: 17 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: LA PALMA | SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 126.341.463,00
Valor Actualizado:	$ 126.341.463,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Comentario:


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


Comentario:




Comentario:



Comentario:



Comentario:



Comentario:

OBSERVACIONES

La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: AZ5202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 129.729.468,00
Valor Actualizado:	$ 129.729.468,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA





IMAGEN OFICINA




AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DOS SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE.

IMAGENES AVANCE





Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 129.729.468,00
Valor Actualizado:	$ 129.729.468,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024




Comentario:



Comentario:

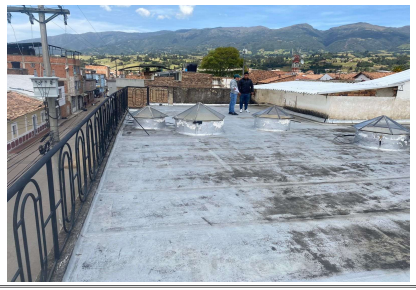

Comentario:



Comentario:

OBSERVACIONES

La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 140.521.985,00
Valor Actualizado:	$ 140.521.985,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE





Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 140.521.985,00
Valor Actualizado:	$ 140.521.985,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario:



Comentario:



Comentario:



Comentario:

OBSERVACIONES

La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 105.053.125,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 105.053.125,00
Valor Actualizado:	$ 105.053.125,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 10 de septiembre de 2024 Al: 17 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: CONVENCION | SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 105.053.125,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 105.053.125,00
Valor Actualizado:	$ 105.053.125,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES

La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.238.984,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 200.238.984,00
Valor Actualizado:	$ 200.238.984,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

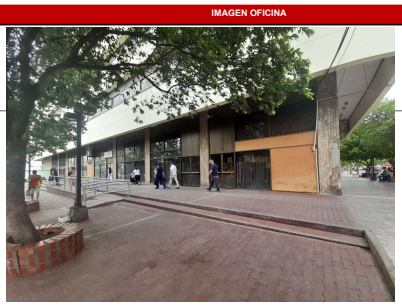





IMAGEN OFICINA

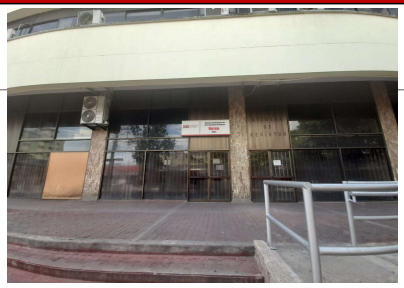


AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE



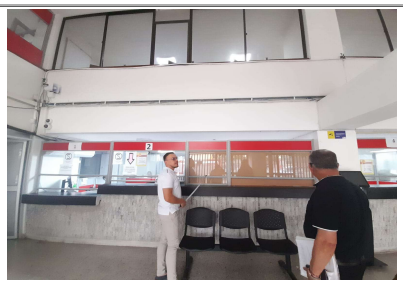

Comentario:

Comentario:

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.238.984,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 200.238.984,00
Valor Actualizado:	$ 200.238.984,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

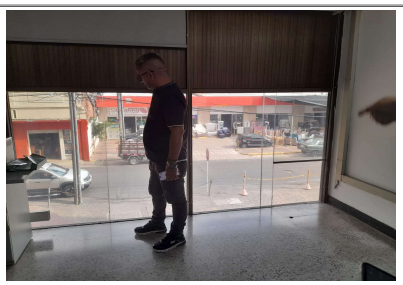

Comentario:



Comentario:

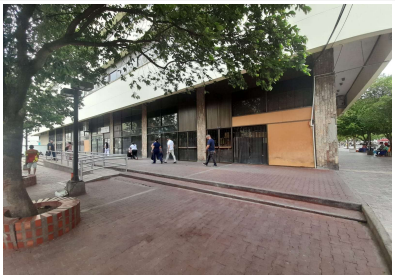

Comentario:



Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 143.094.539,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 143.094.539,00
Valor Actualizado:	$ 143.094.539,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

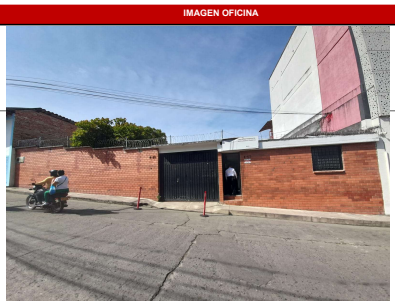


IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE





Comentario:

Comentario:

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 143.094.539,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 143.094.539,00
Valor Actualizado:	$ 143.094.539,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024







Comentario:

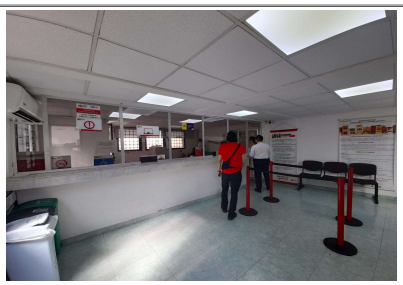

Comentario:

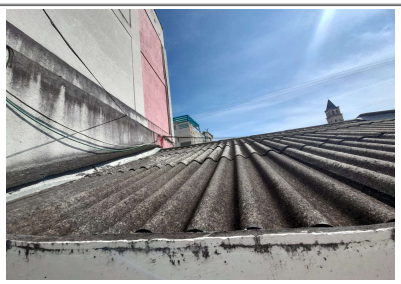

Comentario:

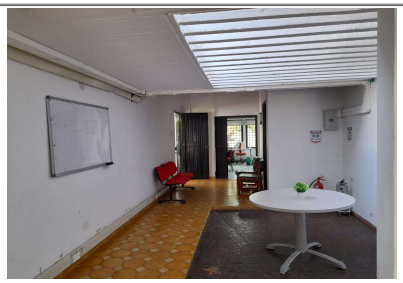

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 202.730.968,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 202.730.968,00
Valor Actualizado:	$ 202.730.968,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 10 de septiembre de 2024 Al: 17 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 202.730.968,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 202.730.968,00
Valor Actualizado:	$ 202.730.968,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 70.411.191,00
Valor Actualizado:	$ 70.411.191,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 70.411.191,00
Valor Actualizado:	$ 70.411.191,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **2** Del: **10 de septiembre de 2024** Al: **17 de septiembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **14** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 46.740.812,00
Valor Actualizado:	$ 46.740.812,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 10 de septiembre de 2024 Al: 17 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: FILANDIA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 46.740.812,00
Valor Actualizado:	$ 46.740.812,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098
