Reporte de Contrato SERVITRONICS union sistemas y energía Fecha: 26/10/2024 - Código: 82f797c7

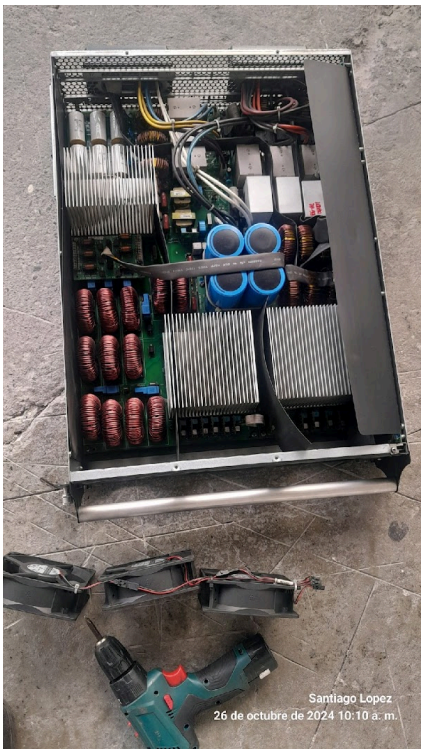
EQUIPO UPS						
Marca: Apc	Servicio: Mantenimiento Preventivo	Serie: PD0649260207	Modelo: Symmetra PX	Activo Fijo: P000014769	Capacidad: 40kva	Carga de máquina: 14

CLIENTE							
Cliente: PEOPLE CONTACT SAS	Contrato: 2024	Visita:	Encargado: Juan Carlos Gutierrez	Ciudad: Manizales	Dirección: Av 19 # 16-04	Sucrusal: Antigua terminal de transporte	Área: - Cuarto servidores

BATERÍAS	ACOMETIDA DE ENTRADA		ACOMETIDA DE SALIDA	
Total de baterías: 320	Tensión F1 F2: 215 VAC	Tensión F1 F3: 214 VAC	Tensión F1 F2: 208 VAC	Tensión F1 F3: 208 VAC
Número de Bancos: 10 Baterías por Banco: 32	Tensión F2 F3: 215 VAC	Tensión F1 N: 120 VAC	Tensión F2 F3: 209 VAC	Tipo de Acometida: Trifásica
Voltaje Nominal: -192	Tension F2 N: 121 VAC	Tensión F3 N: 120 VAC	Tensión F1 N: 120 VAC	Tensión F2 N: 120 VAC
Marca: FVL	Tensión N Tierra: VAC	Calibre: 1/0	Tensión F3 N: 2 VAC	Tensión N Tierra: 121 VAC
Referencia: 12v-7ah	Corriente F1: 15 Aac	Corriente F2: 14 Aac	Calibre Cable: 2	Corriente F1: 10 Aac
Voltaje Flotación: 218	Corriente F3: 15 Aac	Corriente Fase N: Aac	Corriente F2: 15 Aac	Corriente F3: 13 Aac
Corriente de Carga:	Corriente Tierra: Aac	DPS: Si	Corriente N: Aac	Tierra: Aac
Fecha instalación: 09/09/2019	Estado Visual: Bueno	Breaker de Entrada:	Llave Conmutable: No	Estado Visual: Bueno
Observaciones: Se recomienda cambiar baterías por tiempo de vida útil. referencia: 12V 7Ah	Observaciones de entrada: sin novedades		Breaker Salida: A tablero distribución de cargas	Observaciones de salida: Sin novedades

AMBIENTE	PRUEBAS	ACTIVIDADES
Humedad: Normal	Lista de pruebas: Prueba en modo Baterias , Normalización , UPS Trabajando con Carga , Descarga individual de Baterías	Lista de actividades: Mantenimiento Preventivo , Limpieza externa , Limpieza interna , Toma de lecturas , Inspeccion de componentes
Temperatura: Normal	Observaciones:	Resultados: Se realiza mantenimiento preventivo. Limpieza general. Ajustes de conexiones. Se hace el cambio de un ventilador a módulo de potencia N/S: PD0716131640. se le recomienda cambiar juego de ventiladores de referencia NMB-MAT // 4715KL-05W-B40 // 24VDC. A modulo de potencia N/S: PD0716131627 ya que tienen ruido. Se hace lubricacion a todos los ventiladores ok. Se hace pruebas de funcionamiento en run time y en línea OK. La ups queda funcionando bien y sin fallas presentes Se recomienda cambiar baterías por tiempo de vida útil, ya que algunos módulos ya tienen baterías malas y presentan bajo voltaje.
Condiciones normales		
Pendientes: SI	Cotizar suministro e instalación de baterías	

Tecnico: Santiago Lopez	Acompañantes:	Encargado: Juan Carlos Gutierrez	Correo:	

FOTOGRAFÍA DEL REPORTE		
		
		

Santiago Lopez 26 de octubre de 2023 12:00 p. m.		
