	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA NIT. Calle 4 N° 6 - 68 Código Postal: 415040 Tel. 837 80 31 - alcaldia@paicol-huila.gov.co INFORME DE SUPERVISIÓN	Version 1.0 Fecha: 01-03-24024 CÓDIGO: GG-120-18.09 Pagina 1 de 1	mipg

Fecha de Elaboración	24/12/2024
Supervisor del contrato	ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	179 de 2024	**Tipo de Contrato**	INTERADMINISTRATIVO	**Modalidad**	CONTR. DIRECTA	**Valor**	$205.368.311	**Plazo**	1 MES 16 DÍAS
Objeto del contrato	"REALIZAR LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA."								
Contratista	EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A.E.S.P (EMPTESALIA)			**NIT.**	900332875-7	**Representante Legal**		EDISSON ANDRES PALMA CHAVEZ.	
Fecha suscripcion contrato	14/11/2024	**CDP N°**	2024000489	**RP N°**	2024000811	**Banco de proyectos N°**		2024415180039.	
Póliza Cumplimiento N°	560-47-994000184445	**Póliza Respons. Civil N°**		N.A.		**Fecha aprobación pólizas**		16 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Fecha acta inicio	16 DE NOVIEMBRE DE 2024			**Fecha de Terminación**		17 DE DICIEMBRE DE 2024			

Forma de pago: El Municipio de Paicol pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, de la siguiente manera: (A.) Un Pago Anticipado equivalente al 50% del valor del contrato, correspondiente a la suma de CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($102.684.155,50) M/CTE., IVA INCLUIDO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, pagaderos al momento de la suscripción del Acta de Inicio. (B.) Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato, correspondiente a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($82.147.324,4) M/CTE., IVA INCLUIDO, al cumplimiento del 70% de las actividades previstas en el contrato, previa presentación de cuenta de cobro respectiva, el certificado de servicios prestados a satisfacción, expedida por el supervisor designado, la acreditación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, según corresponda y los demás requisitos legales y convencionalmente previstos a tal efecto. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. (C.). Un último pago equivalente al 10% del valor del contrato correspondiente a la suma de VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON UN CENTAVO ($20.536.811,1) M/CTE., IVA INCLUIDO, con el recibo de informe final a satisfacción del servicio contratado y la respectiva Acta de Liquidación, firmada por el Supervisor del Contrato. En todo caso el desembolso de estos dineros queda sujeto a la disponibilidad de los recursos aprobados en el presupuesto Municipal. Para todos los pagos se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con las Leyes 828/2003, 1122/2007, en concordancia con el Artículo 23, de la Ley 1150 y demás normas reglamentarias y complementarias.
El cobro de las estampillas se realizará por parte de del contratista, a sus proveedores o contratistas, en cada pago realizado le girará al Municipio de Paicol.

MODIFICACIONES

Modificaciones	**SI**		**NO**	x				
Tipo de modificación	**Fecha**			**Detalle de la modificación**				
Modificación cantidades y adición de plazo	N.A.			**Otrosi N°**	N.A.	**Prorroga N°**	N.A	
Prorroga N° 01 - Otrosí N° 01	N.A.			**Tiempo adicional**	N.A.			
Suspensión N° 01	N.A.			**Tiempo total**	N.A.			
Reinicio	N.A.			**Otrosi N°**	N.A.	**Prorroga N°**	N.A	
Prorroga N° 02 - Otrosí N° 02	N.A.			**Tiempo adicional**	N.A.			
				Tiempo total	N.A.			

Fecha acta de liquidación	N.A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato	$205.368.311,00				
A) PAGO ANTICIPADO					
Porcentaje anticipo	50%	**Fecha acta Parcial/Final**	N.A.	**Cuenta cobro**	Anticipo
Valor del anticipo	**$ 102.684.155,50**	**(%) De Ejecución**	N.A.	**Fecha cuenta cobro**	19/11/2024

B) Pago Parcial N° 01:					
Periodo Objeto de pago	16/11/2024 al 13/12/2024				
Acta Parcial/Final	ACTA PARCIAL N° 01	**Fecha acta Parcial/Final**	13/12/2024	**factura N°**	157
Valor Acta	**$184.831.480,00**	**(%) De Ejecución**	90,00%	**Fecha factura**	18/12/2024
Amortización (50%)	**$102.684.155,50**				
Valor a pagar en la presente Acta	**$82.147.324,50**				

RESUMEN

Descripción	Valor	Valor pagado	Amortización	Saldo
Valor inicial del contrato	$205.368.311,00			$205.368.311,00
Valor Pago Anticipo		$102.684.155,50		
Valor acta Parcial N° 01		$184.831.480,00	$102.684.155,50	$20.536.831,00

Valor acta Parcial N° 02				
Valor acta Parcial N° 03				
Totales	**$205.368.311,00**	**$184.831.480,00**	**$102.684.155,50**	**$20.536.831,00**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se recibe a satisfacción por parte de la Secretaria de Planeación y obras Públicas la ejecución del 90% del contrato, tal como se muestra en el Acta Parcial N° 01 de fecha 13 de diciembre de 2024.

La Secretaria de Planeación y Obras Públicas, certifica que se ha realizado supervisión al Contrato Interadministrativo N° 179 de 2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA", verificando su cumplimiento conforme a lo estipulado en el presupuesto oficial, con responsabilidad y cumpliendo con lo estipulado en el proceso de contratación, en el periodo comprendido desde 16/11/2024 al 13/12/2024.

OBSERVACIONES

A la fecha de cierre del periodo de ejecución del presente informe de Supervisión, se recibe a satisfación la ejecución del 90% del contrato Interadministrativo.


El Contratista ha cumplido a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.

En cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA - GARANTIA., del contrato, se verifica la existencia de la garantía de cumplimiento, la cual se encuentra constituida y aprobada desde el día Dieciseis (16) de noviembre de 2024.

El pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de las planillas adjuntas al presente informe, han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



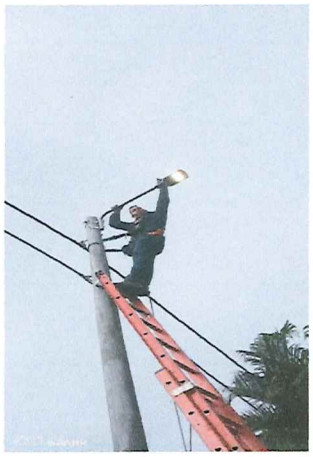


El Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo N° 179 de 2024, aclara que el avance financiero y lo establecido en el presente Informe, concuerda con la información reportada por el Contratista de obra, a fecha del trece (13) de diciembre de 2024 donde se reportó avance del 90%.

Firma Supervisor del Contrato

Nombre **ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS**

Secretario de Planeación y Obras Públicas
