

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1	**CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL**	**337 días**			**$ 3,937,927,705.27**
2	**INICIO DE OBRA**	**0 días**		**4**	**$ 0.00**
3	**PRELIMINARES**	**62 días**			**$ 204,694,253.58**
4	CERRAMIENTO PROVISIONAL	2 días	2	5	$ 6,450,873.52
5	CAMPAMENTO	1 día	4	6	$ 7,010,000.00
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	5	13	$ 6,673,348.33
7	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	17 días	12	8;69;27CC	$ 33,532,030.49
8	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	9 días	7	17	$ 61,415,472.44
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	2 días	21	167	$ 43,727,280.09
10	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA	6 días	15	11	$ 7,592,220.68
11	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO	6 días	10	12	$ 27,937,520.45
12	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (cimentaciones existentes)	6 días	11	7	$ 886,588.12
13	DESMONTE DE CUBIERTA	12 días	6	14	$ 7,563,739.46
14	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS	1 día	13	15	$ 413,592.00
15	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	1 día	14	10	$ 1,491,588.00
16	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	**215 días**			**$ 496,009,029.29**
17	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI	4 días	8	19	$ 6,343,535.44
18	CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI	17 días	22CC+1 día	62FF-1 día;80	$ 39,273,719.18
19	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	12 días	17	23	$ 81,202,108.79
20	CONCRETO ESCALERAS	12 días	25	57	$ 13,480,835.11
21	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA	9 días	27CC+3 días	9	$ 45,551,130.93
22	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA	54 días	23;28	24CC+8 días;	$ 47,853,906.64
23	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	41 días	19	22;28	$ 25,862,619.20
24	VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PLACA DE ENTREPISO	55 días	22CC+8 días	25FF-10 días	$ 145,812,097.40
25	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	23 días	24FF-10 días	127;122;20;3	$ 90,629,076.60
26	**ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA**	**295 días**			**$ 1,262,865,443.63**
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Fy: 60000 PSI	225 días	7CC	21CC+3 días;115;152	$ 525,020,892.47
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	70 días	23	63CC;22	$ 52,158,700.75
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS Y CUBIERTA CANCHA	35 días	152CC+5 días	126FF-2 días;31FC-12 días;98	$ 685,685,850.41
30	**CUBIERTA**	**69 días**			**$ 340,006,465.62**
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PHR-C 220x80x2,5 mm	17 días	29FC-12 días	33FF+1 día	$ 100,719,938.88
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PHR-C 305X80X2,0 MM)	17 días	36	33	$ 39,948,723.80
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA THERMOACUSTICA TIPO CINDU O SIMILAR	9 días	32;31FF+1 día	76FF;129FF;1	$ 168,395,329.74
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y LAMINAS DE DRYWALL	3 días	48	97FF;151FF	$ 30,942,473.20
35	**MAMPOSTERIA,PAÑETE,PISOS,ENCHAPES,PINTURA**	**84 días**			**$ 304,885,546.87**
36	MUROS EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10	23 días	25	37;49;102FF;	$ 41,485,515.60
37	LIEALES EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10	5 días	36	38;40	$ 5,418,636.48
38	PAÑETE LISO PARA MUROS EN MORTERO 1:3	20 días	37	39FF	$ 35,046,418.31
39	PAÑETE LISO PARA MUROS EN MORTERO 1:3	7 días	38FF	41FF+2 días;	$ 4,786,801.92
40	MORTERO AFINADO PARA PISO 1:3 e= 5 CMS	19 días	37	42;77	$ 23,782,496.92
41	FILOS Y DILATACIONES	9 días	39FF+2 días	43	$ 25,274,133.19
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA DURO PISO O SIMILAR 30X30CM	1 día	40	44	$ 1,786,610.57
43	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA 20x20 CMS TIPO EGEO O SIMILAR (BAÑOS Y CAFETERIA) H =2 M	11 días	41	71	$ 7,854,754.38
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSÍN DE GRANO DE MARMOL 30X30CM	23 días	42	45	$ 65,256,515.65
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA BALDOSÍN DE GRANO DE MARMOL 30 CM	11 días	44	136	$ 30,292,031.82
46	CONCRETO DE PISO ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIÓN POR CORTADORA PARA CONCRETO A 1/4 DE ESPESOR DE PLACA e= 12CM	23 días	25	167	$ 25,354,729.40
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	6 días	56FC-2 días	48FF+1 día	$ 13,063,511.19
48	PINTURA SOBRE MURO	7 días	47FF+1 día;10	34;72;105;90	$ 16,951,456.75
49	ALFAJIAS	1 día	36	167	$ 7,500,225.45
50	SUMNISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA GRADERIA CANCHA Y ESCALERAS	1 día	152	167	$ 1,031,709.24
51	**CARPINTERÍA METÁLICA Y OTROS**	**44 días**			**$ 222,274,472.56**
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS COLD ROLLED CAL. 20 CON MARCO (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y CERRADURA) TIPO P3 Y P4 SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	7 días	39	53	$ 6,621,154.05
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS TIPO PERSIANA SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO TIPO V4, V6 Y V7	4 días	52	54	$ 14,301,748.73
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO FIJA Y DESLIZABLE EN VIDRIO CON MARCO Y PERSIANA SUPERIOR TIPO V1 Y V2 SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	9 días	53	55	$ 82,758,072.00

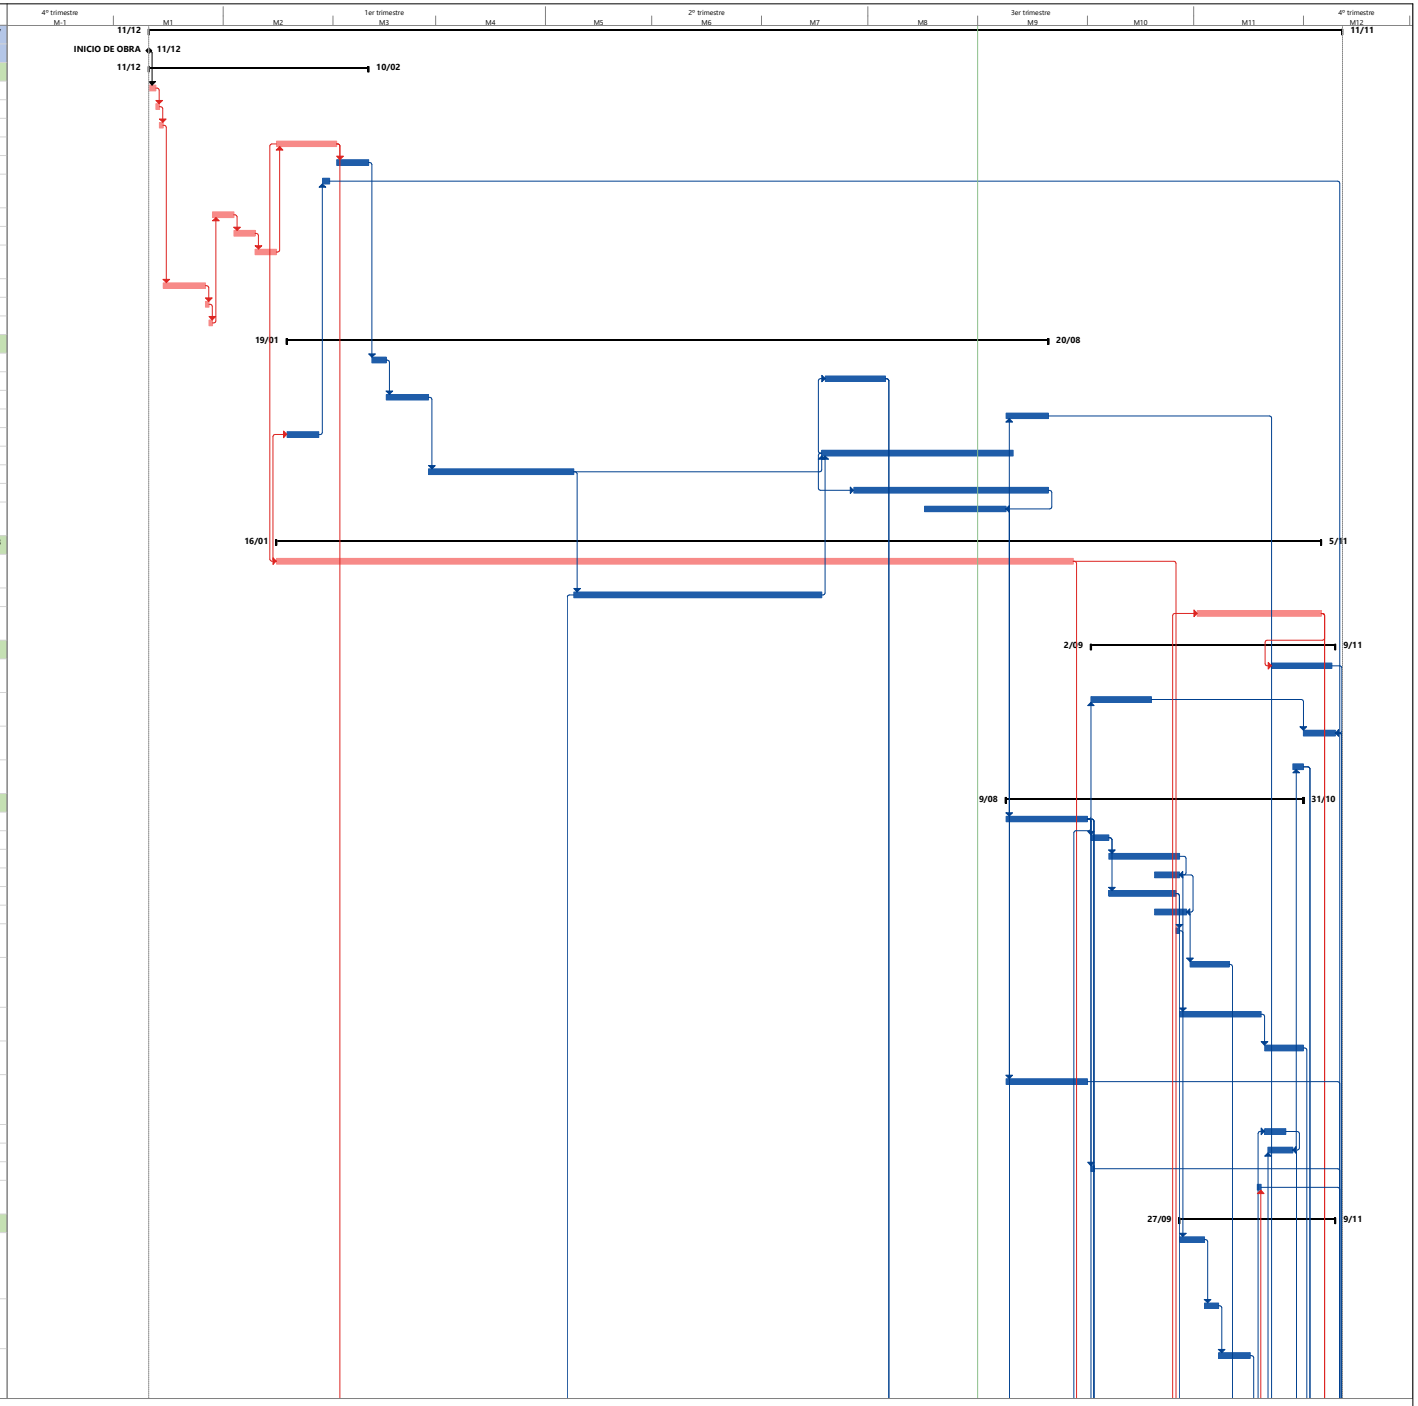

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: jue 1/08/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Costo
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO EN VIDRIO CON MARCO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO TIPO V3	2 días	54	56	$ 3,605,564.16
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS COLD ROLLED CAL. 20 CON MARCO Y PERSIANA SUPERIOR (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y CERRADURA) Y VENTANA FIJA LATERAL TIPO P1 Y P2 SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	4 días	55	57;47FC-2 días	$ 35,234,321.81
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TIPO BARANDAL RAMPA Y ESCALERAS	4 días	56;20	58	$ 45,610,155.93
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO DOBLE DE ANCLAR A PARED PARA RAMPA	3 días	57	59	$ 7,878,248.88
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS	6 días	58	60	$ 18,624,215.00
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL COLEGIO	4 días	59	167	$ 7,640,992.00
61	**RED SANITARIA**	**282 días**			**$ 133,634,057.86**
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL DE 12"	1 día	18FF-1 día	65CC	$ 3,933,295.40
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	1 día	28CC	64CC;66FF;73	$ 4,916,869.64
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	1 día	63CC	67FF	$ 158,246.97
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PLUVIAL DE 6"	1 día	62CC	74CC	$ 10,443,960.00
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4"	1 día	63FF;73	71	$ 721,308.00
67	SUMINISTRO E INSTALACION DEPUNTO SANITARIO DE 2"	1 día	64FF;73	68FF	$ 1,024,374.00
68	SUMINISTRO E INSTALACION DEREJILLA PARA SIFÓN PVC 3"x2"	1 día	67FF	75	$ 130,209.00
69	CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS DE 0,8X0,8 m	1 día	7	70CC;134	$ 4,534,128.00
70	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 0.80x0.80x0.80 m	1 día	69CC	71	$ 4,048,124.00
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE COMPLETO INSTALADO	1 día	70;66;82;43	108	$ 2,035,485.00
72	LAVAMANOS DE INCRUSTAR-SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	48	110	$ 1,392,626.00
73	CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	1 día	63CC	66;67	$ 6,398,367.98
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6"	5 días	65CC	167	$ 49,896,289.32
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA VENTILACION 2"	1 día	68	167	$ 498,975.92
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 D= 60 CM INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA MAS ACABADO EN PINTURA EPOXICA	3 días	33FF	167	$ 24,325,840.63
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CÚPULA DE 6"	1 día	40	167	$ 1,092,708.00
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CUNETA PERIMETRAL CANCHA	1 día	135;152	117	$ 18,083,250.00
79	**RED HIDRÁULICA**	**4 días**			**$ 1,594,533.26**
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 3/4"	1 día	18	81;84	$ 397,336.18
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"	1 día	80	82;83	$ 142,285.08
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	1 día	81	71	$ 603,006.00
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE INTERRUPCIÓN DE 1/2"	1 día	81	167	$ 294,304.00
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE INTERRUPCIÓN DE 3/4"	1 día	80	167	$ 157,602.00
85	**ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN**	**2 días**			**$ 843,804.00**
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDIDA	1 día	146	87	$ 353,401.00
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M EN COBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG	1 día	86	88CC	$ 440,678.00
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M EN COBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG	1 día	87CC	147	$ 49,725.00
89	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN**	**72 días**			**$ 114,664,127.12**
90	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA KIT LED PANEL SQ DE 45W NW DE SYLVANIA O SIMILAR	1 día	94;48	91CC	$ 3,849,984.00
91	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED RECTANGULAR 52 W 120X30 TIPO LED DE SYLVANIA O SIMILAR	5 días	90CC	92CC	$ 31,265,712.00
92	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R3 DE 2X1W.	1 día	91CC	93CC	$ 4,617,149.00
93	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO	1 día	92CC	167	$ 330,110.00
94	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE 14 AWG	4 días	96CC+1 día	90;97	$ 18,500,652.00
95	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO PVC 1 DE 3/4"	5 días	36FF	96CC	$ 41,767,516.00
96	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO EMT DE 3/4"	1 día	95CC	94CC+1 día	$ 4,946,706.12
97	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DE 12 W	1 día	94;34FF	124	$ 551,730.00
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE LED SYLVANIA HIGH BAY 100W GC16	1 día	29	166	$ 8,834,568.00
99	**SALIDAS DE POTENCIA**	**8 días**			**$ 43,755,859.20**
100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE CON POLO A TIERRA, RED NORMAL	1 día	101	103FF	$ 2,886,786.00
101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG	4 días	102	100	$ 22,217,265.00
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC 1 DE 3/4"	2 días	36FF	101	$ 18,124,120.20

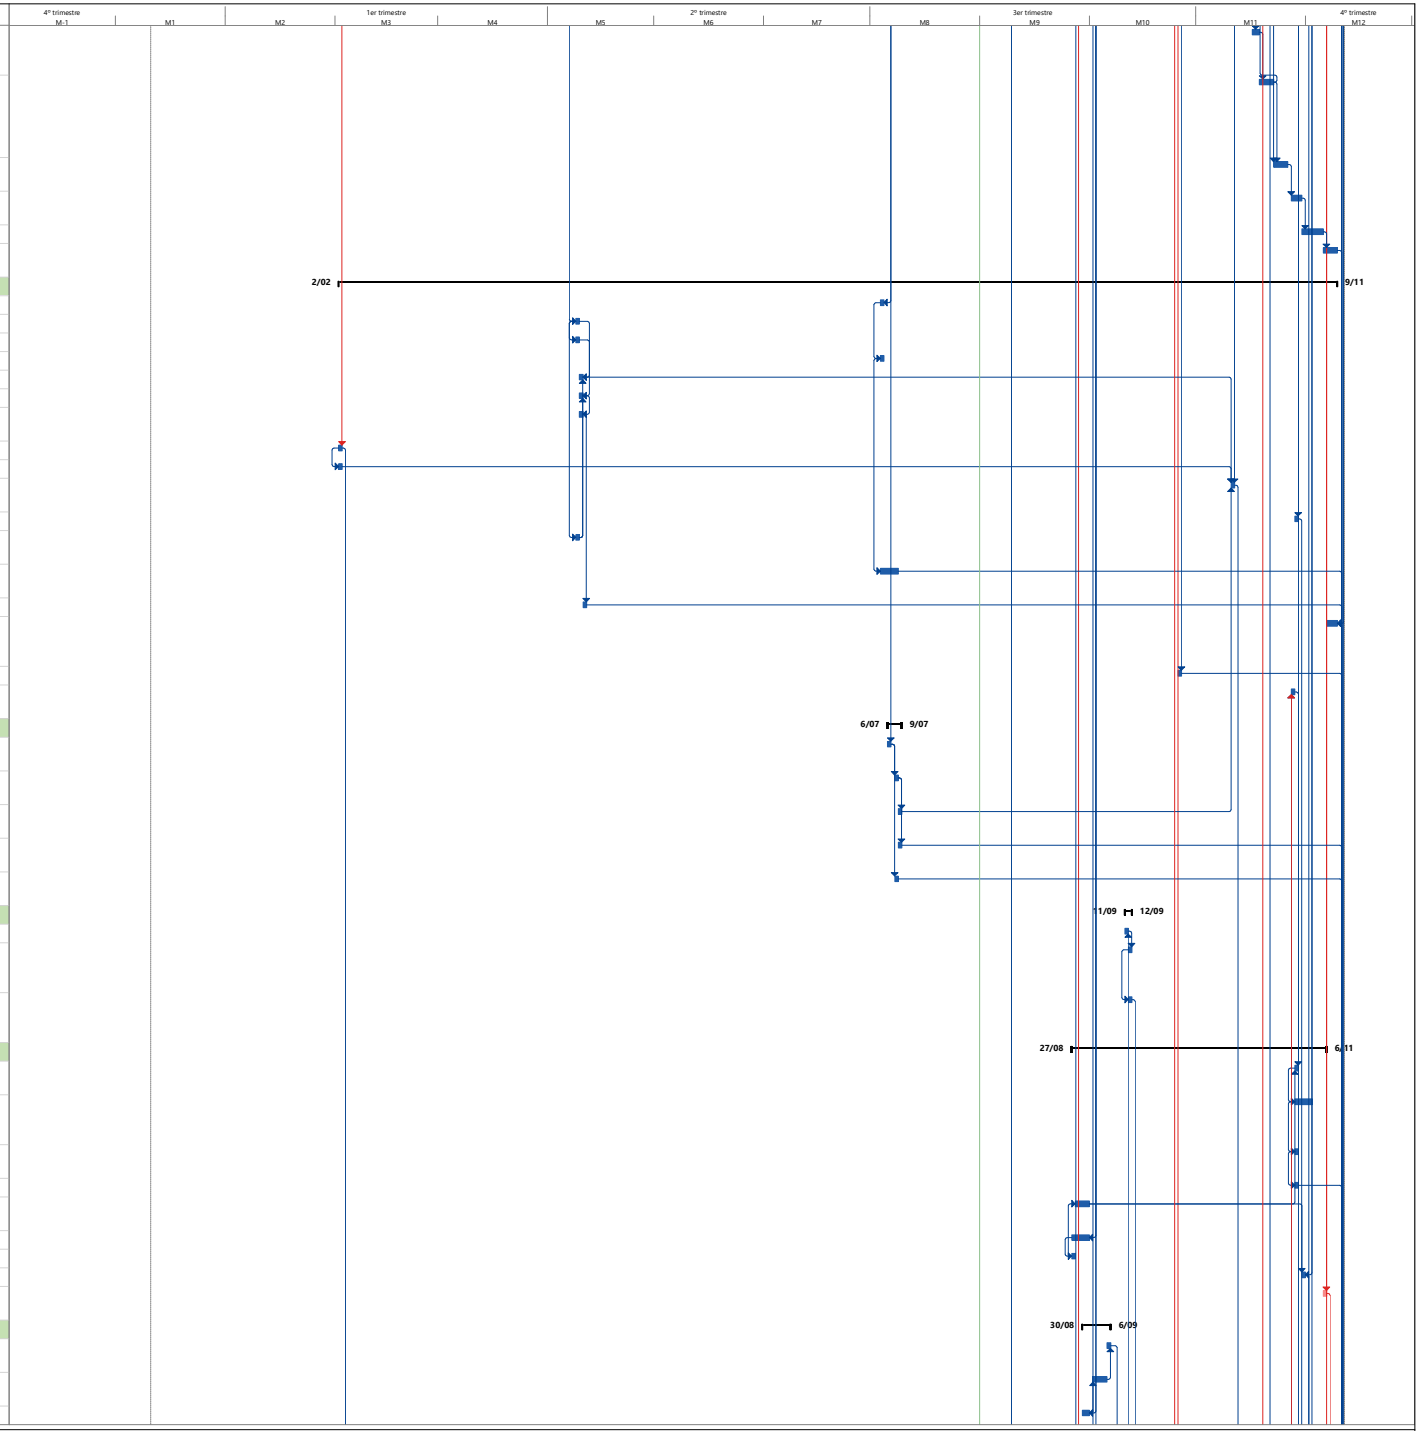

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: jue 1/08/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Costo
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI	1 día	100FF	48	$ 527,688.00
104	**COMUNICACIONES**	**1 día**			**$ 1,260,188.00**
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TELEFONÍA Y DATOS	1 día	48	106CC	$ 1,041,612.00
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TELEVISIÓN	1 día	105CC	167	$ 218,576.00
107	**VARIOS**	**19 días**			**$ 4,287,068.20**
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERAS PARA BAÑOS	1 día	71	109CC	$ 369,987.00
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA PAPEL HIGIENICO	1 día	108CC	167	$ 119,418.00
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS	1 día	72	111CC	$ 3,158,642.00
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERAS	1 día	110CC	112CC	$ 274,722.00
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS	1 día	111CC	167	$ 364,299.20
113	**POLIDEPORTIVO Y ZONA DE JUEGOS**	**71 días**			**$ 177,657,379.28**
114	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR	17 días	115	152	$ 33,158,544.90
115	NIVELACION Y COMPACTACION DE PISOS	11 días	27	114	$ 12,537,466.78
116	DEMARCACIÓN PLACA DEPORTIVA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS DE BALONCESTO, VOLEYBOL Y MICROFUTBOL	3 días	117	118	$ 12,580,209.12
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LOSA DE POLIDEPORTIVO TIPO EPOXICA O SIMILAR	4 días	78;152	116	$ 27,242,328.40
118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ESTRUCTURAS INTEGRADAS EN PORTERÍAS PARA MICRO-FÚTBOL DE 3,0 M X 2,0 M X 1,5 M Y TABLERO DE BALONCESTO CON SU RESPECTIVO ARO Y RED CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS, FABRICADO EN: TUBERÍA NEGRA	1 día	116	120CC	$ 21,693,094.00
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGOS DEPORTIVOS	1 día	120CC	167	$ 52,567,334.00
120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO RECICLADO PARA ZONA DE JUEGOS E:1CM	2 días	118CC	119CC	$ 17,878,402.08
121	**NO PREVISTOS - PRELIMINARES**	**281 días**			**$ 588,238,176.80**
122	DESMONTE Y RETIRO DE POZO SÉPTICO, DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE Y DESCONEXIÓN DE REDES SANITARIAS CONECTADAS AL POZO EXISTENTES	6 días	25	130;123	$ 6,139,413.43
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO 9.000 LITROS Y REINSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	12 días	122	167	$ 30,582,289.82
124	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON DESCANSO (INCLUYE DEMOLICIÓN DE BARANDAS METÁLICAS)	1 día	97	125	$ 1,802,359.57
125	DESMONTE BEBEDEROS DE AGUA (NO INCLUYE REINSTALACIÓN)	1 día	124	167	$ 455,314.19
126	COLUMNA DE 4000 PSI	5 días	29FF-2 días	167	$ 3,065,301.53
127	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA DE RAMPA	18 días	25		$ 26,788,434.45
128	ANCLAJE EPÓXICO PERFORACIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 20 CM (NO INCLUYE VARILLA DE ACERO)	5 días	36FF	167	$ 12,181,214.60
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.26. LONGITUD DE DESARROLLO = 40 cm	3 días	33FF	167	$ 3,877,599.77
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PTE 100X200X4,0 MM	23 días	122;33FF	167	$ 96,644,875.32
131	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	5 días	36	132	$ 1,785,109.85
132	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES	18 días	131	167;133	$ 26,619,260.12
133	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIORES	17 días	132	167	$ 22,192,009.45
134	CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS DE 1,0X1,0 m	8 días	69	167	$ 944,610.00
135	CAÑUELA PARA CANCHA	8 días	152	78	$ 3,191,296.95
136	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAPLATOS Y GRIFERÍA L=4,45 m	2 días	45	137	$ 7,308,828.46
137	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR	2 días	136	167	$ 1,649,916.69
138	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA DE 1.5 METROS INCLUYE BASE PARA PUNTA , BASE AISLADA DE POLIAMIDA Y ACCESORIOS DE MONTAJE	4 días	148	139	$ 6,402,479.07
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8mm , INCLUYE CONECTOR EN CRUZ ALUMINIO-ALUMINIO Y COBRE -ALUMINIO ,ACCESORIOS DE MONTAJE	4 días	138	140	$ 12,242,485.56
140	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN CABLE DE COBRE 1/0 ELECTROLITICO DESNUDO INCLUTE TUBERIA IMC TIPO PESADO DE 3/4 ,CONECTOR EN CRUZ DE CU-AL,CAJA DE PASO PALASTICA Y DEMAS ACCESORIOS DE MONTAJE	12 días	139	141	$ 23,976,796.85
141	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PERIMETRAL PARA DESCARGA DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE ASCESORIOS DE MONTAJE NO INCLUYE ESCAVACION	4 días	140	142	$ 18,512,481.68
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE COBRE DE 2.40 METROS PARA SISTMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE CAJA DE PASO, SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIOS DE MONTAJE	4 días	141	167	$ 7,834,536.55
143	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN BIFÁSICA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION: 2X2F+1X2N+1X6T CU AISLAMIENTO THHN 600V	4 días	36FC-2 días	144	$ 8,268,008.75

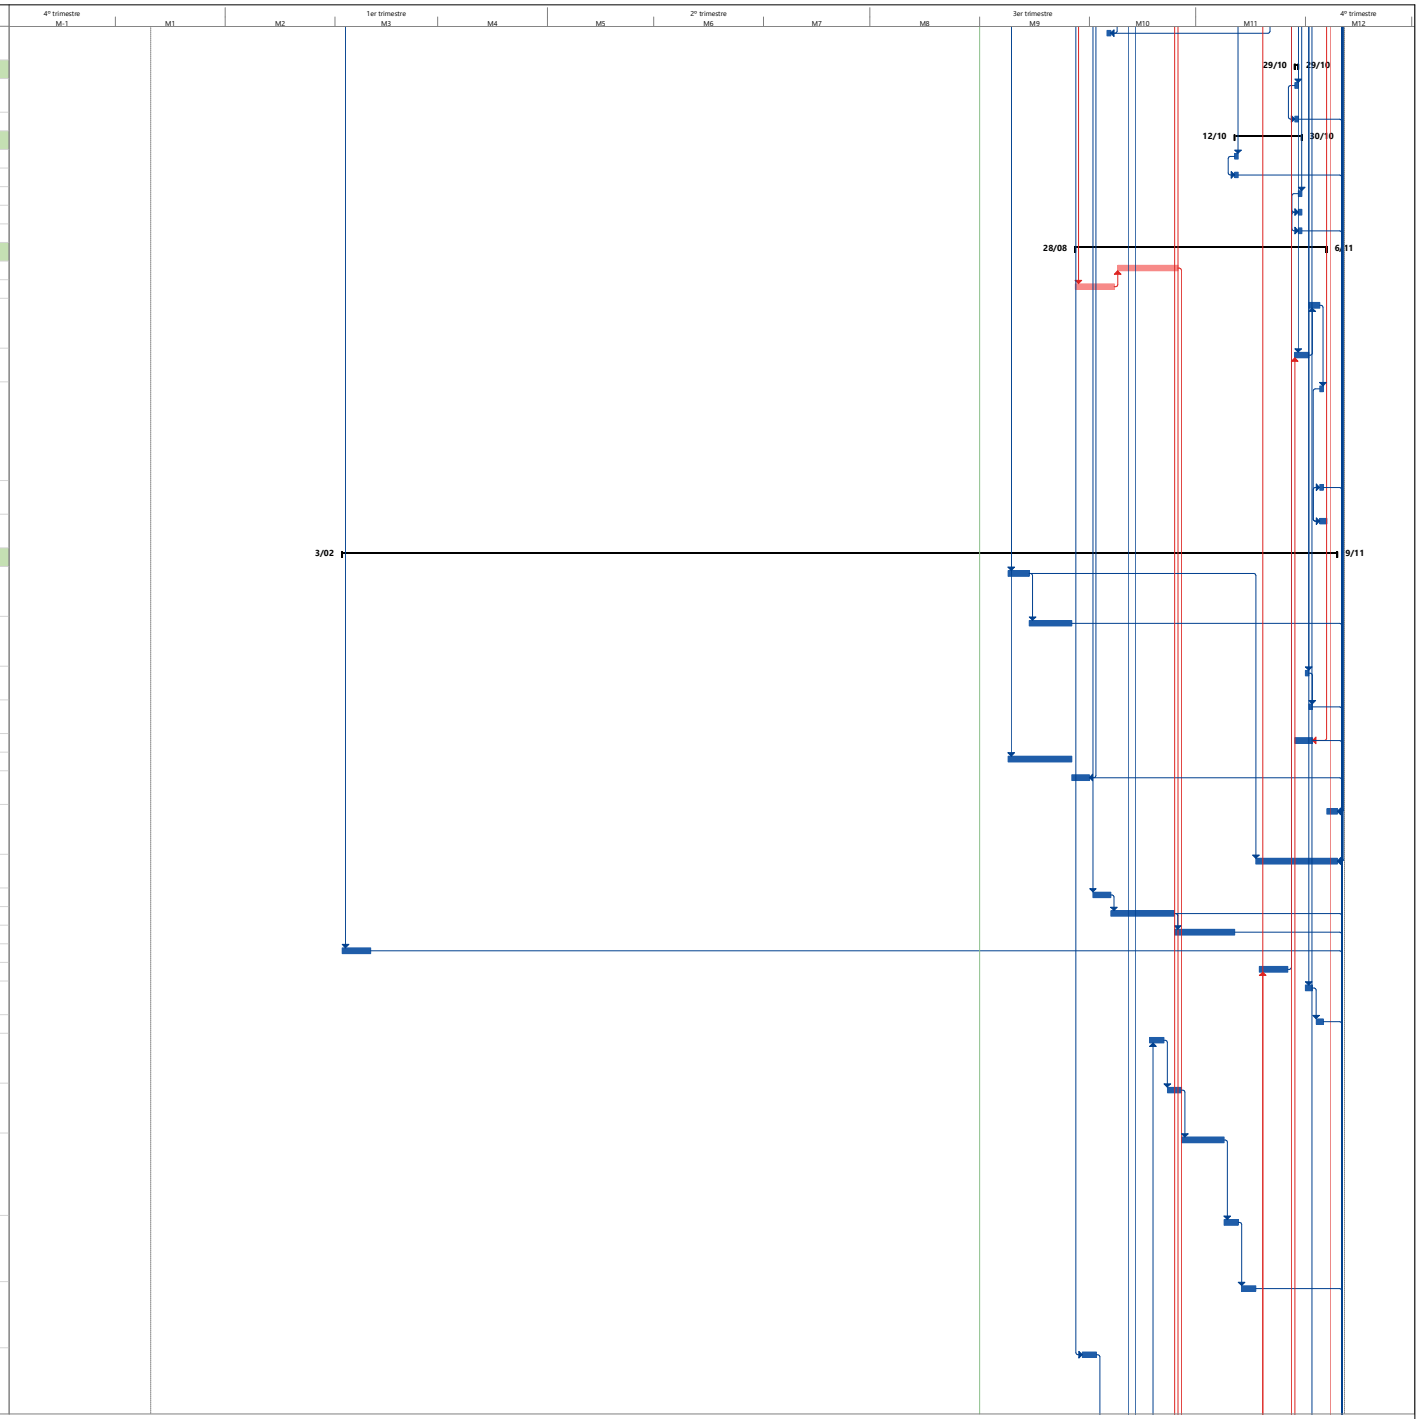

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: jue 1/08/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Costo
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC 2 X2" DESDE PUNTO CONEXIÓN-TP1 (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENO)	3 días	143	145	$ 5,016,922.85
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGÍA BIFÁSICO DE POTENCIA ACTIVA CLASE 1	4 días	144	146	$ 425,707.25
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIÓN TP1 ACTI9 IC60N, 2 POLOS, 63 A, 10 KA O SIMILAR	1 día	145	86	$ 182,090.26
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TP1 DE 24 CIRCUITOS BIFÁSICO CON BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA. INCLUYE TRECE PROTECCIONES 1X20A, CUATRO PROTECCIONES DE 1X15 A	2 días	88	148	$ 1,435,050.00
148	CAJA DE PASO PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN MAMPOSTERIA DE 0.6x0.6x0.8m Y DEMAS ACCESORIOS DE MONTAJE (INCLUYE TAPA MARCO EN ANGULO DE 3/16 Y TAPA EN CONCRETO ARMADO)	2 días	147	138;149	$ 1,900,422.91
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES POR B.T TRANSITORIA Y PERMANENTES DPS ABB de 40KA - 230V Tipo OVR T2 3N 40-275 P QS - Ref: 2CTB803973R1100 (INCLUYE ENVOLVENTE)	3 días	148	167	$ 1,878,586.81
150	DESCONEXIÓN, TRASLADO Y RECONEXIÓN DE POSTE CON MEDIDOR DE ENERGÍA DISTANCIA ENTRE 20 Y 30 METROS (INCLUYE TRÁMITE CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES)	15 días	152CC	166;159	$ 19,471,984.20
151	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA INTERIOR	3 días	34FF	166	$ 3,368,347.83
152	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI PISO POLIDEPORTIVO e=10 cm (NO INCLUYE VARILLAS DE TRANSFERENCIA)	23 días	114;27	117;78;29CC días;135;50;1	$ 143,247,012.79
153	TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS - REF: TRP212T (INCLUYE BREAKER, TOTALIZADOR Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMINETO)	6 días	156CC	160CC	$ 2,347,683.87
154	UPS BIFASICA ONLINE DE 10 KVA CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 7-15 MINUTOS. (PRETEL)	11 días	160	155CC	$ 19,808,226.65
155	RACK DE SOBREPONER EN MURO PARA 48 SALIDAS DE DATOS (INCLUYE REGLETA DE CONEXION DE 6 TOMAS, ACOMODADORES, 2 PATCH PANEL 24 PUERTOS HORIZONTALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	3 días	154CC	161	$ 6,104,117.17
156	TRANSFERENCIA MANUAL CON MUELETILLA DE 2*63 AMP EN CAJA IP55 CON PILOTOS DE SEÑALIZACION RED-UPS / CARGA	6 días	158	153CC	$ 1,595,178.03
157	ALIMENTADOR EN CABLE 2*6+6+8 AWG LSZH EN DUCTO IMC DE 1" DESDE TDG A CLAVIJA DE INDUSTRIAL DE 50 AMP "220 V 2P4H" Y DESDE TDG TA HASTA TRANSFERENCIA MANUAL (INCLUYE TUBERIA IMC – CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)	6 días	159CC	158CC	$ 4,281,563.04
158	ALIMENTADOR EN CABLE 2*6+6+8 AWG LSZH EN DUCTO EMT DE 1" DESDE TDG A CLAVIJA DE INDUSTRIAL DE 50 AMP "220 V 2P4H" Y DESDE TDG TA HASTA TRANSFERENCIA MANUAL (INCLUYE TUBERIA EMT – CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)	6 días	157CC	156	$ 1,006,765.74
159	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ENCAUCHETADO 4*8 EXTRAFLEXIBLE. (INCLUYE CORAZA LIQUID TIGHT – CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)	6 días	150	157CC	$ 1,236,173.55
160	SALIDA PARA TOMA REGULADO (INCLUYE TUBERIA EMT-CAJA RAWELT, CABLEADO TRENZADO 3*12 LSZH-Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION)	6 días	153CC	154	$ 7,334,592.20
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS (INCLUYE MARQUILLAJE EN SALIDA - RACK, TUBERIA EMT DE 3/4 Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO " NO INCLUYE SUMINISTRO E ISNTALACION DE JACK - NO INCLUYE CERTIFICACION	12 días	155	162FF	$ 31,385,503.86
162	SUMINISTRO Y INSTALACION DE JACK AZUL CAT 6A PARA SALIDA DE PUNTO DE DATOS (INCLUYE LA PONCHADA DEL JACK EN LA SALIDA DE PUNTO Y EN EL RACK)	6 días	161FF	163FF	$ 7,740,361.45
163	SUMINISTRO -INSTALACION DE PATCH CORD CAT. 6A (3 MTS) AZUL	3 días	162FF	164FF	$ 3,869,057.44
164	SUMINISTRO -INSTALACION DE PATCH CORD CAT. 6A (1.5 MTS) AZUL	3 días	163FF	166	$ 2,138,206.24
165	**CERTIFICADOS**	**5 días**			**$ 41,257,300.00**
166	CERTIFICADO RETIE Y RETILAP	5 días	151;150;98;16	167	$ 41,257,300.00
167	**FIN DE OBRA**	**0 días**	**166;125;129;1**		**$ 0.00**

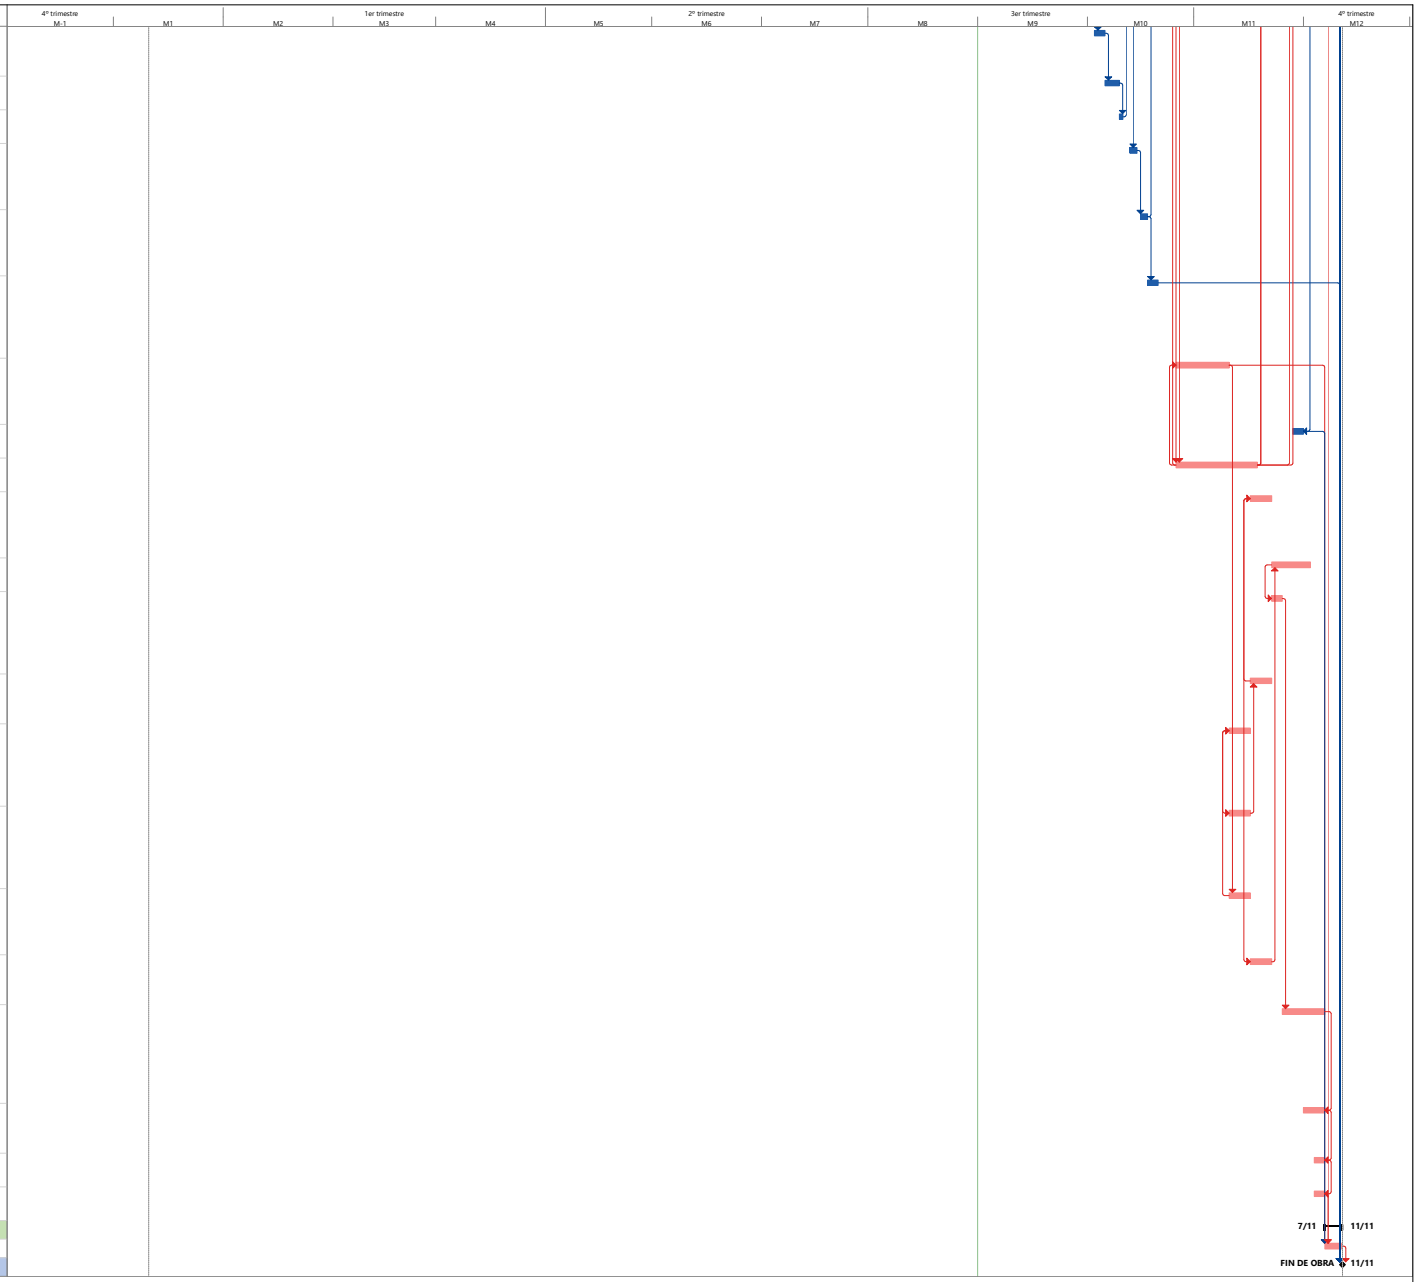

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: jue 1/08/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
