	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3825 **Contratista:** JAC de la Vereda los Peñones

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		9
3.1	Información general del contrato		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		9
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		10
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	22
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	29
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	31
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
5.1	Información general del contrato		11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		11
5.3	Informes especialistas y profesionales		12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		12
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		12
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	45
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	47
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	51
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		13
8	**Anexos**		15
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		54
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		58

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°6

CONVENIO No. 3825 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total**.**".

PERIODO: 1 al 31 de agosto de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, septiembre de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 Localización 5

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5

2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5

2.4 Características Técnicas del Proyecto 6

3. Información convenio solidario. 7

3.1 Información General del convenio 7

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7

3.3 Seguimiento ítems no previstos 7

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8

4.5 Estado General del Tiempo 8

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8

4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9

5.1 Información general del contrato 9

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9

5.3 Informes especialistas 10

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10

5.5 Información otros programas y aplicativo 10

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10

6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10

6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico 12

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Es importante el desarrollo vial y la comunicación con municipios, y ciudades de las comunidades rurales para su avance y mejoramiento en materia de movilidad, estas comunidades logran un desarrollo para sus habitantes en la medida que avanza su infraestructura vial.

Es así que la implementación de la pavimentación con placa huella y su debido manejo de agua con cunetas y alcantarillas hace que la obra garantice estabilidad y durabilidad en su funcionamiento, así mismo la limpieza y mantenimiento de las obras de ates existentes en el corredor influye en el mejoramiento de calidad vial existente en la vereda y el tránsito de los habitantes.

En el presente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de abril del 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El presente convenio se llevará a cabo en zona rural del Municipio de Arenal del departamento de Bolívar, en la vereda Los Peñones, conforme información recopilada por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña INVIAS el tramo a intervenir se encuentra desde la finca de Melkin al cerro de los Peñones.

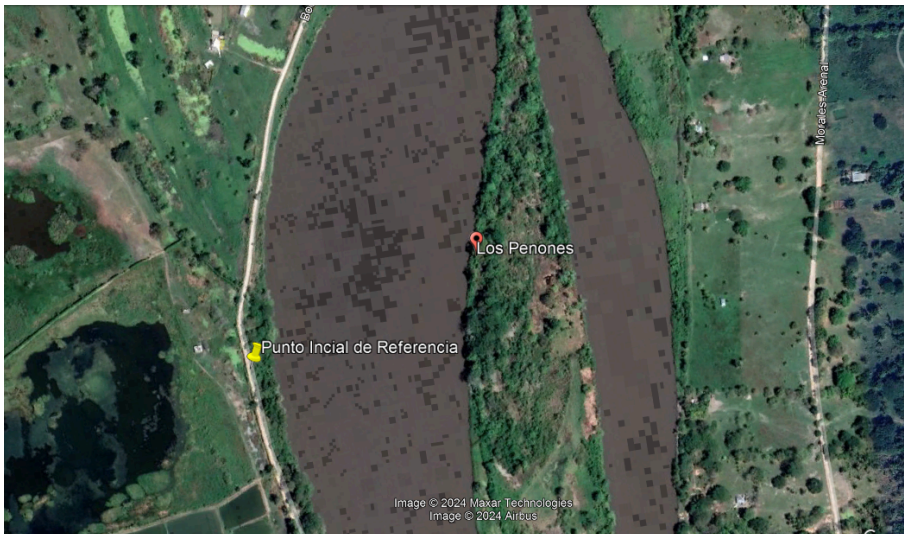


Figura 1. Localización Punto Inicial de Referencia a intervenir de la vereda Los Piñones

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Los Peñones, zona rural del municipio de Arenal, Bolívar. De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El tramo a intervenir se ubica vía al cerro de los Peñones y la finca de Melkin, vía terciaria destapada que requiere intervención, mejoramiento actual de la vía, mantenimiento de alcantarillas existentes en el corredor que se intervendrá.

	
Estado Inicial de la vía 15-01-2024	Estado inicial de la vía 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento vial del corredor a intervenir para que se garantice una circulación continua, rápida y continua para el transporte de propios y visitantes de la región.

- Construcción de ciento cincuenta y cinco (155) metros lineales de placa huella.
- Limpieza y mantenimiento de trece (13) metros lineales de alcantarilla existente en el corredor vial ovejo del proyecto.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	3825 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DE LA VEREDA LOS PEÑONES
FECHA DE INICIACIÓN	15/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	16/01/2024
SUSPENSIÓN No. 2	27/05/2024
REANUDACIÓN SUSPENSIÓN No. 2	27/06/2024
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSIÓN No.2	27/07/2024
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.2	05/08/2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 16/10/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	HASTA EL 16/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.933.566,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.933.566,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido en el mes de agosto no se ejecutaron actividades de obra debido a inconvenientes de carácter social puesto que la comunidad no permitió inicio de actividades hasta no contar con una vía alterna donde se pudiera garantizar el trafico de vehículos en la zona, cabe resaltar que ya se tenía una vía alterna trazada inicialmente, pero debido al incremento del cauce del río esta se vio afectada. Otro de los factores que ha alterado la normal ejecución del proyecto son los daños presentados en las vías de acceso, producto también de la ola invernal, especialmente la vía que de Buenavista comunica a Los Peñones, impidiendo el paso de maquinaria amarilla y de los materiales necesarios para la construcción de la placa huella.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado del contrato de obra se lleva a cabo visita de obra por parte de la interventoría para evaluar el estado y las condiciones de la obra con respecto a la reanudación de actividades y de esta manera poder emitir un diagnóstico, allí se evidencia la afectación que sufrió la vía alterna trazada inicialmente y se propone un nuevo trazado con el fin de dar continuidad y solución a dicha problemática. Seguido a esto se le comunica a la interventoría por parte de la JAC la nueva problemática de las vías de acceso a la vereda.

Por su parte la interventoría realiza seguimiento y control a la solución de las distintas problemáticas, de igual manera solicita de manera inmediata la reprogramación de obra acorde al componente presupuestal.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 3	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA 4	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	11/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 2	$ 27.743.184,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 143.743.184,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el cumplimiento de la junta en cuanto a la ejecución del convenio solidario.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Revisión y aprobación parcial de los ajustes a estudios y diseños y de la programación de obra suministrada por la junta.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio N°3825 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Debido a los inconvenientes presentados, las actividades realizadas dentro de todo el periodo del mes de agosto se basaron sobre todo en temas de índole documental y administrativo, puesto que como se puede evidenciar no se ejecutaron actividades de obra.
- Se realizó visita diagnóstica de obra para conocer el estado en que se encontraba el convenio posterior a las suspensiones.
- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de reanudación de actividades en todos los procesos y actividades relacionadas a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo para pronto inicio de actividades de obra.
- De acuerdo a los atrasos que se han venido presentando en el desarrollo de las actividades de obra, se solicitó a la JAC que presentaran una fecha estimada de solución a las problemáticas además de la entrega de la reprogramación de obra. En caso de no contar con una pronta solución se recomendó solicitar suspensión del convenio.
- La interventoría solicitó apoyo a la alcaldía del municipio de Arenal a modo de gestión para que no se siga viendo afectada la ejecución del convenio.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONVENIO No.: 3825

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Soltions SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Elias Jaimes Fernandez

PLAZO INICIAL:	0,5 meses		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR INICIAL :**	$ 200.933.566,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023	**VALOR ADICIONALES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	6/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 200.933.566,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2024	**DESEMBOLSO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	5,5 meses	**DESEMBOLSO AMORTIZADO:**	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	
Estructuras	Alcantarillas	Und	
	Muro de Contención	m^3	
Mantenimiento		ml	
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	
Estructuras	Alcantarillas	Und	0	
	Muro de Contención	m^3	0	
Mantenimiento		ml	0	
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.941.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.498.248,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.467.289,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.907.129,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ 44.603.004,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 405.513,00	$ 12.911.487,36
VALOR EJECUTADO	$ 405.513,00	$ 57.514.491,36

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 67.473.716,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.603.004,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


InGenius
OFI-4870-2023-131
Ocaña, 08 agosto del 2024
Señor (a)
ELIAS JAIMES PEÑA PIMIENTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES
Correo electrónico: eliaspenapimienta@gmail.com
3148888444
ARENAL – BOLIVAR
Referencia: Convenio solidario N° 3825 del 2023 suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES
Asunto: Diagnóstico visita de obra convenio solidario No 3825-2023
Cordial saludo,
Con toda atención me permito informar lo observado en campo tras realizarse visita de obra:
1. Ya se cuenta con la estructura sobre la cual se construirá la placa huella, a pesar de haberse visto esquecita al agua producto del incremento del cauce del río, se encuentra en muy buen estado y no requiere de reparaciones.
2. No se tiene una vía alterna para iniciar con las actividades de construcción porque la que se encontraba condicionada para dicho fin se vio totalmente afectada por el desborde del río.
3. Se planteó una posible solución durante la visita de obra pero que está sujeta a aprobación por parte de la comunidad ya que se vería afectada una vivienda, la cual se ubica en el trazado de la vía alterna propuesta (en el momento para no bloquear el tráfico en esta zona y que por condiciones sociales tampoco se puede contemplar). Por ende, se requiere que la junta de acción comunal realice reunión con la comunidad y comunique lo acordado durante esa reunión a la interventoría.
4. Se inspeccionó el acopio de materiales, el sorito de acopio se encuentra ubicado estratégicamente en una vivienda el cuidado de la vía y se encuentra en buenas condiciones de almacenamiento, sin exposición al ambiente. Además, se cuenta con el acero armado que se utilizará para las nosttras de la placa huella.
Atentamente,
Evelyn Paola Tarazo
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS
Anexo: Registro fotográfico de la visita de obra.
Ingenius Soluciones S.A.S
NIT. 901.752.219-8
TEL. 3218181535-3138819322
Calle 67 # 214-207 Altos de la Colina
Ocaña, Norte de Santander
e-mail: ingenius_sas@hotmail.com


InGenius
5. El resto de material se manifestó por parte del residente de la JAC que se encuentra en ferretería cujeta a que las condiciones para dar inicio con la construcción sean las adecuadas.
Dado lo argumentado anteriormente, se concluye que una vez se se de la solución a la problemática de la vía alterna (salió en la brevedad del caso) el convenio contará con las condiciones adecuadas para dar inicio nuevamente a sus labores y se les anima a continuar trabajando de esta manera para entregar la obra a la comunidad lo más pronto posible.
Atentamente,
Evelyn Paola Tarazo
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS
Anexo: Registro fotográfico de la visita de obra.
Ingenius Soluciones S.A.S
NIT. 901.752.219-8
TEL. 3218181535-3138819322
Calle 67 # 214-207 Altos de la Colina
Ocaña, Norte de Santander
e-mail: ingenius_sas@hotmail.com



Ingenius Soluciones S.A.S
NIT. 901.752.219-8
TEL. 3218181535-3138819322
Calle 67 # 214-207 Altos de la Colina
Ocaña, Norte de Santander
e-mail: ingenius_sas@hotmail.com


InGenius
OFI-4870-2023-133
Ocaña, 13 agosto del 2024
Doctor
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ingenius@invias.gov.co
OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Referencia: Convenio solidario N° 3825 del 2023 suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES
Asunto: Inconvenientes retraso de actividades convenio solidario No 3825-2023.
Cordial saludo,
Respetado doctor Jaimes,
Con toda atención me permito informarle a través del presente, el panorama del convenio perteneciente a la vereda Los Peñones tras realizarse visita de obra el día 06/08/2024 como medida de organización logística para el reinicio de actividades. Esta interventoría en cumplimiento de sus funciones realizó un diagnóstico que fue remitido a la JAC a través de un oficio con el consecutivo **OFI-4870-2023-131** y que contenía las fotos de la visita y las recomendaciones a tener en cuenta con prioridad en estos momentos el trazado de la vía alterna para poder iniciar con las actividades de construcción de la placa huella.
Se informa también que la respuesta por parte del propietario del predio para que el trazado de la vía alterna se hiciera frente a su vivienda (opción contemplada y propuesta por el presidente de JAC de la mano con el ingeniero residente) fue negativa. Por ende, el convenio se encuentra en incertidumbre al no contar con el espacio óptimo para trazar una vida alterna y reiniciar las actividades sin interrumpir el tráfico o la circulación de vehículos.
Atentamente,
Evelyn Paola Tarazo
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS
Anexo: Oficio con consecutivo **OFI-4870-2023-131.**
Ingenius Soluciones S.A.S
NIT. 901.752.219-8
TEL. 3218181535-3138819322
Calle 67 # 214-207 Altos de la Colina
Ocaña, Norte de Santander
e-mail: ingenius_sas@hotmail.com

OFICIO REMITIDO POR PARTE DE INTERVENTORÍA - DIAGNÓSTICO VISITA DE OBRA	OFICIOS REMITIDOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA - PANORAMA DEL CONVENIO A LA TERRITORIAL OCAÑA
	
OFICIO REMITIDO POR PARTE DE INTERVENTORÍA - RESPUESTA A OFICIO N° 007 JAC	**OFICIO REMITIDO POR PARTE DE INTERVENTORÍA - PRIMERA REITERACIÓN SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE OBRA**
Observaciones y correcciones a entregable de ajustes a estudios y diseños	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

CONTRATO No. 3825

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023

INTERVENTORÍA: Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Reynaldo Manrique Teran
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Firma

Nombre: Andres Mauricio Agudelo Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0700169 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 3825 **CONTRATISTA:** JAC de la Vereda los Peñones

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfenalco Cartagena

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Iización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha .....

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Reynaldo Manrique Teran
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No. 5

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3825 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 200.933.566,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ADICIONES:**

FECHA DE REANUDACIÓN: 6 (Día) DE 8 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 200.933.566,00

PLAZO (MESES): 7 meses y 10 dias

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Polizas peñones	860037013-6		26-ago	$ 266.397,00		$ 266.397,00
2	Tilson Jose Ballesteros Peña (Polizas)	1048557394		9-jul	$ 139.116,00		$ 139.116,00
3							$ -
4							$ -
5							$ -
6							$ -
				TOTAL	$ 405.513,00	$ -	**$ 405.513,00**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 405.513	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 128.934.029
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 11.021.826
TOTAL PAGOS	$ 405.513	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 139.955.855

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Gustavo A. Peña P.
Nombre:Gustavo Andres Peña Pimienta
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Reynaldo Manrique
Nombre: Reynaldo Manrique Teran
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA FINAL

CONVENIO No : 3825 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolivar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 meses y 10 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/5/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 06/08/2024 (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (**A**): $ 200.933.566,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (**B**):

VALOR ACUMULADO (**C=A+B**): $ 200.933.566,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	$ 74.944	$ -			0	$ -	0	$ -
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA								$ -		$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1209	$ 22.084,00	$ 26.699.556			0	$ -	974,69	$ 21.525.000
	320-13		Subbase Granular Clase C	m3	97	$ 179.697,00	$ 17.430.609			0	$ -	89,29	$ 16.044.380
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	77	$ 851.599,00	$ 65.573.123			0	$ -	0	$ -
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	20	$ 567.006,00	$ 11.340.120			0	$ -	0	$ -
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4028	$ 7.173,00	$ 28.892.844			0	$ -	0	$ -
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							0	$ -	0	$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m3	0	$ 44.409	$ -			0	$ -	0	$ -
	600-13		Excavaciones en roca en seco	m3	0	$ 78.139	$ -			0	$ -	0	$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m3	0	$ 583.833	$ -			0	$ -	0	$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m3	0	$ 813.869	$ -			0	$ -	0	$ -
	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	0	$ 7.225	$ -			0	$ -	0	$ -
	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	m3	0	$ 80.377	$ -			0	$ -	0	$ -
	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	0	$ 926.437	$ -			0	$ -	0	$ -
	610-13		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	0	$ 23.366	$ -			0	$ -	0	$ -
										0	$ -	0	$ -
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 149.936.252**				$ -		$ 37.569.380
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.498.088						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.467.268				$ 405.513		$ 12.911.487
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				**$ 199.901.608**				$ 405.513		$ 50.480.867
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -		$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Gustavo A. Peña P.
Nombre:Gustavo Andres Peña Pimienta
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma: Reinaldo Manrique
Nombre: Reinaldo Manrique Teran
Ingeniero Residente
Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3825 **CONTRATISTA:** JAC de la Vereda los Peñones

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco						24	24	24	24	24	18	24	16	24	24	24	17	24	17	24	24	24	21	21	24	24	24	23	17	21	24	579
Lluvias moderadas						0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0	4	0	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	27
Lluvias intensas						0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	18
Total horas						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Reynaldo Manrique Teran
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Firma
Nombre: Andres Mauricio Agudelo Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0700169 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No.: 3825

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Reynaldo Manrique Teran

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 13202-089261

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	5	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3825 **CONTRATISTA:** JAC de la Vereda los Peñones

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.933.566,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.933.566,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.186.713,20	11	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.046.678,30	11	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.280.069,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100294662

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	11	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100072713 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.186.713,20	30	4	2024	16	11	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.678,30	30	4	2024	16	10	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.280.069,80	16	10	2024	16	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294662

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	10	2023	16	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072713 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 17 del 06/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

155 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

construccion de 155 m de placa huella en la vereda Peñones, municipio de Arena

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la Vereda los Peñones		
CONVENIO No.	3825	VALOR INICIAL:	$ 200.933.566,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.933.566,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 47.651.884,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 143.743.184,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 200.933.566		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 62.043.488		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 138.890.078		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 143.743.184		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 119.672.302		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 24.070.882		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.941.592,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 44.000.000,00	29,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.603.004,00	30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 603.004,00	0,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 17.440.484,20	8,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.765.524,12	82,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 62.043.488,20	31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (102.722.035,92)	51,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.353.503,50	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: El convenio cuenta con aprobacion de ajustes a estudios y diseños ,asi como de programacion de obra con fecha de inicio y fin establcidos de acuerdo a vigencia del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119.678.528,00	83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119.672.302,00	83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 29% — Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa Huella	ml	155
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	40				26%
Ejec	0				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tamo desde la finca de los Melkin - Cerro los Peñones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Latitud: 8°20'13,61" N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud:73°43'8,51" O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera la solucion el desvio para el paso de los vehiculos a la vereda

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera inicio de fundicion de concreto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de las correcciones a los ajustes a estudios y diseños. Solicitud de las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Programacion de obra y estudio de mercado para proyeccion de compras de materiales.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA Andrés Agudelo

NOMBRE: Andres Mauricio Agudelo Vargas

Matrícula Profesional No.: 121037-0700169 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 18 del 16/08/2024 al 22/08/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

155 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

construccion de 155 m de placa huella en la vereda Peñones, municipio de Arena

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la Vereda los Peñones		
CONVENIO No.	3825	VALOR INICIAL:	$ 200.933.566,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.933.566,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 47.651.884,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 143.743.184,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 200.933.566		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 62.043.488		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 138.890.078		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 143.743.184		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 123.350.830		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 20.392.354		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.941.592,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 56.980.024,00	38,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.603.004,00	30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.377.020,00)	-8,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 17.440.484,20	8,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.765.524,12	82,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 62.043.488,20	31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (102.722.035,92)	51,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.820.000,00	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: El convenio cuenta con aprobacion de ajustes a estudios y diseños ,asi como de programacion de obra con fecha de inicio y fin establcidos de acuerdo a vigencia del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.357.056,00	86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.350.830,00	86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 38% — Avance o Atraso Físico %: -8%

Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa Huella	ml	155
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	40				26%
Ejec	0				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tamo desde la finca de los Melkin - Cerro los Peñones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Latitud: 8°20'13,61" N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud:73°43'8,51" O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera la solucion el desvio para el paso de los vehiculos a la vereda

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera inicio de fundicion de concreto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de las correcciones a los ajustes a estudios y diseños. Solicitud de las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Programacion de obra y estudio de mercado para proyeccion de compras de materiales.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA Andrés Agudelo

NOMBRE: Andres Mauricio Agudelo Vargas

Matrícula Profesional No.: 121037-0700169 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Peñones, municipio Arenal

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 19 del 23/08/2024 al 29/08/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda los Peñones del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

155 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 155 m de placa huella en la vereda Peñones, municipio de Arena

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la Vereda los Peñones

CONVENIO No.	3825	VALOR INICIAL:	$ 200.933.566,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.933.566,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 47.651.884,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 143.743.184,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 200.933.566		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 62.043.488		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.933.566	$ 138.890.078		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 143.743.184		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 123.350.830		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 20.392.354		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.941.592,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 67.473.716,00	45,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.603.004,00	30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.870.712,00)	-15,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 17.440.484,20	8,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.765.524,12	82,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 62.043.488,20	31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (102.722.035,92)	51,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.820.000,00	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: El convenio cuenta con aprobacion de ajustes a estudios y diseños ,asi como de programacion de obra con fecha de inicio y fin establcidos de acuerdo a vigencia del convenio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.357.056,00	86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.350.830,00	86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.678.528,00	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45% — Avance o Atraso Físico %: -15%

Meta Física Ejecutada %: 30%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa Huella	ml	155
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	70				45%
Ejec	0				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tamo desde la finca de los Melkin - Cerro los Peñones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Latitud: 8°20'13,61" N	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Longitud:73°43'8,51" O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por daños en la vía que de Buenavista comunica a Los Peñones no se puede reaizar traslado de maquinaria ni de materiales. Se está a la espera de la fecha de solución del inconveniente para la reanudación de actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera inicio de fundición de concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



InGenius

OFI:4870-2023-140

Ocaña, 27 agosto del 2024

Señor (a):
GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES
juntaaccioncomunalospenones@gmail.com
3166681444
ARENAL – BOLIVAR

Referencia: Convenio solidario N° 3825 del 2023 suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES

Asunto: Respuesta oficio 007 JAC "Los Peñones" – Condición actual del convenio.

Cordial saludo,


Con toda atención me permito dar respuesta al oficio N° 007 del 26-08-2024 mediante el cual se comunica la situación que se viene presentando con el convenio solidario N° 3825-2023. En el ejercicio de sus funciones esta interventoría supere muy amablemente que, a través de sus gestiones la JAC presente la solución a dicha problemática, de la misma manera una fecha estimada de reanudación de actividades de la obra y se refiera la solicitud de entrega de la reprogramación de obra teniendo en cuenta estos contratiempos.


Ahora bien, es importante resaltar que en caso de no tener solución a los inconvenientes presentados la JAC debe solicitar la suspensión del convenio.

Atentamente,

Dominique Pinel Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

Copia a:
Reynaldo Manrique Tarán – Ingeniero residente JAC vereda Los Peñones.





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Solicitud entrega de reprogramación y fecha estimada de reanudación de actividades, basándonse en las gestiones que debe adelantar la JAC para dar solución a las diferentes problemáticas, en especial el daño en las vías de acceso.	FIRMA Andrés Agudelo NOMBRE: Andres Mauricio Agudelo Vargas Matrícula Profesional No.: 121037-0700169 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16 / 9 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 07-31 de agosto del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 DEL 2023

INTERVENTORÍA: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

CONVENIO No. 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA 4X4	RENAULT DUSTER 2016 PLACA HHP910							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	KTM 200 DUKE 2018 PLACA VIJ90E							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10
Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4970 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 07-31 de agosto del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSÍ BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 580.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	1940000	$ 10.200,0	I	SANITAS	1744935155	$ 77.600,0				$ 77.600,00	$ -	$ -	
2	ANDRES MAURICIO AGUDELO VARGAS	1.065.918.364	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 1.350.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		2700000	$ 188.000,0	V	NUEVA EPS	1744935155	$ 108.000,0	PORVENIR	1744935155	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1.003.257.511	INSPECTORA	$ 960.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1300000	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS CM	1744935155	$ 52.000,0	PORVENIR	1744935155	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
4	0		0	$ -																
5	0		0	$ -																
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2.890.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/9/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 07-31 de agosto del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96.091.300,00	
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19.908.700,00	$ 12.254.752,80
2024	685224	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL Nº2	$27.743.184,00	
			TOTAL			$ 143.743.184,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 143.743.184,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96.091.300,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	1 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357323 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$ 20.853.040,00	$ 3.962.077,60	$ 24.815.117,60				1357323 de 11/12/2023	$ 33.631.922,80	$ 82.368.077,20	RADICADO 2167 DE FECHA 06 ABRIL 2024	
4	1 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$ 30.872.400,00	$ 5.865.756,00	$ 36.738.156,00				1357323 de 11/12/2023	$ 70.370.078,80	$ 45.629.921,20	RADICADO 3767 DE FECHA 08 MAYO 2024	
5	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$ 22.315.040,00	$ 4.239.857,60	$ 26.554.897,60				1357323 de 11/12/2023	$ 96.091.300,00	$ -	RADICACION 5068 DE FECHA 30 MAYO 2024	
								1398423 de 19/12/2023	$ 96.924.976,40	$ 19.075.023,60		
6	1 AL 09 DE MAYO DEL 2024	$ 5.731.320,00	$ 1.088.950,80	$ 6.820.270,80				1357323 de 11/12/2023	$ 103.745.247,20	$ 12.254.752,80		ACTA EN TRAMITE
								685224 de 29/07/2024	-	$ 39.997.936,80		ADICIONAL
7	06 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$ 7.500.400,00	$ 1.425.076,00	$ 8.925.476,00				1357323 de 11/12/2023	$ 112.670.723,20	$ 31.072.460,80		PRESENTE ACTA EN TRAMITE
TOTALES		$ 94.681.280,00	$ 17.989.443,20	$ 112.670.723,20					$ 112.670.723,20	$ 31.072.460,80		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 81.769.280,00	$ 15.536.163,20	$ 97.305.443,20
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.912.000,00	$ 2.453.280,00	$ 15.365.280,00
*			
VALOR TOTAL	$ 94.681.280,00	$ 17.989.443,20	$ 112.670.723,20

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el invias y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del Departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 143.743.184,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	7%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	20%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 14.374.318,40	15	1	2024	10	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 28.748.636,80	15	1	2024	10	10	2027
Calidad del servicio	24%	$ 34.800.000,00	15	1	2024	15	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 5/9/2024


I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA		ASUNTO
OFI-4870-2023-128	1/8/2024	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA	solicitud actualización de pólizas
OFI-4870-2023-129	1/8/2024	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	solicitud actualización de pólizas
OFI-4870-2023-130	1/8/2024	VICTOR HUGO PACHECO BADILLO	solicitud actualización de pólizas
OFI-4870-2023-131	8/8/2024	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA	Diagnóstico visita de obra convenio solidario No 3825-2023
OFI-4870-2023-132	8/8/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Entrega balance gestión ambiental, convenios a cargo del contrato de interventoría Nº 4870 – 2023
OFI-4870-2023-133	13/8/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Inconvenientes reinicio de actividades convenio solidario No 3825-2023.
OFI-4870-2023-134	15/8/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Aprobación Concepto “no objeción” implementación PAGA para evento de cierre
OFI-4870-2023-135	15/8/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Entrega balance gestión Social, convenios a cargo del contrato de interventoría Nº 4870 – 2023
OFI-4870-2023-136	16/8/2024	VICTOR HUGO PACHECO BADILLO	CITACIÓN COMITÉ OPERATIVO.
OFI-4870-2023-137	23/8/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	solicitud reprogramacion de obra
OFI-4870-2023-138	23/8/2024	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	solicitud reprogramacion de obra
OFI-4870-2023-139	23/8/2024	VICTOR HUGO PACHECO BADILLO	solicitud reprogramacion de obra
OFI-4870-2023-140	27/8/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	Respuesta oficio 007 JAC “Los Peñones” – Condición actual del convenio.
OFI-4870-2023-141	27/8/2024	VICTOR HUGO PACHECO BADILLO	Primera reiteración solicitud reprogramación de obra.
OFI-4870-2023-142	27/8/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	Primera reiteración solicitud reprogramación de obra.
OFI-4870-2023-143	27/8/2024	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	Primera reiteración solicitud reprogramación de obra.

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Anexo 14
Registro fotográfico

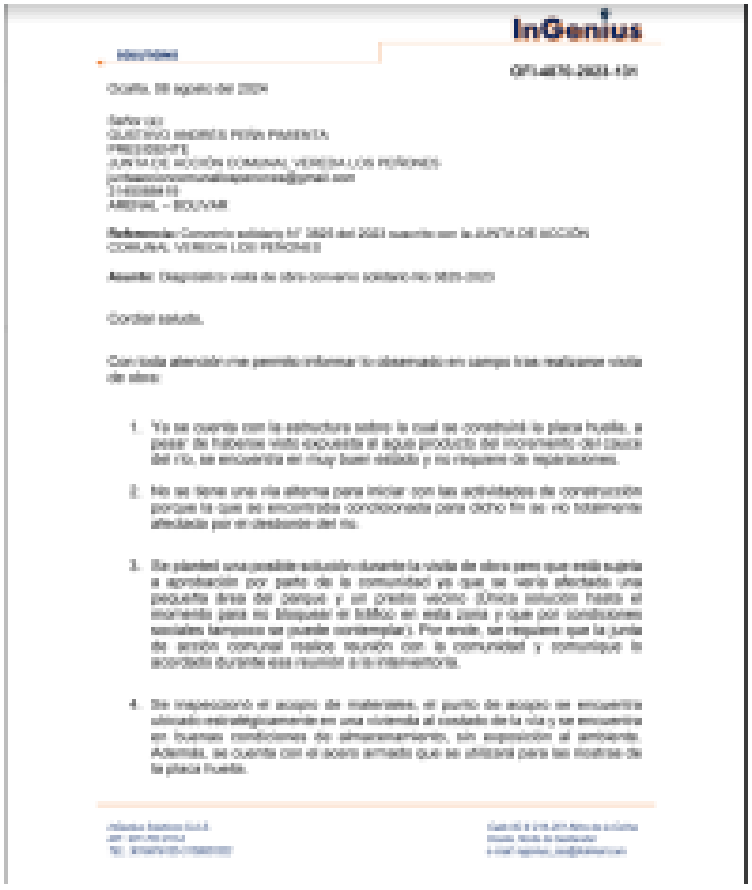



InGenius
SOLUTIONS

OFI-4870-2023-140

Ocaña, 27 agosto del 2024

Señor (a):
GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES
juntaaccioncomunallospenones@gmail.com
3145088419
ARENAL – BOLIVAR

Referencia: Convenio solidario N° 3825 del 2023 suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS PEÑONES

Asunto: Respuesta oficio 007 JAC "Los Peñones" – Condición actual del convenio.

Cordial saludo,

Con toda atención me permito dar respuesta al oficio N° 007 del 26-08-2024 mediante el cual se comunica la situación que se viene presentando con el convenio solidario N° 3825-2023. En el ejercicio de sus funciones esta interventoría sugiere muy amablemente que, a través de sus gestiones la JAC presente la solución a dicha problemática, de la misma manera una fecha estimada de reanudación de actividades de la obra y se reitera la solicitud de entrega de la reprogramación de obra teniendo en cuenta estos contratiempos.

Ahora bien, es importante resaltar que en caso de no tener solución a los inconvenientes presentados la JAC debe solicitar la suspensión del convenio.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

Copia a:
Reynaldo Manrique Terán – Ingeniero residente JAC vereda Los Peñones.

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

ENLACE DESCARGA:

https://drive.google.com/drive/folders/1kberIq-Pl6h18zgkGd5rT28KPHDdkJ-u?usp=drive_link
