
SITUACIÓN ENCONTRADA:

El día miércoles 14 de agosto de 2024, se realiza visita a la Institución Educativa Rural Presbítero Antonio José Cadavid del Corregimiento de Bellavista (+6.539128, -75.283783), en compañía del señor Rector de la institución, quien solicitó la inspección del inmueble debido a afectaciones ocasionadas por una lluvia torrencial ocurrida el día lunes 12 de agosto de 2024 en las horas de noche.


Durante la inspección visual se observó que efectivamente parte de la cubierta de la Institución Educativa en teja UPVC termoacústica se desprendió, ocasionando que las tejas “volaran” y se dañaran; en esta visita también se pudo corroborar que en el centro de salud del corregimiento (+6.540722, -75.285089) también se dañara una teja traslucida debido al fenómeno meteorológico

A continuación, se adjunta registro fotográfico de la situación encontrada en la Institución Educativa Rural Presbítero Antonio José Cadavid del Corregimiento de Bellavista y en el centro educativo rural del corregimiento

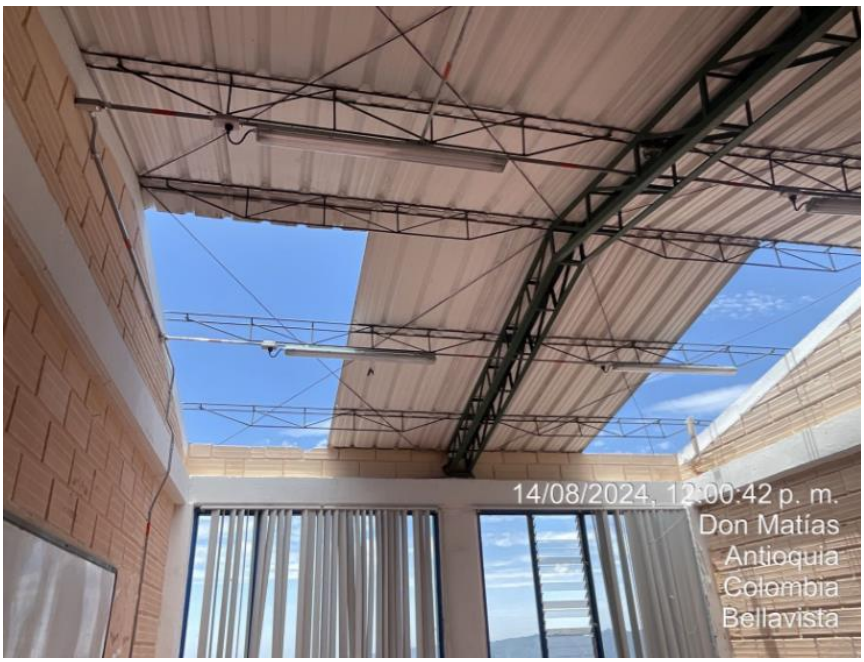


14/08/2024, 12:00:42 p. m.
Don Matías
Antioquia
Colombia
Bellavista


14/08/2024, 12:04:27 p. m.

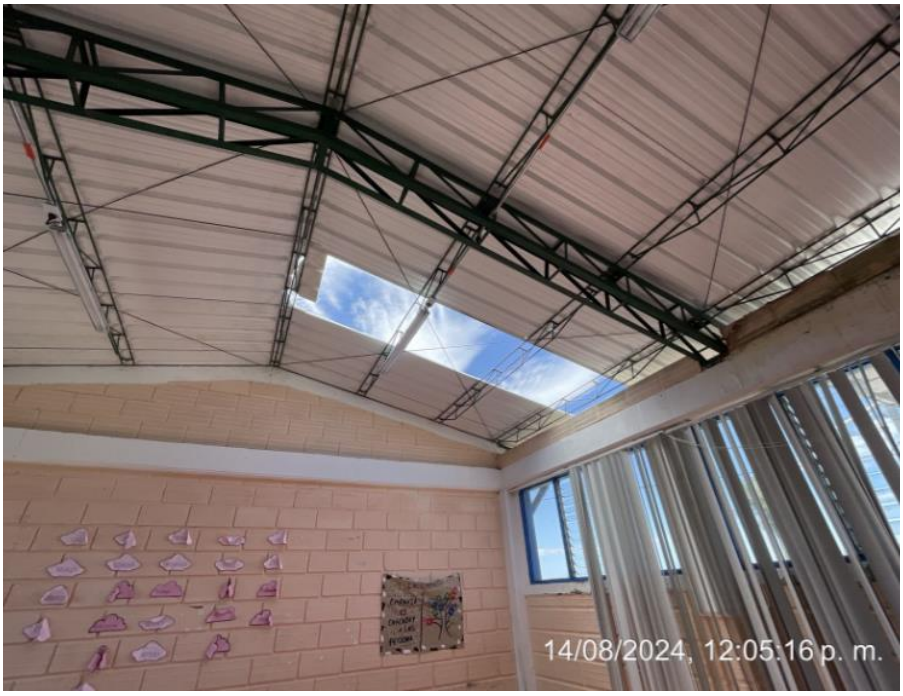
14/08/2024, 12:05:16 p. m.


14/08/2024, 12:07:15 p. m.
Don Matías
Antioquia
Colombia
Bellavista


14/08/2024, 12:06:51 p. m.
Don Matías
Antioquia
Colombia
Bellavista


14/08/2024, 12:07:44 p. m.
Don Matías
Antioquia
Colombia
Bellavista



Situación encontrada en la Institución Educativa Rural Presbítero Antonio José Cadavid del Corregimiento de Bellavista (+6.539128, -75.283783).




Situación encontrada en el centro de salud del corregimiento (+6.540722, -75.285089).

INFORME DE VISITA

Para la mitigación de los daños causados en la Institución Educativa Rural Presbítero Antonio José Cadavid del Corregimiento de Bellavista (+6.539128, -75.283783) y en el centro de salud del corregimiento (+6.540722, -75.285089) por el evento meteorológico son necesarios los siguientes materiales:

Ubicación	Material	Unidad	Cantidad
Institución Educativa	Teja UPVC termoacústica 4,50m*1,0m	Und	7
	Caballete para teja UPVC termoacústica	Und	5
	Ganchos para instalar teja UPVC termoacústica	Und	30
Centro de salud	Teja PVC traslucida de 2,40m*1,0m	Und	1



STEVEN ALVAREZ GÓMEZ
Ingeniero Civil de Apoyo
Secretaría de Obras Públicas
