INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL,PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTODEL ATLANTICO - LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 25
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

ANEXO 2
MUNICIPIO DE LURUACO
CONTRATO DE OBRA LP-001-2022
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
2071 2021

CONSORCIO VIGE 196

LA VIALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	31-10-2024	Elaboración de Informe

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	LUCAS RESTREPO
	Cargo	Residente de Interventoría 1
	Firma	
	Nombre	WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
	Cargo	Residente de Interventoría 2
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	Director de Interventoría
FECHA DE ENTREGA:		**31 de octubre 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO GENERAL 6
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
4 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 13
4.4 EQUIPOS EN OBRA 13
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 13
4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 15
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 15
4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15
4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 15
4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 16
4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 16
4.11.1 SEGUMIENTO A LA INVERISION DEL ANTICIPO 17
4.11.2 SEGUMIENTO PROGRAMACION DE OBRA 17
4.11.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 17
4.11.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 17
4.11.5 ACTA DE REUNION 17
4.11.6 INFORME SEMANAL 17
5 REGISTRO FOTOGRAFICO 18
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7 ANEXOS 20
7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 20
7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 20
7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 20

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA
Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Generalidades del contrato de Luruaco 8
Tabla 2.Características técnicas del proyecto 10
Tabla 3. Facturación de contrato de obra 14
Tabla 4. CUMPLIMIENTO No. 400042483 Anexo 4 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 5.CE No. 400042484 Anexo 4 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6. Relación correspondencia enviada 19
Tabla 7. Relación correspondencia recibida 19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 7
Ilustración 2. Localización del Proyecto 2-Luruaco 8
Ilustración 3. detalles del pavimento 10
Ilustración 4. Meta física ejecutada 12

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1.Avance Financiero 13
Grafica 2. Avance físico financiero 15

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N°CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe la gestión realizada por el CONSORCIO VIAS DEL ATLÁNTICO 2022, Contrato de Obra N° LP-001-2022, proceso de contratación LP-001-2022 SECOP I, suscrito entre el Municipio de Luruaco y el CONSORCIO VÍAS DEL ATLANTICO 2022, que tiene por objeto el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LURUACO-MATEO- BARRIGON, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – SEGUNDA ETAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL e Interventoría.

1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de lasactividades consistentes en el contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3”.


1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativaen desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría
- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.
- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos
- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:

Ilustración 1. Localización del proyecto

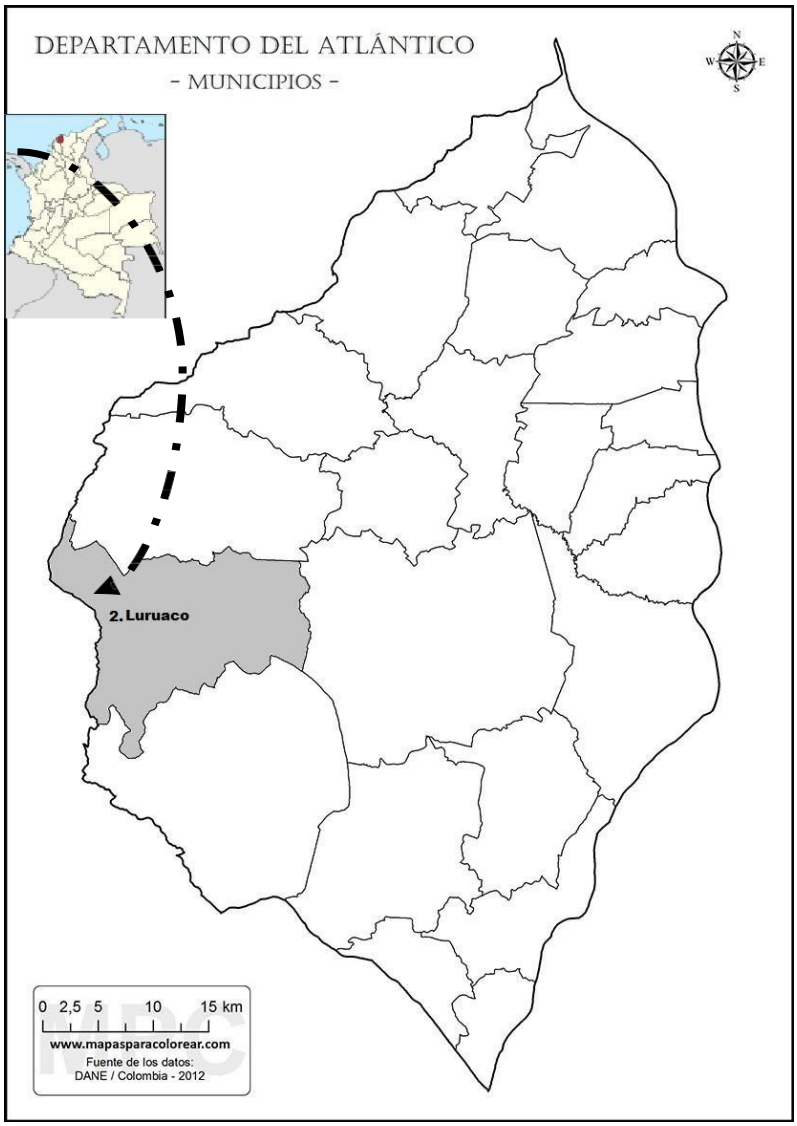


Fuente. Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de LURUACO- ATLÁNTICO consiste en realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO, específicamente en la vía terciariaLURUACO- MATEO- BARRIGON.

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el municipio de Candelaria en las siguientes coordenadas:

Ilustración 2. Localización del Proyecto 2-Luruaco

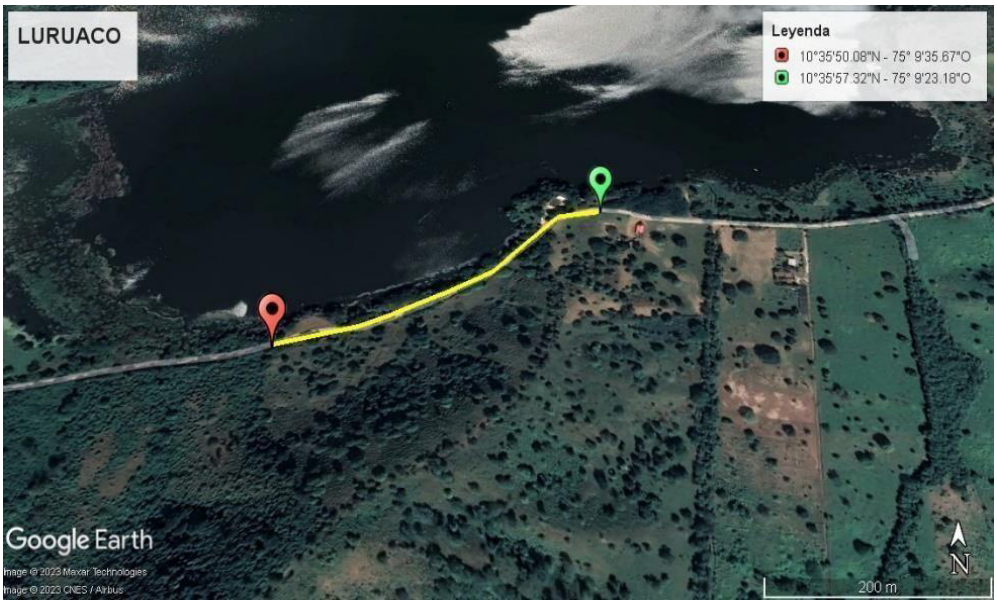

Fuente: Google Earth - Consorcio VIGE 196

2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, donde se priorizó el corredor vial en la vía terciaria que conduce de LURUACO- MATEO- BARRIGON a fin de incrementar la productividad del campo en la zona.

Tabla 1.Generalidades del contrato de Luruaco

Generalidades	Contrato de obra
Razón Social	CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO 2022
Nit	901.606.670-5
Número del contrato	LP-001-2022
Numero de Proceso SECOP I	LP-001-2022
Representante legal	RICARDO MAURICIO ASHTON IZQUIERDO
Número del Contacto	3007387375
Valor Inicial del Contrato	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.798.775.072,80) MONEDA CORRIENTE.
Dirección	Cra. 43 no. 72 – 122. Oficina 106 Barranquilla
Fecha de inicio	07 de octubre del 2022
Plazo Inicial Contrato	Seis (6) meses de ejecución

Generalidades	Contrato de obra
Prorroga No 1	Hasta el 05 de abril de 2023. Del 30-12-2022 para dar cumplimiento al plazo contractual aprobado.
Prorroga No 2	Hasta el 11 de julio de 2023.
Suspensión No 1	10 de abril de 2023 (106 días)
Reinicio No 1	25 de Julio de 2023
Suspensión No 2	Suscrita desde el 15-12-2023
Prorroga N°3	19 de diciembre de 2023 (1 Mes y 23 días)
Prorroga N°4	20 de mayo de 2024
Adición	OCHOCIENTOS UN MILLONES ($ 801.000.000) MONEDA CORRIENTE
Suspensión No3	07 de marzo 2024 (45 días)
Reinicio No3	22 de abril 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre del 2022
Fecha de terminación actual	06 de julio de 2024

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía terciaria que comunica la cabecera municipal de Luruaco con la vereda Mateo - Barrigón en el municipio de Luruaco – Atlántico, actualmente está siendo intervenida por uncontrato de obra distinto al que nos ocupa, de este modo la verificación de la vía se realizóen el sitio establecido como punto inicial y final por el secretario de planeación. En la inspección visual se encontró que el tramo vía no presenta una estructura consolidada, el carreteable se encuentra en terreno natural con alta saturación por deficiencia de obras de drenajes, la movilidad de vehículo como de peatones se encuentra restringidas.

El corredor vial a intervenir tiene una longitud aproximada de 1,5 Km, y el ancho promedio de la banca es de 4.0 m. La sección transversal de la totalidad del corredor presenta cunetasen tierra, las cuales se encuentran con alta presencia de cobertura vegetal, impidiendo su correcto funcionamiento y flujo del agua de escorrentía superficial.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto según el presupuesto emitido por el contratista para la socialización del proyecto ante la comunidad contempla la construcción de placa huella con 3 obras de drenajes, como se muestra en la siguiente tabla:


Tabla 2.Características técnicas del proyecto

TIPO DEOBRA	SECCIÓN (m)	ABSCISA		LONGITUD (m)	ESTADO
		INICIO	FIN		
PLACA HUELLA	4.7 ANCHO	K1+990	K2+440	450	FINALIZADO
PLACA HUELLA (ADICIÓN)	4.7 ANCHO	K1+990	K1+730	260	FINALIZADO
OBRAS DE DRENAJE					
Batea	3,6 ANCHO	K2+100	NA	5	FINALIZADO
Box culvert (adición)	1X1	K1+100	NA	5	FINALIZADO
Ampliación de box culvert (adición)	2X1	K1+890	NA	5	FINALIZADO

Fuente. Guía de diseño de pavimento con Placa-Huella

A continuación, se presenta el diseño de pavimento en el proyecto

Ilustración 3. detalles del pavimento

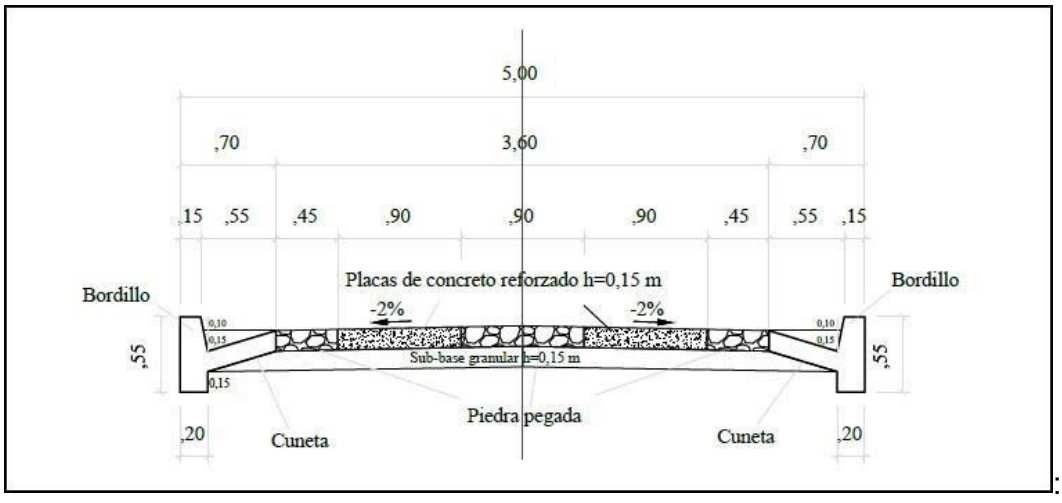

Fuente. Guía de diseño de pavimento con Placa-Huella

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

- El acta de inicio del contrato de obra se estipuló para el 7 de octubre de 2022, y con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022.

- El 6 de diciembre mediante memorando SVR 98837el INSTITUTO, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del convenio.

- El Contratista mediante comunicado OF-CONATL-LP-001-2022-10 solicita la prórroga del contrato de obras, el 30 de diciembre de 2022 la Interventoría mediante comunicado N°U232-LUR-015-22, por las razones expuestas emite al municipio el concepto favorable para la prórroga del contrato.

- El contratista mediante comunicado OF-CONATL-LP-001-2022-16 de fecha 05 de abril de 2023, solicita la prórroga del contrato de obra por 6 meses, hasta el 05 de octubre de 2023.

- El municipio de Luruaco, contratista e interventoría se reúnen el 10 de abril de 2023 para suscribir acta de suspensión del contrato LP-001-2022, suspensión dada por un término de 106 días contados a partir de la fecha.

- El 25 de julio de 2023 se suscribe acta de reinicio del contrato LP-001-2022, actualizando fecha de terminación de contrato al 8 de noviembre de 2023.

- Contratista realiza la instalación de la valla informativa, luego de la entrega de la resolución y diseño entregado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS-.

- El municipio de Luruaco autoriza suspensión del contrato de obra LP-001-2022, suspensión dada por un termino de 45 días contados a partir de la fecha 7 de marzo 2024.


- El 21 de abril 2024 se suscribe acta de reinicio del contrato LP-001-2022, actualizando fecha de terminación de contrato al 6 de julio 2024.

- El 14 de junio 2024 se realiza el acta de visita previa recibo definitivo de la obra del contrato LP-001-2022

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Ilustración 4. Meta física ejecutada

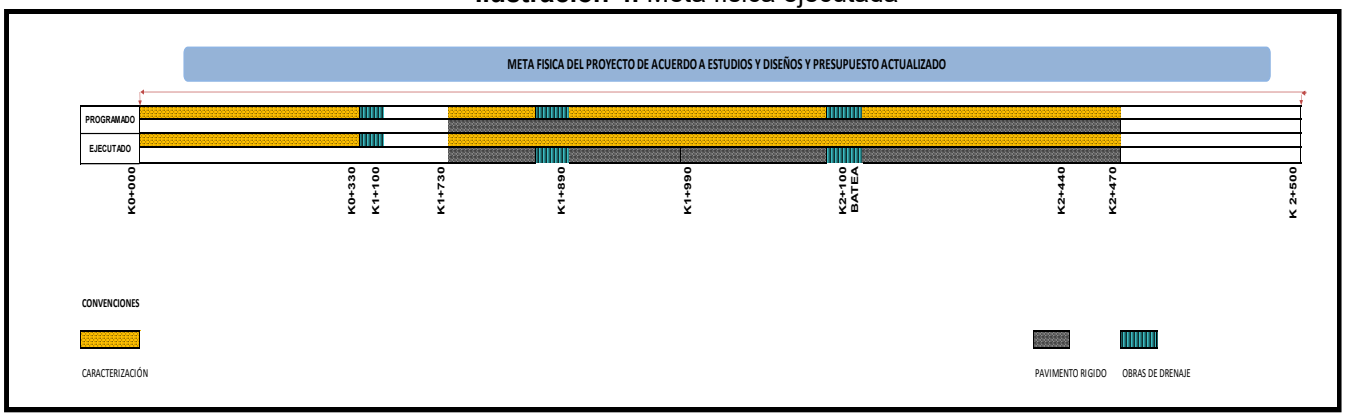

Fuente. Consorcio VIGE 196

3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo no es necesario contemplar un plan de contingencia, el contratista inicia proceso de liquidación de contrato de obra

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato

4 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- La Interventoría realiza seguimiento a la obra y verifica que el Contratista en este realizando toda la documentación para hacer la liquidación de la obra.
- Revisar y aprobar de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra

4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Gestionar ante el municipio de LURUACO, el envío del certificado de rendimientos financieros generados de los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 2071 de 2021 así como su reintegro al INVIAS.

Dar seguimiento de las actividades de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS.

Informar a la entidad contratante y contratista la documentación necesaria para la liquidación de la obra.

Revisar y aprobar de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 EQUIPOS EN OBRA


El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: OBRA.MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Este informe contine el valor inicial de $1.798.775.072,80 y un adicional de $ 801.000.000 el cual representa un valor total de 2.599.775.072.80, en este periodo el contratista ha Invertido $2.547.779.571,34 representado en el 98%, presenta un acumulado en facturación de 91,57% del valor del contrato.

De acuerdo a la programación de obra presentada por el contratista y ajustada, a corte de este informe presenta un atraso de 2%, porcentaje resultado de la comparación del avance ejecutado de 98% y el avance programado del contrato de 100%.

Grafica 1.Avance Financiero

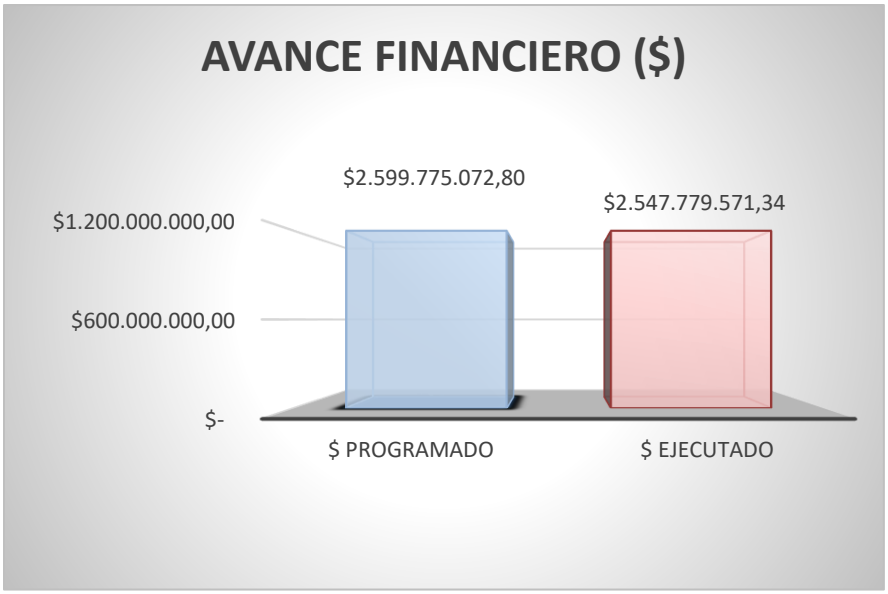

Fuente. Consorcio VIGE 196

A la fecha el contratista ha emitido cuatro actas parciales de obra que suman un monto total facturado de $2.380.539.779,44, lo cual corresponde a un 91,57% del valor total del contrato.

Tabla 3. Facturación de contrato de obra

ACTA	FECHA	#FACT	VALOR	VALOR ACUMULADO	PENDIENTE POR FACTURAR	%	% ACUM	% REST	DESEM
No.1	sep-23	No. FE 1	$ 977.405.993,62			54,34%	54,34%	45,66%	SI
No.2	oct-23	No. FE 2	$ 632.878.261,50	$ 1.610.284.255,12	$ 188.490.817,68	35,18%	89,52%	10,48%	SI
Adiccion $ 801.000.000									
No.3	mar-24	No. FE 3	$ 392.069.988,02	$ 2.002.354.243,14	$ 597.420.829,66	15,08%	77,02%	22,98%	SI
No.4	abr-24	No. FE 4	$ 378.185.536,30	$ 2.380.539.779,44	$ 219.235.293,36	14,55%	91,57%	8,43%	SI

Fuente. Consorcio VIGE 196

4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA


El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista una vez terminado el plazo de ejecución del contrato LP-001-2022, éste presenta un atraso de 2%, en el periodo comprendido para la elaboración de este informe, el contratista lleva un avance físico ejecutado de 98% comparado con el porcentaje de avance físico programado de 100%.

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe se presentará en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA (Anexo 1).

Grafica 2. Avance físico financiero

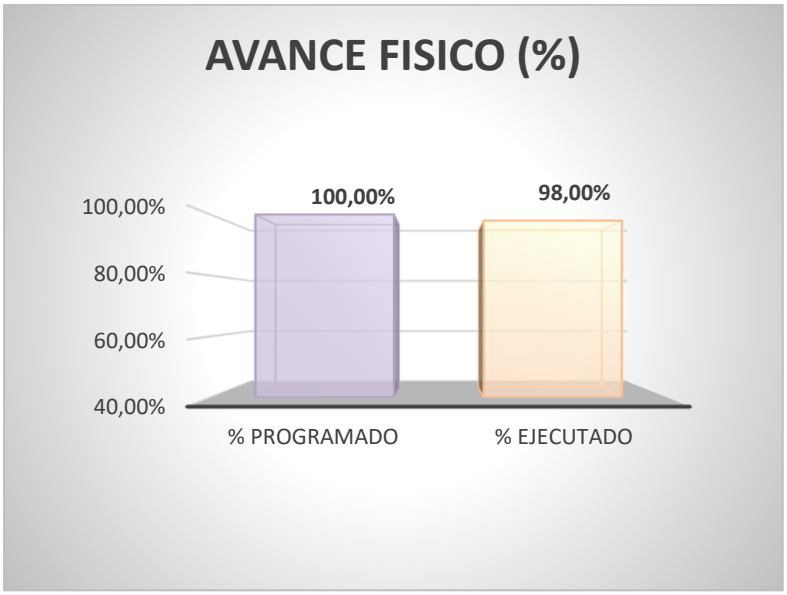

Fuente. Consorcio VIGE 196

4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra cuenta con las pólizas de cumplimiento No. No. 400042483 del 4 de agosto de 2023 y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 400042484 24 de mayo de 2024. El seguimiento garantías y seguros contrato de obra del frente de obra para el periodo del presente informe se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 2).

4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-14

4.11.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-2-FR- 2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA

4.11.2 Seguimiento Programa de Obra.

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

4.11.3 Seguimiento Programa de Inversiones

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES.

4.11.4 Actas de comité de obra

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

4.11.5 Acta de reunión

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

4.11.6 Informe Semanal

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Foto N°1 – Placa huella terminada	**Foto N°2 –** Placa huella terminada
	
Foto N°3 – Placa huella terminada	**Foto N°4 –** Placa huella terminada

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte de este informe, el Contratista presenta porcentaje de avance ejecutado del 98%.

- A corte de este informe el contratista ha realizado una inversión de $2.547.779.571,34representado en un avance físico financiero de 98% del valor del contrato de obra.

- El 14 de junio 2024 se realiza el acta de visita previa recibo definitivo de la obra del contrato LP-001-2022

- La Interventoría sigue atenta en la entrega de documentación requerida para la liquidación del contrato por parte del contratista

7 ANEXOS

7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 4. Relación correspondencia enviada

COMUNICACIÓN	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

Fuente. Consorcio Vige 196

7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 5. Relación correspondencia recibida

COMUNICACIÓN	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA	NA

Fuente. Consorcio Vige 196

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS ATLANTICO 2022

MES INFORME MENSUAL: 25 **PROYECTO:** VIA LURUACO- MATEO- BARRIGON EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – SEGUNDA ETAPA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	RP20220824001		98/99	Nacion	LP-001-2022	$ 1.798.775.072,80	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.599.775.072,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	sep-23	$ 821.349.574,47	$ 156.056.419,15	$ 977.405.993,62	$ 390.962.397	$ 586.443.596,17								
2	parcial	oct-23	$ 531.830.471,85	$ 101.047.789,65	$ 632.878.261,50	$ 328.547.632	$ 304.330.629,83				$ 188.490.817,68				
3	parcial	mar-24	$ 329.470.578,17	$ 62.599.410,85	$ 392.069.988,02						$ 597.420.829,66				
4	Parcial	abr-24	$ 317.802.971,68	$ 60.382.565,00	$ 378.185.536,30						$ 219.235.293,36				
TOTALES			**$ 2.000.453.596**	**$ 380.086.185**	**$ 2.380.539.779**										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 1.488.466.832	$ 282.808.698	**$ 1.771.275.530**
*PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 4.468.104	$ 804.940	**$ 5.317.044,00**
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 3.298.976	$ 626.806	**$ 3.925.781,60**
*REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 15.470.000,00	$ 2.939.300,00	**$ 18.409.300,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 1.798.927.655,14**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RICARDO MAURICIO ASHTON IZQUIERDO
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.08202-089204ATL

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS ATLANTICO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

EL MEJORAMIENTO VIA LURUACO- MATEO- BARRIGON EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – SEGUNDA ETAPA.

FECHA DE INICIO: 7/10/2022

PLAZO INICIAL: 6 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6 de julio 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.798.775.072,80

VALOR ACUMULADO: $ 2.599.775.072,80
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.409.300,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.409.300,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 179.877.507,20	25/7/2023	7/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 719.510.028,80	25/7/2023	7/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.755.014,40	25/7/2023	7/11/2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 539.632.521,60	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 539.632.521,60	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400042483

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios Labores y Operaciones	10%	$ 300.000.000,00	7/10/2022	7/11/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 300.000.000,00	7/10/2022	7/11/2023
Vehiculos propios y No propios	10%	$ 300.000.000,00	7/10/2022	7/11/2023
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400042484 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios Labores y Operaciones	10%	$ 300.000.000,00	7 10 2022	7 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400042484 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
