INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 25
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

ANEXO 6
MUNICIPIO DE PONEDERA
CONTRATO DE OBRA 2022-05-04-001
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1745 DE 2021

CONSORCIO VIGE 196

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	31-10-2024	Elaboración de Informe

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	LUCAS RESTREPO
	Cargo	Residente de Interventoría 1
	Firma	
	Nombre	WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
	Cargo	Residente de Interventoría 2
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	Director de Interventoría
FECHA DE ENTREGA:		**31 de octubre 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 6
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 9
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
DETALLES DEL PAVIMENTO 10
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
3.2. PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 12
3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 12
4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 12
4.2. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 13
4.4. EQUIPOS EN OBRA 13
4.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 13
4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14
4.7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 14
4.8. CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 14
4.9. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 14
4.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 14
4.11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 15
4.12. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 15
4.12.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo (No Aplica) 15
4.12.2. Seguimiento Programa de Obra. 15
4.12.3. Seguimiento Programa de Inversiones 15
4.12.4. Actas de comité de obra 15
4.12.5. Acta de reunión 15
4.12.6. Informe Semanal 15
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
7. ANEXOS 18
7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 18
7.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 18
7.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 18

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA
Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del Proyecto 7
Ilustración 2. Localización del Proyecto 6-Ponedera 8
Ilustración 3. detalles del pavimento 10

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato de Ponedera 8
Tabla 2. Características técnicas del proyecto 10
Tabla 3. Facturación de contrato de obra 13
Tabla 4. Relación correspondencia enviada 18
Tabla 5. Relación correspondencia enviada 18

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Avance físico 12
Grafica 2. Avance Físico Financiero 13
Grafica 3. Avance Físico Financiero 14

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N° CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe a gestión realizada por el CONSORCIO VIA RURAL, Contrato de Obra N° 2022-05-04-001, suscrito entre el Municipio de PONEDERA y CONSORCIO VIA RURAL, que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL e Interventoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de las actividades consistentes en el Contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3” durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría

- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos


- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:


Ilustración 1.Localización del Proyecto

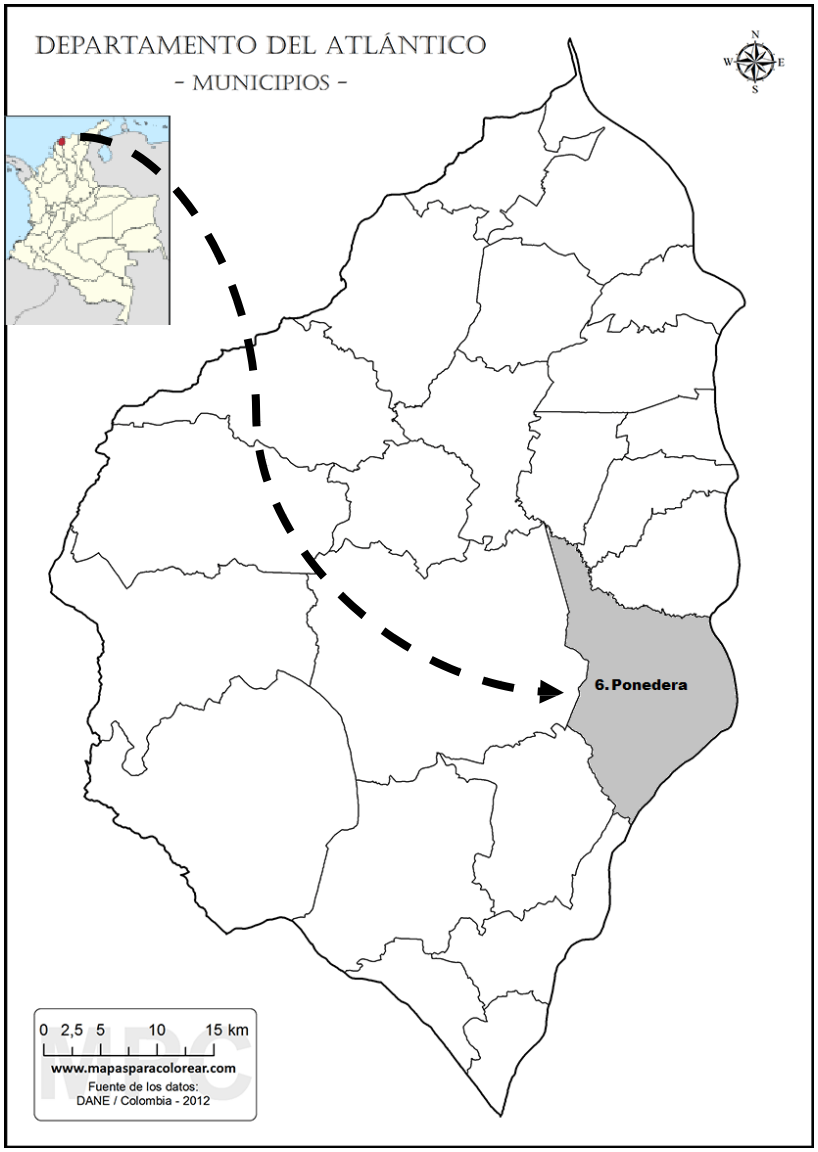

Fuente. Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de PONEDERA - ATLÁNTICO consiste en realizar el *MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL*., específicamente en la vía terciaria que de la cabecera municipal de PONEDERA conduce a LA OLIMPICA.

Ilustración 2. Localización del Proyecto 6-Ponedera

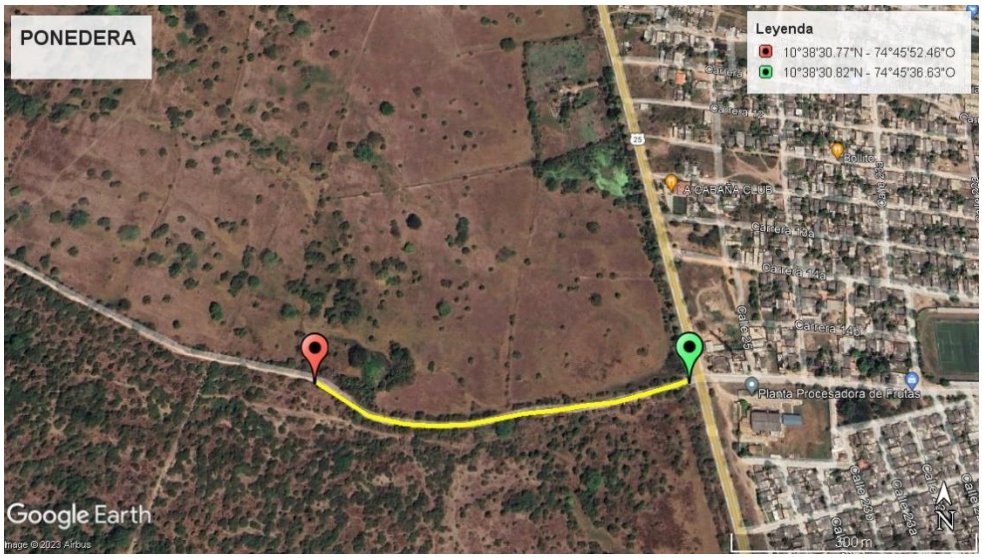

Fuente: Google Earth - Consorcio VIGE 196

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, donde se priorizó el corredor vial en el municipio de PONEDERA- ATLÁNTICO para realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO, específicamente en la vía terciaria que de la cabecera municipal de PONEDERA conduce a LA OLIMPICA.

Tabla 1. Generalidades del contrato de Ponedera

Generalidades	Contrato de obra
Razón Social	CONSORCIO VIA RURAL
Nit	901.581.468-3
Número del contrato	No. 2022-05-04-001
Representante legal	ANGELICA MARIA CAEZ PEREZ
Número del Contacto	3014576549
Valor Inicial del Contrato	MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOSDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 1.738.502.522,00) MONEDA CORRIENTE
Dirección	Carrera 43 # 72 -122 OF 607 Barranquilla
Fecha de inicio	06 de octubre del 2022
Plazo Inicial Contrato	Cuatro (4) meses, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Generalidades	Contrato de obra
Prorroga No 1	*Del 30-12-2022, hasta el 4 de febrero de 2023 para completar el plazo contractual inicial de 4 meses.*
Prorroga No.2	*Modificatoria No 2 del 03 de febrero de 2023. Ampliación del plazo por ajuste a diseños iniciales.*
Prorroga No.3	*Modificatoria No3. Hasta 29 de julio de 2023.*
Prorroga No.4	*Hasta 29 de septiembre. Se adicionan (2) meses*
Suspensión N°1	*Suscrita el 22 de septiembre de 2023, (45 días)*
Prorroga Suspensión	Suscrita el 13 de noviembre de 2023 (15 días)
Adición	$ 61.497.473
Valor final delContrato	MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.800.000.000,00) MONEDA CORRIENTE
Fecha de terminación	31 de diciembre del 2022
Fecha de terminación actual	30 de noviembre de 2023

Fuente. Consorcio VIGE 196

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

El proyecto se desarrolla en la parte rural del Municipio de Ponedera donde la mayor parte de la malla vial rural del Municipio, en la inspección visual del corredor vial de 5 km, se encontró una vía en mal estadocon poca a nula transitabilidad de vehículos, presenta una estructura en terreno natural en mal estado, se evidencia falta obras de drenajes generando represamiento de las zonal laterales que influyen en la saturación de la estructura existente, la poca regularidad del terreno afecta las escorrentías superficiales lo que genera represamiento de las lluvias.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía terciaria que comunica el Municipio de PONEDERA- ATLÁNTICO con LA OLIMPICA, donde el mal estado se traduce en problemas de movilidad reducida, salud, y deterioro de la infraestructura física vial que afecta a toda la comunidad del Municipio de PONEDERA, ATLÁNTICO.

El proyecto contempla la construcción de 500 m de pavimento rígido de ancho 4,0m, cunetas laterales para evacuación de aguas y dos estructuras de drenaje de tipo Box-culvert, adicionalmente contempla actividades de mantenimiento en algunas zonas críticas del corredor vial que comunica a la cabecera municipal con la vereda La Olímpica, en el municipio de Ponedera, departamento del Atlántico, como se muestra a continuación:

Tabla 2.Características técnicas del proyecto


PONEDERA					
TIPO DE OBRA	**SECCIÓN (m)**	**ABSCISA**		**LONGITUD (m)**	**ESTADO**
		INICIO	**FIN**		
Pavimento rigido	2,5x3,0	K0+000	K0+500	500	FINALIZADO
OBRAS DE DRENAJE					
Box Culvert (1 Unidad)	1x1	K0+215		6m	FINALIZADO
Box Culvert (1 Unidad)	2x1	K0+380		6m	FINALIZADO

Fuente. Consorcio VIGE 196

DETALLES DEL PAVIMENTO

A continuación, se presenta el diseño de pavimento en el proyecto:

Ilustración 3. detalles del pavimento

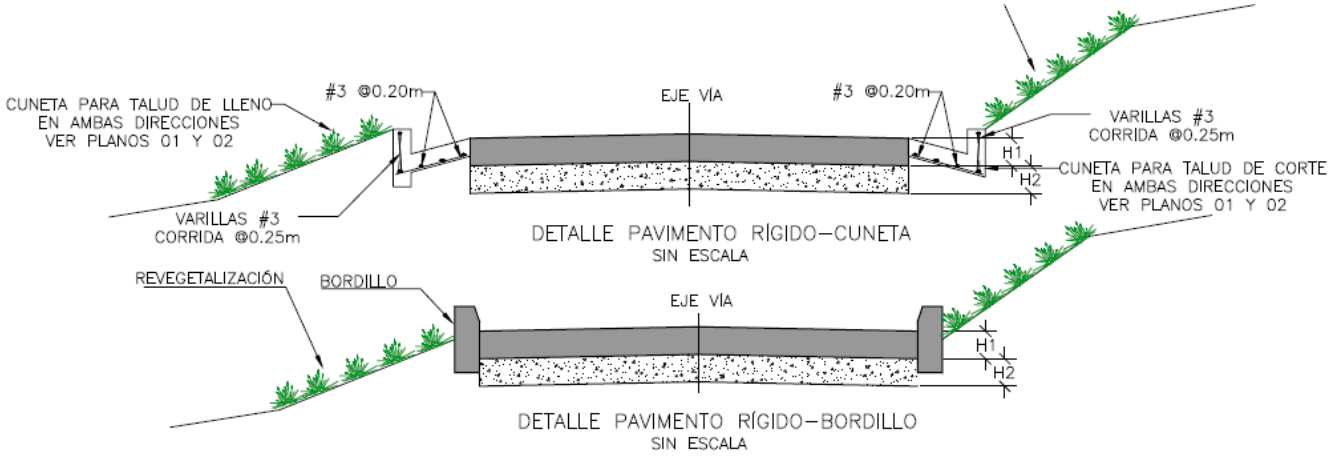

Fuente. OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes:

- Terraplenes (con material seleccionado)
- Suelo-cemento clase SC-R gradación tipo A (incluye suministro del cemento)
- Subbase Granular Clase C
- Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 MPa
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,45m)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
- Excavaciones varias en material común en seco a mano.

- Caracterización del corredor
- Afirmado (con material seleccionado)
- Conformación de la calzada existente

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El acta de inicio del contrato de obra se estipuló para el 6 de octubre de 2022, y con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022.

El 6 de diciembre mediante memorando SVR 98837el INSTITUTO, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del convenio.

El municipio realizó firma de otrosí modificatorio No 1 de fecha 10 de noviembre de 2022, donde se incluyen las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo 1745 de 2021.

El Contratista mediante comunicado 024-2022 solicita la prórroga del contrato de obras, el 28 de diciembre de 2022 la Interventoría mediante comunicado N°. U232-PON-013-22, por las razones expuestas emite el concepto favorable para la prórroga del contrato.

El municipio de Ponedera mediante otro sí modificatorio No 2, de fecha 3 de febrero de 2023 donde se prorroga el contrato de obra hasta el 2 de junio de 2023.

El contratista mediante comunicación 052-2023 de fecha 19 de mayo 2023, solicita a la alcaldía prórroga al contrato de obras, el cual vence el próximo 02 de junio de 2023.


El municipio de ponedera mediante otro sí modificatorio No 3, de fecha 26 de mayo de 2023 donde se prorroga el contrato de obra hasta el 29 de julio de 2023.

El municipio de ponedera mediante otro sí modificatorio No 4, de fecha 28 de junio de 2023 donde se prorroga el contrato de obra por dos meses más hasta el 29 de septiembre de 2023, en el cual se adiciona al contrato $ 61.497.473,00 actualizando el valor del contrato en $1.800.000.000,00.

3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

El contrato se encuentra en liquidación

Grafica 1. Avance físico

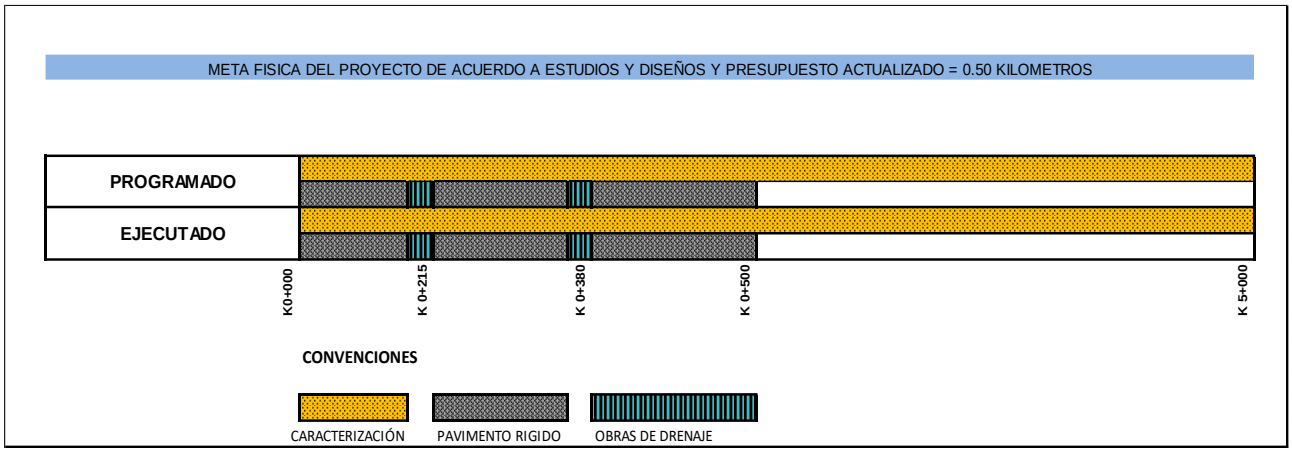

Fuente. Consorcio VIGE 196

3.2. PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

El contrato se encuentra en liquidación

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

El contrato se encuentra en liquidación

4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- El día 18 de octubre de 2024 la interventoría remitió el comunicado U232-PON-058-24a la dirección territorial Atlántico INVIAS con el asunto Incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1745 de 2021

4.2. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Gestionar ante el municipio de PONEDERA, el envío del certificado de rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 1745 de 2021, así como su reintegro al INVIAS.

- Seguir con la revisión de la documentación de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS para revisión y aprobación de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra.

- Informar a la entidad contratante y contratista la documentación necesaria para la liquidación de la obra.

- Notificar a la entidad contratante el incumplimiento de la documentación necesaria para la

liquidación de la obra.

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6.


4.4. EQUIPOS EN OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: OBRA.MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista mantiene la información financiera y presupuestal descrita en el informe anterior, no se ha adelantado acciones administrativas ni financieras que reflejen cambios en los porcentajes y valores descritos en el periodo de noviembre, avance físico del 99.00%, representado en una inversión de $ 1.782.000.000,00 de los $1.800.000.000,00 previstos para la ejecución del contrato.

Grafica 2. Avance Físico Financiero

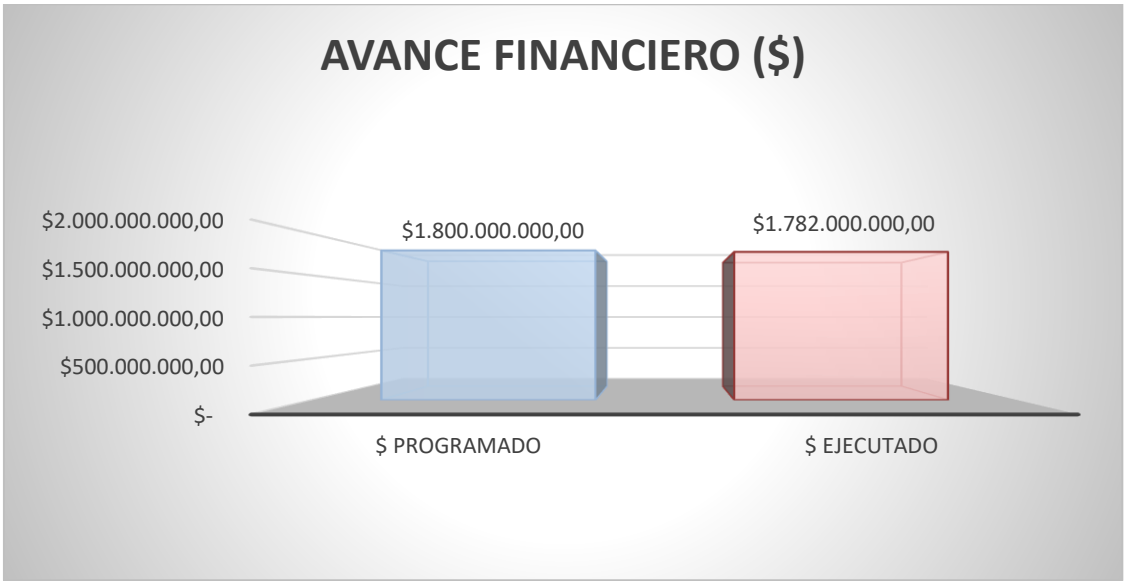

Fuente. Consorcio VIGE 196

Tabla 3. Facturación de contrato de obra

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA									
ACTA	**FECHA**	**#FACT**	**VALOR**	**VALOR ACUMULADO**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**%**	**% ACUM**	**% REST**	**DESEM**
No.1	may-23	No.1	$1.006.653.551,00			55,93%	55,93%	44,07%	SI

No.2	ago-23	No.2	$ 340.357.702,00	$1.347.011.253,00	$452.988.747,00	18,91%	74,83%	25,17%	SI
No.3	oct-23	No.3	$ 271.404.000,00	$1.618.415.253,00	$181.584.747,00	15,08%	89,91%	10,09%	SI

Fuente: Consorcio Vige 196

4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-11


4.8. CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.9. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

El contratista mantiene la información descrita en el mes de noviembre, no se han presentado acciones administrativas o técnicas que modifiquen lo descrito en el periodo anterior, avance físico del 99.00% a corte de este informe y financiero por un valor de $ 1.763.999.995,10 cabe aclarar que, ante la renuncia por parte del contratista al anticipo establecido en el contrato de obra, también se modifica el modo de pago de la factura presentada por el contratista, en la cual no se realiza amortización al valor facturado.

Grafica 3. Avance Físico Financiero

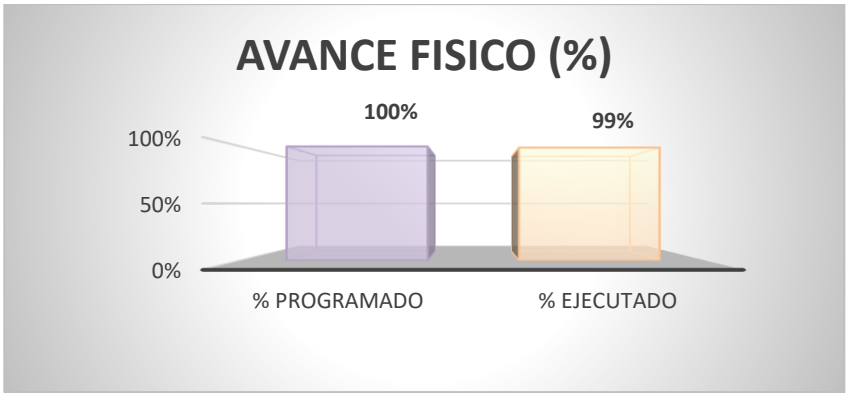

Fuente: Consorcio Vige 196

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe, se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA, (*Anexo 1*)

4.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra cuenta con las pólizas de garantía que amparan el contrato con su correspondiente acta de aprobación emitida por el municipio de Ponedera. Para el corte de este informe mensual, las pólizas del contrato de obra se encuentran actualizadas con el último trámite contractual realizado, el cual fue el Acta Modificatoria No. 1 de fecha 28 de junio de 2023, por medio del cual el municipio adiciona valor al contrato. A continuación, se muestra un resumen con los valores y las vigencias de las pólizas, adjunto se encuentrael formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 (*Anexo 2*) con el seguimiento a estas garantías. La interventoría se encuentra a la espera de la actualización de las garantías y seguros del contrato, de acuerdo a las acciones administrativas suscritas por el municipio y contratista.

4.11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-14

4.12. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.12.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo (No Aplica)

Aunque el contrato de obra contempla un anticipo por el 40% del valor del contrato, mediante el comunicado 041A-2023 de fecha 25 de abril de 2023, el contratista remite a la Alcaldía municipal, su decisión de renunciar al anticipo del contrato de obra No. 2022-05-04-001.

4.12.2. Seguimiento Programa de Obra.

La interventoría en plan de seguimiento de la ejecución de las obras verifica el avance de las actividades de acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista, teniendo en cuenta que el avance programado una vez cumplido el plazo contractual del contrato es del 100,00%, a su vez presenta un avance de obra de 99.00%.

4.12.3. Seguimiento Programa de Inversiones

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN-IN-6-FR-1

4.12.4. Actas de comité de obra

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

4.12.5. Acta de reunión

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

4.12.6. Informe Semanal

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-3

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista en proceso de liquidación del contrato de obra, con la entrega de la documentación requerida y toma de observaciones descritas en el acta de visita previa recibo definitivo de obra.

- A corte de este informe el contratista mantiene la inversión descrita en el periodo de noviembre de $ $1.782.000.000,00 de los $1.800.000.000,00 dispuestos para la ejecución de las actividades contenidas en el cronograma de obra y facturado $1.618.415.253,00 representado en 3 movimientos financieros.

- La Interventoría sigue atenta en la entrega de documentación requerida para la liquidación del contrato por parte del contratista, el municipio aún no remite acta de visita previa recibo definitivo de obra firmada.

- Mediante el comunicado U232-PON-054-24 con fecha 20/6/2024 se le reitera al contratista documentación para Cierre ambiental y liquidación del contrato.

- Mediante el comunicado U232-PON-055-24 con fecha 29/7/2024 se le reitera al ALCALDIA Liquidación CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1745 DE 2021.

- El 20 de diciembre de 2023, se realizó el acta de visita previa para el recibo definitivo de las obras, el contratista a corte de este periodo no subsanado las observaciones relacionadas en el acta.

7. ANEXOS

7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

7.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 4. Relación correspondencia enviada

COMUNICACIÓN	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-PON-058-24	18/10/2024	DIANA VANEGAS	Municipio 6. Ponedera, Posible, Incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1745 de 2021

Fuente: Consorcio Vige 196

7.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 5. Relación correspondencia enviada

COMUNICACIÓN	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: Consorcio Vige 196

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2022-05-04-001

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA RURAL

MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación		$ 1.738.502.522	
2023		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación		$ 61.497.474	
			TOTAL			**$ 1.799.999.996**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.799.999.995,89**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ago-23	$ 1.006.653.551		$ 1.006.653.551										
2	Parcial	oct-23	$ 340.357.702		$ 340.357.702										
3	Parcial	may-24	$ 271.404.000		$ 271.404.000										
TOTALES					**$ 1.618.415.253**	**$ -**	**$ 1.618.415.253**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL OBRA	$ 1.601.630.018		**$ 1.601.630.018**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 2.857.475		**$ 2.857.475**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 13.927.769		**$ 13.927.769**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1.618.415.262		**$ 1.618.415.262**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANGELICA CAEZ PEREZ
Representante legal
CC No.: 32.896.995

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2022-05-04-001 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/10/2022

PLAZO INICIAL: 4 mese

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.738.502.522,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.800.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 17.409.700,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 17.409.700,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 173.850.252,22	6/10/2022	20/1/2024
Buen manejo del anticipo	100%	$ 1.279.400.092,00	6/10/2022	29/4/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 639.700.046,00	6/10/2022	29/9/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 959.550.069,00	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-10115928

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Pendiente

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 300.000.000,00	6/10/2022	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 85-40-101052194 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Pendiente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
