INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 25
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

ANEXO 8
MUNICIPIO DE REPELÓN
CONTRATO DE OBRA 2022-04-25-001
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
1888 2021

LA VIALIDAD

CONSORCIO VIGE 196

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	31-10-2024	Elaboración de Informe

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	LUCAS RESTREPO
	Cargo	Residente de Interventoría 1
	Firma	
	Nombre	WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
	Cargo	Residente de Interventoría 2
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	Director de Interventoría
FECHA DE ENTREGA:		**31 de octubre 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 6
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 11
3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 12
4 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 13
4.4 EQUIPOS EN OBRA 13
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 14
4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 15
4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15
4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 15
4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 15
4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 16
4.12 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 16
4.12.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 16
4.12.2 SEGUMIENTO PROGRAMA DE OBRA 16
4.12.3 SEGUMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 17
4.12.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 17
4.12.5 ACTA DE REUNION 17
4.12.6 INFORME SEMANAL 17
5 REGISTRO FOTOGRAFICO 18
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7 ANEXOS 20
7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 20
7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 20
7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 20

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL
Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA
Anexo 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA
Anexo 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA
Anexo 6. MEPI-MN1-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INT
Anexo 7. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato de Repelón 8
Tabla 2. Características técnicas del proyecto 10
Tabla 3. Facturación de contrato de obra 15
Tabla 4.Relación correspondencia enviada frente de obra 20
Tabla 5. Relación correspondencia recibida frente de obra 20

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Localización del Proyecto 7
Ilustración 2.Localización del Proyecto 8-Repelón 8
Ilustración 3. Detalles del pavimento 10
Ilustración 4.Avance físico del proyecto 13

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1.Avance financiero del proyecto 15
Grafica 2.Avance Físico – Financiera 16

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N° CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe a gestión realizada por el EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, Contrato de Obra N° LP-2022-04-25-001, suscrito entre el Municipio de Repelón y EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL e Interventoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de las actividades consistentes en el Contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3”.


1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría
- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.
- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos
- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:

Ilustración 1.Localización del Proyecto

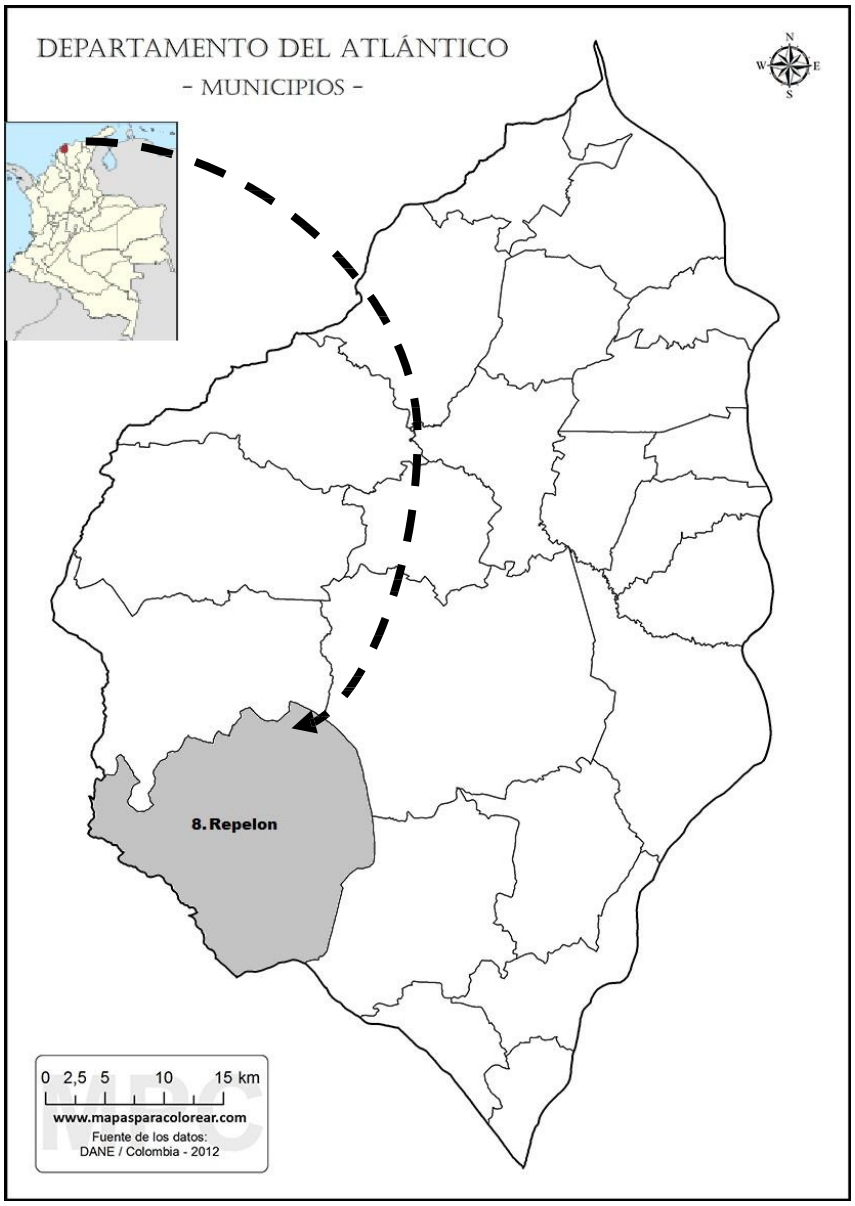


Fuente. Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de REPELÓN- ATLÁNTICO consiste en realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO, específicamente en la vía terciaria que de la cabecera municipal de Candelaria conduce a BANCO-TOTUMO- BIJIBANA.

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así

Ilustración 2.Localización del Proyecto 8-Repelón

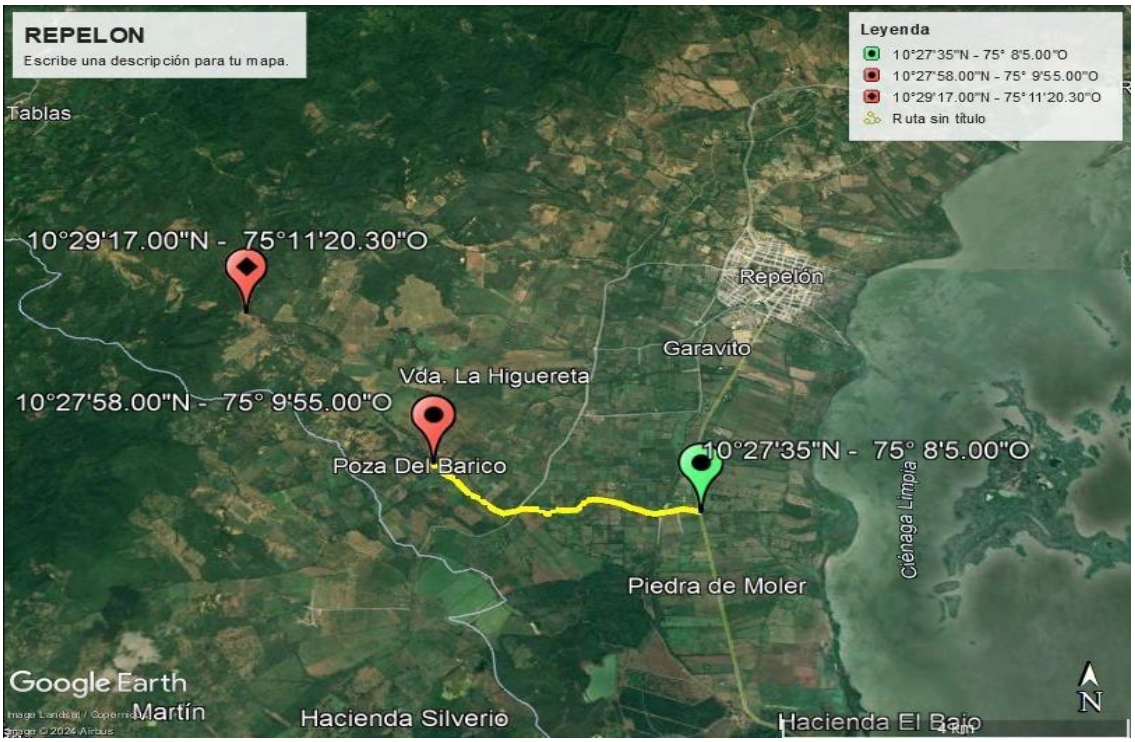

Fuente: Google Earth - Consorcio VIGE 196

2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, donde se priorizó el corredor vial en la vía terciaria que de la cabecera municipal de Repelón conduce a BANCO-TOTUMO-BIJIBANA (PR0+000 AL PR6+050) a fin de incrementar la productividad del campo en la zona.

Tabla 1. Generalidades del contrato de Repelón

Generalidades	Contrato de obra
Razón Social	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA
Nit/ Cedula de ciudadanía	8.638.502
Número del contrato	No LP-2022-04-25-001
Representante legal	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA

Generalidades	Contrato de obra
Número de Contacto	3004630279
Valor Inicial del Contrato	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.938.516.274,20) MONEDA CORRIENTE.
Dirección	Cra. 43 No. 72 – 122. Oficina 106 Barranquilla
Fecha de inicio	07 de octubre del 2022
Plazo Inicial Contrato	VEINTIÚN (21) MESES o HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, lo que suceda primero.
Prorroga N°1	Hasta el 30 de junio del 2024
Prorroga N°2	Hasta el 30 de octubre del 2024
Suspensión 1	Suscrita el 22/12/2023 hasta el 9/01/2024
Adición	NA
Fecha de terminación	30 de octubre del 2024

Fuente. Consorcio VIGE 196

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía terciaria que comunica la cabecera municipal de Repelón específicamente con el BANCO-TOTUMO-BIJIBANA, esta vía presenta un alto número de desperfectos constituidos en el suelo natural, es decir baches, posee una precaria estructura para la circulación vehicular y ante la irregularidad del perfil de la Subrasante se dificulta la evacuación de las escorrentías producidas por aguas lluvias, represándose en muchos sectores de la banca formando charcos que persisten por varios días y con el paso de vehículos se convierten en grandes baches que imposibilitan la movilidad tanto de vehículos como de peatones.

El tramo de vía a intervenir tiene una longitud aproximada de 3,0 Km, y el ancho promedio de la banca es de 5,0 m, en la totalidad de su sección transversal donde se incluyen cunetas en tierra, las cuales se encuentran con alta presencia de cobertura vegetal, impidiendo su correcto funcionamiento y flujo del agua de escorrentía superficial

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un pavimento rígido, con obras de drenajes tipo Boxculvert y alcantarillas adicionalmente obras de estabilización con muros en gavión de acuerdo con el presupuesto estimado inicialmente como se muestra a continuación:


Tabla 2. Características técnicas del proyecto

REPELÓN					
TIPO DE OBRA	**SECCIÓN (m)**	**ABSCISA**		**LONGITUD (m)**	**ESTADO**
		INICIO	**FIN**		
Pavimento rígido, con su estructura	5	K0+000	K1+500	1500	EN CONTRUCCION
Pavimento rígido, con su estructura	5	K2+300	K3+833	1500	EN CONTRUCCION
OBRAS DE DRENAJE					
Box Culvert	1x1	K2+350		6m	EN CONTRUCCION
MEJORAMIENTO					
AFIRMADO	5	K1+500	K2+400	900m	EN CONTRUCCION

Fuente. Consorcio VIGE 196

A continuación, se presenta el diseño de pavimento que fue instalado en el proyecto.

Ilustración 3. Detalles del pavimento



Fuente. OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes:

- Afirmado
- Excavaciones varias en material común en seco a mano.
- Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
- Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
- Relleno para Estructuras con recebo

- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para bordillos
- Disipadores de Energía y Sedimentadores en Gaviones de Alambre de Acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM
- Subbase Granular Clase C.
- Concreto 3500 psi módulo de rotura 36 MPa

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El acta de inicio del contrato de obra se formalizó el 7 de octubre de 2022.

Por medio de correo electrónico de fecha 25 de abril de 2023, el contratista envía ajustes de diseños hidrológico, geotécnico y geométrico del contrato LP-006-2022.

El día 30 de mayo de 2023, el contratista de obra realiza socialización del proyecto en compañía de representantes de la alcaldía de Repelón e Interventoría, describe a la comunidad beneficiaria del proyecto especificaciones, alcance y fecha de inicio del proyecto.

Mediante correo electrónico de fecha 11 de julio de 2023, el Contratista remite a la Interventoría pólizas actualizadas al otro si - Modificatoria 1 contrato No. 2022-25-04-001 Repelón - Oficio de Solicitud ajuste de precios.

Mediante correo electrónico de fecha 14 de julio de 2023, el Contratista remite a la Interventoría plan de inversión del anticipo.

Mediante correo electrónico de fecha 28 de julio de 2023, el Contratista remite a la Alcaldía de Repelón oficio de vigencias futuras.

Contratista realiza la instalación de la valla informativa en el mes agosto 2023 de acuerdo con las especificaciones y diseño entregado por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SEMANA 105 (Del 4-10-2024 al 10-10-2024)

- Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+500

SEMANA 106 (Del 11-10-2024 al 17-10-2024)

- Reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+243


SEMANA 107 (Del 18-10-2024 al 24-10-2024)

- Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K2+552

SEMANA 108 (Del 25-10-2024 al 31-10-2024)

- Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424

Ilustración 4. Avance físico del proyecto

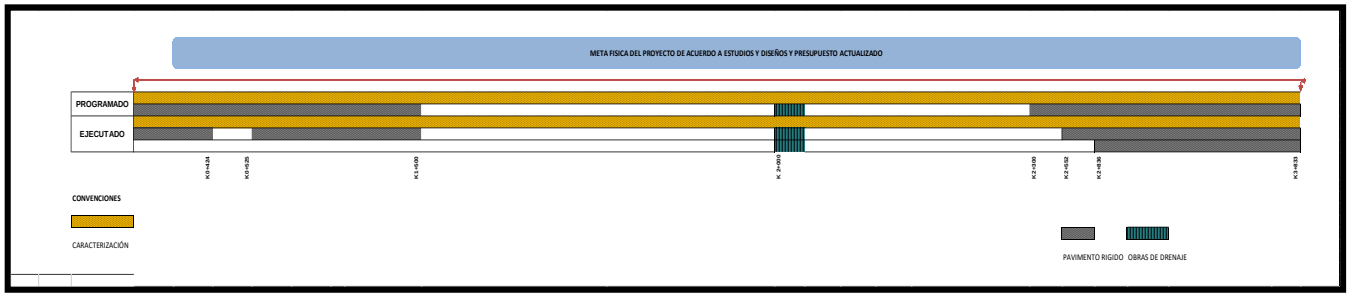

Fuente: Consorcio VIGE 196

3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista no gestionó un plan de contingencia, ya que no se ha determinado como necesario a la fecha de corte de este informe. Los planes de contingencia deben ser elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, con el fin de ajustar los atrasos presentados y que no se afecte el plazo contractual.

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

En este período el contratista no presentó a la Interventoría ítems no previstos para su aprobación.

4 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- El día 1 de octubre de 2024 la interventoría remite comunicado U232-REP-070-24 mediante el cual le da respuesta al comunicado N° REP-17-24 Solicitud adición contrato de obra.
- El día 21 de octubre de 2024 la interventoría remite comunicado U232-REP-071-24 mediante el cual se comunica el Próximo vencimiento plazo contractual.
- El día 21 de octubre de 2024 la interventoría remite comunicado U232-REP-072-24 mediante el cual se comunica a la dirección territorial de INVIAS el soporte de rendimientos financieros.
- El día 24 de octubre de 2024 la interventoría remite comunicado U232-REP-073-24 mediante el cual le da respuesta al comunicado N° REP-19-24. Solicitud de adicional para la ejecución de obras complementarias del contrato de obra 2022-04-25-001.

4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Continuar gestión ante el municipio de REPELÓN, la entrega del modificatorio del CONTRATO DE OBRA 2022-04-25-001, de acuerdo a los lineamientos y obligaciones del convenio interadministrativo 1888 de 2021.

Gestionar ante el municipio de REPELÓN, el envío del certificado de rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 1888 de 2021, así como su reintegro al INVIAS.

Solicitar al contratista los documentos que hacen parte integral del contrato de obra, que permita hacer seguimiento continuo a los avances técnicos y financieros de las obras.

Continuar con el seguimiento y control de la obra, con los aspectos calidad de acuerdo con las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

La información respecto al personal de obra se encuentra registrada en el siguiente formato MEPI-MN1-IN- 15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA ubicada en la carpeta de ANEXOS MEPI (Anexo 1)

4.4 EQUIPOS EN OBRA


La información relacionada con la maquinaria y equipo de obra utilizada durante el presente

mes se encuentra registrada en el siguiente formato, MEPI-MN1-IN-15-FR-4, ubicado en la carpeta de ANEXOS MEPI. (Anexo 2)

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En este periodo el contratista acumula una facturación por un valor de $8.302.636.982,55 representando 75.90% del valor total del contrato, se observa que el contrato de obra considera un anticipo del 15%, por lo que se amortiza el 15% al valor facturado hasta el acta parcial N°3.

Grafica 1.Avance financiero del proyecto

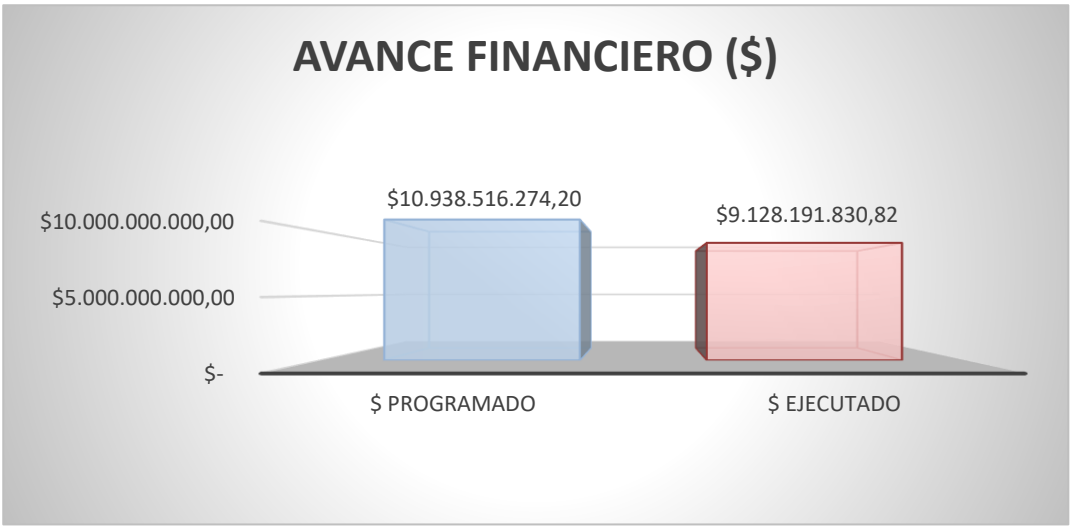

Fuente – Consorcio VIGE 196

Las actividades ejecutadas por el contratista permiten mostrar un avance de costos de 83,45%, representado en una inversión de $ 9.128.191.830,82 del valor total del contrato.

Tabla 3. Facturación de contrato de obra

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA							
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**VALOR ACUMULADO**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**%**	**% ACUMU**	**% RESTANTE**
No.1	ago-23	$ 3.892.194.038,00		$ 7.046.322.236,20	35,58%	35,58%	
No.2	oct-23	$ 1.539.933.090,55	$ 5.432.127.128,55	$ 5.506.389.145,65	14,08%	49,66%	50,34%
No.3	may-24	$ 2.870.509.854,00	$ 8.302.636.982,55	$ 2.635.879.291,45	26,24%	75,90%	24,10%

Fuente – Consorcio VIGE 196

4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado general del tiempo en el municipio de Repelón, durante el periodo han aumentado el porcentaje de lluvias presentes, los datos diarios de esta actividad se registrarán una vez se

inicien la ejecución de las obras en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. (*Anexo 3*)

4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe no se tienen ensayos de laboratorio, en caso de haberlos se reportarán en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. (No aplica)

4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA


El seguimiento a los aportes y seguridad social para el periodo del presente informe se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA (*Anexo 1*)

4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista una vez terminado el plazo de ejecución del contrato, en el periodo comprendido para la elaboración de este informe, el contratista lleva un avance físico ejecutado de 83,45% comparado con el porcentaje de avance físico programado del 100%.

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA (*Anexo 4*)

Grafica 2. Avance Físico – Financiera

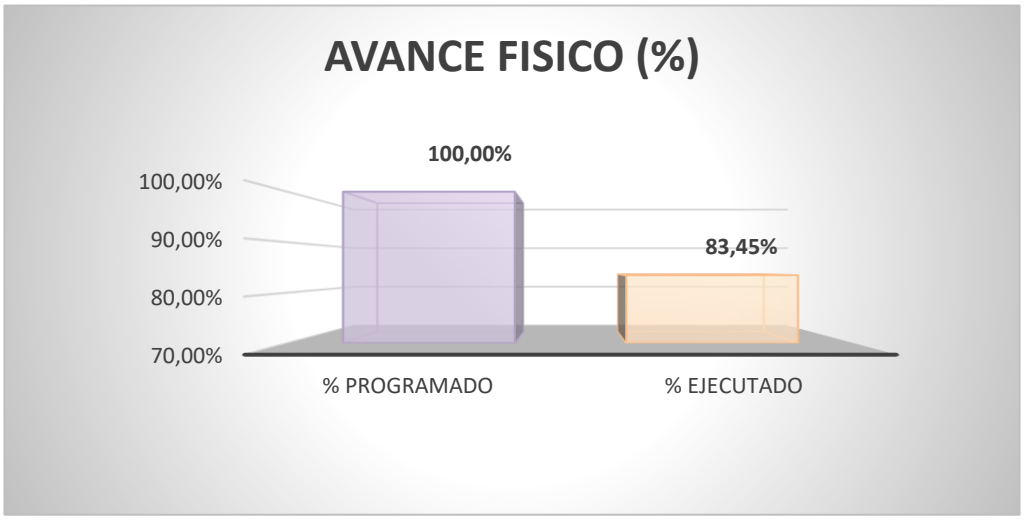

Fuente – Consorcio VIGE 196

4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA (ANEXO 5) se

relaciona el seguimiento a garantías y seguros del contrato de obra.

4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

En este periodo no se realizó seguimiento al plan de calidad, las observaciones concernientes a este tema se relacionarán en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA (*No aplica*)

4.12 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.13 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contrato cuenta con un anticipo del 15% del valor del contrato, el cual a la fecha del presente informe se encuentra totalmente amortizado. El seguimiento a la inversión del anticipo está relacionado en el formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA (*Anexo 6*)

4.14 Seguimiento Programa de Obra.

El contratista no ha presentado la programación de obra actualizado, la cual a corte de este informe presenta un avance programado de 100% y un porcentaje de avance ejecutado del 83,45%, presentando un atraso de 16,55%.

4.15 Seguimiento Programa de Inversiones

El seguimiento al programa de inversiones de obra se presenta en el formato MEPI-MN1- IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES, (*No aplica*)

4.16 Actas de comité de obra

Durante el periodo no se desarrollaron actas de comité de obra.

4.17 Acta de reunión

Durante el periodo no se desarrollaron reuniones, no se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ (*No aplica*).

4.18 Informe Semanal

Para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024 se generaron cinco (5) informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL (*Anexo 7)*

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

Durante el periodo se toma registro fotográfico a las actividades descritas anteriormente.



FOTO N°1. Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424



FOTO N°2. Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K2+552



FOTO N°3. Reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+243



FOTO N°4. Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+500

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El municipio no ha sido diligente en la entrega de certificación de rendimientos financieros de los dineros derivados del convenio interadministrativo 1888 de 2021, a pesar del requerimiento de la Interventoría, se sugiere al Instituto tomar medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio.

- El contratista presenta al corte de este informe un porcentaje de avance de 83,45%, correspondiente a una inversión de $ $ 9.128.191.830,82

- Durante el proceso de construcción se han detectados fisuras en las losas de pavimento, lo que ha generado requerimientos al contratista por parte de la interventoría, informado el cumplimiento de la calidad de las obras.

7 ANEXOS

7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 4.Relación correspondencia enviada frente de obra

COMUNICACIÓN	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U232-REP-070-24	1/10/2024	EDUARDO CABALLERO AVILA	Municipio 8. Repelón: Concepto, Solicitud adición contrato de obra, responde comunicado N° REP-17-24
U232-REP-071-24	21/10/2024	ALCALDIA	Municipio 8. Repelón: Próximo vencimiento plazo contractual
U232-REP-072-24	21/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Soporte rendimientos
U232-REP-073-24	24/10/2024	EDUARDO CABALLERO AVILA	Municipio 8. Repelón – Concepto, Solicitud de adicional para la ejecución de obras complementarias del contrato de obra 2022-04-25-001. Responde comunicado N° REP-19-24.

Fuente: Consorcio Vige 196

7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 5. Relación correspondencia recibida frente de obra

COMUNICACIÓN	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio Vige 196

ANEXO 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2022-04-25-001 **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																		EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ENTREGA DE ESTE FORMATO DILIGENCIADO

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 0820264430

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO No. 2022-04-25-001 **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 975-2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIGE 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADOR																																	
MINICARGADOR																																	
CARROTANQUE																																	
MEZCLADOR																																	
VIBRADOR DE CONCRETO																																	
TRONZADOR																																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA ENTREGA DE ESTE FORMATO DILIGENCIADO**

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDUARDO CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No. 08202-64430 ATL

Firma
Nombre: WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.22202-097112

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2022-04-25-001 **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				X							X								X							X						4
Lluvias moderadas																						x				x	x		x	x		5
Lluvias intensas	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x						x			22
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Registro pluviometrico IDEAM-REP.csv

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: EDUARDO CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No. 08202-64430 ATL

Firma
Nombre: WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.22202-097112

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-2022-04-25-001

CONTRATISTA: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	187722	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación		$ 1.800.000.000	
2023		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-03	Nación		$ 4.499.500.000	
2024		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-04	Nación		$ 4.639.016.274	
			TOTAL			**$ 4.639.016.274**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 10.938.516.274,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ago-23	$ 3.892.194.038		$ 3.892.194.038	$ 581.750.856	$ 3.310.443.182	$ 1.059.026.585							
2	Parcial	oct-23	$ 1.539.933.091		$ 1.539.933.091	$ 230.989.964	$ 1.308.943.127	$ 828.036.622							
3	Parcial	may-24	$ 2.870.509.854		$ 2.870.509.854	$ 430.576.478	$ 2.439.933.376	$ 397.460.144							
TOTALES					**$ 8.302.636.983**	**$ 1.243.317.297**	**$ 9.545.954.280**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL OBRA	$ 8.270.928.851		**$ 8.270.928.851**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 12.500.000		**$ 12.500.000**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.355.000		**$ 5.355.000**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 13.855.000		**$ 13.855.000**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ -**
VALOR TOTAL	$ 8.302.638.851		**$ 8.302.638.851**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 0820264430

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-2022-04-25-001 **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 7/10/2022

PLAZO INICIAL: 21 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 10.938.516.274,00

VALOR ACUMULADO: $ 10.938.516.274,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 32.974.900,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 32.974.900,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.093.851.627,42	7	10	2022	12	10	2024
Devolución de pago anticipado	100%	$ 5.469.258.137,10	7	10	2023	12	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 2.187.703.254,26	7	10	2022	14	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.892.470,00	13	6	2024	14	6	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$3.2281.554.882,26	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo			Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101115929

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Pendiente

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$546.925.813.71	7	10	2022	13	6	2024
Otros	10%	$546.925.813.71	7	10	2022	13	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 85-40-101052195 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Pendiente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1 de 1 1
		PÁGINA	

FECHA: 14/07/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE REPELÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTÍCO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 2022-04-25-001 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975 de 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	**COMPRA DE MATERIALES**					$ 510.463.881,28	31,11%
2	**MAQUINARIA Y EQUIPO**					$ 133.201.045,66	8,12%
3	**TRANSPORTE**					$ 731.175.306,41	44,56%
4	**MANO DE OBRA**						
	TOTAL ÍTEM					**$ 1.374.840.233,35**	**83,79%**
5	**DEDUCCIONES**						
	INDUSTRIA Y COMERCIO (6 X 1000)					$ 9.844.664,65	0,60%
	AVISOS Y TABLEROS(15 % DE INDUSTRIA Y COMERCIO)					$ 1.476.699,70	0,09%
	SOBRETASA BOMBERIL (3% INDUSTRIA Y COMERCIO)					$ 295.339,94	0,02%
	ESTAMPILLA PROCULTURA					$ 32.815.548,82	2,00%
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR					$ 65.631.097,64	4,00%
	CONTRIVUCION CIUDADANA					$ 82.038.872,05	5,00%
	RETEFUENTE					$ 32.815.548,82	2,00%
	ESTAMPILLA PRODEPORTE					$ 41.019.436,03	2,50%
	TOTAL DEDUCCIONES					**$ 265.937.207,65**	**16,21%**
	TOTAL					**$ 1.640.777.441,00**	**100,000%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma Eduardo Caballero A.
Nombre: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 0820264430

Firma:
Nombre: **JUAN MANUEL ALBA ROJAS**
Representante Legal CONSORCIO VIGE 196
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 105 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 0,94 — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 3.0 — No. PUENTES: N/A — OTROS: BOXCULVERT 2X2: 1UND

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3 km de pavimento rígido, con 1 estructuras de drenajes tipo Boxculvert 2x2 ,940m en mejoramiento con afirmado, en la vía que comunica la cabecera municipal de Repelón con el Banco-Totumo-Bijibana, en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	2022-04-25-001	VALOR INICIAL:	$ 10.938.516.274,20	CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10.938.516.274,20	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 1.639.379.955	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 822.540.545	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.907.505.774,03	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.971.423.499,14	82,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (531.195.531,20)	-4,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.971.423.499,14	82,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (531.195.531,20)	-4,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.736.498,85	1,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.361.258,66	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.010.950.583,03	23,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.010.950.583,03	23,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 9.601.973,00	0,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 9.601.973,00	0,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	58,69%
Acumulado:	11,27%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 87,12%
Meta Física Ejecutada %: 82,25%
Avance o Atraso Físico %: -4,87%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Pavimento rigido	km	3,00	3	3	Prog	2				66,7%
					Ejec	1,4				46,7%
* Explanaciones	m3	6000,00	6000,00	6000,00	Prog	6000				100,0%
					Ejec	6000				100,0%
* Obras de drenaje	UND	1	1	1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
MINICARGADOR		
RETROEXCAVADORA		
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARROYO DE PIEDRA - ATLÁNTICO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGECOST ARROYO DE PIEDRA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que no ha presentado que fuentes de material va a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que aún no se define que permisos debe gestionar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Se remite a contratista aprobación del documento P.A.G.A dediante comunicación U232-REP-016-22 de fecha 31 de enero de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se continua con el punto de atencion a la comunidad, brindando orientacion a los usuarios directos e indirectos del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TECNICA

Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+500

GESTIÓN SOCIAL

*Seguimiento y apoyo al contratista en el area social por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


GESTIÓN TECNICA

*Continuar con el acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas en obra.

GESTIÓN SOCIAL

*Atención de observaciones a ajustes a que haya lugar en el area social

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+500



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+500

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	
*Remisión comunicación U232-REP-024-23 de fecha 28-feb-23 Recomendando al municipio el inicio de proceso sancionatorio por posible incumplimiento de obligaciones contractuales.	FIRMA NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS Matrícula Profesional N° 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 106 (Numeración consecutiva) del 11/10/2024 al 17/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 0,94 — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 3.0 — No. PUENTES: N/A — OTROS: BOXCULVERT 2X2: 1UND

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3 km de pavimento rígido, con 1 estructuras de drenajes tipo Boxculvert 2x2 ,940m en mejoramiento con afirmado, en la vía que comunica la cabecera municipal de Repelón con el Banco-Totumo-Bijibana, en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	2022-04-25-001	VALOR INICIAL:	$ 10.938.516.274,20	CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10.938.516.274,20	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 1.639.379.955	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 822.540.545	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.907.505.774,03	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.998.692.263,57	82,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (503.926.766,76)	-4,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.998.692.263,57	82,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (503.926.766,76)	-4,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.736.498,85	1,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.361.258,66	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.020.552.556,01	23,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.020.552.556,01	23,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 9.601.973,00	0,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 9.601.973,00	0,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	58,69%
Acumulado:	11,34%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 87,12%
Meta Física Ejecutada %: 82,50%
Avance o Atraso Físico %: -4,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Pavimento rigido	km	3,00	3	3	Prog	2				66,7%
					Ejec	1,4				46,7%
* Explanaciones	m3	6000,00	6000,00	6000,00	Prog	6000				100,0%
					Ejec	6000				100,0%
* Obras de drenaje	UND	1	1	1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
MINICARGADOR		
RETROEXCAVADORA		
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARROYO DE PIEDRA - ATLÁNTICO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGECOST ARROYO DE PIEDRA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que no ha presentado que fuentes de material va a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que aún no se define que permisos debe gestionar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Se remite a contratista aprobación del documento P.A.G.A dediante comunicación U232-REP-016-22 de fecha 31 de enero de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

***** No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se continua con el punto de atencion a la comunidad, brindando orientacion a los usuarios directos e indirectos del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TECNICA

Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+243

GESTIÓN SOCIAL

*Seguimiento y apoyo al contratista en el area social por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


GESTIÓN TECNICA

*Continuar con el acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas en obra.

GESTIÓN SOCIAL

*Atención de observaciones a ajustes a que haya lugar en el area social

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+243



Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+243

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	
*Remisión comunicación U232-REP-024-23 de fecha 28-feb-23 Recomendando al municipio el inicio de proceso sancionatorio por posible incumplimiento de obligaciones contractuales.	FIRMA NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS Matrícula Profesional N° 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 107 (Numeración consecutiva) del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 0,94 — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 3.0 — No. PUENTES: N/A — OTROS: BOXCULVERT 2X2: 1UND

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3 km de pavimento rígido, con 1 estructuras de drenajes tipo Boxculvert 2x2 ,940m en mejoramiento con afirmado, en la vía que comunica la cabecera municipal de Repelón con el Banco-Totumo-Bijibana, en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,			INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	2022-04-25-001	VALOR INICIAL:	$ 10.938.516.274,20	CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10.938.516.274,20	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 1.639.379.955	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 822.540.545	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.907.505.774,03	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.064.137.298,22	83,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (438.481.732,12)	-4,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.502.619.030,33	87,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.064.137.298,22	83,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (438.481.732,12)	-4,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.736.498,85	1,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.361.258,66	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.030.154.528,98	24,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.030.154.528,98	24,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 9.601.973,00	0,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 9.601.973,00	0,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	58,69%
Acumulado:	11,37%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 87,12%
Meta Física Ejecutada %: 83,10%
Avance o Atraso Físico %: -4,02%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Pavimento rigido	km	3,00	3	3	Prog	2				66,7%
					Ejec	1,4				46,7%
* Explanaciones	m3	6000,00	6000,00	6000,00	Prog	6000				100,0%
					Ejec	6000				100,0%
* Obras de drenaje	UND	1	1	1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
MINICARGADOR		
RETROEXCAVADORA		
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARROYO DE PIEDRA - ATLÁNTICO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGECOST ARROYO DE PIEDRA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que no ha presentado que fuentes de material va a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que aún no se define que permisos debe gestionar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Se remite a contratista aprobación del documento P.A.G.A dediante comunicación U232-REP-016-22 de fecha 31 de enero de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se continua con el punto de atencion a la comunidad, brindando orientacion a los usuarios directos e indirectos del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TECNICA

Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K2+552

GESTIÓN SOCIAL

*Seguimiento y apoyo al contratista en el area social por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


GESTIÓN TECNICA

*Continuar con el acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas en obra.

GESTIÓN SOCIAL

*Atención de observaciones a ajustes a que haya lugar en el area social

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K2+552



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K2+552

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	
*Remisión comunicación U232-REP-024-23 de fecha 28-feb-23 Recomendando al municipio el inicio de proceso sancionatorio por posible incumplimiento de obligaciones contractuales.	FIRMA NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS Matrícula Profesional N° 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 108 (Numeración consecutiva) del 25/10/2024 al 31/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 0,94 — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 3.0 — No. PUENTES: N/A — OTROS: BOXCULVERT 2X2: 1UND

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3 km de pavimento rígido, con 1 estructuras de drenajes tipo Boxculvert 2x2 ,940m en mejoramiento con afirmado, en la vía que comunica la cabecera municipal de Repelón con el Banco-Totumo-Bijibana, en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,		
INTEGRANTES:	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA,		
CONTRATO No.	2022-04-25-001	VALOR INICIAL:	$ 10.938.516.274,20
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 10.938.516.274,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 4.499.500.000	$ 4.639.016.274	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 1.639.379.955	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 822.540.545	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 10.907.505.774,03	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.907.505.774,03	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.102.313.568,43	83,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.805.192.205,60)	-16,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.907.505.774,03	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.102.313.568,43	83,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.805.192.205,60)	-16,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 186.736.498,85	1,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.361.258,66	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.039.756.501,95	24,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.039.756.501,95	24,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 9.601.973,00	0,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 9.601.973,00	0,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	58,69%
Acumulado:	11,42%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 83,45%
Avance o Atraso Físico %: -16,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Pavimento rigido	km	3,00	3	3	Prog	2				66,7%
					Ejec	1,4				46,7%
* Explanaciones	m3	6000,00	6000,00	6000,00	Prog	6000				100,0%
					Ejec	6000				100,0%
* Obras de drenaje	UND	1	1	1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
MINICARGADOR		
RETROEXCAVADORA		
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARROYO DE PIEDRA - ATLÁNTICO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGECOST ARROYO DE PIEDRA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que no ha presentado que fuentes de material va a utilizar.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en las actividades de revisión y ajustes estudios y diseños, por lo que aún no se define que permisos debe gestionar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Se remite a contratista aprobación del documento P.A.G.A dediante comunicación U232-REP-016-22 de fecha 31 de enero de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Se continua con el punto de atencion a la comunidad, brindando orientacion a los usuarios directos e indirectos del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA IOBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TECNICA

Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424

GESTIÓN SOCIAL

*Seguimiento y apoyo al contratista en el area social por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


GESTIÓN TECNICA

*Continuar con el acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas en obra.

GESTIÓN SOCIAL

*Atención de observaciones a ajustes a que haya lugar en el area social

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424



Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	
*Remisión comunicación U232-REP-024-23 de fecha 28-feb-23 Recomendando al municipio el inicio de proceso sancionatorio por posible incumplimiento de obligaciones contractuales.	FIRMA NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS Matrícula Profesional N° 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	4/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+833 al K3+733 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	5/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+733 al K3+680 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	7/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+680 al K3+620 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	8/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+620 al K3+583 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	9/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+583 al K3+550 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	10/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+553 al K3+500 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	11/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+500 al K3+450 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	12/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima con lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+450 al K3+400 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	14/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+400 al K3+350 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	15/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+350 al K3+300 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	16/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+300 al K3+250 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	17/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de Concreto clase D para reparación de losas fracturadas desde el K3+250 al K3+243 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	18/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• No se ejecutaron actividades debido a las intensas lluvias desde tempranas horas de la mañana • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	19/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+243 al K3+200 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	21/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias intensas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+200 al K3+180 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	22/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+180 al K3+150 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	23/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+150 al K3+120 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	24/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+120 al K3+000 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	25/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K3+000 al K2+552 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	26/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+100 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	28/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+230 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	29/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+350 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	30/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+350 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

BITACORA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	31/10/2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima lluvias moderadas
EQUIPOS EN OBRA	Minicargador y herramientas menores.
PERSONAL EN OBRA	Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Concreto clase D para Reparación de losas fracturadas desde el K0+000 al K0+424 • Se le recomienda al contratista aumentar el rendimiento • Mejorar la señalización al largo de la vía y en los puntos de alto riesgo



Firma _____
Residente interventoría
LUCAS RESTREPO



Firma _____ _____
Representante legal
EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
