INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL,PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTODEL ATLANTICO - LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 25
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

ANEXO 9 MUNICIPIO DE SABANALARGA - PATILLA
CONTRATO DE OBRA LP-003-2022
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1746 2021

LA VIALIDAD

CONSORCIO VIGE 196

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	31-10-2024	Elaboración de Informe


CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	LUCAS RESTREPO
	Cargo	Residente de Interventoría 1
	Firma	
	Nombre	WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
	Cargo	Residente de interventoría 2
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	Director de Interventoría
FECHA DE ENTREGA:		**31 de octubre de 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo general 7
1.1. Objetivos específicos 7
2. Localizacion del proyecto 8
2.1. Generalidades del contrato de obra 9
2.2. Inventario y estado inicial de la vía 10
2.3. Características técnicas del proyecto 10
3. Información contrato de obra 13
3.1. Descripción de actividades ejecutadas en el mes 13
3.2. Planes de contingencia elaborados por el contratista 14
3.3. Seguimiento a ítems no previstos 14
4. Seguimiento de ejecución mensual contrato de obra 15
4.1. Actividades ejecutadas por la interventoría 15
4.2. Acciones a seguir por parte de la interventoría 15
4.3. Personal contrato de obra 15
4.4. Equipos en obra 15
4.5. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 15
4.6. Estado general del tiempo 16
4.7. Resumen ensayos de laboratorio 16
4.8. Control aportes y seguridad social contrato de obra 16
4.9. Informe avance físico-financiero 17
4.10. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 17
4.11. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra 17
4.12. Otros documentos seguimiento mensual 17
5. Registro fotografico 19
6. Conclusiones y recomendaciones 20
7. Anexos 21
7.1. Relación de correspondencia generada 21
7.1.1. Correspondencia enviada 21
7.1.2. Correspondencia recibida 21

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL
Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA
Anexo 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA
Anexo 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA
Anexo 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Generalidades del contrato de Sabanalarga, Patilla 9
Tabla 2.Características técnicas del proyecto 11
Tabla 3.Facturación de contrato de obra 16
Tabla 4.CUMPLIMIENTO No. 530-47-994000037465 Anexo 2 del 04/05/2023..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 5.RCE No. 530-74-99400015324 Anexo 2 del 03/05/2023 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6.Relación correspondencia enviada frente de obra 9 21
Tabla 7.Relación correspondencia recibida 21

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Localización del Proyecto 8
Ilustración 2.Localización del Proyecto 9-Sabanalarga, Patilla 9
Ilustración 3.Corte transversal de la estructura de la via (placa huella) sección normal: 11
Ilustración 4.Avance físico del proyecto 14

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.Avance Financiero 16
Gráfico 2.Avance Físico Financiero 17

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N° CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe a gestión realizada por el CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, Contrato de Obra N° LP-003-2022, Proceso de contratación LP-003-2022 SECOP I, suscrito entreel Municipio de SABANALARGA y CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA e Interventoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de las actividades consistentes en el Contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEL NOROCCIDENTE DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 3” periodo del 1 al 31 de octubre de 2024.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativaen desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría

- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimientode los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos


- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de La Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:

Ilustración 1.Localización del Proyecto

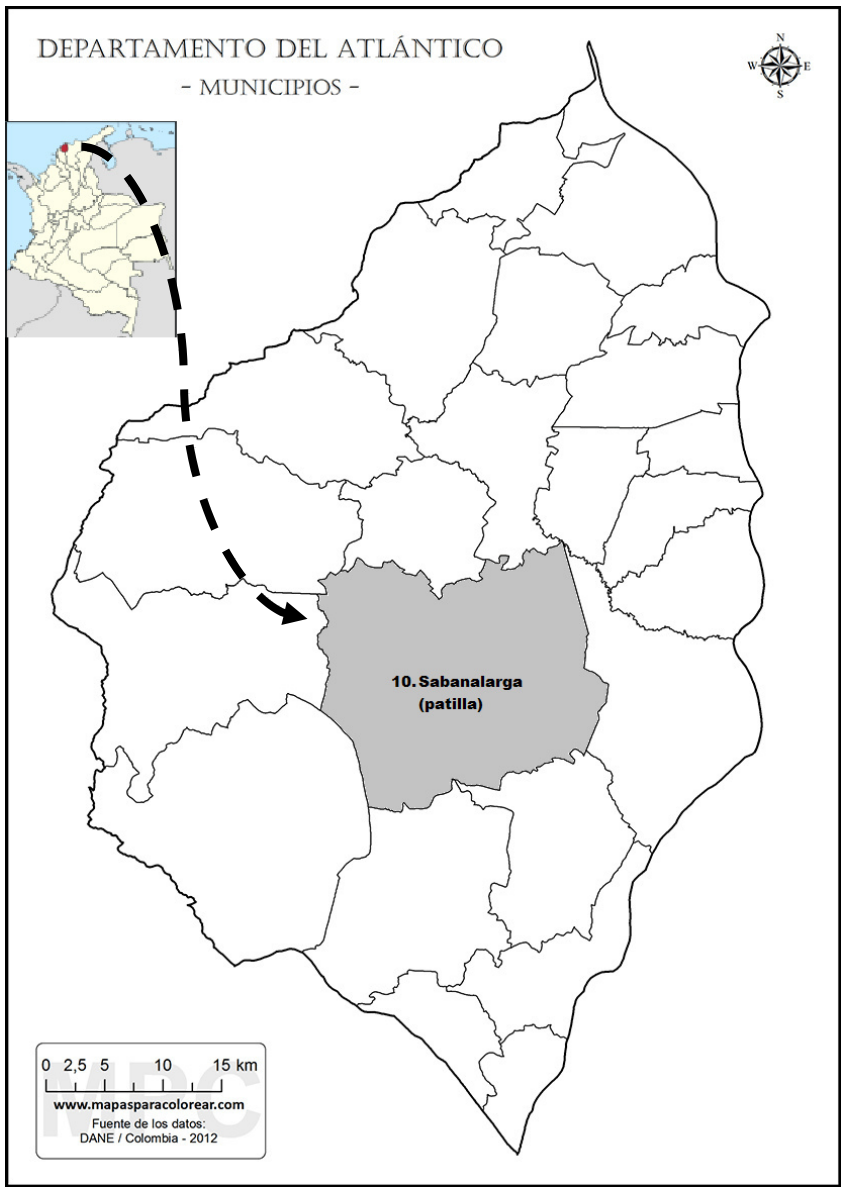


Fuente. Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de SABANALARGA- ATLÁNTICO consiste en realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO, específicamente en la vía terciaria que de PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

El corredor vial se encuentra ubicado en el municipio de Sabanalarga como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 2.Localización del Proyecto 9-Sabanalarga, Patilla

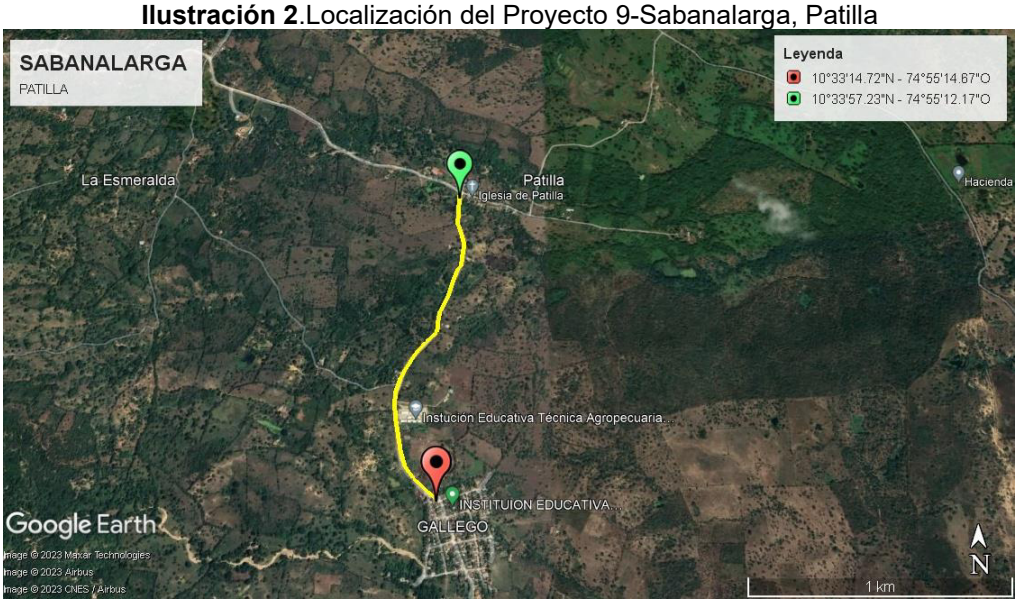

Fuente: Google Earth - Consorcio VIGE 196

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en mejorar la vía en afirmado y placa huella en los sitios más críticos, con una longitud total de 1,0 km en la vía que del corregimiento de PATILLA conduce al corregimiento de GALLEGO, en el municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, la cual será de 5,0 m de ancho y cumplirá con la normativa existente a fin de incrementar la productividad del campo en lazona.

Tabla 1. Generalidades del contrato de Sabanalarga, Patilla

Generalidades	Contrato de obra
Razón Social	CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO
Nit	901.614.144-6
Número del contrato	No LP-003-2022
Numero de Proceso SECOP I	LP-003-2022
Representante legal	MICHAEL CORTES LINERO
Número del Contacto	3017195971
Valor Inicial del Contrato	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 1.798.927.655,00) MONEDA CORRIENTE.
Dirección	Calle 64 No. 23 – 60 Barranquilla

Generalidades	Contrato de obra
Fecha de inicio	06 de octubre del 2022
Plazo Inicial Contrato	Cuatro (4) Meses, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Prorroga No 1.	Del 30-12-2022, hasta el 5 de febrero de 2023 para completar el plazo contractual inicial de 4 meses.
Prorroga No.2	Del 02-02-2023, hasta el 6 de junio de 2023.
Prorroga No.3	Del 06-06-2023, hasta el 6 de septiembre de 2023.
Suspensión	29 de agosto de 2023 hasta el 08 de octubre (40 días)
Adición	NA
Fecha de terminación	Se está en espera de la prórroga por parte del municipio.
Fecha de terminación actual	Se está en espera de la prórroga por parte del municipio.

Fuente. Consorcio VIGE 196

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía terciaria que comunica la cabecera municipal de Sabanalarga específicamente con la vereda PATILLA – GALLEGO. Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio de Sabanalarga, presenta una estructura del carreteable estable con algunos pontos que restringen la movilidad, la falta de rocería evitala evacuación de escorrentías superficiales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la vía en afirmado y placa huella en los sitios más críticos, con una longitud total de 1,0 km en la vía que de Patilla conduce a Gallego, en el municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, la cual será de 5,0 m de ancho y cumplirá con la normativa existente. El proyecto solucionaría una compleja situación de transitabilidad y movilidad, que pone en bastante riesgo de inseguridad por el lodo y el encharcamiento de las aguas, a la población buscando así mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural.

El proyecto contempla la construcción de 1000 metros de placa huella con una sección transversal útil de 3,6 m y mejoramiento en afirmado para una longitud de intervención total de 1 Km en la vía que de Patilla conduce a Gallego, en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico. El tramo contará con 5 zonas de rebase en donde la sección será de 5 m, como se muestra a continuación:


Tabla 2.Características técnicas del proyecto

SABANALARGA PATILLA					
TIPO DE OBRA	**SECCIÓN (m)**	**ABSCISA**		**LONGITUD -(m)**	**ESTADO**
		INICIO	**FIN**		
PLACA HUELLA	3,6 ancho	K0+000	K0+270	270	EN CONSTRUCCION
PLACA HUELLA	3,6 ancho	K0+689	K0+876	187	CONSTRUIDO
PLACA HUELLA	3,6 ancho	K0+876	K1+480	604	CONSTRUIDO

Fuente. Consorcio VIGE 196

A continuación, se muestra un corte transversal de la estructura de la via (placa huella) sección normal:

Ilustración 3.Corte transversal de la estructura de la via (placa huella) sección normal:

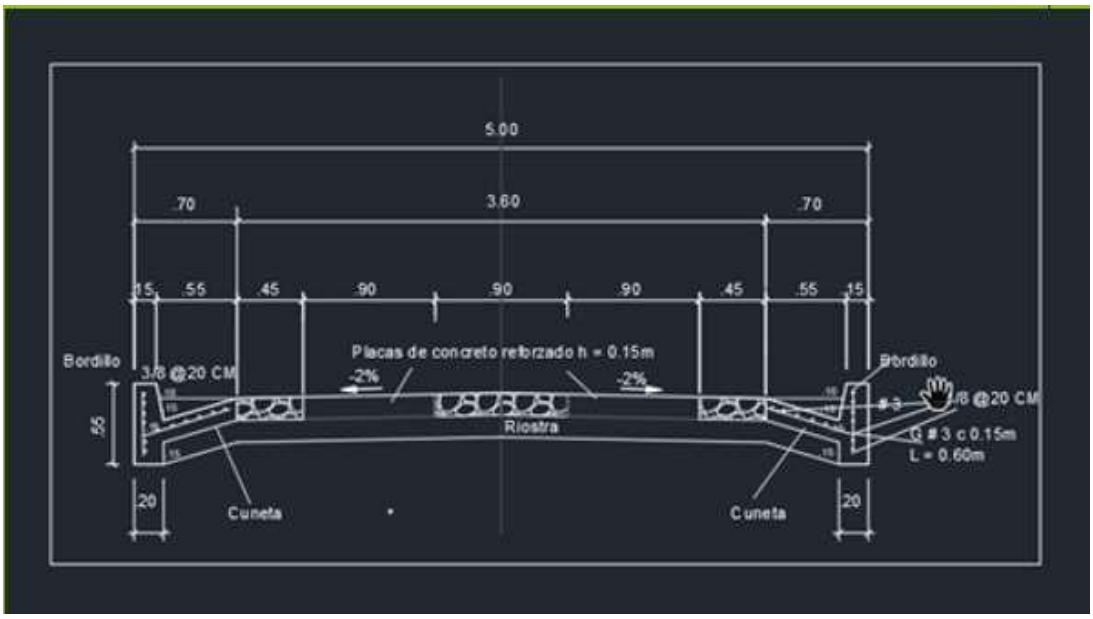

Fuente: Consorcio VIGE 196

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes:

- Afirmado
- Excavaciones varias en material común en seco a mano.
- Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
- Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
- Relleno para Estructuras con recebo
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para bordillos
- Subbase Granular Clase C.
- Concreto 3500 psi módulo de rotura 36 MPa
- Caracterización del corredor

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El acta de inicio del contrato de obra se estipuló para el 6 de octubre de 2022, y con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022.

El 6 de diciembre mediante memorando SVR 98837el INSTITUTO, solicita a la Subdirecciónde Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del convenio.

El Contratista mediante comunicado 002-2022 solicita la prórroga del contrato de obras, el 30 de diciembre de 2022 la Interventoría mediante comunicado N°. U232-SPA-013-22, porlas razones expuestas emite el concepto favorable para la prórroga del contrato.

La Alcaldía Municipal de Sabanalarga mediante correo electrónico de fecha 4 de mayo emite la Prórroga No. 2 del contrato de obra, en donde se extiende el contrato hasta el 06 de junio de 2023.

La Alcaldía Municipal de Sabanalarga mediante correo electrónico remite la Prórroga No. 3 del contrato de obra, en donde se extiende el contrato por tres (3) meses hasta el 06 de septiembre de 2023.

La Alcaldía Municipal de Sabanalarga suscribe Acta de Suspensión al contrato de obra LP-NO.003-2022, en donde se suspende la obra por un periodo de 40 días a partir del día 29 de agosto de 2023, en donde se define como nueva fecha de terminación del contrato el día 16 de octubre de 2023.

3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SEMANA 105- (DEL 04-10-2024 AL 10-10-2024)

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K0+200 hasta K0+170 derecho
- Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho

SEMANA 106 (Del 11-10-24 al 17-10-24)

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K0+170 a K0+100 derecho
- Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho
- Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) K0+150 a K0+100 derecho


SEMANA 107 (Del 18-10-24 al 23-10-24)

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K0+200 a K0+100derecho
- Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K0+100 a K0+00derecho
- Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho

El avance físico del proyecto se representa a través del siguiente esquema:

***Ilustración 4**.Avance físico del proyecto*

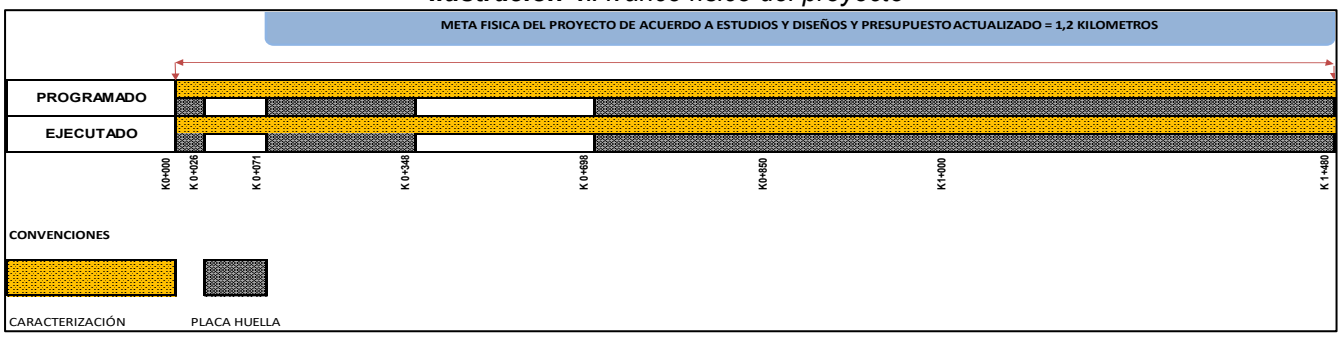

Fuente: Consorcio VIGE 196

3.2. PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista no gestionó un plan de contingencia, ya que no se ha determinado como necesario a la fecha de corte de este informe. Los planes de contingencia deben ser elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, con el fin de ajustar los atrasos presentados y que no se afecte el plazo contractual.

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo el contratista no ha solicitado para aprobación del Interventoría ítems no previstos.

4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Acompañamiento, seguimiento y control en la ejecución de las actividades descritas en el presupuesto de obra aprobado.
- Verificación de estado de maquinaria y equipos empleados, así como el suministro de materiales empleados para la construcción de la estructura de pavimento aprobada en los estudios entregados por el contratista.

4.2. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Gestionar ante el municipio de SABANALARGA, el envío del certificado de rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 1746 de 2021, así como su reintegro al INVIAS.

Continuar con el seguimiento de las actividades de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS.

Hacer seguimiento y control de las actividades ejecutadas, asimismo la verificaciónpermanente al cronograma de obra y flujo de inversión propuesto por el contratista y proponiendo alternativas que garanticen el cumplimiento del mismo.

Notificar a la entidad contratante el incumplimiento del programa de obra presentado por el contratista a la interventoría.

Informar a la entidad contratante el incumplimiento de la inversión descrita en el flujo de inversión presentado por el contratista.

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo el contratista cuenta con personal en obra, información que será descrita en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA (Anexo 1.).

4.4. EQUIPOS EN OBRA


Durante este periodo el Contratista dispuso de maquinaria en obra, relacionadas en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 3)

4.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista hasta el periodo de septiembre ha realizado una inversión de $ 1.753.954.463,63 representado en un 97,50%. En cuanto al avance programado y cálculo del atraso financiero, no se pudo tener conclusiones debido a que aún no ha sido presentada la prórroga junto a su

respectivo programa de inversiones ajustado. En la siguiente grafica se representan a través de diagramas de barras la inversión programada y ejecutada hasta la fecha del presente informe:

Gráfico 1.Avance Financiero

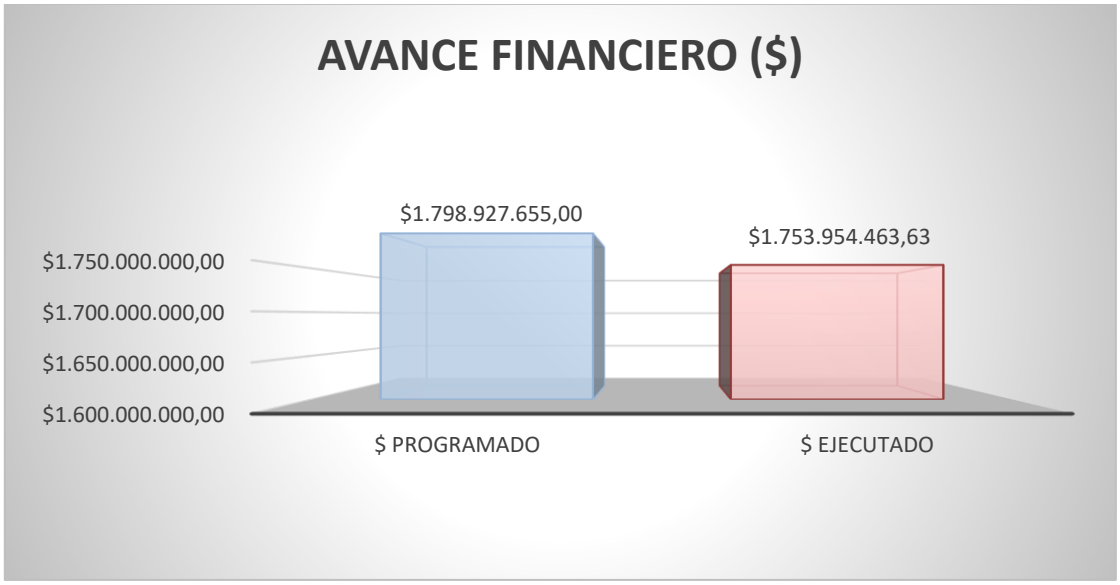

Fuente: Consorcio VIGE 196

Tabla 3.Facturación de contrato de obra

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA							
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**VALOR ACUMULADO**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**%**	**% ACUMU**	**% RESTANTE**
No.1	jun-23	$529.235.592,88	$ 529.235.592,88	$1.269.692.062,12	29,42%	29,42%	70,58%
No.2	ago-23	$627.986.498,36	$1.157.222.091,24	$641.705.563,76	34,91%	64,33%	35,67%
No.3	dic-23	$240.531.638,00	$1.397.753.729,24	$401.173.925,76	13,37%	77,70%	22,30%

Fuente – Consorcio VIGE 196

4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el municipio de Sabanalarga durante el periodo de octubre se presentaron lluvias moderadas y fuertes, los datos diarios de esta actividad se registrarán en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Anexo 4)

4.7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No se tomaron muestras de laboratorio.


4.8. CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

El seguimiento a los aportes y seguridad social para el periodo del presente informe se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA (Anexo 5).

4.9. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

El contratista a fecha del presente informe tiene un avance físico del 97,50%, representado en $ 1.748.557.680,66 del valor total del contrato.

Gráfico 2. Avance Físico Financiero

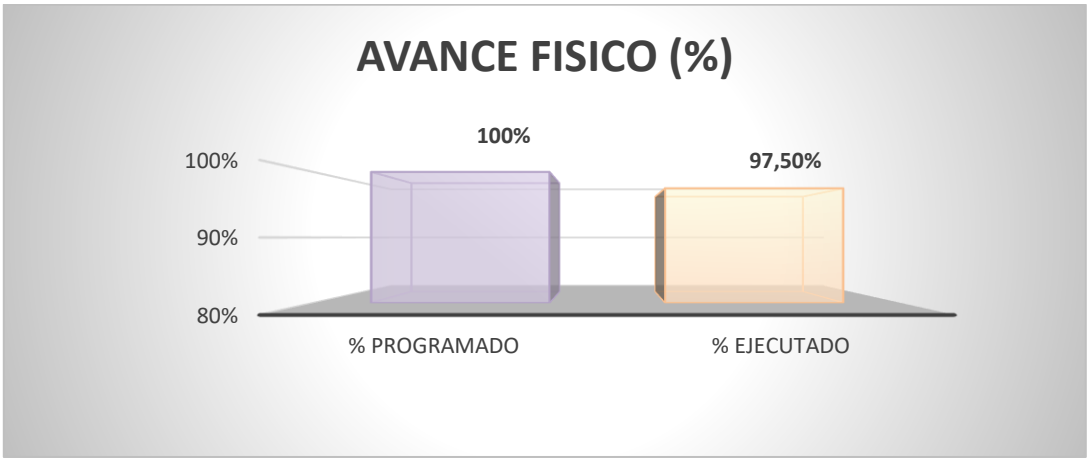

Fuente: Consorcio VIGE 196

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe, se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN YPRESUPUESTAL OBRA, (*Anexo 4*)

4.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra cuenta con las pólizas de cumplimiento No. 530-47-994000037465 del 04 de mayo de 2023, y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 530-74-99400015324 del 03 de mayo de 2023. El seguimiento garantías y seguros contrato de obra del frente de obra para el periodo del presente informe se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (*Anexo 5*).

4.11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

En este periodo no se realizó seguimiento al plan de calidad, las observaciones concernientes a este tema se relacionarán en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA.

4.12. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.12.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contrato de obra contempla un anticipo por el 30% del valor del contrato, el contratista renuncia al anticipo, por lo que en el proceso de facturación no se realiza amortización al valor de cada acta parcial que presente el contratista.

4.12.2. Seguimiento Programa de Obra.

La interventoría está a la espera de la entrega de la prórroga N°4 y de un programa de obra ajustada al nuevo plazo de ejecución.

4.12.3. Seguimiento Programa de Inversiones

La interventoría está a la espera de la entrega de la prórroga N°4 y de un programa de inversiones ajustado al nuevo plazo de ejecución.

4.12.4. Actas de comité de obra

Durante el periodo comprendido para la elaboración de este informe no se desarrollaron reuniones de comité de obra.

4.12.5. Acta de reunión

Durante el periodo no se desarrollaron actas de reunión.

4.12.6. Informe Semanal

Para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, se generaron cuatro (4) informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL (*Anexo 6)*

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Foto N°1 Vaciado Concreto clase D para placa huella	**Foto N°2** Vaciado Concreto clase D para placa huella
	
Foto N°3 Vaciado Concreto clase D para placa huella	**Foto N°4** Placa huella

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría solicita al municipio suspender la ejecución de actividades que viene ejecutando el contratista, toda vez que, el contrato carece de documentos que hacen parte integral del contrato de obra, que impide el cumplimento de las obligaciones contractuales de la Interventoría.

- El municipio no ha sido diligente en la entrega de certificación de rendimientos financieros de los dineros derivados del convenio interadministrativo 1974 de 2021, a pesar del requerimiento de la Interventoría, se sugiere al Instituto tomar medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio.

- Coadyuvar ante los municipios, que se realicen los modificatorios dentro del contrato de obra de forma oportuna, y así dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo que el INVIAS convino con el municipio de Sabanalarga.

- A corte de este informe el contratista presenta una inversión de $1.753.954.463,63

- El día 20 de junio de 2024, se remitió comunicación U232-SPA-057-24 dirigida a la representante legal del CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, mediante el cual se realizó la Solicitud de documentos contractuales contrato LP-NO.003-2022.

7. ANEXOS

7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

7.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 4.Relación correspondencia enviada frente de obra 9

COMUNICACIÓN	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

Fuente: Consorcio VIE 196

7.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 5.Relación correspondencia recibida

COMUNICACIÓN	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: Consorcio VIGE196

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Wladimir Guerrero Villanueva	80719017	Directo de obra		x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
2	Francisco Daniel Camargo B	8511829	Ayudande		x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
3	José Rafael Guerrero Palme	8510379	Ayudande		x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
4	Efraín Amador Gutiérrez Rive	8511023			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
5	Leonardo David Rojano Tapia	1043604968			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
6	Ronal E Domínguez Domíng	1045169282			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
7	Sixto Deivis Valencia Fuentes	3725425			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
8	Guillermo González Ruiz	1043607515			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
9	Max Enrique Silvera Yance	1002067818			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
10	Jeison Sarmiento Lopez	1143385706	Ing.Residente		x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												
	Lourdes Muñoz Gomez	32846818	T.Social		x	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
El contratista no entrego formato

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Representante legal

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONTRATO No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 975-2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIGE 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MOTONIVELADORA					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
VIBROCOMPACTADOR					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
					A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	
TOTAL ACTIVO				0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contratista no realizo formato

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Representante legal
CC:

Firma
Nombre: WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.22202-097112

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																30
Lluvias moderadas				x			x				x												x						x			
Lluvias intensas																						x										
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Registro pluviométrico del IDEAM SPA.csv

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MICHAEL CORTES LINERO
Representate legal
CC: 1.045.670.104

Firma
Nombre: WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.22202-097112

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

MES INFORME MENSUAL: 25 **PROYECTO:** VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022				Nacion	LP-003-2022	$ 1.798.927.655	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	jun-23	$ 444.735.792,34	$ 84.499.801,54	$ 529.235.592,88					$ 1.269.692.062					
2	parcial	ago-23	$ 527.719.746,52	$ 100.266.751,84	$ 627.986.498,36					$ 641.705.564					
3	parcial	dic-23	$ 202.127.427	$ 38.404.211,11	$ 240.531.638,00					$ 401.173.926					
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 1.488.466.832	$ 282.808.698	**$ 1.771.275.530**
*PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 4.468.104	$ 804.940	**$ 5.317.044,00**
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 3.298.976	$ 626.806	**$ 3.925.781,60**
*REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 15.470.000,00	$ 2.939.300,00	**$ 18.409.300,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 1.798.927.655,14**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MICHAEL CORTES LINERO
Representate legal
CC: 1.045.670.104

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

OBJETO DEL CONTRATO:

EL MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

FECHA DE INICIO: 6/10/2022

PLAZO INICIAL: 54meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11 de octubre 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.798.927.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.798.927.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.409.300,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.409.300,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 179.892.765,50	6/10/2022	6/09/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 539.678.296,50	6/10/2022	6/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.785.531,00	6/10/2022	6/9/2023
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 539.678.296,50	Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 539.678.296,50	12/12/2022	12/06/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 530-47-994000037465

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Predios Labores y Operaciones	10%	$ 200.000.000,00	6 / 2 / 2023	6 / 6 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 530-74-99400015324 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO — SEMANA No.: 105 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: N/A — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 2,50 — No. PUENTES: N/A — OTROS: N/A

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 2500 metros de Placa huella y mejoramiento en afirmado para una intervención total de 3,5 Km de la vía que comunica al municipio de Sabanalarga, con el corregimiento de Leña.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA		
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN NUEVA CASTELLANA - TECNICAL CIVIL SAS		
CONTRATO No.	LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.769.047.710,00
FECHA DE INICIO:	6/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ 2.128.200.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	5/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6.897.247.710,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 470.884.064,00	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.299.115.936,00	$ 2.461.920.500,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.850.307.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.693.145.597,68	68,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.623.957.492,98	67,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69.188.104,71)	-1,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.693.145.597,68	68,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.693.145.597,68)	-68,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 203.050.618,07	2,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.850.307,40	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 440.761.017,50	10,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 440.761.017,50	10,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.430.714.313,00
Amortizado $	$ 1.430.714.313,00
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	61,11%
Acumulado:	9,53%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,51%
Meta Física Ejecutada %: 67,50%
Avance o Atraso Físico %: -1,01%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	1		Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Placa huella	KM	2.5			Prog	0,5	0,5	0,5		62,8%
					Ejec	0,5	0,5	0,2		60,0%
* Mejoramiento	KM	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Minicargador	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: ARROYO DE PIEDRA	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: satelital

OBSERVACIONES:
*No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este proyecto no se contempla la adquisicion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No se generó gestión de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el Contratista se encuentra elaborando los ajustes estudios y diseños, y elaboración de documento PAGA. La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TÉCNICA

SEMANA 105 (Del 04-10-24 al 10-10-24)

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K2+300 a K1+920 borde derecho
Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K2+300 a K1+920 borde derecho
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) K2+300 a K1+920 borde derecho

GESTIÓN SOCIAL

* El contratista Brinda información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para lograr generar confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
* El contratista le informa a la comunidad del avance de obra a traves de volantes informativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

GESTIÓN TÉCNICA

* La interventoría continuará con el seguimiento y apoyo al contrato de obra.


GESTIÓN SOCIAL

*Continuar con el seguimiento y apoyo a la gestión llevaba a cabo por el contratista por parte de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

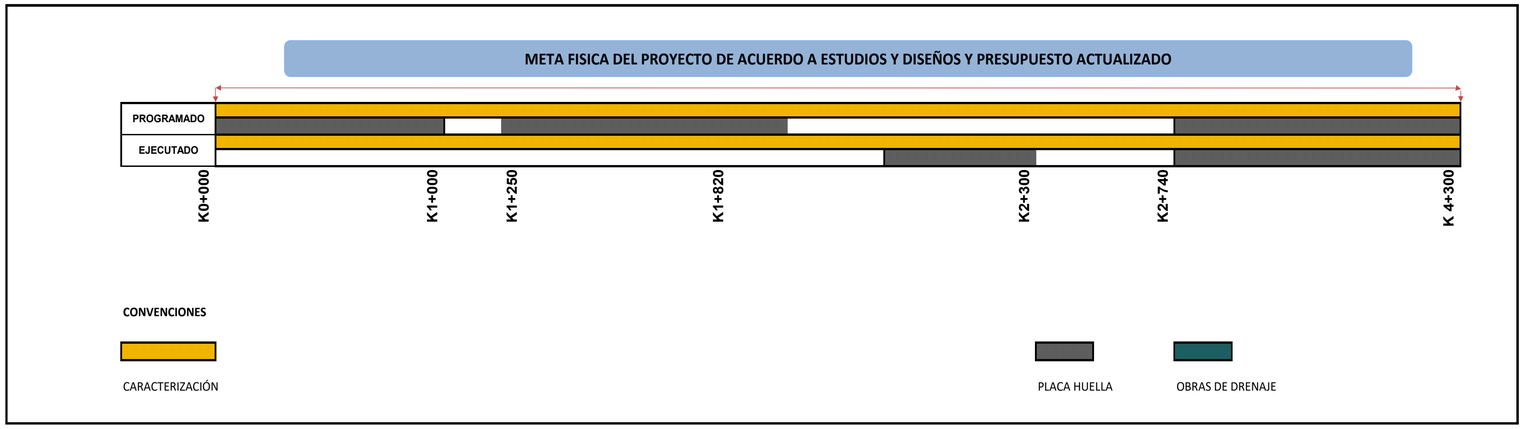

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K2+300 a K1+920 borde derecho



Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K2+300 a K1+920 borde derecho

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Acompañamiento en el levantamiento de las actas de vecindad al contratista	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	FIRMA
	NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO — SEMANA No.: 106 (Numeración consecutiva) del 11/10/2024 al 17/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: N/A — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 2,50 — No. PUENTES: N/A — OTROS: N/A

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 2500 metros de Placa huella y mejoramiento en afirmado para una intervención total de 3,5 Km de la vía que comunica al municipio de Sabanalarga, con el corregimiento de Leña.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA		
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN NUEVA CASTELLANA - TECNICAL CIVIL SAS		
CONTRATO No.	LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.769.047.710,00
FECHA DE INICIO:	6/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ 2.128.200.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	5/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6.897.247.710,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 2.461.920.500,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.850.307.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.889.064.389,24	71,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.645.878.476,65	67,82%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (243.185.912,59)	-3,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.889.064.389,24	71,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.889.064.389,24)	-71,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 203.050.618,07	2,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.850.307,40	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 444.947.350,09	10,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 444.947.350,09	10,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.430.714.313,00
Amortizado $	$ 1.430.714.313,00
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	61,11%
Acumulado:	9,58%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 71,37%
Meta Física Ejecutada %: 67,82%
Avance o Atraso Físico %: -3,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	1		Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Placa huella	KM	2.5			Prog	0,5	0,5	0,5		62,8%
					Ejec	0,5	0,5	0,2		60,0%
* Mejoramiento	KM	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Minicargador	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARROYO DE PIEDRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: .

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: satelital

OBSERVACIONES:
*No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este proyecto no se contempla la adquisicion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No se generó gestión de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el Contratista se encuentra elaborando los ajustes estudios y diseños, y elaboración de documento PAGA. La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TÉCNICA

SEMANA 106 (Del 11-10-24 al 17-10-24)

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K1+920 a K1+1858 borde derecho
Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K1+920 a K1+1858 borde derecho
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) K1+920 a K1+1858 borde derecho

GESTIÓN SOCIAL

* El contratista Brinda información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para lograr generar confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
* El contratista le informa a la comunidad del avance de obra a traves de volantes informativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

GESTIÓN TÉCNICA

* La interventoría continuará con el seguimiento y apoyo al contrato de obra.


GESTIÓN SOCIAL

*Continuar con el seguimiento y apoyo a la gestión llevaba a cabo por el contratista por parte de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

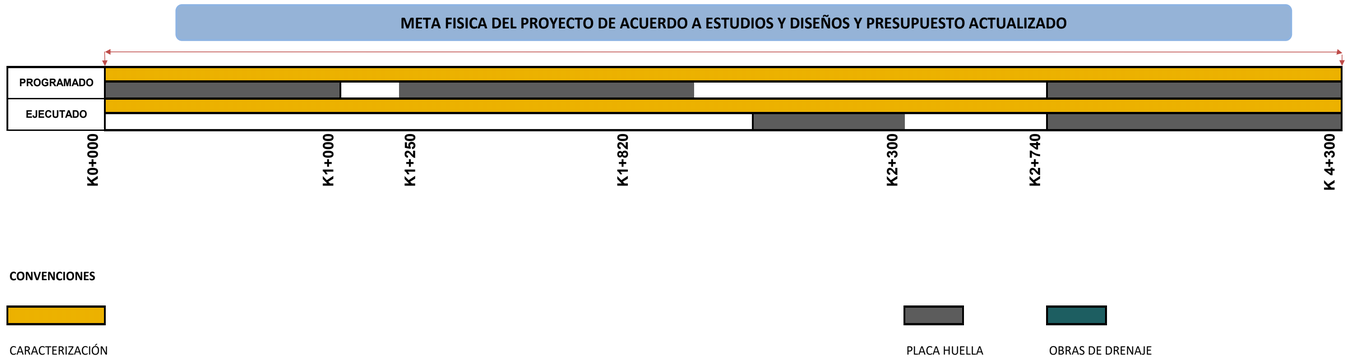

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K1+920 a K1+1858 borde derecho



Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K1+920 a K1+1858 borde derecho

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Acompañamiento en el levantamiento de las actas de vecindad al contratista	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	FIRMA
	NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO — SEMANA No.: 107 (Numeración consecutiva) del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
KM A MEJORAR: N/A — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 2,50 — No. PUENTES: N/A — OTROS: N/A

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 2500 metros de Placa huella y mejoramiento en afirmado para una intervención total de 3,5 Km de la vía que comunica al municipio de Sabanalarga, con el corregimiento de Leña.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA		
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN NUEVA CASTELLANA - TECNICAL CIVIL SAS		
CONTRATO No.	LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.769.047.710,00
FECHA DE INICIO:	6/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ 2.128.200.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	5/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6.897.247.710,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 2.461.920.500,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.850.307.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.085.668.211,53	74,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.670.539.583,27	68,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (415.128.628,26)	-6,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.085.668.211,53	74,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.085.668.211,53)	-74,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 203.050.618,07	2,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.850.307,40	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 449.133.682,69	10,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 449.133.682,69	10,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.430.714.313,00
Amortizado $	$ 1.430.714.313,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	61,11%
Acumulado:	9,62%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 74,24%
Meta Física Ejecutada %: 68,18%
Avance o Atraso Físico %: -6,06%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1	1		Prog	1				100,0%
						Ejec	1				100,0%
*	Placa huella	KM	2.5			Prog	0,5	0,5	0,5		62,8%
						Ejec	0,5	0,5	0,2		60,0%
*	Mejoramiento	KM	1			Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Minicargador	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARROYO DE PIEDRA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: .

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: satelital

OBSERVACIONES:
*No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este proyecto no se contempla la adquisicion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No se generó gestión de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el Contratista se encuentra elaborando los ajustes estudios y diseños, y elaboración de documento PAGA. La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TÉCNICA

SEMANA 107 (Del 18-10-24 al 24-10-24)

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K2+300 a K2+100 borde derecho

Vaciado de concreto clase D cuneta desde K2+300 a K2+100 borde derecho

GESTIÓN SOCIAL


* El contratista Brinda información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para lograr generar confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
* El contratista le informa a la comunidad del avance de obra a traves de volantes informativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/10/2024 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

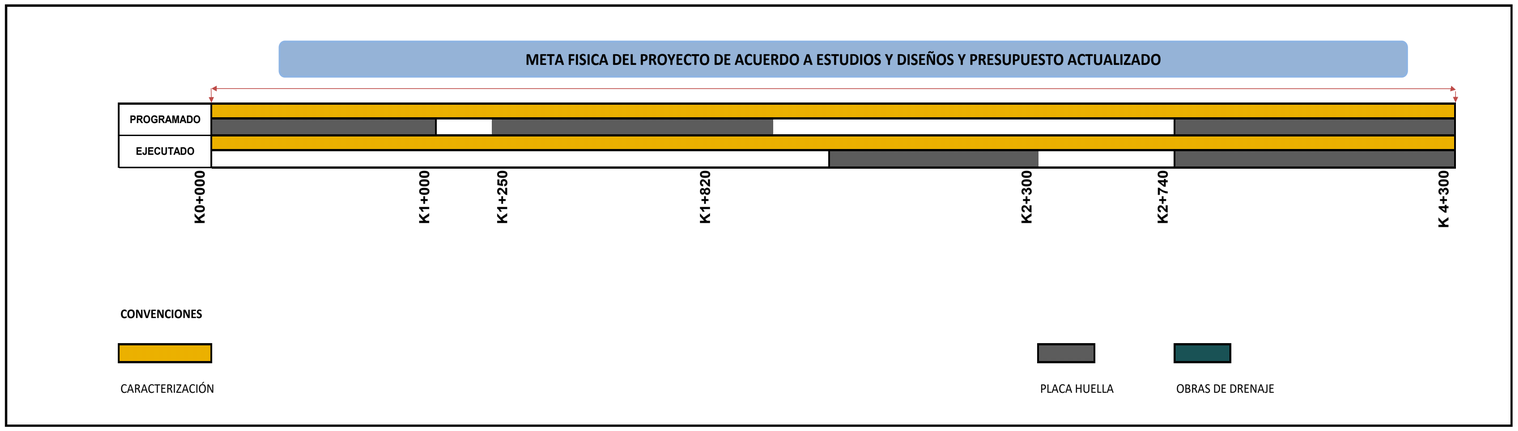

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto clase D cuneta desde K2+300 a K2+100 borde derecho



Vaciado de concreto clase D cuneta desde K2+300 a K2+100 borde derecho

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Acompañamiento en el levantamiento de las actas de vecindad al contratista	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	FIRMA
	NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO — SEMANA No.: 108 (Numeración consecutiva) del 25/10/2024 al 31/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 1 — KM A REHABILITAR: N/A — KM A CONSTRUIR: 2,50 — No. PUENTES: N/A — OTROS: N/A

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 2500 metros de Placa huella y mejoramiento en afirmado para una intervención total de 3,5 Km de la vía que comunica al municipio de Sabanalarga, con el corregimiento de Leña.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA		
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN NUEVA CASTELLANA - TECNICAL CIVIL SAS		
CONTRATO No.	LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.769.047.710,00
FECHA DE INICIO:	6/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ 2.128.200.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	5/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6.897.247.710,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/07/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIGE 196		
INTEGRANTES:	LA VIALIDAD LTDA - GEOVIAL LTDA		
CONTRATO No.	975 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE INICIO:	5/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.276.920.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.350.000.000,00	$ 3.419.047.710,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 2.461.920.500,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 45.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ 2.461.920.500,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.850.307.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.477.505.794,64	79,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.696.570.751,38	68,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (780.935.043,26)	-11,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.477.505.794,64	79,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.477.505.794,64)	-79,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 203.050.618,07	2,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.850.307,40	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 453.320.015,28	10,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 453.320.015,28	10,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.186.332,59	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10286 del 4/09/2024

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 145.372.294,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.430.714.313,00
Amortizado $	$ 1.430.714.313,00
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	61,11%
Acumulado:	9,65%

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,96%
Meta Física Ejecutada %: 68,56%
Avance o Atraso Físico %: -11,40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	1		Prog	1				100,0%
					Ejec	1				100,0%
* Placa huella	KM	2.5			Prog	0,5	0,5	0,5		62,8%
					Ejec	0,5	0,5	0,2		60,0%
* Mejoramiento	KM	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora de concreto	1	1
Minicargador	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: ARROYO DE PIEDRA	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: satelital

OBSERVACIONES:
*No se presentan observaciones.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este proyecto no se contempla la adquisicion de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No se generó gestión de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el Contratista se encuentra elaborando los ajustes estudios y diseños, y elaboración de documento PAGA. La interventoría radico, según lo señalado en el manual de interventoría a la subdirección de sostenibilidad documentos de soportes establecidos contractualmente para el componente social.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTIÓN TÉCNICA

SEMANA 108 (Del 25-10-24 al 31-10-24)

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). desde K2+100 a K1+888 borde derecho

Vaciado de concreto clase D cuneta desdeK2+100 a K1+888 borde derecho

GESTIÓN SOCIAL

* El contratista Brinda información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para lograr generar confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
* El contratista le informa a la comunidad del avance de obra a traves de volantes informativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

GESTIÓN TÉCNICA

* La interventoría continuará con el seguimiento y apoyo al contrato de obra.


GESTIÓN SOCIAL

*Continuar con el seguimiento y apoyo a la gestión llevaba a cabo por el contratista por parte de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

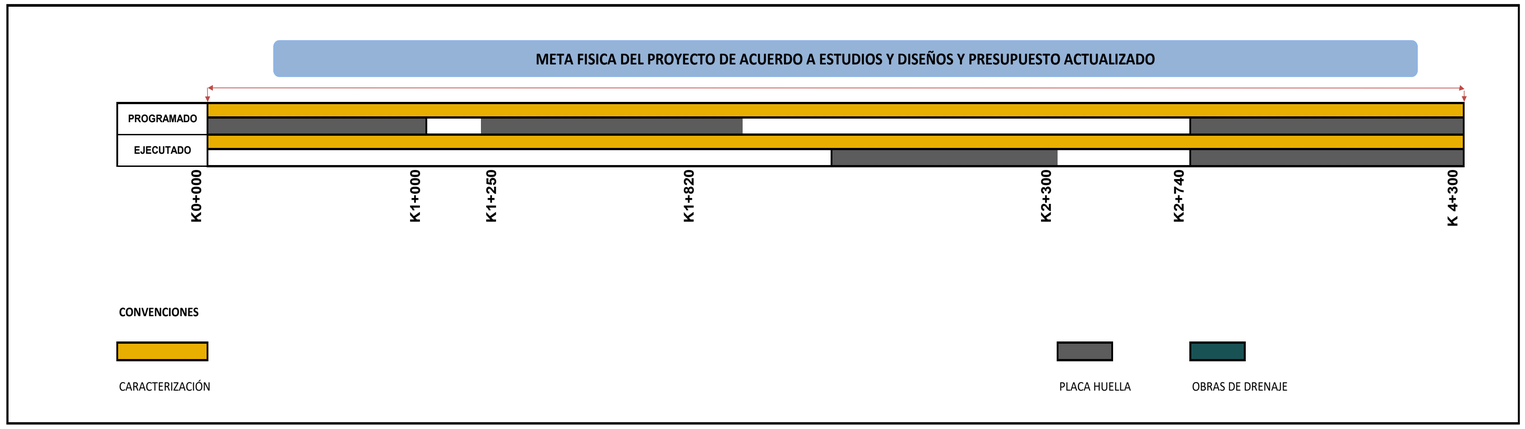

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto clase D cuneta desde K2+100 a K1+888 borde derecho



Vaciado de concreto clase D cuneta desde K2+100 a K1+888 borde derecho

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Acompañamiento al ajuste de diseños, de acuerdo al requerimiento del contratista o solicitud de la interventoría, en cada una de las áreas objeto de estudio.	
* Revisión expedita de diseños presentados por el Contratista.	
* Acompañamiento en el levantamiento de las actas de vecindad al contratista	
* Sugerir parámetros que garanticen el cumplimiento de las Normas y Especificaciones INVIAS.	FIRMA
	NOMBRE: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **PERIODO MES:** Octubre

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 6/10/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.798.927.655,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 975 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	Construcción	Km	1
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	Construcción	Km		0,914
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	5.756.560.837,90	1.093.746.559,20	$ 6.850.307.397,10
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	6.988.767,98	1.327.865,92	$ 8.316.633,90
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-PMT	11.906.873,11	2.262.305,89	$ 14.169.179,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.550.000,00	3.904.500,00	$ 24.454.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 6.897.247.710,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	964.223.940,33	183.202.548,66	$ 1.147.426.488,99	3.159.361.771,50
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.550.000,00	3.904.500,00	$ 24.454.500,00	24.454.500,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.497.226.806,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.306.788.260,49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,87%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado Concreto clase D para placa huella



Vaciado Concreto clase D para placa huella

Firma

Nombre Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	4-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	5-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	**7**-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	8-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	9-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	10-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+200 hasta K0+170 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	11-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	12-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	14-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	15-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	16-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	17-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto clase D Placa huella desde K0+170 a K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	18-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	19-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	21-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	22-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	23-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+200+ K0+100 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	24-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	25-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	26-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	28-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	29-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento

Residente de interventoría
William Tordecilla Payares

Representante Legal
Michael Cortes Linero

BITACORA SABANALARGA PATILLA LP-003-2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

FECHA	30-10-2024
ESTADO DEL TIEMPO	Clima seco despejado sin señales de lluvia
EQUIPOS EN OBRA	• Motoniveladora y Vibrocompactador
PERSONAL EN OBRA	• Cuadrilla de oficial y 3 ayudantes
OBSERVACIONES	• Vaciado de concreto bordillo desde K0+100 K0+00 derecho • Se le solicita al contratista aumentar el rendimiento



Residente de interventoría
William Tordecilla Payares



Representante Legal
Michael Cortes Linero
