ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	89	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. Excavación a maquina cancha de futbol	74,52	27,52	0,30				615,24
2. Excavación a maquina para zapata de muro de contencion de la cancha de futbol	102,04	1,60	0,55				89,80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:**	**Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:**

TOTAL PRESENTE ACTA: 705,03

OBSERVACIONES:

PLANO DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA

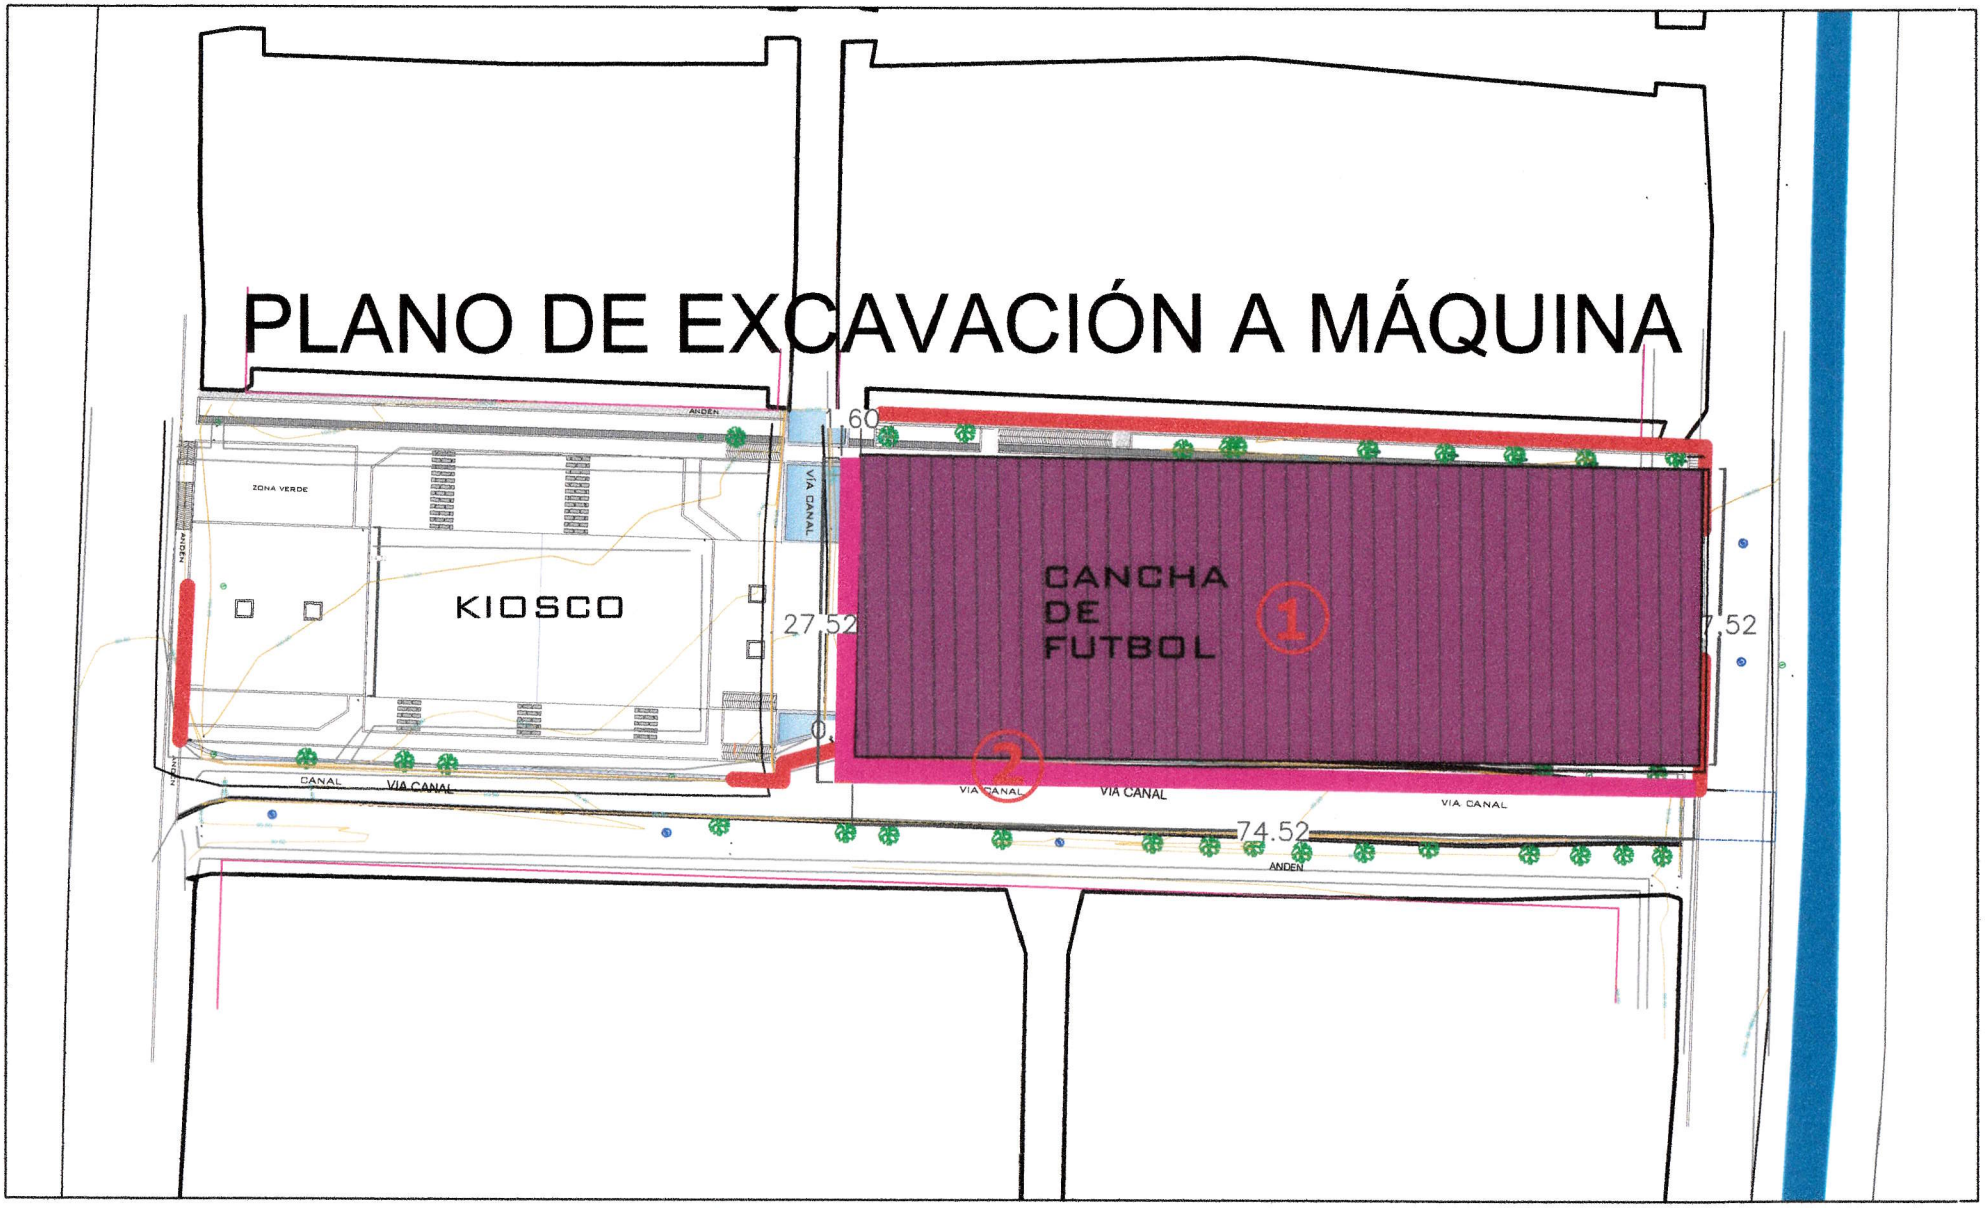

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:		LP-001-2024		**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:		02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES -	**CÓDIGO DEL**	89	**DESCRIPCION DE LA**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG	ANCHO	ALTURA		ML	M2	M3
1. Excavacion a maquina de la zanja de la instalacion de tuberia de gas	202,00	0,76	1,85				284,01
2. Excavacion pozo por descubrimiento de ojo de agua	11,10	11,00	1,70				207,57
3. Excavacion a maquina ladera desbancada para instalacion de big bag	25,00	6,30	3,50				551,25
Cantidad contractual según modificatoria No.2	**16.885,09**						
Acumulado anterior	**14.037,23**						
Acumulado a presente acta	**15785,09**						
Obra por ejecutar	**1100,00**						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		1.042,83

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:**	**Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:**

PLANO DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA

