ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 3 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 DE 3

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO - 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	4070	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINAS DE ZINC ALTURA 2,00 METROS (VER DISEÑO). PARQUE VILLA SAN PEDRO.

PARQUE VILLA SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
REPARACIONES DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE							
1. CALLE 102	15,00				15,00		
2. AV. CIRCUNVALAR	13,20				13,20		
TOTAL PRESENTE ACTA:							**28,20**

OBSERVACIONES: En este período se presentaron fuertes vientos, lo que produjeron que gran parte del cerramiento de cayera.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

Plano de cerramiento



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-001-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4070	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINAS DE ZINC ALTURA 2,00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

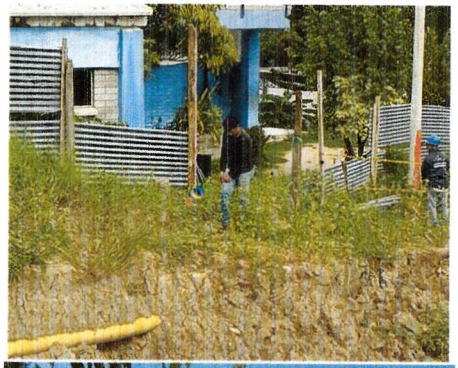








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CERRAMIENTO DEL PERIMETRO DEL PARQUE JORGE ROBLEDO							
1. LADO AV. CIRCUNVALAR	51,00				51,00		
2. AV. CIRVUNVALAR (protección puente peatonal)	12,00				12,00		
3. LADO CALLE 74	36,00				36,00		
4. LADO CARRERA 13 SUR	24,00				24,00		
5. LADO I.E.D	3,60				3,60		
6. LADO DERECHO COLEGIO	26,00				26,00		
7. ENTRADA COLEGIO	35,00				35,00		
TOTAL PRESENTE ACTA:					187,60		

OBSERVACIONES: En este periodo se presentaron fuertes vientos lo que produjeron que gran parte del cerramiento de cayera, ademas, del bandalismo que se presenta en la zona.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO DE CERRAMIENTO

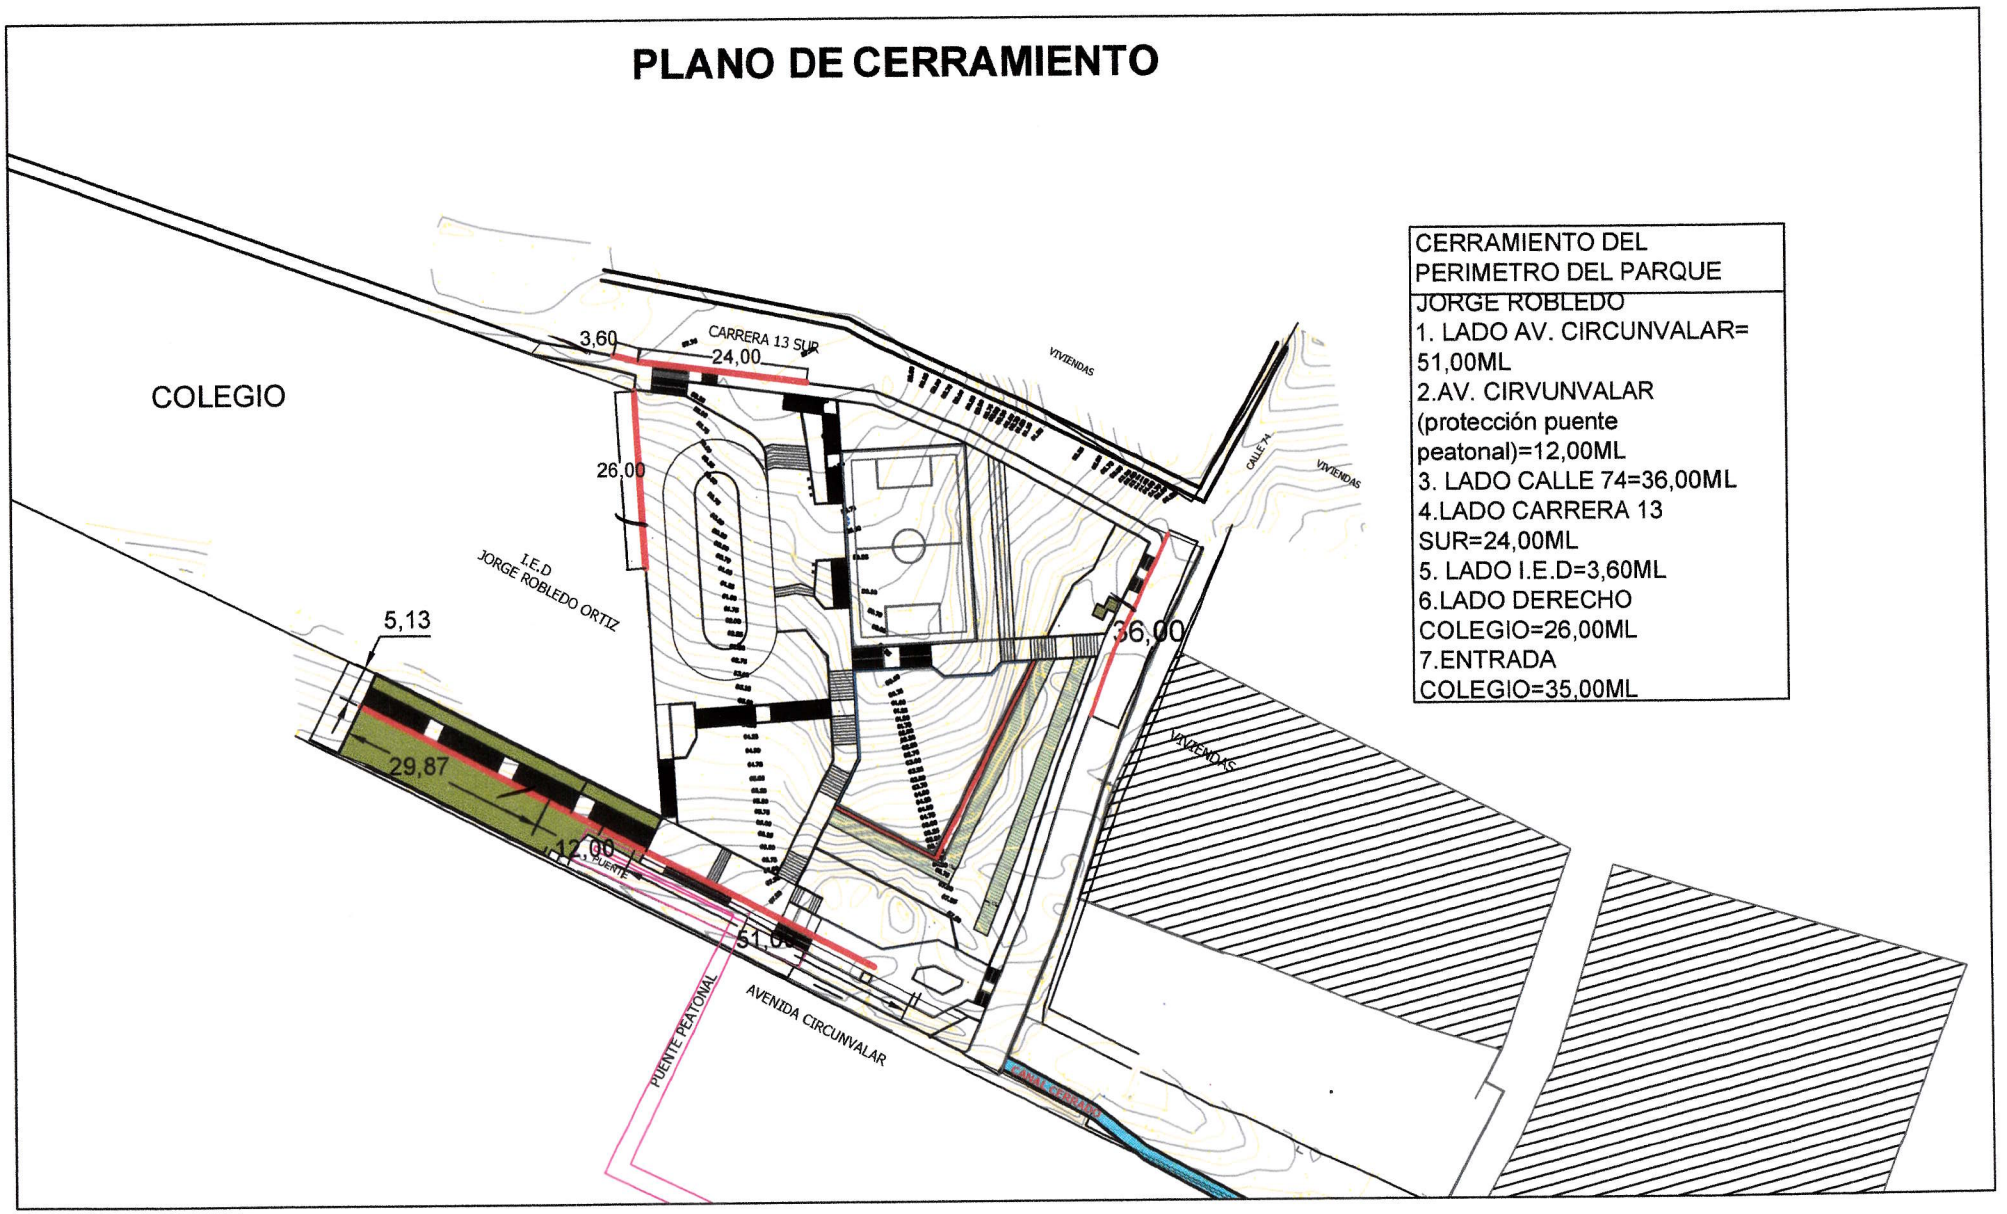

CERRAMIENTO DEL PERIMETRO DEL PARQUE JORGE ROBLEDO
1. LADO AV. CIRCUNVALAR= 51,00ML
2.AV. CIRVUNVALAR (protección puente peatonal)=12,00ML
3. LADO CALLE 74=36,00ML
4.LADO CARRERA 13 SUR=24,00ML
5. LADO I.E.D=3,60ML
6.LADO DERECHO COLEGIO=26,00ML
7.ENTRADA COLEGIO=35,00ML

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-001-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
FECHA:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4070	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINAS DE ZINC ALTURA 2,00 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

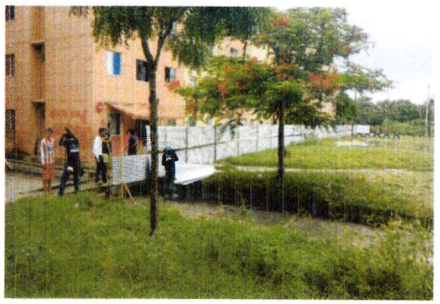

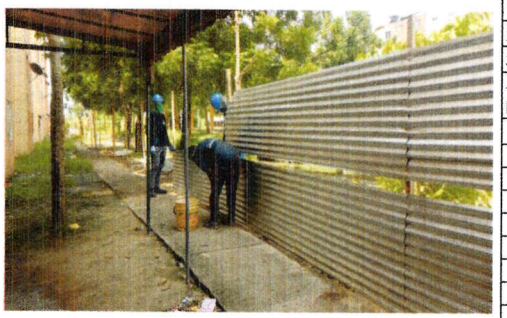





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. LADO DEL CANAL	84,00				84,00		
2. LADO DE APARTAMENTOS	71,00				71,00		
3. LADO VIA ARROYO	18,00				18,00		
4. LADO DE LA VIA ZONA DEL KIOSKO	16,00				16,00		

Cantidad contractual según modificatoria No.2	1.303,96
Acumulado anterior	899,16
Acumulado a presente acta	1303,96
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA: 189,00

OBSERVACIONES: En este periodo se presentaron fuertes vientos lo que produjeron que gran parte del cerramiento de cayera, ademas, del bandalismo que se presenta en la zona.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
Carlos Villegas		

PLANO DE CERRAMIENTO

