ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	AD-06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE VILLA SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



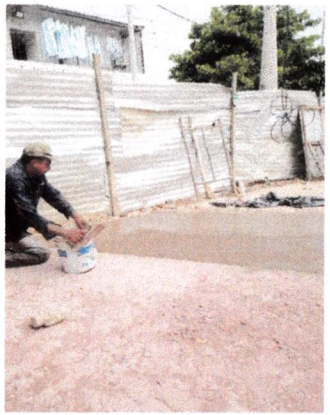

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. Area de concreto estampado (plazoleta entre zona de juego de niños y anden lado circunvalar)	22,05	4,01				88,42	
1. Area de concreto estampado (plazoleta entre zona de juego de niños y biosaludables)	3,74	8,40				31,42	

Cantidad contractual según modificartoria No.2	1705,20
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	119,84
Obra por ejecutar	1585,36

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

TOTAL PRESENTE ACTA: 119,84

OBSERVACIONES:

PLANO DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO FLUIDO DE 3000 PSI

