ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 3

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. Solado en concreto para zapatas de la cancha de futbol	102,04	1,50				153,06	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

TOTAL PRESENTE ACTA: 153,06

OBSERVACIONES:

PLANO DE SOLADO

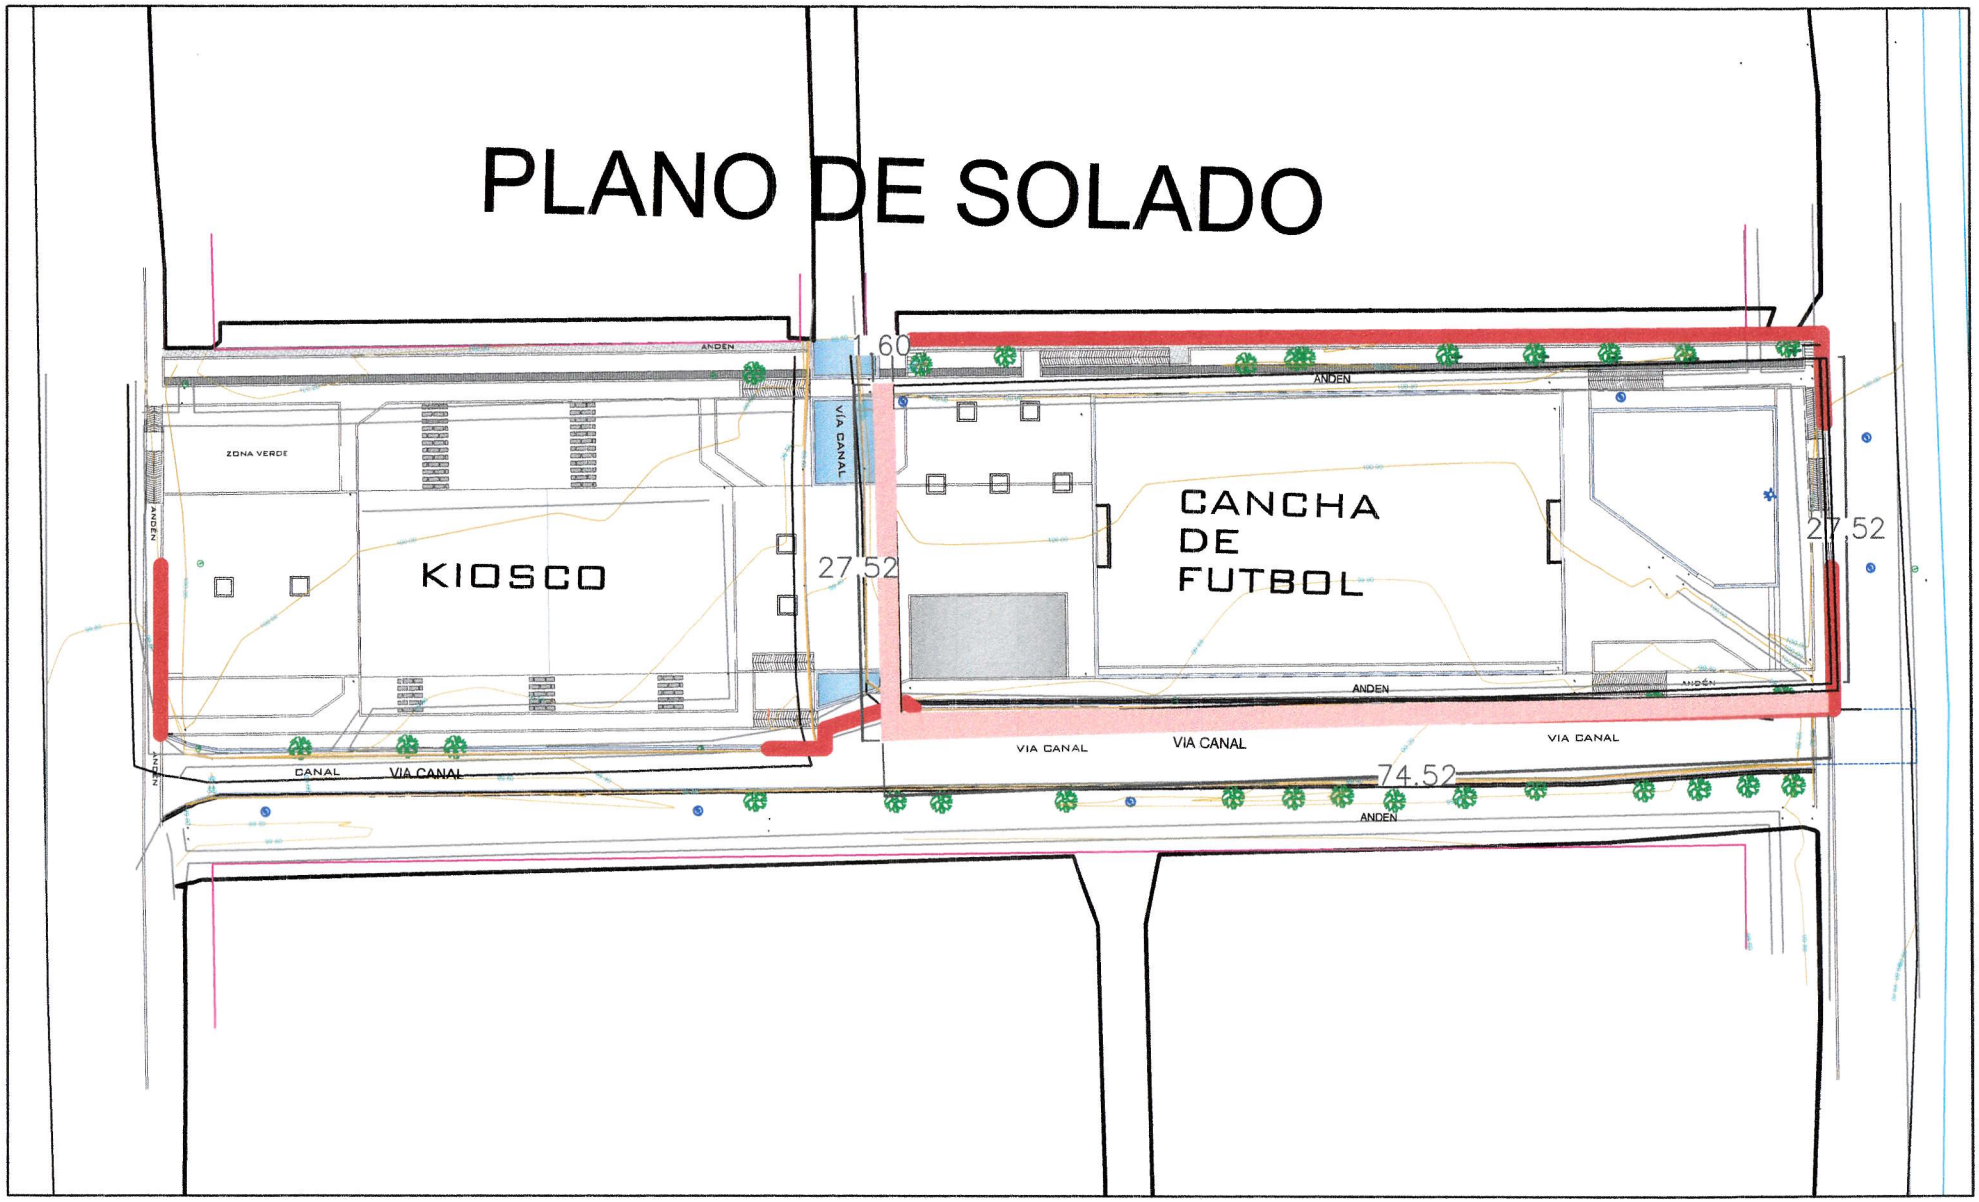

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 3

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO - 30 DE NOVIEMBRE DE				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE JORGE ROBLEDO


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



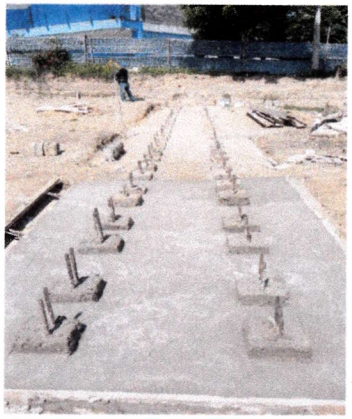

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. SOLADO PARA ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 1)	15,94	1,60				25,50	
2. SOLADO PARA ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 2)	27,00	2,00				54,00	

PLANO DE SOLADO

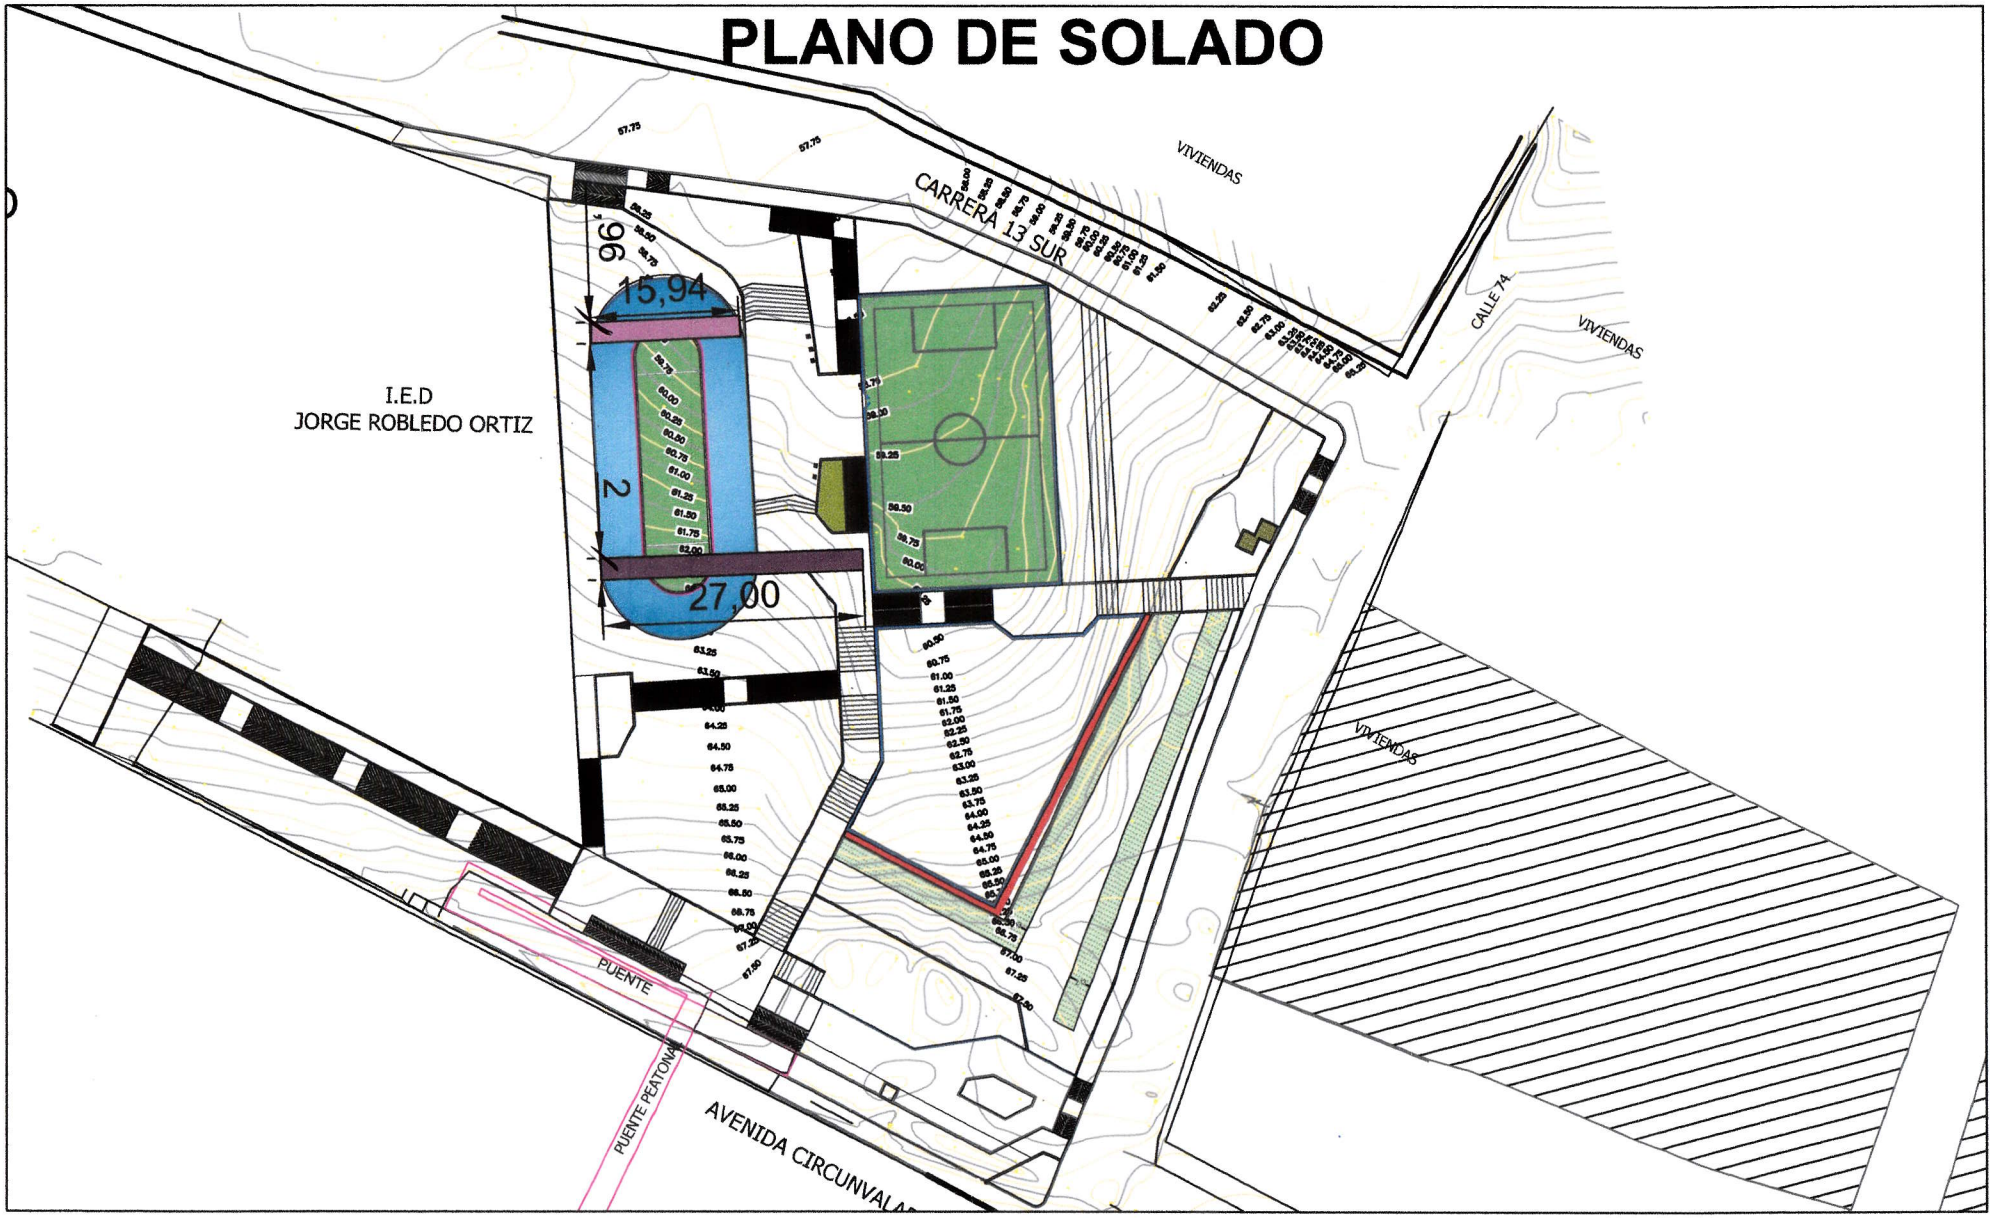

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-5

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


Código:	10-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	3 de 3

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO - 30 DE NOVIEMBRE DE				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE VILLA SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



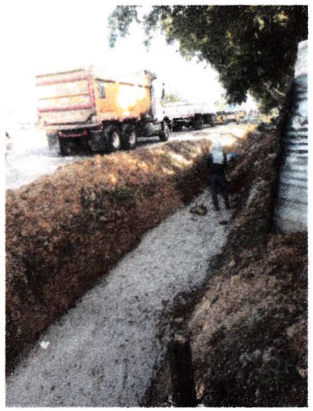

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. Solado para cuneta lado vía circunvalar	46,20	1,10				50,82	

Cantidad contractual según modificatoria No.2	300,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	283,38
Obra por ejecutar	16,62

TOTAL PRESENTE ACTA: 50,82

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CÁLCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO SOLADO

