ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP- 09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DEL MURO DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO	67,50	0,60	0,60				24,30
2. DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE DEL MURO DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO	67,50	0,25	0,25				4,22
3. DEMOLICION DE COLUMNAS DEL MURO DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO	0,25	0,25	3,20	27,00			5,40
TOTAL PRESENTE ACTA:							33,92

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

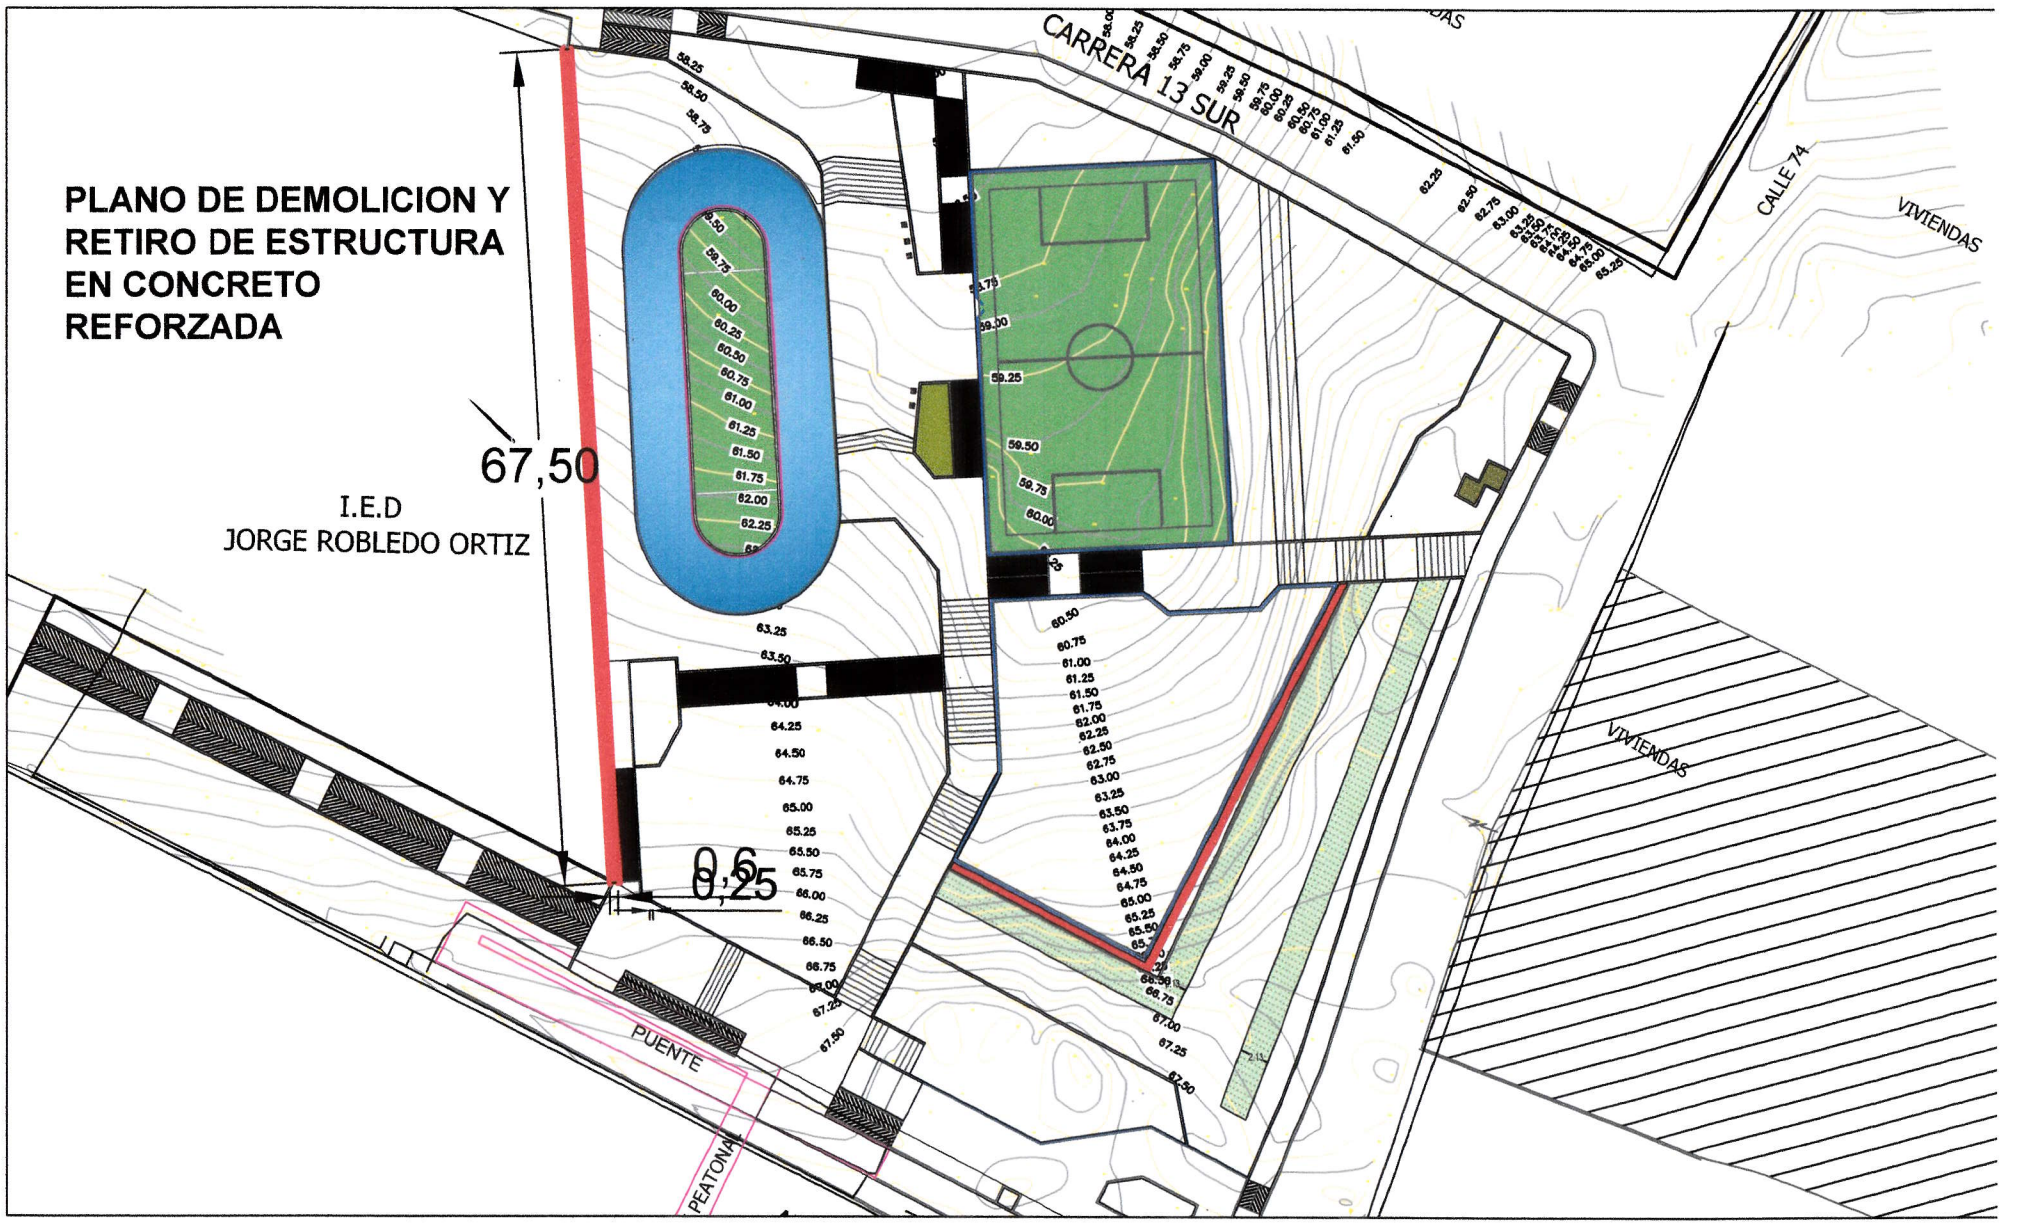
PLANO DE DEMOLICION Y
RETIRO DE ESTRUCTURA
EN CONCRETO
REFORZADA
67,50
I.E.D
JORGE ROBLEDO ORTIZ
0,6
0,25
CARRERA 13 SUR
CALLE 74
VIVIENDAS
VIVIENDAS
PUENTE
PEATONAL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES E DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP- 09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



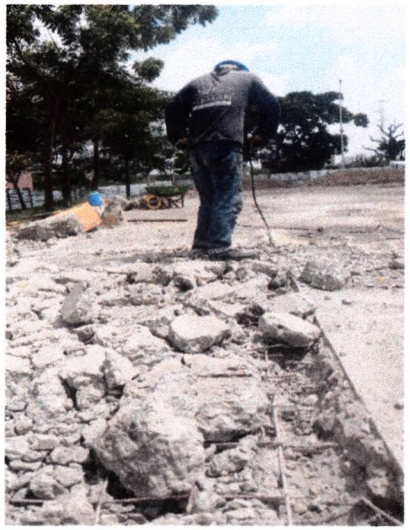

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. Columnas del kiosko comunal	0,30	0,30	4,10	10,00			3,69
2. Vigas de amarre del kiosko comunal	114,00	0,30	0,30				10,26


Cantidad contractual según modificatoria No.2	50,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	47,87
Obra por ejecutar	2,13

TOTAL PRESENTE ACTA:	13,95

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO DE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS

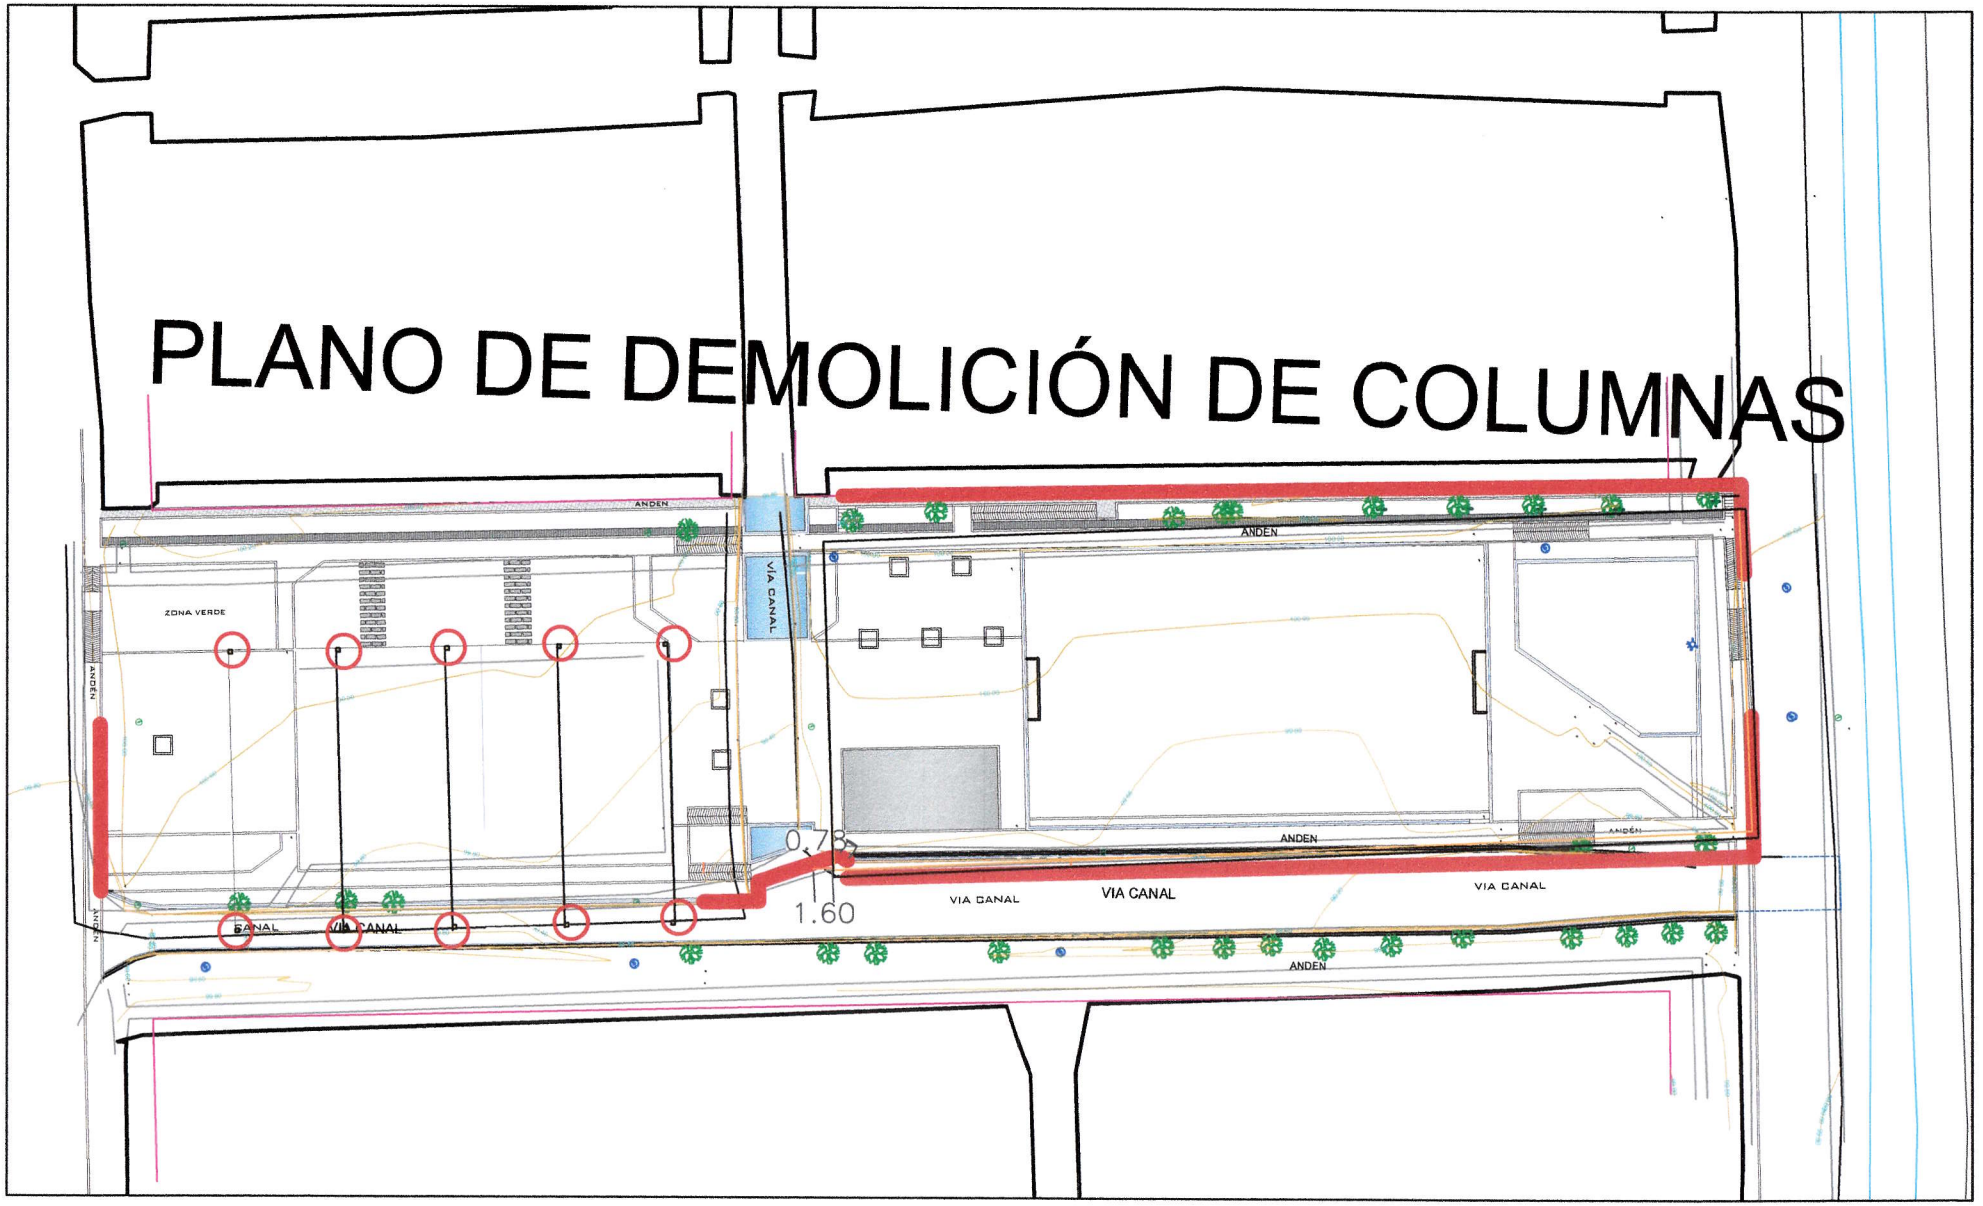

PLANO DE DEMOLICIÓN DE VIGAS

