ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-10	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA


PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

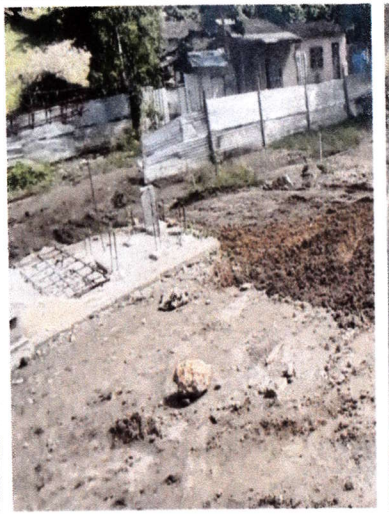



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		M	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 1)	17,00	1,60	0,25				6,80
2. CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 2)	27,00	2,00	0,30				16,20
3. CONCRETO PARA INICO DE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 2)	27,00	0,20	1,00				5,40
4. CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE INTERMEDIA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 1)	17,00	0,20	0,25				0,85

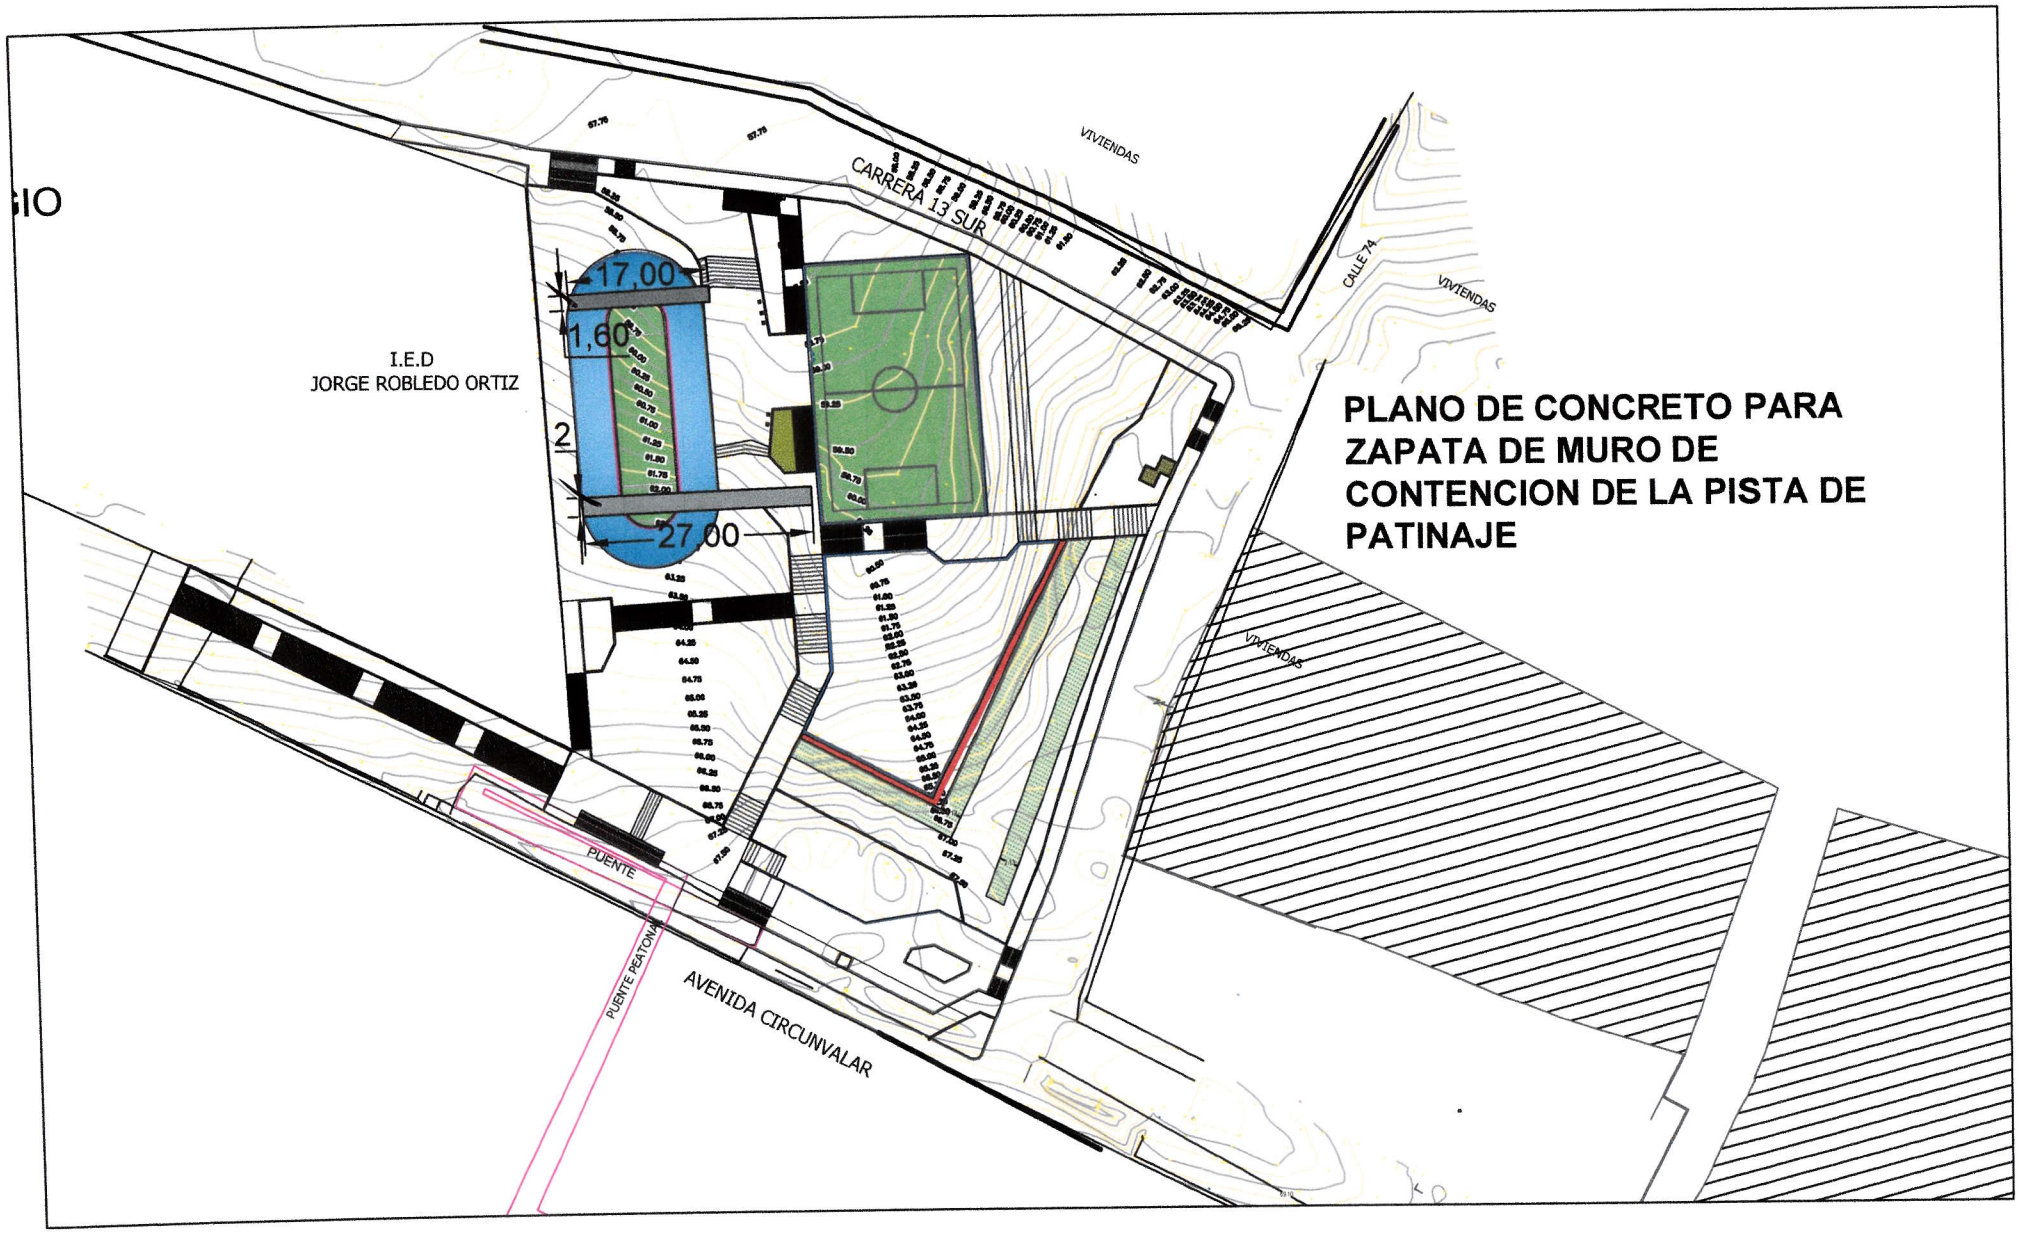
GIO
I.E.D
JORGE ROBLEDO ORTIZ
CARRERA 13 SUR
VIVIENDAS
CALLE 74
VIVIENDAS
17,00
1,60
2
27,00
PLANO DE CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION DE LA PISTA DE PATINAJE
VIVIENDAS
PUENTE
PUENTE PEATONAL
AVENIDA CIRCUNVALAR

PLANO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS

