Informe Final de Interventoría

Contrato No. CTO2776-23

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Versión 1.0

Bogotá D.C. – noviembre de 2024


Elaboro:	Juan F. Medina Jessica Velásquez Reina Jiménez Karen Quito	Reviso:	Esteban López A.	Aprobó:	Oscar Bahamon
Fecha:	19/11/2024	Fecha:	19/11/2024	Fecha:	19/11/2024
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente	Cargo:	Coordinador de proyecto	Cargo:	Director de proyecto

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 11

3. EL CONTRATO DE ADECUACIÓN 16

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN 16
INFORMACIÓN LOTE 1 16
INFORMACIÓN LOTE 2 16
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 17
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES LOTE 1 17
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 17
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 18
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES LOTE 2 19
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 19
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 20
RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATISTA 21
PERSONAL MINIMO LOTE 1 21
PERSONAL MINIMO LOTE 2 22
RELACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA 22
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 1 23
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 2 25

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28
SEGUIMIENTO A LA GARANTÍAS CONTRACTUALES 28
RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 30
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 31
RELACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO GENERADAS – LOTE 1 39
RELACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO GENERADAS– LOTE 2 50
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – LOTE 1 58
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – LOTE 2 88
ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO – LOTE 1 112
ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO – LOTE 2 127
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 140

5. INFORME AMBIENTAL 142

6. INFORME SST 143

7. INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 144

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 1 150
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 2 159

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 166

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Listado de estaciones asignadas a Lote 1 ____ 9
Tabla 2. Listado de estaciones asignadas a Lote 2 ____ 10
Tabla 3. Listado de actividades comprendidas en el contrato. ____ 11
Tabla 4. Información General del Contrato de Adecuación Lote 1 ____ 16
Tabla 5. Información General del Contrato de Adecuación Lote 2 ____ 16
Tabla 6. Relación Póliza Cumplimiento CTO2795-23 ____ 17
Tabla 7.Resumen Póliza RCE CTO2795-23 ____ 18
Tabla 8. Relación Póliza Cumplimiento CTO2811-23 ____ 19
Tabla 9.Resumen Póliza RCE CTO2811-23 ____ 20
Tabla 10: Seguimiento a Garantías CTO 2776-23 ____ 29
Tabla 11: Personal Interventoría ____ 30
Tabla 12. Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 1 - Periodo 1 al 10. ____ 39
Tabla 13. Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 2 - Periodo 1 al 10 ____ 50
Tabla 14. Relación de actividades ejecutadas Lote 1- Periodo 1 al 10 ____ 58
Tabla 15. Relación de actividades ejecutadas Lote 2 – Periodo 1 al 10 ____ 88
Tabla 16. Estado ordenes de trabajo Lote 1 – Periodo 1 al 10 ____ 112
Tabla 17. Estado ordenes de trabajo Lote 2 – Periodo 1 al 10 ____ 127
Tabla 18. Resumen Programado Vs Ejecutado ____ 144
Tabla 19. Resumen Programado Vs Ejecutado Lote 1 ____ 151
Tabla 20. Resumen Programado Vs Ejecutado Lote 2 ____ 159

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Plano General Sistema Transmilenio 8

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3. Estado de OTs generadas por periodo 141

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Soporte de verificación de instalaciones, equipos y herramientas. 23

Imagen 2. Soporte de verificación de instalaciones, equipos y herramientas 25

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los habitantes de la capital y usuarios del sistema de transporte masivo TRANSMILENIO y su administración a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. han evidenciado que la evasión del pasaje afecta significativamente la seguridad de los usuarios del sistema y la calidad del servicio. Este problema ha ido en aumento, deteriorando la calidad del servicio ya que las frecuencias de operación se programan en base a la demanda. Sin embargo, al no tener información precisa sobre el número de evasores en el sistema, la demanda utilizada para planificar la operación del sistema es limitada. Además, este fenómeno de evasión ha tenido un impacto negativo significativo en la infraestructura del sistema, ya que hay recursos en actividades correctivas por actos de vandalismo y uso indebido de la infraestructura, lo que reduce el presupuesto disponible para actividades para mantenerla y mejorar su calidad.

Según lo anterior y enfocándose en fortalecer la infraestructura y considerando las responsabilidades de la Dirección de Infraestructura y de TRANSMILENIO S.A., se ha reconocido que ciertas actividades de adaptación en la infraestructura ayudarían a reducir la evasión en el Sistema. Aunque estas actividades pueden no ser esenciales para la prestación del servicio de transporte, desde la perspectiva de la seguridad de los usuarios y de los diversos actores involucrados en el Sistema, de la cultura ciudadana, y de la prevención y mitigación de la evasión, sí complementan y fortalecen la infraestructura existente y son necesarias para la mejora continua del servicio de transporte de manera integral.

Por lo mencionado, la entidad adelantó el proceso de licitación pública TMSA-LP-06 DE 2023 con el objeto de "Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A." proceso mediante el cual fueron seleccionados dos contratistas para la ejecución de las actividades de adecuación mediante el acto de adjudicación con la resolución 533 del 20 de octubre de 2023 identificados como CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA y CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 para el desarrollo de los contratos producto del proceso en LOTE 1 y LOTE 2 respectivamente.

Paralelamente y en cumplimiento a la normatividad colombiana se desarrolló el concurso de méritos TMSA-CM-05-2023 con el objeto de "Realizar la interventoría integral

(técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A." para el cual como adjudicatario se designó a ACINCO INGENIERIA SAS.

Como parte de los productos de los procesos mencionados anteriormente el interventor ACINCO INGENIERIA SAS - BIC remite el presente informe donde se presenta el control realizado en los aspectos generales constructivos, técnicos, administrativos, operativos y financieros durante el desarrollo de los contratos de adecuación desarrollados entre el 20 de diciembre de 2023 y el 19 de octubre de 2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Empresa De Transporte Masivo Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A en el ejercicio de sus funciones y específicamente de la administración de la infraestructura específica y exclusiva del Sistema TransMilenio, ha desarrollado actividades y/o acciones que permita la prestación de un servicio de movilidad de la población Bogotana con estándares de calidad, dignidad, comodidad, seguridad, sustentable financiera y ambientalmente, mejorando así, la calidad de vida de los usuarios del sistema.

De lo anterior, se tiene que la empresa TRANSMILENIO S.A. en el desarrollo de dichas acciones ha identificado una problemática en la prestación del servicio el cual, corresponde al hecho de evasión de pagos del pasaje por parte de los usuarios, afectando directamente los estándares de calidad, comodidad y seguridad de los usuarios que utilizan el Sistema TransMilenio como su medio de traslado de un punto a otro para el desarrollo de sus actividades diarias.

Por tal razón, Empresa De Transporte Masivo Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A desde el año 2021 estableció el plan Anti-Evasión, dentro del cual, se tiene las siguientes líneas:

1. Prevención, cultura ciudadana, incidencia y corresponsabilidad
2. Monitorio y caracterización de la evasión
3. Fortalecimiento de la infraestructura
4. Fiscalización.

Dentro de la línea fortalecimiento de la infraestructura, la empresa TRANSMILENIO S.A. mediante el proceso de selección No TMSA-LP-06 DE 2023 designó dos contratistas para la intervención de las estaciones y portales del sistema TransMilenio mediante los contratos de obra CTO2795-23 y CTO2811-23 para LOTE 1 y LOTE 2 respectivamente. Contratos mediante los cuales se suministrarán e instalarán elementos en la infraestructura del sistema que permitirán mitigar el fenómeno de evasión en el mismo.

Como complemento a los contratos de obra y mediante el contrato CTO2776-23 correspondiente a la interventoría se realizará seguimiento integral a fin de garantizar la correcta ejecución y puesta en marcha de las actividades objeto de los contratos de adecuación.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos principales se realizará a la infraestructura del componente BRT del Sistema Transmilenio que se encuentre a cargo de TRANSMILENIO S.A., dividida en (2) Lotes.

A continuación, se presenta el plano general del proyecto, lo mismo que la distribución Lotes de la siguiente forma:

Ilustración 1. Plano General Sistema Transmilenio



Tabla 1. Listado de estaciones asignadas a Lote 1

LOTE 1 (104 estaciones y portales)		
ALCALÁ	CENTRO MEMORIA	NIZA CALLE 127
AV 39	CIUDAD JARDÍN	NORMANDÍA
AV. 1 DE MAYO	CIUDAD UNIVERSITARIA	NQS CALLE 75
AV. 68	COMUNEROS	PALOQUEMAO
AV. AMÉRICAS - AV. BOYACÁ	CONCEJO DE BOGOTÁ	PARQUE
AV. CHILE	COUNTRY SUR	PATIO BONITO
AV. JIMÉNEZ	DISTRITO GRAFITI	PERDOMO
AV. ROJAS	EL TIEMPO MALOKA	POLICARPA
BIBLIOTECA	ESCUELA MILITAR	PRADERA
BIBLIOTECA TINTAL	FERIAS	PRADO
BICENTENARIO	FLORES	QUINTA PAREDES
BOSA	GOBERNACIÓN	QUIRIGUA
CALLE 100	GRANJA - CRA 77	RECINTO FERIAL
CALLE 106	GUATOQUE VERAGUAS	RIONEGRO
CALLE 142	HÉROES	SALITRE EL GRECO
CALLE 146	HORTÚA	SAN BERNARDO
CALLE 161	HOSPITAL	SAN DIEGO
CALLE 19	LA CASTELLANA	SAN FACON
CALLE 22	LA DESPENSA	SAN MATEO
CALLE 26	LAS AGUAS	SAN VICTORINO
CALLE 34	LAS NIEVES	SANTA LUCÍA
CALLE 45	LEÓN XIII	SENA
CALLE 57	MANDALAY	SEVILLANA
CALLE 63	MARLY	SIMÓN BOLÍVAR
CALLE 72	MARSELLA	SUBA CALLE 100
CALLE 76	MAZUREN	SUBA CALLE 95
CALLE 85	MODELIA	TERCER MILENIO
CAMPIN - UAN	MOLINOS	TERREROS

LOTE 1 (104 estaciones y portales)		
CAN	MOVISTAR ARENA	TOBERÍN
CARRERA 47	MUSEO DEL ORO	TV. 86
CARRERA 53	MUSEO NACIONAL	TYGUA SAN JOSÉ
PORTAL NORTE	PORTAL 80	UNIVERSIDADES
PORTAL TUNAL	PORTAL DE USME	PORTAL DE SUBA
PORTAL AMÉRICAS	PORTAL DEL SUR	PORTAL ELDORADO
PORTAL 20 DE JULIO	BANDERAS	--

Tabla 2. Listado de estaciones asignadas a Lote 2

LOTE 2 (43 estaciones)		
DE LA SABANA	CAD	LA CAMPIÑA
CARRERA 43	RICAURTE	PUENTELARGO
ZONA INDUSTRIAL	AVENIDA CALI	CALLE 40 SUR
CDS - CARRERA 32	CARRERA 90	RESTREPO
PUENTE ARANDA	BOYACÁ	CONSUELO
NQS - CALLE 38 A SUR	POLO	QUIROGA
MADELENA	MINUTO DE DIOS	FUCHA
SANTA ISABEL	AV. SUBA - CALLE 116	OLAYA
ALQUERÍA	21 ÁNGELES	NARIÑO
NQS - CALLE 30 A SUR	SUBA - AV. BOYACÁ	SOCORRO
VENECIA	SUBA - TV. 91	CALLE 127
AV. EL DORADO	SAN MARTÍN	PEPE SIERRA
GENERAL SANTANDER	HUMEDAL CÓRDOBA	VIRREY
UNIVERSIDAD NACIONAL	GRATAMIRA	TERMINAL
CALLE 187	--	--

Los trabajos se ejecutarán en todas o algunas de las estaciones asignadas a cada Lote, según la necesidad de la Entidad.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

La ejecución de las actividades del contrato de adecuación, que se requieren en la infraestructura del sistema, se basa en los siguientes lineamientos:

- Aspectos generales: La interventoría del proyecto está designada para revisar y verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones adquiridas por parte de los contratistas en cuanto a la ejecución de las actividades de adecuación que desarrollen en la infraestructura BRT del sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá D.C (TRANSMILENIO S.A.). Dichas actividades de obra deberán responder satisfactoriamente, en lo cual debe cumplir con las especificaciones técnicas ya definidas y que por consiguiente se encuentren enmarcadas por el listado de actividades, que se muestra a continuación:

Tabla 3. Listado de actividades comprendidas en el contrato.

CÓDIGO ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2
1.2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2
1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2
1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2
1.5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML
1.6	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA TIPO CONCIERTO CON CIMENTACIÓN.	ML
1.7	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, RECUBIERTO CON PINTURA POLIESTER VERDE 100 MICRAS.	M2
1.8	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA SOBRE TORNIQUETES.	UN
1.9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2

CÓDIGO ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2
1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2
1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2

Todas las actividades que se ejecuten dentro del contrato serán inspeccionadas, aprobadas y reportadas ante la Entidad, esto con el fin de brindar información específica acerca de cada una de estas labores, que serán objeto de pago.

Es de esta manera, que la Interventoría está dada a supervisar al contratista para que en la ejecución de cada actividad se cumplan los requerimientos específicos, los cuales están determinados por los anexos de las condiciones del pliego (ambiental, seguridad y salud en el trabajo, catalogó de actividades, técnico, estudios previos, estructura económica y demás que están consignados en la propuesta), que tiene como fin garantizar la calidad de los elementos, insumos, personal y equipo idóneo, que en general con lleva al desempeño óptimo de las labores.

- Información para el control de la ejecución de la obra: La interventoría deberá rectificar y aprobar toda la información que el contratista presente, esto con el fin de corroborar que los documentos se encuentren en cumplimiento bajo los parámetros del pliego de condiciones, tales como son las hojas de vida de los profesionales, la consolidación del equipo mínimo obligatorio, el respectivo análisis de los precios unitarios acordes a la propuesta económica y demás documentos que se encuentren en el pliego de condiciones a cumplir.

  Cabe mencionar, que la revisión por parte de la interventoría se efectuará en un máximo de cinco (5) días calendario. En caso de tener alguna observación por parte de interventoría, el contratista debe dar solución y respuesta en un máximo de tres (3) días hábiles, ya que de ser mayor el tiempo, podría incurrir en incumplimiento del contrato.

  Finalmente, la interventoría es responsable de emitir el concepto favorable, una vez se haya subsanado y cumplido con lo exigido. Este comunicado deberá ser enviado tanto al contratista como a la entidad.

- Análisis de precios unitarios: El análisis de los precios unitarios de cada uno de los ítems expuestos en el formato de oferta económica, correspondientes a las actividades deberán tener en cuenta todos los valores, costos y precios, que estarán expresados en pesos colombianos, que es el origen del contrato y a precios del 2023. Cabe destacar, que estos precios deberán ser entregados antes de la firma del acta de inicio, esto con el fin de evidenciar que dichos precios coincidan con la oferta económica utilizada en la evaluación de las propuestas. De llegar a presentarse alguna discordancia, esta deberá ser ajustada por parte del contratista, de tal manera que concuerde el precio unitario con la oferta presentada.

  Para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista es quien debe contemplar todo lo necesario para la óptima ejecución de la actividad, en la cual se debe respetar y cumplir con las respectivas especificaciones técnicas contractuales y detalles de construcción; tales como son el equipo idóneo, los materiales adecuados y de calidad, el transporte y la disposición final, y la mano de obra. En caso de error u omisión en los costos de los análisis de precios unitarios, es importante anotar que es directamente responsabilidad del Contratista, por lo que este no podrá reclamar a la entidad ningún adicional en el valor de los precios unitarios entregados dentro de la propuesta económica.

- Expedición de órdenes de trabajo: Es la interventoría del contrato quien genera las ordenes de trabajo, lo cual permite que el contratista por su parte pueda iniciar la ejecución de estas, siempre teniendo presente los tiempos. Por esta razón y acorde al artículo 32 de la ley 80 de 1993, la Interventoría tiene la obligación de socializar de manera escrita las ordenes de trabajo generadas, así mismo como la información adicional. Para ello, es importante que entre la Interventoría y el Contratista se establezca un medio físico que permita informar por medio escrito sobre estas órdenes de trabajo.

  Es importante mencionar, que únicamente se ejecutarán y pagarán actividades que estén dentro de los ítems establecidos en el contrato. Adicionalmente, se fija que ninguna actividad que haya sido ejecutada sin previa orden, podrá ser incluida en actas de costos de pago.

  De esta manera, se establece que únicamente, las órdenes que sean cerradas por el Interventor, que se encuentren con recibido a satisfacción serán las que se incluyan en el acta mensual de obra, para que estas sean pagadas. Por esto, se encuentra prohibido el pago de actividades que no hayan sido culminadas, ni cerradas.

La Interventoría podrá asignar ordenes de trabajo al mismo tiempo, ya sea para una actividad o varias. Sin embargo, el Contratista debe tener claro el cumplimiento con los tiempos estimados, los cuales están determinados de forma independiente para cada orden. Por ello, es importante que entre el Contratista y la Interventoría establezcan el uso de un software ofimático comercial, esto con el fin de llevar el control de órdenes de trabajo generadas en el contrato.

- Horario de trabajos: Al ser un sistema de transporte masivo, la mayoría de las actividades se deben realizar en horarios nocturnos, iniciando el cierre de operaciones del sistema BRT, de 11:00p.m. a 4:00a.m., contemplando las indicaciones y turnos de trabajo establecidos por el gobierno. Las actividades de adecuación que no presenten afectación alguna relacionada con la circulación de los usuarios y/o la normal prestación de los servicios, se podrán programar en horario diurno.

  Por otra parte, para la ejecución de actividades, en manera de lo posible, TransMilenio S.A. dispondrá para los contratistas de hasta 100 tarjetas funcionarios, con fin exclusivo de la ejecución puntual de actividades del contrato, no para ser utilizadas como medio de pago del pasaje, en sistemas zonales y/o en cualquier otro sistema BRT distinto. Para cumplir esto, el contratista deberá realizar un estricto control y seguimiento, presentando un informe mensual detallado remitido a la entidad, donde se evidencie el listado de funcionarios asignados a las tarjetas, utilización diaria acorde a los turnos y actividades programadas, los pasos no justificados acorde al protocolo establecido, deberán cancelarse según lo señalado; considerando lo anterior al presentarse un mal uso de las tarjetas, TransMilenio S.A. podrá solicitar la devolución y/o retiro.

- Trabajo bajo condiciones ambientales restringidas: En consideraciones técnicas, como requerimiento por temperatura, humedad relativa y puntos de rocío, etc., el contratista podrá presentar ante TransMilenio S.A. la solicitud del cierre parcial de zonas determinadas del sistema, vagones y/o estaciones.

- Preparación de los trabajos: Previamente al inicio de las actividades, el contratista dispondrá de los recursos necesarios para la adecuación de la zona, debe contar con orden de trabajo debidamente autorizada, realizar una revisión previa en la localización de la actividad, teniendo en cuenta las normas técnicas necesarias, debe contar con los recursos humanos, insumos, herramientas, materiales y equipos necesarios, los cuales se deben encontrar en perfecto estado para su adecuado uso, se debe suministrar en la zona de trabajo la señalización correspondiente a la actividad, conforme al manual de señalización aprobado, suministrar los elementos de seguridad industrial acordes al trabajo a realizar y al Anexo # 2 seguridad y salud

en el trabajo, se debe verificar el cumplimiento de las normativas colombianas en vigencia y por ultimo dar cumplimiento a las exigencias ambientales acordes al Anexo # 1 ambiental.

- Actualización de precios unitarios: Se contempla en el documento 2. Anexo técnico adecuación, respecto al incremento correspondiente al 2024 "*En el mes de enero de 2024, los Contratistas y la Interventoría actualizarán la totalidad de precios unitarios con el IPC certificado por el DANE para el año 2023. Esta actualización entrará en vigor a partir del 1 de febrero del 2024 y se aplicará al acta de ese mes (febrero de 2024). En caso de presentarse alguna prórroga en el Contrato se aplicará el mismo procedimiento para los mismos meses en los años siguientes. El listado de precios actualizados será radicado por el Interventor en TRANSMILENIO S.A. a más tardar el día 31 de enero del año 2024 pero, en todo caso, estará disponible y operará con él a partir del día 1 de febrero del año 2024.*"
  Esta gestión fue cumplida a cabalidad por la Interventoría, tal y como quedó indicado en su oficio SAL-24-001089 fechado del 29 de enero de 2024, con Asunto: "ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS – Contratos 2795-2023 CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA, y 2811-2023 CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 – LOTE 2"

3. EL CONTRATO DE ADECUACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN

INFORMACIÓN LOTE 1

Tabla 4. Información General del Contrato de Adecuación Lote 1

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA
Contrato:	CTO2795-23 Lote 1
Objeto:	Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 12.299.456.398
Adición No 1	$ 4.919.782.559
Valor total del contrato	$ 17.219.238.957
Plazo de ejecución inicial	8 meses
Fecha de inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	19 de agosto de 2024
Prorroga No 1	2 meses
Fecha de terminación actualizada	19 de octubre de 2024

INFORMACIÓN LOTE 2

Tabla 5. Información General del Contrato de Adecuación Lote 2

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024
Contrato:	CTO2811-23 Lote 2

Objeto:	Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 12.299.456.398
Adición No 1	$ 1.844.918.460
Valor total del contrato	$ 14.144.374.858
Plazo de ejecución inicial	8 meses
Fecha de inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	19 de agosto de 2024
Prorroga No 1	2 meses
Fecha de terminación actualizada	19 de octubre de 2024

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

De acuerdo con sus obligaciones, cada contratista presentó las garantías contractuales, las cuales fueron aprobadas por la Entidad Contratante, a continuación, se presenta la información relevante sobre cubrimiento y vigencias, con fecha de vigencia correspondiente a el Acta de Inicio del contrato.

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES LOTE 1

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 6. Relación Póliza Cumplimiento CTO2795-23

CONTRATO	CTO2795-23
VALOR	$ 12.299.456.398,00
ANTICIPO	$ -
ADICION	$ 4.919.782.559,00
VALOR TOTAL	$ 17.219.238.957,00
PLAZO	8 meses
FECHA INICIO	20/12/2023

FECHA TERMINACION	19/08/2024
PRORROGA	2 meses
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	19/10/2024
No POLIZA CUMPLIMIENTO	I-100027894
ANEXO	5

AMPARO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	I-100027894	5	19/10/2024	19/04/2025	$ 5.165.771.687,10	21/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	I-100027894	5	19/10/2024	19/10/2027	$ 1.721.923.895,70	21/11/2024
Estabilidad y calidad de la obra	I-100027894	5	19/10/2024	19/10/2029	$ 5.165.771.687,10	21/11/2024


GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 7.Resumen Póliza RCE CTO2795-23

CONTRATO	CTO2795-23
VALOR	$ 12.299.456.398,00
ANTICIPO	$ -
ADICION	$ 4.919.782.559,00
VALOR TOTAL	$ 17.219.238.957,00
PLAZO	8 meses
FECHA INICIO	20/12/2023
FECHA TERMINACION	19/08/2024
PRORROGA	2 meses
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	19/10/2024
No POLIZA CUMPLIMIENTO	I-100006483
ANEXO	3

AMPARO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	I-100006483	3	7/11/2023	19/10/2024	$ 860.961.947,85	7/06/2024

La interventoría se permite manifestar que, el CONSORCIO SAN RAFEAL AM&CIA, realizó el cargue de las pólizas del contrato de obra 2795-23 en la proforma del SECOP II, como se soporta en la siguiente imagen.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15683236	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.053.467.269,90 COP	Seguros Mundial S.A.	19/10/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14495049	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.914.429.217,75 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	19/10/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13292522	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.224.592.298,50 COP	Mundial de seguros S.A.	19/08/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13059760	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.224.592.298,50 COP	Mundial de seguros S.A.	14/07/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12781301	Seriedad de la oferta	-	3.689.836.919,40 COP	-	6/01/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

Configuración financiera Pago de anticipos

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES LOTE 2

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 8. Relación Póliza Cumplimiento CTO2811-23

CONTRATO	CTO2811-23
VALOR	$ 12.299.456.398,00
ANTICIPO	$ -
ADICION	$ 1.844.918.460,00
VALOR TOTAL	$ 14.144.374.858,00
PLAZO	8 meses
FECHA INICIO	20/12/2023
FECHA TERMINACION	19/08/2024
PRORROGA	2 meses
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	19/10/2024
No POLIZA CUMPLIMIENTO	18-44-101094396

ANEXO	4

AMPARO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	18-44-101094396	4	20/12/2023	19/04/2025	$ 4.243.312.457,40	19/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	18-44-101094396	4	20/12/2023	19/10/2027	$ 1.414.437.485,80	19/06/2024
Estabilidad y calidad de la obra	18-44-101094396	4	19/10/2024	19/10/2029	$ 4.243.312.457,40	19/06/2024

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 9.Resumen Póliza RCE CTO2811-23

CONTRATO	CTO2811-23
VALOR	$ 12.299.456.398,00
ANTICIPO	$ -
ADICION	$ 1.844.918.460,00
VALOR TOTAL	$ 14.144.374.858,00
PLAZO	8 meses
FECHA INICIO	20/12/2023
FECHA TERMINACION	19/08/2024
PRORROGA	2 meses
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	19/10/2024
No POLIZA RCE	18-40-101069285
ANEXO	4

AMPARO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		

Póliza de responsabilidad civil extracontractual	18-40-101069285	4	20/12/2023	20/10/2024	$ 707.218.742,00	19/06/2024

La interventoría se permite manifestar que, el CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024, realizó el cargue de las pólizas del contrato de obra 2811-23 en la proforma del SECOP II, como se soporta en la siguiente imagen.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14560651	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.901.062.400,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/08/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14563220	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	707.218.742,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13343412	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	614.972.819,90 COP	Seguros del Estado S.A.	20/08/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13343185	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.609.619.478,60 COP	Seguros del Estado S.A.	19/08/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13135614	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.609.619.478,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

1 2 »

RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATISTA

El Contratista contó con el personal requerido en el pliego de condiciones, cumpliendo con las exigencias del contrato durante el periodo objeto de este informe no se ha sustituido personal profesional o técnico del Contratista.

PERSONAL MINIMO LOTE 1

Cargo	Nombre
Director de Obra	Luis Eduardo Alfonso Ramos
Residente Obra Diurno	Paolo Dimauro Valencia Peralta
Residente Obra Nocturno	Carlos Julio Gaona Jiménez
INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Jeannette Bohórquez Wilches
INGENIERO AMBIENTAL	David Alfonso Pérez
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Gabriel Silva Vega
INSPECTOR AMBIENTAL	Andrés Broom Martínez Ramos

INSPECTORES DE OBRA Diurno	Daniel Andrés Lopez Robayo
INSPECTORES DE OBRA Nocturno	Leonel Eliecer Estupiñan
SECRETARIA	Bella Elvira Arrieta Martínez
ALMACENISTA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mateo Salvador Mafioli Petro

En el anexo A del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 2811-23.

PERSONAL MINIMO LOTE 2

Cargo	Nombre
Director de Obra	Holman Alexander Acosta Cruz
Residente Obra Diurno	Juan David Martínez Arango
Residente Obra Nocturno	Yamith Hefren Rodríguez Castellanos
INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Gerd Wilson Tovar Hernandez
INGENIERO AMBIENTAL	Elizabeth Beltrán Infante
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Yenny Lorena Romero Gordillo
INSPECTOR AMBIENTAL	Fabiana Furnieles Muñoz
INSPECTORES DE OBRA Diurno	David Aleksey Morales Sandoval
INSPECTORES DE OBRA Nocturno	Juan Felipe Javier Lancheros Flórez
SECRETARIA	Luz Margarita Arteaga Cuadrado
ALMACENISTA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Rafael Antonio Niño Rodríguez

En el anexo B del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 2811-23.


RELACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA

Según lo establecido en el numeral 10. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del anexo técnico de los contratos de obra CTO2795-23 y CTO2811-23, la interventoría se permite informar lo siguiente para cada contratista de obra:


INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 1


El contratista, mediante comunicado CO-SAN RAFAEL TM-AM&CIA-007-2023, entregó la relación de las instalaciones, equipos y herramientas, que la interventoría revisó y validó el 18 de diciembre del 2023, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Imagen 1. Soporte de verificación de instalaciones, equipos y herramientas.

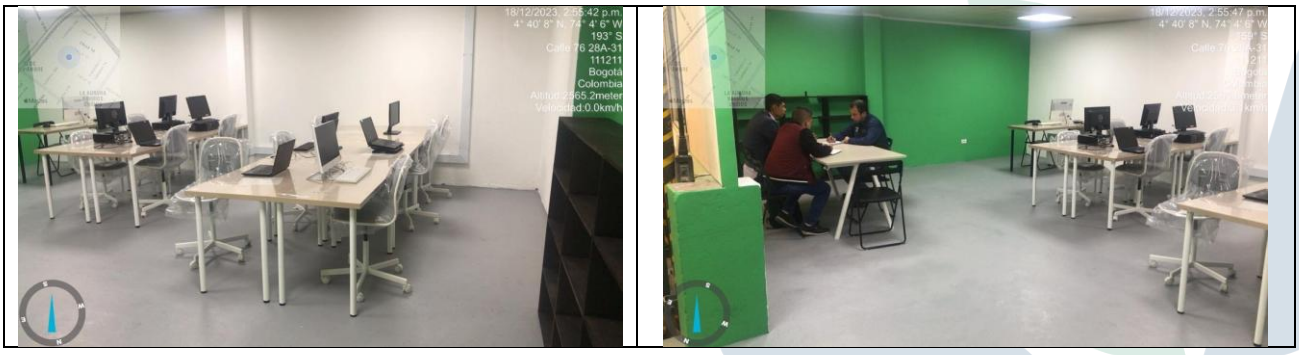




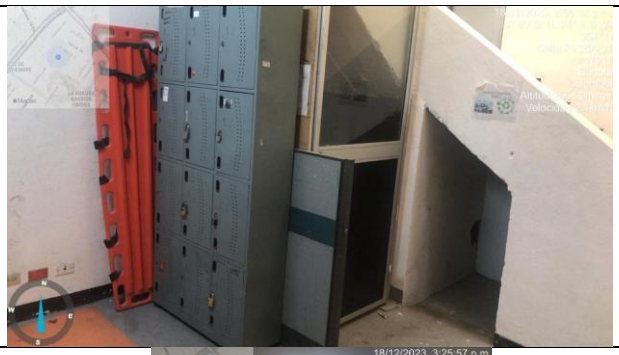

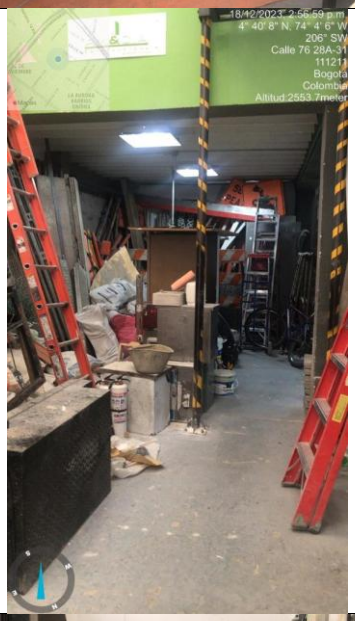



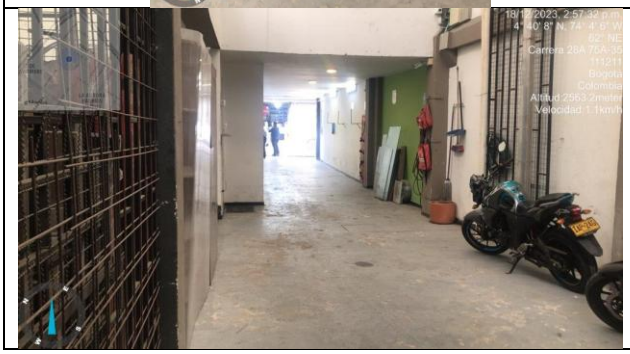




INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 2

El contratista, mediante comunicados CMTM2024-3483-003-2023, CMTM2024-3483-006-2023, CMTM2024-3483-007-2023 y CMTM2024-3483-008-2023 hizo entrega de la relación de las instalaciones, equipos y herramientas, las cuales, fueron revisadas y validas por la interventoría el 19 de diciembre del 2023 como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

Imagen 2. Soporte de verificación de instalaciones, equipos y herramientas

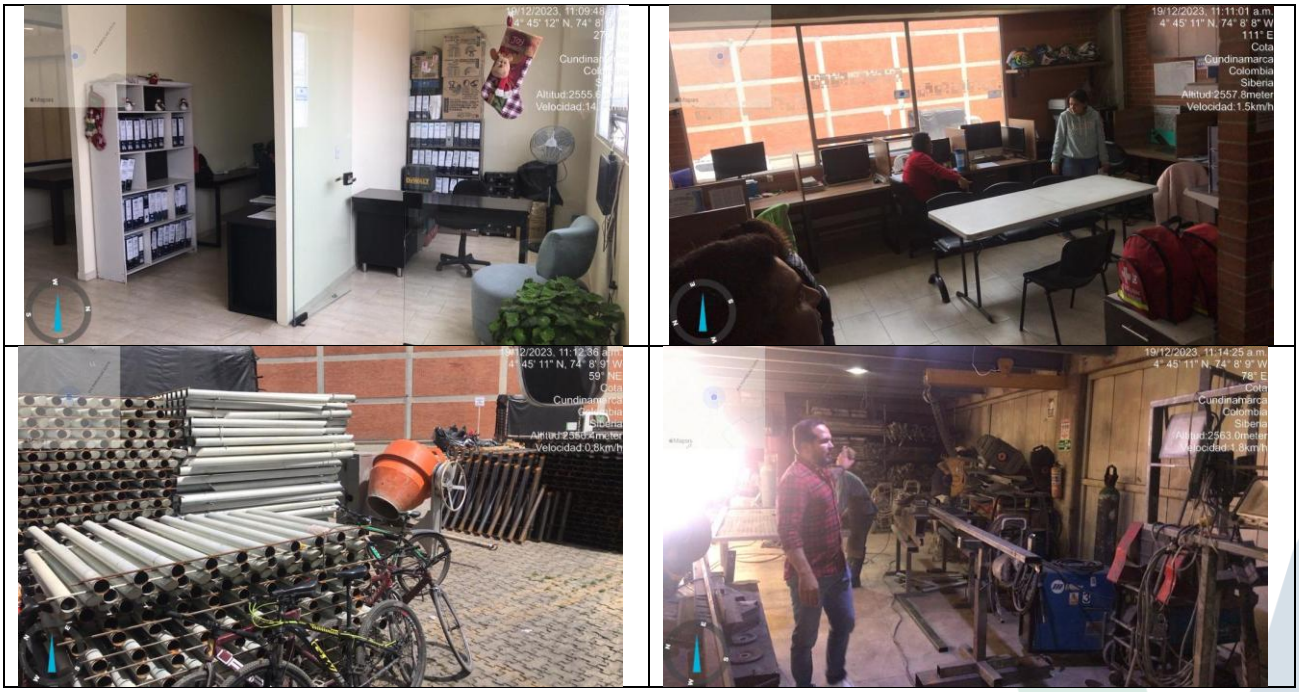



4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	ACINCO INGENIERIA S.A.S – BIC
Contrato:	CTO 2776-23
Objeto:	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 1.142.999.945
Adición No 1	$ 285.599.986
Valor total del contrato	$ 1.428.599.931
Plazo de ejecución inicial	8 meses
Fecha de inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	19 de agosto de 2024
Prorroga No 1	2 meses
Fecha de terminación actualizada	19 de octubre de 2024

SEGUIMIENTO A LA GARANTÍAS CONTRACTUALES

De acuerdo con sus obligaciones, la Interventoría presentó las garantías contractuales, las cuales fueron aprobadas por la Entidad Contratante, a continuación, se presenta la información relevante sobre cubrimiento y vigencias, con fecha de vigencia correspondiente a el Acta de Inicio del contrato.

Tabla 10: Seguimiento a Garantías CTO 2776-23

CONTRATO	CTO2776-23
VALOR	$ 1.142.999.945,00
PLAZO	8 meses
FECHA INICIO	20/12/2023
FECHA TERMINACION	19/08/2024
PRORROGA	2 meses
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	19/10/2024
ADICION	$ 285.599.986,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 1.428.599.931,00
No POLIZA	CBC-100051072
ANEXO	3

AMPARO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	CBC-100051072	3	29/05/2024	19/04/2025	$ 214.289.997,90	7/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	CBC-100051072	3	19/10/2024	19/10/2029	$ 71.429.999,30	7/06/2024
Calidad del servicio	CBC-100051072	3	29/05/2024	19/10/2027	$ 214.289.997,90	7/06/2024

La interventoría se permite manifestar que, la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC, realizó el cargue de las pólizas del contrato de obra 2776-23 en la proforma del SECOP II, como se soporta en la siguiente imagen.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14497752	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	500.009.975,85 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13343446	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	400.050.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/08/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12739672	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	400.050.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A	17/06/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12695101	Seriedad de la oferta	-	114.300.000,00 COP	-	30/12/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría reporta que, durante este informe, se contó con todo el personal requerido contractualmente y así cumplir con las actividades a su cargo.

A continuación, la relación del personal de la Interventoría:

Tabla 11: Personal Interventoría

CARGO	OPERACIÓN	APELLIDOS	NOMBRES
Director de proyecto	Diurno/Nocturno	Bahamon Tovar	Oscar Eduardo
Residente de interventoría	Diurno	Quito Moreno	Karen Lorena
Residente de interventoría	Diurno	Velásquez Mejía	Jessica Milena
Residente de interventoría	Nocturno	Medina Moreno	Juan Fernando
Residente de interventoría	Nocturno	Jiménez Beltrán	Reina Inés
Ingeniero de calidad y SST	Diurno	Quitian Quitian	Yimmy Yohani
Ingeniero ambiental	Diurno	Arenas Vesga	Jeepsen Giovanni
Inspector de Calidad y SST	Nocturno	Arias Forero	Marisol
Inspector ambiental	Nocturno	Daza Álvarez	Diana Katherin
Inspector de interventoría	Diurno	Vargas Lasso	Jefersson David
Inspector de interventoría	Diurno	Clavijo Rodríguez	Laura Gabriela
Inspector de interventoría	Nocturno	Pérez Castañeda	Henry Oswaldo
Inspector de interventoría	Nocturno	Deaza Ramirez	Juan Manuel
Secretaria	N/A	Lizarazo Acevedo	Angela Maria
Conductor	N/A	Morales Álvarez	Luz Heidy

En el anexo C del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 2776-23.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante la ejecución del contrato, la entidad requirió de manera periódica a la interventoría la generación de órdenes de trabajo. Estas órdenes, emitidas conforme a las necesidades del sistema, requeridas por la Entidad y los plazos establecidos en el anexo técnico, fueron dirigidas a los contratistas para la ejecución de las tareas correspondientes. A continuación, se presenta un desglose de las solicitudes por periodo para los lotes 1 y 2 de los contratos de adecuación.

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23						
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR				OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN	
TYGUA SAN JOSE	CALLE SEXTA	SI	---	---	---	
GUATOQUE VERAGUAS	CALLE SEXTA	SI	---	---	---	
PRADO	NORTE	SI	---	SI	---	
CALLE 85	NORTE	---	SI	SI	SI	
AV. 1 DE MAYO	CARRERA 10	---	SI	SI	---	
SAN DIEGO	CARRERA 10	---	SI	---	---	
SEVILLANA	NQS SUR	---	SI *	---	---	* Completar
PERDOMO	NQS SUR	---	SI *	---	---	* Completar
COMUNEROS	NQS SUR	---	SI	SI	---	
COUNTRY SUR	CARRERA 10	---	---	---	SI	
CALLE 106	NORTE	---	---	---	SI	
BOSA	NQS SUR	---	---	---	SI	
MOVISTAR	NQS CENTRAL	---	---	---	SI	

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23						
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR				OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN	
PEPE SIERRA	NORTE	SI	---	---	---	
CALLE 127	NORTE	SI	---	---	---	
CARRERA 43	AMERICAS	SI	---	---	---	
CDS CARRERA 32	AMERICAS	SI	---	---	---	
VENECIA	NQS SUR	---	SI	SI	---	
NQS CALLE 38 SUR	NQS SUR	---	SI	SI	SI	
NQS CALLE 30 A SUR	NQS SUR	---	SI	SI	---	
SANTA ISABEL	NQS SUR	---	SI	SI	---	
SABANA	AMERICAS	---	---	SI	---	
VIRREY	NORTE	---	---	SI	---	
ALQUERIA	NQS SUR	---	---	---	SI	
MADELENA	NQS SUR	---	---	---	SI	
GENERAL SANTANDER	NQS SUR	---	---	---	SI	

- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AMACIA - LOTE 1 CTO 2795-23						
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR				
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS
SEVILLANA	NQS SUR	SI				
MANDALAY	AMERICAS	SI				
MOVISTAR	NQS CENTRAL		SI	SI		SI
CAMPIN	NQS		SI	SI		
HORTUA	CARACAS SUR	SI	SI			
GUATOQUE VERUGAS	CALLE 6		SI			
PALOQUEMAO	NQS CENTRAL		SI	SI		
QUIRIGUA	CALLE 80			SI		
ESCUELA MILITAR	CALLE 80			SI		
CALLE 85	NORTE					SI
COUNTRY SUR	CARRERA 10					SI
CALLE 106	NORTE					SI
BOSA	NQS SUR					SI
NIEVES	CARRERA 10				SI	SI
SAN VICTORINO	CARRERA 10				SI	SI
SAN BERNANDO	CARRERA 10				SI	SI
POLICARPA	CARRERA 10				SI	SI
CIUDAD JARDIN	CARRERA 10				SI	SI

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23							
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR					OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	
NQS CALLE 38 SUR	NQS SUR	SI				SI	
ALQUERIA	NQS SUR	SI				SI	
NQS CALLE 30 A SUR	NQS SUR	SI			SI	SI	* Falta rutero
MADELENA	NQS SUR					SI	
GENERAL SANTANDER	NQS SUR					SI	
VENECIA	NQS SUR				SI	SI	* Falta cartilla y rutero
CONSUELO	CARACAS SUR		SI				
SOCORRO	CARACAS SUR		SI				
QUIROGA	CARACAS SUR		SI				
FUCHA	CARACAS SUR		SI				
ZONA INDUSTRIAL	AMERICAS		SI	SI			
CDS CARRERA 32	AMERICAS		SI	SI			
CARRERA 43	CARACAS SUR		SI	SI			
PUENTE ARANDA	CARACAS SUR		SI	SI			
AVENIDA EL DORADO	NQS				SI	SI	* Falta rutero
SUBA TV 91	SUBA				SI	SI	* Falta rutero
BOYACA	OCHENTA				SI	SI	

- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN	
NIZA CALLE 127	SUBA							
FERIAS	CALLE 80							
CENTRO MEMORIA	CALLE 26							
CIUDAD UNIVERSITARIA	CALLE 26							
CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26							
CORFERIAS	CALLE 26							
QUINTA PAREDES	CALLE 26							
PERDOMO	NQS SUR							
SEVILLANA	NQS SUR							
SAN DIEGO	CARRERA 10							
PRADO	NORTE							
COMUNEROS	NQS SUR							
EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO	CALLE 26							
TV 86	AMERICAS							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23									
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR							OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN	
BOYACA	CALLE 80								
VENECIA	NQS SUR								
UNIVERSIDAD NACIONAL	NQS CENTRAL								
RICAURTE	NQS CENTRAL								
MADELENA	NQS SUR								
ALQUERIA	NQS SUR								
CAD	NQS CENTRAL								
OLAYA	CARACAS SUR								
NARIÑO	CARACAS SUR								
MINUTO DE DIOS	CALLE 80								
RESTREPO	CARACAS SUR								
PUENTE ARANDA	AMERICAS								
CAMPIÑA	SUBA								
ZONA INDUSTRIAL	AMERICAS								
CALLE 40 SUR	CARACAS SUR								
SOCORRO	CARACAS SUR								

- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN	
NIZA CALLE 127	SUBA							
FERIAS	CALLE 80							
CENTRO MEMORIA	CALLE 26							
CIUDAD UNIVERSITARIA	CALLE 26							
CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26							
CORFERIAS	CALLE 26							
QUINTA PAREDES	CALLE 26							
PERDOMO	NQS SUR							
SEVILLANA	NQS SUR							
SAN DIEGO	CARRERA 10							
PRADO	NORTE							
COMUNEROS	NQS SUR							
EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO	CALLE 26							
TV 86	AMERICAS							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23									
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR							OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN	
BOYACA	CALLE 80								
VENECIA	NQS SUR								
UNIVERSIDAD NACIONAL	NQS CENTRAL								
RICAURTE	NQS CENTRAL								
MADELENA	NQS SUR								
ALQUERIA	NQS SUR								
CAD	NQS CENTRAL								
OLAYA	CARACAS SUR								
NARIÑO	CARACAS SUR								
MINUTO DE DIOS	CALLE 80								
RESTREPO	CARACAS SUR								
PUENTE ARANDA	AMERICAS								
CAMPIÑA	SUBA								
ZONA INDUSTRIAL	AMERICAS								
CALLE 40 SUR	CARACAS SUR								
SOCORRO	CARACAS SUR								

- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23									
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR							OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE	CELOSÍA EN ZONAS DE	
EL CAMPIN	NQS CENTRAL								
PALOQUEMADO	NQS CENTRAL								
CALLE 95	SUBA								
GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL								
TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL								
7 DE AGOSTO	NQS CENTRAL								
NIZA CALLE 127	SUBA								
RIO NEGRO	SUBA								
MODELIA	CALLE 26								
GOBERNACIÓN	CALLE 26								
CAN	CALLE 26								
SALITRE GRECO	CALLE 26								
EL TIEMPO	CALLE 26								
CENTRO MEMORIA	CALLE 26								
AV ROJAS	CALLE 26								

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23									
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR							OBSERVACIONES
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN	
21 ANGELES	SUBA								
SUBA - AV. BOYACA	SUBA								
AV. CAL.I	CALLE 80								
PUENTE LARGO	SUBA								
LA SABANA	AMERICAS								
AV. EL DORADO	NQS CENTRAL								
VIRREY	NORTE								
PEPE SIERRA	NORTE								
CALLE 127	NORTE								
GENERAL SANTANDER	NQS CENTRAL								
RESTREPO	CARACAS SUR								
CALLE 40 SUR	CARACAS SUR								

- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
CORFERIAS	CALLE 26							
CIUDAD UNIVERSITARIA	CALLE 26							
CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26							
CENTRO MEMORIA	CALLE 26							
QUINTA PAREDES	CALLE 26							
GOBERNACIÓN	CALLE 26							
CAN	CALLE 26							
SALITRE EL GRECO	CALLE 26							
AV ROJAS	CALLE 26							
MODELIA	CALLE 26							
NORMANDIA	CALLE 26							
HEROES	NORTE							
CALLE 100	NORTE							
CALLE 106	NORTE							
PRADO	NORTE							
AV. CHILE	NQS CENTRAL							
LA CASTELLANA	NQS CENTRAL							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
CARRERA 90 (1 VAGON)	CALLE 80							
CDS CARRERA 32	AMERICAS							
CARRERA 43	AMERICAS							
NQS - CALLE 38 A SUR	NQS SUR							
SANTA ISABEL	NQS SUR							
21 ANGELES	SUBA							
SUBA - AV. BOYACÁ	SUBA							
LA CAMPIÑA (1 VAGON)	SUBA							
PUENTE LARGO (1 VAGON)	SUBA							
POLO	CALLE 80							

- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
NQS CALLE 75	NQS CENTRAL							
AV. CHILE	NQS CENTRAL							
LAS AGUAS	EJE AMBIENTAL							
SANTA LUCIA	CARACAS SUR							
CALLE 142	NORTE							
SAN MATEO	NQS SUR							
ALCALÁ (NOMBRE NUEVO)	NORTE							
TOBERÍN	NORTE							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
MINUTO DE DIOS	CALLE 80							
SUBA TV. 91	SUBA							
BOYACÁ (Vagón antiguo)	CALLE 80							

- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
CALLE 146	NORTE							
MAZUREN	NORTE							
CALLE 161	NORTE							
TV. 86	AMERICAS							
MANDALAY	AMERICAS							
PRADERA	AMERICAS							
AV. AMERICAS - AV. BOYACA	AMERICAS							
DISTRITO GRAFITI	AMERICAS							
MARSELLA	AMERICAS							
ESCUELA MILITAR	CALLE 80							
LA DESPENSA	NQS SUR							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
AV. CALI (Vagón antiguo)	CALLE 80							
GRATAMIRA	SUBA							
SUBA - CALLE 116	SUBA							
RICAURTE - CALLE 13	AMÉRICAS							

- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
QUIRIGUA	CALLE 80							
LEON XIII	NQS SUR							
GRANJA CRA 77	CALLE 80							
FERIAS	CALLE 80							
CARRERA 53	CALLE 80							
CARRERA 47	CALLE 80							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
SAN MARTÍN	SUBA							
SUBA - CALLE 116	SUBA							
HUMEDAL CORDOBA	SUBA							

- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA - LOTE 1 CTO 2795-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.9 Y 1.10	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
AV. 68	CALLE 80							
NIZA CALLE 127	SUBA							
RIONEGRO	SUBA							
SUBA CALLE 95	SUBA							
CARRERA 47	CALLE 80							

CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 - LOTE 2 CTO 2811-23								
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR						
		BARRERA PERIMETRALES	CELOSIA FACHADA	PUERTAS ABATIBLES	SEÑALIZACIÓN ITEM 1.10 Y 1.11	MONTAJE DE RUTEROS	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN	CELOSÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN
RESTREPO	CARACAS SUR							
GENERAL SANTANDER	NQS SUR							
HUMEDAL CORDOBA	SUBA							
BOYACÁ	CALLE 80							

Es importante mencionar que tras identificar un excedente presupuestal en el lote 2 producto de un ejercicio de balance financiero realizado en conjunto entre el Contratista y la Interventoría, la entidad tomó la decisión de invertir estos fondos en una mejora específica de las instalaciones. Se autorizó, así, mediante correo electrónico la inclusión

de una nueva actividad en el periodo 10: el suministro e instalación de celosías para optimizar la transición entre los vagones B y C en la estación Virrey.

De lo anterior, se relacionan las órdenes de trabajo emitidas durante los 10 periodos en los que se desarrolló el contrato para la correspondiente ejecución por parte de los contratistas de adecuación de lote 1 y lote 2. Las fechas de inicio y finalización de actividades están sujetas a lo dispuesto en el numeral 6. FORMA DE PAGO del anexo técnico de los contratos de adecuación.

RELACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO GENERADAS – LOTE 1

Tabla 12. Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 1 - Periodo 1 al 10.

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

ORDEN DE TRABJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CSR_L1_2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CSR_L1_3	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_6	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_7	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_8	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_9	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_11	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	4/01/2024	24/01/2024
CSR_L1_12	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	12/01/2024	27/01/2024
CSR_L1_13	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_14	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	4/01/2024	19/01/2024

CSR_L1_15	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_16	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	4/01/2024	19/01/2024
CSR_L1_17	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CSR_L1_18	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	4/01/2024	24/01/2024

- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_19	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	16/02/2024	12/03/2024
CSR_L1_20	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CSR_L1_21	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	06/02/2024	21/02/2024
CSR_L1_22	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CSR_L1_23	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	08/02/2024	23/02/2024
CSR_L1_24	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	28/02/2024	19/03/2024
CSR_L1_25	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/03/2024	19/03/2024
CSR_L1_26	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	09/02/2024	29/02/2024
CSR_L1_27	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	05/03/2024	20/03/2024
CSR_L1_28	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	12/02/2024	03/03/2024
CSR_L1_29	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	09/02/2024	24/02/2024
CSR_L1_30	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	12/02/2024	27/02/2024
CSR_L1_31	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	12/02/2024	27/02/2024
CSR_L1_32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	12/02/2024	27/02/2024
CSR_L1_33	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	12/02/2024	27/02/2024
CSR_L1_34	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	12/02/2024	27/02/2024
CSR_L1_35	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM

CSR_L1_36	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	01/03/2024	25/03/2024
CSR_L1_37	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	15/02/2024	01/03/2024
CSR_L1_38	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS	15/02/2024	01/03/2024
CSR_L1_39	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/02/2024	04/03/2024
CSR_L1_40	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/02/2024	02/03/2024
CSR_L1_41	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/02/2024	02/03/2024
CSR_L1_42	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/02/2024	12/03/2024

- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_43	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/03/2024	31/03/2024
CSR_L1_44	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/03/2024	02/04/2024
CSR_L1_45	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_46	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_47	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_48	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	18/03/2024	02/04/2024
CSR_L1_49	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/03/2024	01/04/2024
CSR_L1_50	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/03/2024	01/04/2024
CSR_L1_51	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM
CSR_L1_52	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM
CSR_L1_53	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_54	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	01/04/2024	21/04/2024

CSR_L1_55	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_56	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_57	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_58	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_59	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_60	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	01/04/2024	16/04/2024

- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_45	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_46	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_47	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	18/03/2024	07/04/2024
CSR_L1_48	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	18/03/2024	02/04/2024
CSR_L1_51	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	05/04/2024	30/04/2024
CSR_L1_52	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	05/04/2024	30/04/2024
CSR_L1_53	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_54	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_55	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_56	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024

CSR_L1_57	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_58	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_59	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	01/04/2024	21/04/2024
CSR_L1_60	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	01/04/2024	16/04/2024
CSR_L1_61	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	11/04/2024	26/04/2024
CSR_L1_62	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	11/04/2024	26/04/2024
CSR_L1_63	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	11/04/2024	26/04/2024
CSR_L1_64	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/04/2024	04/05/2024

- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_64	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/04/2024	04/05/2024
CSR L1-65	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-66	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-67	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-68	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-69	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-70	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-71	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-72	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-73	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/05/2024	18/05/2024

CSR L1-74	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-75	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ZONAS DE TRANSICIÓN	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-76	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-77	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/05/2024	23/05/2024
CSR L1-78	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-79	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	03/05/2024	18/05/2024
CSR L1-80	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/05/2024	31/05/2024
CSR L1-81	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	21/05/2024	05/06/2024
CSR L1-82	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	21/05/2024	05/06/2024
CSR_L1_83	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_84	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_85	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/05/2024	01/06/2024
CSR_L1_86	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_87	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_88	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	03/06/2024	17/06/2024

- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR L1-81	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	21/05/2024	5/06/2024
CSR L1-82	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	21/05/2024	5/06/2024
CSR_L1_83	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_84	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_86	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_87	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	27/05/2024	11/06/2024
CSR_L1_88	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	3/06/2024	17/06/2024

CSR_L1_89	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	5/06/2024	25/06/2024
CSR_L1_90	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	12/06/2024	2/07/2024
CSR_L1_91	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	12/06/2024	27/06/2024
CSR_L1_92	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	12/06/2024	27/06/2024
CSR_L1_93	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/06/2024	30/06/2024
CSR_L1_94	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	10/06/2024	25/06/2024
CSR_L1_95	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	4/06/2024	24/06/2024
CSR_L1_96	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	12/06/2024	2/07/2024
CSR_L1_97	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	7/06/2024	27/06/2024
CSR_L1_98	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	7/06/2024	22/06/2024
CSR_L1_99	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	12/06/2024	2/07/2024
CSR_L1_100	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	7/06/2024	27/06/2024
CSR_L1_101	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	13/06/2024	28/06/2024
CSR_L1_102	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/06/2024	2/07/2024
CSR_L1_103	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	13/06/2024	28/06/2024
CSR_L1_104	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/06/2024	2/07/2024
CSR_L1_106	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	17/06/2024	2/07/2024

- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_105	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	24/06/2024	09/07/2024
CSR_L1_107	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	24/06/2024	09/07/2024

CSR_L1_108	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	24/06/2024	09/07/2024
CSR_L1_109	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	01/07/2024	16/07/2024
CSR_L1_110	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	23/06/2024	08/07/2024
CSR_L1_111	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_112	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	15/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_113	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/07/2024	02/08/2024
CSR_L1_114	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/07/2024	03/08/2024
CSR_L1_115	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_116	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_117	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_118	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	15/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_119	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/07/2024	03/08/2024
CSR_L1_120	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/07/2024	02/08/2024
CSR_L1_121	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_122	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	15/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_123	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	22/07/2024	06/08/2024
CSR_L1_124	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	10/07/2024	30/07/2024
CSR_L1_125	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	23/07/2024	07/08/2024

- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_113	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/07/2024	02/08/2024

CSR_L1_114	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/07/2024	03/08/2024
CSR_L1_119	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/07/2024	03/08/2024
CSR_L1_120	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/07/2024	02/08/2024
CSR_L1_123	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	22/07/2024	06/08/2024
CSR_L1_125	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	23/07/2024	07/08/2024
CSR_L1_126	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	06/08/2024	26/08/2024
CSR_L1_127	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/08/2024	10/09/2024
CSR_L1_128	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	06/08/2024	26/08/2024
CSR_L1_129	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	15/08/2024	30/08/2024
CSR_L1_130	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	06/08/2024	26/08/2024
CSR_L1_131	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/08/2024	03/09/2024
CSR_L1_132	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	09/08/2024	29/08/2024
CSR_L1_133	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	17/08/2024	27/08/2024
CSR_L1_134	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	17/08/2024	01/09/2024
CSR_L1_135	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	12/08/2024	27/08/2024
CSR_L1_136	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	08/08/2024	28/08/2024
CSR_L1_137	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	12/08/2024	27/08/2024
CSR_L1_138	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	13/08/2024	02/09/2024
CSR_L1_139	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/08/2024	28/08/2024
CSR_L1_140	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/08/2024	03/09/2024
CSR_L1_141	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	13/08/2024	02/09/2024
CSR_L1_142	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/08/2024	28/08/2024

CSR_L1_143	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/08/2024	31/08/2024
CSR_L1_144	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	21/08/2024	10/09/2024
CSR_L1_145	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	21/08/2024	05/09/2024
CSR_L1_146	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/08/2024	31/08/2024
CSR_L1_147	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	15/08/2024	04/09/2024
CSR_L1_148	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	22/08/2024	06/09/2024

- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_127	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/08/2024	10/09/2024
CSR_L1_129	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	15/08/2024	30/08/2024
CSR_L1_131	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/08/2024	03/09/2024
CSR_L1_138	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	13/08/2024	02/09/2024
CSR_L1_139	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/08/2024	28/08/2024
CSR_L1_140	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/08/2024	03/09/2024
CSR_L1_143	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/08/2024	31/08/2024
CSR_L1_144	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	21/08/2024	10/09/2024
CSR_L1_145	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	21/08/2024	05/09/2024
CSR_L1_146	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/08/2024	31/08/2024
CSR_L1_148	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	22/08/2024	06/09/2024
CSR_L1_149	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	13/09/2024	28/09/2024
CSR_L1_150	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	11/09/2024	01/10/2024

CSR_L1_151	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/09/2024	28/09/2024
CSR_L1_152	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_153	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	11/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_154	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	11/09/2024	26/09/2024
CSR_L1_155	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	13/09/2024	28/09/2024
CSR_L1_156	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	11/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_157	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	11/09/2024	26/09/2024
CSR_L1_158	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_159	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	11/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_160	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	11/09/2024	26/09/2024
CSR_L1_161	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_162	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	11/09/2024	01/10/2024
CSR_L1_163	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	11/09/2024	26/09/2024
CSR_L1_164	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	16/09/2024	01/10/2024

- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION*	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CSR_L1_165	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/10/2024	19/10/2024
CSR_L1_166	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	03/10/2024	18/10/2024
CSR_L1_167	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/10/2024	18/10/2024
CSR_L1_168	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/10/2024	19/10/2024

CSR_L1_169	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/10/2024	19/10/2024
CSR_L1_170	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	03/10/2024	19/10/2024
CSR_L1_171	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/10/2024	18/10/2024

RELACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO GENERADAS– LOTE 2

Tabla 13. Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 2 - Periodo 1 al 10

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

ORDEN DE TRABJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_001	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CMTTO_L2_002	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CMTTO_L2_003	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CMTTO_L2_004	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/01/2024	13/02/2024
CMTTO_L2_005	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	04/01/2024	24/01/2024
CMTTO_L2_006	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	04/01/2024	24/01/2024
CMTTO_L2_007	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	04/01/2024	24/01/2024
CMTTO_L2_008	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	04/01/2024	24/01/2024
CMTTO_L2_009	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_010	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_011	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_012	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_013	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	24/01/2024
CMTTO_L2_014	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	04/01/2024	24/01/2024

CMTTO_L2_015	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_016	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_017	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/01/2024	19/01/2024
CMTTO_L2_018	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/01/2024	19/01/2024

- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

ORDEN DE TRABJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_019	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	* En trámite de obtención de PMT por parte de SDM
CMTTO_L2_020	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	*En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	*En trámite de obtención de PMT por parte de SMD
CMTTO_L2_021	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	*En trámite de obtención de PMT por parte de SDM	*En trámite de obtención de PMT por parte de SMD
CMTTO_L2_022	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	12/02/2024	03/03/2024
CMTTO_L2_023	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	12/02/2024	03/03/2024
CMTTO_L2_024	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	12/02/2024	03/03/2024
CMTTO_L2_025	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	12/02/2024	03/03/2024
CMTTO_L2_026	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CMTTO_L2_027	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CMTTO_L2_028	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CMTTO_L2_029	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/02/2024	26/02/2024
CMTTO_L2_030	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	14/02/2024	29/02/2024
CMTTO_L2_031	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	14/02/2024	29/02/2024
CMTTO_L2_032	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	14/02/2024	29/02/2024

CMTTO_L2_033	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	14/02/2024	29/02/2024
CMTTO_L2_034	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	13/02/2024	28/02/2024
CMTTO_L2_035	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	13/02/2024	28/02/2024
CMTTO_L2_036	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	13/02/2024	28/02/2024
CMTTO_L2_037	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	13/02/2024	28/02/2024
CMTTO_L2_038	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	15/02/2024	01/03/2024
CMTTO_L2_039	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	15/02/2024	01/03/2024
CMTTO_L2_040	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/02/2024	05/03/2024
CMTTO_L2_041	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/02/2024	05/03/2024
CMTTO_L2_042	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/02/2024	05/03/2024
CMTTO_L2_043	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	19/02/2024	05/03/2024

- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_044	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	08/03/2024	28/03/2024
CMTTO_L2_045	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/03/2024	02/04/2024
CMTTO_L2_046	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/03/2024	02/04/2024
CMTTO_L2_047	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	18/03/2024	02/04/2024
CMTTO_L2_048	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	18/03/2024	02/04/2024
CMTTO_L2_049	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	15/03/2024	30/03/2024
CMTTO_L2_050	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	15/03/2024	30/03/2024
CMTTO_L2_051	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	19/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_052	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	19/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_053	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	24/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_054	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	24/03/2024	08/04/2024

CMTTO_L2_055	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/03/2024	13/04/2024
CMTTO_L2_056	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_057	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_058	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_059	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_060	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_061	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	01/04/2024	26/04/2024
CMTTO_L2_062	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	26/03/2024	15/04/2024
CMTTO_L2_063	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	01/04/2024	16/04/2024

- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_050	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	15/03/2024	30/03/2024
CMTTO_L2_051	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	19/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_052	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	19/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_053	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	24/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_054	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	24/03/2024	08/04/2024
CMTTO_L2_055	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	19/03/2024	13/04/2024
CMTTO_L2_056	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_057	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_058	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_059	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_060	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	26/03/2024	10/04/2024
CMTTO_L2_061	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	01/04/2024	26/04/2024
CMTTO_L2_062	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	26/03/2024	15/04/2024

CMTTO_L2_063	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	01/04/2024	16/04/2024
CMTTO_L2_064	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA	04/04/2024	19/04/2024
CMTTO_L2_065	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/04/2024	19/04/2024
CMTTO_L2_066	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/04/2024	19/04/2024
CMTTO_L2_067	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	04/04/2024	19/04/2024
CMTTO_L2_068	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	05/04/2024	20/04/2024
CMTTO_L2_069	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	05/04/2024	20/04/2024

- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_070	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/05/2024	21/05/2024
CMTTO_L2_071	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	02/05/2024	22/05/2024
CMTTO_L2_072	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	03/05/2024	23/05/2024
CMTTO_L2_073	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	02/05/2024	17/05/2024
CMTTO_L2_074	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	02/05/2024	17/05/2024
CMTTO_L2_075	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/05/2024	02/06/2024
CMTTO_L2_076	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	06/05/2024	26/05/2024
CMTTO_L2_077	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	06/05/2024	21/05/2024
CMTTO_L2_078	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	06/05/2024	21/05/2024
CMTTO_L2_079	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/05/2024	28/05/2024
CMTTO_L2_080	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/05/2024	28/05/2024
CMTTO_L2_081	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/05/2024	28/05/2024
CMTTO_L2_082	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	14/05/2024	19/05/2024
CMTTO_L2_083	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	14/05/2024	19/05/2024

CMTTO_L2_084	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	15/05/2024	19/05/2024
CMTTO_L2_085	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	15/05/2024	19/05/2024
CMTTO_L2_086	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/05/2024	02/06/2024
CMTTO_L2_087	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/05/2024	02/06/2024

- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_086	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/05/2024	02/06/2024
CMTTO_L2_087	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/05/2024	02/06/2024
CMTTO_L2_088	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	10/06/2024	05/07/2024
CMTTO_L2_089	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	29/05/2024	18/06/2024
CMTTO_L2_090	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_091	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	06/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_092	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_093	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	06/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_094	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_095	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_096	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_097	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	01/06/2024	21/06/2024
CMTTO_L2_098	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	31/05/2024	16/06/2024
CMTTO_L2_099	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	01/06/2024	16/06/2024
CMTTO_L2_100	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	01/06/2024	16/06/2024
CMTTO_L2_101	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	05/06/2024	20/06/2024
CMTTO_L2_102	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	14/06/2024	29/06/2024
CMTTO_L2_103	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/06/2024	03/07/2024

CMTTO_L2_104	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/06/2024	03/07/2024
CMTTO_L2_105	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	13/05/2024	28/05/2024
CMTTO_L2_106	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	21/06/2024	06/07/2024

- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_103	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/06/2024	03/07/2024
CMTTO_L2_104	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/06/2024	03/07/2024
CMTTO_L2_106	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	21/06/2024	06/07/2024
CMTTO_L2_107	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	09/07/2024	29/07/2024
CMTTO_L2_108	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/07/2024	28/07/2024
CMTTO_L2_109	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	26/07/2024	20/08/2024
CMTTO_L2_110	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	09/07/2024	29/07/2024
CMTTO_L2_111	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	10/07/2024	25/07/2024
CMTTO_L2_112	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	11/07/2024	31/07/2024

- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_109	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	26/07/2024	20/08/2024
CMTTO_L2_113	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	02/08/2024	22/08/2024
CMTTO_L2_114	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	02/08/2024	22/08/2024
CMTTO_L2_115	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	09/08/2024	03/09/2024
CMTTO_L2_116	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	03/08/2024	23/08/2024
CMTTO_L2_117	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	05/08/2024	25/08/2024

CMTTO_L2_118	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/08/2024	28/08/2024
CMTTO_L2_119	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	13/08/2024	28/08/2024

- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_120	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	09/09/2024	29/09/2024
CMTTO_L2_121	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	09/09/2024	29/09/2024
CMTTO_L2_122	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	12/09/2024	27/09/2024
CMTTO_L2_123	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/09/2024	03/10/2024

- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

ORDENES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	INICIO DE INTERVENCION	FECHA LIMITE DE FINALIZACION
CMTTO_L2_123	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	18/09/2024	03/10/2024
CMTTO_L2_124	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	02/10/2024	19/10/2024
CMTTO_L2_125	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN FACHADA	02/10/2024	19/10/2024
CMTTO_L2_126	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/10/2024	18/10/2024
CMTTO_L2_127	ADECUACIÓN DE REALCE EXISTENTE EN ZONAS DE TRANSICIÓN INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	03/10/2024	18/10/2024
CMTTO_L2_128	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	16/10/2024	19/10/2024

De esta manera, se tiene el siguiente reporte de actividades ejecutadas por los contratistas de lote 1 y lote 2 durante los 10 periodos comprendidos entre el 20 de diciembre del 2023 al 19 de octubre del 2024.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – LOTE 1

Tabla 14. Relación de actividades ejecutadas Lote 1- Periodo 1 al 10

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-3	NORTE	CALLE 85	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-3	NORTE	CALLE 85	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-4	NORTE	CALLE 85	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN
1	CSR L1-4	NORTE	CALLE 85	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-5	NORTE	CALLE 85	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR
1	CSR L1-5	NORTE	CALLE 85	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-1-6	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR
1	CSR L1-1-6	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-1-7	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-1-7	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-9	NQS SUR	SEVILLANA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-9	NQS SUR	SEVILLANA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE

					CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-10	NQS SUR	PERDOMO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-10	NQS SUR	PERDOMO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-11	NQS SUR	COMUNEROS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-11	NQS SUR	COMUNEROS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-12	NQS SUR	COMUNEROS	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-12	NQS SUR	COMUNEROS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-13	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-13	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-14	NORTE	CALLE 106	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-14	NORTE	CALLE 106	1,10	DECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-15	NQS SUR	BOSA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-15	NQS SUR	BOSA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-16	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO

					ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-16	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-18	NORTE	PRADO VERANIEGO	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-18	NORTE	PRADO VERANIEGO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-18	NORTE	PRADO VERANIEGO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-1	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	1.5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-2	NQS CENTRO	GUATOQUE VERAGUAS	1.5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-1-8	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-1-8	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-17	NORTE	PRADO VERANIEGO	1.5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-20	NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-20	NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-21	NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES

					ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-21	NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-22	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-22	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-23	NORTE	CALLE 85	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-26	NQS CENTRAL	CAMPIN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-26	NQS CENTRAL	CAMPIN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-27	NQS CENTRAL	CAMPIN	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-27	NQS CENTRAL	CAMPIN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-28	CARACAS SUR	HORTUA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-28	CARACAS SUR	HORTUA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-29	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-30	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-31	NQS SUR	BOSA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO

					IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-32	NORTE	CALLE 106	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-33	CALLE 80	QUIRIGUA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-34	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-37	CARRERA 10	POLICARPA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-37	CARRERA 10	POLICARPA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-38	CARRERA 10	POLICARPA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-40	CARRERA 10	NIEVES	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-40	CARRERA 10	NIEVES	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-40	CARRERA 10	NIEVES	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-41	CARRERA 10	CIUDAD JARDIN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-41	CARRERA 10	CIUDAD JARDIN	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-41	CARRERA 10	CIUDAD JARDIN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-19	NQS SUR	SEVILLANA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-24	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-24	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-25	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-25	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-35	CARACAS SUR	HORTUA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-36	AMERICAS	MANDALAY	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-39	CARRERA 10	SAN BERNARDO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-39	CARRERA 10	SAN BERNARDO	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-39	CARRERA 10	SAN BERNARDO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

1	CSR L1-42	CARRERA 10	SAN VICTORINO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-42	CARRERA 10	SAN VICTORINO	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-42	CARRERA 10	SAN VICTORINO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-43	NORTE	PRADO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-43	NORTE	PRADO	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-43	NORTE	PRADO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-44	NQS SUR	PERDOMO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-44	NQS SUR	PERDOMO	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-44	NQS SUR	PERDOMO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-49	NQS SUR	SEVILLANA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-49	NQS SUR	SEVILLANA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-49	NQS SUR	SEVILLANA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-50	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-50	CARRERA 10	SAN DIEGO	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-50	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-45	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-45	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-46	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-47	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-47	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-48	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-48	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-51	SUBA	NIZA- CL. 127	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).

1	CSR L1-52	CALLE 80	FERIAS	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-53	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-53	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-54	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-54	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-55	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-55	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-56	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-56	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-57	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-57	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-58	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-58	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-59	CALLE 26	CORFERIAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

1	CSR L1-59	CALLE 26	CORFERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-60	CALLE 26	CORFERIAS	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-60	CALLE 26	CORFERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-64	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
1	CSR L1-65	CALLE 26	AV. ROJAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-65	CALLE 26	AV. ROJAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-66	CALLE 26	EL TIEMPO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-66	CALLE 26	EL TIEMPO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-67	CALLE 26	EL TIEMPO	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-67	CALLE 26	EL TIEMPO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-68	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-68	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-69	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-69	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-70	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
1	CSR L1-71	CALLE 26	CAN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

1	CSR L1-71	CALLE 26	CAN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-72	CALLE 26	CAN	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-72	CALLE 26	CAN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-73	CALLE 26	CAN	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
1	CSR L1-74	CALLE 26	GOBERNACION	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-74	CALLE 26	GOBERNACION	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-75	CALLE 26	GOBERNACION	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
1	CSR L1-75	CALLE 26	GOBERNACION	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-76	CALLE 26	GOBERNACION	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
1	CSR L1-77	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-77	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-78	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
1	CSR L1-79	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-79	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO

					ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-81	SUBA	SUBA CALLE 95	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-81	SUBA	SUBA CALLE 95	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-81	SUBA	SUBA CALLE 95	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-82	NQS CENTRAL	CAMPIN- UAN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-82	NQS CENTRAL	CAMPIN- UAN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-82	NQS CENTRAL	CAMPIN- UAN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-83	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-83	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-83	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-84	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-84	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-84	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-86	SUBA	RIONEGRO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-86	SUBA	RIONEGRO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-86	SUBA	RIONEGRO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-87	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-87	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-87	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

1	CSR L1-88	NQS CENTRAL	PALOQUEMADO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-88	NQS CENTRAL	PALOQUEMADO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-88	NQS CENTRAL	PALOQUEMADO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-89	CALLE 26	MODELIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-89	CALLE 26	MODELIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-90	CALLE 26	NORMANDIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-90	CALLE 26	NORMANDIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-91	CALLE 26	NORMANDIA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-91	CALLE 26	NORMANDIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-92	CALLE 26	NORMANDIA	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
1	CSR L1-93	NQS CENTRAL	CHILE	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-93	NQS CENTRAL	CHILE	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-94	NQS CENTRAL	CHILE	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-94	NQS CENTRAL	CHILE	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-95	NORTE	HEROES GEL'HADA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-95	NORTE	HEROES GEL'HADA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE

					CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-96	NORTE	CALLE 100	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-96	NORTE	CALLE 100	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-97	NORTE	CALLE 106	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-97	NORTE	CALLE 106	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-98	NORTE	CALLE 106	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-98	NORTE	CALLE 106	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-99	NORTE	PRADO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-99	NORTE	PRADO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-100	NQS CENTRAL	CASTELLANA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-100	NQS CENTRAL	CASTELLANA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-103	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-103	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-103	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-104	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-104	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-104	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-106	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-106	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-106	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E

					INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-108	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-108	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-108	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO

					IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-117	AUTONORTE	CALLE 142	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

1	CSR L1-117	AUTONORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-118	AUTONORTE	CALLE 142	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-118	AUTONORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-121	AUTONORTE	ALCALA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-121	AUTONORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-122	AUTONORTE	ALCALA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-122	AUTONORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-124	AUTONORTE	TOBERIN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-124	AUTONORTE	TOBERIN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-114	NQS CENTRAL	AV CHILE	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-114	NQS CENTRAL	AV CHILE	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-114	NQS CENTRAL	AV CHILE	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-119	NORTE	CALLE 142	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-119	NORTE	CALLE 142	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-119	NORTE	CALLE 142	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-120	NQS SUR	SAN MATEO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-120	NQS SUR	SAN MATEO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-120	NQS SUR	SAN MATEO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-121	NORTE	ALCALA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-121	NORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA

					MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-123	NORTE	ALCALA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-123	NORTE	ALCALA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-123	NORTE	ALCALA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-125	NORTE	TOBERIN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-125	NORTE	TOBERIN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-125	NORTE	TOBERIN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-126	NORTE	CALLE 146	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-126	NORTE	CALLE 146	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-128	NORTE	MAZUREN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-128	NORTE	MAZUREN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-130	NORTE	CALLE 161	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

1	CSR L1-130	NORTE	CALLE 161	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-132	AMERICAS	TV. 86	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-133	AMERICAS	MANDALAY	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-133	AMERICAS	MANDALAY	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-134	AMERICAS	MANDALAY	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-134	AMERICAS	MANDALAY	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-136	AMERICAS	PRADERA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-136	AMERICAS	PRADERA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-137	AMERICAS	PRADERA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE

					VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-137	AMERICAS	PRADERA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-137	AMERICAS	PRADERA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-141	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-141	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-142	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-142	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-147	NQS SUR	LA DESPENSA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-147	NQS SUR	LA DESPENSA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-127	NORTE	CALLE 146	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-127	NORTE	CALLE 146	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-127	NORTE	CALLE 146	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-129	NORTE	MAZUREN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-129	NORTE	MAZUREN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-129	NORTE	MAZUREN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-131	NORTE	CALLE 161	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-131	NORTE	CALLE 161	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-131	NORTE	CALLE 161	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-138	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-138	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-139	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-140	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-140	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO

					FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-140	AMERICAS	AV. AMERICAS AV. BOYACA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-144	AMERICAS	MARSELLA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-144	AMERICAS	MARSELLA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-145	AMERICAS	MARSELLA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-146	CALLEE 80	ESCUELA MILITAR	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-146	CALLEE 80	ESCUELA MILITAR	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-146	CALLEE 80	ESCUELA MILITAR	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

1	CSR L1-148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-150	NQS SUR	LEON XIII	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-150	NQS SUR	LEON XIII	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-151	NQS SUR	LEON XIII	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-151	NQS SUR	LEON XIII	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-152	NQS SUR	LEON XIII	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-152	NQS SUR	LEON XIII	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-152	NQS SUR	LEON XIII	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO

					IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-153	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-153	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-154	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-154	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-155	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-155	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-155	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-156	CALLE 80	FERIAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-156	CALLE 80	FERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-157	CALLE 80	FERIAS	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-157	CALLE 80	FERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-158	CALLE 80	FERIAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO

					ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-158	CALLE 80	FERIAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-158	CALLE 80	FERIAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-159	CALLE 80	CARRERA 53	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-159	CALLE 80	CARRERA 53	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-160	CALLE 80	CARRERA 53	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-160	CALLE 80	CARRERA 53	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-161	CALLE 80	CARRERA 53	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-161	CALLE 80	CARRERA 53	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-161	CALLE 80	CARRERA 53	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-162	CALLE 80	CARRERA 47	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-162	CALLE 80	CARRERA 47	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-163	CALLE 80	CARRERA 47	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES

					ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
1	CSR L1-163	CALLE 80	CARRERA 47	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-164	CALLE 80	CARRERA 47	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-164	CALLE 80	CARRERA 47	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-164	CALLE 80	CARRERA 47	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
1	CSR L1-165	CALLE 80	AVENIDA 68	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-165	CALLE 80	AVENIDA 68	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-166	CALLE 80	AVENIDA 68	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-166	CALLE 80	AVENIDA 68	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
1	CSR L1-166	CALLE 80	AVENIDA 68	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
1	CSR L1-167	CALLE 80	AVENIDA 68	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.

1	CSR L1-168	SUBA	NIZA CALLE 127	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-168	SUBA	NIZA CALLE 127	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-169	SUBA	RIONEGRO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-169	SUBA	RIONEGRO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-170	SUBA	SUBA CALLE 95	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
1	CSR L1-170	SUBA	SUBA CALLE 95	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
1	CSR L1-171	CALLE 80	CARRERA 47	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – LOTE 2

Tabla 15. Relación de actividades ejecutadas Lote 2 – Periodo 1 al 10

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_005	NQS SUR	Venecia	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_005	NQS SUR	Venecia	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_006	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

2	CMTTO_L2_006	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_007	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_007	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_008	NQS SUR	Santa Isabel	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_008	NQS SUR	Santa Isabel	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_009	NQS SUR	Venecia	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_009	NQS SUR	Venecia	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_010	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_010	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_011	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_011	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_012	NQS SUR	Santa Isabel	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_012	NQS SUR	Santa Isabel	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.

2	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_015	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_015	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_016	NQS SUR	Alquería	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_016	NQS SUR	Alquería	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_017	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_017	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_018	NQS SUR	General Santander	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_018	NQS SUR	General Santander	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_001	NORTE	Pepe Sierra	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_002	NORTE	Calle 127	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_003	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_004	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_022	CARACAS SUR	Consuelo	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_022	CARACAS SUR	Consuelo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_023	CARACAS SUR	Socorro	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_023	CARACAS SUR	Socorro	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_024	CARACAS SUR	Quiroga	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE

					VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_024	CARACAS SUR	Quiroga	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_025	CARACAS SUR	Fucha	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_025	CARACAS SUR	Fucha	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_026	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_026	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_027	AMERICAS	Zona Industrial	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_027	AMERICAS	Zona Industrial	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_028	AMERICAS	Puente Aranda	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_028	AMERICAS	Puente Aranda	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_029	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_029	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_030	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.

2	CMTTO_L2_030	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_031	AMERICAS	Zona Industrial	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_031	AMERICAS	Zona Industrial	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_032	AMERICAS	Puente Aranda	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_032	AMERICAS	Puente Aranda	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_033	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_033	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_034	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_035	NQS SUR	General Santander	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_036	NQS SUR	Alquería	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_037	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_038	NQS SUR	Venecia	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_038	NQS SUR	Venecia	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE

					EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_039	NQS SUR	Venecia	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 3. 20 febrero 2024 – 19 marzo 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_019	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_020	NQS SUR	Alquería	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_021	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMMTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_041	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMMTO_L2_041	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_041	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

2	CMTTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMMTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_043	SUBA	Suba - TV. 91	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMMTO_L2_043	SUBA	Suba - TV. 91	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_043	SUBA	Suba - TV. 91	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_044	SUBA	Gratamira	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_044	SUBA	Gratamira	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_045	NQS SUR	Alquería	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_045	NQS SUR	Alquería	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_046	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

2	CMTTO_L2_046	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_047	NQS SUR	Alquería	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_047	NQS SUR	Alquería	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_048	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_048	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_050	NQS CENTRAL	CAD	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_051	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_051	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE

					CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_052	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_052	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_053	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_053	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_054	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_054	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_055	CALLE 80	Boyacá	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_056	AMERICAS	Puente Aranda	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_056	AMERICAS	Puente Aranda	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_056	AMERICAS	Puente Aranda	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

2	CMTTO_L2_057	AMERICAS	Zona Industrial	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_057	AMERICAS	Zona Industrial	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_057	AMERICAS	Zona Industrial	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_059	CARACAS SUR	Socorro	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_059	CARACAS SUR	Socorro	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_059	CARACAS SUR	Socorro	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_060	CARACAS SUR	Nariño	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_060	CARACAS SUR	Nariño	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO

					FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_060	CARACAS SUR	Nariño	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_061	NQS SUR	Venecia	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_062	NQS CENTRAL	CAD	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_062	NQS CENTRAL	CAD	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_063	NQS CENTRAL	CAD	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_063	NQS CENTRAL	CAD	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_064	NQS SUR	C.C. Paseo villa del río-Madelena	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_065	CARACAS SUR	Olaya	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_065	CARACAS SUR	Olaya	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_065	CARACAS SUR	Olaya	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_066	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

2	CMTTO_L2_066	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_066	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_067	CARACAS SUR	Restrepo	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_067	CARACAS SUR	Restrepo	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_067	CARACAS SUR	Restrepo	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_068	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_068	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_068	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_069	NQS CENTRAL	CAD	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_069	NQS CENTRAL	CAD	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

2	CMTTO_L2_069	NQS CENTRAL	CAD	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_070	NORTE	Calle 127	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_070	NORTE	Calle 127	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_071	NORTE	Virrey	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_071	NORTE	Virrey	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_072	NORTE	Pepe Sierra	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_072	NORTE	Pepe Sierra	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_073	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_073	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.
2	CMTTO_L2_074	NQS SUR	General Santander	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.

2	CMTTO_L2_075	CARACAS SUR	Restrepo	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_075	CARACAS SUR	Restrepo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_076	AMERICAS	De la sabana	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_076	AMERICAS	De la sabana	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_077	NORTE	Calle 127	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_077	NORTE	Calle 127	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_078	NORTE	Pepe Sierra	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_078	NORTE	Pepe Sierra	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_079	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_079	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_080	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_080	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE

					CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_081	NQS SUR	General Santander	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_081	NQS SUR	General Santander	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_082	SUBA	21 Ángeles	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_082	SUBA	21 Ángeles	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_082	SUBA	21 Ángeles	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_083	SUBA	Puentelargo	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_083	SUBA	Puentelargo	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_083	SUBA	Puentelargo	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_084	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_084	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_085	NQS SUR	General Santander	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.

2	CMTTO_L2_085	NQS SUR	General Santander	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_105	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_105	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_086	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_086	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_086	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_087	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_087	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_087	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

2	CMTTO_L2_088	NQS SUR	Santa Isabel	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_089	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_090	CALLE 80	Polo	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_090	CALLE 80	Polo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_091	CALLE 80	Polo	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_091	CALLE 80	Polo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_092	CALLE 80	Carrera 90	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_092	CALLE 80	Carrera 90	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_093	CALLE 80	Carrera 90	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_093	CALLE 80	Carrera 90	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_094	SUBA	21 Ángeles	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.

2	CMTTO_L2_094	SUBA	21 Ángeles	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_095	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_095	SUBA	Suba - Av. Boyacá	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_096	SUBA	La Campiña	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_096	SUBA	La Campiña	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_097	SUBA	Puentelargo	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_097	SUBA	Puentelargo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_098	SUBA	21 Ángeles	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_099	NQS SUR	Santa Isabel	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_100	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_101	CALLE 80	Carrera 90	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.

2	CMTTO_L2_102	CALLE 80	Carrera 90	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_102	CALLE 80	Carrera 90	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_102	CALLE 80	Carrera 90	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_103	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_103	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_103	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_104	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_104	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_104	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.

2	CMTTO_L2_106	NQS SUR	General Santander	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_107	CALLE 80	Minuto de Dios	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_107	CALLE 80	Minuto de Dios	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_108	CALLE 80	Minuto de Dios	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_108	CALLE 80	Minuto de Dios	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_110	CALLE 80	Boyacá	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_110	CALLE 80	Boyacá	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_111	CALLE 80	Boyacá	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_111	CALLE 80	Boyacá	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_112	SUBA	Suba - TV. 91	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_112	SUBA	Suba - TV. 91	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_109	SUBA	Suba - TV. 91	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_113	SUBA	Gratamira	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_113	SUBA	Gratamira	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_114	SUBA	Gratamira	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_115	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).
2	CMTTO_L2_116	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_116	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_117	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_117	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_118	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO

2	CMTTO_L2_118	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.
2	CMTTO_L2_119	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.

- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_120	SUBA	San Martín	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_120	SUBA	San Martín	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_121	SUBA	Humedal Córdoba	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_121	SUBA	Humedal Córdoba	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_122	SUBA	San Martín	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.

- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024

LOTE	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION
2	CMTTO_L2_123	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.

2	CMTTO_L2_123	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.
2	CMTTO_L2_123	SUBA	Av. Suba - Calle 116	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.
2	CMTTO_L2_124	CARACAS SUR	Restrepo	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_124	CARACAS SUR	Restrepo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_125	NQS SUR	General Santander	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.
2	CMTTO_L2_125	NQS SUR	General Santander	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_126	SUBA	Humedal Córdoba	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_127	CALLE 80	Boyacá	1,3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.
2	CMTTO_L2_128	NORTE	Virrey	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO
2	CMTTO_L2_128	NORTE	Virrey	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.

Por lo tanto, para la fecha del presente informe final, se recopila la información de las ordenes de trabajo que fueron ejecutadas en el transcurso de los 10 periodos de cada uno de los contratos de obra CTO2795-23 y CTO-2811-23.

ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO – LOTE 1


Tabla 16. Estado ordenes de trabajo Lote 1 – Periodo 1 al 10

- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_1	TYGUA SAN JOSE	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_2	GUATOQUE VERAGUAS	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_3	CALLE 85	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_4	CALLE 85	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_5	CALLE 85	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_6	AV. PRIMERA DE MAYO	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_7	AV. PRIMERA DE MAYO	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_8	SAN DIEGO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_9	SEVILLANA	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_10	PERDOMO	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_11	COMUNEROS	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_12	COMUNEROS	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_13	COUNTRY SUR	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_14	CALLE 106	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_15	BOSA	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_16	MOVISTAR ARENA	19/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_17	PRADO VERANIEGO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_18	PRADO VERANIEGO	19/01/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
18	18	14

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

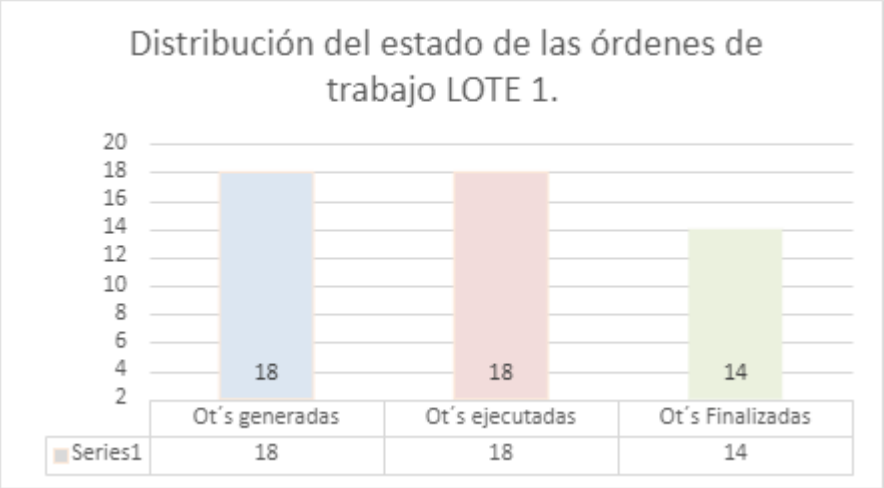


- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_1	TYGUA SAN JOSE	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_2	GUATOQUE VERAGUAS	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_8	SAN DIEGO	24/01/2024	0	0,00%
CSR_L1_17	PRADO VERANIEGO	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_19	SEVILLANA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_20	PALOQUEMAO	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_21	PALOQUEMAO	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_22	GUATOQUE VERAGUAS	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_23	CALLE 85	17/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_24	MOVISTAR ARENA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_25	MOVISTAR ARENA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_26	CAMPIN	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_27	CAMPIN	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_28	HORTUA	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_29	MOVISTAR ARENA	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_30	COUNTRY SUR	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_31	BOSA	19/02/2024	0	0,00%

CSR_L1_32	CALLE 106	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_33	QUIRIGUA	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_34	ESCUELA MILITAR	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_35	HORTUA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_36	MANDALAY	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_37	POLICARPA	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_38	POLICARPA	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_39	SAN BERNARDO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_40	NIEVES	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_41	CIUDAD JARDIN	19/02/2024	0	0,00%
CSR_L1_42	SAN VICTORINO	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
28	28	21

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

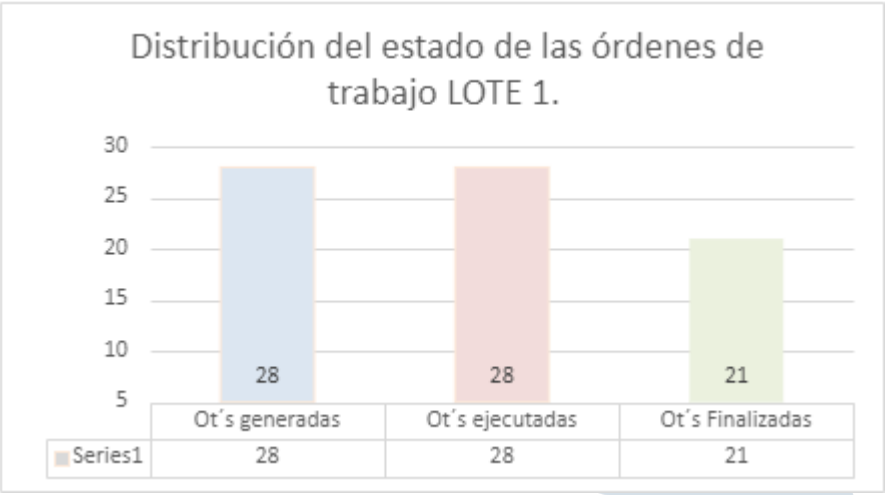


- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_19	SEVILLANA	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_24	MOVISTAR ARENA	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_25	MOVISTAR ARENA	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_35	HORTUA	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_36	MANDALAY	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_39	SAN BERNARDO	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_42	SAN VICTORINO	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_43	PRADO	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_44	PERDOMO	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_45	CONCEJO DE BOGOTA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_46	CONCEJO DE BOGOTA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_47	QUINTA PAREDES	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_48	QUINTA PAREDES	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_49	SEVILLANA	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_50	SAN DIEGO	19/03/2024	0	0,00%
CSR_L1_51	NIZA- CL. 127	En trámite PMT	0	0,00%
CSR_L1_52	FERIAS	En trámite PMT	0	0,00%
CSR_L1_53	CENTRO MEMORIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_54	CENTRO MEMORIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_55	CENTRO MEMORIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_56	CIUDAD UNIVERSITARIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_57	CIUDAD UNIVERSITARIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_58	CIUDAD UNIVERSITARIA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_59	CORFERIAS	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_60	CORFERIAS	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
25	23	11

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1- Periodo 3. 20 febrero 2024 - 19 marzo 2024

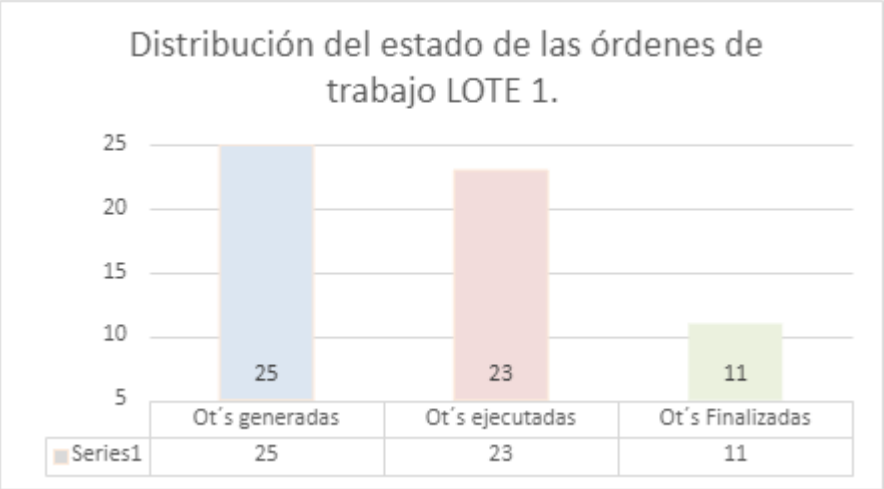


- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_45	CONCEJO DE BOGOTA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_46	CONCEJO DE BOGOTA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_47	QUINTA PAREDES	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_48	QUINTA PAREDES	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_51	NIZA- CL. 127	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_52	FERIAS	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_53	CENTRO MEMORIA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_54	CENTRO MEMORIA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_55	CENTRO MEMORIA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_56	CIUDAD UNIVERSITARIA	19/04/2024	0	0,00%

CSR_L1_57	CIUDAD UNIVERSITARIA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_58	CIUDAD UNIVERSITARIA	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_59	CORFERIAS	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_60	CORFERIAS	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_61	COMUNEROS	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_62	EL TIEMPO	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_63	TV 86	19/04/2024	0	0,00%
CSR_L1_64	CENTRO MEMORIA	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
18	18	17

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

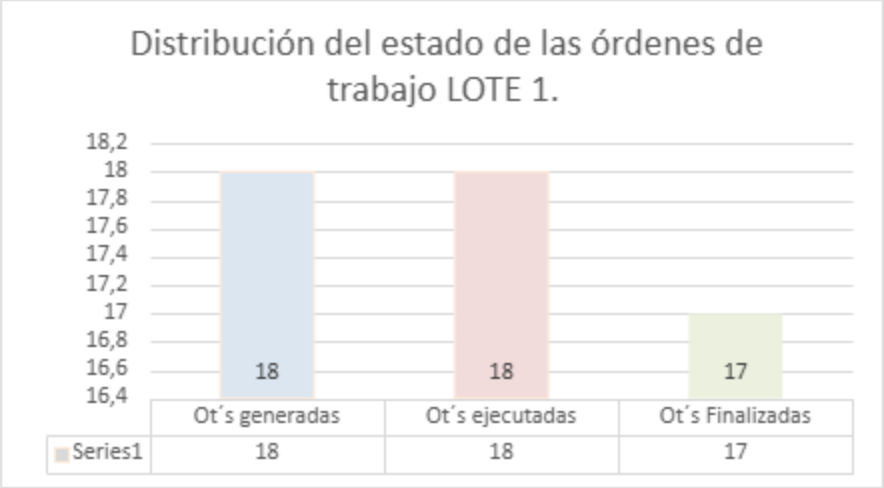


- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

ORDENES DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_64	CENTRO MEMORIA	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-65	AV. ROJAS	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-66	EL TIEMPO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-67	EL TIEMPO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-68	SALITRE EL GRECO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-69	SALITRE EL GRECO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-70	SALITRE EL GRECO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-71	CAN	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-72	CAN	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-73	CAN	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-74	GOBERNACION	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-75	GOBERNACION	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-76	GOBERNACION	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-77	7 DE AGOSTO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-78	7 DE AGOSTO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-79	7 DE AGOSTO	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-80	NIZA CALLE 127	19/05/2024	0	0,00%
CSR L1-81	SUBA CALLE 95	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR L1-82	CAMPIN- UAN	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_83	GUATOQUE VERAGUAS	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_84	TYGUA SAN JOSE	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_85	MODELIA	19/05/2024	0	0,00%
CSR_L1_86	RIONEGRO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_87	7 DE AGOSTO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_88	PALOQUEMADO	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
25	25	18

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

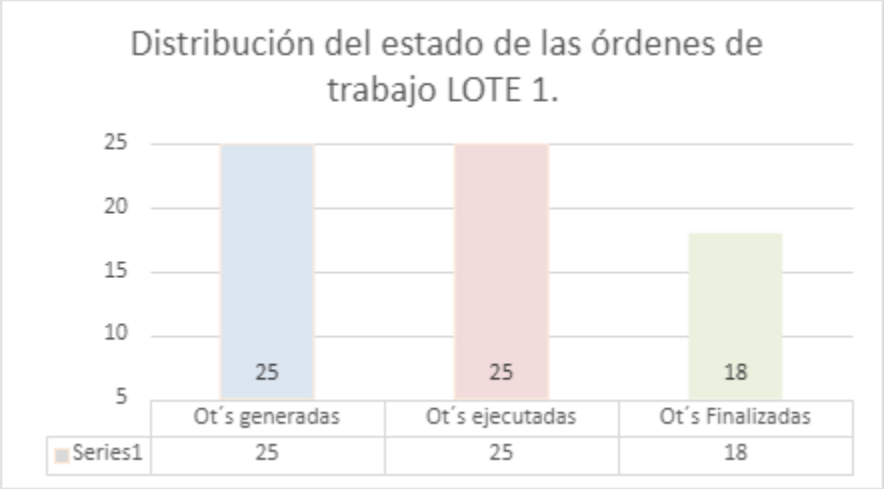


- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

OT	ESTACIÓN	FECHA FINALIZACION Y RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR L1-81	SUBA CALLE 95	19/06/2024	0	0,00%
CSR L1-82	CAMPIN- UAN	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_83	GUATOQUE VERAGUAS	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_84	TYGUA SAN JOSE	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_86	RIONEGRO	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_87	7 DE AGOSTO	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_88	PALOQUEMADO	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_89	MODELIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_90	NORMANDIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_91	NORMANDIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_92	NORMANDIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_93	CHILE	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_94	CHILE	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_95	HEROES GEL'HADA	19/06/2024	0	0,00%

CSR_L1_96	CALLE 100	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_97	CALLE 106	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_98	CALLE 106	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_99	PRADO	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_100	CASTELLANA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_101	NORMANDIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_102	AV. ROJAS	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_103	SALITRE EL GRECO	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_104	CIUDAD UNIVERSITARIA	19/06/2024	0	0,00%
CSR_L1_106	QUINTA PAREDES	19/06/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
24	24	24

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024.

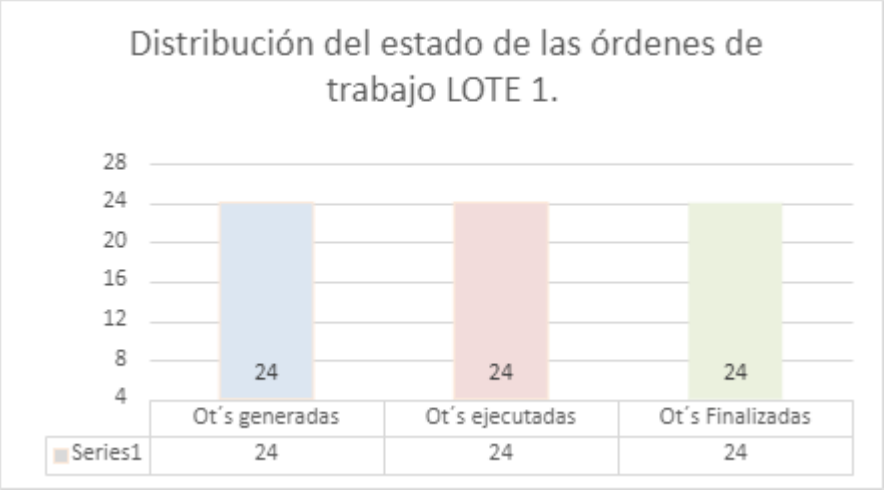


- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_105	GOBERNACION	09/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_107	CORFERIAS	09/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_108	CONCEJO DE BOGOTA	09/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_109	CENTRO MEMORIA	16/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_110	CAN	08/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_111	CALLE 75	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_112	CALLE 75	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_113	CALLE 75	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_114	AV CHILE	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_115	AGUAS	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_116	SANTA LUCIA	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_117	CALLE 142	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_118	CALLE 142	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_119	CALLE 142	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_120	SAN MATEO	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_121	ALCALA	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_122	ALCALA	19/07/2024	0	0,00%

CSR_L1_123	ALCALA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_124	TOBERIN	19/07/2024	0	0,00%
CSR_L1_125	TOBERIN	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
20	20	14

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024.

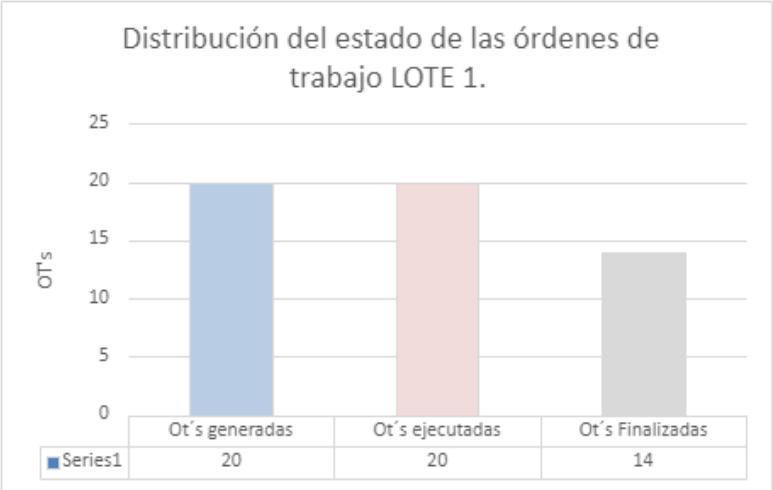


- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_113	CALLE 75	02/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_114	AV CHILE	03/08/2024	0	0,00%

CSR_L1_119	CALLE 142	03/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_120	SAN MATEO	02/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_123	ALCALA	06/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_125	TOBERIN	07/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_126	CALLE 146	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_127	CALLE 146	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_128	MAZUREN	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_129	MAZUREN	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_130	CALLE 161	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_131	CALLE 161	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_132	TV. 86	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_133	MANDALAY	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_134	MANDALAY	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_135	MANDALAY	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_136	PRADERA	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_137	PRADERA	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_138	AV. AMERICAS AV. BOYACA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_139	AV. AMERICAS AV. BOYACA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_140	AV. AMERICAS AV. BOYACA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_141	DISTRITO GRAFITI	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_142	DISTRITO GRAFITI	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_143	DISTRITO GRAFITI	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_144	MARSELLA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_145	MARSELLA	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_146	ESCUELA MILITAR	En ejecución	En ejecución	0,00%
CSR_L1_147	LA DESPENSA	19/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_148	LA DESPENSA	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
29	29	18

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024.

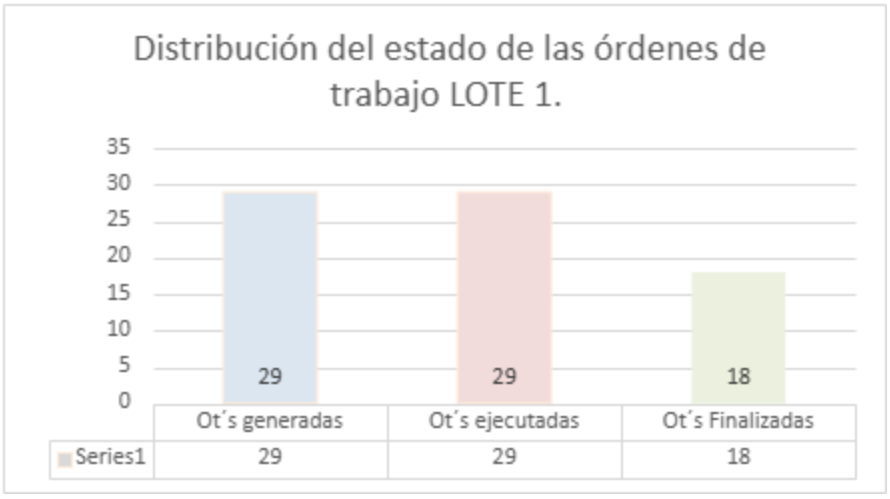


- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_127	CALLE 146	10/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_129	MAZUREN	30/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_131	CALLE 161	03/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_138	AV. AMERICAS AV. BOYACA	02/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_139	AV. AMERICAS AV. BOYACA	28/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_140	AV. AMERICAS AV. BOYACA	03/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_143	DISTRITO GRAFITI	31/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_144	MARSELLA	10/09/2024	0	0,00%

CSR_L1_145	MARSELLA	05/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_146	ESCUELA MILITAR	31/08/2024	0	0,00%
CSR_L1_148	LA DESPENSA	06/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_149	QUIRIGUA	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_150	LEON XIII	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_151	LEON XIII	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_152	LEON XIII	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_153	GRANJA - CARRERA 77	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_154	GRANJA - CARRERA 77	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_155	GRANJA - CARRERA 77	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_156	FERIAS	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_157	FERIAS	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_158	FERIAS	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_159	CARRERA 53	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_160	CARRERA 53	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_161	CARRERA 53	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_162	CARRERA 47	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_163	CARRERA 47	19/09/2024	0	0,00%
CSR_L1_164	CARRERA 47	19/09/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
27	27	27

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024.

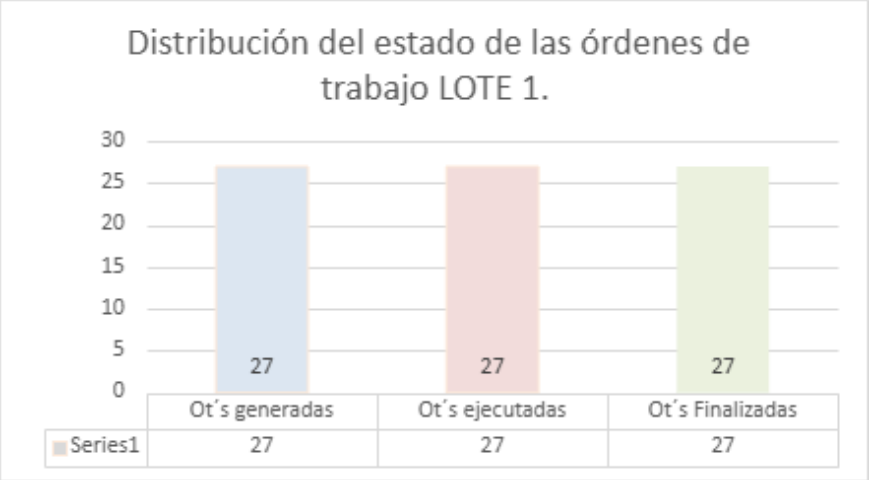


- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CSR_L1_165	AVENIDA 68	19/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_166	AVENIDA 68	18/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_167	AVENIDA 68	18/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_168	NIZA CALLE 127	19/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_169	RINEGRO	19/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_170	SUBA CALLE 95	19/10/2024	0	0,00%
CSR_L1_171	CARRERA 47	18/10/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
7	7	7

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 1 - Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024.

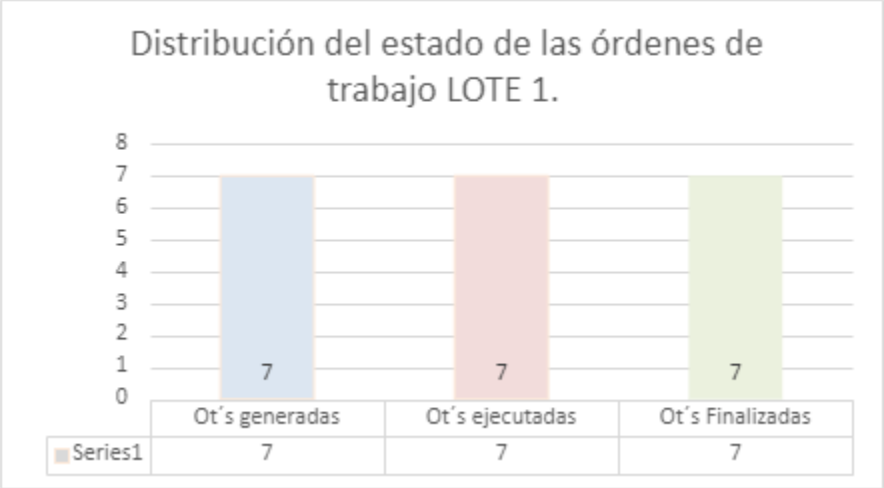

A la fecha de elaboración del presente informe no se evidencian atrasos para las actividades autorizadas por esta Interventoría y generada la necesidad por la Entidad, y en ejecución por parte del contratista LOTE 1 – CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA.

ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO – LOTE 2

Tabla 17. Estado ordenes de trabajo Lote 2 – Periodo 1 al 10


- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_001	Pepe Sierra	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_002	Calle 127	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_003	Cra. 43 - COMAPAN	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_004	CDS Carrera 32	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_005	Venecia	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_006	NQS - CL 38A Sur	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_007	NQS - CL 30 Sur	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_008	Santa Isabel	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_009	Venecia	19/01/2024	0	0,00%

CMTTO_L2_010	NQS - CL 38A Sur	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_011	NQS - CL 30 Sur	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_012	Santa Isabel	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_013	De la sabana	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_014	Virrey	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_015	NQS - CL 38A Sur	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_016	Alquería	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_017	C.C. Paseo villa del río - Madelena	19/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_018	General Santander	19/01/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
18	18	13

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 1. 20 diciembre 2023 – 19 enero 2024

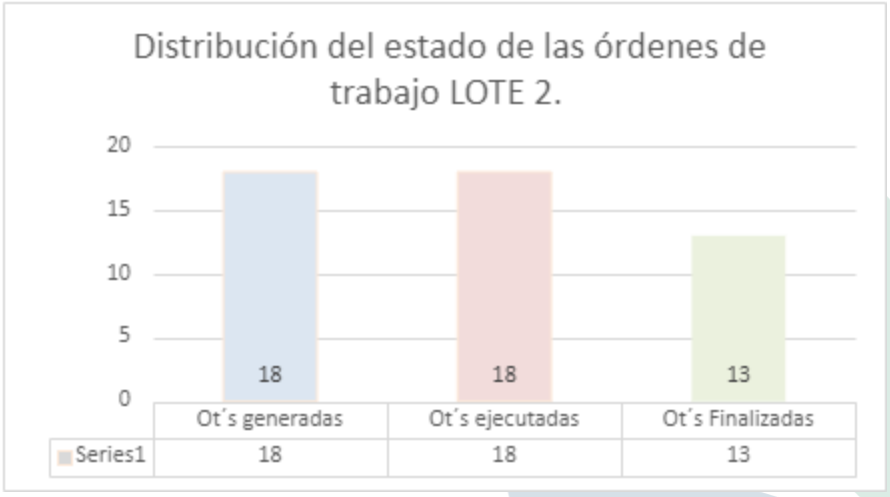


- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_001	Pepe Sierra	13/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_002	Calle 127	13/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_003	Cra. 43 - COMAPAN	13/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_004	CDS Carrera 32	13/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_014	Virrey	24/01/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_019	NQS - CL 38A Sur	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_020	Alquería	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_021	NQS - CL 30 Sur	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_022	Consuelo	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_023	Socorro	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_024	Quiroga	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_025	Fucha	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_026	CDS - Cr 32	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_027	Zona Industrial	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_028	Puente Aranda	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_029	Cra. 43 - COMAPAN	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_030	CDS - Cr 32	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_031	Zona Industrial	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_032	Puente Aranda	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_033	Cra. 43 - COMAPAN	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_034	NQS - CL 38A Sur	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_035	General Santander	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_036	Alquería	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_037	C.C. Paseo villa del río-Madelena	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_038	Venecia	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_039	Venecia	19/02/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_040	Boyacá	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_041	NQS - CL 30 Sur	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_042	Av. El Dorado	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_043	Suba-TV. 91	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
30	30	23

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 2. 20 enero 2024 – 19 febrero 2024

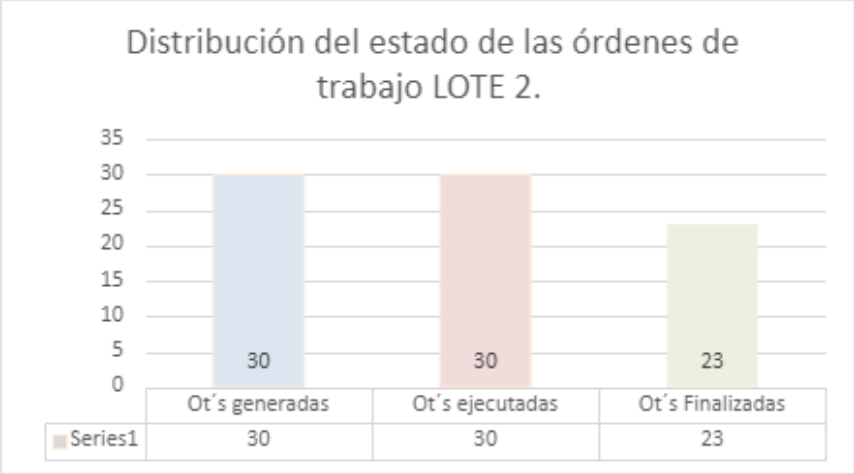


- Periodo 3. 20 febrero 2024 – 19 marzo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_019	NQS - CL 38A Sur	17/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_020	Alquería	17/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_021	NQS - CL 30 Sur	17/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_040	Boyacá	05/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_041	NQS - CL 30 Sur	05/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_042	Av. El Dorado	05/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_043	Suba-TV. 91	05/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_044	Gratamira	18/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_045	Alquería	19/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_046	C.C. Paseo villa del río - Madelena	19/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_047	Alquería	19/03/2024	0	0,00%

CMTTO_L2_048	C.C. Paseo villa del río - Madelena	19/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_049	Minuto de Dios	19/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_050	CAD	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_051	U. Nacional	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_052	Ricaurte	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_053	U. Nacional	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_054	Ricaurte	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_055	Boyacá	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_056	Puente Aranda	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_057	Zona Industrial	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_058	La Campiña	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_059	Socorro	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_060	Nariño	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_061	Venecia	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_062	CAD	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_063	CAD	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
27	27	13

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 3. 20 febrero 2024 – 19 marzo 2024

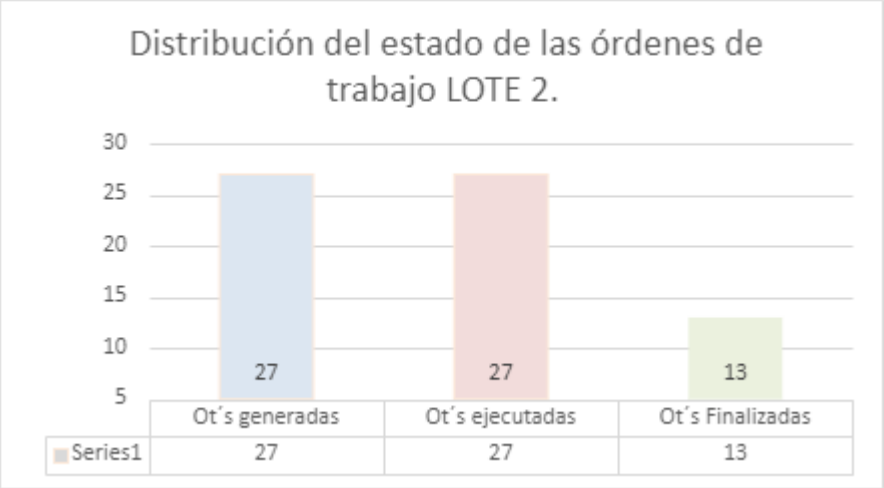


- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_050	CAD	30/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_051	U. Nacional	07/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_052	Ricaurte	08/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_053	U. Nacional	08/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_054	Ricaurte	24/03/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_055	Boyacá	13/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_056	Puente Aranda	10/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_057	Zona Industrial	10/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_058	La Campiña	10/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_059	Socorro	10/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_060	Nariño	10/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_061	Venecia	20/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_062	CAD	14/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_063	CAD	16/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_064	C.C. Paseo villa del río - Madelena	19/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_065	Olaya	19/04/2024	0	0,00%

CMTTO_L2_066	Calle 40 Sur	19/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_067	Restrepo	19/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_068	U. Nacional	19/04/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_069	CAD	19/04/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
20	20	20

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 4. 20 marzo 2024 – 19 abril 2024

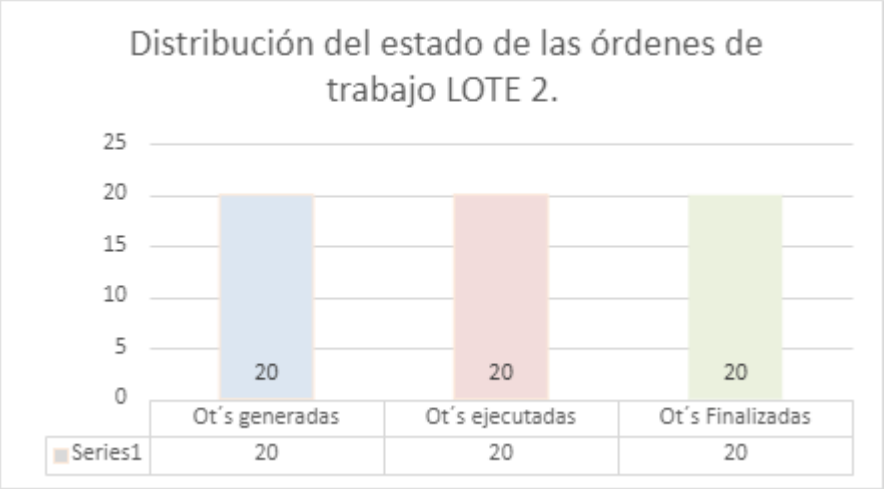


- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_070	Calle 127	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_071	Virrey	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_072	Pepe Sierra	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_073	Av. El Dorado	17/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_074	General Santander	17/05/2024	0	0,00%

CMTTO_L2_075	Restrepo	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_076	De la sabana	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_077	Calle 127	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_078	Pepe Sierra	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_079	Av. El Dorado	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_080	Calle 40 Sur	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_081	General Santander	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_082	21 Ángeles	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_083	Puentelargo	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_084	Av. El Dorado	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_085	General Santander	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_086	Suba - Av. Boyacá	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_087	Av. Ciudad de Cali	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
18	18	16

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 5. 20 abril 2024 – 19 mayo 2024

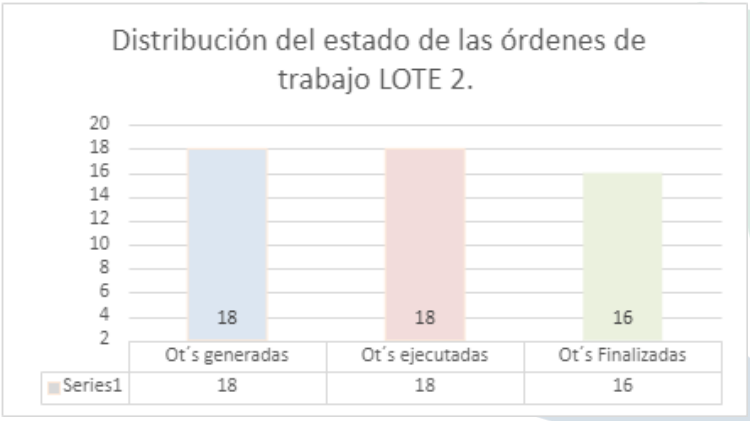


- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_086	Suba - Av. Boyacá	02/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_087	Av. Ciudad de Cali	02/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_088	Santa Isabel	16/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_089	Suba - Av. Boyacá	18/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_090	Polo	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_091	Polo	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_092	Carrera 90	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_093	Carrera 90	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_094	21 Ángeles	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_095	Suba - Av. Boyacá	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_096	La Campiña	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_097	Puentelargo	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_098	21 Ángeles	16/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_099	Santa Isabel	16/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_100	NQS - CL 38A Sur	16/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_101	Carrera 90	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_102	Carrera 90	19/06/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_103	Cra. 43 - COMAPAN	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_104	CDS Carrera 32	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_105	Calle 40 Sur	19/05/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_106	General Santander	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
21	21	18

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 6. 20 mayo 2024 – 19 junio 2024

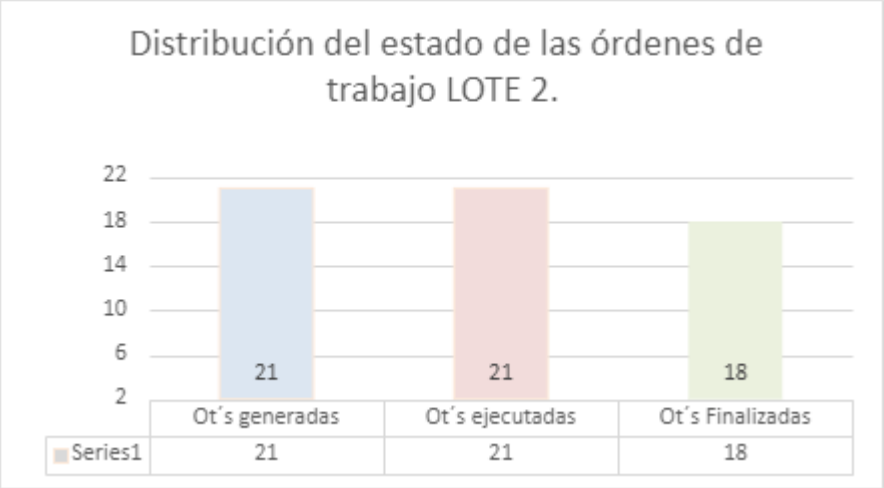


- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_103	Cra. 43 - COMAPAN	03/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_104	CDS Carrera 32	03/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_106	General Santander	06/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_107	Minuto de Dios	19/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_108	Minuto de Dios	19/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_109	Suba-TV. 91	En ejecución	En ejecución	0,00%
CMTTO_L2_110	Boyacá	19/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_111	Boyacá	19/07/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_112	Suba-TV. 91	19/07/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
9	9	8

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 7. 20 junio 2024 – 19 julio 2024

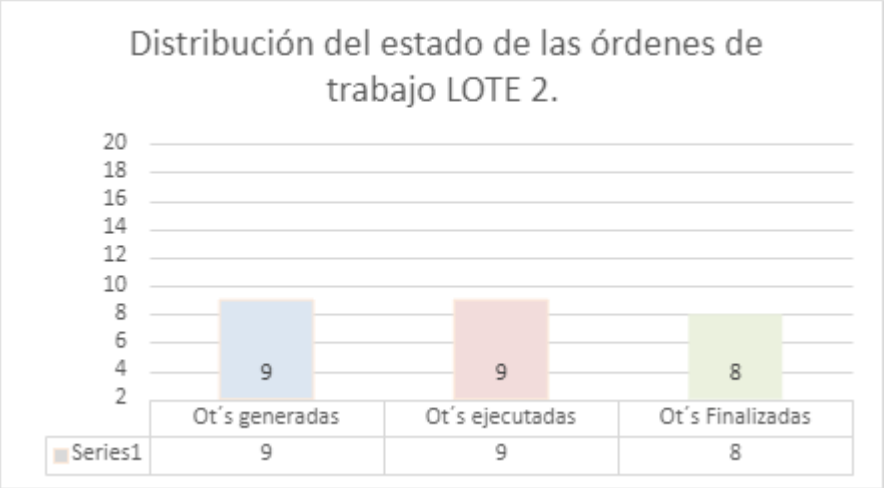


- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_109	Suba-TV. 91	18/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_113	Gratamira	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_114	Gratamira	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_115	Av. Suba - Calle 116	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_116	Av. Suba - Calle 116	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_117	Av. Ciudad de Cali	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_118	Av. Ciudad de Cali	19/08/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_119	Ricaurte	19/08/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
8	8	8

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 8. 20 julio 2024 – 19 agosto 2024

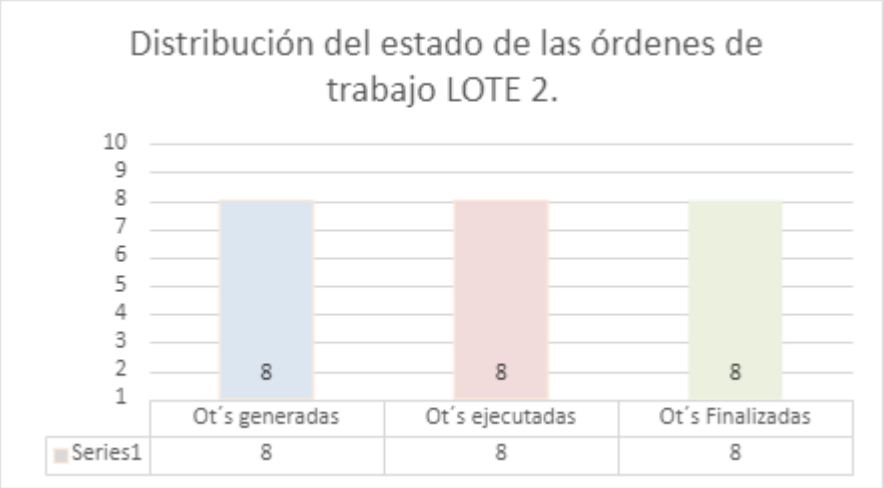


- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_120	San Martín	19/09/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_121	Humedal Córdoba	19/09/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_122	San Martín	19/09/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_123	Av. Suba - Calle 116	En ejecución	En ejecución	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
4	4	3

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 9. 20 agosto 2024 – 19 septiembre 2024

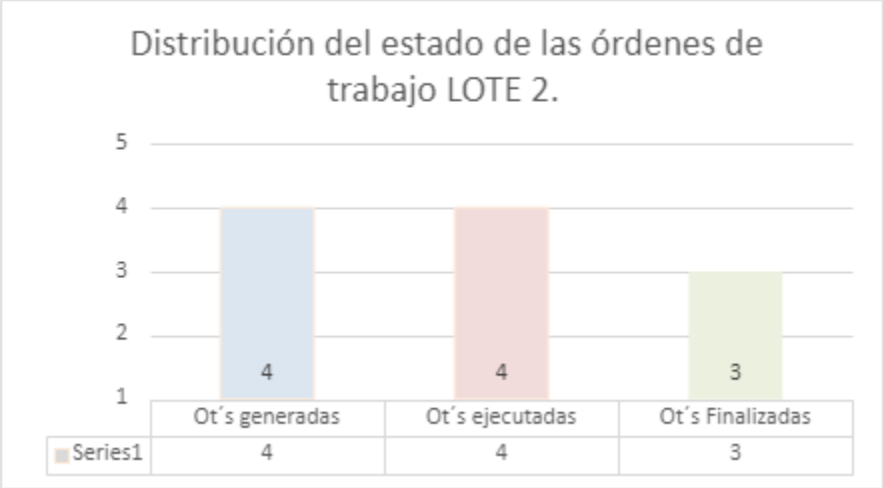


- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
CMTTO_L2_123	Av. Suba - Calle 116	03/10/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_124	Restrepo	19/10/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_125	General Santander	19/10/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_126	Humedal Córdoba	18/10/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_127	Boyacá	18/10/2024	0	0,00%
CMTTO_L2_128	Virrey	19/10/2024	0	0,00%

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
6	6	6

- Gráfico de distribución del estado de las ordenes de trabajo LOTE 2- Periodo 10. 20 septiembre 2024 – 19 octubre 2024

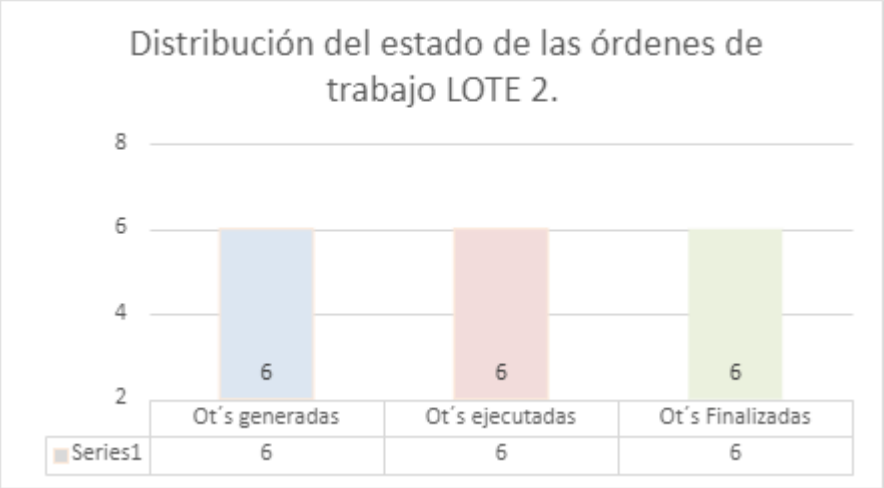


A la fecha del presente informe no se evidencian atrasos para las actividades autorizadas por esta Interventoría y generada la necesidad por la Entidad, y en ejecución por parte del contratista LOTE 2 - CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Los contratistas dieron culminación a las actividades programadas para cada uno de los periodos durante los tiempos establecidos en los requisitos contractuales del contrato de adecuación cumpliendo en un 100% con la programación de actividades terminadas de cada uno de los periodos. No obstante, es de aclarar que todas las actividades fueron finalizadas dentro de los tiempos de ejecución requeridos por el numeral 6 del anexo técnico.

Figura 1. Estado de OTs generadas por periodo

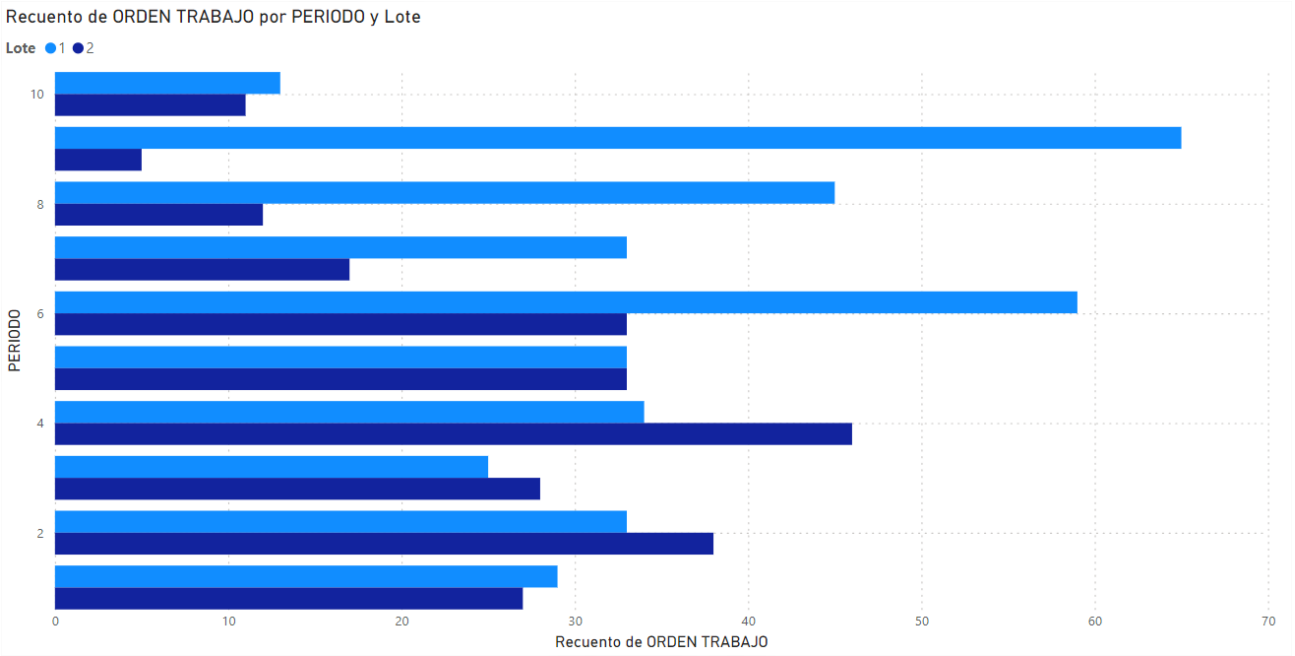

5. INFORME AMBIENTAL

Ver anexo 2. SST.

6. INFORME SST

Ver anexo 1. AMB.

7. INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante el desarrollo del contrato comprendido del 20 de diciembre del 2023 al 19 de octubre del 2024, se tuvo una facturación total de $ 31.352.762.405 entre los contratos de obra CTO2795-23 y CTO2811-23, lo que corresponde al 99.7% del recurso presupuestal dispuesto por la entidad TRANSMILENIO S.A para la realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de evasión del pago de pasajes por parte de los usuarios del sistema.

Tabla 18. Resumen Programado Vs Ejecutado

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
11	1	1,00	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	$ 178.384.018	$219.233.959
11	1	1,00	CARRERA 10	COUNTRY SUR	$ 24.493.723	$30.102.785
11	1	1,00	NORTE	CALLE 106	$ 38.511.210	$47.330.276
11	1	1,00	NORTE	CALLE 85	$ 281.367.019	$345.800.064
11	1	1,00	NORTE	PRADO VERANIEGO	$ 35.800.611	$43.998.952
11	1	1,00	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	$ 23.814.706	$29.268.273
11	1	1,00	NQS SUR	BOSA	$ 27.150.445	$33.367.898
11	1	1,00	NQS SUR	COMUNEROS	$ 206.484.955	$253.770.010
11	1	1,00	NQS SUR	PERDOMO	$ 19.735.390	$24.254.795
11	1	1,00	NQS SUR	SEVILLANA	$ 19.735.390	$24.254.795
12	1	2,00	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	$ 35.399.549	$43.506.046
12	1	2,00	CALLE 80	QUIRIGUA	$ 17.699.774	$21.753.022
12	1	2,00	CARACAS SUR	HORTUA	$ 31.214.503	$38.362.624
12	1	2,00	CARRERA 10	CIUDAD JARDIN	$ 26.675.857	$32.784.628
12	1	2,00	CARRERA 10	COUNTRY SUR	$ 9.098.004	$11.181.447
12	1	2,00	CARRERA 10	NIEVES	$ 38.720.087	$47.586.987
12	1	2,00	CARRERA 10	POLICARPA	$ 32.224.909	$39.604.413
12	1	2,00	CARRERA 10	SAN DIEGO	$ 134.539.165	$165.348.634
12	1	2,00	NORTE	CALLE 106	$ 9.098.004	$11.181.447
12	1	2,00	NORTE	CALLE 85	$ 16.376.407	$20.126.604
12	1	2,00	NORTE	PRADO VERANIEGO	$ 370.858.320	$455.784.875
12	1	2,00	NQS CENTRAL	CAMPIN	$ 225.224.144	$276.800.473
12	1	2,00	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	$ 326.252.900	$400.964.814
12	1	2,00	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	$ 11.524.138	$14.163.166
12	1	2,00	NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	$ 208.558.163	$256.317.982
12	1	2,00	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	$ 305.958.114	$376.022.522
12	1	2,00	NQS SUR	BOSA	$ 8.324.674	$10.231.024

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
13	1	3,00	AMERICAS	MANDALAY	$ 353.488.954	$434.437.924
13	1	3,00	CARACAS SUR	HORTUA	$ 156.480.779	$192.314.877
13	1	3,00	CARRERA 10	SAN BERNARDO	$ 35.594.992	$43.746.245
13	1	3,00	CARRERA 10	SAN DIEGO	$ 36.907.530	$45.359.355
13	1	3,00	CARRERA 10	SAN VICTORINO	$ 51.159.536	$62.875.070
13	1	3,00	NORTE	PRADO	$ 40.991.261	$50.378.260
13	1	3,00	NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	$ 223.685.717	$274.909.747
13	1	3,00	NQS SUR	PERDOMO	$ 27.208.663	$33.439.447
13	1	3,00	NQS SUR	SEVILLANA	$ 342.538.126	$420.979.358

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
14	1	4,00	AMERICAS	TV 86	$ 47.993.859	$58.984.453
14	1	4,00	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	$ 156.583.730	$192.441.405
14	1	4,00	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	$ 273.892.875	$336.614.344
14	1	4,00	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	$ 62.382.186	$76.667.707
14	1	4,00	CALLE 26	CORFERIAS	$ 194.941.426	$239.583.012
14	1	4,00	CALLE 26	EL TIEMPO	$ 37.654.451	$46.277.320
14	1	4,00	CALLE 26	QUINTA PAREDES	$ 173.367.476	$213.068.627
14	1	4,00	CALLE 80	FERIAS	$ 193.630.892	$237.972.366
14	1	4,00	NQS SUR	COMUNEROS	$ 40.362.241	$49.605.195
14	1	4,00	SUBA	NIZA- CL. 127	$ 376.004.174	$462.109.130

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
15	1	5,00	CALLE 26	AV. ROJAS	$ 162.454.220	$199.656.236
15	1	5,00	CALLE 26	CAN	$ 248.392.219	$305.274.037
15	1	5,00	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	$ 389.625.882	$478.850.209
15	1	5,00	CALLE 26	EL TIEMPO	$ 173.093.878	$212.732.376
15	1	5,00	CALLE 26	GOBERNACION	$ 249.203.457	$306.271.048
15	1	5,00	CALLE 26	MODELIA	$ 34.698.093	$42.643.956
15	1	5,00	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	$ 249.203.457	$306.271.048
15	1	5,00	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	$ 290.345.963	$356.835.189
15	1	5,00	SUBA	NIZA CALLE 127	$ 31.812.535	$39.097.605

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
16	1	6,00	CALLE 26	AV. ROJAS	$ 50.121.588	$61.599.431
16	1	6,00	CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	$ 40.371.822	$49.616.970
16	1	6,00	CALLE 26	MODELIA	$ 119.592.503	$146.979.186
16	1	6,00	CALLE 26	NORMANDIA	$ 288.347.656	$354.379.269
16	1	6,00	CALLE 26	QUINTA PAREDES	$ 38.042.545	$46.754.287
16	1	6,00	CALLE 26	SALITRE EL GRECO	$ 33.857.864	$41.611.315
16	1	6,00	NORTE	CALLE 100	$ 205.451.462	$252.499.846
16	1	6,00	NORTE	CALLE 106	$ 242.675.374	$298.248.035
16	1	6,00	NORTE	HEROES GEL'HADA	$ 127.215.013	$156.347.251
16	1	6,00	NORTE	PRADO	$ 159.749.114	$196.331.662
16	1	6,00	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	$ 36.669.314	$45.066.586
16	1	6,00	NQS CENTRAL	CAMPIN- UAN	$ 39.655.349	$48.736.424
16	1	6,00	NQS CENTRAL	CASTELLANA	$ 51.365.851	$63.128.631
16	1	6,00	NQS CENTRAL	CHILE	$ 266.652.661	$327.716.121
16	1	6,00	NQS CENTRAL	GUATOQUE VERAGUAS	$ 36.499.640	$44.858.057
16	1	6,00	NQS CENTRAL	PALOQUEMADO	$ 34.402.678	$42.280.892
16	1	6,00	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	$ 36.388.440	$44.721.392
16	1	6,00	SUBA	RIONEGRO	$ 28.256.981	$34.727.830
16	1	6,00	SUBA	SUBA CALLE 95	$ 28.408.614	$34.914.187

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
17	1	7,00	CALLE 26	CAN	$ 38.279.044	$ 47.044.945
17	1	7,00	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	$ 36.058.328	$ 44.315.685
17	1	7,00	CALLE 26	CONCEJO DE BOGOTA	$ 32.588.391	$ 40.051.133
17	1	7,00	CALLE 26	CORFERIAS	$ 42.610.283	$ 52.368.038
17	1	7,00	CALLE 26	GOBERNACION	$ 34.269.267	$ 42.116.929
17	1	7,00	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	$ 126.705.931	$ 155.721.589
17	1	7,00	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	$ 47.740.442	$ 58.673.003
17	1	7,00	NORTE	ALCALA	$ 531.334.896	$ 653.010.587
17	1	7,00	NORTE	CALLE 142	$ 198.117.551	$ 243.486.470
17	1	7,00	NORTE	TOBERIN	$ 222.246.135	$ 273.140.500
17	1	7,00	NQS CENTRAL	CALLE 75	$ 215.001.025	$ 264.236.260

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
18	1	8,00	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	$ 140.300.586	$ 172.429.420
18	1	8,00	AMERICAS	MANDALAY	$ 171.346.724	$ 210.585.124
18	1	8,00	AMERICAS	PRADERA	$ 61.633.631	$ 75.747.732
18	1	8,00	AMERICAS	TV. 86	$ 35.399.549	$ 43.506.046
18	1	8,00	NORTE	ALCALA	-$ 133.795.377	-$ 164.434.518
18	1	8,00	NORTE	CALLE 142	$ 49.093.400	$ 60.335.789
18	1	8,00	NORTE	CALLE 146	$ 145.510.066	$ 178.831.871
18	1	8,00	NORTE	CALLE 161	$ 85.707.969	$ 105.335.094
18	1	8,00	NORTE	MAZUREN	$ 115.603.172	$ 142.076.298
18	1	8,00	NORTE	TOBERIN	$ 109.658.302	$ 134.770.053
18	1	8,00	NQS CENTRAL	AV CHILE	$ 70.618.229	$ 86.789.803
18	1	8,00	NQS CENTRAL	CALLE 75	$ 46.767.987	$ 57.477.856
18	1	8,00	NQS SUR	LA DESPENSA	$ 102.755.463	$ 126.286.464
18	1	8,00	NQS SUR	SAN MATEO	$ 64.044.877	$ 78.711.154

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
19	1	9,00	AMERICAS	AV.AMERICAS AV. BOYACA	$ 145.954.901	$ 179.378.574
19	1	9,00	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	$ 44.307.907	$ 54.454.417
19	1	9,00	AMERICAS	MARSELLA	$ 65.294.752	$ 80.247.250
19	1	9,00	CALLE 80	CARRERA 47	$ 259.409.937	$ 318.814.812
19	1	9,00	CALLE 80	CARRERA 53	$ 127.548.292	$ 156.756.850
19	1	9,00	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	$ 35.605.733	$ 43.759.446
19	1	9,00	CALLE 80	FERIAS	$ 128.609.726	$ 158.061.353
19	1	9,00	CALLE 80	GRANJA - CARRERA 77	$ 322.879.091	$ 396.818.403
19	1	9,00	CALLE 80	QUIRIGUA	$ 16.730.660	$ 20.561.981
19	1	9,00	NORTE	CALLE 146	$ 47.757.794	$ 58.694.329
19	1	9,00	NORTE	CALLE 161	$ 28.226.910	$ 34.690.872
19	1	9,00	NORTE	MAZUREN	$ 48.385.756	$ 59.466.095
19	1	9,00	NQS SUR	LA DESPENSA	$ 25.874.568	$ 31.799.844
19	1	9,00	NQS SUR	LEON XIII	$ 212.855.846	$ 261.599.836

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
110	1	10,00	CALLE 80	AVENIDA 68	$ 294.999.009	$ 362.553.782
110	1	10,00	CALLE 80	CARRERA 47	$ 86.412.104	$ 106.200.476
110	1	10,00	SUBA	NIZA CALLE 127	$ 137.039.122	$ 168.421.081
110	1	10,00	SUBA	RIONEGRO	$ 102.650.236	$ 126.157.140
110	1	10,00	SUBA	SUBA CALLE 95	$ 102.650.236	$ 126.157.140

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
21	2	1,00	AMERICAS	DE LA SABANA	$ 35.602.766	$43.755.799
21	2	1,00	NQS	ALQUERIA	$ 9.553.338	$11.741.053
21	2	1,00	NQS	CC PASEO DEL RIO MADELENA	$ 9.380.827	$11.529.036
21	2	1,00	NQS	GENERAL SANTANDER	$ 54.216.353	$66.631.898
21	2	1,00	NQS	NQS - CL 30 Sur	$ 141.566.896	$173.985.715
21	2	1,00	NQS	NQS - CL 38A Sur	$ 150.015.352	$184.368.868
21	2	1,00	NQS	SANTA ISABEL	$ 205.082.129	$252.045.937
21	2	1,00	NQS	VENECIA	$ 122.084.262	$150.041.558

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
22	2	2,00	AMERICAS	CDS - Cr 32	$ 465.807.861	$572.477.862
22	2	2,00	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	$ 492.459.239	$605.232.405
22	2	2,00	AMERICAS	NQS - CL 38A Sur	$ 5.205.408	$6.397.447
22	2	2,00	AMERICAS	Puente Aranda	$ 154.704.276	$190.131.555
22	2	2,00	AMERICAS	Zona Industrial	$ 154.704.276	$190.131.555
22	2	2,00	CARACAS SUR	Consuelo	$ 103.653.458	$127.390.100
22	2	2,00	CARACAS SUR	Fucha	$ 60.761.912	$74.676.390
22	2	2,00	CARACAS SUR	Quiroga	$ 103.455.681	$127.147.032
22	2	2,00	CARACAS SUR	Socorro	$ 46.647.152	$57.329.350
22	2	2,00	NORTE	CALLE 127	$ 303.518.193	$373.023.860
22	2	2,00	NORTE	PEPE SIERRA	$ 301.570.593	$370.630.258
22	2	2,00	NORTE	Virrey	$ 166.214.310	$204.277.387
22	2	2,00	NQS SUR	Alquería	$ 7.197.043	$8.845.166
22	2	2,00	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	$ 13.247.387	$16.281.039
22	2	2,00	NQS SUR	Paseo villa del río- Madelena	$ 7.000.897	$8.604.102
22	2	2,00	NQS SUR	VENECIA	$ 17.290.640	$21.250.197

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
23	2	3,00	CALLE 80	Boyacá	$ 23.663.893	$29.082.925
23	2	3,00	CALLE 80	Minuto de Dios	$ 21.966.648	$26.997.010
23	2	3,00	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	$ 28.213.358	$34.674.217
23	2	3,00	NQS SUR	Alquería	$ 482.830.672	$593.398.896
23	2	3,00	NQS SUR	NQS - CL 30 Sur	$ 346.233.541	$425.521.022
23	2	3,00	NQS SUR	NQS - CL 38A Sur	$ 333.589.008	$409.980.891
23	2	3,00	NQS SUR	Paseo villa del río- Madelena	$ 154.704.277	$190.131.556
23	2	3,00	SUBA	Gratamira	$ 56.808.529	$69.817.682
23	2	3,00	SUBA	Suba - TV. 91	$ 34.269.584	$42.117.319

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
24	2	4,00	AMERICAS	Puente Aranda	$ 13.585.043	$16.696.018
24	2	4,00	AMERICAS	Zona Industrial	$ 14.098.040	$17.326.491
24	2	4,00	CALLE 80	Boyacá	$ 473.499.241	$581.930.567
24	2	4,00	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	$ 43.301.121	$53.217.078
24	2	4,00	CARACAS SUR	Nariño	$ 14.143.220	$17.382.017
24	2	4,00	CARACAS SUR	Olaya	$ 11.155.768	$13.710.439
24	2	4,00	CARACAS SUR	Restrepo	$ 21.844.360	$26.846.718
24	2	4,00	CARACAS SUR	Socorro	$ 7.829.439	$9.622.381
24	2	4,00	NQS CENTRAL	CAD	$ 197.483.227	$242.706.886
24	2	4,00	NQS CENTRAL	Ricaurte	$ 225.160.764	$276.722.580
24	2	4,00	NQS CENTRAL	U. Nacional	$ 265.352.957	$326.118.784
24	2	4,00	NQS SUR	Paseo Villa del río - Madelena	$ 66.154.715	$81.304.144
24	2	4,00	NQS SUR	VENECIA	$ 334.149.097	$410.669.241
24	2	4,00	SUBA	La Campiña	$ 14.912.735	$18.327.751

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
25	2	5,00	AMERICAS	DE LA SABANA	$ 73.714.421	$90.595.023
25	2	5,00	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	$ 144.834.815	$178.001.988
25	2	5,00	CARACAS SUR	Restrepo	$ 27.505.385	$33.804.118
25	2	5,00	NORTE	CALLE 127	$ 181.240.927	$222.745.099
25	2	5,00	NORTE	PEPE SIERRA	$ 181.240.927	$222.745.099
25	2	5,00	NORTE	Virrey	$ 190.074.572	$233.601.649
25	2	5,00	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	$ 174.012.370	$213.861.203
25	2	5,00	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	$ 206.155.844	$253.365.532
25	2	5,00	SUBA	21 ÁNGELES	$ 17.750.832	$21.815.773
25	2	5,00	SUBA	PUENTELARGO	$ 15.004.803	$18.440.903


orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de VALOR TOTAL CON AIU_
26	2	6,00	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	$ 24.107.664	$29.628.319
26	2	6,00	CALLE 80	CARRERA 90	$ 195.963.059	$240.838.599
26	2	6,00	CALLE 80	POLO	$ 63.772.618	$78.376.548
26	2	6,00	CARACAS SUR	Calle 40 Sur	$ 92.300.271	$113.437.034
26	2	6,00	NQS SUR	NQS Calle 38A sur	$ 64.572.627	$79.359.759
26	2	6,00	NQS SUR	SANTA ISABEL	$ 482.237.383	$592.669.744
26	2	6,00	SUBA	21 Angeles	$ 101.441.123	$124.671.140
26	2	6,00	SUBA	21 ÁNGELES	$ 68.510.268	$84.199.119
26	2	6,00	SUBA	La Campiña	$ 42.647.233	$52.413.449
26	2	6,00	SUBA	PUENTELARGO	$ 42.647.233	$52.413.449
26	2	6,00	SUBA	Suba - Av. Boyacá	$ 21.307.648	$26.187.099
26	2	6,00	SUBA	Suba Av. Boyaca	$ 346.535.844	$425.892.552

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
27	2	7,00	AMERICAS	Carrera 43 - COMAPAN	$ 13.870.977	$ 17.047.431
27	2	7,00	AMERICAS	CDS Carrera 32	$ 14.007.043	$ 17.214.656
27	2	7,00	CALLE 80	Boyacá	$ 111.323.729	$ 136.816.863
27	2	7,00	CALLE 80	Minuto de Dios	$ 222.647.833	$ 273.634.187
27	2	7,00	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	$ 9.105.795	$ 11.191.022
27	2	7,00	SUBA	Suba-Tv. 91	$ 110.593.608	$ 135.919.544

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
28	2	8,00	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	$ 111.324.105	$ 136.817.325
28	2	8,00	NQS CENTRAL	Ricaurte	$ 35.223.955	$ 43.290.241
28	2	8,00	SUBA	Av. Suba - Calle 116	$ 453.849.122	$ 557.780.571
28	2	8,00	SUBA	Gratamira	$ 110.770.768	$ 136.137.274
28	2	8,00	SUBA	Suba-Tv. 91	$ 615.873.864	$ 756.908.979

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
29	2	9,00	SUBA	HUMEDAL CORDOBA	$ 102.202.595	$ 125.606.989
29	2	9,00	SUBA	SAN MARTIN	$ 187.234.259	$ 230.110.904
Total					**$ 289.436.853**	**$ 355.717.893**

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	ESTACIÓN	Suma de VALOR TOTAL SIN AIU	Suma de ValorToTalConAIU
210	2	10,00	AUTONORTE	Virrey	$ 25.729.208	$ 31.621.196
210	2	10,00	CALLE 80	Boyacá	$ 107.851.522	$ 132.549.520
210	2	10,00	CARACAS SUR	Restrepo	$ 58.798.770	$ 72.263.689
210	2	10,00	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	$ 59.555.361	$ 73.193.539
210	2	10,00	SUBA	Av. Suba - Calle 116	$ 15.743.549	$ 19.348.822
210	2	10,00	SUBA	HUMEDAL CORDOBA	$ 68.182.131	$ 83.795.839

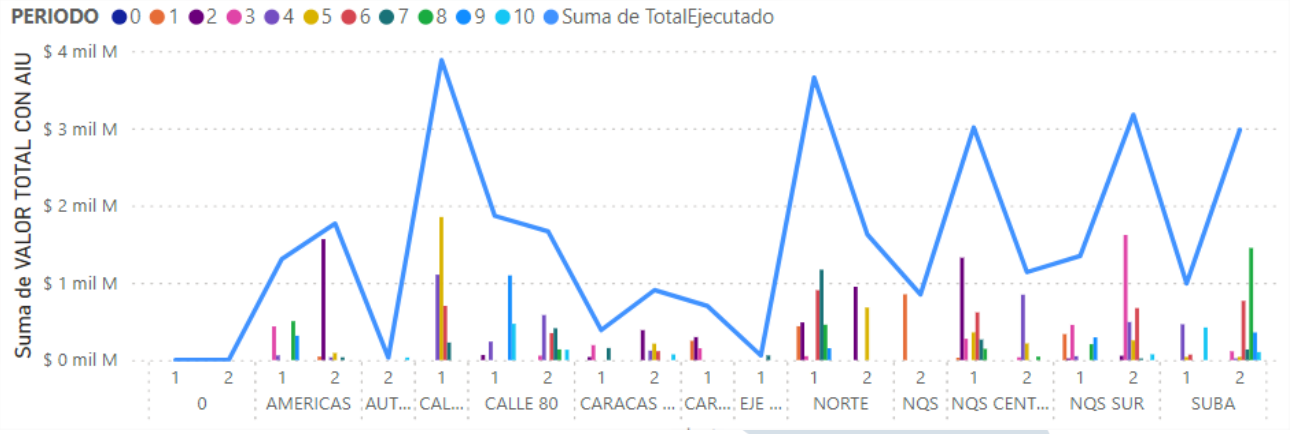


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 1

Entre los periodos 1 al 10, la inversión del valor del contrato de obra CTO2795-23 es el siguiente, con relación a los 12 ítems del presupuesto objeto de intervención.

Tabla 19. Resumen Programado Vs Ejecutado Lote 1

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	Suma de Valor Total Sin AIU	Suma de Valor Total Con AIU
11	1	1	NORTE	$ 355.678.839,51	$ 437.129.292
11	1	1	NQS SUR	$ 273.106.181,10	$ 335.647.498
11	1	1	CARRERA 10	$ 202.877.741,05	$ 249.336.744
11	1	1	NQS CENTRAL	$ 23.814.705,72	$ 29.268.273
12	1	2	NQS CENTRAL	$ 1.077.517.459	$ 1.324.268.958
12	1	2	NORTE	$ 396.332.731	$ 487.092.926
12	1	2	CARRERA 10	$ 241.258.022	$ 296.506.109
12	1	2	CALLE 80	$ 53.099.323	$ 65.259.068
12	1	2	CARACAS SUR	$ 31.214.503	$ 38.362.624
12	1	2	NQS SUR	$ 8.324.674	$ 10.231.024
13	1	3	NQS SUR	$ 369.746.789	$ 454.418.804
13	1	3	AMERICAS	$ 353.488.954	$ 434.437.924
13	1	3	NQS CENTRAL	$ 223.685.717	$ 274.909.746
13	1	3	CARACAS SUR	$ 156.480.779	$ 192.314.877
13	1	3	CARRERA 10	$ 123.662.058	$ 151.980.669
13	1	3	NORTE	$ 40.991.261	$ 50.378.260
14	1	4	CALLE 26	$ 898.822.144	$ 1.104.652.415
14	1	4	SUBA	$ 376.004.174	$ 462.109.130
14	1	4	CALLE 80	$ 193.630.892	$ 237.972.366
14	1	4	AMERICAS	$ 47.993.859	$ 58.984.453
14	1	4	NQS SUR	$ 40.362.241	$ 49.605.194
15	1	5	CALLE 26	$ 1.506.671.206	$ 1.851.698.912
15	1	5	NQS CENTRAL	$ 290.345.963	$ 356.835.189
15	1	5	SUBA	$ 31.812.535	$ 39.097.606
16	1	6	NORTE	$ 735.090.963	$ 903.426.794
16	1	6	CALLE 26	$ 570.333.978	$ 700.940.459
16	1	6	NQS CENTRAL	$ 501.633.933	$ 616.508.104


16	1	6	SUBA	$ 56.665.595	$ 69.642.016
17	1	7	NORTE	$ 951.698.582	$ 1.169.637.557
17	1	7	NQS CENTRAL	$ 215.001.025	$ 264.236.260
17	1	7	CALLE 26	$ 183.805.313	$ 225.896.730
17	1	7	CARACAS SUR	$ 126.705.931	$ 155.721.589
17	1	7	EJE AMBIENTAL	$ 47.740.442	$ 58.673.003
18	1	8	AMERICAS	$ 408.680.490	$ 502.268.322
18	1	8	NORTE	$ 371.777.532,32	$ 456.914.587
18	1	8	NQS SUR	$ 166.800.340	$ 204.997.618
18	1	8	NQS CENTRAL	$ 117.386.216,42	$ 144.267.660
19	1	9	CALLE 80	$ 890.783.439	$ 1.094.772.845
19	1	9	AMERICAS	$ 255.557.560	$ 314.080.241
19	1	9	NQS SUR	$ 238.730.414	$ 293.399.680
19	1	9	NORTE	$ 124.370.460	$ 152.851.296
110	1	10	CALLE 80	$ 381.411.113	$ 468.754.257
110	1	10	SUBA	$ 342.339.594	$ 420.735.361
TOTAL				$ 14.003.435.672,12	$ 17.210.222.439

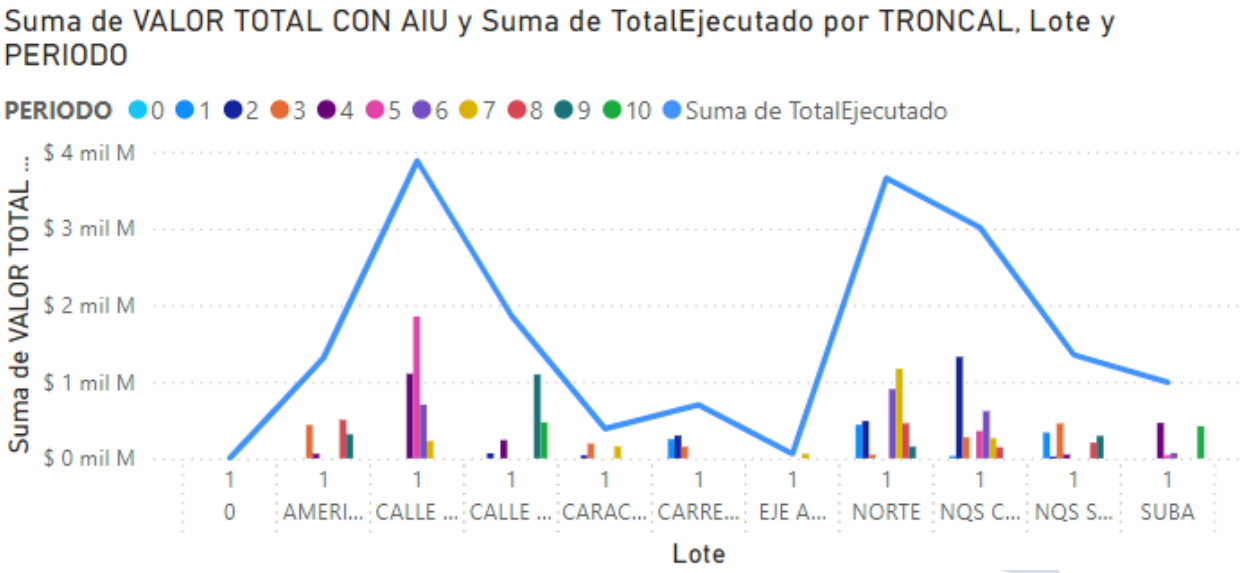

De lo anterior, se tiene la siguiente ejecución presupuestal por troncal del sistema por parte del contratista CONSORCIO SAN RAFAEL AM&CIA para el contrato 2795-23.

TRONCAL AMERICAS

Para la troncal AMERICAS se tiene una ejecución presupuestal de $ 1.309.770.941 correspondiente al 7,61% de la ejecución presupuestal del Lote 1.

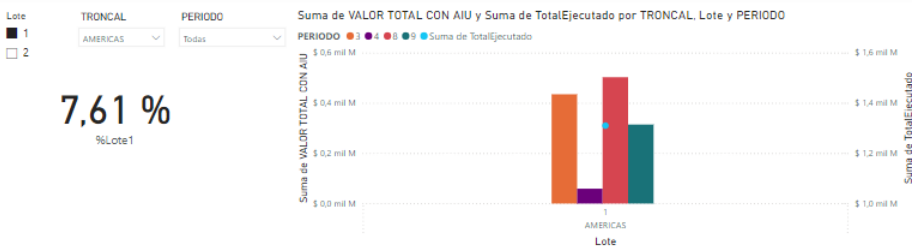

Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramado	Suma de TotalEjecutado
1	8,00	CSR L1-132	AMERICAS	TV. 86	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 43.506.045	$ 43.506.046
1	8,00	CSR L1-133	AMERICAS	MANDALAY	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	75,78	$ 108.891.083	$ 108.891.084
1	8,00	CSR L1-133	AMERICAS	MANDALAY	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	133,43	$ 6.187.500	$ 6.187.500
1	8,00	CSR L1-134	AMERICAS	MANDALAY	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,40	$ 667.766	$ 667.766
1	8,00	CSR L1-134	AMERICAS	MANDALAY	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 43.506.045	$ 43.506.046
1	8,00	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,69	$ 3.697.929	$ 3.697.928
1	8,00	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,54	$ 8.460.628	$ 8.460.628
1	8,00	CSR L1-135	AMERICAS	MANDALAY	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	42,06	$ 39.174.172	$ 39.174.172
1	8,00	CSR L1-136	AMERICAS	PRADERA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	23,87	$ 34.299.685	$ 34.299.685
1	8,00	CSR L1-136	AMERICAS	PRADERA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA	M2	52,65	$ 2.441.519	$ 2.441.519
Total									$ 1.309.770.939	$ 1.309.770.941

TRONCAL CALLE 26


Para la troncal CALLE 26 se tiene una ejecución presupuestal de $ 3.883.188.515 correspondiente al 22,55% de la ejecución presupuestal del Lote 1.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalPrograMado	Suma de TotalEjecutado
1	6,00	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,11	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,21	$ 5.982.074	$ 5.982.074
1	6,00	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,63	$ 3.687.800	$ 3.687.799
1	6,00	CSR L1-101	CALLE 26	NORMANDIA	1,90	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACION AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	37,10	$ 34.554.488	$ 34.554.488
1	6,00	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,11	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,90	$ 9.131.515	$ 9.131.516
1	6,00	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	5,70	$ 5.712.248	$ 5.712.248
1	6,00	CSR L1-102	CALLE 26	AV. ROJAS	1,90	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACION AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	50,20	$ 46.755.668	$ 46.755.668
1	6,00	CSR L1-108	CALLE 26	SAUTRE EL GRECO	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,60	$ 3.607.735	$ 3.607.736
1	6,00	CSR L1-108	CALLE 26	SAUTRE EL GRECO	1,11	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,70	$ 6.895.226	$ 6.895.226
1	6,00	CSR L1-108	CALLE 26	SAUTRE EL GRECO	1,90	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACION AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	33,40	$ 31.108.353	$ 31.108.353
1	6,00	CSR L1-104	CALLE 26	CIUDAD	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE	M2	3,50	$ 3.507.521	$ 3.507.521
Total									$ 3.883.188.512	$ 3.883.188.515

TRONCAL CALLE 80


Para la troncal CALLE 80 se tiene una ejecución presupuestal de $1.866.758.537 correspondiente al 10,84% de la ejecución presupuestal del Lote 1.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalPrograMado	Suma de TotalEjecutado
1	9,00	CSR L1-146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,60	$ 2.605.587	$ 2.605.587
1	9,00	CSR L1-146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,11	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,44	$ 12.001.420	$ 12.001.420
1	9,00	CSR L1-146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,90	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACION AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	31,30	$ 29.152.439	$ 29.152.439
1	9,00	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 1.773.803	$ 1.773.803
1	9,00	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,11	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	2,61	$ 4.863.929	$ 4.863.930
1	9,00	CSR L1-149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,90	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACION AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	14,95	$ 13.924.248	$ 13.924.248
1	9,00	CSR L1-153	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	192,74	$ 276.955.231	$ 276.955.231
1	9,00	CSR L1-153	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	365,63	$ 16.955.224	$ 16.955.224
1	9,00	CSR L1-154	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,10	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,40	$ 21.753.023	$ 21.753.022
1	9,00	CSR L1-154	CALLE 80	GRANJA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA	M2	14,40	$ 667.766	$ 667.766
Total									$ 1.866.758.535	$ 1.866.758.537

TRONCAL CARACAS SUR


Para la troncal CARACAS SUR se tiene una ejecución presupuestal de $386.399.091 correspondiente al 2,24% de la ejecución presupuestal del Lote 1.

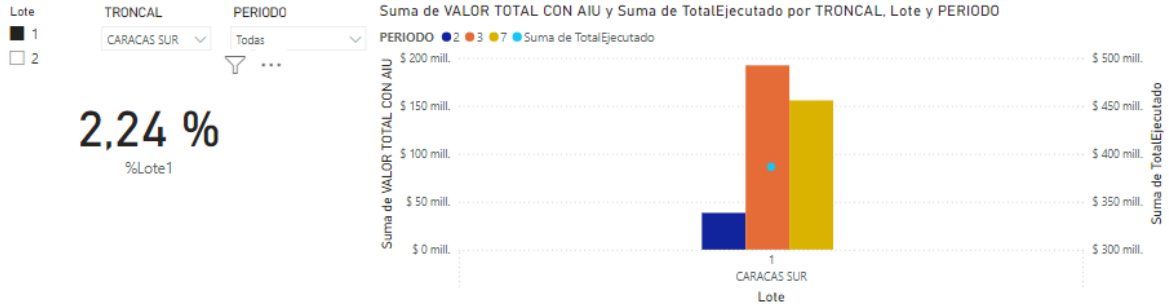

Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	7,00	CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	101,90	$ 146.423.877	$ 146.423.877
1	7,00	CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	200,50	$ 9.297.712	$ 9.297.712
1	2,00	CSR L1-28	CARACAS SUR	HORTUA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	25,00	$ 35.923.424	$ 35.923.424
1	2,00	CSR L1-28	CARACAS SUR	HORTUA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	52,60	$ 2.439.200	$ 2.439.200
1	3,00	CSR L1-35	CARACAS SUR	HORTUA	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	M2	139,00	$ 192.314.877	$ 192.314.877
Total									**$ 386.399.091**	**$ 386.399.091**

TRONCAL CARRERA 10


Para la troncal CARRERA 10 se tiene una ejecución presupuestal de $697.823.522 correspondiente al 4,05% de la ejecución presupuestal del Lote 1.

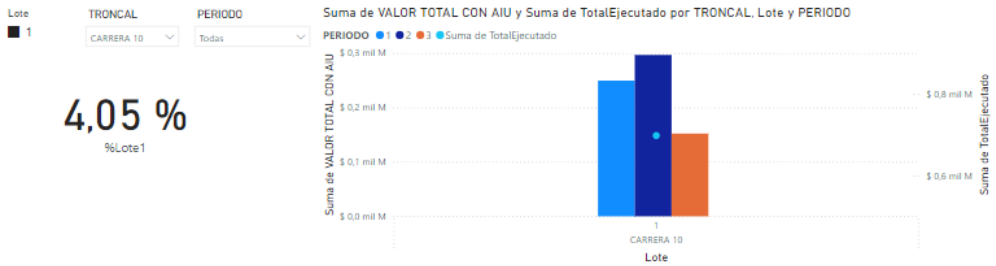

Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	1,00	CSR L1-16	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,40	$ 611.063	$ 611.062
1	1,00	CSR L1-16	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,10	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR	M2	28,80	$ 39.811.530	$ 39.811.530
1	1,00	CSR L1-17	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	128,30	$ 168.708.369	$ 168.708.370
1	1,00	CSR L1-17	CARRERA 10	AV. 1 MAYO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	238,20	$ 10.107.996	$ 10.107.997
1	2,00	CSR L1-18	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	118,31	$ 155.567.386	$ 155.567.387
1	2,00	CSR L1-18	CARRERA 10	SAN DIEGO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	230,50	$ 9.781.247	$ 9.781.247
1	1,00	CSR L1-13	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,55	$ 3.255.515	$ 3.255.515
1	1,00	CSR L1-13	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	31,50	$ 26.847.270	$ 26.847.270
1	2,00	CSR L1-30	CARRERA 10	COUNTRY SUR	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL 80.	M2	6,00	$ 11.181.447	$ 11.181.447
1	2,00	CSR L1-37	CARRERA 10	POLICARPA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE	M2	3,55	$ 3.557.628	$ 3.557.628
Total									**$ 697.823.524**	**$ 697.823.522**

TRONCAL EJE AMBIENTAL


Para la troncal EJE AMBIENTAL se tiene una ejecución presupuestal de $58.673.003 correspondiente al 0,34% de la ejecución presupuestal del Lote 1.

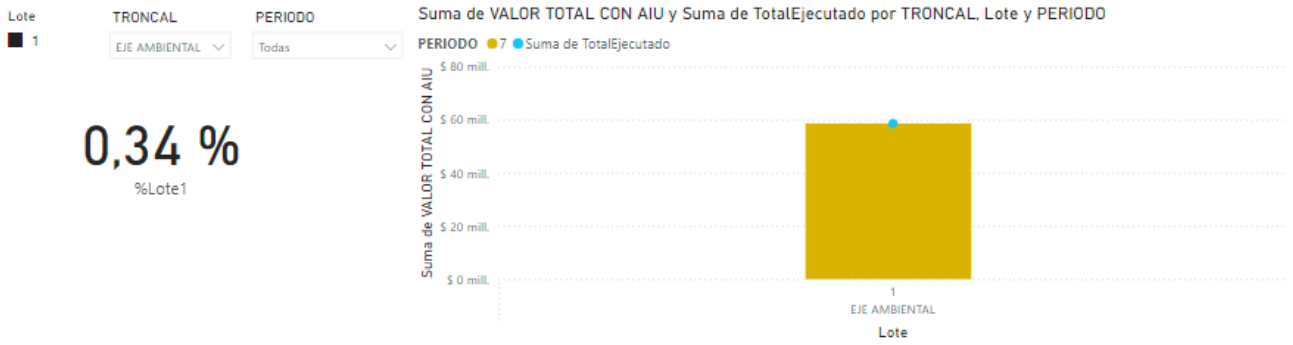

Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	7,00	CSR L1 115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	38,43	$ 55.221.488	$ 55.221.488
1	7,00	CSR L1 115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	74,43	$ 3.451.515	$ 3.451.515
Total									**$ 58.673.002**	**$ 58.673.003**

TRONCAL NORTE


Para la troncal NORTE se tiene una ejecución presupuestal de $3.657.430.712 correspondiente al 21,24% de la ejecución presupuestal del Lote 1.

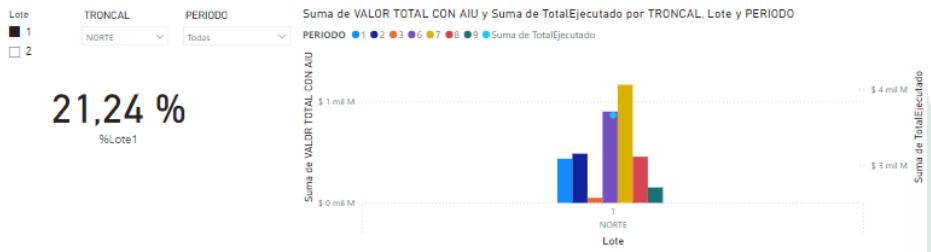

Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	7,00	CSR L1 117	NORTE	CALLE 142	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	144,98	$ 208.327.122	$ 208.327.121
1	7,00	CSR L1 117	NORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	274,70	$ 12.738.561	$ 12.738.560
1	7,00	CSR L1 118	NORTE	CALLE 142	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,40	$ 21.753.023	$ 21.753.022
1	7,00	CSR L1 118	NORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,40	$ 667.766	$ 667.766
1	8,00	CSR L1 119	NORTE	CALLE 142	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,80	$ 2.806.016	$ 2.806.016
1	8,00	CSR L1 119	NORTE	CALLE 142	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	9,09	$ 16.939.892	$ 16.939.892
1	8,00	CSR L1 119	NORTE	CALLE 142	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	43,58	$ 40.589.881	$ 40.589.881
1	7,00	CSR L1 121	NORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	227,34	$ 10.542.353	$ 10.542.353
1	7,00	CSR L1 121	NORTE	ALCALA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	400,30	$ 575.205.868	$ 575.205.869
1	8,00	CSR L1 121	NORTE	ALCALA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS	M2	172,96	$ 248.532.618	$ 248.532.618
Total									**$ 3.657.430.719**	**$ 3.657.430.712**

TRONCAL NQS CENTRAL


Para la troncal NQS CENTRAL se tiene una ejecución presupuestal de $3.010.294.189 correspondiente al 17,48% de la ejecución presupuestal del Lote 1.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramado	Suma de TotalEjecutado
1	2,00	CSR L1-1	NQS CENTRAL	TYGUA SAN JOSE	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	297,00	$ 376.022.522	$ 376.022.522
1	6,00	CSR L1-100	NQS CENTRAL	CASTELLANA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	41,21	$ 59.216.172	$ 59.216.172
1	6,00	CSR L1-100	NQS CENTRAL	CASTELLANA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	84,37	$ 3.912.459	$ 3.912.459
1	7,00	CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	151,64	$ 217.897.122	$ 217.897.122
1	7,00	CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	274,04	$ 12.707.955	$ 12.707.955
1	7,00	CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	21,60	$ 82.629.534	$ 82.629.535
1	7,00	CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	21,60	$ 1.001.649	$ 1.001.649
1	8,00	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,77	$ 3.778.101	$ 3.778.101
1	8,00	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,57	$ 12.243.684	$ 12.243.684
1	8,00	CSR L1-113	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL	M2	44,51	$ 41.456.072	$ 41.456.072
Total									$ 3.010.294.185	$ 3.010.294.189

TRONCAL NQS SUR


Para la troncal NQS SUR se tiene una ejecución presupuestal de $1.348.299.818 correspondiente al 7,83% de la ejecución presupuestal del Lote 1.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	1,00	CSR L1 10	NQS SUR	PERDOMO	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	17,42	$ 22.905.789	$ 22.905.789
1	1,00	CSR L1 10	NQS SUR	PERDOMO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	31,79	$ 1.349.006	$ 1.349.006
1	1,00	CSR L1 11	NQS SUR	COMUNEROS	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	153,70	$ 202.102.166	$ 202.102.166
1	1,00	CSR L1 11	NQS SUR	COMUNEROS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	250,60	$ 10.634.189	$ 10.634.189
1	1,00	CSR L1 12	NQS SUR	COMUNEROS	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 39.811.530	$ 39.811.530
1	1,00	CSR L1 12	NQS SUR	COMUNEROS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	28,80	$ 1.222.125	$ 1.222.125
1	8,00	CSR L1 120	NQS SUR	SAN MATEO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,59	$ 6.690.232	$ 6.690.232
1	8,00	CSR L1 120	NQS SUR	SAN MATEO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	5,35	$ 5.361.496	$ 5.361.495
1	8,00	CSR L1 120	NQS SUR	SAN MATEO	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	71,57	$ 66.659.426	$ 66.659.426
1	8,00	CSR L1 147	NQS SUR	LA DESPENSA	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS	M2	82,44	$ 118.461.084	$ 118.461.083
Total									$ 1.348.299.817	$ 1.348.299.818

TRONCAL SUBA

Para la troncal SUBA se tiene una ejecución presupuestal de $991.584.113 correspondiente al 5,76% de la ejecución presupuestal del Lote 1.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
1	10,00	CSR L1 168	SUBA	NIZA CALLE 127	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	110,39	$ 158.623.472	$ 158.623.472
1	10,00	CSR L1 168	SUBA	NIZA CALLE 127	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	211,28	$ 9.797.609	$ 9.797.609
1	10,00	CSR L1 169	SUBA	RIONEGRO	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	82,35	$ 118.331.759	$ 118.331.759
1	10,00	CSR L1 169	SUBA	RIONEGRO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 7.825.381	$ 7.825.381
1	10,00	CSR L1 170	SUBA	SUBA CALLE 95	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	82,35	$ 118.331.759	$ 118.331.759
1	10,00	CSR L1 170	SUBA	SUBA CALLE 95	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 7.825.381	$ 7.825.381
1	4,00	CSR L1 51	SUBA	NIZA CL 127	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M (1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	334,00	$ 462.109.130	$ 462.109.130
1	5,00	CSR L1 80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,60	$ 3.607.735	$ 3.607.736
1	5,00	CSR L1 80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,00	$ 9.317.872	$ 9.317.872
1	5,00	CSR L1 80	SUBA	NIZA CALLE	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL	M2	28,10	$ 26.171.998	$ 26.171.997
Total									$ 991.584.112	$ 991.584.113

Por consiguiente, se tiene una inversión total para el contrato de obra CTO2795-23 del 99,95%, el cual corresponde a $17.210.222.439


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 2

Entre los periodos 1 al 10, la inversión del valor del contrato de obra CTO2811-23 es el siguiente, con relación a las 12 actividades objeto de intervención.

Tabla 20. Resumen Programado Vs Ejecutado Lote 2

orden	Lote	PERIODO	TRONCAL	Suma de Valor Total Sin AIU	Suma de Valor Total Con AIU
21	2	1	NQS SUR	$ 691.899.157,20	$ 850.344.064
21	2	1	AMERICAS	$ 35.602.766	$ 43.755.799
22	2	2	AMERICAS	$ 1.267.675.652,20	$ 1.557.973.377
22	2	2	NORTE	$ 771.303.095,70	$ 947.931.505
22	2	2	CARACAS SUR	$ 314.518.203,54	$ 386.542.872
22	2	2	NQS SUR	$ 49.941.374,91	$ 61.377.950
23	2	3	NQS SUR	$ 1.317.357.495,84	$ 1.619.032.362
23	2	3	SUBA	$ 91.078.114	$ 111.935.002
23	2	3	CALLE 80	$ 45.630.541,20	$ 56.079.935
23	2	3	NQS CENTRAL	$ 28.213.359	$ 34.674.218
24	2	4	NQS CENTRAL	$ 687.996.949	$ 845.548.250
24	2	4	CALLE 80	$ 473.499.241	$ 581.930.567
24	2	4	NQS SUR	$ 400.303.812	$ 491.973.385
24	2	4	CARACAS SUR	$ 98.273.907	$ 120.778.632
24	2	4	AMERICAS	$ 27.683.083	$ 34.022.509
24	2	4	SUBA	$ 14.912.734	$ 18.327.750
25	2	5	NORTE	$ 552.556.426	$ 679.091.847,6
25	2	5	NQS SUR	$ 206.155.844	$ 253.365.532
25	2	5	NQS CENTRAL	$ 174.012.370	$ 213.861.203
25	2	5	CARACAS SUR	$ 172.340.200	$ 211.806.106
25	2	5	AMERICAS	$ 73.714.421	$ 90.595.023
25	2	5	SUBA	$ 32.755.635	$ 40.256.675
26	2	6	SUBA	$ 623.089.349	$ 765.776.810

26	2	6	NQS SUR	$ 546.810.010	$ 672.029.502
26	2	6	CALLE 80	$ 283.843.341	$ 348.843.466
26	2	6	CARACAS SUR	$ 92.300.271	$ 113.437.033
27	2	7	CALLE 80	$ 333.971.562	$ 410.451.050
27	2	7	SUBA	$ 110.593.608	$ 135.919.544
27	2	7	AMERICAS	$ 27.878.020	$ 34.262.087
27	2	7	NQS SUR	$ 9.105.795	$ 11.191.022
28	2	8	SUBA	$ 1.180.493.754	$ 1.450.826.824
28	2	8	CALLE 80	$ 111.324.105	$ 136.817.325
28	2	8	NQS CENTRAL	$ 35.223.955	$ 43.290.241
29	2	9	SUBA	$ 289.436.853,09	$ 355.717.893
210	2	10	CALLE 80	$ 107.851.522	$ 132.549.521
210	2	10	SUBA	$ 83.925.680	$ 103.144.661
210	2	10	NQS SUR	$ 59.555.361	$ 73.193.539
210	2	10	CARACAS SUR	$ 58.798.770	$ 72.263.688
210	2	10	NORTE	$ 25.729.208	$ 31.621.197
TOTAL				$ 11.507.355.546	$ 14.142.539.966

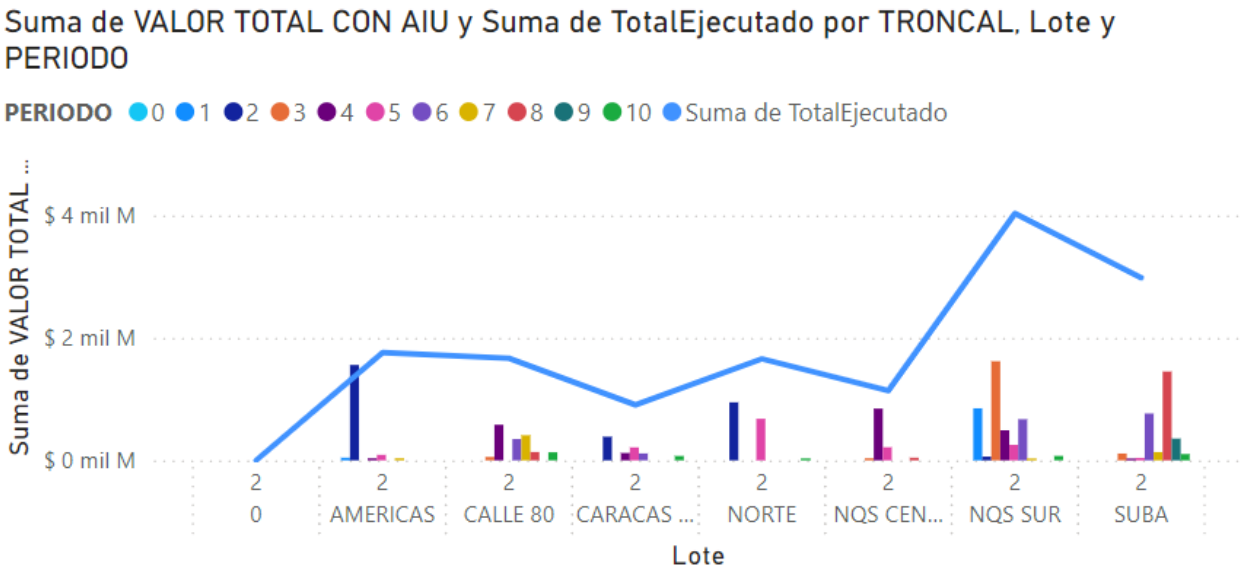

De lo anterior, se tiene la siguiente ejecución presupuestal por troncal del sistema por parte del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024 para el contrato 2811-23:

TRONCAL AMERICAS


Para la troncal AMERICAS se tiene una ejecución presupuestal de $ 1.760.608.795 correspondiente al 12,45% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramado	Suma de TotalEjecutado
2	2,00	CMTTO_L2_003	AMERICAS	Cra. 43 COMAPAN	1,50	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M. 1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	329,50	$ 415.100.850	$ 415.100.850
2	2,00	CMTTO_L2_004	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,50	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M. 1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	303,50	$ 382.346.307	$ 382.346.307
2	1,00	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,10	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSIA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,40	$ 19.807.080	$ 19.807.080
2	1,00	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACION.	M2	17,28	$ 22.609.017	$ 22.609.017
2	1,00	CMTTO_L2_013	AMERICAS	De la sabana	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	31,73	$ 1.339.752	$ 1.339.753
2	2,00	CMTTO_L2_026	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACION.	M2	111,02	$ 158.737.642	$ 158.737.642
2	2,00	CMTTO_L2_026	AMERICAS	CDS Carrera 32	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 9.084.353	$ 9.084.354
2	2,00	CMTTO_L2_027	AMERICAS	Zona Industrial	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACION.	M2	111,02	$ 158.737.642	$ 158.737.642
2	2,00	CMTTO_L2_027	AMERICAS	Zona Industrial	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 9.084.353	$ 9.084.354
2	2,00	CMTTO_L2_0	AMERICAS	Puente Aranda	1,40	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS	M2	111,02	$ 158.737.642	$ 158.737.642
Total									$ 1.760.608.793	$ 1.760.608.795

TRONCAL CALLE 80


Para la troncal CALLE 80 se tiene una ejecución presupuestal de $ 1.666.671.864 correspondiente al 11,78% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
2	3,00	CMMTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,06	$ 2.054.188	$ 2.054.188
2	3,00	CMTTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,25	$ 9.735.245	$ 9.735.246
2	3,00	CMTTO_L2_040	CALLE 80	Boyacá	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	18,66	$ 17.293.491	$ 17.293.491
2	3,00	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,06	$ 2.054.188	$ 2.054.188
2	3,00	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,39	$ 8.140.519	$ 8.140.519
2	3,00	CMTTO_L2_049	CALLE 80	Minuto de Dios	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	18,13	$ 16.802.304	$ 16.802.304
2	4,00	CMTTO_L2_055	CALLE 80	Boyacá	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M 1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	422,70	$ 581.990.567	$ 581.990.567
2	6,00	CMTTO_L2_087	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 1.765.006	$ 1.765.006
2	6,00	CMTTO_L2_087	CALLE 80	Av. Ciudad de Cali	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,86	$ 10.866.388	$ 10.866.388
2	6,00	CMTTO_L2_0	CALLE 80	Av. Ciudad de	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL	M2	18,34	$ 16.996.925	$ 16.996.925
Total									$ 1.666.671.862	$ 1.666.671.864

TRONCAL CARACAS SUR


Para la troncal CARACAS SUR se tiene una ejecución presupuestal de $ 904.828.331 correspondiente al 6,40% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
2	2,00	CMTTO_L2_022	CARACAS SUR	Consuelo	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	83,65	$ 119.603.709	$ 119.603.709
2	2,00	CMTTO_L2_022	CARACAS SUR	Consuelo	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 7.786.391	$ 7.786.391
2	2,00	CMTTO_L2_023	CARACAS SUR	Socorro	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	34,65	$ 49.542.959	$ 49.542.959
2	2,00	CMTTO_L2_023	CARACAS SUR	Socorro	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 7.786.391	$ 7.786.391
2	2,00	CMTTO_L2_024	CARACAS SUR	Quiroga	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	83,48	$ 119.360.641	$ 119.360.641
2	2,00	CMTTO_L2_024	CARACAS SUR	Quiroga	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 7.786.391	$ 7.786.391
2	2,00	CMTTO_L2_025	CARACAS SUR	Fucha	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	48,83	$ 69.817.682	$ 69.817.682
2	2,00	CMTTO_L2_025	CARACAS SUR	Fucha	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	105,30	$ 4.858.708	$ 4.858.708
2	4,00	CMTTO_L2_059	CARACAS SUR	Socorro	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	0,29	$ 289.182	$ 289.181
2	4,00	CMTTO_L2_0	CARACAS SUR	Socorro	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO	M2	0,81	$ 1.502.009	$ 1.502.009
Total									$ 904.828.333	$ 904.828.331

TRONCAL NORTE


Para la troncal NORTE se tiene una ejecución presupuestal de $ 1.658.644.549 correspondiente al 11,73% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
2	2,00	CMTTO_L2_001	NORTE	Pepe Sierra	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M: 1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	294,20	$ 370.630.258	$ 370.630.258
2	2,00	CMTTO_L2_002	NORTE	Calle 127	1,50	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M: 1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	296,10	$ 373.023.860	$ 373.023.860
2	2,00	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	71,33	$ 98.113.573	$ 98.113.573
2	2,00	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	76,37	$ 99.921.910	$ 99.921.910
2	2,00	CMTTO_L2_014	NORTE	Virrey	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	147,88	$ 6.241.904	$ 6.241.904
2	5,00	CMTTO_L2_070	NORTE	Calle 127	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	119,16	$ 170.376.306	$ 170.376.306
2	5,00	CMTTO_L2_070	NORTE	Calle 127	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	205,56	$ 9.484.863	$ 9.484.863
2	5,00	CMTTO_L2_071	NORTE	Virrey	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	153,77	$ 219.862.072	$ 219.862.072
2	5,00	CMTTO_L2_071	NORTE	Virrey	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	297,77	$ 13.739.577	$ 13.739.577
2	5,00	CMTTO_L2_070	NORTE	Pepe Sierra	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	119,16	$ 170.376.306	$ 170.376.306
Total									$ 1.658.644.547	$ 1.658.644.549

TRONCAL NQS CENTRAL


Para la troncal NQS CENTRAL se tiene una ejecución presupuestal de $ 1.137.373.912 correspondiente al 8,04% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramdo	Suma de TotalEjecutado
2	3,00	CMMTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,06	$ 2.054.188	$ 2.054.188
2	3,00	CMTTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	8,87	$ 16.447.928	$ 16.447.929
2	3,00	CMTTO_L2_042	NQS CENTRAL	Av. El Dorado	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	17,45	$ 16.172.102	$ 16.172.102
2	4,00	CMTTO_L2_050	NQS CENTRAL	CAD	1,30	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	54,45	$ 78.423.573	$ 78.423.573
2	4,00	CMTTO_L2_051	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	153,72	$ 219.790.582	$ 219.790.582
2	4,00	CMTTO_L2_051	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,85	$ 12.312.880	$ 12.312.879
2	4,00	CMTTO_L2_052	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	153,72	$ 219.790.582	$ 219.790.582
2	4,00	CMTTO_L2_052	NQS CENTRAL	Ricaurte	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,85	$ 12.312.880	$ 12.312.879
2	4,00	CMTTO_L2_053	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 43.290.241	$ 43.290.241
2	4,00	CMTTO_L2_053	NQS CENTRAL	U. Nacional	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA	M2	28,80	$ 1.328.877	$ 1.328.877
Total									$ 1.137.373.911	$ 1.137.373.912

TRONCAL NQS SUR


Para la troncal NQS SUR se tiene una ejecución presupuestal de $ 4.032.507.356 correspondiente al 28,51% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramado	Suma de TotalEjecutado
2	3,00	CMMTO_L2_041	NQS SUR	NQS Sur CL 80	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 1.765.006	$ 1.765.006
2	1,00	CMTTO_L2_005	NQS SUR	Venecia	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	93,80	$ 122.727.186	$ 122.727.185
2	1,00	CMTTO_L2_005	NQS SUR	Venecia	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	163,40	$ 6.899.324	$ 6.899.324
2	1,00	CMTTO_L2_006	NQS SUR	NQS Sur CL 38A	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 145.257.699	$ 145.257.699
2	1,00	CMTTO_L2_006	NQS SUR	NQS Sur CL 38A	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 8.312.967	$ 8.312.967
2	1,00	CMTTO_L2_007	NQS SUR	NQS Sur CL 80	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 145.257.699	$ 145.257.699
2	1,00	CMTTO_L2_007	NQS SUR	NQS Sur CL 80	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 8.312.967	$ 8.312.967
2	1,00	CMTTO_L2_008	NQS SUR	Santa Isabel	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	152,82	$ 199.948.492	$ 199.948.492
2	1,00	CMTTO_L2_008	NQS SUR	Santa Isabel	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,85	$ 11.267.347	$ 11.267.347
2	1,00	CMTTO_L2_0	NQS SUR	Venecia	1,10	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN	M2	14,40	$ 19.807.080	$ 19.807.080
Total									$ 4.032.507.357	$ 4.032.507.356

TRONCAL SUBA

Para la troncal SUBA se tiene una ejecución presupuestal de $ 2.981.905.159 correspondiente al 21,08% de la ejecución presupuestal del Lote 2.



Lote	PERIODO	ORDEN TRABAJO	TRONCAL	ESTACIÓN	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Suma de TotalProgramado	Suma de TotalEjecutado
2	3,00	CMMTO_L2_043	SUBA	Suba TV 91	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,06	$ 2.054.188	$ 2.054.188
2	3,00	CMTTO_L2_043	SUBA	Suba TV 91	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	10,82	$ 19.136.710	$ 19.136.711
2	3,00	CMTTO_L2_043	SUBA	Suba TV 91	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	22,58	$ 20.926.422	$ 20.926.422
2	3,00	CMTTO_L2_044	SUBA	Gratamira	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	0,00	$ 0	$ 0
2	3,00	CMTTO_L2_044	SUBA	Gratamira	1,40	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	48,88	$ 69.817.682	$ 69.817.682
2	4,00	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,49	$ 1.485.796	$ 1.485.796
2	4,00	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,24	$ 6.008.037	$ 6.008.037
2	4,00	CMTTO_L2_058	SUBA	La Campiña	1,90	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	11,69	$ 10.833.918	$ 10.833.918
2	5,00	CMTTO_L2_082	SUBA	21 Ángeles	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,78	$ 1.774.978	$ 1.774.978
2	5,00	CMTTO_L2_0	SUBA	21 Ángeles	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO	M2	5,11	$ 9.475.639	$ 9.475.639
Total									$ 2.981.905.159	$ 2.981.905.159

Por consiguiente, se tiene una inversión total para el contrato de obra CTO2811-23 del 99,99%, el cual corresponde a $14.142.539.966

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el desarrollo del presente contrato se realizaron acompañamientos a la ejecución y revisión a cada de las actividades de adecuación adelantadas por los contratistas del Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024). Los cuales cumplieron con los términos indicados en los Contratos Principales y sus anexos.

- Durante el contrato, los contratistas no presentaron atrasos en la ejecución de las actividades; de acuerdo con los requerimientos establecidos en los documentos de este.

- Los Contratistas del Lote 1 y Lote 2 cumplieron con las obligaciones emanadas del acuerdo de voluntades suscritos con la Entidad; las inversiones totales de los contratos se encuentran en el 99,95% del valor total del contrato de obra para el CTO2795-23 – Lote 1, y en el 99,99% del valor total del contrato de obra para el CTO2811-23 – Lote 2.

- A la fecha del presente cierre del contrato de obra CTO2795-23, el contratista correspondiente al lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) logro ejecutar y facturar un valor de $17.210.222.439 del valor total del contrato ($17.219.238.957); por lo cual, se evidencia un valor remanente por $9.016.518

- Al presente cierre del contrato de obra CTO2811-23, el contratista de lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024) logro ejecutar y facturar un valor de $14.142.539.966 del valor total del contrato ($14.144.374.858); por lo cual, se evidencia un valor remanente por $1.834.892
