Certificado
Bancario

Viernes, 14 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MACANA PROYECTOS SAS identificado(a) con NIT 900866458, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61246586058	2015/08/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/02/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/02/2024 Fecha de Pago: 06/02/2024

Proveedor: 900866458 - 0 MACANA PROYECTOS SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_002 PAGO SUMINISTRO MATERIALES-131417

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_454504	05/02/2024	63,256,259.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
63,256,259.00	0.00	0	63,256,259.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		63,256,259.00	0.00	0.00
	Totales		63,256,259.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 63,256,259.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202402

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900866458 - 0	MACANA PROYECTOS SAS		63,256,259.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900866458 - 0	MACANA PROYECTOS SAS	63,256,259.00	
						63,256,259.00	63,256,259.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #511235 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_454504 del 05/02/2024 15:09:34, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	8
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CC - 61246586058
Nro. Doc. Tercero:	900866458
Nombre Tercero:	MACANA PROYECTOS SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$63,256,259.00
Observaciones:	OP_454504-DES:PAGO FVN FE388

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/02/2024 09:05:48.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

MACANA PROYECTOS S.A.S

NIT 900866458-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764063161812
Fecha 02/01/2024 - 02/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE379 al FE1000
Email: macanaproyectos@gmail.com
Teléfono: 62188994

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	01	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FE389

Cliente: CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
NIT: 901722718
Fecha de firmado:
Dirección: CR 16 9664 OF 407
Departamento: Bogotá
Teléfono: 6016210189
Email: contabilidad@proinark.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: Enero 30 del 2024
Hora emisión: 13:35:56
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	COC-01	1,00	CONTRATO OBRA CIVIL	CE	$56.005.000,00	$56.005.000,00
2	AIU1	1,00	ADMINISTRACION Contrato de servicios por AUI por concepto de Obra civil 4%	EA	$2.240.500,00	$2.240.500,00
3	AIU2	1,00	IMPREVISTOS 3 %	EA	$1.680.150,00	$1.680.150,00
4	AIU3	1,00	UTILIDAD 5%	EA	$2.800.250,00	$2.800.250,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			19,00	$532.047,50

SON: (SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS)
CUFE:

NOTAS:
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y HIERRO FIGURADO PARA LA CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES ,BAÑOS Y ALAMACENES PARA EL COLISEO DE CAFE, PISTA DE ATLETISMO Y COLISEO DE GIMNASIA

SUBTOTAL:	$62.725.900,00
TOTAL OPERACION:	$62.725.900,00
CARGOS GLOBALES:	$532.047,50
TOTAL:	$63.257.947,50

Factura 209
Mes de Obra
2-2-24

Firma Digital:
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14864292828

(415)7707212489984(8020) 000001486429282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 6 4 5 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MACANA PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 92 15 62 OF 502

42. Correo electrónico macanaproyectos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 2 1 8 8 9 4	3 2 0 4 4 9 9 3 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 5 0 7 1 5	6 8 1 0	2 0 2 2 0 8 0 1		4 1 1 2	6 8 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 15 / 01 : 19: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864292828

(415)7707212489984(8020) **000001486429282 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 6 4 5 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 9 1 0 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 7 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864292828

(415)7707212489984(8020) **000001486429282 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 6 4 5 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 5 9 7 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARAVITO	MATAMOROS	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 6 9 4 5 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	SALAZAR	PAULA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864292828

(415)7707212489984(8020) **000001486429282 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 6 4 5 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 1 3 2 7 2		1 6 4 4 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TELLEZ	PARDO	HIMER	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MACANA PROYECTOS S A S
N.I.T. : 900866458 0 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02591093 DEL 9 DE JULIO DE 2015

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 2,564,485,818

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 92 NO. 15 62 OF 502
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : MACANAPROYECTOS@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CL 92 NO. 15 62 OF 502
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : MACANAPROYECTOS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ACTA NO. 001 DE ACCIONISTA UNICO DEL 7 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01955114 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MACANA PROYECTOS S A S.

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL LA EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE CONSULTORÍA, ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LÍCITA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO POR SÍ, O POR INTERMEDIO DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS, CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA. LA SOCIEDAD PODRÁ ACTUAR COMO INVERSIONISTA DE CAPITAL EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CIVILES, NACIONALES O EXTRANJERAS, Y PODRÁ ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO Y PODRÁ FABRICAR, VENDER, ENAJENAR, COMERCIALIZAR, FABRICAR Y/O DISTRIBUIR BIENES Y PRESTAR CUALQUIER TIPO DE SERVICIOS, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO. LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ POSEER Y ADMINISTRAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES SOBRE LOS MISMOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6820 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)
OTRAS ACTIVIDADES:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $200,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 200,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SERÁ EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. SI LA ASAMBLEA LO DESEA, PUEDE HABER ADICIONALMENTE HASTA TRES (3) SUPLENTE(S) DEL GERENTE GENERAL QUE LO REEMPLAZARÁ(N) EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOMENTO EN QUE SEAN NOMBRADOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 001 DE ACCIONISTA UNICO DEL 7 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01955114 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
GARAVITO MATAMOROS CARLOS ALBERTO	C.C. 000000079159705
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	

RAMIREZ SALAZAR PAULA C.C. 000000039694505

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA. EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES TENDRÁN PLENAS FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA Y/O ACTUACIÓN, EN CUALQUIER ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, SIN QUE SEA NECESARIA LA APROBACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA NINGÚN ACTO. POR LO TANTO, EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN ADELANTAR CUALQUIER ACTO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, YA SEA ANTE ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS O EN DESARROLLO DE ACTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. LA ASAMBLEA PODRÁ ESTABLECER LÍMITES EN LA ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, TANTO PRINCIPAL COMO SUPLENTE Y/O DE MANERA INDEPENDIENTE, CUANDO ASÍ LO DECIDA EN UNA DE SUS REUNIONES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE MAYO DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $495,169,019

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6820

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Certificado
Bancario

Viernes, 14 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MACANA PROYECTOS SAS identificado(a) con NIT 900866458, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61246586058	2015/08/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/02/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/02/2024 Fecha de Pago: 06/02/2024

Proveedor: 900866458 - 0 MACANA PROYECTOS SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PAGO MANO DE OBRA-131417

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_454504	05/02/2024	63,257,947.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
63,257,947.50	0.00	0	63,257,947.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		63,257,947.50	0.00	0.00
	Totales		63,257,947.50	0.00	0.00

Valor a Girar: 63,257,947.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202402

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900866458 - 0	MACANA PROYECTOS SAS		63,257,947.50
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900866458 - 0	MACANA PROYECTOS SAS	63,257,947.50	
						63,257,947.50	63,257,947.50

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #511235 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_454504 del 05/02/2024 15:09:34, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	7
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CC - 61246586058
Nro. Doc. Tercero:	900866458
Nombre Tercero:	MACANA PROYECTOS SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$63,257,947.50
Observaciones:	OP_454504-DES:PAGO FVN FE389

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/02/2024 09:05:45.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

INGENIERIA TECNICA EN CONTRUCCION SAS
NIT 901.239.413-4
CL 78C No. 130 -55
Tel: (031) 6332438
Bogotá - Colombia
ingetecfmt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 177

Señores	Consorcio Megaconstrucciones Zipa		
NIT	901.722.718-6	**Teléfono**	(601) 6210189 - Ext. 000
Dirección	Cr 16 96 64 Of 407	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024, 08:02
Expedición	28/06/2024, 08:02
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato CMZ-007-2024 MO Cimentacion y Estructura Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artista No. 5	1.00	45,461,936.72

2% 1 011.620
CGP 349.008
Fiducia 35.622.336
Ret 5.088.133
Amort 2.544.066
6.266.167

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta millones ochocientos ochenta y un mil trescientos treinta pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:

Otros	$	5,088,133.00
Otros	$	2,544,066.00
Transferencia	$	43,249,131.16

Total Bruto	45,161,612.00
Administración 4.50%	2,032,272.54
Imprevistos 4.00%	1,806,464.48
Utilidad 3.50%	1,580,656.42
IVA 19%	300,324.72
Total a Pagar	50,881,330.16

Observaciones:
Retencion de Garantias 10% $5.088.133
Amortizacion Anticipo 5% $ 2.544.066
Condiciones de Pago Contado

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072272890 aprobado en 20240603 prefijo desde el número 173 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 6,9 po mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0a315b912d4a5d1231febf13fb17b6f0f8e6ebed5afd77ba6a70aa2232e8d2e3552bf060b2d46424161133eda75b29e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1089699766 73 Daviana Correa

CMCZ NIT 901.722.718-6	**ACTA PARCIAL DE OBRA 5** CONSORCIOMEGACONTRUCCIONES ZIPA Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-022 Fecha: 18/02/2015 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATISTA: INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901239413-4

ORDEN DE TRABAJO CONTRATO

ZIPAQUIRA, 15 DE junio 2024 — CORTE DE OBRA 2

FECHA DE INICIO		17/04/2024
PLAZO CONTRACTUAL		NA
VALOR INICIAL CONTRATO	$	781.902.547,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	781.902.547,00
VALOR OBRA EJECUTADA		NA

Ítem	Actividad	Obra Contratada				BALANCE		ACTA 5		ACUMULADO	
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
	CIMENTACION										$ 0,00
2.1.9NP	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN F'c 28 Mpa	M2	2.975,52	$ 56.911	169.339.223,19	2.975,52	169.339.223,19	450,15	$ 25.618.513	2.151,33	$ 122.433.963,24
2.1.10	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	111,94	$ 91.996	10.298.249,04	111,94	10.298.249,04	10,35	$ 952.157	37,56	$ 3.455.146,98
	ELEMENTOS ESPECIALES EN CONCRETO			$ 0	-	-	-				$ 0,00
2.6.1	CONCRETO PARA GRADERIAS DE F'c 28 Mpa	M3	23,01	$ 226.451	5.210.959,14	23,01	5.210.959,14	59,05	$ 13.371.943	59,05	$ 13.371.943,36
	ACERO DE REFUERZO (MANEJO)			$ 0	-	-	-				$ 0,00
3.1.1	ACERO DE REFUERZO DE 60.000PSI	KILOS	335.494,89	$ 221	74.257.390,44	335.494,89	74.257.390,44	2.549,46	$ 564.289	54.547,52	$ 12.073.377,05
	NO PREVISTOS				-	-	-				$ 0,00
2,1,5	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	m3	75,94	$ 271.015	20.580.879,10	75,94	20.580.879,10	3,04	$ 824.275	11,77	$ 3.189.972,57
2,2,1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	134,48	$ 50.074,46	6.734.013,11	134,48	6.734.013,11	76,49	$ 3.830.436	137,29	$ 6.874.962,70
COSTO DIRECTO					$ 723.804.602,34		$ 721.321.502,34		$ 45.161.612,22		$ 162.614.085,42
ADMINISTRACION				4,5%	$ 32.571.207		$ 32.459.468		$ 2.032.773,00		$ 7.317.634
IMPREVISTOS				4%	$ 28.952.186		$ 28.852.860		$ 1.806.464,00		$ 6.504.563
UTILIDADES				3,5%	$ 25.333.161		$ 25.246.253		$ 1.580.656,00		$ 5.691.492
IVA				19%	$ 4.813.301		$ 4.796.788		$ 300.325,00		$ 1.081.384
VALOR TOTAL					$ 781.902.547		$ 781.902.547		$ 50.881.330,22		$ 183.209.159,34

Obra contratada Incluido Adicional	$	781.902.547,30
Valor presente acta	$	50.881.330,22
Valor pagado actas	$	33.930.884,64
Saldo del Contrato	$	697.090.332,44
Anticipo Recibido	$	11.759.007,00
Anticipo Proveedores		
Total anticipo	$	11.759.007,00
Retencion Garantía Anterior	$	13.232.782,92
Retencion Garantía (10%) presente corte	$	5.088.133,02
Total Retegarantía	$	18.320.915,94
Amortizacion anticipo anterior	$	6.616.391,46
Amortizacion Anticipo Presente (5%)	$	2.544.066,51
Amortización Anticipo acumulado	$	9.160.457,97
Saldo Amortización Anticipo	$	2.598.549,03
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	43.249.131

INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FRED AHANGO P.
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
CONTRATANTE

JAIME MADERO
8

CMCZ NIT 901.722.718-6	ACTA PARCIAL DE OBRA 5 CONSORCIOMEGACONTRUCCIONES ZIPA Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-022 Fecha: 18/02/2015 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATISTA: INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901239413-4
ORDEN DE TRABAJO CONTRATO

ZIPAQUIRA, 16 DE Junio 2024 — CORTE DE OBRA 2

FECHA DE INICIO	17/04/2024	
PLAZO CONTRACTUAL		NA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 781.902.547,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 781.902.547,00	NA
VALOR OBRA EJECUTADA		NA

Item	Actividad	Obra Contratada				BALANCE		ACTA 5		ACUMULADO	
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
	CIMENTACION										$ 0,00
2.1.9NP	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN Fc 28 Mpa	M2	2.975,52	$ 56.911	169.339.223,19	2.975,52	169.339.223,19	450,15	$ 25.618.513	2.151,33	$ 122.433.983,24
2.1.10	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	111,94	$ 91.996	10.298.249,04	111,94	10.298.249,04	10,35	$ 952.157	37,56	$ 3.455.146,50
	ELEMENTOS ESPECIALES EN CONCRETO			$ 0	-	-	-				$ 0,00
2.6.1	CONCRETO PARA GRADERIAS DE Fc 28 Mpa	M3	23,01	$ 226.451	5.210.959,14	23,01	5.210.959,14	59,05	$ 13.371.943	59,05	$ 13.371.943,26
	ACERO DE REFUERZO (MANEJO)			$ 0	-	-	-				$ 0,00
3.1.1	ACERO DE REFUERZO DE 60.000PSI	KLOS	335.494,89	$ 221	74.257.390,44	335.494,89	74.257.390,44	2.549,46	$ 564.289	54.547,52	$ 12.073.377,08
	NO PREVISTOS				-	-	-				$ 0,00
2.1.5	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	m3	75,04	$ 271.015	20.580.879,10	75,04	20.580.879,10	3,04	$ 824.275	11,77	$ 3.189.972,57
2.2.1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	134,48	$ 50.074,45	6.734.013,11	134,48	6.734.013,11	76,49	$ 3.830.436	137,29	$ 6.874.962,70
COSTO DIRECTO					$ 723.894.602,34		$ 721.323.559,34		$ 45.161.612,27		$ 162.414.085,47
ADMINISTRACION				4,5%	$ 32.575.257,11		$ 32.454.460,17		$ 2.032.327,55		$ 7.308.633,84
IMPREVISTOS				4%	$ 28.955.784,09		$ 28.847.582,37		$ 1.806.464,09		$ 6.496.541,51
UTILIDADES				3,5%	$ 25.326.311,61		$ 25.232.259,71		$ 1.580.656,08		$ 5.684.473,32
IVA				19%	$ 4.813.301		$ 4.796.788		$ 300.429,00		$ 1.081.194
VALOR TOTAL					$ 781.902.547		$ 781.902.547		$ 50.881.330,27		$ 183.209.158,34

Obra contratada incluida Adicional	$ 781.902.547,30
Valor pendiente acta	$ 581.192,27
Valor pagado actas	$ 33.990.884,64
Saldo del Contrato	$ 697.092.317,44
Anticipo Recibido	$ 11.739.007,00
Anticipo Proveedores	
Total anticipo	$ 11.758.007,00
Retencion Garantia Anterior	$ 13.233.782,57
Retencion Garantia (10%) presente corte	$ 5.088.133,07
Total Retegarantia	$ 18.320.915,64
Amortizacion anticipo anterior	$ 8.819.991,66
Amortizacion Anticipo Presente (5%)	$ 2.544.066,51
Amortización Anticipo acumulado	$ 9.160.457,97
Saldo Amortización Anticipo	$ 2.598.549,03
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 43.249.133

INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FREC MANGO P.
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
CONTRATANTE

JAIME MADERO
a

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGETEC-FMT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 78 C 130 55 TO 2 AP 1409

42. Correo electrónico ingetecfmt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 8 1 4 9 8 2	3 1 0 6 1 7 1 9 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 8 1 2 1 7	4 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 7	4 3 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 01 : 49: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA BARBOSA JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 3 4 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 1 2 1 9		-
2	8 1	2 0 2 1 0 5 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS** con NIT **901.239.413-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969976613

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #587922 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_506486 del 28/06/2024 07:36:38, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	65
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CC - 108969976613
Nro. Doc. Tercero:	901239413
Nombre Tercero:	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$35,622,336.60
Observaciones:	OP_506486-DES:PAGO CORTE 5

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 28/06/2024 14:19:36.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 65

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 28/06/2024 Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2024 Fecha de Pago: 28/06/2024

Proveedor: 901239413 - 4 INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PAGO MANO DE OBRA-8939965

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	245864	28/06/2024	35,622,336.60

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
35,622,336.60	0.00	0	35,622,336.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		35,622,336.60	0.00	0.00
	Totales		35,622,336.60	0.00	0.00

Valor a Girar: 35,622,336.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 65 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS		35,622,336.60
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS	35,622,336.60	
						35,622,336.60	35,622,336.60

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

INGENIERIA TECNICA EN CONTRUCCION SAS
NIT 901.239.413-4
CL 78C No. 130 -55
Tel: (031) 6332438
Bogotá - Colombia
ingetecfmt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 175

Señores	Consorcio Megaconstrucciones Zipa		
NIT	901.722.718-6	**Teléfono**	(601) 6210189 - Ext. 000
Dirección	Cr 16 96 64 Of 407	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2024, 15:16
Expedición	13/06/2024, 15:16
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato CMZ-007-2024 MO Cimentacion y Estructura Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas - Municipio de Zipaquira Corte No. 4	1.00	47,325,057.63

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones novecientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Otros	$	5,296,655.00
Otros	$	2,648,327.00
Transferencia	$	45,021,566.63

Total Bruto	47,012,425.00
Administración 4.50%	2,115,559.13
Imprevistos 4.00%	1,880,497.00
Utilidad 3.50%	1,645,434.87
IVA 19%	312,632.63
Total a Pagar	52,966,548.63

Observaciones:
Retencion de Garantias 10% $ 5.296.655
Amortizacion Anticipo 5% $ 2.648.327
Condiciones de Pago Contado

21.1.053.078
0091.383.312
ret 5296.654
Amort. 2648.327

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072272890 aprobado en 20240603 prefijo desde el número 173 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 6.9 po mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6d8d773fea7a986c8c408a84d5d6d3a7808b7efa8347d2aa9a8f4c9ba4a5899168af5dec69eae630b43d6bf1e4c75169

LB. 605.177

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CMCZ NIT 901.722.718-6	ACTA PARCIAL DE OBRA 4 CONSORCIOMEGACONTRUCCIONES ZIPA Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-022 Fecha: 18/02/2015 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATISTA: INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901239413-4

ORDEN DE TRABAJO CONTRATO

ZIPAQUIRA, 15 DE Junio 2024 — **CORTE DE OBRA 4**

FECHA DE INICIO	17/04/2024	
PLAZO CONTRACTUAL		NA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 781.902.547,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 781.902.547,00	NA
VALOR OBRA EJECUTADA		NA

Ítem	Actividad	Obra Contratada				BALANCE		ACTA 4		ACUMULADO	
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
	CIMENTACION										$ 0,00
2.1.9NP	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN F'c 28 Mpa	M2	2.976	$ 56.911	169.339.223,19	2.976	$ 169.339.223	791,68	$ 45.055.130	1.701,18	$ 96.815.450,28
	ACERO DE REFUERZO (MANEJO)										
3.1.1	ACERO DE REFUERZO DE 60.000PSI	KILOS	335.495	$ 221	74.257.390,44	335.495	$ 74.257.390	8.843,06	$ 1.957.298	51.998,06	$ 11.509.087,84
COSTO DIRECTO					$ 723.804.602,34				$ 47.012.425,76		$ 117.452.473,20
ADMINISTRACION				4.5%	$ 32.571.207				$ 2.115.559,09		$ 5.285.163
IMPREVISTOS				4%	$ 28.952.184				$ 1.880.497,03		$ 4.698.044
UTILIDADES				3.5%	$ 25.333.161				$ 1.645.435,00		$ 4.110.837
IVA				19%	$ 4.813.301				$ 312.633,00		$ 781.059
VALOR TOTAL					$ 781.902.547				$ 52.966.549,26		$ 132.327.828,93

Obra contratada incluido Adicional	$	781.902.547,30
Valor presente acta	$	52.966.549,26
Valor pagado actas	$	33.930.884,64
Saldo del Contrato	$	695.005.113,40
Anticipo Recibido	$	11.759.007,00
Anticipo Proveedores		
Total anticipo	$	11.759.007,00
Retencion Garantia Anterior	$	7.936.127,99
Retencion Garantia (10%) presente corte	$	5.296.654,93
Total Retegarantia	$	13.232.782,92
Amortizacion anticipo anterior	$	3.968.064,00
Amortizacion Anticipo Presente (5%)	$	2.648.327,46
Amortizacion Anticipo acumulado	$	6.616.391,46
Saldo Amortización Anticipo	$	5.142.615,54
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	**45.021.567**

INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FRED MANGO P.
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
CONTRATANTE

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

Rt 2. (1'059.330)
IVA (365.469)
43.596.798

Carol López
O. Zipa
Fiducia - Mano de obra
13-6-24

Powered by CamScanner

CMCZ		CR 16 No 96-64 ofc 407 TEL:6210189	**ORDEN DE GIRO No CCZ 59**
CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA			**FECHA DE SOLICITUD: 13 DE JUNIO 2024**

ITEM	PROVEDOR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	CONTRATO	VALOR	SUBTOTAL	CONSIGNAR A NOMBRE DE
1	CONSTRUCCIONES RN S.A.S	CORTE 6 OBRA CIVIL		CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA	$ 31.528.484,00	$ 31.528.484	CONSTRUCCIONES RN S.A.S
2	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S	CORTE 4 OBRA CIVIL		CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA	$ 45.021.567,00	$ 45.021.567	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S
3	JULIETH ALEJANDRA TORRES	AUXLIO DE VIVIENDA DEL 15 D EJUNIO AL 15 D EJULIO		CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA	$ 500.000,00	$ 500.000	JULIETH ALEJANDRA TORRES
4	TECNISEG	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024		CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000	TECNISEG
				TOTAL	$ 87.550.051,00	$ 87.550.051,00	

Factura - Factura

Factura - Factura

CAROL LOPEZ
ELABORADO POR

CARLOS GARAVITO
APROBADO POR

Zyg
13-6-24

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGETEC-FMT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 78 C 130 55 TO 2 AP 1409

42. Correo electrónico ingetecfmt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 8 1 4 9 8 2	3 1 0 6 1 7 1 9 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 8 1 2 1 7	4 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 7	4 3 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 01 : 49: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA BARBOSA JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 3 4 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 1 2 1 9		-
2	8 1	2 0 2 1 0 5 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS** con NIT **901.239.413-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969976613

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 63

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 14/06/2024 Fecha de Registro de la Orden: 14/06/2024 Fecha de Pago: 14/06/2024

Proveedor: 901239413 - 4 INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_002 PAGO MANO DE OBRA-8759148

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_500618	14/06/2024	43,596,798.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
43,596,798.00	0.00	0	43,596,798.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		43,596,798.00	0.00	0.00
	Totales		43,596,798.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 43,596,798.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 63 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS	43,596,798.00	
25110501001	PROVEEDORES			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS		43,596,798.00
						43,596,798.00	43,596,798.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #579022 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_500618 del 13/06/2024 20:00:39, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	63
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CC - 108969976613
Nro. Doc. Tercero:	901239413
Nombre Tercero:	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$43,596,798.00
Observaciones:	OP_500618-DES:PAGO CORTE NO. 4

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 14/06/2024 14:11:57.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

INGENIERIA TECNICA EN CONTRUCCION SAS
NIT 901.239.413-4
CL 78C No. 130 -55
Tel: (031) 6332438
Bogotá - Colombia
ingetecfmt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 172

Señores	Consorcio Megaconstrucciones Zipa		
NIT	901.722.718-6	Teléfono	(601) 6210189 - Ext. 000
Dirección	Cr 16 96 64 Of 407	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2024, 10:19
Expedición	31/05/2024, 10:19
Vencimiento	31/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato CMZ-007-2024 MO Cimentacion y estructura centro cultural y de Convenciones Tierra de Artistas - Municipio de Zipaquira Corte No. 3	1.00	40,591,583.83

21.903.244
0091.311.619
Amort 2.271.519
rete 4.543.039
37.400.974

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones cuatrocientos treinta mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Otros	$	4,543,039.00
Otros	$	2,271,520.00
Transferencia	$	38,615,836.79

Total Bruto	40,323,433.00
Administración 4.50%	1,814,554.49
Imprevistos 4.00%	1,612,937.32
Utilidad 3.50%	1,411,320.15
IVA 19%	268,150.83
Total a Pagar	45,430,395.79

Observaciones:
Retencion de Garantias 10% $ 4.543.039
Amortizacion Anticipo 5% $ 2.271.520
Condiciones de Pago: Contado

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764049950184 aprobado en 20230602 prefijo desde el número 118 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 6.9 po mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 74e2cc3606ef80be966806d35b29a0c0563c08207ad936819b7b0122b3cc484789991b9c9d37e6504d51cf6689b00653

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CMCZ NIT 901.722.718-6	ACTA PARCIAL DE OBRA 3 CONSORCIOMEGACONTRUCCIONES ZIPA Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-022 Fecha: 18/02/2015 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATISTA: INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901239413-4

ORDEN DE TRABAJO CONTRATO

ZIPAQUIRA, 15 DE MAYO 2024 | CORTE DE OBRA 3

FECHA DE INICIO	17/04/2024	
PLAZO CONTRACTUAL		NA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 781.902.547,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 781.902.547,00	NA
VALOR OBRA EJECUTADA		NA

Item	Actividad	Obra Contratada				BALANCE		ACTA 3		ACUMULADO	
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
	CIMENTACION										$ 0,00
2.1.6	CONCRETO PARA DADOS DE F'c 28 Mpa	M3	28,32	$ 169.521	4.801.509,99	28,3	4.801.509,99	1,39	$ 235.441	1,39	$ 235.440,80
2.1.9NP	CONCRETO PARA PLACA DE CIMENTACIÓN F'c 28 Mpa	M2	2.975,52	$ 56.911	169.339.223,19	2.975,5	169.339.223,19	862,50	$ 37.703.352	909,50	$ 51.760.320,78
	ACERO DE REFUERZO (MANEJO)			$ 0	-	-	-				$ 0,00
3.1.1	ACERO DE REFUERZO DE 60.000PSI	kg	335.494,89	$ 221	74.257.390,44	335.494,9	74.257.390,44	10.134,98	$ 2.243.244	43.155,00	$ 9.551.792,08
	NO PREVISTOS				-	-	-				$ 0,00
1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	100,00	$ 24.831	2.483.100,00		-	5,69	$ 141.397	39,44	$ 979.278,72
COSTO DIRECTO					$ 723.804.602,34				$ 40.323.433,30		$ 70.440.047,94
ADMINISTRACION				4,5%	$ 32.571.207				$ 1.814.554,00		$ 3.169.802
IMPREVISTOS				4%	$ 28.952.184				$ 1.612.937,00		$ 2.817.602
UTILIDADES				3,5%	$ 25.333.161				$ 1.411.320,00		$ 2.465.402
IVA				19%	$ 4.813.301				$ 268.154,00		$ 468.426
VALOR TOTAL					$ 781.902.547				$ 45.430.595,30		$ 79.361.280,01

Obra contratada incluido Adicional	$ 781.902.547,30
Valor proyectado acta	$ 45.430.595,30
Valor pagado actas	$ 33.930.884,64
Saldo del Contrato	$ 702.541.267,36
Anticipo Recibido	$ 11.759.007,00
Anticipo Proveedores	
Total anticipo	$ 11.759.007,00
Retencion Garantia Anterior	$ 3.393.088,40
Retencion Garantia (10%) presente corte	$ 4.543.039,53
Total Retegarantia	$ 7.936.127,99
Amortizacion anticipo anterior	$ 1.696.544,23
Amortizacion Anticipo Presente (5%)	$ 2.273.519,76
Amortización Anticipo acumulado	$ 3.968.064,00
Saldo Amortización Anticipo	$ 7.790.943,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 38.615.836

INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

FRED AHANGO P.
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
CONTRATANTE

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGETEC-FMT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 78 C 130 55 TO 2 AP 1409

42. Correo electrónico ingetecfmt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 8 1 4 9 8 2	3 1 0 6 1 7 1 9 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 8 1 2 1 7	4 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 7	4 3 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 01 : 49: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA BARBOSA JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 3 4 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 1 2 1 9		-
2	8 1	2 0 2 1 0 5 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS** con NIT **901.239.413-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969976613

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 58

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 04/06/2024 Fecha de Registro de la Orden: 04/06/2024 Fecha de Pago: 04/06/2024

Proveedor: 901239413 - 4 INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PAGO CTO. CIMENTACION-8208127

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_496887	04/06/2024	37,400,974.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
37,400,974.00	0.00	0	37,400,974.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		37,400,974.00	0.00	0.00
	Totales		37,400,974.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 37,400,974.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 58 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS		37,400,974.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS	37,400,974.00	
						37,400,974.00	37,400,974.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #573490 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_496887 del 31/05/2024 15:04:26, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	58
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CC - 108969976613
Nro. Doc. Tercero:	901239413
Nombre Tercero:	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$37,400,974.00
Observaciones:	OP_496887-DES:PAGO FACTURA NO. 172

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 04/06/2024 12:24:17.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

INGENIERIA TECNICA EN CONTRUCCION SAS
NIT 901.239.413-4
CL 78C No. 130 -55
Tel: (031) 6332438
Bogotá - Colombia
ingetecfmt@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 170

Señores	Consorcio Megaconstrucciones Zipa		
NIT	901.722.718-6	**Teléfono**	(601) 6210189 - Ext. 000
Dirección	Cr 16 96 64 Of 407	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2024, 10:41
Expedición	17/05/2024, 10:41
Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato CMZ-007-2024 MO Cimentacion y estructura Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas - Municipio de Zipaquira Corte No. 2	1.00	25,165,768.82

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho millones ciento sesenta y cinco mil setecientos once pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Otros	$	2,816,571.00
Otros	$	1,408,286.00
Transferencia	$	23,940,854.46

Total Bruto	24,999,522.00
Administración 4.50%	1,124,978.49
Imprevistos 4.00%	999,980.88
Utilidad 3.50%	874,983.27
IVA 19%	166,246.82
Total a Pagar	28,165,711.46

Observaciones:
Retencion de Garantias 10% $2.816.571
Amortizacion Anticipo 5% $ 1.408.286
Condiciones de pago Contado

2.1589.989
2691193192
iel. 2.816.571
Am. 1.408.285

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764049950184 aprobado en 20230602 prefijo desde el número 118 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 6.9 po mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5b9a4216a14bc0bf3578ffc4dd2f8627cfe7879b26bbe48d509eab2d8cb6642642fb0644568db8239355a9e12b546118

23.187.674

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGETEC-FMT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 78 C 130 55 TO 2 AP 1409

42. Correo electrónico ingetecfmt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 8 1 4 9 8 2	3 1 0 6 1 7 1 9 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 8 1 2 1 7	4 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 7	4 3 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 01 : 49: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA BARBOSA JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931256995

(415)7707212489984(8020) 000001493125699 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 4 1 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 3 4 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 1 2 1 9		-
2	8 1	2 0 2 1 0 5 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS** con NIT **901.239.413-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969976613

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 54

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/05/2024 Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2024 Fecha de Pago: 17/05/2024

Proveedor: 901239413 - 4 INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_002 PAGO MANO DE OBRA-6544234

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_491340	17/05/2024	23,183,199.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,183,199.00	0.00	0	23,183,199.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		23,183,199.00	0.00	0.00
	Totales		23,183,199.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 23,183,199.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 54 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS	23,183,199.00	
25110501001	PROVEEDORES			901239413 - 4	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS		23,183,199.00
						23,183,199.00	23,183,199.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #565700 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_491340 del 17/05/2024 12:02:16, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	54
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CC - 108969976613
Nro. Doc. Tercero:	901239413
Nombre Tercero:	INGENIERIA TECNICA EN CONSTRUCCION SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$23,183,199.00
Observaciones:	OP_491340-DES:PAGO CORTE NO. 2

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 17/05/2024 15:12:58.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ELISEO BUITRAGO SILVA

NIT 79822392 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764070121978 del 03/05/2024 al 03/05/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 55 sur No 24b-55 Parque real 1

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

CODIGO DE ACTIVIDAD 4923
PERSONA NATURAL
TELEFONO: 3204004129
DIRECCIÓN: CALLE 55 SUR NO 24 B 55 TORRE 29 APT 302


Factura Electronica de Venta No. FE1
Fecha de emisión: 03/05/2024 03:46:01 PM
Fecha de validación DIAN: 03/05/2024 03:57:01 PM
Fecha de vencimiento: 04/05/2024
Plazo (Días): 1
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
NIT 901722718 - 6
Dirección: CRA 16 NO 96-64 OFI 407
Codigo Cliente 01
Teléfono: 6016210189
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Venta de bomba estacionaria de concreto marca PUTMEIZTER TK-40 Motor serial #11349591 Chasis: 2106T3389 DE SEGUNDA MANO	1,00	unidad	COP 225,000,000.00	COP 0.00			COP 225,000,000.00



Total de items: 1
Observaciones
Esta factura de venta se asimila en todos los aspectos legales a la letra de cambio a cambio.
Art. 772 y 774 del código de comercio y causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida por la norma colombiana.

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Favor girar cheque o consignación a nombre de Eliseo Buitrago Silva C.C 79822392 de Bogotá
Cuenta de ahorros Banco de Bogotá #022403281

Subtotal:	COP 225,000,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 225,000,000.00
Neto a pagar	COP 225,000,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 631a29d152a85bff12965297fbf1c223b8e5afe0c08b9d18da6bdda610708747e11828dc6398881e9d038e03a3631f49

Contrato de Compraventa celebrado entre CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA (COMPRADOR) Y ELISEO BUITRAGO SILVA (VENDEDOR).

Entre los suscritos a saber; por una parte, JORGE A. BECERRA ROJAS, mayor de edad e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.787.400 de Bogotá D.C., quien obra en nombre y en representación legal del **CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA,** sociedad identificada con NIT No. 901.722.718-6 y debidamente constituida de conformidad con las leyes colombianas, que en adelante para efectos del presente documento fungirá como **EL COMPRADOR;** y, por otra parte, **ELISEO BUITRAGO SILVA,** mayor de edad e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.822.392 de Bogotá D.C., que en adelante para efectos del presente documento fungirá como **EL VENDEDOR.** En conjunto se referirá a "Las Partes" e individualmente a "La Parte" de acuerdo con la calidad en la que obra en el presente documento. Que LAS PARTES convienen la celebración del presente contrato, previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. LAS PARTES se reconocen entre sí capacidad legal para la celebración del contrato de compraventa.

2. LAS PARTES manifiestan que no tienen ningún impedimento legal, financiero y/o administrativo que les impida la celebración del presente contrato.

3. EL VENDEDOR pone en conocimiento que la máquina objeto de la compraventa a celebrar ya ha tenido otro dueño anterior a él.

4. Las especificaciones técnicas de la máquina de la que se trata la compraventa objeto del presente contrato son las siguientes:

    - Maquinaria: BOMBA DE CONCRETO ESTACIONARIA;
    - Marca PUTZMEISTER TK 40;
    - Referencia No. A700127CTK40RS457S;
    - Motor serial No. 11349591;
    - Chasis No. 2106T3389.

    En conjunto con los siguientes accesorios:

    - 20 tubos de 3 metros;
    - 2 semícodos;
    - 4 codos;
    - 26 abrazaderas de cuña;
    - 1 botella de sopletear;
    - Reducción de 4 pulgadas;
    - 1 de limpieza.
    - 1 moco de 10 metros de 4 pulgadas.

5. Que LA PARTE COMPRADORA ha sido debidamente informada del estado de la maquinaria y de sus accesorios, y se encuentra satisfecha con la misma.

6. Que mientras ocurre la entrega efectiva y a satisfacción de la maquinaria y los accesorios relacionados, los mismos serán responsabilidad única y exclusiva de LA PARTE VENDEDORA.

De tal manera que; LAS PARTES convienen la celebración del presente contrato, el cual se regirá por las leyes civiles y comerciales colombianas y las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO; que LA PARTE VENDEDORA transferirá el derecho de propiedad a LA PARTE COMPRADORA de la maquinaria y los accesorios relacionados anteriormente en el acápite considerativo del presente documento, a cambio del pago de estos derechos.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO; LA PARTE COMPRADORA pagará a LA PARTE VENDEDORA ($ 225'000.000) DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/cte, en razón de la transferencia del derecho de propiedad de la maquinaria y de los accesorios relacionados.

TERCERA. FORMA DE PAGO; EL COMPRADOR, se compromete a pagar el precio total del valor, una vez EL VENDEDOR emita la respectiva cuenta de cobro para la venta de acuerdo con todos los requisitos legales de conformidad con su naturaleza tributaria y remita toda la documentación que requiera EL COMPRADOR para hacer efectivo el pago del valor del contrato.

CUARTA. ENTREGA; EL VENDEDOR entregará al COMPRADOR la maquinaria y los accesorios relacionados en el acápite considerativo del presente contrato en las instalaciones del VENDEDOR, el proyecto de construcción del Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

QUINTA. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y ACCESORIOS; EL VENDEDOR garantiza que la maquinaria y los accesorios objeto de esta compraventa se encuentran en excelente estado de funcionamiento y libres de cualquier defecto que pueda afectar su uso normal, de acuerdo con el desgaste natural teniendo en cuenta que es una maquinaria de segunda mano.

SEXTA. OBLIGACIONES DE MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA POR PARTE DEL COMPRADOR; EL COMPRADOR y el funcionario destinado para la manipulación y operar la maquinaría y el uso de los accesorios deberá comprometerse a su manipulación y mantenimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual entregado por EL VENDEDOR el debido funcionamiento de estos.



SÉPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE; LAS PARTES convienen que el domicilio contractual será Bogotá D.C. y Zipaquirá, Cundinamarca, respectivamente. Por consiguiente la ley aplicable será la colombiana.

OCTAVA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de cualquier controversia a dirimir que exista con ocasión de la interpretación, aplicación, cumplimiento y/o incumplimiento del presente contrato, LAS PARTES acuerdan resolver la misma directamente como primera instancia; en caso de imposibilidad de la misma, LAS PARTES accederán ante un árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que este sea quien decida en derecho acerca de la controversia.

PARÁGRAFO 1: El laudo arbitral será definitivo, vinculante y ejecutable para LAS PARTES.

PARÁGRAFO 2: LAS PARTES renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles, comprometiéndose a cumplir y acatar el laudo arbitral sin posibilidad de presentación de recurso judicial posterior.

En señal de conformidad y aceptación de las partes, se suscribe el presente contrato en dos (2) copias del mismo tenor para cada una de las partes, a los dos (2) días del mes de mayo del año 2024.

EL COMPRADOR;

JORGE A. BECERRA ROJAS.
C.C. 79.787.400.
Representante Legal Suplente.
CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA.

EL VENDEDOR;

ELISEO BUITRAGO SILVA.
C.C. 79.822.392

Carrera 16 # 96 -64 oficina407
Bogota – Colombia
Tel: 57 601 6210189
e-mail:consorciomegaconstruccioneszipa@proinark.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141038008651

(415)7707212489984(8020) 000014103800865 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 2 2 3 9 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79822392	1 9 9 4 1 0 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUITRAGO	SILVA	ELISEO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 55 SUR 24 B 55 TO 29 AP 302

42. Correo electrónico: multibombas.bm@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 0 0 4 1 2 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 4 0 8 0 6	4 3 9 0	2 0 1 4 0 8 0 5	0 0 9 0	0 0 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 05 - 02 17 : 43: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BUITRAGO SILVA ELISEO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit 860 002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ELISEO BUITRAGO SILVA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.822.392 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 022403281, abierta/o desde el 2/3/2009.

Se expide en Bogotá el día 2 del mes de Mayo del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 49

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 06/05/2024 Fecha de Registro de la Orden: 06/05/2024 Fecha de Pago: 06/05/2024

Proveedor: 79822392 - BUITRAGO SILVA ELISEO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PAGO COMPRA BOMBA ESTACIONARIA-4890077

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_486976	06/05/2024	217,822,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
217,822,500.00	0.00	0	217,822,500.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		217,822,500.00	0.00	0.00
	Totales		217,822,500.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 217,822,500.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 49 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			79822392 -	BUITRAGO SILVA ELISEO		217,822,500.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			79822392 -	BUITRAGO SILVA ELISEO	217,822,500.00	
						217,822,500.00	217,822,500.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #559056 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_486976 del 06/05/2024 09:21:25, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	49
Cuenta/Encargo Destino:	BANCO DE BOGOTA - CH - 022403281
Nro. Doc. Tercero:	79822392
Nombre Tercero:	BUITRAGO SILVA ELISEO
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$217,822,500.00
Observaciones:	OP_486976-DES:PAGO FACTURA FE 1

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/05/2024 14:32:28.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS

NIT 900922754-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA PROFORMA : PF 32660

AV CALLE 80 # 119 - 62
TEL: 3124010492 - 3134472801
transportessalamanca@outlook.com

Email: transportessalamanca@outlook.es
Teléfono: 3134472801

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	
FECHA DE FACTURA	6	3	2024	VENCIMIENTO	6	3	24		

CLIENTE:	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	NIT:	901,722,728-8
DIRECCION:	CRA 16 No 96-64 OF. 407	CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	6210189	FAX:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	TRANSPORTE DE AGREGADOS PROYECTO CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MDA CTE.	CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPADO	VALOR BRUTO	$ 120.000.000,00

ATENTAMENTE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C. O NIT.

Abono c/o Suministro de Concreto Acuoss.

P. Zipa
Fiduc
8-3-24

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 18/01/2024 Fecha de Registro de la Orden: 18/01/2024 Fecha de Pago: 19/01/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_536646 - PAGO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	536646	18/01/2024	9,833,542.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,833,542.25	0.00	0	9,833,542.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		9,833,542.25	0.00	0.00
		Totales	9,833,542.25	0.00	0.00

Valor a Girar: 9,833,542.25

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 1 Periodo: 202401

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		9,833,542.25
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	9,833,542.25	
						9,833,542.25	9,833,542.25

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	8,278,488,542
TOTAL ABONOS	$	8,298,704,376.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,083,389.16
SALDO ACTUAL	$	8,298,704,376.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE ZI			8,200,000,000.00	8,200,000,000.00
1/11	PAGO DE PROV MPIO DE ZIPAQUI			60,480,987.00	8,260,480,987.00
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,536,217.73	8,263,017,204.73
16/11	PAGO INTERBANC CONSORCIO CONST			33,140,000.00	8,296,157,204.73
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,547,171.43	8,298,704,376.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE DICIEMBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,298,704,376.16	*SALDO PROMEDIO*	$	7,486,693,530
TOTAL ABONOS	$	4,750,153.09	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,438,462,215.36	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,750,153.09
SALDO ACTUAL	$	6,864,992,313.89	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			849,230.92	8,299,553,607.08
6/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	8,299,552,350.74
6/12	PAGO A PROV EPROCON ESTUDIOS P			-726,278,050.00	7,573,274,300.74
6/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,905,118.18	7,570,369,182.56
6/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	7,570,368,943.85
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,394,513.85	7,571,763,457.70
15/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	7,571,762,201.36
15/12	PAGO A PROV LEEGS INGENIERIA S			-263,156,600.00	7,308,605,601.36
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,052,632.38	7,307,552,968.98
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	7,307,552,730.27
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,944,448.14	7,309,497,178.41
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,512.68	7,309,494,665.73
28/12	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-293,290,660.00	7,016,204,005.73
28/12	PAGO A PROV INECTEL SAS			-150,000,000.00	6,866,204,005.73
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,773,174.60	6,864,430,831.13
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-477.42	6,864,430,353.71
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			561,960.18	6,864,992,313.89
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE ENERO DEL 2024

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,864,992,313.89	*SALDO PROMEDIO*	$	6,573,981,177
TOTAL ABONOS	$	4,171,341.87	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	696,799,893.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,171,341.87
SALDO ACTUAL	$	6,172,363,761.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,529,390.21	6,867,521,704.10
19/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	6,867,520,334.42
19/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	6,867,517,595.06
19/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ZIPAQ			-9,833,542.00	6,857,684,053.06
19/01	PAGO A PROV INECTEL SAS			-200,000,000.00	6,657,684,053.06
19/01	PAGO A PROV EPROCON ESTUDIOS P			-484,185,367.00	6,173,498,686.06
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,776,095.19	6,170,722,590.87
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	6,170,722,330.62
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	6,170,721,810.12
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,641,951.66	6,172,363,761.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 14

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 20/02/2024 Fecha de Registro de la Orden: 20/02/2024 Fecha de Pago: 22/02/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_540448 - PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2024

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	540448	20/02/2024	4,171,341.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,171,341.87	0.00	0	4,171,341.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		4,171,341.87	0.00	0.00
	Totales		4,171,341.87	0.00	0.00

Valor a Girar: 4,171,341.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 14 Periodo: 202402

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	4,171,341.87	
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		4,171,341.87
						4,171,341.87	4,171,341.87

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE FEBRERO DEL 2024

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,172,363,761.78	*SALDO PROMEDIO*	$	4,695,307,167
TOTAL ABONOS	$	2,786,765.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,365,057,860.99	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,786,765.55
SALDO ACTUAL	$	3,810,092,666.34	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,109.04	6,172,359,652.74
1/02	PAGO A PROV HOLCIM COLOMBIA S			-454,813,458.00	5,717,546,194.74
1/02	PAGO A PROV TRANSPORTES SALAMA			-103,556,706.00	5,613,989,488.74
1/02	PAGO A PROV ACROSS INGENIERIA			-50,000,000.00	5,563,989,488.74
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,433,500.21	5,561,555,988.53
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-780.75	5,561,555,207.78
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			569,130.35	5,562,124,338.13
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	5,562,122,245.31
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-506,066.78	5,561,616,178.53
6/02	PAGO A PROVE MACANA PROYECTO			-63,256,259.00	5,498,359,919.53
6/02	PAGO A PROVE MACANA PROYECTO			-63,257,948.00	5,435,101,971.53
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	5,435,101,573.89
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			222,469.16	5,435,324,043.05
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			109,016.30	5,435,433,059.35
8/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	5,435,431,689.67
8/02	PAGO A PROV FERRETERIA ANDRES			-108,122,649.00	5,327,309,040.67
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-432,497.11	5,326,876,543.56
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	5,326,876,283.31
9/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	5,326,874,913.63
9/02	PAGO A PROV LEEGS INGENIERIA S			-263,156,600.00	5,063,718,313.63
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,052,632.91	5,062,665,680.72
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	5,062,665,420.47
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			725,323.34	5,063,390,743.81
16/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	5,063,388,004.45
16/02	PAGO A PROV G Y J FERRETERIAS			-291,022,043.00	4,772,365,961.45
16/02	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-87,498,837.00	4,684,867,124.45
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,514,096.55	4,683,353,027.90
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	4,683,352,507.40
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			287,550.88	4,683,640,058.28
19/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	4,683,638,688.60
19/02	PAGO A PROV G Y J FERRETERIAS			-617,200,328.00	4,066,438,360.60
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,468,807.83	4,063,969,552.77
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	4,063,969,292.52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES
Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130
CALI VALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			249,521.67	4,064,218,814.19
22/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	4,064,217,444.51
22/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	4,064,216,074.83
22/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ZIPAQ			-4,171,342.00	4,060,044,732.83
22/02	PAGO A PROV EPROCON ESTUDIOS P			-249,560,360.00	3,810,484,372.83
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,014,939.84	3,809,469,432.99
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,809,469,172.74
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,809,468,912.49
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			623,753.85	3,810,092,666.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 22

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 14/03/2024 Fecha de Registro de la Orden: 14/03/2024 Fecha de Pago: 14/03/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_543348 - PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO 2024

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	543348	14/03/2024	2,786,765.55

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,786,765.55	0.00	0	2,786,765.55

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		2,786,765.55	0.00	0.00
	Totales		2,786,765.55	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,786,765.55

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 22 Periodo: 202403

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		2,786,765.55
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	2,786,765.55	
						2,786,765.55	2,786,765.55

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 34

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 16/04/2024 Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2024 Fecha de Pago: 16/04/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_546501 - PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2024

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	546501	16/04/2024	1,262,704.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,262,704.87	0.00	0	1,262,704.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		1,262,704.87	0.00	0.00
	Totales		1,262,704.87	0.00	0.00

Valor a Girar: 1,262,704.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 34 Periodo: 202404

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		1,262,704.87
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	1,262,704.87	
						1,262,704.87	1,262,704.87

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE MARZO DEL 2024

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 52

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/05/2024 Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2024 Fecha de Pago: 17/05/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_549728 - RENDIMIENTOS ABRIL

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	549728	17/05/2024	816,834.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
816,834.47	0.00	0	816,834.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		816,834.47	0.00	0.00
	Totales		816,834.47	0.00	0.00

Valor a Girar: 816,834.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 52 Periodo: 202405

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		816,834.47
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	816,834.47	
						816,834.47	816,834.47

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE ABRIL DEL 2024

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE MAYO DEL 2024

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA CODIGO SIFI 115649

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 8/27/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,546,241,247.41	*SALDO PROMEDIO*	$	847,063,627
TOTAL ABONOS	$	254,595.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,149,520,008.27	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	254,595.47
SALDO ACTUAL	$	396,975,834.61	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			84,515.56	1,546,325,762.97
6/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,109.04	1,546,321,653.93
6/05	PAGO A PROV G Y J FERRETERIAS			-21,914,754.00	1,524,406,899.93
6/05	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-106,862,493.00	1,417,544,406.93
6/05	PAGO A PROV BUITRAGO SILVA ELI			-217,822,500.00	1,199,721,906.93
6/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	1,199,719,814.11
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,606,743.89	1,198,113,070.22
6/05	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-38,443,388.00	1,159,669,682.22
6/05	PAGO A PROVE GAS NATURAL SAN			-16,635,458.00	1,143,034,224.22
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	1,143,033,826.58
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-780.75	1,143,033,045.83
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			137,453.26	1,143,170,499.09
17/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-5,478.72	1,143,165,020.37
17/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	1,143,163,650.69
17/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	1,143,162,281.01
17/05	PAGO A PROV ACROSS INGENIERIA			-70,280,257.00	1,072,882,024.01
17/05	PAGO A PROV HOLCIM COLOMBIA S			-317,645,615.00	755,236,409.01
17/05	PAGO A PROV INGENIERIA TECNICA			-23,183,199.00	732,053,210.01
17/05	PAGO A PROV G Y J FERRETERIAS			-131,829,494.00	600,223,716.01
17/05	PAGO A PROV TRANSPORTES SALAMA			-110,430,122.00	489,793,594.01
17/05	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ZIPAQ			-816,834.00	488,976,760.01
17/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	488,975,713.60
17/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	488,974,667.19
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,973,017.09	486,001,650.10
17/05	PAGO A PROVE CASETONES MODUL			-37,748,583.00	448,253,067.10
17/05	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-51,307,900.00	396,945,167.10
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	396,944,906.85
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,041.00	396,943,865.85
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	396,943,605.60
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	396,943,406.78
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	396,943,207.96
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			32,626.65	396,975,834.61
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 64

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 20/06/2024 Fecha de Registro de la Orden: 20/06/2024 Fecha de Pago: 20/06/2024

Proveedor: 899999318 - 6 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Teléfono:

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_553227 DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIERO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	553224	20/06/2024	254,595.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
254,595.47	0.00	0	254,595.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		254,595.47	0.00	0.00
		Totales	254,595.47	0.00	0.00

Valor a Girar: 254,595.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 64 Periodo: 202406

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		254,595.47
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999318 - 6	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	254,595.47	
						254,595.47	254,595.47

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,105,330,043.35	*SALDO PROMEDIO*	$	2,299,375,241
TOTAL ABONOS	$	816,834.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,559,905,630.41	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	816,834.47
SALDO ACTUAL	$	1,546,241,247.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			76,400.09	3,105,406,443.44
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			35,167.88	3,105,441,611.32
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	3,105,439,518.50
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-982,261.16	3,104,457,257.34
3/04	PAGO A PROVE LEEGS INGENIERI			-225,562,800.00	2,878,894,457.34
3/04	PAGO A PROVE GAS NATURAL SAN			-20,000,000.00	2,858,894,457.34
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	2,858,894,059.70
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			34,767.90	2,858,928,827.60
4/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	2,858,927,781.19
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,682.09	2,858,798,099.10
4/04	PAGO A PROVE CASETONES MODUL			-32,419,279.00	2,826,378,820.10
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	2,826,378,621.28
5/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	2,826,375,881.92
5/04	PAGO A PROV PV CENTER BOGOTA S			-10,888,100.00	2,815,487,781.92
5/04	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-111,919,066.00	2,703,568,715.92
5/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	2,703,566,623.10
5/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-650,566.14	2,702,916,056.96
5/04	PAGO A PROVE VARGAS FERNANDE			-22,717,100.00	2,680,198,956.96
5/04	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-17,111,521.00	2,663,087,435.96
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	2,663,087,038.32
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	2,663,086,517.82
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			229,325.72	2,663,315,843.54
12/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	2,663,313,104.18
12/04	PAGO A PROV EES DOTACIONES SAS			-2,188,276.00	2,661,124,828.18
12/04	PAGO A PROV G Y J FERRETERIAS			-114,190,121.00	2,546,934,707.18
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-465,526.62	2,546,469,180.56
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	2,546,468,660.06
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			125,302.50	2,546,593,962.56
16/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	2,546,592,592.88
16/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ZIPAQ			-1,262,705.00	2,545,329,887.88
16/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,057.33	2,545,324,830.55
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	2,545,324,570.30
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			62,622.33	2,545,387,192.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES
Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130
CALI VALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-5,478.72	2,545,381,713.91
18/04	PAGO A PROV HOLCIM COLOMBIA S			-330,000,000.00	2,215,381,713.91
18/04	PAGO A PROV TRANSPORTES SALAMA			-105,171,544.00	2,110,210,169.91
18/04	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-75,178,779.00	2,035,031,390.91
18/04	PAGO A PROV ACROSS INGENIERIA			-75,456,278.00	1,959,575,112.91
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,343,252.48	1,957,231,860.43
18/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,041.00	1,957,230,819.43
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			85,583.31	1,957,316,402.74
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			20,931.73	1,957,337,334.47
22/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	1,957,335,964.79
22/04	PAGO A PROV INGENIERIA TECNICA			-11,759,007.00	1,945,576,957.79
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	1,945,574,864.97
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-169,356.88	1,945,405,508.09
22/04	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-18,502,245.00	1,926,903,263.09
22/04	PAGO A PROVE GAS NATURAL SAN			-12,073,850.00	1,914,829,413.09
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	1,914,829,152.84
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	1,914,828,755.20
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	1,914,827,708.79
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,791.30	1,914,757,917.49
23/04	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-17,446,581.00	1,897,311,336.49
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	1,897,311,137.67
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			62,222.07	1,897,373,359.74
26/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	1,897,370,620.38
26/04	PAGO A PROV AGOFER S A S			-324,814,094.00	1,572,556,526.38
26/04	PAGO A PROV METALICAS WILLIAM			-25,000,000.00	1,547,556,526.38
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,399,269.41	1,546,157,256.97
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	1,546,156,736.47
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			84,510.94	1,546,241,247.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007816

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,810,092,666.34	*SALDO PROMEDIO*	$	3,311,098,078
TOTAL ABONOS	$	1,262,704.87	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	706,025,327.86	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,262,704.87
SALDO ACTUAL	$	3,105,330,043.35	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	3,810,091,296.66
1/03	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-104,843,411.00	3,705,247,885.66
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-419,380.16	3,704,828,505.50
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,704,828,245.25
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			227,877.90	3,705,056,123.15
6/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	3,705,054,753.47
6/03	PAGO A PROV PV CENTER BOGOTA S			-34,904,610.00	3,670,150,143.47
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	3,670,149,097.06
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-235,684.51	3,669,913,412.55
6/03	PAGO A PROVE GAS NATURAL SAN			-24,013,643.00	3,645,899,769.55
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,645,899,509.30
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	3,645,899,310.48
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			224,253.27	3,646,123,563.75
11/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,109.04	3,646,119,454.71
11/03	PAGO A PROV HOLCIM COLOMBIA S			-250,000,000.00	3,396,119,454.71
11/03	PAGO A PROV ACROSS INGENIERIA			-69,684,066.00	3,326,435,388.71
11/03	PAGO A PROV TRANSPORTES SALAMA			-120,000,000.00	3,206,435,388.71
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,758,755.82	3,204,676,632.89
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-780.75	3,204,675,852.14
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			118,267.15	3,204,794,119.29
14/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	3,204,792,749.61
14/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ZIPAQ			-2,786,766.00	3,202,005,983.61
14/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,153.58	3,201,994,830.03
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,201,994,569.78
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			157,558.56	3,202,152,128.34
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	3,202,150,758.66
18/03	PAGO A PROV CONDIAL LTDA			-85,207,075.00	3,116,943,683.66
18/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	3,116,942,637.25
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-387,875.82	3,116,554,761.43
18/03	PAGO A PROVE CONSTRUCCIONES			-11,759,007.00	3,104,795,754.43
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	3,104,795,555.61
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	3,104,795,295.36
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			534,747.99	3,105,330,043.35
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS
SIGLA : TRANS SALAMANCA SAS
N.I.T. : 900.932.754-9 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02649426 DEL 2 DE FEBRERO DE 2016

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE ABRIL DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 25,751,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CALLE 80 # 119 52
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSPORTESSALAMANCA@OUTLOOK.ES
DIRECCION COMERCIAL : AV CALLE 80 # 119 52
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : TRANSPORTESSALAMANCA@OUTLOOK.ES

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02057881 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE TODO TIPO DE CARGA, INCLUYENDO MATERIALES PARA OBRA CIVIL Y TODO MATERIAL MOVIBLE; COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE OBRA CIVIL, ACCESORIOS, INSUMOS ENTRE OTROS, Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA CON OBRAS CIVILES. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4792 (COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE CASAS DE VENTA O POR CORREO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4663 (COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $1,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 20.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $1,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 20.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $1,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 20.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, SE DENOMINARA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, QUE LO REMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, CON LAS MISMAS FACULTADES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02057881 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
SALAMANCA PARRA LUIS EDUARDO	C.C. 000000080843653
SUPLENTE	
VEGA GORDILLO KAREN JULIETH	C.C. 000001019043803

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 31 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE AGOSTO DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,895,887,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4923

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974271171

(415)7707212489984(8020) 0000014974271171

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 2 7 5 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TRANSP SALAMANCA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CL 80 119 52

42. Correo electrónico transportessalamanca@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 0 1 0 4 9 2	3 1 3 4 4 7 2 8 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 6 0 2 0 1	4 7 9 2	2 0 1 6 0 2 0 1	4 6 6 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 22 / 10 : 53: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA GORDILLO KAREN JULIETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974271171

(415)7707212489984(8020) **0000014974271171**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 2 7 5 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 4 9 4 2 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 1 0 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 0 2		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974271171

(415)7707212489984(8020) **0000014974271171**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 2 7 5 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 4 3 8 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GORDILLO	KAREN	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 4 3 6 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAMANCA	PARRA	LUIS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 22/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS** con **NIT 900.932.754-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 456400057455

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

115649 - FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 20

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 11/03/2024 Fecha de Registro de la Orden: 11/03/2024 Fecha de Pago: 11/03/2024

Proveedor: 900932754 - 9 TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_002 PAGO TRANSPORTE DE AGREGADOS-696946

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_467318	11/03/2024	120,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
120,000,000.00	0.00	0	120,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		120,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		120,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 120,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 20 Periodo: 202403

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900932754 - 9	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS		120,000,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900932754 - 9	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS	120,000,000.00	
						120,000,000.00	120,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FID CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #530335 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_467318 del 11/03/2024 11:18:14, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	20
Cuenta/Encargo Destino:	DAVIVIENDA - CH - 456400057455
Nro. Doc. Tercero:	900932754
Nombre Tercero:	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$120,000,000.00
Observaciones:	OP_467318-DES:PAGO FACTURA

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 11/03/2024 16:33:56.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

	LONGITUD	A	H	UNID	SUB TOTAL	Convención			OK	
PLACA CONTRAPISO	30,00	62,30	0,15	M3	280,35				ok	
			TOTAL	M3	280,35					

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Vo. Bo. INTERVENTORIA - CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055921	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

VER PLANO ANEXO

Vo.-Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

82.30
30.00

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES				AUDITORIO						
	LONGITUD	A	H	UNID	SUB TOTAL	Convención			OK	
VC 101 EJE F ENTRE EL EJE 1 AL 5	30,00	0,60	0,60	M3	10,8				OK	
VC 112 EJE 2 ENRE EL EJE F AL V	46,12	0,60	0,60	M3	16,60				OK	
VC 112 EJE 2 ENTRE EL EJE V AL Y	6,08	0,60	0,60	M3	2,19				OK	
VC 112 EJE 2 ENTRE EL EJE Y ALZ	3,87	0,60	0,60	M3	1,39				OK	
VC 113 EJE 3 ENTRE EJE F AL K'	15,92	0,60	0,60	M3	5,73				OK	
VC 113 EJE 3 ENTRE EJE L ALV	27,51	0,60	0,60	M3	9,90				OK	
VC 113 EJE 3 ENTRE EJE V AL Y	5,86	0,60	0,60	M3	2,11				OK	
VC 113 EJE 3 ENTRE EJE Y AL Z	3,97	0,60	0,60	M3	1,43				OK	
VC 112 EJE 4 ENRE EL EJE F AL V	46,12	0,60	0,60	M3	16,60				OK	
VC 112 EJE 4 ENTRE EL EJE V AL Y	6,08	0,60	0,60	M3	2,19				OK	
VC 112 EJE 4 ENTRE EL EJE Y ALZ	3,87	0,60	0,60	M3	1,39				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE F AL L'	20,25	0,80	0,60	M3	9,72				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE M AL O	10,18	0,80	0,60	M3	4,89				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE O AL Q	2,73	0,80	0,60	M3	1,31				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE R ALT	3,65	0,80	0,60	M3	1,75				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE T' ALV	4,58	0,80	0,60	M3	2,20				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE V ALY	6,6	0,80	0,60	M3	3,17				OK	
VC 111 EJE 1 ENTRE EL EJE Y ALZ	4,83	0,80	0,60	M3	2,32				OK	
VC 102 EJE H ENTRE EJE 1 AL 2	5,35	0,40	0,60	M3	1,28				OK	
VC 102 EJE H ENTRE EJE 2 AL 3	4,15	0,40	0,60	M3	1,00				OK	
VC 102 EJE H ENTRE EJE 3 AL 4	4,15	0,40	0,60	M3	1,00				OK	
VC 102 EJE H ENTRE EJE 4 AL 5	4,95	0,40	0,60	M3	1,19				OK	
VC 103 EJE I ENTRE EJE 1 AL 2	5,35	0,40	0,60	M3	1,28				OK	
VC 103 EJE I ENTRE EJE 2 AL 3	4,45	0,40	0,60	M3	1,07				OK	
VC 103 EJE I ENTRE EJE 3 AL4	4,45	0,40	0,60	M3	1,07				OK	
VC 103 EJE I ENTRE EJE 4 AL5	5,35	0,40	0,60	M3	1,28				OK	
VC 104 EJE K ENTRE EJE 1 AL 2	1,75	0,40	0,60	M3	0,42				OK	
VC 104 EJE K ENTRE EJE 1 AL 2	3,43	0,40	0,60	M3	0,82				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

VC 104 EJE K ENTRE EJE 2 AL 3	5,58	0,40	0,60	M3	1,34				OK	
VC 104 EJE K ENTRE EJE 3 AL4	5,58	0,40	0,60	M3	1,34				OK	
VC 104 EJE K ENTRE EJE 4 AL 5	1,75	0,40	0,60	M3	0,42				OK	
VC 104 EJE K ENTRE EJE 4 AL 5	3,43	0,40	0,60	M3	0,82				OK	
VC 105 EJE L ENTRE EJE 1 AL 2	5,35	0,40	0,60	M3	1,28				OK	
VC 105 EJE L ENTRE EJE 2 AL 3	4,52	0,40	0,60	M3	1,08				OK	
VC 105 EJE L ENTRE EJE 3 AL 4	4,52	0,40	0,60	M3	1,08				OK	
VC 105 EJE L ENTRE EJE 4 AL 5	5,35	0,40	0,60	M3	1,28				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 1 AL 2	1,65	0,40	0,60	M3	0,40				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 1 AL 2	4,10	0,40	0,60	M3	0,98				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 2 AL 3	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 3 AL 4	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 4 AL 5	4,10	0,40	0,60	M3	0,98				OK	
VC 106 EJE M ENTRE EJE 4 AL 5	1,15	0,40	0,60	M3	0,28				OK	
VC 107 EJE O ENTRE EJE 1 AL 2	6,45	0,40	0,60	M3	1,55				OK	
VC 107 EJE O ENTRE EJE 2 AL 3	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE O ENTRE EJE 3 AL 4	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE O ENTRE EJE 4 AL 5	5,75	0,40	0,60	M3	1,38				OK	
VC 107 EJE Q ENTRE EJE 1 AL 2	6,45	0,40	0,60	M3	1,55				OK	
VC 107 EJE Q ENTRE EJE 2 AL 3	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE Q ENTRE EJE 3 AL 4	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE Q ENTRE EJE 4 AL 5	5,75	0,40	0,60	M3	1,38				OK	
VC 107 EJE T ENTRE EJE 1 AL 2	6,45	0,40	0,60	M3	1,55				OK	
VC 107 EJE T ENTRE EJE 2 AL 3	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE T ENTRE EJE 3 AL 4	6,75	0,40	0,60	M3	1,62				OK	
VC 107 EJE T ENTRE EJE 4 AL 5	6,05	0,40	0,60	M3	1,45				OK	
VC 108 EJE V ENTRE EJE 1 AL 2	5,62	0,40	0,60	M3	1,35				OK	
VC 108 EJE V ENTRE EJE 2 AL 3	4,66	0,40	0,60	M3	1,12				OK	
VC 108 EJE V ENTRE EJE 3 AL 4	4,66	0,40	0,60	M3	1,12				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS				OBSERVACIONES					Cumple	
									SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES				AUDITORIO						
VC 108 EJE V ENTRE EJE 4 AL 5	5,62	0,40	0,60	M3	1,35				OK	
VC 109 EJE Y ENTRE EJE 1 AL 2	5,62	0,40	0,60	M3	1,35				OK	
VC 109 EJE Y ENTRE EJE 2 AL 3	4,88	0,40	0,60	M3	1,17				OK	
VC 109 EJE Y ENTRE EJE 3 AL 4	4,88	0,40	0,60	M3	1,17				OK	
VC 109 EJE Y ENTRE EJE 4 AL 5	5,62	0,40	0,60	M3	1,35				OK	
VC 110 EJE Z ENTRE EJE 2 AL 3	6,25	0,40	0,60	M3	1,50				OK	
VC 110 EJE Z ENTRE EJE 3 AL 4	6,25	0,40	0,60	M3	1,50				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE F AL H	4,00	0,60	0,60	M3	1,44				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE H AL L	8,30	0,60	0,60	M3	2,99				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE K AL M	4,75	0,60	0,60	M3	1,71				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE M AL O	3,65	0,60	0,60	M3	1,31				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE O AL Q	2,73	0,60	0,60	M3	0,98				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE Q AL T	3,65	0,60	0,60	M3	1,31				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE T AL V	4,58	0,60	0,60	M3	1,65				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE V AL Y	6,60	0,60	0,60	M3	2,38				OK	
VC 114 EJE 5 ENTRE EJE V AL Y	4,83	0,60	0,60	M3	1,74				OK	
VC 110 EJE Z ENTRE EJE 4 AL 5	7,25	0,70	0,60	M3	3,05				OK	
VC 110 EJE Z ENTRE EJE 1 AL 2	7,25	0,70	0,60	M3	3,05				OK	
EJE Y-2	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 2-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE 2-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE Y-3	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 3-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE 3-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE Y-4	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 4-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE 4-Y	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE V-2	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 2-V	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055821	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

EJE 2-V	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE V-4	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 4-V	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE 4-V	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE V-3	2,92	0,80	0,60	M3	1,40				OK	
EJE 3-V	1,06	0,80	0,60	M3	0,51				OK	
EJE 3-V	1,06	0,80	0,60	M3	0,51				OK	
EJE L-2	1,3	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE L-2	1,3	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE L-3	2,47	0,70	0,60	M3	1,04				OK	
EJE 3-L	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE 3-L	0,88	0,70	0,60	M3	0,37				OK	
EJE L-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE L-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE K-2	0,68	0,70	0,60	M3	0,29				OK	
EJE K-2	0,68	0,70	0,60	M3	0,29				OK	
EJE K-4	0,68	0,70	0,60	M3	0,29				OK	
EJE K-4	0,68	0,70	0,60	M3	0,29				OK	
EJE K-3	0,5	0,60	0,60	M3	0,18				OK	
EJE K-3	0,5	0,60	0,60	M3	0,18				OK	
EJE I-2	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE I-2	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE I-3	1,00	0,70	0,60	M3	0,42				OK	
EJE I-3	1,00	0,70	0,60	M3	0,42				OK	
EJE I-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE I-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE H-2	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE H-2	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE H-3	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoria:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoria	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES				AUDITORIO						
EJE H-3	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE H-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
EJE H-4	1,30	0,70	0,60	M3	0,55				OK	
DADO EJE 5-H	1,60	1,00	0,60	M3	0,96				OK	
DADO EJE 5-K	1,60	0,90	0,60	M3	0,86				OK	
DADO EJE 5-M	1,95	1,20	0,60	M3	1,40				OK	
DADO EJE 5-O	3,80	1,50	0,60	M3	3,42				OK	
DADO EJE 5-Q	3,80	1,50	0,60	M3	3,42				OK	
DADO EJE 5-T	1,95	1,20	0,60	M3	1,40				OK	
DADO EJE 5-V	1,95	0,70	0,60	M3	0,82				OK	
DADO EJE 1-Y	1,95	0,90	0,60	M3	1,05				OK	
DADO EJE 1-V	1,95	0,90	0,60	M3	1,05				OK	
DADO EJE 1-T	1,95	0,90	0,60	M3	1,05				OK	
DADO EJE 1-Q	3,80	1,00	0,60	M3	2,28				OK	
DADO EJE 1-O	3,80	1,00	0,60	M3	2,28				OK	
DADO EJE 1-M	1,95	0,90	0,60	M3	1,05				OK	
Vtc 101 DEL EJE F AL H DESDE EL EJE 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE F AL H DESDE EL EJE 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE F AL H DESDE EL EJE 3 AL 4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE F AL H DESDE EL EJE 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE H AL I DESDE EL EJE 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE H AL I DESDE EL EJE 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE H AL I DESDE EL EJE 3 AL 4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES					AUDITORIO						
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE H AL I DESDE EL EJE 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE I AL K DESDE EL EJE 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE I AL K DESDE EL EJE 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE I AL K DESDE EL EJE 3 AL 4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE I AL K DESDE EL EJE 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE L AL M DESDE EL EJE 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE L AL M DESDE EL EJE 2 AL3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE L AL M DESDE EL EJE 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE L AL M DESDE EL EJE 4 AL5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 103 DEL EJE M AL O DESDE EL EJE 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,45	0,20	0,60	M3	0,77					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 102 DEL EJE M AL O DESDE EL EJE 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 102 DEL EJE M AL O DESDE EL EJE 3 AL 4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 104 DEL EJE M AL O DESDE EL EJE 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	5,75	0,20	0,60	M3	0,69					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE O AL Q DESDE EL 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE O AL Q DESDE EL 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

Vtc 101 DEL EJE O AL Q DESDE EL 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE O AL Q DESDE EL 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE Q AL T DESDE EL 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE Q AL T DESDE EL 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE Q AL T DESDE EL 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE Q AL T DESDE EL 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE T AL V DESDE EL 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE T AL V DESDE EL 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE T AL V DESDE EL 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE T AL V DESDE EL 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE V AL Y DESDE EL 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80				OK	
Vtc 101 DEL EJE V AL Y DESDE EL 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
Vtc 101 DEL EJE V AL Y DESDE EL 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81				OK	

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

Vtc 101 DEL EJE V AL Y DESDE EL 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE Y AL Z DESDE EL 1 AL 2	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Vtc 101 DEL EJE Y AL Z DESDE EL 2 AL 3	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE Y AL Z DESDE EL 3 AL4	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
	6,75	0,20	0,60	M3	0,81					OK	
Vtc 101 DEL EJE Y AL Z DESDE EL 4 AL 5	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
	6,65	0,20	0,60	M3	0,80					OK	
Riostra entre eje 1 y 2	50,92	0,12	0,60	M3	3,67					OK	
Riostra entre eje 2 y 3	51,41	0,12	0,60	M3	3,70					OK	
Riostra entre eje 3 y 4	51,41	0,12	0,60	M3	3,70					OK	
Riostra entre eje 4 y 5	50,92	0,12	0,60	M3	3,67					OK	
DADO EJE 3-Z	1,60	0,60	0,60	M3	0,58					OK	
DADO EJE K ENTRE EJE 1-2	0,80	0,80	0,60	M3	0,38					OK	
DADO EJE K ENTRE EJE 4-5	0,80	0,80	0,60	M3	0,38					OK	
			TOTAL	M3	299,79						

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	M3		Liberación de actividad:		CONCRETO VIGAS CIMENTACION AUDITORIO		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

VER PLANO ANEXO

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

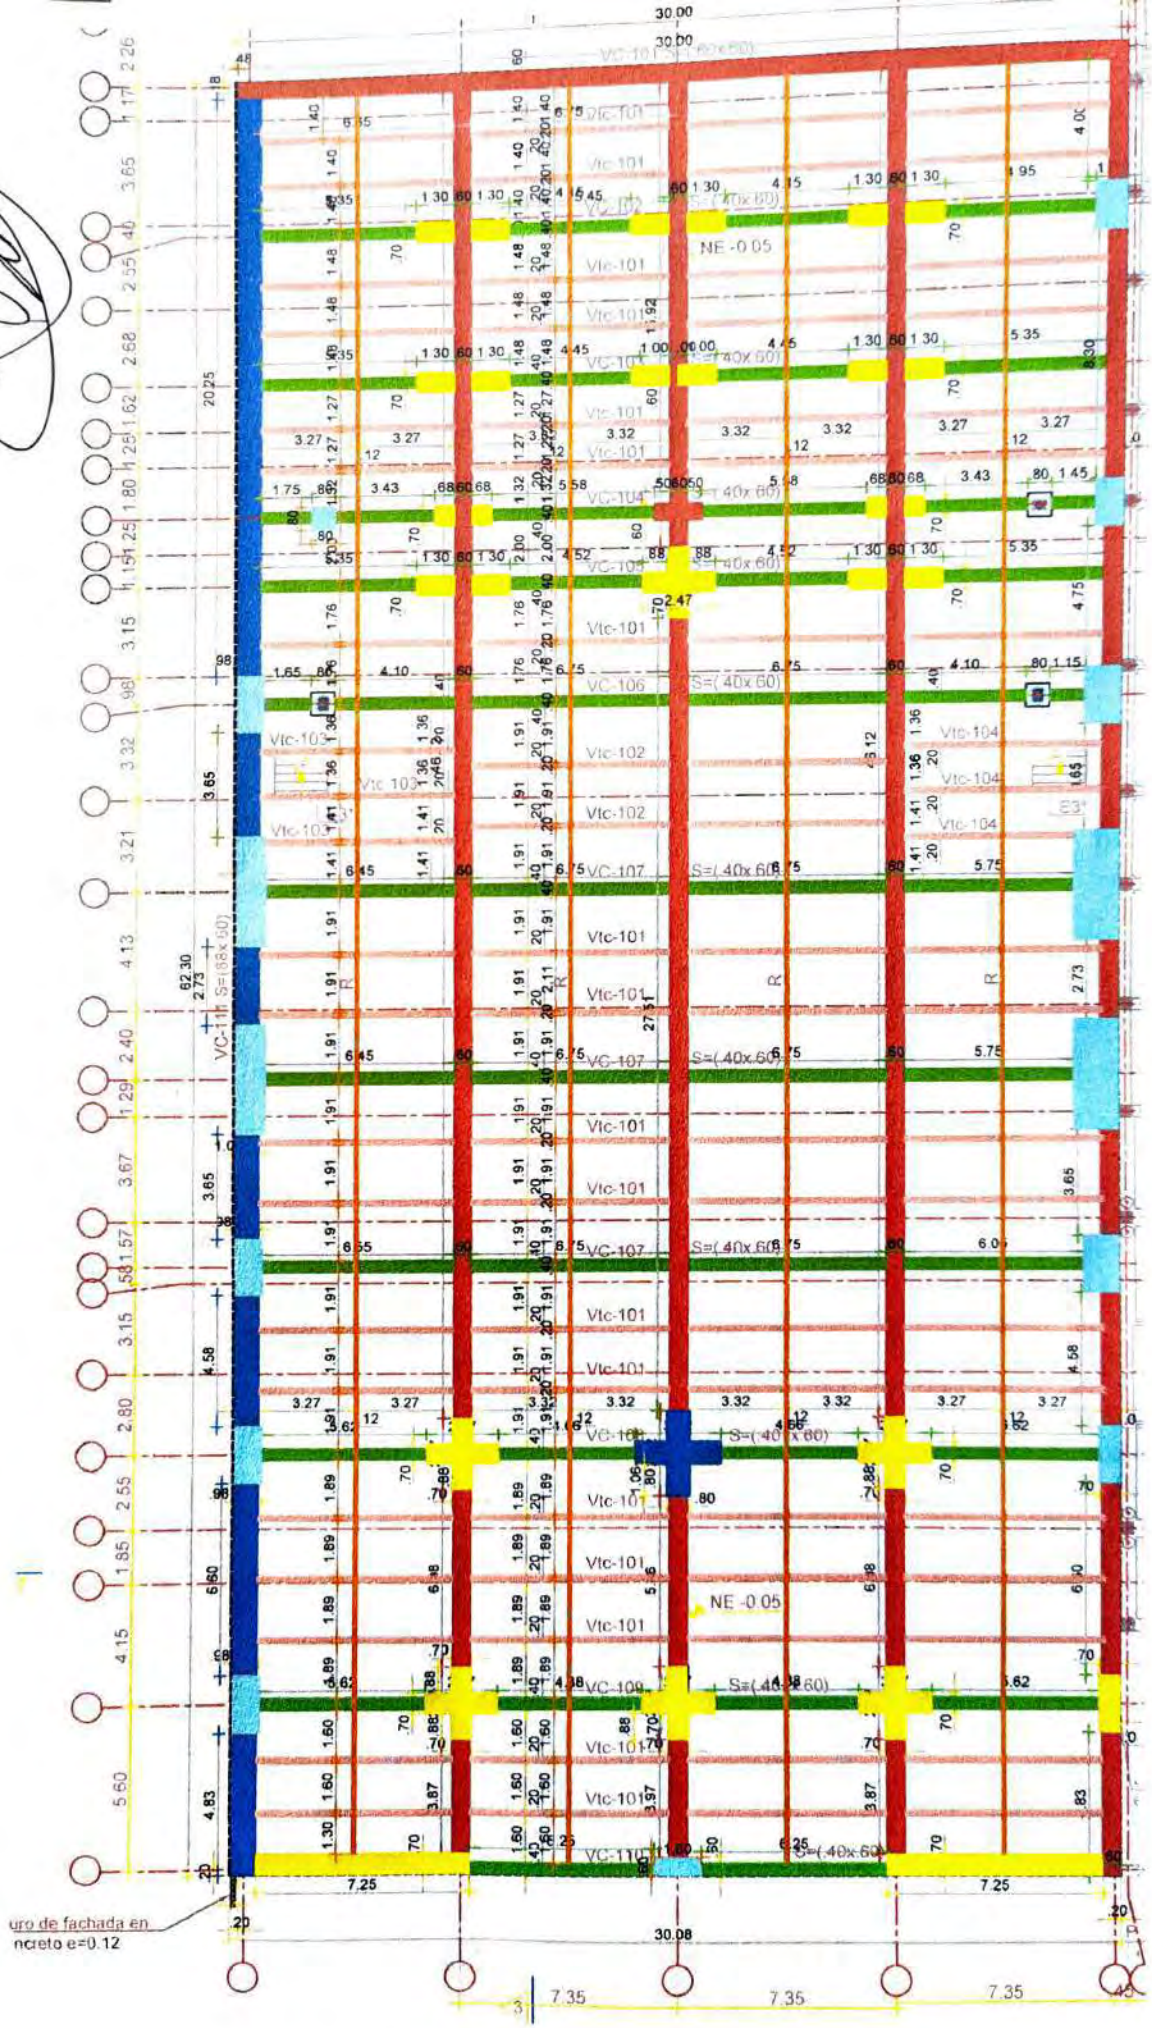
30.00
30.00
VC-101 (25x50)
Vtc-101
NE -0.05
S=(40x60)
VC-104
VC-105
VC-106
VC-107
VC-109
VC-110
Vtc-102
Vtc-103
Vtc-104
7.25
30.08
7.35
7.35
7.35
uro de fachada en
ncreto e=0.12

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	24 de Junio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	ML KG		Liberación de actividad:		ACERO ESCALERAS DE AULA POLIVALENTE		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AULA POLIVALENTE		
VC-101. (.50X.60)		X	
VC-102. (.50X.60)		X	
VC-108. (.50X.60)	Tiene un fleje de más	X	
VC-109. (.50X.60)		X	
VC-110. (.50X.60)		X	
VC-111. (.50X.60)		X	
VC-112. (.50X.60)		X	
VC-113. (.50X.60)		X	
VC-114. (.50X.60)		X	
VC-115. (.50X.60)		X	
VCT-101		X	
VCT-102		X	
VCT-103		X	
VCT-104		X	
VCT-105		X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	24 de junio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	ML KG		Liberación de actividad:		ACERO ESCALERAS DE AULA POLIVALENTE		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AULA POLIVALENTE		
VCT-106	Tiene 3 flejes de más	x	
VCT-107		x	
VCT-108		x	
VCT-109		x	
VCT-110		x	
VCT-111		x	
VCT-112		x	
VCT-113		x	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	24 de junio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	ML KG		Liberación de actividad:		ACERO ESCALERAS DE AULA POLIVALENTE		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AULA POLIVALENTE		



Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	27 de junio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN DE PLAZOLETA		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VC-111. (.50X.60) (5'-14)	1 Fleje de más, traslapos más largos es de 1.50, queda de 4mts	x	
VC-112. (.50X.60) (5'-14)	1 fleje de más	x	
VC-112. (.50X.60) (5'-14)		x	
VC-113. (.50X.60) (5'-14)		x	
VC-116. (.50X.60) (0-T'/5')	se libera hasta el eje 5' y comienzo del T' al V (ejes)	x	
VC-117. (.50X.60) (T'-V)	Del eje T' se liberan 11 - Pendientes 7.	x	
VC-120. (.50X.60) (5-T')	Del eje T' se liberan 28 - Pendientes 5.	x	
VC-124. (.50X.60) (N-T')	menos 1 fleje.	x	
VC-125. (.50X.60) (5-T')	Del eje T' se liberan 29 - Pendientes 1.	x	
VC-133. (.50X.60) (5-T')	Del eje T' se liberan 18 - Pendientes 8	x	
VC-134. (.50X.60) (5-T')	Del eje T' se liberan 26 - Pendientes 12	x	

C.M.C.Z.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoria:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoria	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN DE PLAZOLETA		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VTC-107A S.		x	
VTC-107A S.		x	
VTC-107 S.		x	
VTC-107 S.	Más un fleje	x	
VTC-107 S.		x	
VTC-107 S.		x	
VTC-107 S.		x	
VTC-107 S.		x	
VTC-107 S.		x	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN DE PLAZOLETA		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

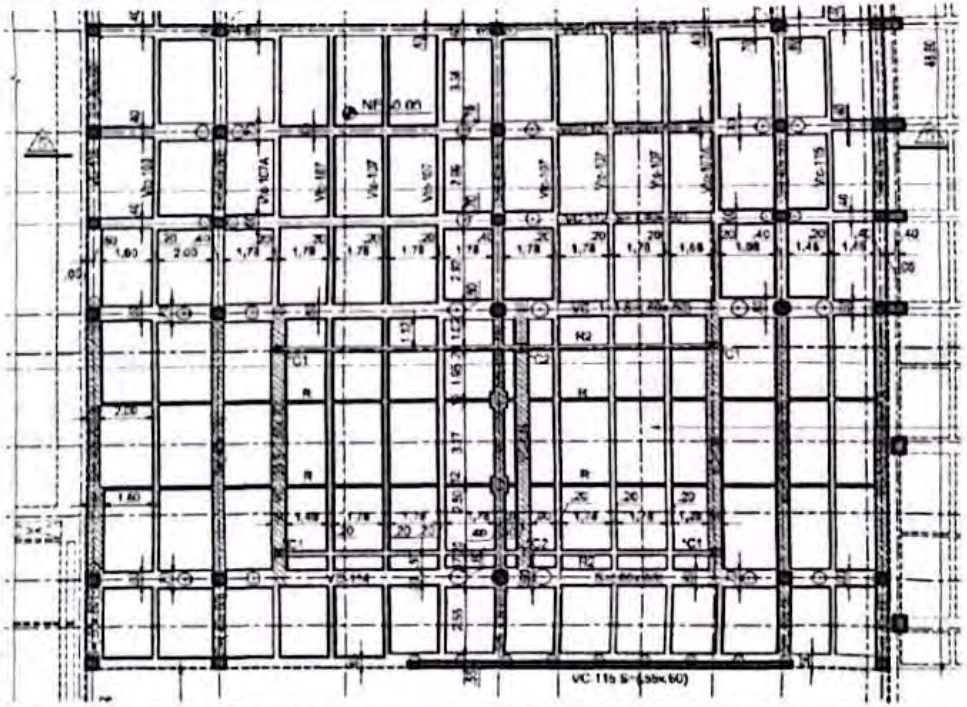

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**	28 de junio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoría**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO COLUMNAS DE PLAZOLETA**		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
COLUMNA A-23		X	
COLUMNA B-23		X	

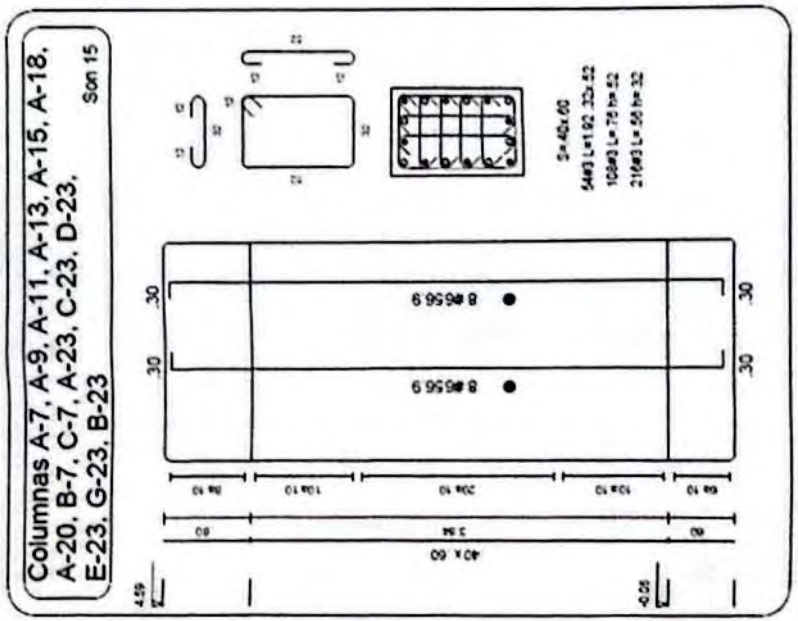

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	02 JULIO 24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCCNTR 5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		
VTCR-01 EJE Z1 ENTRE Z AL Z1		X	
VCR-01 Z1-1 AL Z1-5		X	
VTCR-02 ENTRE ZI AL ZII		X	
VTCR-03 ENTRE ZI AL ZII		X	
VCR-02 ZI-1 AL Z1-5		X	
VTCR-04 ENTRE ZII AL ZIII		X	
VCR-03 DEL ZI AL ZII		X	
VTCR-06 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-04 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-05 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-06 DEL ZI AL ZII		X	


Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1 PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

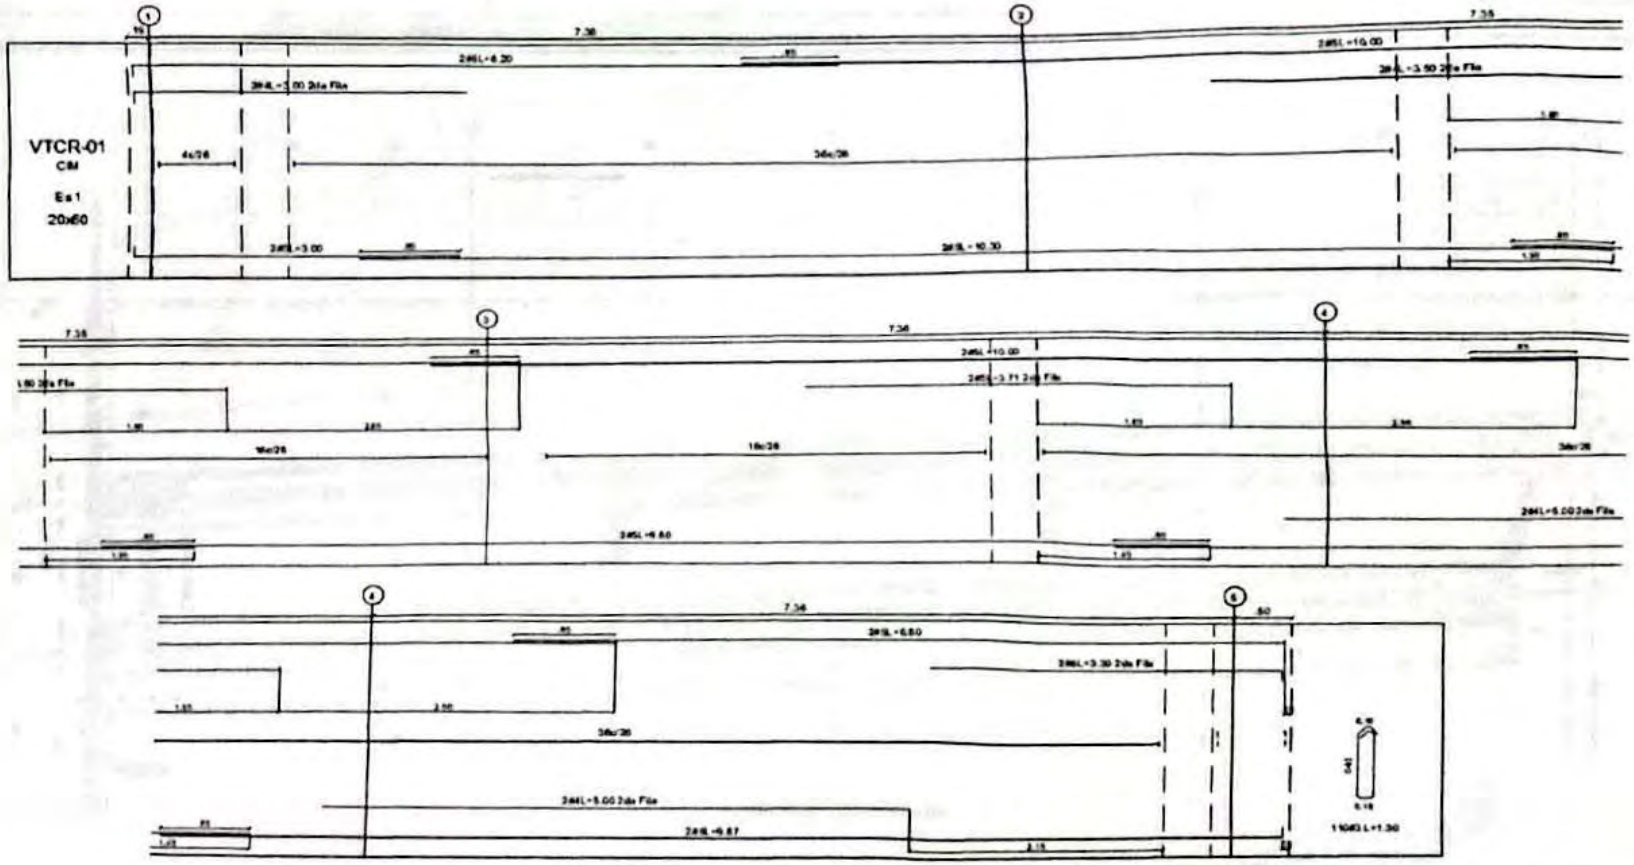




Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

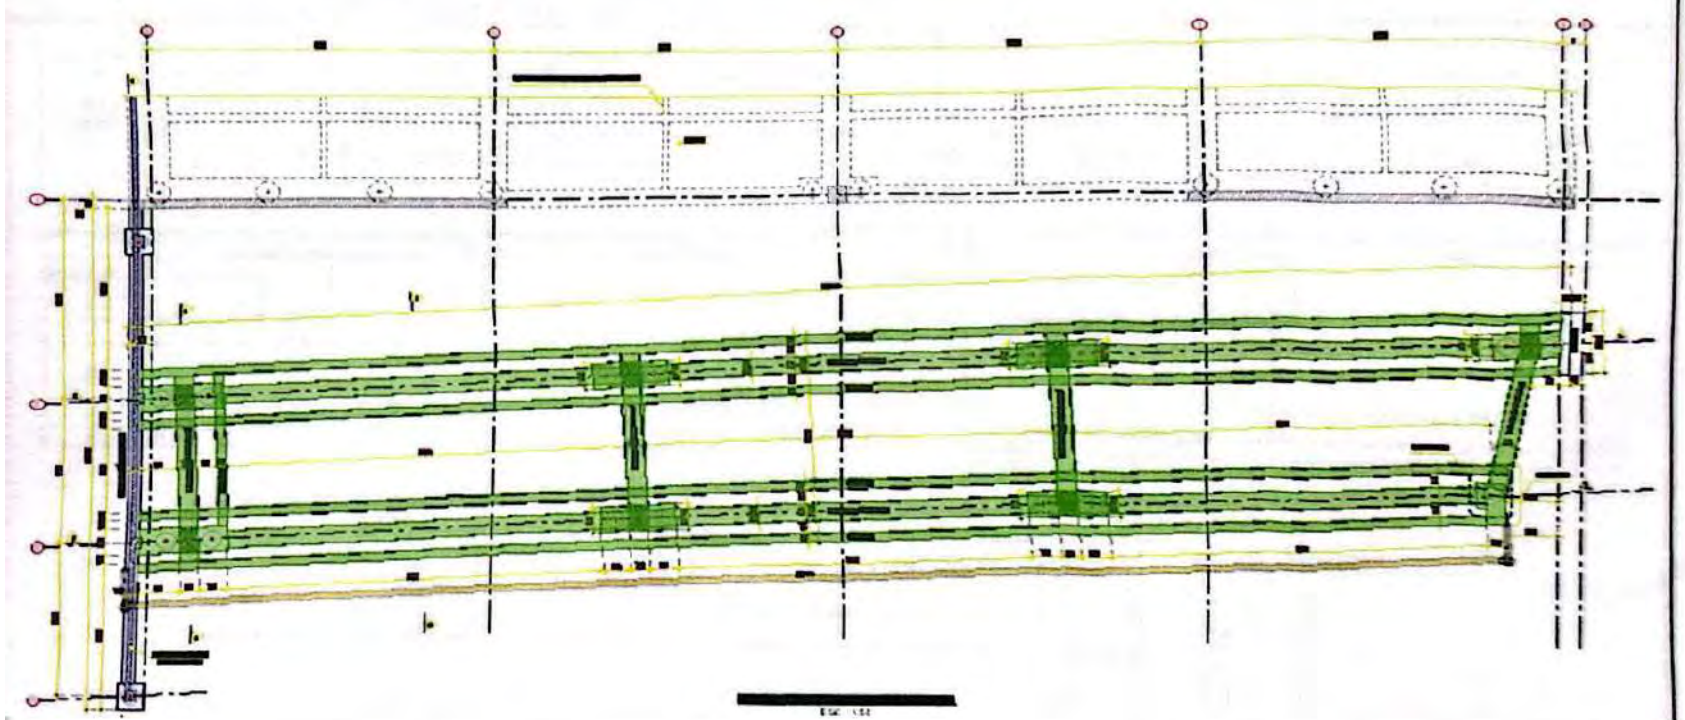

Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES						IN-CA2023-5347795
							Versión No. 01
INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCCNTR.5055621	Interventoria:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoria	CO1 PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		
ELEMENTOS		OBSERVACIONES				Cumple	
						SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES			AUDITORIO				

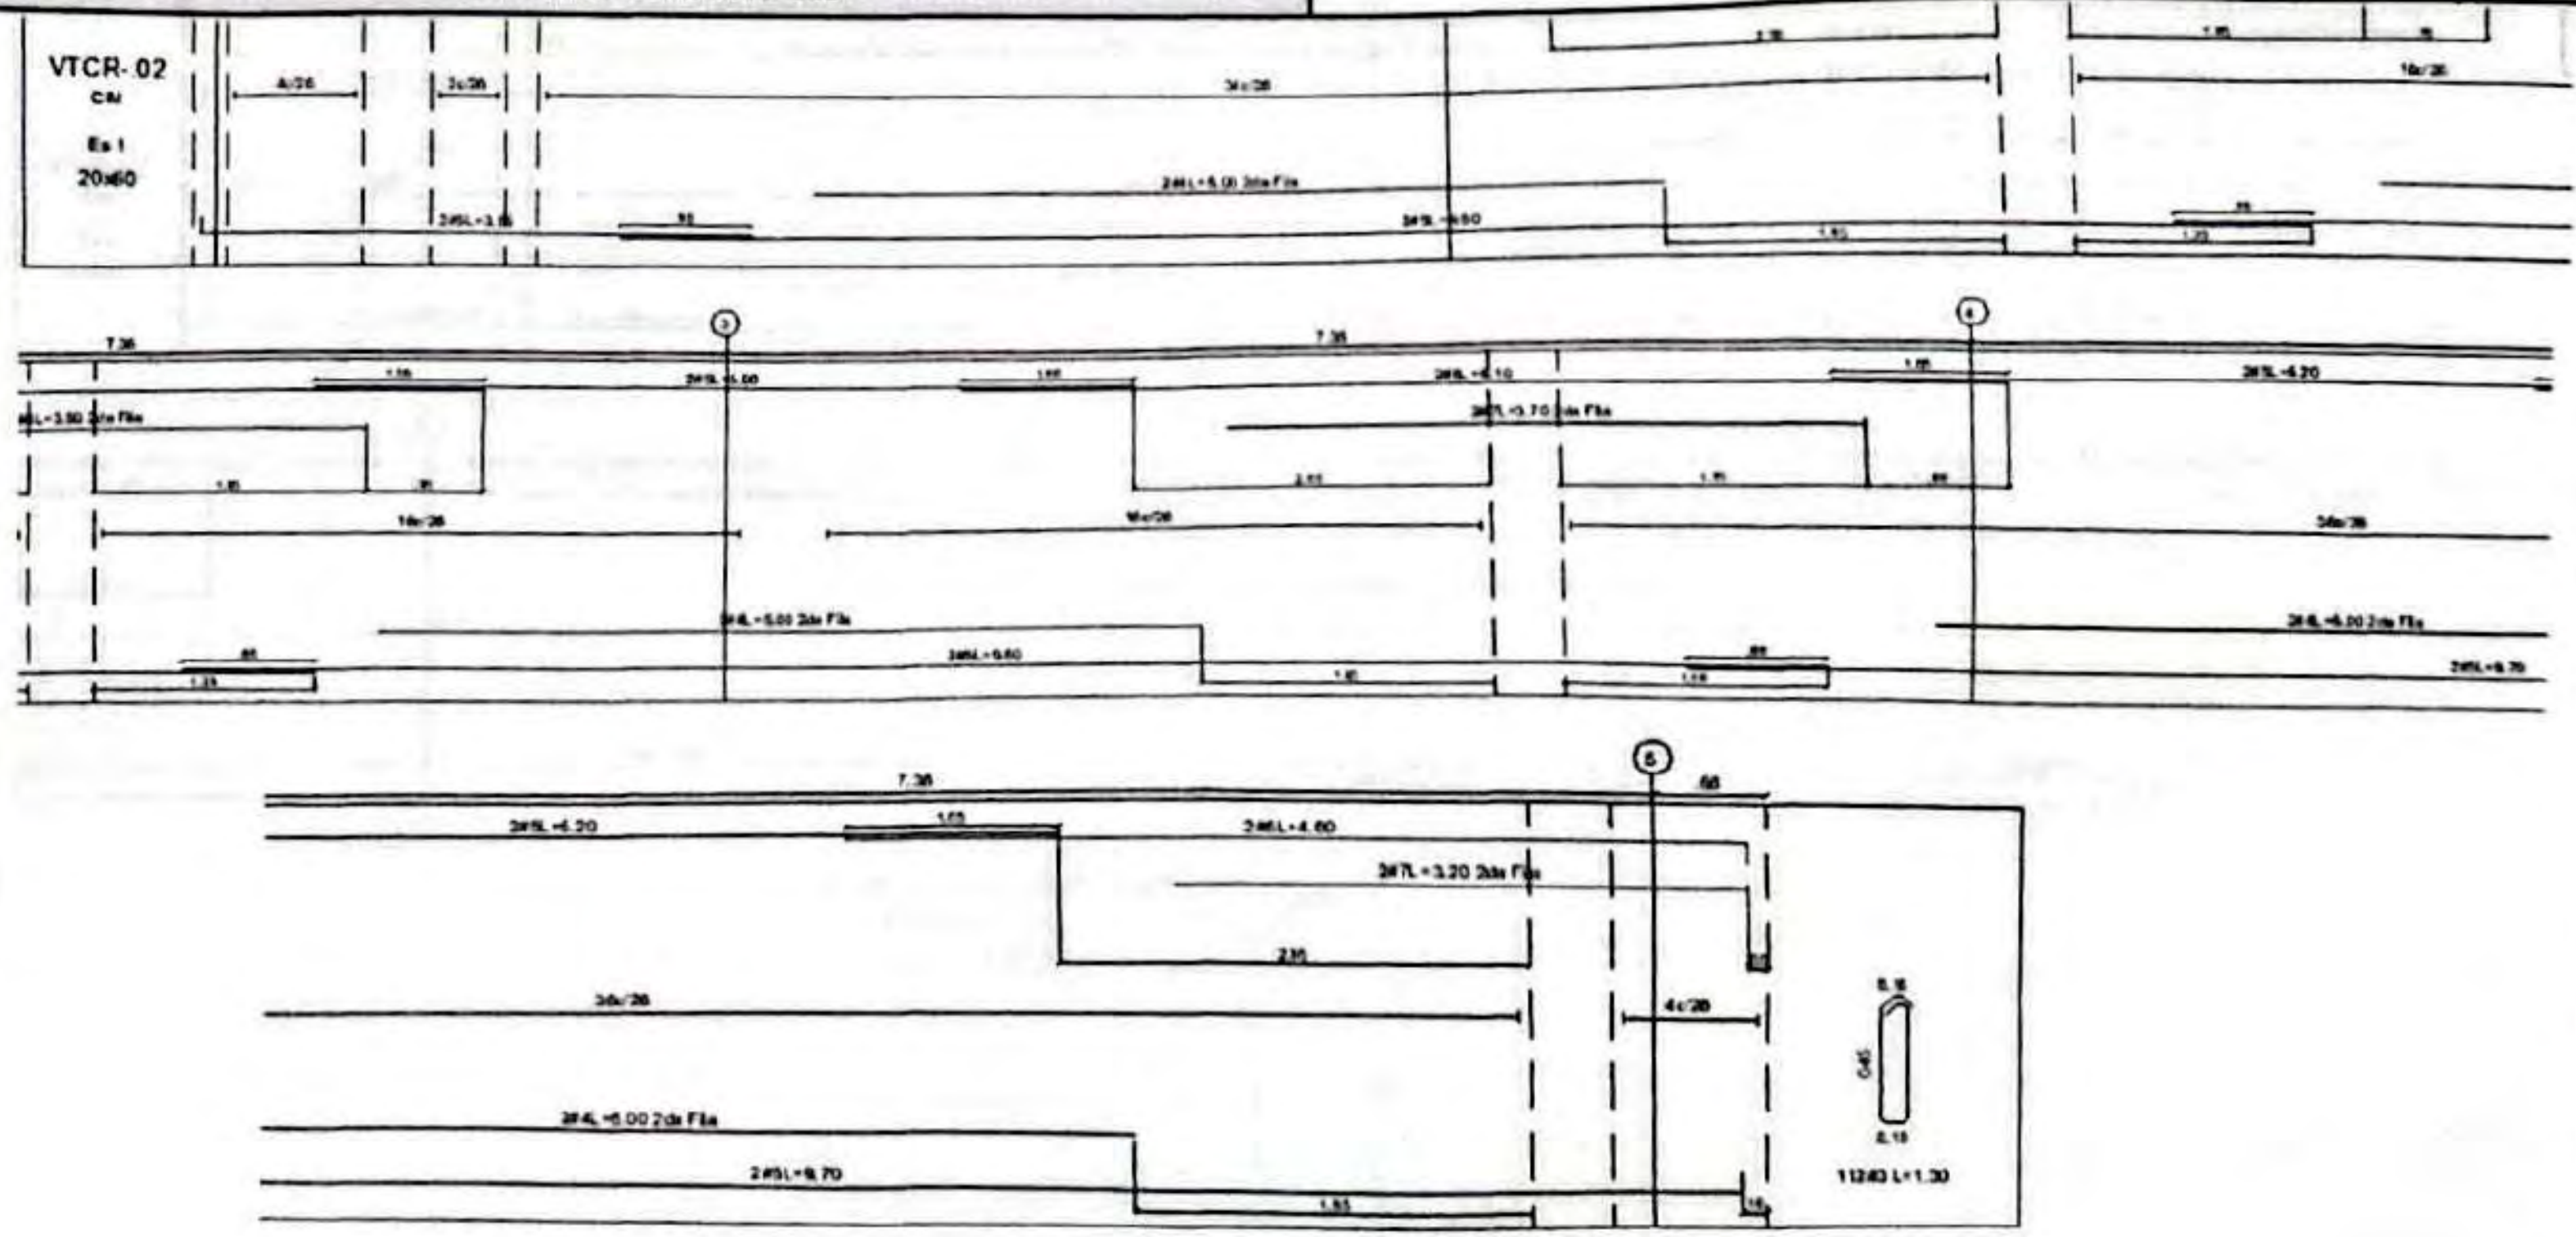

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

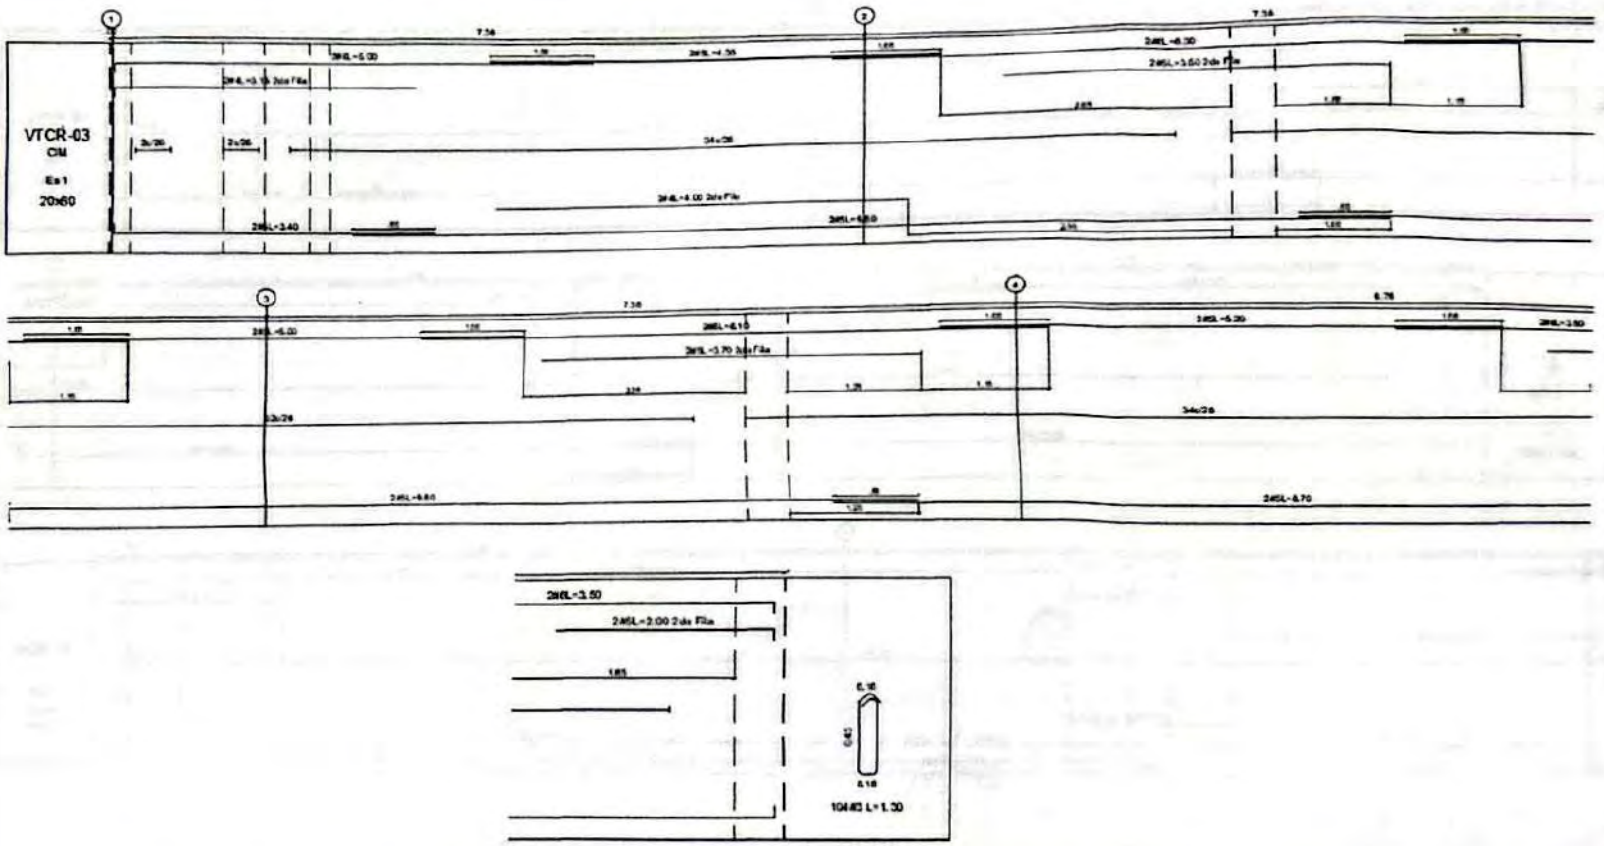


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		


ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

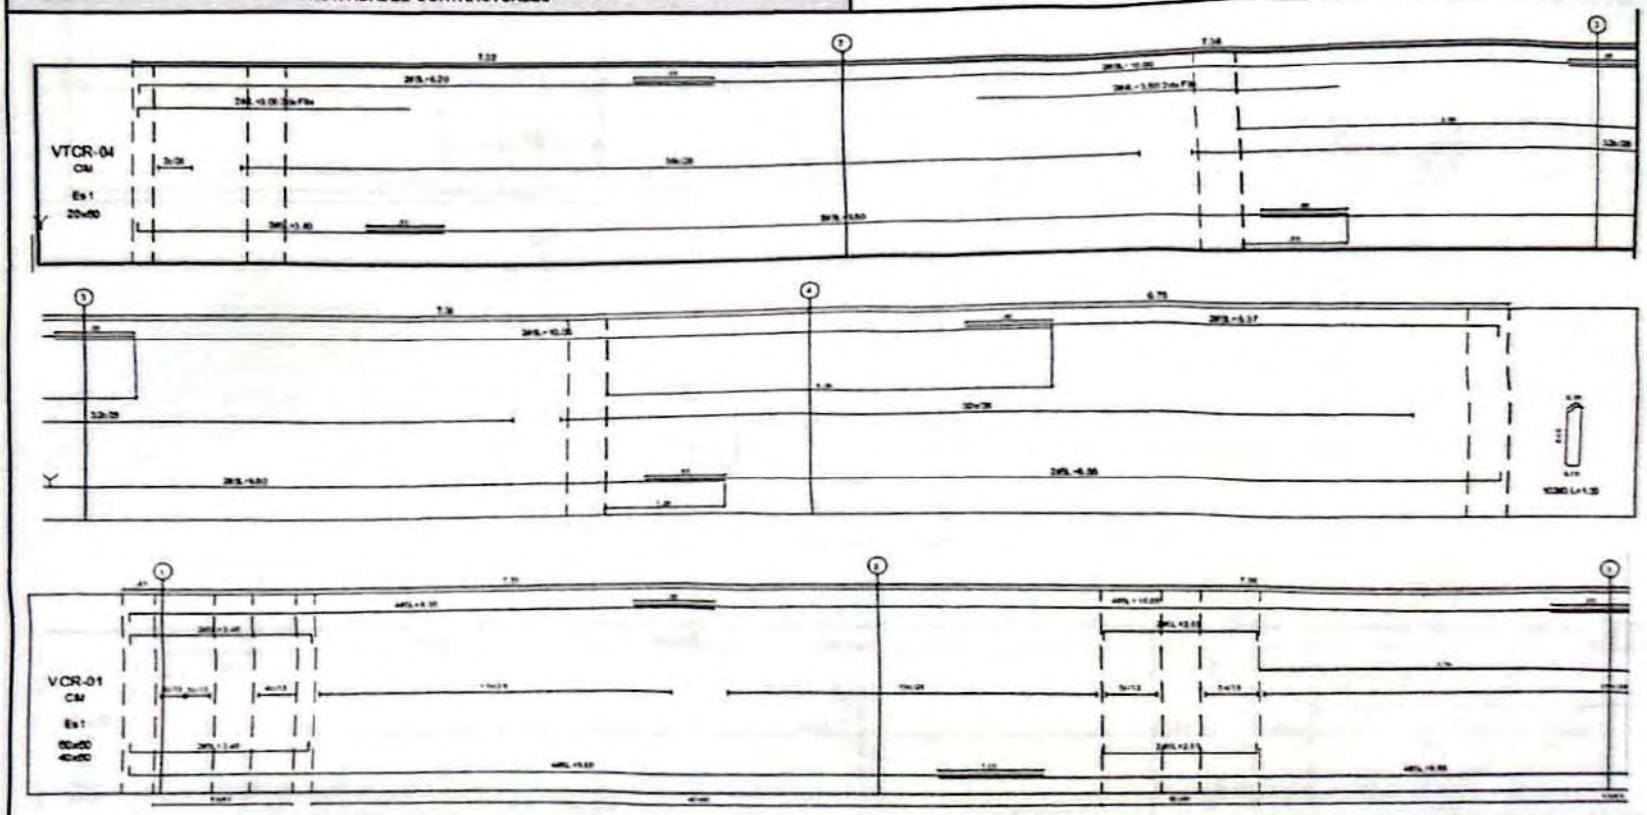


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES							BI-CA2023-5347795 Versión No. 01
INFORMACIÓN GENERAL								
Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**			
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoría**	CO1.PCCNTR.5347795	
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.**			
ELEMENTOS		**OBSERVACIONES**					**Cumple**	
							SI	**NO**
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES					**AUDITORIO**			

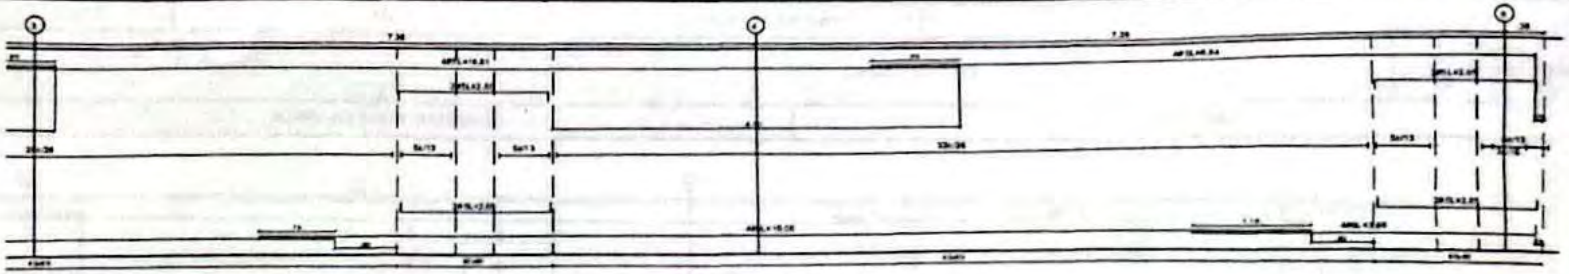

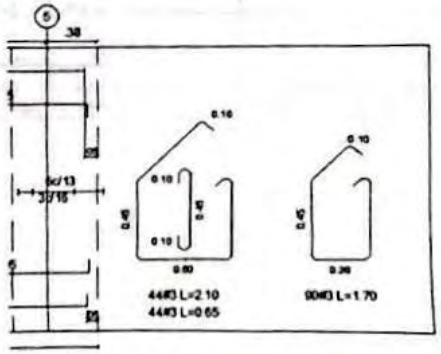

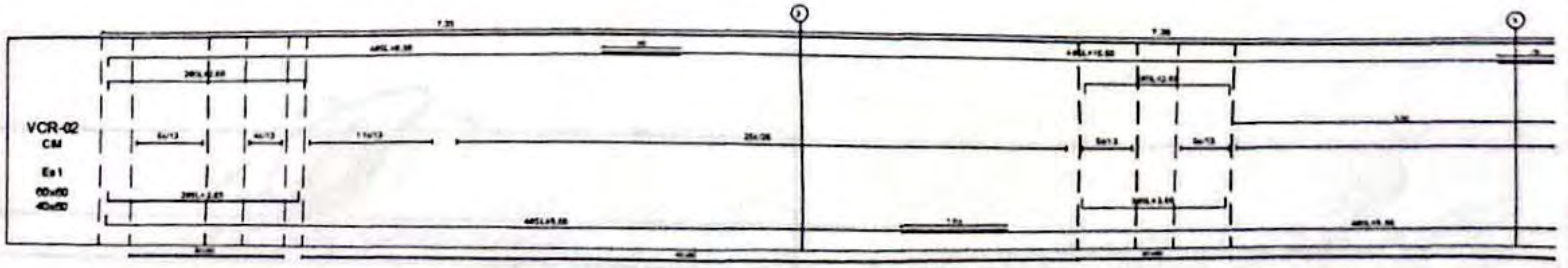


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		



Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	02 Julio 24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCCNTR 5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		
VTCR-01 EJE Z1 ENTRE Z AL Z1		X	
VCR-01 Z1-1 AL Z1-5		X	
VTCR-02 ENTRE ZI AL ZII		X	
VTCR-03 ENTRE ZI AL ZII		X	
VCR-02 ZI-1 AL Z1-5		X	
VTCR-04 ENTRE ZII AL ZIII		X	
VCR-03 DEL ZI AL ZII		X	
VTCR-06 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-04 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-05 DEL ZI AL ZII		X	
VCR-06 DEL ZI AL ZII		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA			FECHA	02 Julio 24.	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría: CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS	

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VC 111 (0,60X0,60) Eje X-27 al X -14		X	
VC 110 (0,80X0,60) Eje U-27 al U-14		X	
VC 118 (0,40X0,60) Eje 15X al 15U		X	
VTC 107 (0,20X0,60) Eje 18-X al 18-U		X	
VC 114 (0,40X0,60) Eje 19-X al 19-U		X	
VTC 109 (0,20X0,60) Eje X-U entre 19 y 21		X	
VC 115 (0,40X0,60) Eje 21-X al 21-U		X	
VTC 110 (0,20X0,60) Eje X-U entre 21-22		X	
VC 116 (0,40X0,60) Eje 22-X al 22-U		X	
VTC 107 (0,20X0,60) Eje X-U entre 22-24		X	
VC 117 (0,40X0,60) Eje 24-X al 24-U		X	
VTC 111 (0,20X0,60) Eje X-U entre 24-25		X	
VC 118 (0,40X0,60) Eje 25-X al 25-U		X	
VTC 112 (0,20X0,60) Eje 26-X al 26-U		X	
VC 120 (0,40X0,60) Eje 27-X al 27-U		X	
VC Eje 17 entre X-U		X	
VTC 101 entre Eje 14-15 entre U-X		X	
VTC 103 Eje 16-X al 16-U		X	
R (riostra) del eje 14 al eje 27 entre los ejes U-X		X	
		X	
		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA


Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	in-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCONTR 5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1 PCONTR 6347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

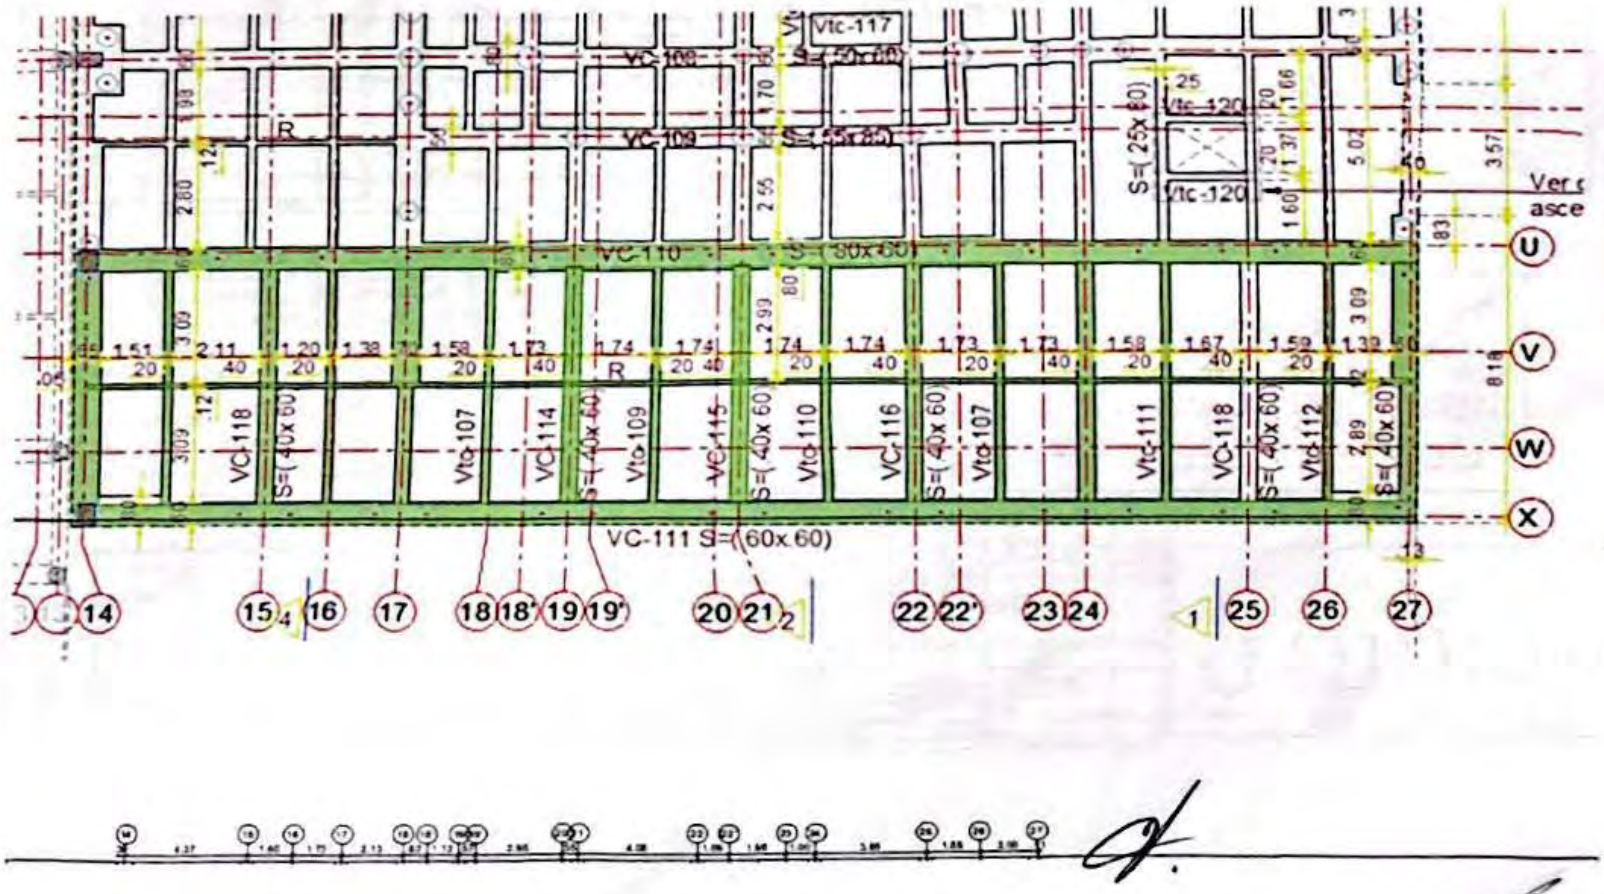

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoria:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS**		


ELEMENTOS	**OBSERVACIONES**	**Cumple**	
		SI	**NO**


ACTIVIDADES-CONTRACTUALES


PLAZOLETA

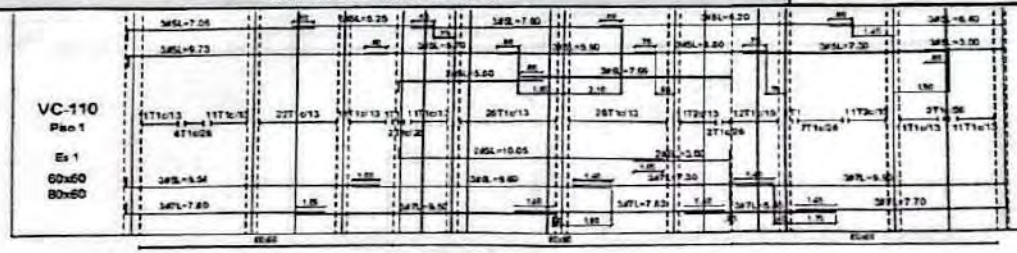




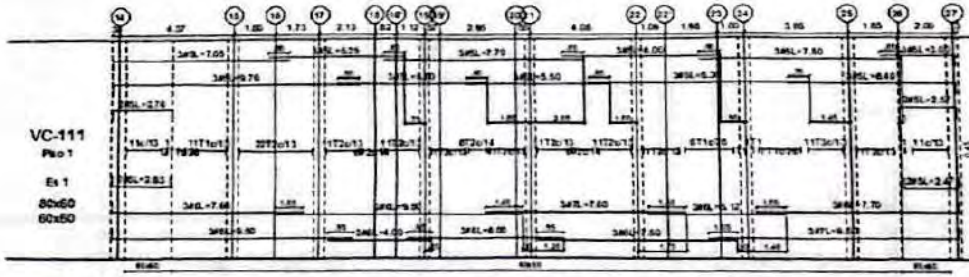








Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

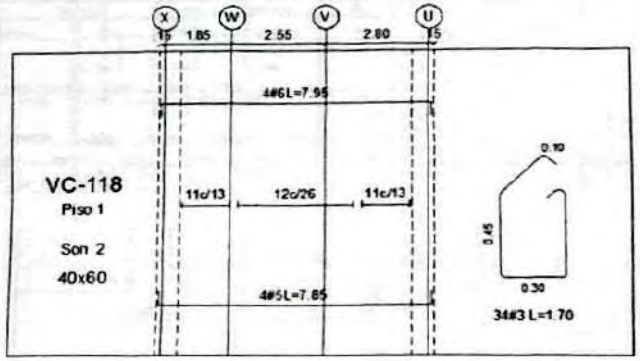




Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055821	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

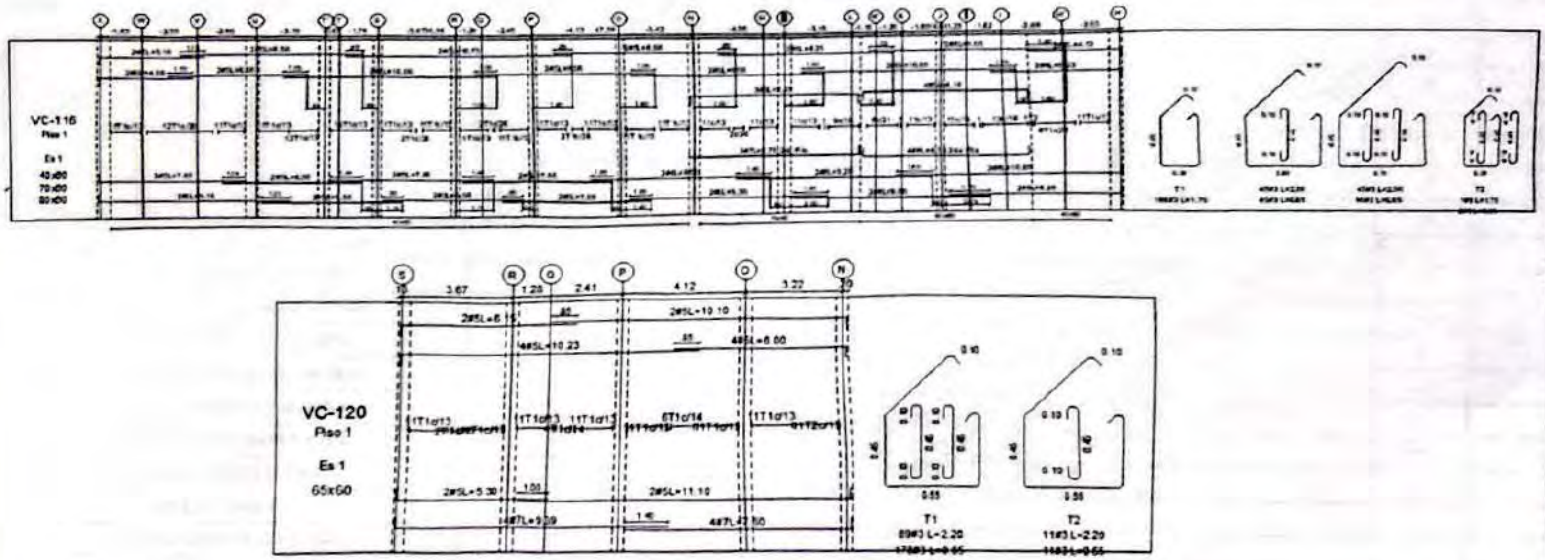

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	02 JULIO 24.	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VC 111 (0,60X0,60) Eje X-27 al X -14		X	
VC 110 (0,80X0,60) Eje U-27 al U-14		X	
VC 118 (0,40X0,60) Eje 16X al 15U		X	
VTC 107 (0,20X0,60) Eje 18-X al 18-U		X	
VC 114 (0,40X0,60) Eje 19-X al 19-U		X	
VTC 109 (0,20X0,60) Eje X-U entre 19 y 21		X	
VC 115 (0,40X0,60) Eje 21-X al 21-U		X	
VTC 110 (0,20X0,60) Eje X-U entre 21-22		X	
VC 116 (0,40X0,60) Eje 22-X al 22-U		X	
VTC 107 (0,20X0,60) Eje X-U entre 22-24		X	
VC 117 (0,40X0,60) Eje 24-X al 24-U		X	
VTC 111 (0,20X0,60) Eje X-U entre 24-25		X	
VC 118 (0,40X0,60) Eje 25-X al 25-U		X	
VTC 112 (0,20X0,60) Eje 26-X al 26-U		X	
VC 120 (0,40X0,60) Eje 27-X al 27-U		X	
VC Eje 17 entre X-U		X	
VTC 101 entre Eje 14-15 entre U-X		X	
VTC 103 Eje 16-X al 16-U		X	
R (riostra) del eje 14 al eje 27 entre los ejes U-X		X	
		X	
		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**	3 de Julio de 2024	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoría**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO COLUMNAS DE PLAZOLETA**		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
COLUMNA G´-6/7		✓	
COLUMNA G´-7		✓	
COLUMNA G´-7/8		✓	
COLUMNA G´-8/9		✓	
COLUMNA G´-9/10		✓	
COLUMNA G´-11	Un fleje de más.	✓	
COLUMNA C-23		✓	
COLUMNA D-23		✓	
COLUMNA E-23		✓	
COLUMNA G-23		✓	
COLUMNA G´-22		✓	
COLUMNA G-20		✓	
COLUMNA G´-20		✓	

C.M.C.Z.

Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**		
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoría**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO COLUMNAS DE PLAZOLETA**		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO


Columnas G'-11, G'-6/7, G'-7', G'-7/8, G'-8/9, G'-9/10 Son 6

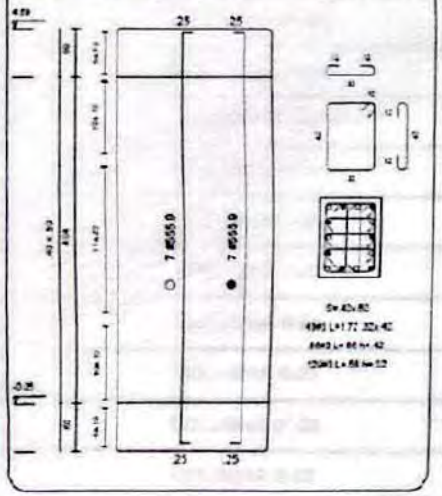


Columnas A-7, A-9, A-11, A-13, A-15, A-18, A-20, B-7, C-7, A-23, C-23, D-23, E-23, G-23, B-23 Son 15

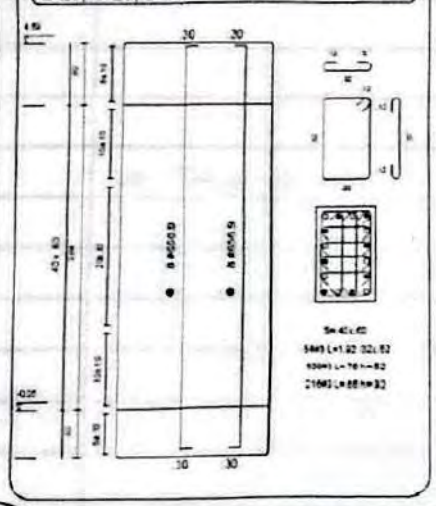

Columnas G'-20, G'-18, G'-15, O-5', P-5', R-5', S-5', W-5', X-5', X-13', O-13', P-13', R-13', S-13', W-13', G-5', X-6, G'-5', G'-13', G'-22, H'-5', H'-13', I'-5', I'-13', K-5', K'-13', L'-5', L'-13', N-5', N-13' Son 30

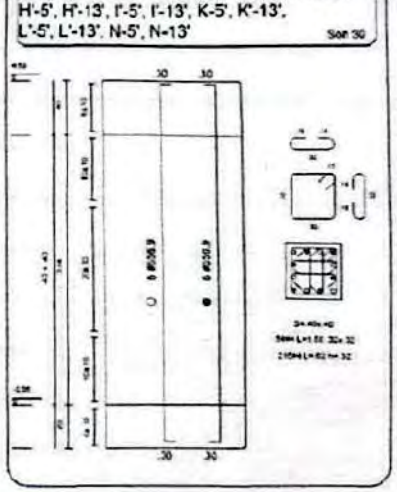

Columnas B-9, B-11, B-13, B-15, B-18, B-20, G-9, G-20, C-9, C-20, D-20, E-20, D-9, E-9, G-7/8 Son 15

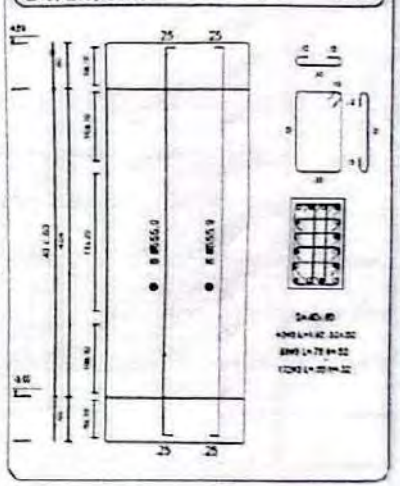

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-GA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	4-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		
COLUMNA A15 (PLAZOLETA)		X	
COLUMNA A18 (PLAZOLETA)		X	
COLUMNA B15 (PLAZOLETA)		X	
COLUMNA B18 (PLAZOLETA)		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA


Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	4-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

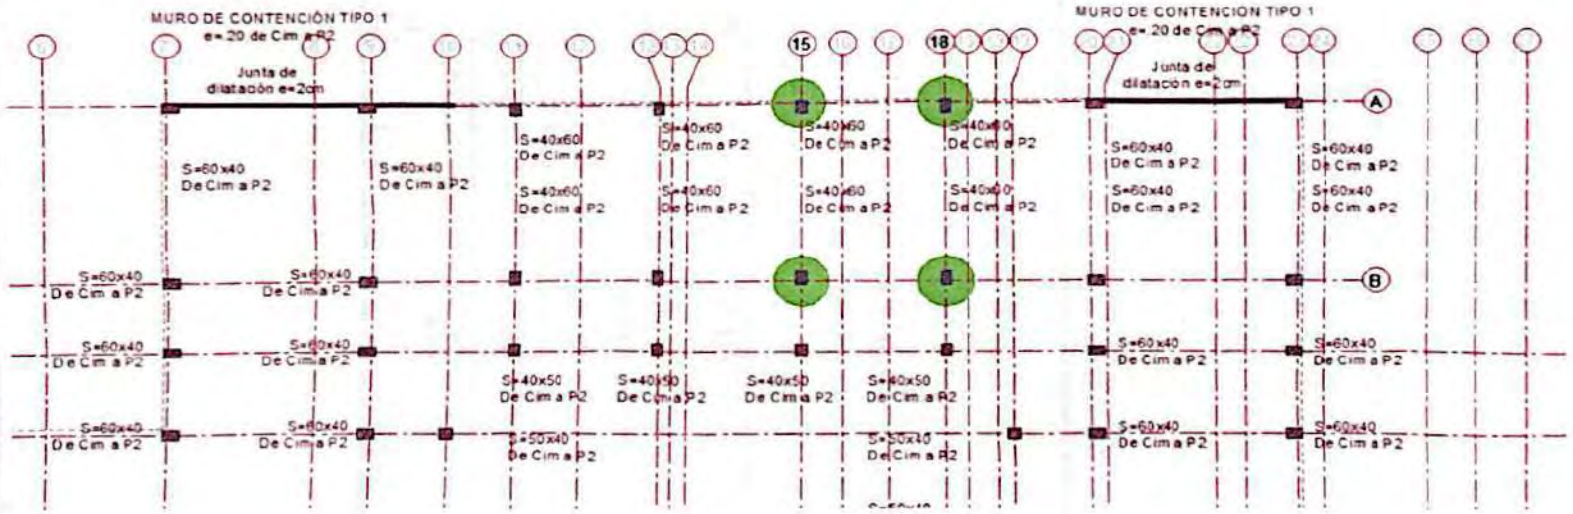


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	4-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

Columnas A-7, A-9, A-11, A-13, A-15, A-18, A-20, B-7, C-7, A-23, C-23, D-23, E-23, G-23, D-7, B-23 Son 16

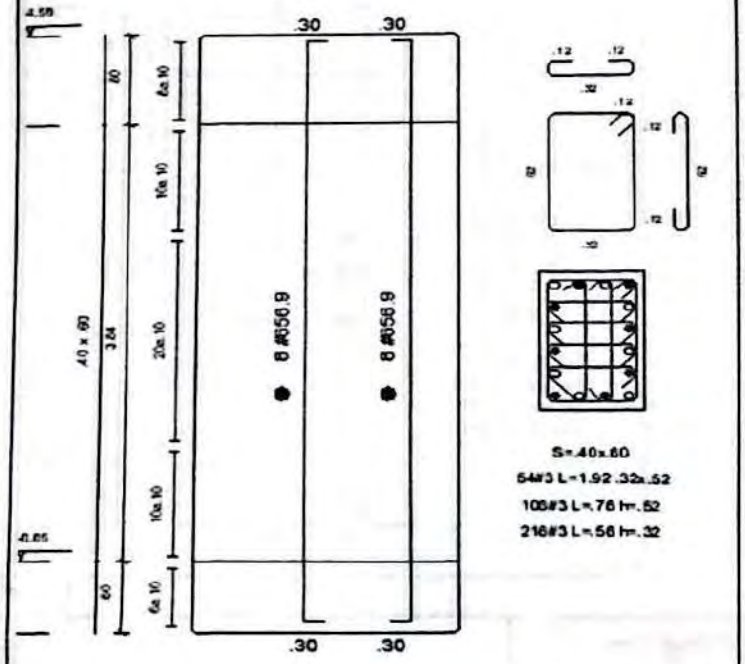

S=.40x.60
54#3 L=1.92 .32x.52
108#3 L=.76 hr=.52
216#3 L=.56 hr=.32


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	4-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE RAMPA AUDITORIO.		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	AUDITORIO		

Columnas B-9, B-11, B-13, B-15, B-18, B-20, G-9, G-20, C-9, C-20, D-20, E-20, D-9, E-9, G-7/8 Son 15

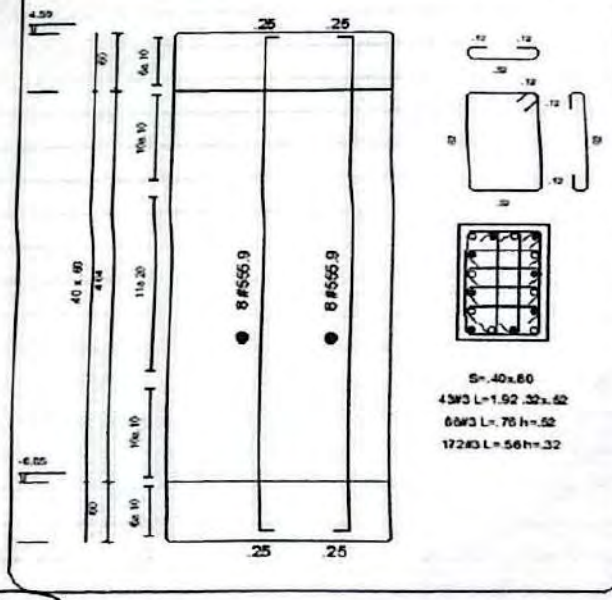

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1 PCCNTR.5055821	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1 PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		MURO DE CONTENCION		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	Plazoleta AUDITORIO		
MURO EJE A DEL 20 AL 23		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA


Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		MURO DE CONTENCION		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	Diazolotz ~~AUDITORIO~~		

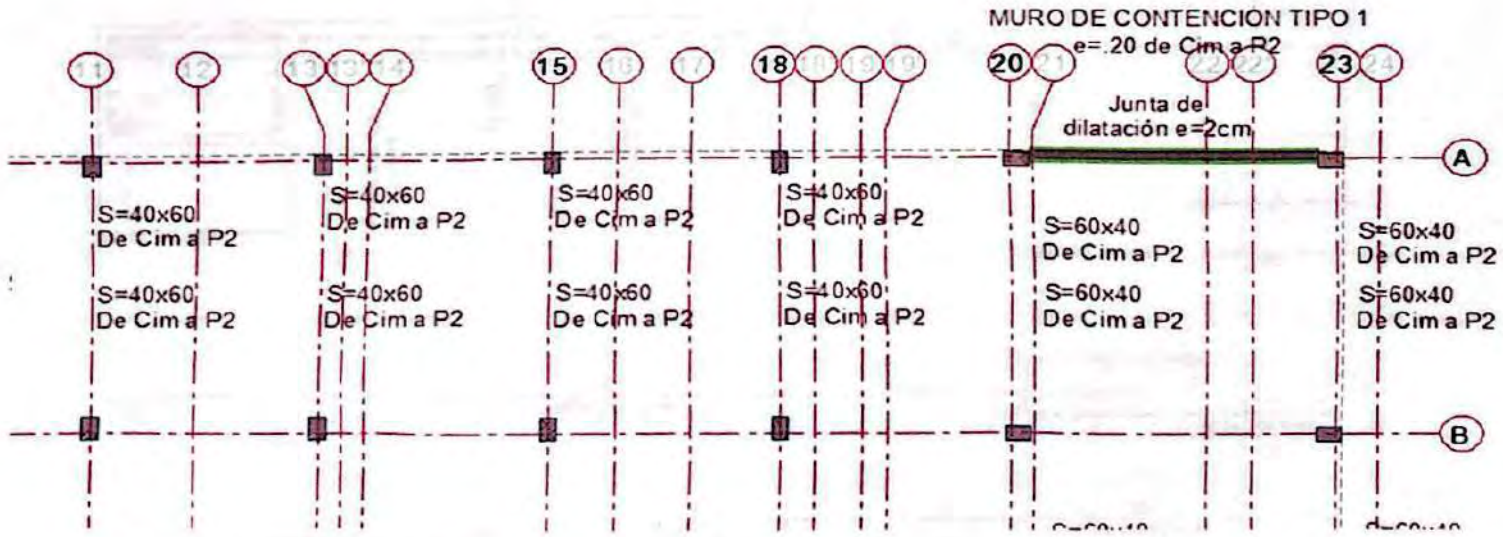


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	5-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoria:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoria	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		MURO DE CONTENCION		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	Plazoleta AUDITORIO		

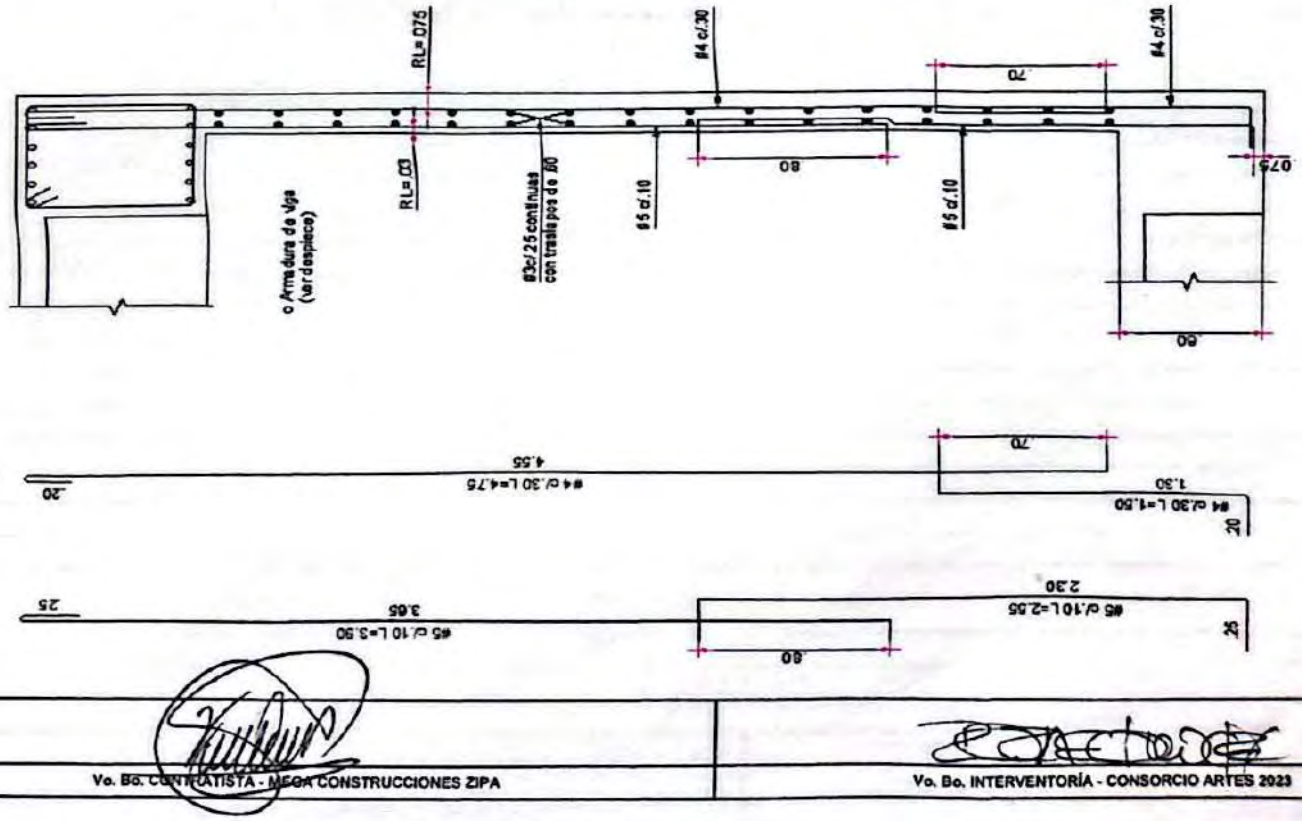

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoria:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoria	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VC 108 (0,50X0,60) EjeS-27 al S -14		X	
VC 109 (0,55X0,85) Eje T1-27 al T1-14		X	
VC 120 (0,65X0,60) Eje 27U al 27S		X	
VTC 112 (0,20X0,60) Eje 26U al 26S		X	
VTC 113 (0,20X0,60) Eje 25U al 25S		X	
S (0,25X0,80) Eje U-S entre 25 y 24		X	
VTC 120 (0.20X0,60) entre eje 25 y 24		X	
VTC 111 (0,20X0,60) Eje X-U entre 24-25		X	
VC 117 (0,40X0,60) Eje 24-U al 24-S		X	
VTC 105 (0,20X0,60) entre Eje S y T1		X	
VTC 107 (0,20X0,60) entre Eje T1 al U		X	
VC 116A entre S y T1		X	
VTC 119 entre T1 y S		X	
VIGA (0,40X0,60) entre ejes 21-22 y T1 y U-S		X	
VTC 109 entre eje U al S y Eje 21 y 19		X	
VTV 114 Eje 19 ente U-S		X	
VTC 107 eje 18 entre Eje U-T1		X	
VC 114A entre Eje T-S		X	
VTC105 entre Eje 181 -17 ente T1-S		X	
VTC 104 Eje 17 entre U-S		X	
VTC103 Eje 16 entre U-S		X	
VTC102 entre Eje 15 y 14 entre U-S		X	
VTC101 ente Eje 15 y 14 entre U-S		X	
VC112S Eje 14 entre eje U-S		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA OMEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

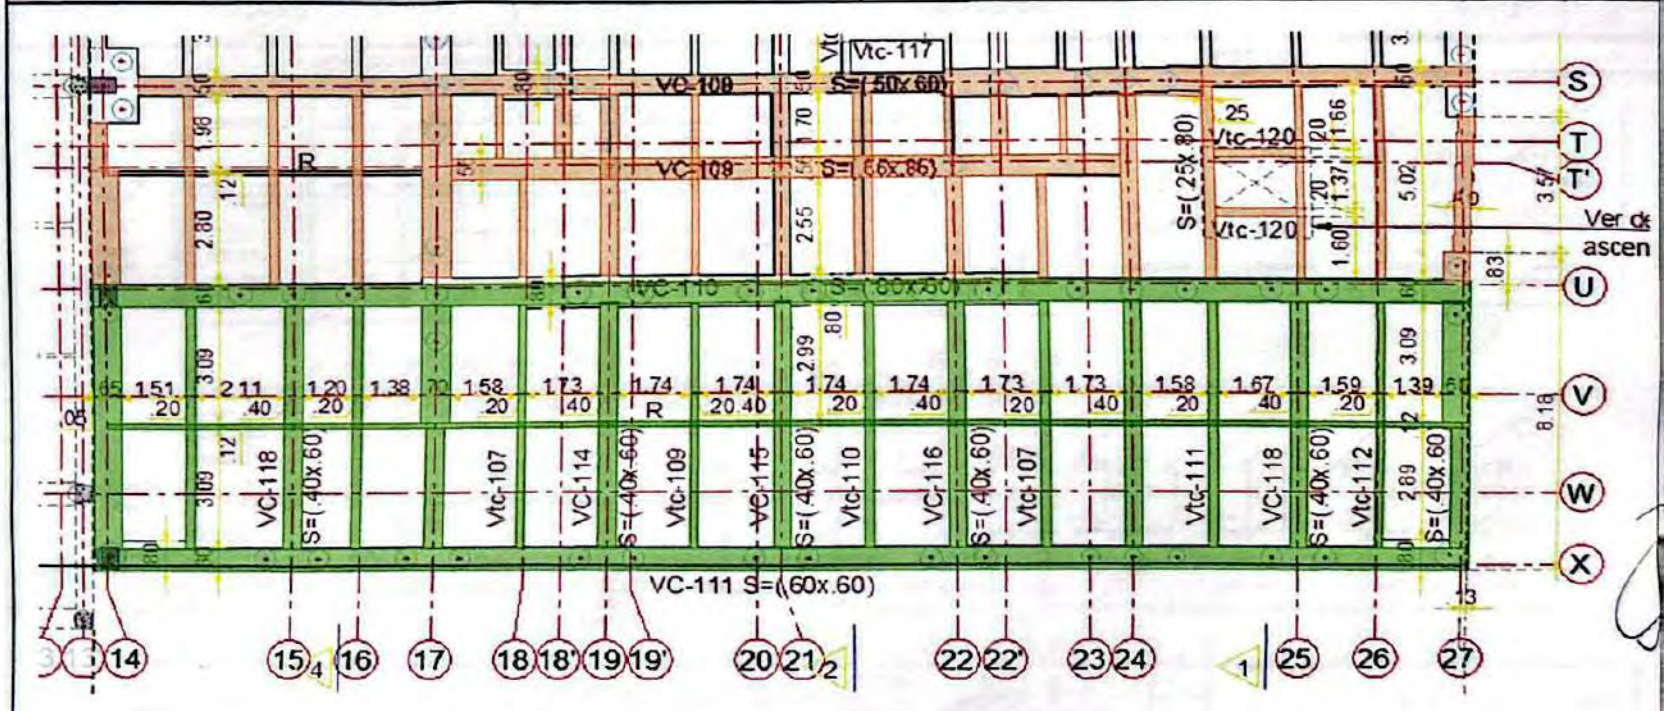

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

PLAZOLETA

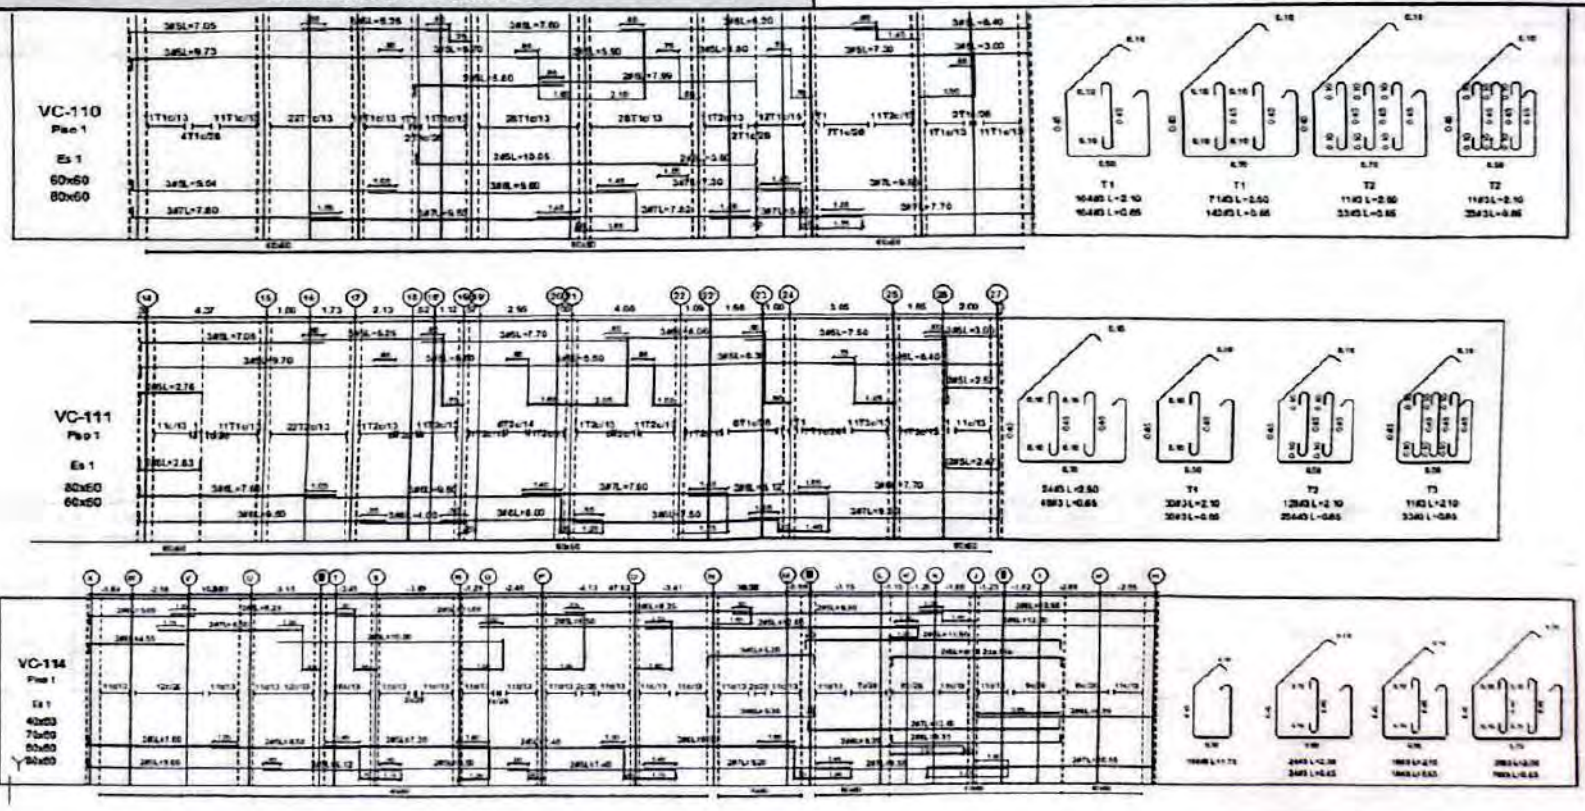


Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				**FECHA**	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoria:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		**Liberación de actividad:**		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	**OBSERVACIONES**	**Cumple**	
		SI	**NO**
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	**PLAZOLETA**		

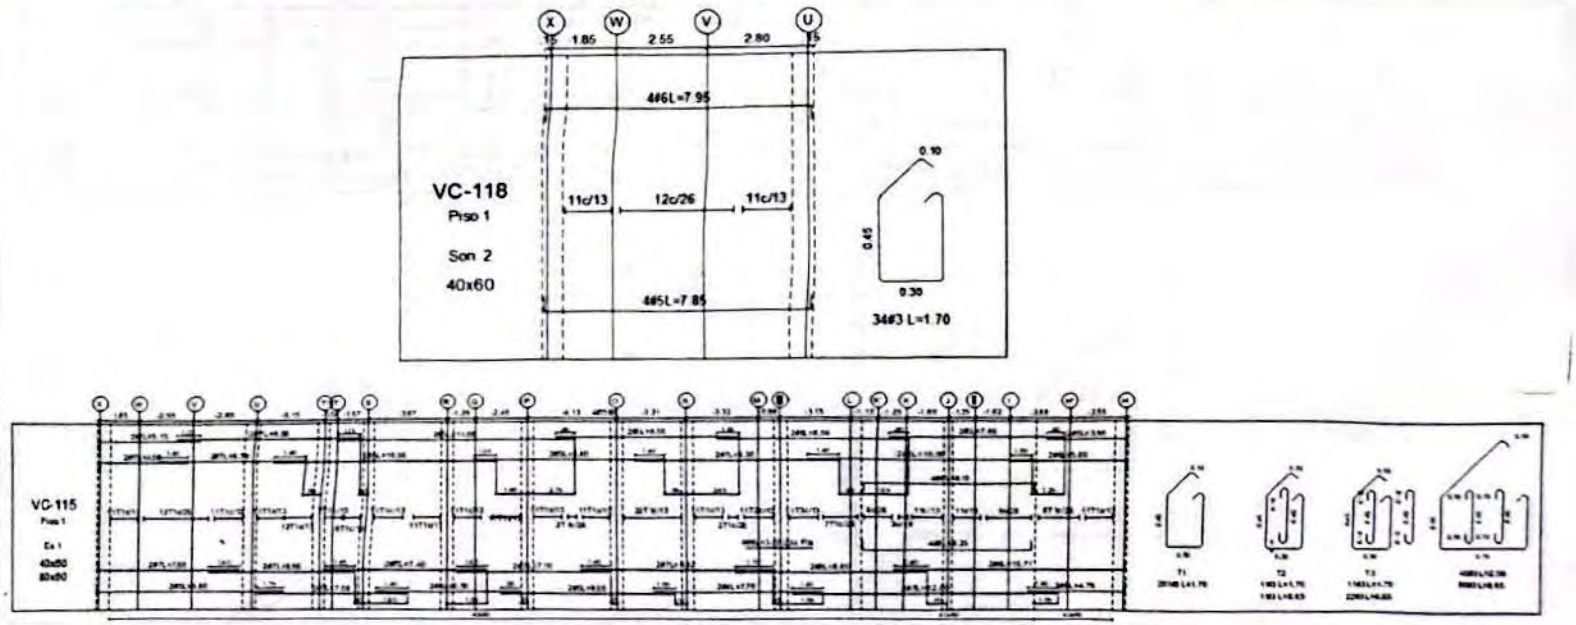


Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		



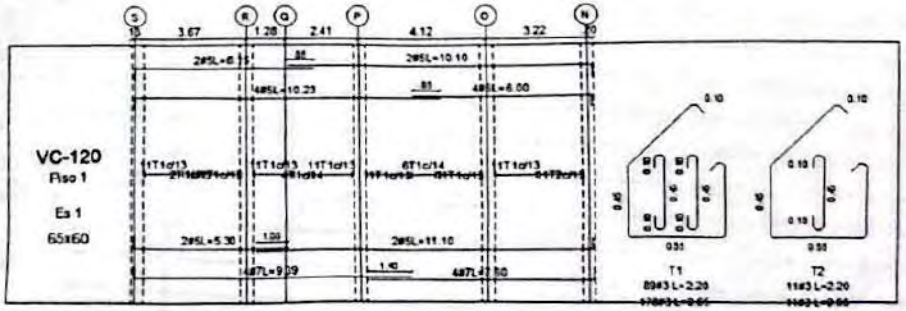

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	06-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		
VC 107 (0,50X0,60) EjeS-Z7 al S -14		X	
VC 106 (0,55X0,85) Eje T1-27 al T1-14		X	
VTC 112 (0,20X0,60) Eje 26S al 26P		X	
VTC 113 (0,20X0,60) Eje 25S al 25P		X	
S (0,25X0,80) Eje U-S entre 25 y 24		X	
VTC 120 (0.20X0,60) entre eje 25 y 24		X	
VTC 111 (0,20X0,60) Eje X-U entre 24-25		X	
VTC 105 (0,20X0,60) entre Eje S y P		X	
VTC 107 (0,20X0,60) entre Eje S al P		X	
VTC 119 entre S y P		X	
VTC 109 entre eje S al P y Eje 21 y 19		X	
VTV 114 Eje 19 ente S-P		X	
VTC 107 eje 18 entre Eje S-P		X	
VTC105 entre Eje 181 -17 ente S-P		X	
VTC 104 Eje 17 entre S-P		X	
VTC103 Eje 16 entre S-P		X	
VTC102 entre Eje 15 y 14 entre S-P		X	
VTC101 ente Eje 15 y 14 entre S-P		X	
VC112S Eje 14 entre eje U-S		X	
VTC117 entre eje 22 Y 21		X	
VTC117 entre eje 22 Y 21		X	
VTC 116 entre eje S y R		X	

Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA


Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	5-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		

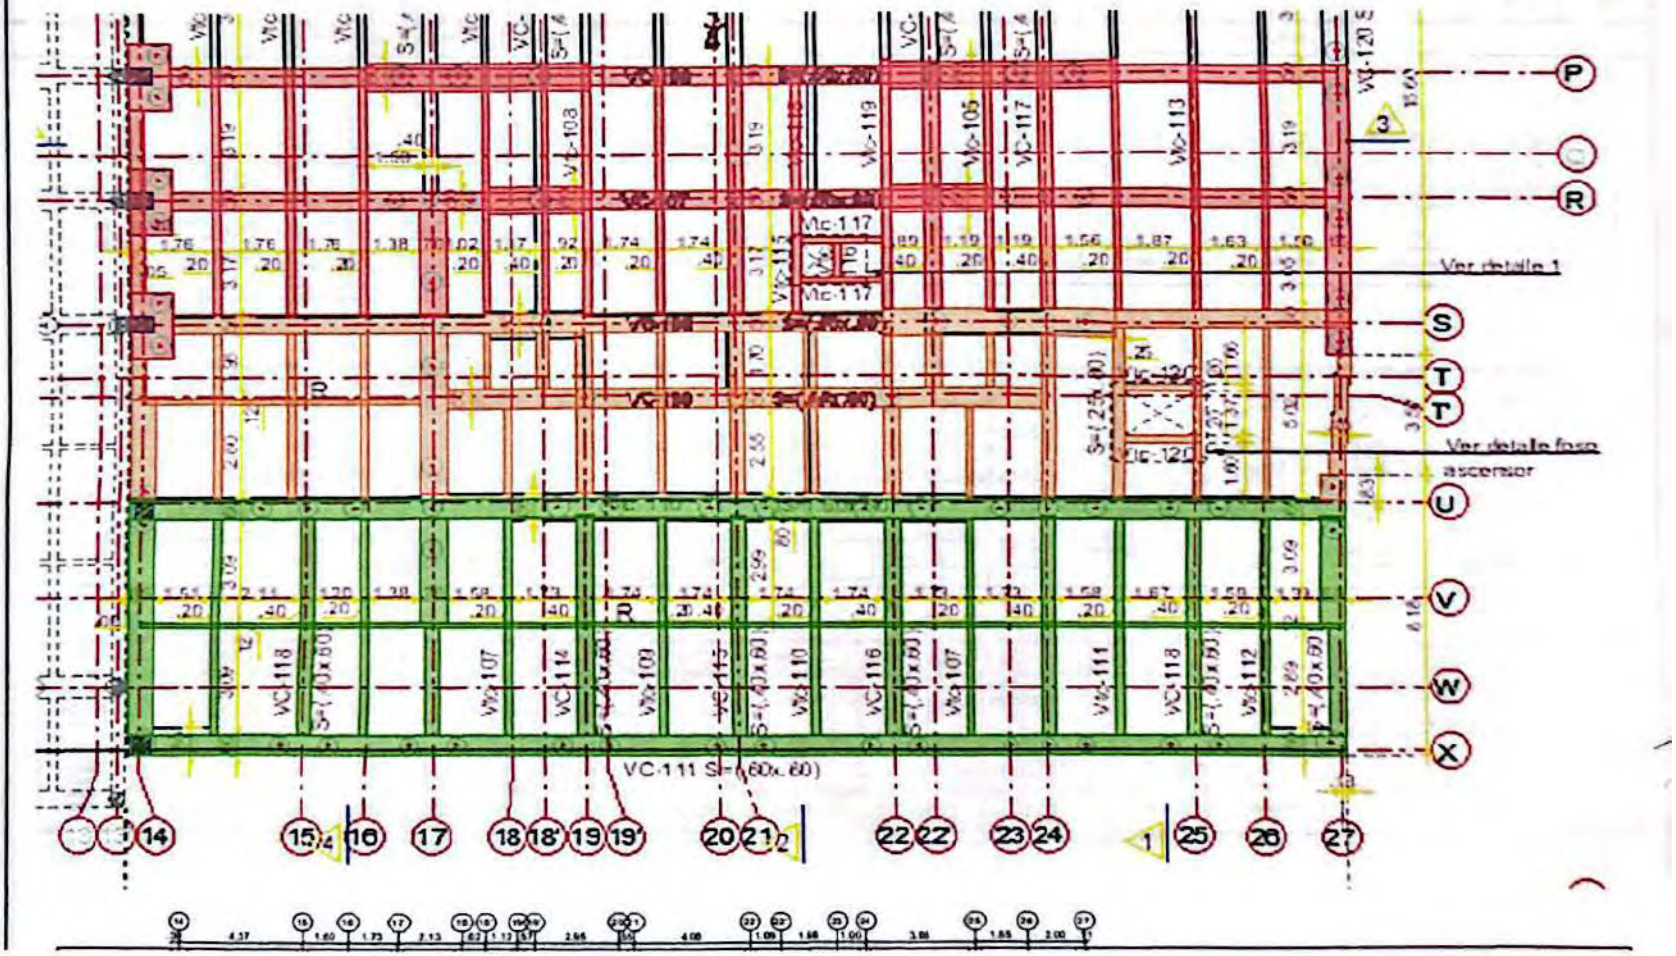


Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**	**8-jul-24**	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoría**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS**		

ELEMENTOS	**OBSERVACIONES**	**Cumple**	
		SI	**NO**
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	**PLAZOLETA**		

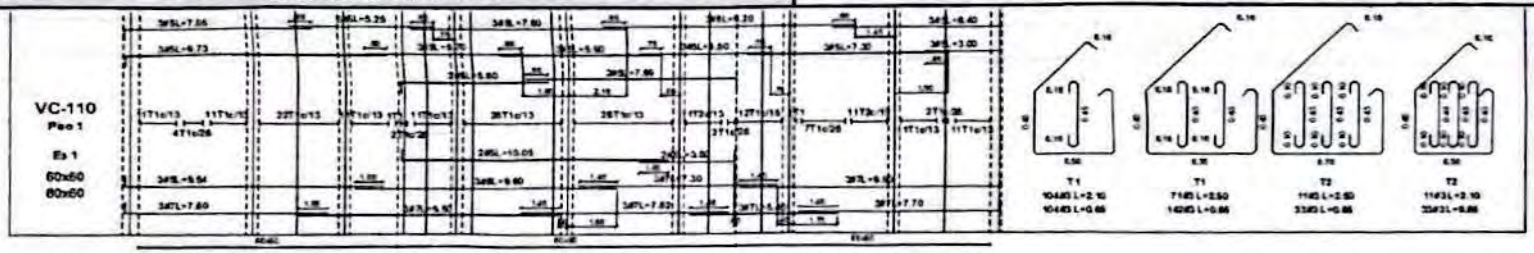

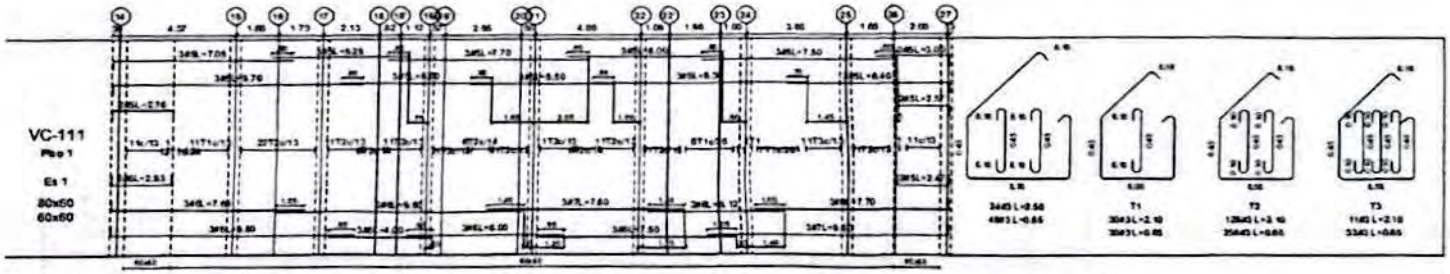




Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	**CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA**				**FECHA**	**8-jul-24**	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoria:**	CONSORCIO ARTES 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**KG**		**Liberación de actividad:**		**ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS**		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple	
		SI	NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	**PLAZOLETA**		

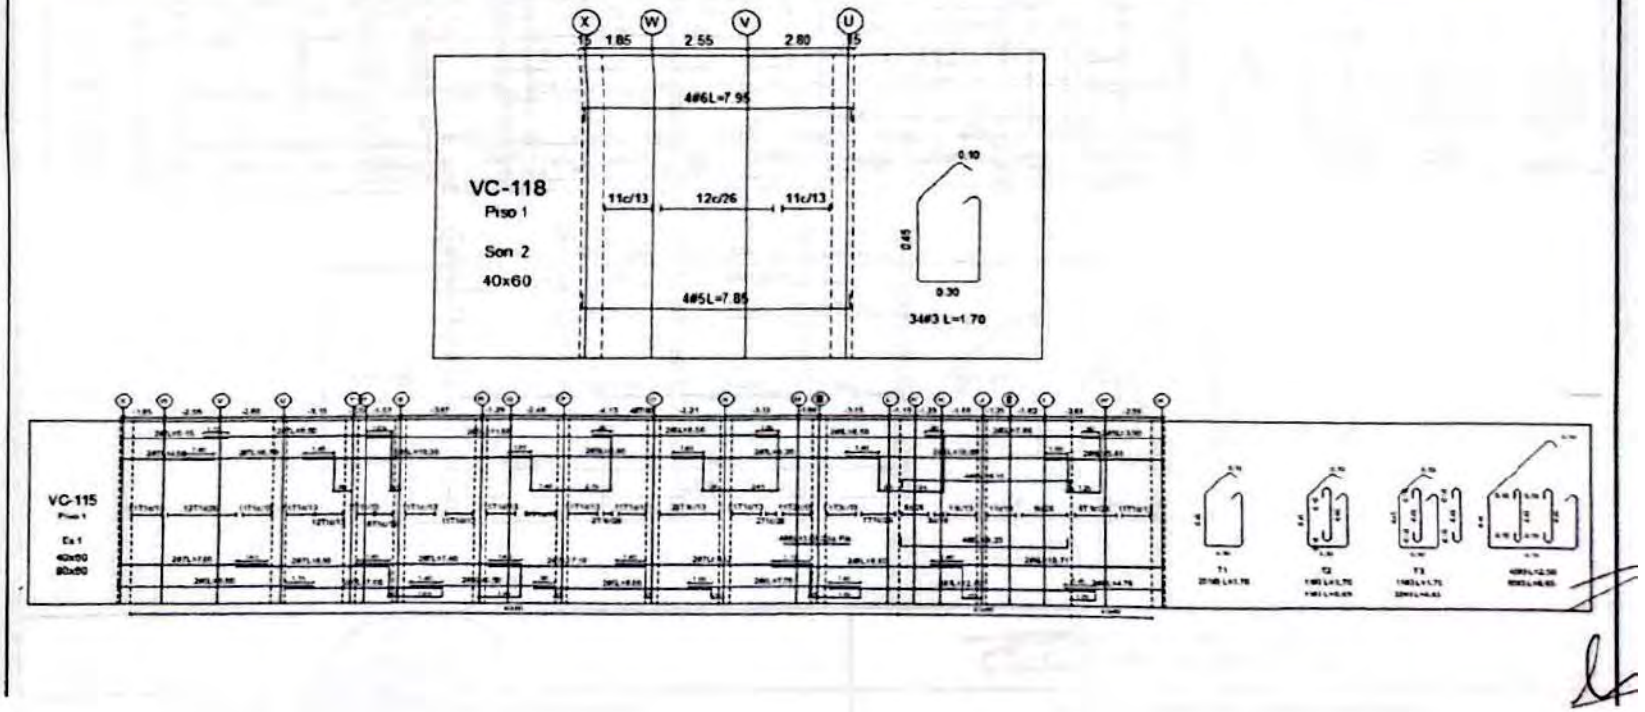


Powered by CamScanner


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA				FECHA	8-jul-24	
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	CONSORCIO ARTES 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	KG		Liberación de actividad:		ACERO VIGAS DE CIMENTACIÓN AULAS		

ELEMENTOS	OBSERVACIONES	Cumple SI	Cumple NO
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES	PLAZOLETA		



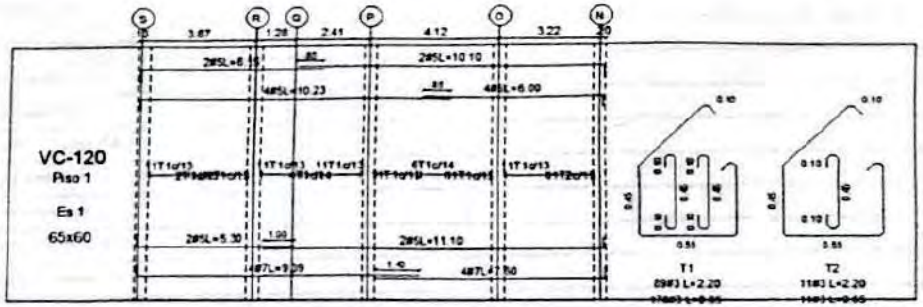


Vo. Bo. CONTRATISTA - MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Vo. Bo. INTERVENTORÍA - CONSORCIO ARTES 2023

Powered by CamScanner

	CONTROL DE CALIDAD		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	viernes, 24 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		
LOCALIZACION:	FASE 1, 2 Y 3	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

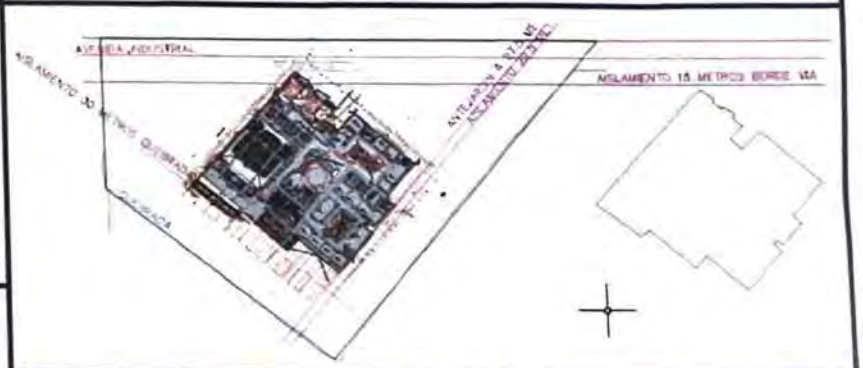ITEM	AREA M2	AREA EDIFICIO
LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIOS	7161.06 M2	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VÍAS ALEDAÑAS Y QUEBRADA PARA AISLAMIENTOS	1008,98 M2	
TOTAL AREA REPLANTEO	**8170,04**	

ORIGEN GAUSS KRUGER			
IDENTIDICACION	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1-3212220568	1045795.349	1008861.812	2545.146 m
GPS 2 -3212220568	1045796.356	1008670.019	2544.847 m

Edward D.

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA


RESIDENTE
INTERVENTORIA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:				Liberación de actividad:	Campamento 18m²		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Campamento 18m²				X		Campamento Sala de juntas	
Campamento 18m²				X		Campamento SST	
Campamento 18m²				X		Campamento Almacen	
Campamento 18m²				X		Campamento Baños	
Campamento 18m²				X		Campamento Interventoria	
Campamento 18m²				X		Campamento Cocina - Almacen	

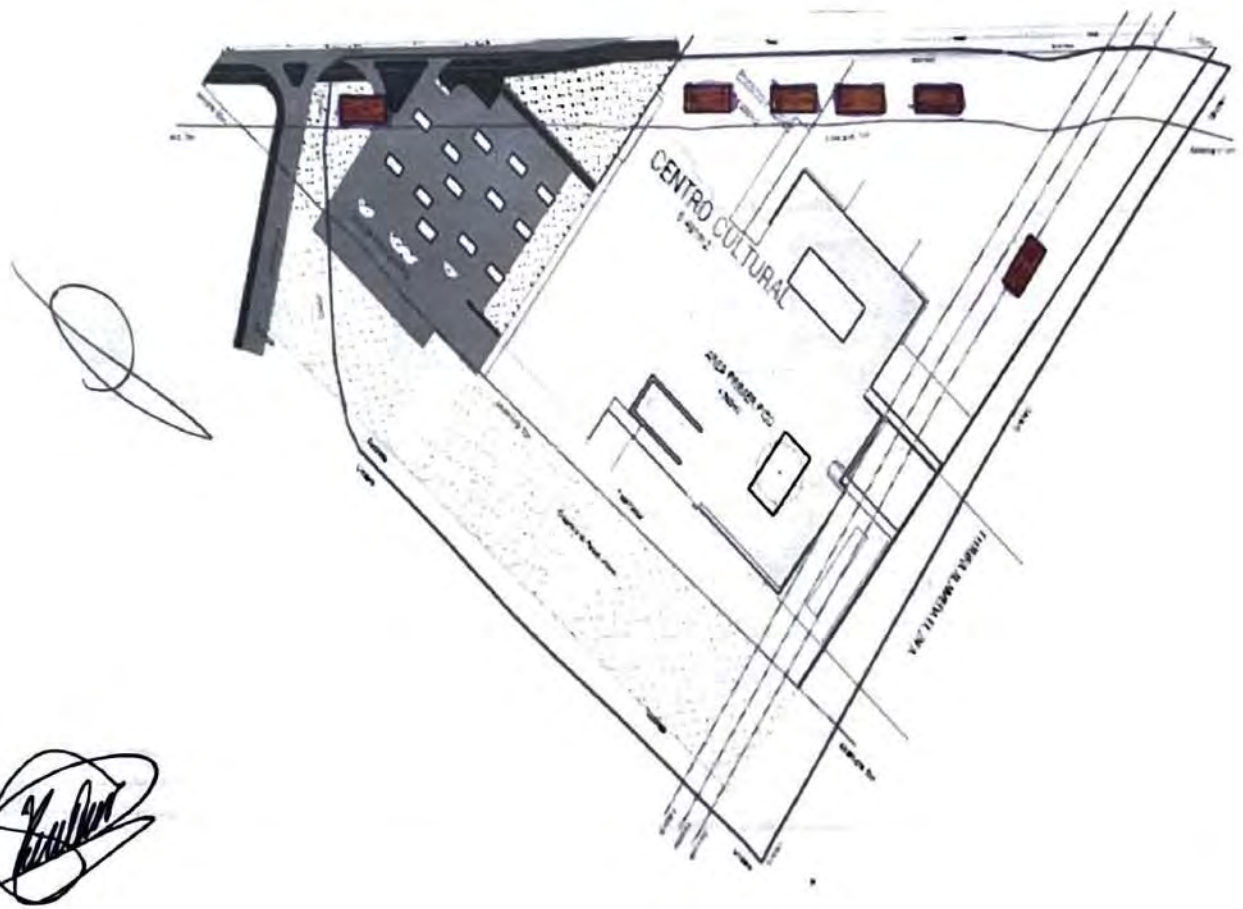
CENTRO CULTURAL

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	lunes, 24 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		^
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES					
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION				RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED PLUVIAL															
CJ 4	CJ 5	PLAZOLETA	18,00	1,0%	6	2593,260	2593,260	2592,502	2592,322	0,35	1,01	1,19	1,10	6,98	0,63	6,02
										TOTAL				6,98	0,63	6,02

TUBERIA SN	
2"	
3"	
4"	

TUBERIA PL	
4"	
6"	18,00
8"	

FILTROS	
LONG	0,00

TOPOGRAFO
Interventoria

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
Contratista

RESIDENTE
INTERVENTORIA

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	lunes, 24 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		^
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED PLUVIAL																
C-16	CODO	PLAZOLETA	4,00	1,4%	4	2593,260	2593,260	2593,033	2592,979	0,30	0,43	0,48	0,46	0,55	0,12	0,40
CODO	CJ-12	PLAZOLETA	30,10	0,9%	4	2593,260	2593,260	2592,979	2592,705	0,30	0,48	0,76	0,62	5,62	0,91	4,47
CJ-25	CJ-32	PLAZOLETA	10,10	1,1%	4	2593,260	2593,260	2592,889	2592,781	0,30	0,57	0,68	0,63	1,91	0,30	1,52
CJ-32	CJ-31	PLAZOLETA	13,24	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,085	2592,965	0,30	0,38	0,50	0,44	1,74	0,40	1,24
										TOTAL				9,83	1,73	7,63

TUBERIA SN	
2"	
3"	
4"	

TUBERIA PL	
4"	57,44
6"	
8"	

FILTROS	
LONG	0,00

TOPOGRAFO
Interventoria

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
Contratista

RESIDENTE
INTERVENTORIA

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES

CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	martes, 4 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Arias 2023		^
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES									CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llamp		EXCAVACION				RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	SUP	N. EXC	PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED PUVIAL															
CJ 7		Plazoleta	7.20	1.2%	4	2593.260	2593.260	2593.124	2593.040	0.30	0.34	0.42	0.38	0.82	0.22	0.55
RED SANITARIA															
CJ 26		PLAZOLETA	3.90	2.9%	4	2593.260	2593.260	2592.985	2592.870	0.60	0.59	0.48	0.53	1.25	0.23	0.99
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	2.72	2.3%	3	2593.260	2593.260	2593.060	2592.998	0.58	0.44	0.38	0.41	0.64	0.16	0.47
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	1.15	1.3%	3	2593.260	2594.260	2593.010	2592.995	0.58	0.44	1.43	0.93	0.62	0.07	0.55
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	1.24	1.5%	3	2593.260	2595.260	2593.015	2592.996	0.58	0.44	2.42	1.43	1.02	0.07	0.95
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	1.13	1.2%	2	2593.260	2596.260	2593.008	2592.994	0.55	0.42	3.40	1.91	1.19	0.08	1.12
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	1.15	0.8%	2	2594.260	2597.260	2593.005	2592.996	0.55	1.41	4.41	2.91	1.84	0.06	1.78
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	0.20	1.0%	2	2595.260	2598.260	2593.000	2592.998	0.55	2.41	5.41	3.91	0.48	0.01	0.47
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	2.24	0.8%	2	2595.260	2598.260	2593.002	2592.985	0.55	2.43	5.41	3.92	4.83	0.12	4.71
CJ 30	C-2	PLAZOLETA	3.42	0.8%	2	2593.260	2593.260	2592.941	2592.915	0.55	0.50	0.47	0.48	0.91	0.19	0.71
CJ 30		PLAZOLETA	3.91	0.7%	4	2593.260	2593.260	2592.941	2592.915	0.60	0.55	0.52	0.53	1.26	0.24	0.99
CJ 30	C-4	PLAZOLETA	8.34	1.6%	4	2593.260	2593.26	2593.	2593.080	0.60	0.38	0.25	0.31	1.57	0.50	1.00
CJ 30	C-4	PLAZOLETA	0.30	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.939	2592.936	0.60	0.53	0.52	0.52	0.09	0.02	0.07
CJ 30	C-4	PLAZOLETA	6.55	0.8%	4	2593.260	2593.260	2592.993	2592.941	0.60	0.52	0.47	0.49	1.95	0.39	1.50
CJ 30	C-4	PLAZOLETA	0.20	1.5%	4	2593.260	2593.260	2592.945	2592.942	0.60	0.52	0.52	0.52	0.06	0.01	0.05
CJ 29	C-4	PLAZOLETA	4.74	2.8%	4	2593.260	2593.260	2593.124	2592.990	0.60	0.47	0.34	0.40	1.15	0.29	0.83
CJ 29	C-4	PLAZOLETA	0.60	1.3%	4	2593.260	2593.260	2593.110	2593.102	0.60	0.36	0.35	0.36	0.13	0.04	0.09
CJ 29	C-2	PLAZOLETA	2.18	1.0%	3	2593.260	2593.260	2593.101	2593.080	0.58	0.36	0.34	0.35	0.43	0.13	0.30
CJ 29	C-2	PLAZOLETA	4.57	0.9%	2	2593.260	2593.260	2593.050	2593.010	0.55	0.40	0.36	0.38	0.96	0.25	0.70
CJ 29	C-2	PLAZOLETA	1.27	0.8%	2	2593.260	2593.260	2593.020	2593.010	0.55	0.40	0.39	0.40	0.28	0.07	0.20
CJ 29	C-2	PLAZOLETA	0.20	1.5%	2	2593.260	2593.260	2592.998	2592.995	0.55	0.42	0.41	0.41	0.05	0.01	0.03
CJ 29	C-5	PLAZOLETA	1.07	1.0%	4	2593.260	2593.260	2593.005	2592.994	0.60	0.47	0.46	0.46	0.30	0.06	0.22
CJ 29		PLAZOLETA	2.10	1.3%	4	2593.260	2593.260	2592.973	2592.946	0.60	0.52	0.49	0.50	0.63	0.13	0.49
CJ 28	C-2	PLAZOLETA	3.87	3.5%	3	2593.260	2593.260	2593.124	2592.990	0.58	0.45	0.31	0.38	0.85	0.22	0.60
CJ 28	C2	PLAZOLETA	2.19	0.9%	2	2593.260	2593.260	2593.12	2593.10	0.55	0.31	0.29	0.30	0.36	0.12	0.24
CJ 28	C2	PLAZOLETA	1.08	0.9%	2	2593.260	2593.260	2593.09	2593.08	0.55	0.33	0.32	0.33	0.19	0.06	0.13
CJ 28	C2	PLAZOLETA	2.95	0.8%	2	2593.260	2593.260	2593.10	2593.07	0.55	0.34	0.32	0.33	0.53	0.16	0.36
CJ 28	C2	PLAZOLETA	0.98	1.0%	2	2593.260	2593.260	2593.05	2593.04	0.55	0.37	0.36	0.37	0.20	0.05	0.14
CJ 28	C2	PLAZOLETA	0.78	1.0%	2	2593.260	2593.260	2593.04	2593.03	0.55	0.38	0.37	0.37	0.16	0.04	0.12
CJ 28	C2	PLAZOLETA	0.20	1.5%	2	2593.260	2593.260	2593.03	2593.02	0.55	0.39	0.39	0.39	0.04	0.01	0.03
CJ 28	C4	PLAZOLETA	5.17	1.0%	4	2593.260	2593.260	2593.04	2592.99	0.60	0.47	0.42	0.45	1.39	0.31	1.04
CJ 28		PLAZOLETA	7.78	1.5%	4	2593.260	2593.260	2593.198	2593.080	0.60	0.38	0.26	0.32	1.51	0.47	0.98
CJ 27	S2	PLAZOLETA	3.37	1.4%	4	2593.260	2593.260	2593.055	2592.964	0.60	0.37	0.32	0.35	0.70	0.20	0.47
CJ 27	S2	PLAZOLETA	2.65	0.7%	2	2593.260	2593.260	2593.050	2593.031	0.55	0.38	0.36	0.37	0.54	0.15	0.39
CJ 27	S2	PLAZOLETA	1.44	1.1%	2	2593.260	2593.260	2593.050	2593.034	0.55	0.38	0.36	0.37	0.29	0.08	0.21
CJ 27	S2	PLAZOLETA	2.10	1.0%	2	2593.260	2593.260	2593.042	2593.021	0.55	0.39	0.37	0.38	0.44	0.12	0.32
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.69	1.2%	2	2593.260	2593.260	2593.020	2593.012	0.55	0.40	0.39	0.39	0.15	0.04	0.11
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.38	1.8%	2	2593.260	2593.260	2593.021	2593.015	0.55	0.40	0.39	0.39	0.08	0.02	0.06
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.57	1.1%	2	2593.260	2593.260	2593.015	2593.009	0.55	0.40	0.40	0.40	0.13	0.03	0.09
CJ 27	S2	PLAZOLETA	3.26	0.6%	2	2593.260	2593.260	2593.025	2592.998	0.55	0.41	0.39	0.40	0.72	0.18	0.53
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.78	1.2%	2	2593.260	2593.260	2592.999	2592.990	0.55	0.42	0.41	0.42	0.18	0.04	0.13
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.20	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.989	2592.987	0.55	0.42	0.42	0.42	0.05	0.01	0.04
CJ 27	C4	PLAZOLETA	2.54	0.8%	4	2593.260	2593.260	2592.972	2592.952	0.60	0.51	0.49	0.50	0.76	0.15	0.59
CJ 27	C2	PLAZOLETA	4.40	1.1%	2	2593.260	2593.260	2593.140	2593.092	0.55	0.32	0.27	0.29	0.71	0.24	0.46
CJ 27	S2	PLAZOLETA	0.30	1.0%	2	2593.260	2593.260	2593.130	2593.127	0.55	0.28	0.28	0.28	0.05	0.02	0.03
												TOTAL		28.36	4.98	22.83

TUBERIA SN	
2"	39.13
3"	11.16
4"	49.87

TUBERIA PL	
4"	1.20
6"	
8"	

FILTROS	
LONG	0.00

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

INTERVENTORIA
Inspector.

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES

CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	martes, 4 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		^
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llamo		EXCAVACION					RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	LONG FILTRO	RECEBO
RED PLUVIAL																	
CJ-8		PLAZOLETA	9.85	1.1%	6	2593.260	2593.260	2592.601	2592.705	0.35	0.91	0.81	0.86	2.98	0.35		2.46
CJ-7		PLAZOLETA	5.09	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.716	2592.768	0.35	0.80	0.74	0.77	1.38	0.18		1.11
CJ-8		RED	15.08	0.6%	14	2593.260	2593.260	2592.058	2592.142	0.86	1.66	1.57	1.62	20.85	1.29		18.05
CJ-15		RED	15.28	0.5%	6	2593.260	2593.260	2592.184	2592.258	0.65	1.33	1.25	1.29	12.87	1.00		11.60
CJ-14		RED	6.01	0.5%	6	2593.260	2593.260	2592.252	2592.282	0.65	1.26	1.23	1.25	4.88	0.39		4.38
CJ-13		RED	6.91	0.6%	6	2593.260	2593.260	2592.290	2592.332	0.65	1.22	1.18	1.20	5.42	0.45		4.84
CJ-16		RED	4.55	0.5%	14	2593.260	2593.260	2592.107	2592.132	0.86	1.61	1.58	1.60	6.21	0.39		5.37
CJ-16		RED	30.35	0.5%	14	2593.260	2593.260	2591.974	2592.126	0.86	1.74	1.59	1.67	43.25	2.60		37.62
RED SANITARIA																	
CJ 6		PLAZOLETA	5.10	1.0%	6	2593.260	2593.260	2593.240	2593.190	0.35	0.27	0.32	0.30	0.53	0.18		0.26
	CJ 5	PLAZOLETA	10.70	0.9%	6	2593.260	2593.260	2593.180	2593.080	0.65	0.33	0.43	0.38	2.67	0.70		1.77
CJ 8		RED	10.27	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.250	2592.350	0.65	1.26	1.16	1.21	8.12	0.67		7.26
CJ 13	CJ-26	RED	23.84	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.360	2592.590	0.65	1.15	0.92	1.04	16.13	1.56		14.14
CJ-26	CJ-25	RED	13.66	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.600	2592.730	0.65	0.91	0.78	0.85	7.55	0.89		6.41
CJ-25	CJ-24	RED	1.42	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.74	2592.75	0.60	0.72	0.71	0.72	0.61	0.09		0.52
CJ-25	S-4	AUDITORIO	1.50	0.7%	2	2593.260	2593.260	2592.73	2592.74	0.55	0.68	0.68	0.68	0.56	0.08		0.48
										TOTAL				134.04	10.80	0.00	116.26

TUBERIA SN	
2"	1.50
4"	1.42
6"	63.57

TUBERIA PI	
8"	0.00
6"	43.14
14"	42.98

FILTROS	
LONG	0.00

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

RESIDENTE
INTERVENTORIA
INTERVENTOR.

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES

CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	martes, 4 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLEN	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROM	EXCAV.	ARENA	LONG FI	
RED PLUVIAL																
F-7	F-P	FILTRO	8.90	0.9%	4	2593.260	2593.260	2592.900	2592.980	0.30	0.56	0.48	0.52	1.40		8.9
F-8	F-P	FILTRO	9.15	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.898	2592.990	0.30	0.56	0.47	0.52	1.43		9.1
RED SANITARIA																
										TOTAL				2.83	0.00	18.0

TUBERIA SN	
2"	0.00
4"	0.00
6"	0.00

TUBERIA PL	
4"	0.00
6"	0.00
8"	0.00

FILTROS	
LONG	18.05

Edward P.
TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

RESIDENTE
INTERVENTORIA
INSPECTOR

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	lunes, 24 de junio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		A
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llamo		EXCAVACION				RELLENO			
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROM	EXCAV.	ARENA	LONG FILTRO	RECEBO	
RED PLUVIAL																	
CJ 19	CJ 6	Auditorio	15,10	1,1%	6	2593,260	2593,260	2592,354	2592,195	0,35	1,16	1,32	1,24	6,59	0,53		5,78
CJ 6	CJ 5	Auditorio	6,80	1,0%	8	2593,260	2593,260	2592,165	2592,094	0,40	1,40	1,47	1,43	3,93	0,27		3,43
CJ 5	CJ 21	Auditorio	20,05	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,624	2592,421	0,30	0,84	1,04	0,94	5,68	0,60		4,91
CJ 21	CJ 20	Auditorio	6,60	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,698	2592,635	0,30	0,76	0,83	0,80	1,58	0,20		1,33
CJ-5	CJ-6	Auditorio	6,93	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,206	2593,131	0,30	0,26	0,33	0,29	0,61	0,21		0,35
CJ-6	CJ-7	Auditorio	4,97	1,1%	10	2593,260	2593,260	2592,562	2592,508	0,45	1,05	1,11	1,08	2,43	0,23		1,96
CJ-7	CJ-8	Auditorio	9,04	1,0%	10	2593,260	2593,260	2592,491	2592,398	0,45	1,12	1,22	1,17	4,80	0,41		3,93
F-1	F-P	filtro	17,50	0,8%	4	2593,260	2593,260	2593,135	2592,999	0,40	0,33	0,46	0,39	2,76		17,50	
F-2	F-P	filtro	8,08	2,2%	4	2593,260	2593,260	2593,170	2592,991	0,40	0,29	0,47	0,38	1,23		8,08	
F-3	F-P	filtro	17,70	0,8%	4	2593,260	2593,260	2593,130	2592,990	0,40	0,33	0,47	0,40	2,84		17,70	
F-4	F-P	filtro	8,00	2,2%	4	2593,260	2593,260	2593,101	2592,926	0,40	0,36	0,54	0,45	1,43		8,00	
F-5	F-P	filtro	17,80	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,151	2592,975	0,40	0,31	0,49	0,40	2,84		17,80	
F-6	F-P	filtro	8,22	1,8%	4	2593,260	2593,260	2593,056	2592,912	0,40	0,41	0,55	0,48	1,57		8,22	
F-P	CJ-9	filtro	16,70	0,6%	4	2593,260	2593,260	2592,999	2592,893	0,40	0,46	0,57	0,52	3,44		16,70	
RED SANITARIA																	
CJ 20	CJ 6	Auditorio	15,02	1,3%	4	2593,260	2593,260	2592,967	2592,770	0,30	0,49	0,69	0,59	2,69	0,45		2,11
CJ 6	CJ 5	Auditorio	19,50	1,0%	6	2593,260	2593,260	2592,958	2592,765	0,35	0,55	0,75	0,65	4,47	0,69		3,43
CJ 5	CJ 4	Auditorio	11,60	1,3%	4	2593,260	2593,260	2593,048	2592,900	0,30	0,41	0,56	0,49	1,71	0,35		1,26
CJ 7	C4	Auditorio	6,00	3,5%	4	2593,260	2593,260	2593,245	2593,032	0,30	0,22	0,43	0,32	0,58	0,18		
CJ 7	C2	Auditorio	6,20	3,5%	2	2593,260	2593,260	2593,240	2593,025	0,25	0,17	0,39	0,28	0,43	0,16		
										TOTAL				51,63	4,28	94,00	28,48

TUBERIA SN	
2"	6,20
4"	32,82
6"	19,50

TUBERIA PL	
4"	33,58
6"	15,10
8"	8,80
10"	14,01

FILTROS	
LONG	94,00

Interventoria

RESIDENTE CONTRATISTA

TOPOGRAFO - Contratista

RESIDENTE INTERVENTORIA

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES

CONTRATO DE OBRA: Construccion Centro Cultural | FECHA: lunes, 24 de junio de 2024

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llanta		EXCAVACION				RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	ID	H. EXC	PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO	
RED PLUVIAL																
ND	CJ 19	Auditorio	2,84	2,1%	4	2593,260	2593,260	2592,900	2592,839	0,30	0,56	0,62	0,59	0,51	0,09	0,40
CJ 19	CJ 18	Auditorio	23,95	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,158	2592,916	0,30	0,30	0,55	0,42	3,07	0,72	2,15
CJ 17	CJ 18	Auditorio	9,83	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,256	2593,158	0,30	0,21	0,30	0,25	0,75	0,30	0,38
BI	CJ 18	Auditorio	7,25	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,184	2593,160	0,30	0,28	0,30	0,29	0,20	0,07	0,11
EST	CJ 18	Auditorio	7,84	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,234	2593,162	0,25	0,18	0,25	0,21	0,42	0,20	0,21
RED SANITARIA																
CJ 24	CJ 25	Auditorio	1,70	0,7%	4	2593,260	2593,260	2592,932	2592,920	0,30	0,53	0,54	0,54	0,27	0,05	0,21
CJ 25	CJ 26	Auditorio	13,71	0,8%	6	2593,260	2593,260	2592,939	2592,824	0,35	0,57	0,69	0,63	3,05	0,48	2,32
CJ 26	CJ 13	Auditorio	24,10	0,7%	6	2593,260	2593,260	2592,824	2592,650	0,35	0,69	0,86	0,78	6,59	0,85	5,29
CJ 13	CJ 8	Auditorio	10,82	3,3%	6	2593,260	2593,260	2592,552	2592,191	0,35	0,96	1,32	1,14	4,35	0,38	3,77
CZ"	CJ 21	Auditorio	2,86	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,13	2593,10	0,30	0,33	0,36	0,35	0,30	0,09	0,19
CZ"	CJ 21	Auditorio	4,84	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,18	2593,13	0,25	0,23	0,28	0,25	0,31	0,12	0,18
CZ"	CJ 21	Auditorio	1,35	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,20	2593,184	0,25	0,21	0,23	0,22	0,07	0,03	0,04
SZ"	CJ 21	Auditorio	0,84	9,6%	2	2593,260	2593,260	2593,27	2593,19	0,25	0,14	0,22	0,18	0,04	0,02	0,02
CZ"	CJ 21	Auditorio	2,79	0,9%	3	2593,260	2593,260	2593,16	2593,13	0,28	0,28	0,30	0,29	0,21	0,08	0,13
CZ"	CJ 21	Auditorio	1,55	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,17	2593,15	0,25	0,24	0,26	0,25	0,10	0,04	0,06
CZ"	CJ 21	Auditorio	0,52	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,16	2593,15	0,25	0,26	0,26	0,26	0,03	0,01	0,02
SZ"	CJ 21	Auditorio	0,60	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,15	2593,14	0,25	0,26	0,27	0,27	0,04	0,02	0,02
SZ"	CJ 21	Auditorio	3,26	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,16	2593,13	0,25	0,25	0,28	0,26	0,22	0,08	0,13
SZ"	CJ 21	Auditorio	0,30	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,16	2593,16	0,25	0,25	0,26	0,25	0,02	0,01	0,01
CZ"	CJ 21	Auditorio	1,10	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,15	2593,14	0,25	0,26	0,27	0,27	0,07	0,03	0,04
C4"	CJ 21	Auditorio	6,26	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,09	2593,03	0,30	0,37	0,43	0,40	0,76	0,19	0,57
C4"	CJ 21	Auditorio	0,90	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,09	2593,08	0,30	0,37	0,38	0,37	0,10	0,03	0,07
C4"	CJ 21	Auditorio	4,49	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,07	2593,03	0,30	0,39	0,43	0,41	0,56	0,14	0,38
C4"	CJ 21	Auditorio	1,40	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,07	2593,05	0,30	0,40	0,41	0,40	0,17	0,04	0,12
CJ 21	CJ 20	Auditorio	5,40	0,7%	4	2593,260	2593,260	2593,02	2592,98	0,30	0,44	0,48	0,46	0,75	0,16	0,55
CZ"	CJ 20	Auditorio	3,68	1,2%	3	2593,260	2593,260	2592,99	2592,94	0,28	0,45	0,49	0,47	0,48	0,10	0,36
CZ"	CJ 20	Auditorio	0,70	1,3%	2	2593,260	2593,260	2593,01	2593,00	0,25	0,41	0,41	0,41	0,07	0,02	0,05
SZ"	CJ 20	Auditorio	1,50	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,02	2593,00	0,25	0,40	0,41	0,40	0,15	0,04	0,11
CZ"	CJ 20	Auditorio	0,60	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,00	2593,00	0,25	0,41	0,41	0,41	0,06	0,02	0,05
C4"	CJ 20	Auditorio	10,24	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,10	2592,99	0,30	0,36	0,47	0,42	1,28	0,31	0,89
CZ"	CJ 20	Auditorio	0,50	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,09	2593,08	0,30	0,38	0,38	0,38	0,06	0,02	0,04
CZ"	CJ 20	Auditorio	0,54	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,06	2593,05	0,30	0,41	0,41	0,41	0,07	0,02	0,05
CJ 20	CJ 19	Auditorio	20,24	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,11	2592,90	0,30	0,35	0,57	0,46	2,80	0,61	2,02
CZ"	CJ 19	Auditorio	1,66	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,16	2593,15	0,28	0,27	0,29	0,28	0,13	0,05	0,07
CZ"	CJ 19	Auditorio	1,40	1,0%	3	2593,260	2593,260	2593,16	2593,15	0,28	0,27	0,29	0,28	0,11	0,04	0,06
CZ"	CJ 19	Auditorio	0,66	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,15	2593,14	0,25	0,26	0,27	0,27	0,04	0,02	0,03
CZ"	CJ 19	Auditorio	0,58	1,2%	2	2593,260	2593,260	2593,14	2593,13	0,25	0,27	0,28	0,28	0,04	0,01	0,02
CZ"	CJ 19	Auditorio	0,68	1,2%	3	2593,260	2593,260	2593,13	2593,12	0,28	0,30	0,31	0,31	0,06	0,02	0,04
										TOTAL				28,31	5,47	21,08

TUBERIA SN	
2"	16,40
3"	10,21
4"	54,53
8"	43,05

TUBERIA PL	
2	7,84
4"	88,87

TOPOGRAFO

RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO contratista

RESIDENTE INTERVENTORIA

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES

CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	lunes 1 de abril de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		^
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES										
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llamo		EXCAVACION					RELLENO		CAJAS			
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC	RDM	EXCAV.		ARENA	RECEBO	EXCAV.	MAMP.	TAPAS	SOLADO
RED PLUVIAL																				
CJ 11	CJ 12	Auditorio	18.00	1.8%	4	2593.260	2593.260	2592.886	2592.568	0.30	0.58	0.89	3.73	3.99	0.54	3.30	0.57	2.50	1	0.025
CJ 12	BJ 3	Auditorio	14.96	1.2%	4	2593.260	2593.260	2593.103	2592.918	0.30	0.36	0.54	3.45	2.04	0.45	1.46	0.35	1.52	1	0.025
RED SANITARIA																				
S2	CJ 22	Auditorio	3.90	0.9%	2	2593.260	2593.260	2592.994	2592.958	0.25	0.42	0.45	3.43	0.43	0.10	0.32	0.32	1.27	1	0.025
S2	CJ 22	Auditorio	4.10	0.7%	3	2593.260	2593.260	2592.958	2592.928	0.28	0.48	0.51	3.49	0.56	0.11	0.43				
C4	CJ 22	Auditorio	4.92	0.7%	4	2593.260	2593.260	2592.965	2592.930	0.30	0.50	0.53	3.51	0.76	0.15	0.57				
CJ 22	CJ 23	Auditorio	14.8	1.2%	4	2593.260	2593.260	2592.96	2592.78	0.30	0.50	0.68	0.59	2.64	0.45	2.07	0.44	1.91	1	0.025
C2	CJ 23	Auditorio	1.9	1.1%	3	2593.260	2593.260	2592.99	2592.97	0.28	0.45	0.47	3.46	0.24	0.05	0.18				
C3	CJ 23	Auditorio	1.14	1.1%	2	2593.260	2593.260	2592.79	2592.78	0.25	0.62	0.63	3.62	0.18	0.03	0.15				
C2"	CJ 23	Auditorio	4.00	1.2%	3	2593.260	2593.260	2592.83	2592.78	0.28	0.61	0.65	3.63	0.70	0.11	0.57				
C3	CJ 23	Auditorio	1.45	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.80	2592.78	0.25	0.61	0.63	3.62	0.23	0.04	0.19				
S2"	CJ 23	Auditorio	2.55	1.0%	3	2593.260	2593.260	2592.81	2592.78	0.28	0.63	0.66	3.64	0.45	0.07	0.37				
S2"	CJ 23	Auditorio	3.05	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.84	2592.81	0.25	0.57	0.60	3.58	0.45	0.08	0.36				
S2"	CJ 23	Auditorio	1.4	0.7%	2	2593.260	2593.260	2592.82	2592.81	0.25	0.59	0.60	3.60	0.21	0.04	0.17				
C4"	CJ 23	Auditorio	2.15	1.1%	2	2593.260	2593.260	2592.83	2592.81	0.25	0.58	0.60	3.59	0.32	0.05	0.26				
CJ 23	CJ 24	Auditorio	7.6	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.89	2592.81	0.30	0.58	0.65	3.61	1.41	0.23	1.12	0.42	1.82	1	0.025
C2"	CJ 24	Auditorio	5.2	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.86	2592.81	0.25	0.55	0.60	3.58	0.75	0.13	0.61				
			58.16																	
										TOTAL				15.34	2.62	12.13	2.09	9.02	5.00	0.12

TUBERIA SN	
2"	18.29
3"	12.65
4"	27.32

TUBERIA PL	
4"	32.96

Edward P.
TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

RESIDENTE
INTERVENTORIA

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	FECHA:	lunes, 1 de abril de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones 2 pa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES										
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO		CAJAS			
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAVACION	ARENA	RECEBO	EXCAVACION	MAMPOSTERIA	TAPAS	SOLADO
RED PLUVIAL																				
BJ 1	CJ-10	Auditorio	24.80	1.5%	4	2593.260	2593.260	2592.870	2592.500	0.30	0.59	0.96	0.78	5.81	0.75	4.86				
SF-1	CJ-10	Auditorio	7.23	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.733	2592.660	0.30	0.73	0.80	0.77	1.67	0.22	1.39				
BJ 2	CJ 10	Auditorio	10.00	1.7%	4	2593.260	2593.260	2592.717	2592.548	0.30	0.74	0.91	0.83	2.50	0.30	2.12				
CJ 10	CJ-9	Auditorio	9.24	1.2%	14	2593.260	2593.260	2592.760	2592.645	0.56	0.96	1.07	1.01	5.20	0.51	3.76	0.78	3.00	1	0.015
BJ 3	CJ-9	Auditorio	5.35	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.864	2592.810	0.30	0.60	0.65	0.62	1.01	0.16	0.80				
CJ-9	CJ-8	Auditorio	10.50	1.2%	14	2593.260	2593.260	2592.637	2592.507	0.56	1.08	1.21	1.14	6.67	0.58	5.04	0.89	3.38	1	0.015
RED SANITARIA																				
SN	CJ-11	Auditorio	7.95	1.4%	4	2593.260	2593.260	2593.097	2592.985	0.30	0.36	0.48	0.42	1.01	0.24	0.70	0.30	1.33	1	0.015
CJ-11	CJ-10	Auditorio	5.23	0.9%	6	2593.260	2593.260	2593.072	2592.974	0.35	0.49	0.54	0.51	0.95	0.18	0.67	0.31	1.51	1	0.015
SN	CJ-10	Auditorio	8.43	1.1%	4	2593.260	2593.260	2593.016	2592.920	0.30	0.45	0.54	0.49	1.25	0.25	0.93				
SN	CJ-10	Auditorio	2.4	1.0%	4	2593.260	2593.260	2593.05	2593.02	0.30	0.42	0.44	0.43	0.31	0.07	0.22				
SN	CJ 10	Auditorio	5.74	0.9%	4	2593.260	2593.260	2592.97	2592.92	0.30	0.49	0.54	0.52	0.89	0.17	0.67				
SN	CJ-10	Auditorio	1.05	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.96	2592.95	0.30	0.50	0.51	0.51	0.16	0.03	0.12				
SN	CJ-10	Auditorio	3.9	0.9%	3	2593.260	2593.260	2592.97	2592.93	0.28	0.47	0.51	0.49	0.53	0.11	0.40				
SN	CJ 10	Auditorio	4.95	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.98	2592.93	0.25	0.43	0.48	0.46	0.57	0.12	0.43				
CJ-10	CJ-9	Auditorio	4.47	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.89	2592.85	0.35	0.62	0.67	0.64	1.00	0.16	0.76	0.39	1.86	1	0.015
SN	CJ-9	Auditorio	21.46.	0.6%	4	2593.260	2593.260	2592.96	2592.93	0.30	0.51	0.63	0.57	3.69	0.65	2.87				
SN	CJ-9	Auditorio	5.74	0.9%	4	2593.260	2593.260	2592.89	2592.84	0.30	0.57	0.62	0.60	1.03	0.17	0.81				
SN	CJ-9	Auditorio	1.05	1.9%	4	2593.260	2593.260	2592.86	2592.84	0.30	0.61	0.63	0.62	0.20	0.03	0.16				
SN	CJ-9	Auditorio	5.7	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.89	2592.83	0.30	0.57	0.63	0.60	1.04	0.17	0.82				
SN	CJ-9	Auditorio	0.8	1.3%	4	2593.260	2593.260	2592.84	2592.83	0.30	0.63	0.64	0.63	0.15	0.02	0.12				
SN	CJ-9	Auditorio	2.87	0.9%	3	2593.260	2593.260	2592.87	2592.85	0.28	0.56	0.59	0.58	0.46	0.08	0.37				
SN	CJ-9	Auditorio	2.84	0.8%	2	2593.260	2593.260	2592.90	2592.87	0.25	0.52	0.54	0.53	0.38	0.07	0.30				
CJ-9	CJ-8	Auditorio	5.47	1.0%	6	2593.260	2593.260	2592.90	2592.85	0.35	0.61	0.67	0.64	1.23	0.19	0.94	0.39	1.86	1	0.025
SN	CJ-8	Auditorio	7.92	1.6%	4	2593.260	2593.260	2592.96	2592.83	0.30	0.51	0.63	0.57	1.36	0.24	1.06				
SN	CJ-8	Auditorio	1.1	0.9%	4	2593.260	2593.260	2592.84	2592.83	0.30	0.62	0.63	0.63	0.21	0.03	0.17				
SN	CJ-8	Auditorio	3.9	0.8%	3	2593.260	2593.260	2592.84	2592.81	0.28	0.60	0.63	0.62	0.66	0.11	0.54				
SN	CJ-8	Auditorio	5.9	0.2%	4	2593.260	2593.260	2592.84	2592.83	0.30	0.62	0.63	0.63	1.11	0.18	0.89				
SN	CJ-8	Auditorio	5.32	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.88	2592.83	0.30	0.58	0.63	0.60	0.97	0.16	0.77				
SN	CJ-8	Auditorio	3.7	0.0%	4	2593.260	2593.260		esta en pacha con la anterior											
SN	CJ-8	Auditorio	2.94	1.0%	3	2593.260	2593.260	2592.91	2592.88	0.28	0.53	0.56	0.54	0.44	0.08	0.34				
SN	CJ-8	Auditorio	3.63	0.8%	2	2593.260	2593.260	2592.94	2592.91	0.25	0.47	0.50	0.49	0.44	0.09	0.34				
SN	CJ-8	Auditorio	7.48	1.1%	2	2593.260	2593.260	2592.91	2592.83	0.25	0.50	0.58	0.54	1.01	0.19	0.81				
SN	CJ-8	Auditorio	6.05	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.97	2592.91	0.25	0.44	0.50	0.47	0.71	0.15	0.55				
SN	CJ-8	Auditorio	2.1	1.2%	4	2593.260	2593.260	2592.86	2592.84	0.30	0.60	0.63	0.61	0.39	0.06	0.31				

SN	CJ-8	Auditoria	2.8	1.1%	4	2593.260	2593.260	2592.98	2592.95	0.30	0.48	0.51	0.50	0.42	0.08	0.31				
SN	CJ-8	Auditoria	7.4	0.9%	4	2593.260	2593.260	2592.90	2592.83	0.30	0.56	0.63	0.60	1.33	0.22	1.05				
SN	CJ-8	Auditoria	4.8	1.0%	4	2593.260	2593.260	2592.89	2592.84	0.30	0.57	0.62	0.60	0.86	0.14	0.68				
SN	CJ-8	Auditoria	1.85	1.1%	3	2593.260	2593.260	2592.91	2592.89	0.28	0.53	0.55	0.54	0.27	0.05	0.21				
SN	CJ-8	Auditoria	5.89	0.8%	2	2593.260	2593.260	2592.96	2592.91	0.25	0.45	0.50	0.48	0.70	0.15	0.54				
SN	CJ-8	Auditoria	2.86	1.0%	3	2593.260	2593.260	2592.92	2592.89	0.28	0.52	0.55	0.53	0.42	0.08	0.33				
SN	CJ-8	Auditoria	2.27	1.1%	2	2593.260	2593.260	2592.95	2592.92	0.25	0.47	0.49	0.48	0.27	0.06	0.21				
SN	CJ-8	Auditoria	1.48	1.0%	2	2593.260	2593.260	2592.95	2592.93	0.25	0.47	0.48	0.47	0.18	0.04	0.14				
												TOTAL		4.30	7.34	38.37	3.07	12.95	6.00	0.15

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA


RESIDENTE
INTERVENTORIA

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Construcciones Centro Cultural	CONTRATISTA: Consorcio Mega Construcciones Ltda	INTERVENTORIA: CONSORCIO ARTES 2022

FECHA:	18/06/2024	PÁGINA	1	DE:	1	OBSERVACIONES:	Excavacion Manual Plazoleta etapa 2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACION
	LARGO	ANCHO	ALTO				
EXCAVACION MANUAL VIGAS Y VIGUETAS FASE 2 - PLAZOLETA							
EJE 8 entre EJE 20 Y 19 VC 105	1,80	0,75	0,35	1,00	0,47	M3
	4,90	0,55	0,35	1,00	0,94	M3
	8,64	0,67	0,05	1,00	2,36	M3
	4,39	0,48	0,35	1,00	0,74	M3
	1,53	0,80	0,35	1,00	0,43	M3
VIGA ENTRA ENTRE EJES 8 Y 19-19	72,05	0,30	0,07	1,00	1,41	M3
EJE D entre EJE 20 Y 19 VC - 104	1,85	0,72	0,35	1,00	0,46	M3
	4,60	0,53	0,35	1,00	0,85	M3
	2,70	0,77	0,35	1,00	0,73	M3
	6,70	0,68	0,35	1,00	1,50	M3
	4,70	0,51	0,33	1,00	0,84	M3
	1,70	0,70	0,35	1,00	0,44	M3
EJE C entre EJE 20 Y 18 VC - 103	4,41	0,66	0,35	1,00	1,02	M3
	17,65	0,80	0,42	1,00	4,40	M3
Vic-104 entre ejes C Y D	2,90	0,29	0,36	1,00	0,74	M3
Vic-117 entre ejes D Y G	1,87	0,23	0,35	1,00	0,15	M3
	2,02	0,73	0,95	1,00	0,16	M3
VC-120 EJE 18 entre ejes C Y G	3,00	0,35	0,35	1,00	0,37	M3
	2,00	0,46	0,35	1,00	0,32	M3
	2,36	0,47	0,35	1,00	0,36	M3
	2,80	0,20	0,40	1,00	0,27	M3
Vic 120 entre ejes C Y B	2,87	0,23	0,35	1,00	0,24	M3
	1,96	0,23	0,35	1,00	0,16	M3
	2,02	0,23	0,35	1,00	0,16	M3
	2,80	0,40	0,40	1,00	0,45	M3
Vic 117 entre ejes C Y G	2,86	0,23	0,35	1,00	0,23	M3
	1,93	0,29	0,35	1,00	0,16	M3
	1,87	0,23	0,35	1,00	0,15	M3
	2,80	0,20	0,40	1,00	0,22	M3
VC-127 EJE 15 entre ejes C Y B	2,86	0,40	0,35	1,00	0,40	M3
	1,80	0,42	0,35	1,00	0,26	M3
	1,62	0,42	0,35	1,00	0,27	M3
	2,80	0,40	0,40	1,00	0,45	M3
Vic 126 entre ejes C Y G	1,86	0,24	0,35	1,00	0,24	M3
	1,80	0,24	0,35	1,00	0,16	M3
	1,78	0,24	0,35	1,00	0,15	M3
	2,80	0,20	0,40	1,00	0,22	M3
Vic 118 entre ejes C Y G	2,80	0,33	0,35	1,00	0,32	M3
	1,80	0,73	0,35	1,00	0,14	M3
	1,85	0,23	0,35	1,00	0,15	M3
	2,80	0,70	0,40	1,00	0,22	M3
VC-128 EJE 13 entre ejes C Y G	2,94	0,43	0,35	1,00	0,44	M3
	1,80	0,68	0,35	1,00	0,75	M3
	1,62	0,42	0,35	1,00	0,28	M3
	2,80	0,40	0,40	1,00	0,45	M3
Vic 114 entre ejes C Y G	3,00	0,24	0,35	1,00	0,25	M3
	1,72	0,24	0,35	1,00	0,14	M3
	2,02	0,24	0,35	1,00	0,17	M3
	2,80	0,30	0,40	1,00	0,22	M3
Vic 113 entre ejes C Y G	3,04	0,22	0,35	1,00	0,23	M3
	1,90	0,22	0,35	1,00	0,15	M3
	2,02	0,22	0,35	1,00	0,16	M3
	2,80	0,20	0,40	1,00	0,22	M3
VC-125 EJE 11 entre ejes C Y G	3,02	0,45	0,35	1,00	0,48	M3
	1,80	0,45	0,35	1,00	0,29	M3
	1,36	0,45	0,35	1,00	0,21	M3
	2,80	0,40	0,40	1,00	0,45	M3
Vic 112 entre ejes C Y G	2,91	0,24	0,35	1,00	0,24	M3
	1,80	0,75	0,35	1,00	0,16	M3
	1,87	0,55	0,25	1,00	0,26	M3
	2,80	0,40	0,20	1,00	0,22	M3
VC-108 EJE 6 entre ejes C Y G	7,33	0,50	0,30	1,00	1,41	M3
	6,50	0,50	0,30	1,00	1,24	M3
	8,00	0,60	0,30	1,00	1,82	M3
BANTERAS	2,80	0,27	0,33	1,00	0,26	M3
	2,30	0,20	0,30	1,00	0,14	M3
	5,10	0,20	0,80	1,00	0,31	M3
				Subtotal			33,74

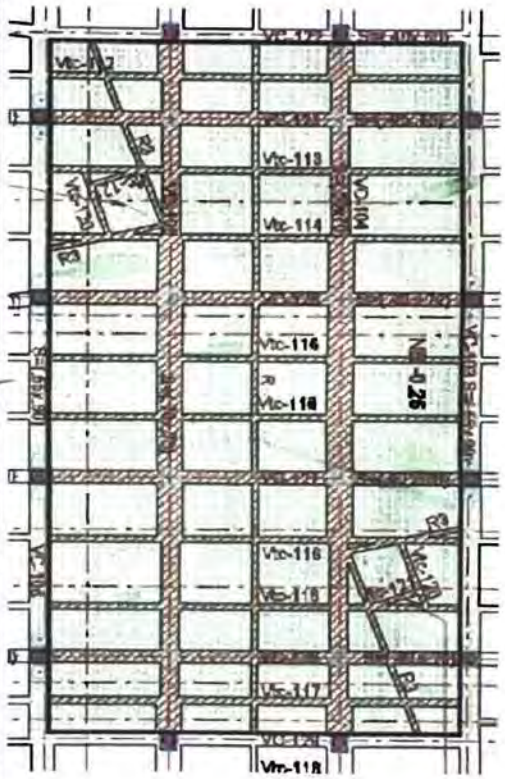

ARCHIVO ACAD

VIENEN	33,74
	0,00
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA TOTAL	33,74

ING RESIDENTE CONTRATISTA

TOPOGRAFO CONTRATISTA


ING RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:				Liberación de actividad:	Demolición Cabeza de Pilotes		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Demolición cabeza pilotes escalera (1)				X		Ø40cm - 1.33m³ - Cant 33	
Demolición cabeza pilotes auditorio (2)				X		Ø40cm - 1.37m³ - Cant 34	
Demolición cabeza pilotes auditorio (2)				X		Ø50cm - 5,34m³ - Cant 85	
Demolición cabeza pilotes auditorio (2)				X		Ø60cm - 1.63m³ - Cant 18	
Demolición cabeza pilotes rampa (3)				X		Ø40cm - 0.68m³ - Cant 17	
Demolición cabeza pilotes plazoleta (4)				X		Ø40cm - 4.66m³ - Cant 116	
Demolición cabeza pilotes plazoleta (4)				X		Ø50cm - 2.83m³ - Cant 45	
Demolición cabeza pilotes plazoleta (4)				X		Ø60cm - 2.99m³ - Cant 33	
Demolición cabeza pilotes polivalente (5)				X		Ø40cm - 0,72m³ - Cant 18	
Demolición cabeza pilotes polivalente (5)				X		Ø60cm - 0,18m³ - Cant 2	
Demolición cabeza pilotes escalera tanque (6)				X		Ø40cm - 1.61m³ - Cant 40	
Demolición cabeza pilotes aislados (7)				X		Ø50cm - 2.83m³ - Cant 45	
Demolición cabeza pilotes aislados (7)				X		Ø60cm - 3,71m³ - Cant 41	
Demolición cabeza pilotes aislados (7)				X		Ø70cm - 1.11m³ - Cant 9	

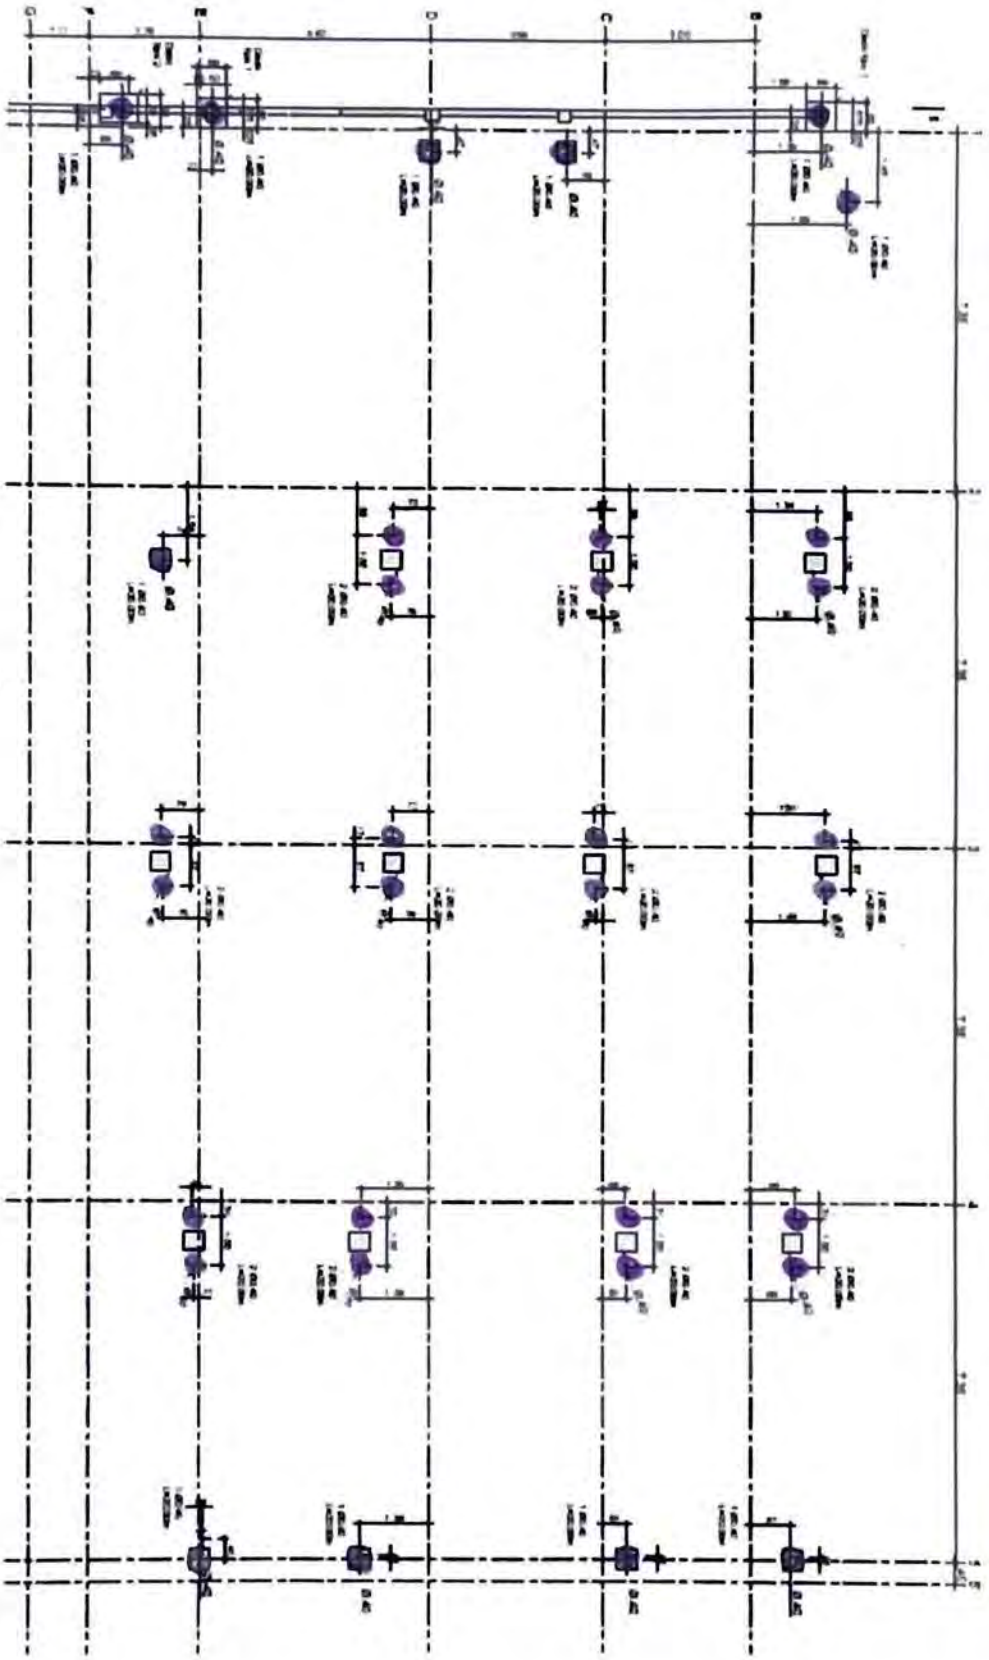


(1)

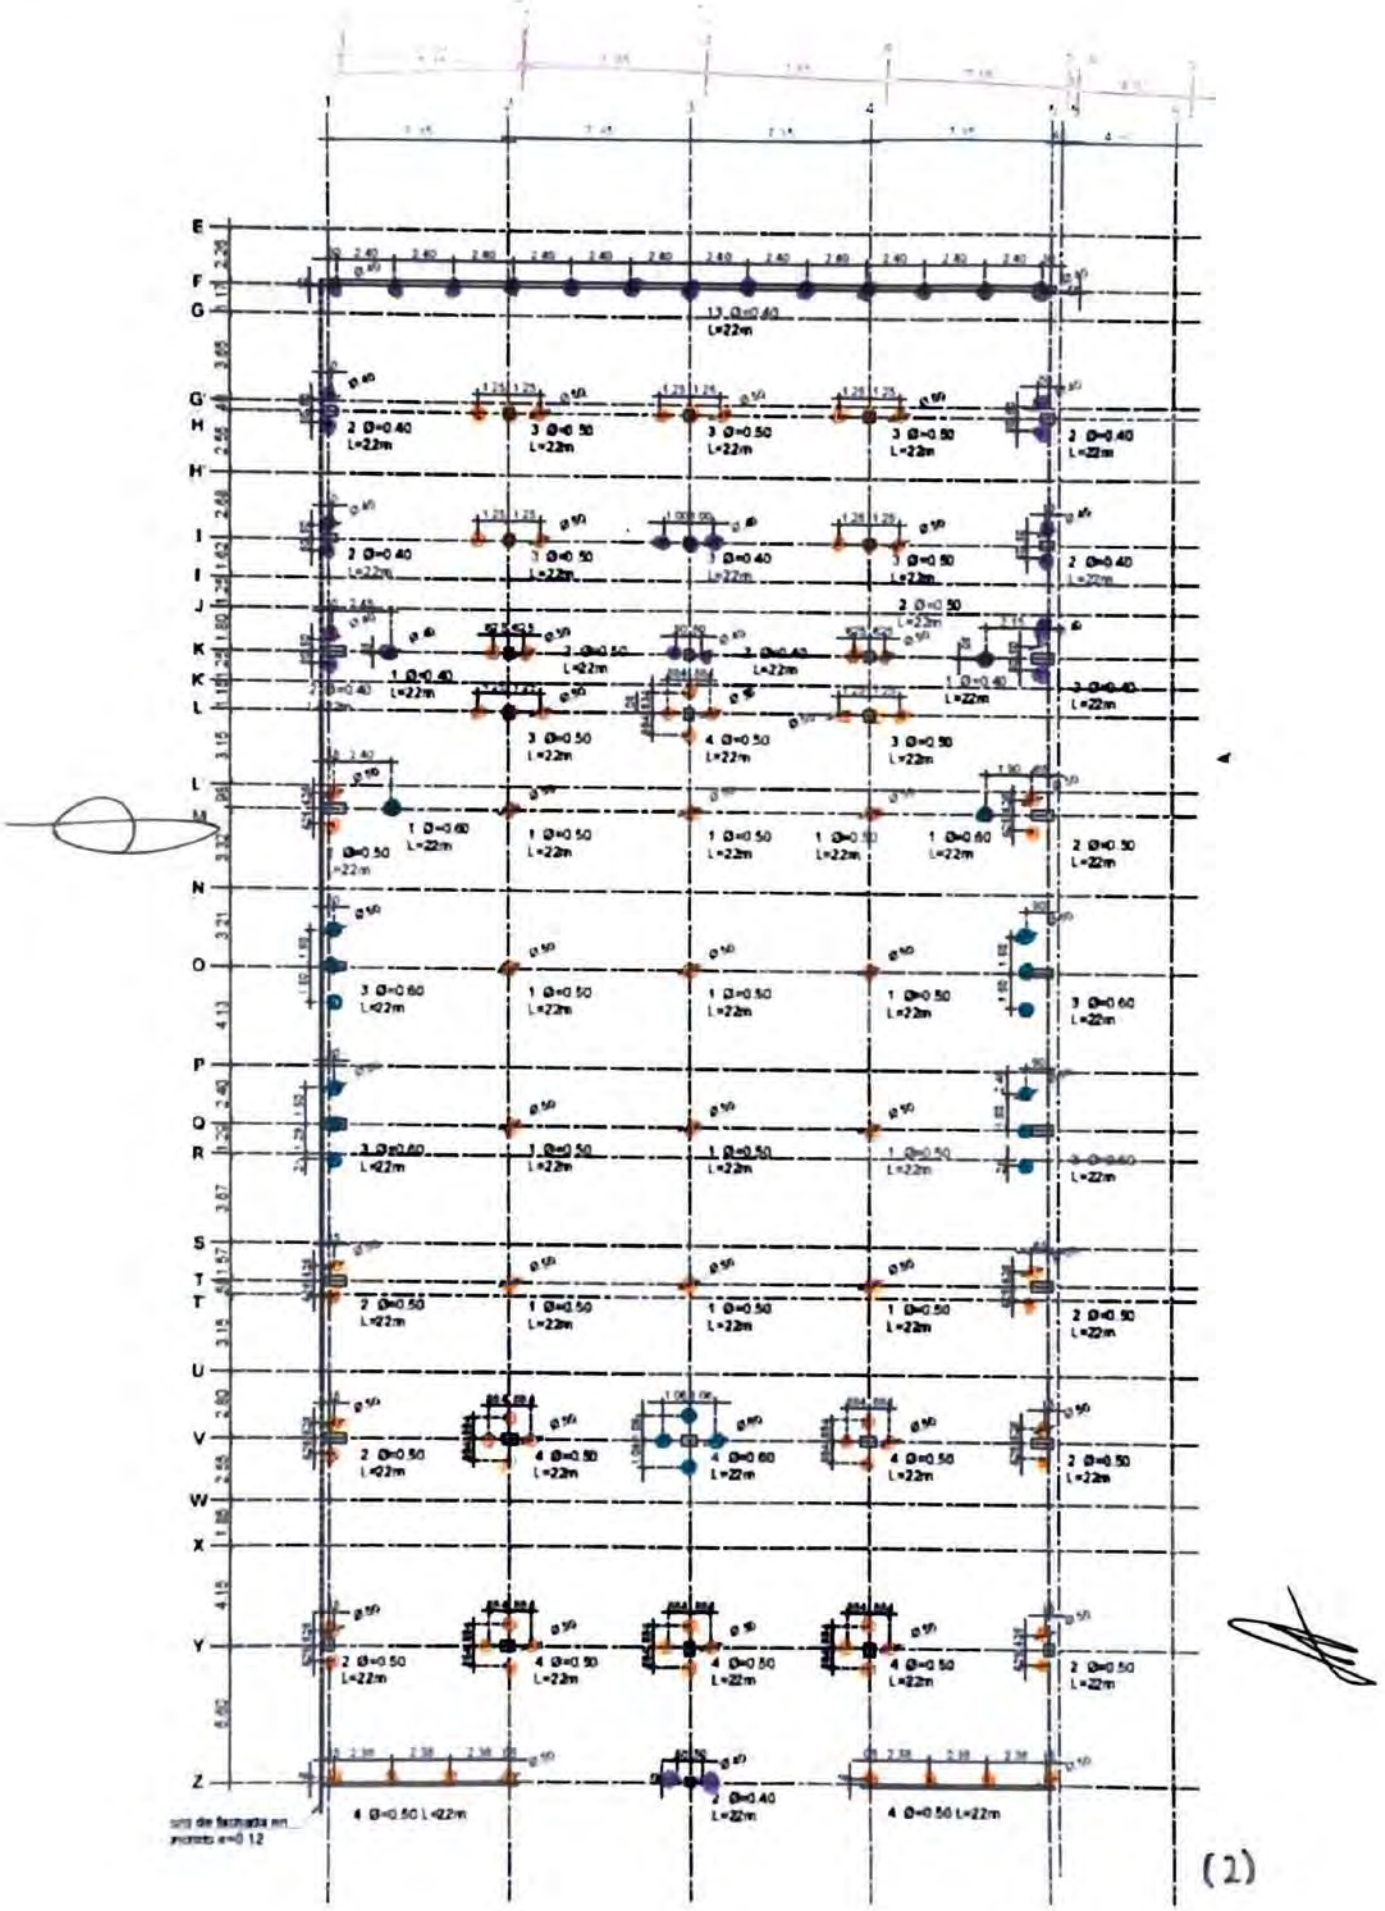

E
F
G
G'
H
H'
I
I'
J
K
K'
L
L'
M
N
O
P
Q
R
S
T
T'
U
V
W
X
Y
Z
13 Ø=0.60 L=22m
2 Ø=0.40 L=22m
3 Ø=0.50 L=22m
4 Ø=0.50 L=22m
1 Ø=0.60 L=22m
3 Ø=0.60 L=22m
2 Ø=0.50 L=22m
4 Ø=0.60 L=22m
1 Ø=0.40 L=22m
2 Ø=0.40 L=22m
4 Ø=0.50 L=22m
(2)

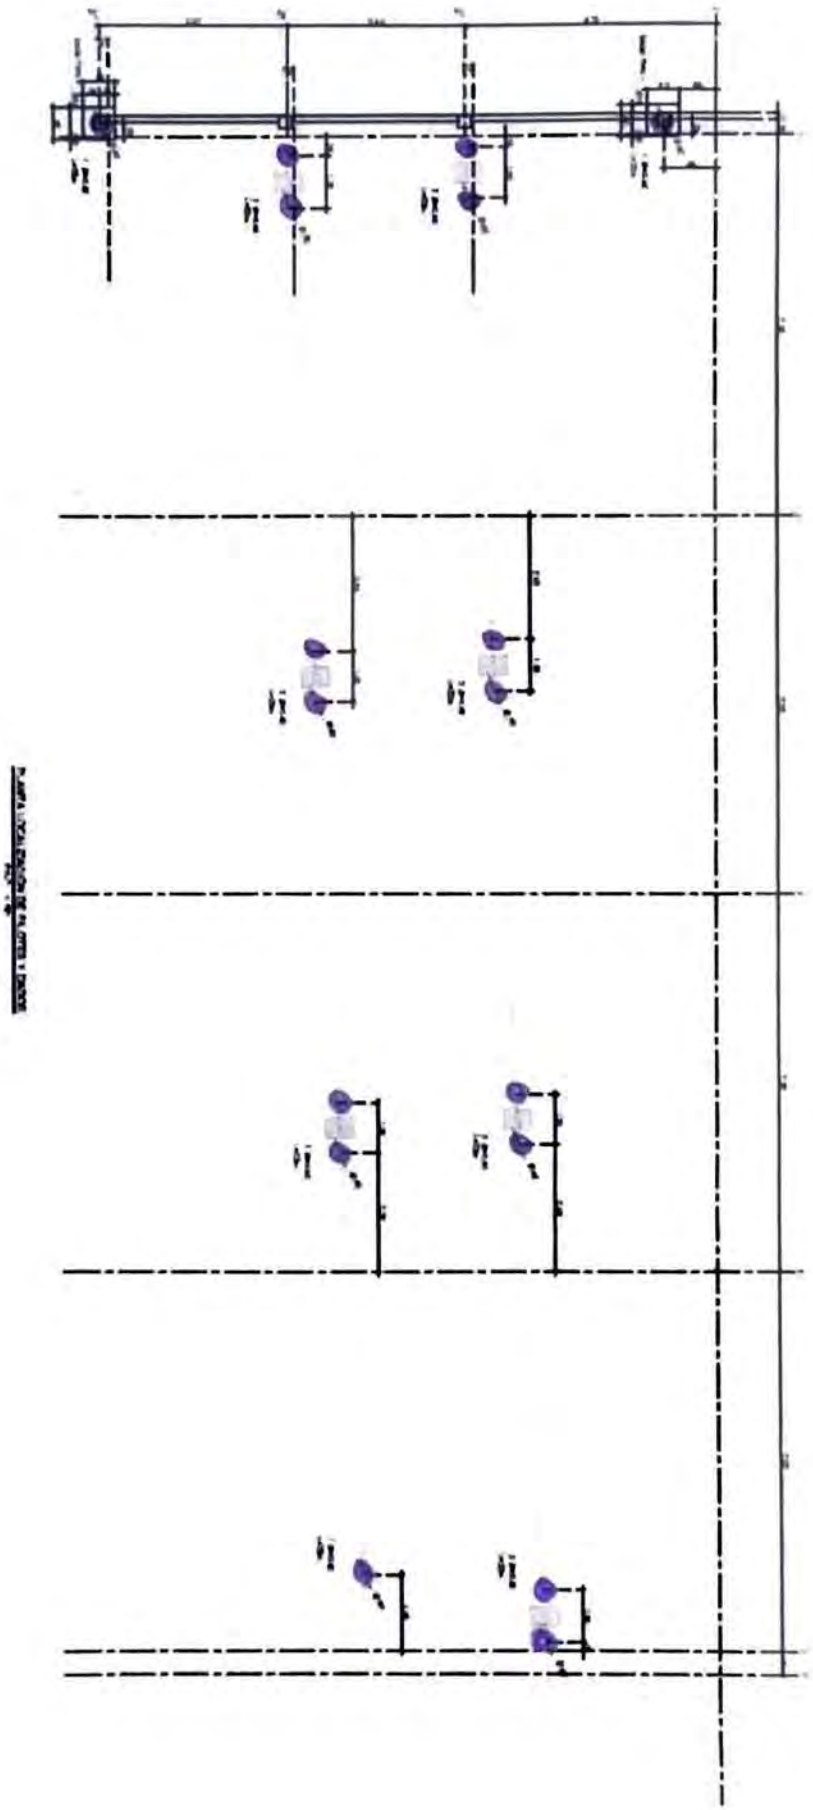



(3)

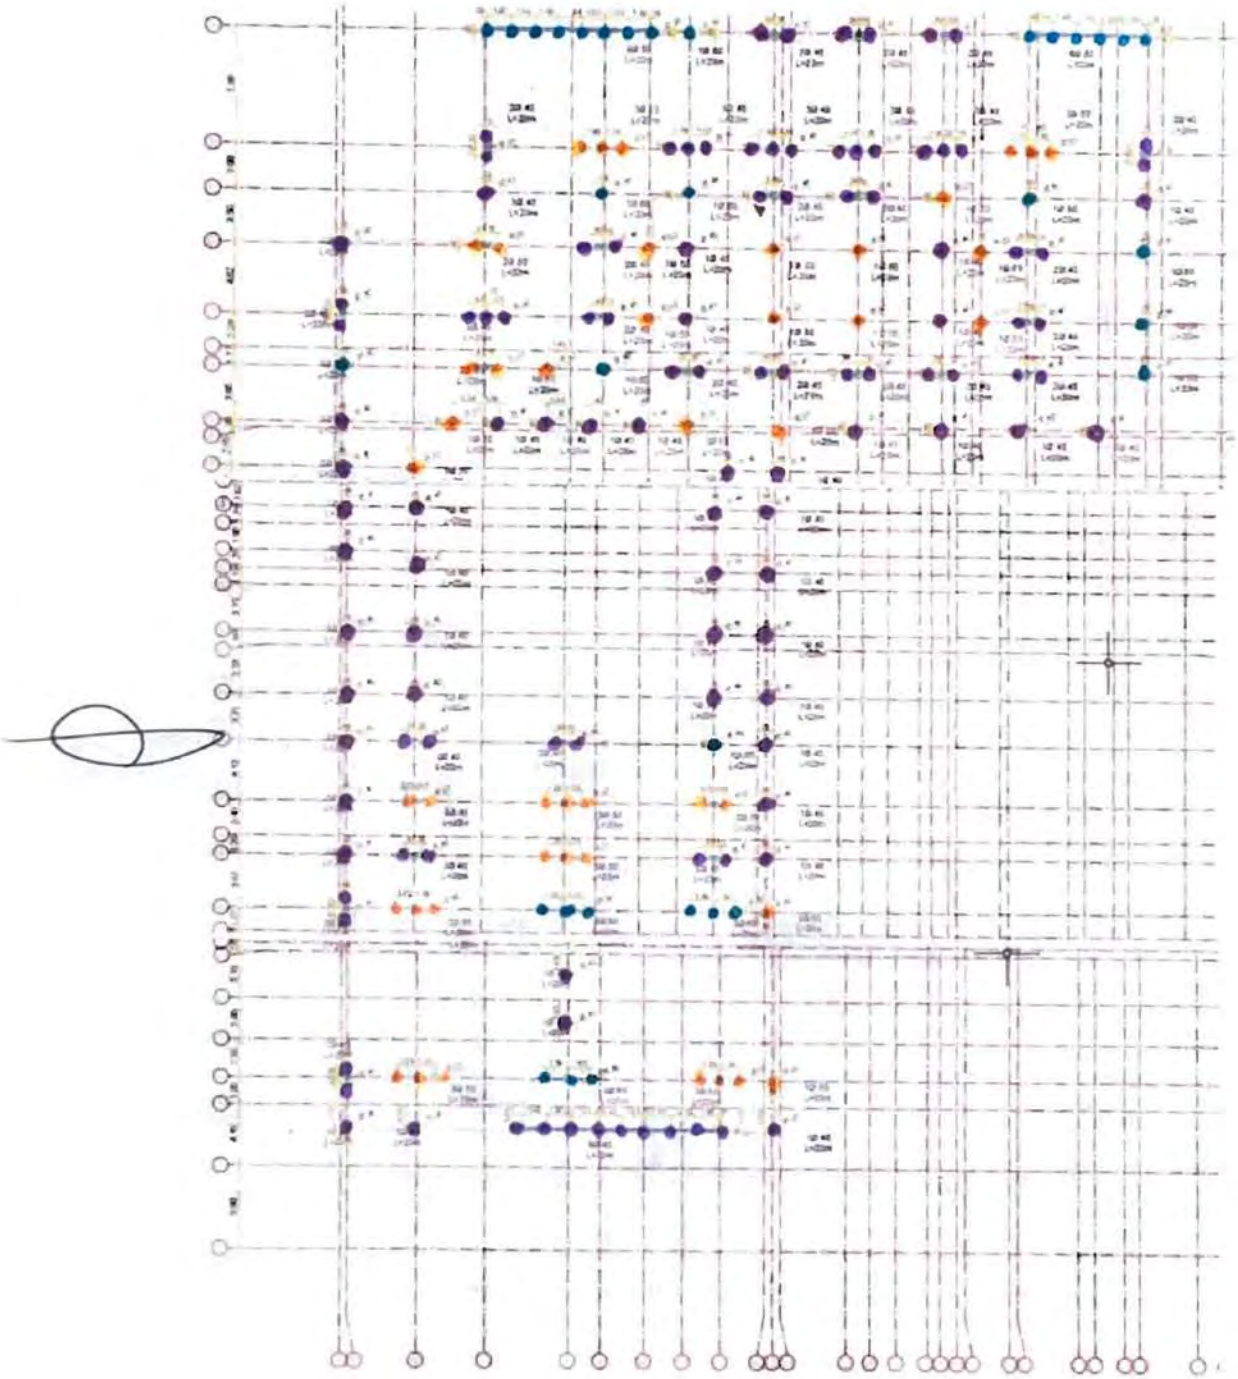

(9)

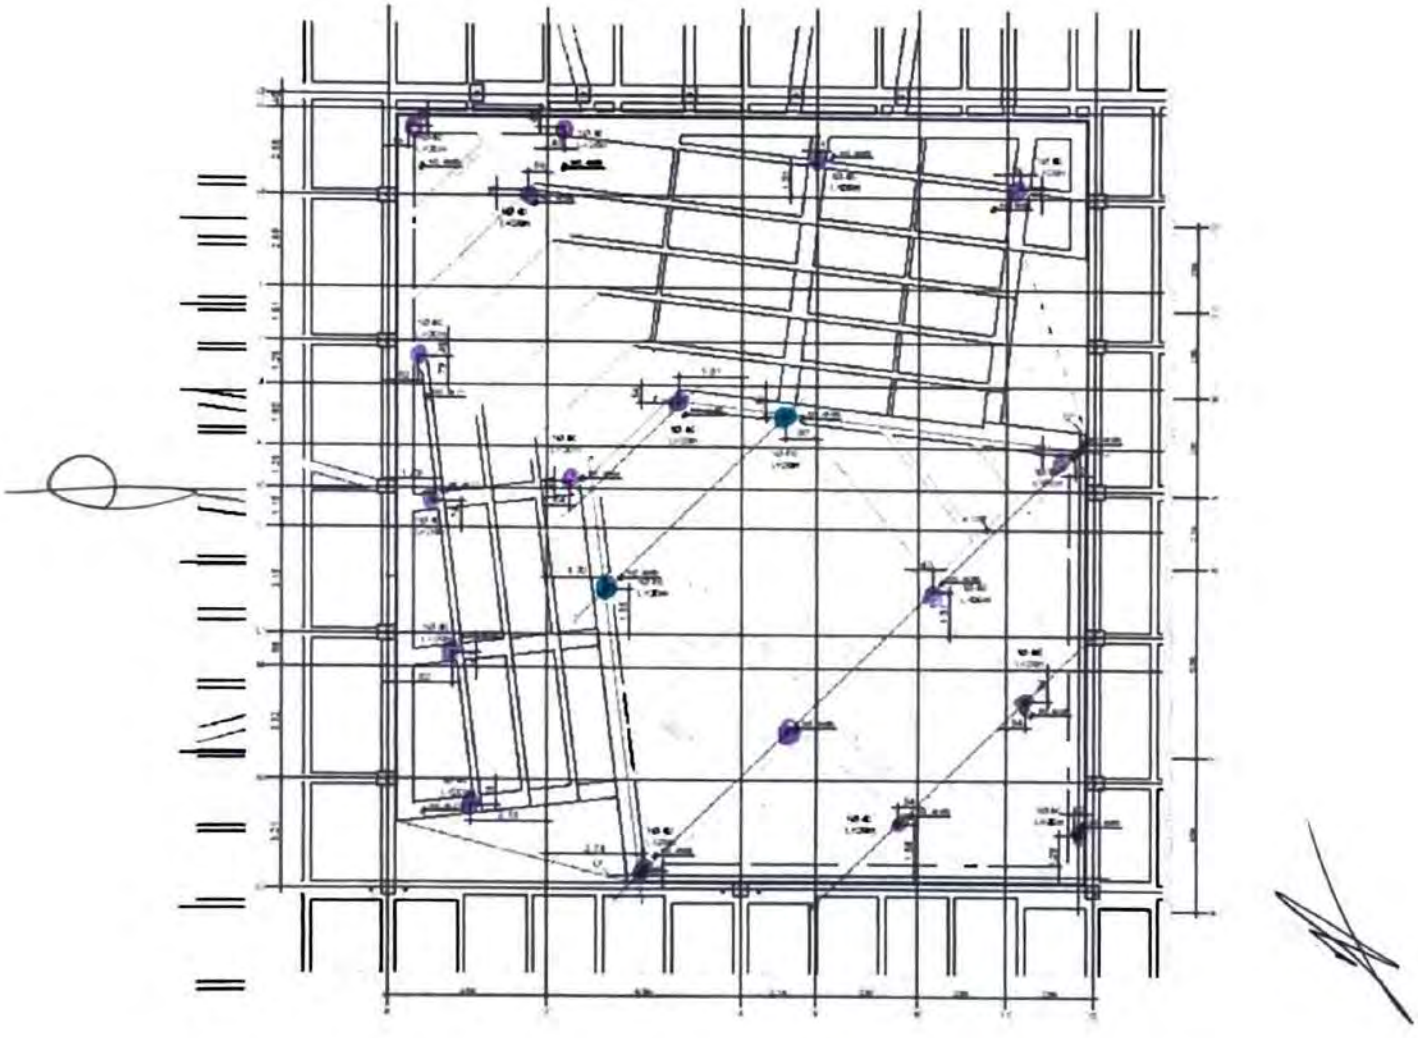

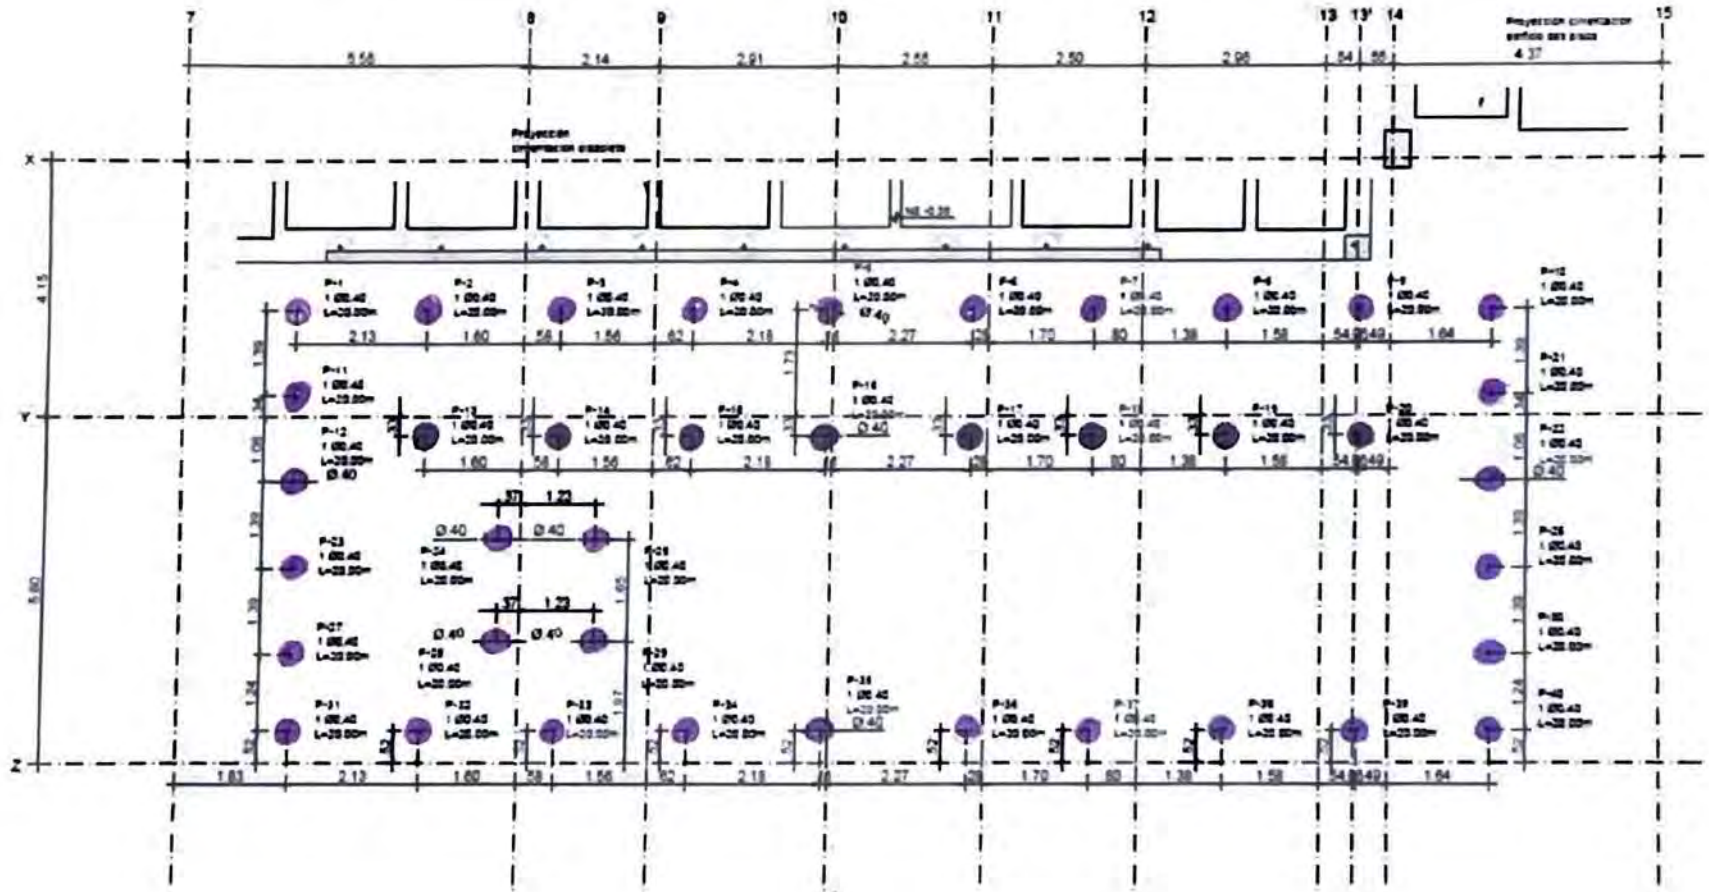
7
8
9
10
11
12
13
13'
14
15
X
Y
Z
5.58
2.14
2.91
2.55
2.50
2.96
.54
.55
4.37
4.15
5.80
Proyección cimentación existente
Proyección cimentación existente sótano
Ø.40
1.83
2.13
1.60
.58
1.56
.62
2.18
.58
2.27
.58
1.70
.60
1.38
1.58
.54
.49
1.64

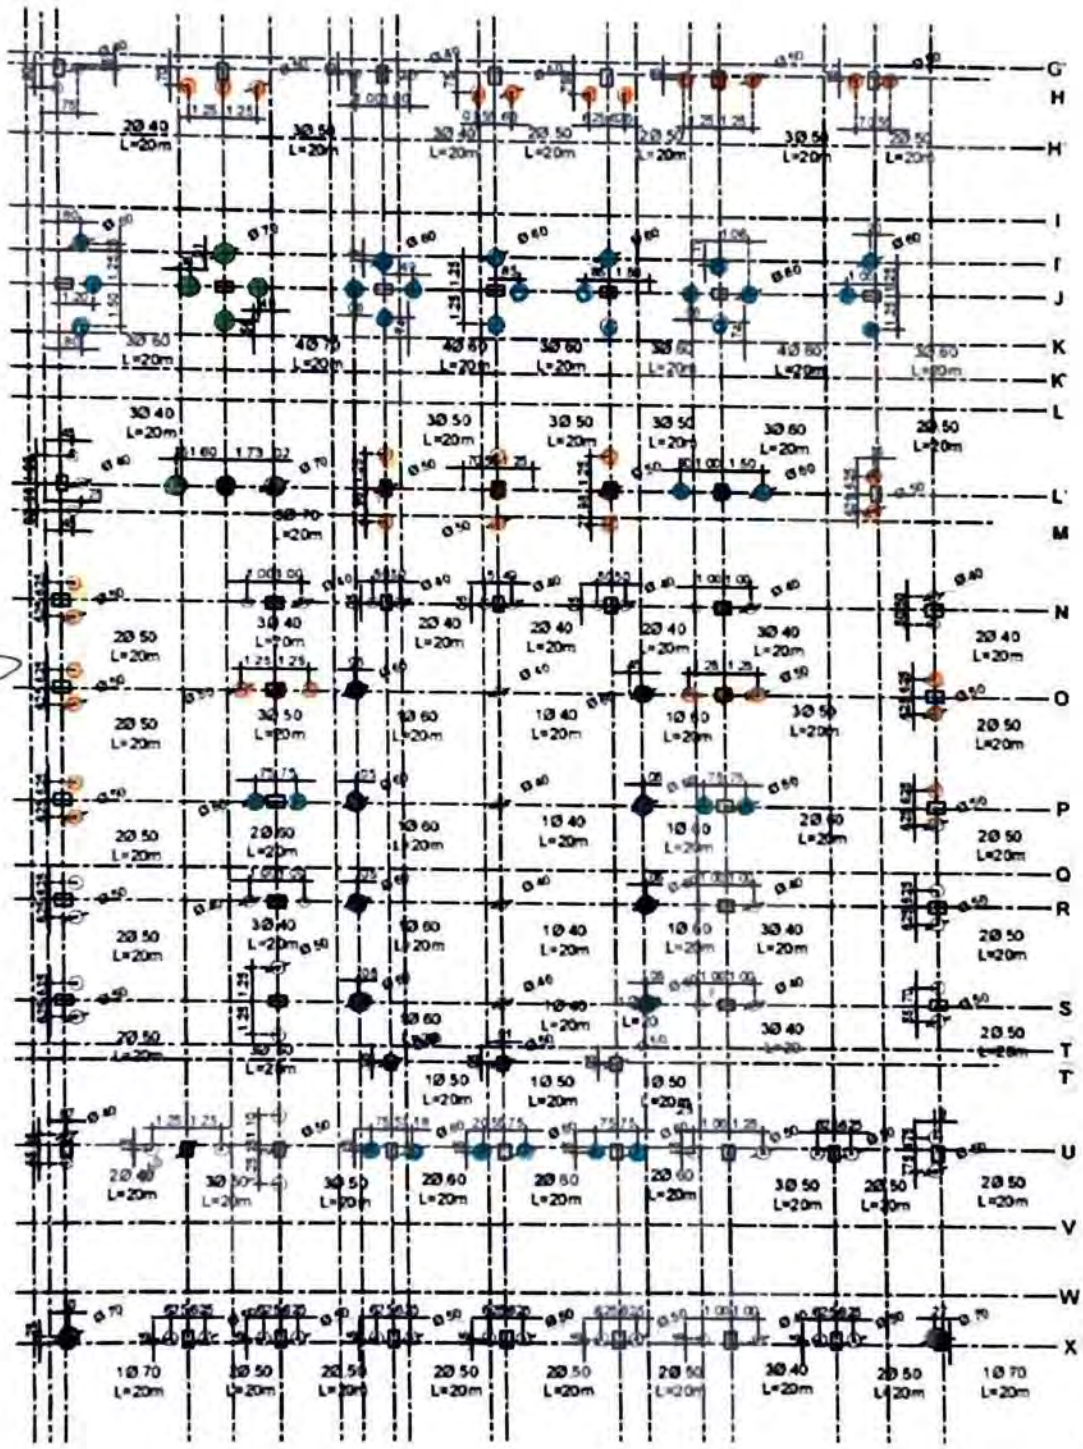


(7)

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:				Liberación de actividad:	Concreto para dados de F'c 28 MPa		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Dado auditorio tipo 1				X		(1.60 x 1.00 x 0.75) Cant. 1	
Dado auditorio tipo 2				X		(1.60 x 0.90 x 0.95) Cant. 1	
Dado auditorio tipo 3				X		(1.95 x 1.20 x 0.95) Cant. 2	
Dado auditorio tipo 4				X		(3.80 x 1.50 x 0.75) Cant 2	
Dado auditorio tipo 5				X		(0.80 x 0.80 x 0.55) Cant. 4	

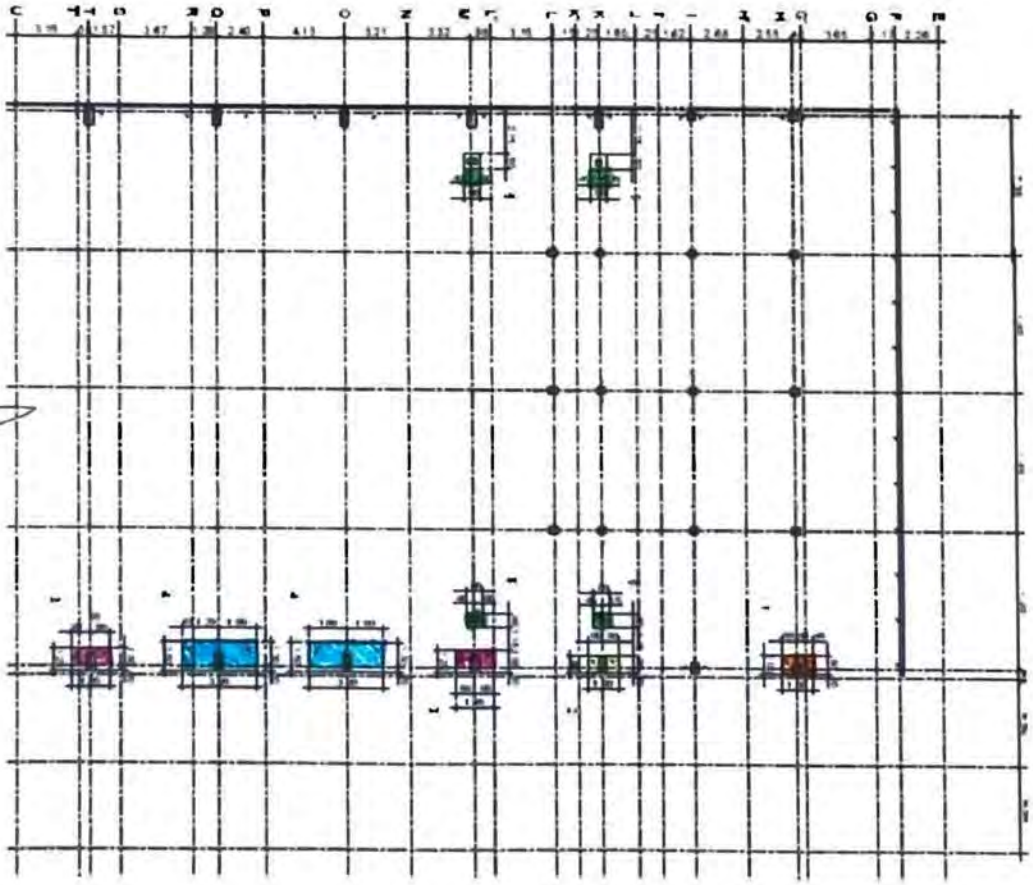


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR 5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:	Escaleras - Auditorio			Liberación de actividad:	Concreto para columnas f'c 35 MPa		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Columnas D-E entre 4 y 5; E entre 4 y 5 D-E-5				X		(3.80 x 0.40 x 0.40) Cant. 4	
Columnas C entre 3 y 4; C entre 2 y 3				X		(2.45 x 0.90 x 0.40) Cant 2	
Columnas tipo 3				X		(2.00 x 0.40 x 0.40) Cant. 4	
Columnas tipo 2				X		(1.55 x 0.40 x 0.40) Cant. 2	
Columnas tipo 1				X		(0.90 x 0.40 x 0.40) Cant. 1	
Columnas D entre 1 y 2, C entre 1 y 2				X		(2.90 x 0.40 x 0.40) Cant 2	
Columnas E-F entre 2 y 3; E-F entre 3-4				X		(4.25 x 0.40 x 0.40) Cant 2	
Columnas D-E entre 2 y 3, D-E entre 3-4				X		(3.35 x 0.40 x 0.40) Cant. 2	-
COLUMNAS AUDITORIO	-	-	-	X	-	-	
Columnas 6'-1 6'-5				X		(3.84 x 0.50 x 0.40) Cant 2	
Columnas 6'-2, 6'-3, 6'-4				X		(4.04 x 0.40 x 0.40) Cant 3	
Columnas I-1, I-5				X		(3.84 x 0.50 x 0.40) Cant 2	
Columnas I-2, I-3, I-4				X		(4.04 x 0.40 x 0.40) Cant 3	


Columnas D-E entre 4 y 5
E entre 4 y 5
D-E-5

Son 4

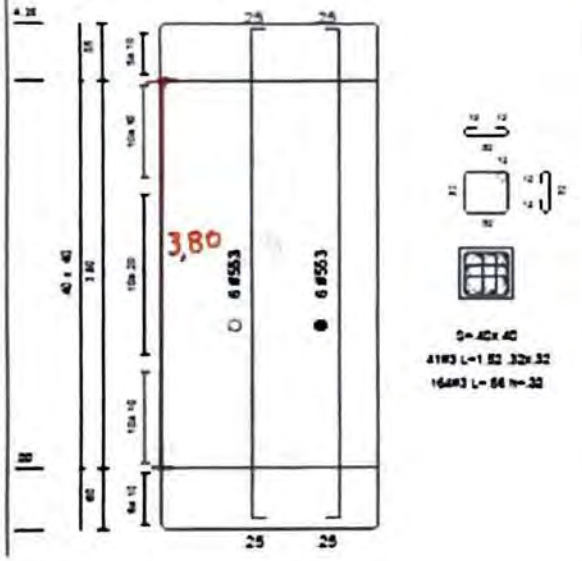


Columnas C entre 3 y 4
C entre 2 y 3

Son 2

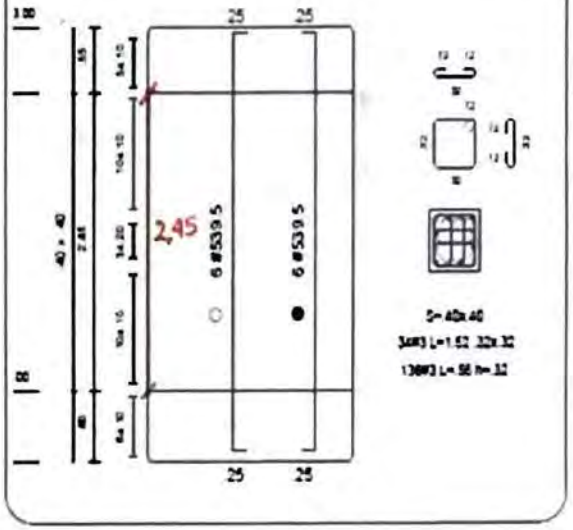

Columnas Tipo 3


Son 4

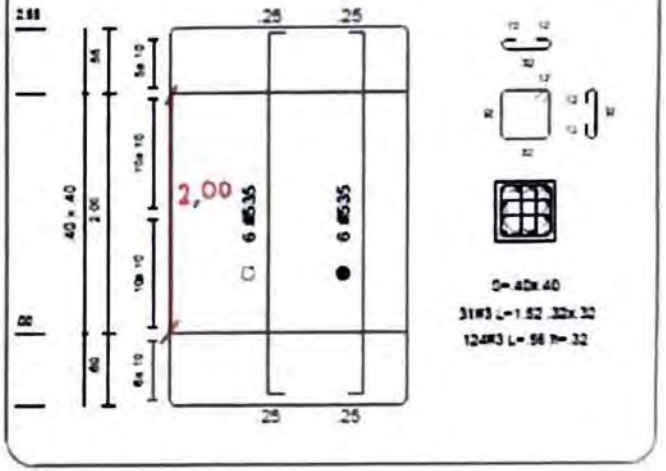

(1)


Columna Tipo 1

Es 1

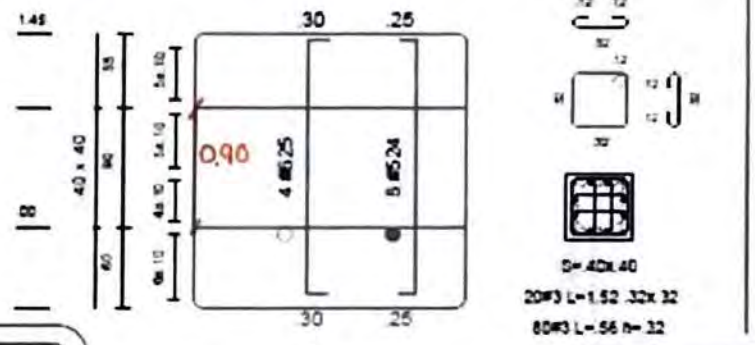


Columnas Tipo 2


Son 2

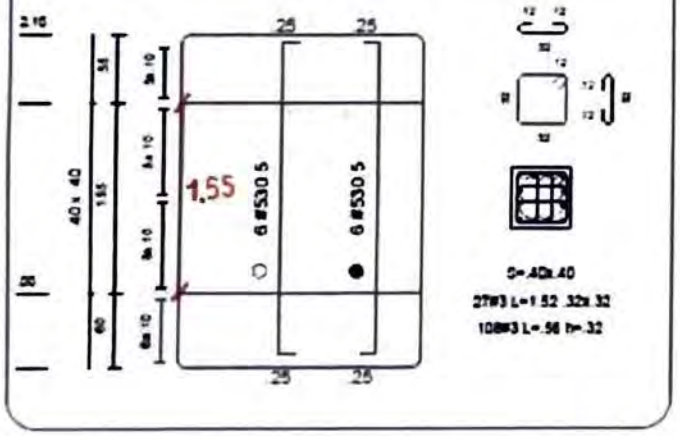


Columnas D entre 1 y 2
C´ entre 1 y 2

Son 2

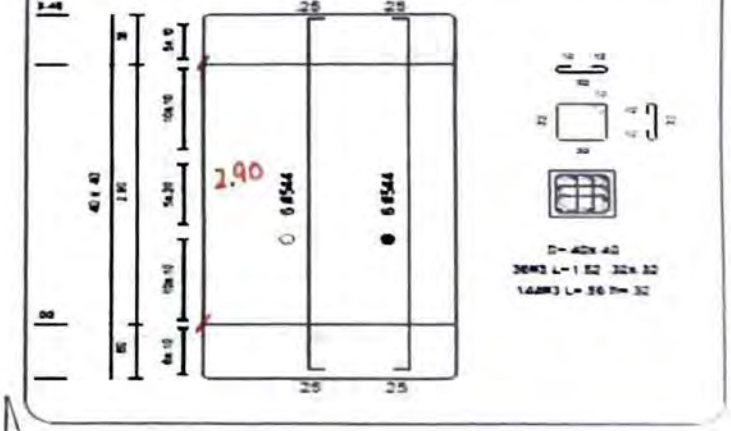


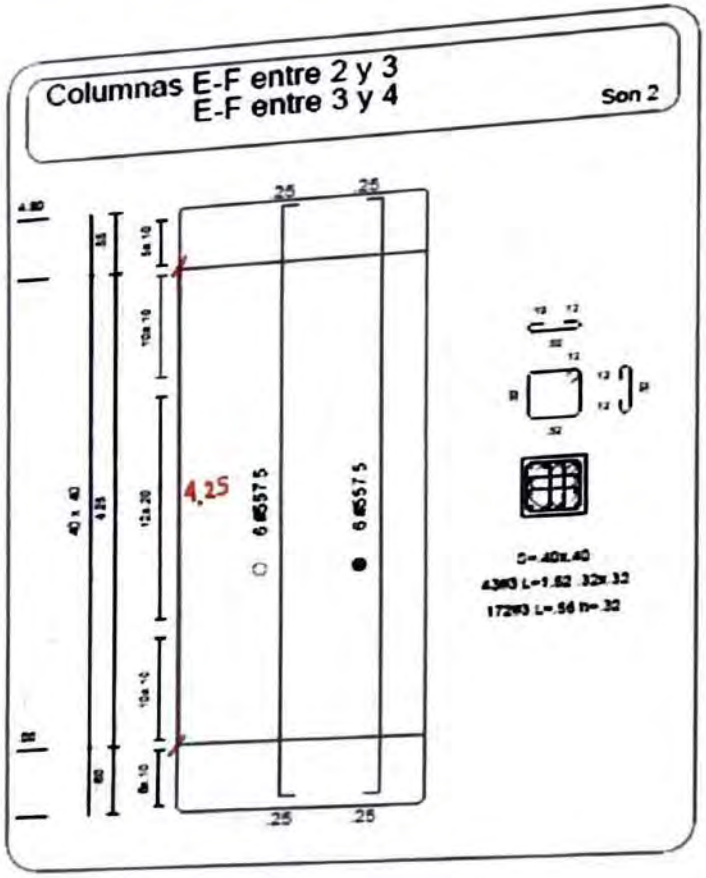
Columnas E-F entre 2 y 3
E-F entre 3 y 4
Son 2
4.25
.25
.25
.25
.25

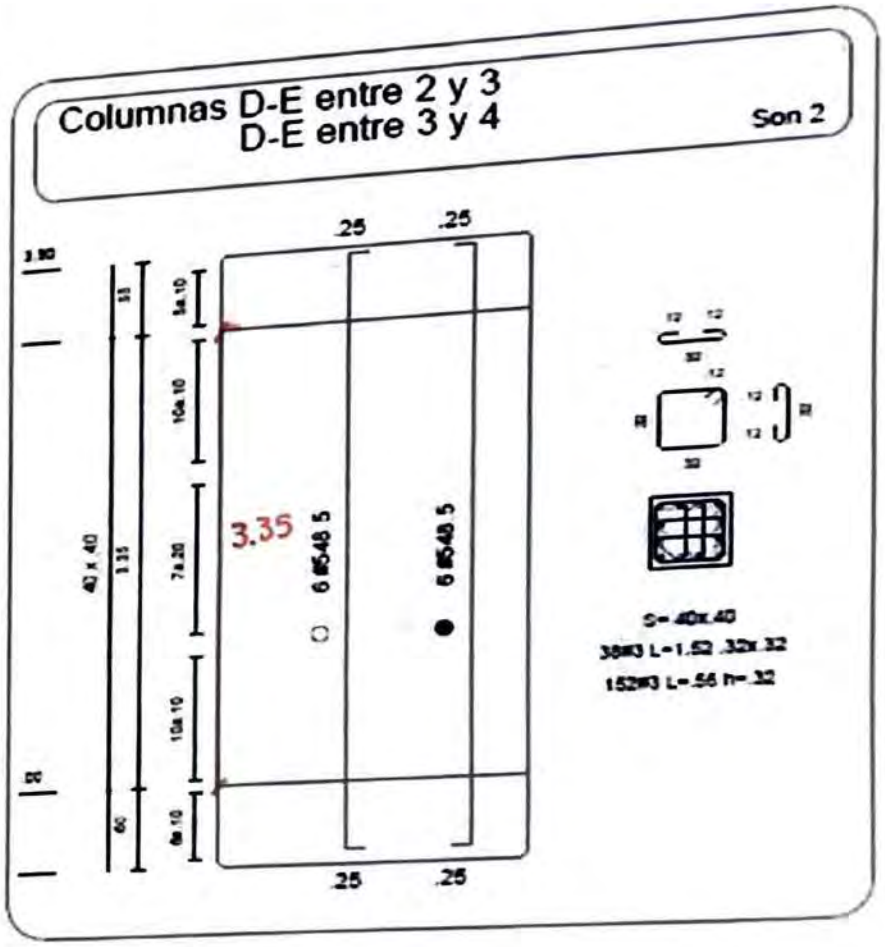
Columnas D-E entre 2 y 3
D-E entre 3 y 4
Son 2
3.35
.25
.25
.25
.25


Columnas Y-1, I-1, I-5, G'-1, G'-5

Son 5

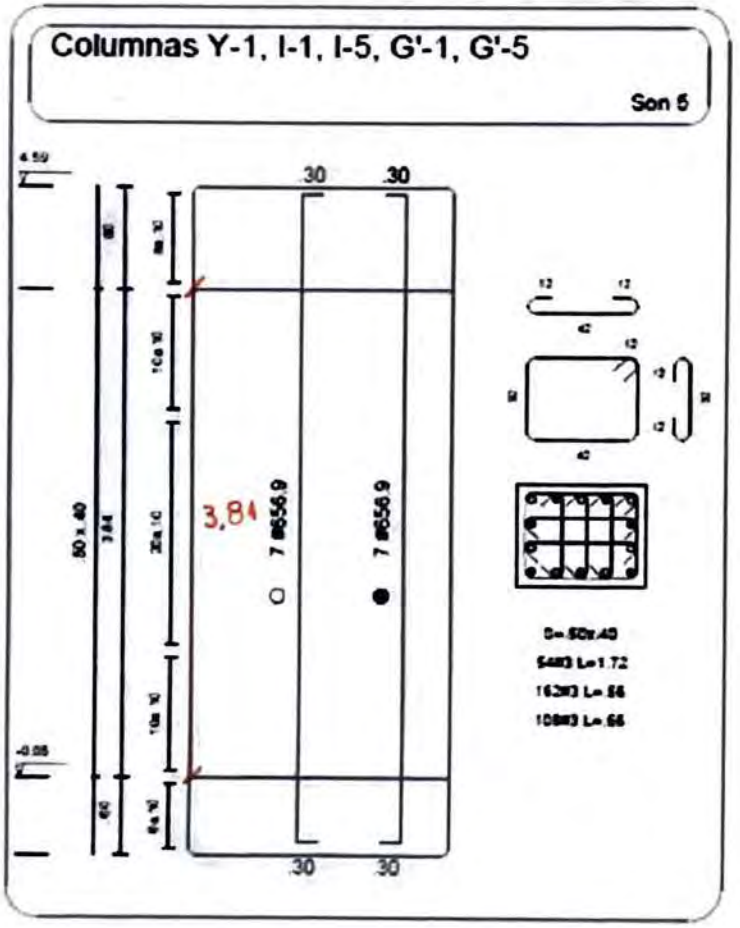


Columnas G'-2, G'-3, G'-4

Son 3

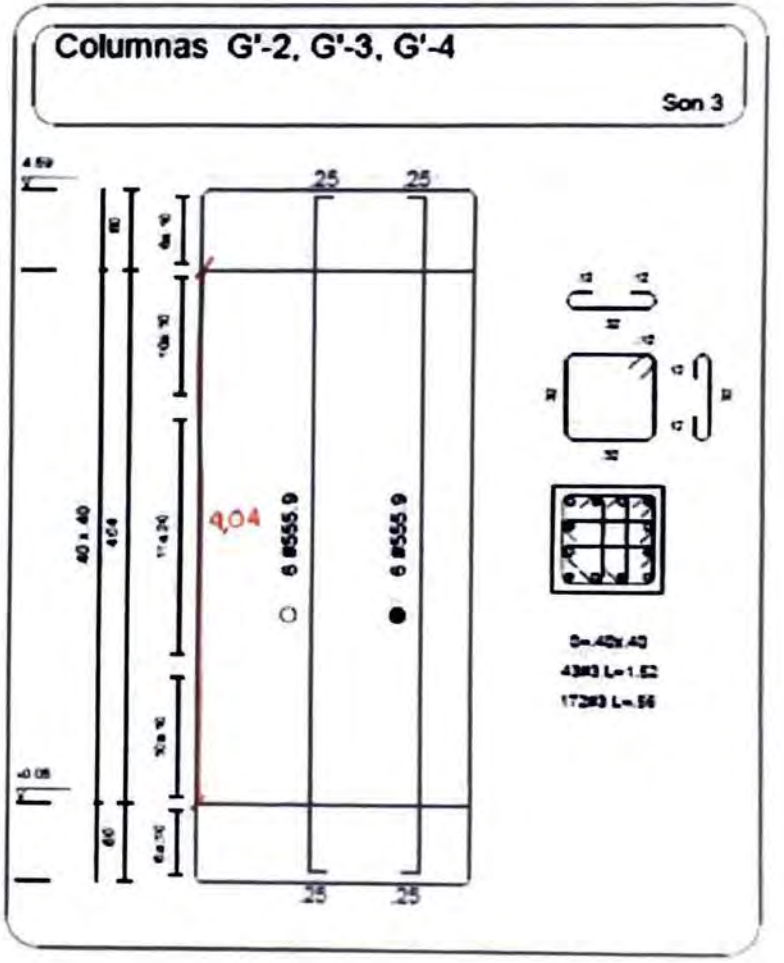


Columnas Y-1, I-1, I-5, G'-1, G'-5

Son 5

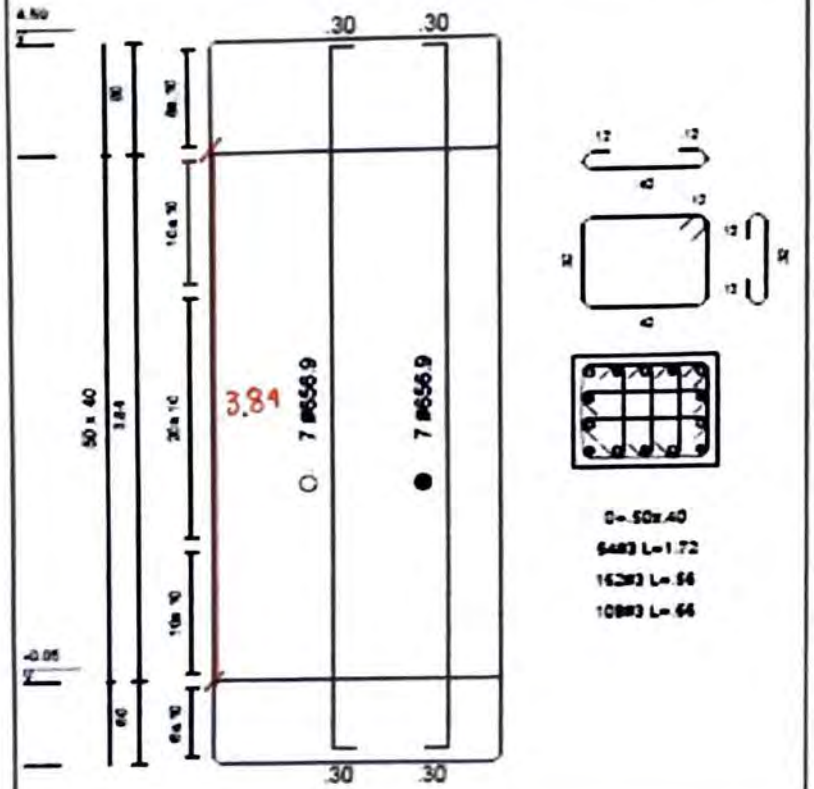

Columnas K-2, K-3, K-4, I-4, I-3, I-2


Son 6

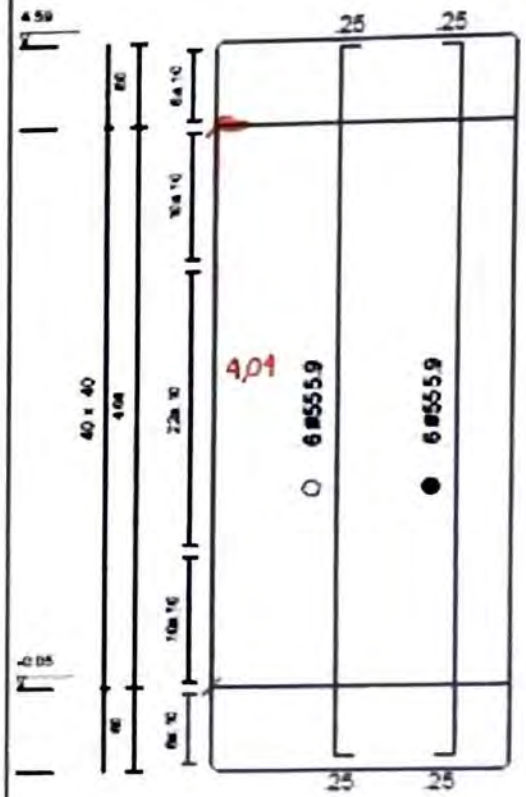


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:				Liberación de actividad:	Concreto para pantallas f'c 35MPa		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Pantalla tipo 1 Auditorio eje F				X		(30.00 x 0.20 x 3.84)	

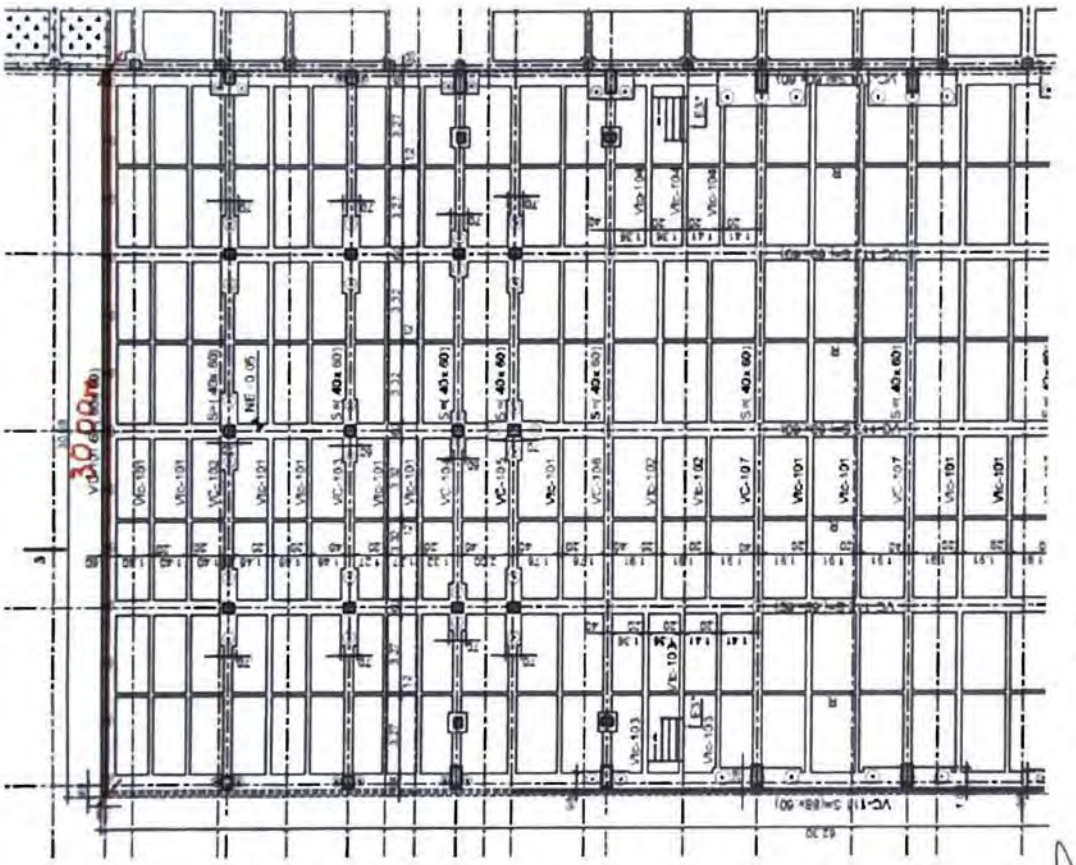

30.00m

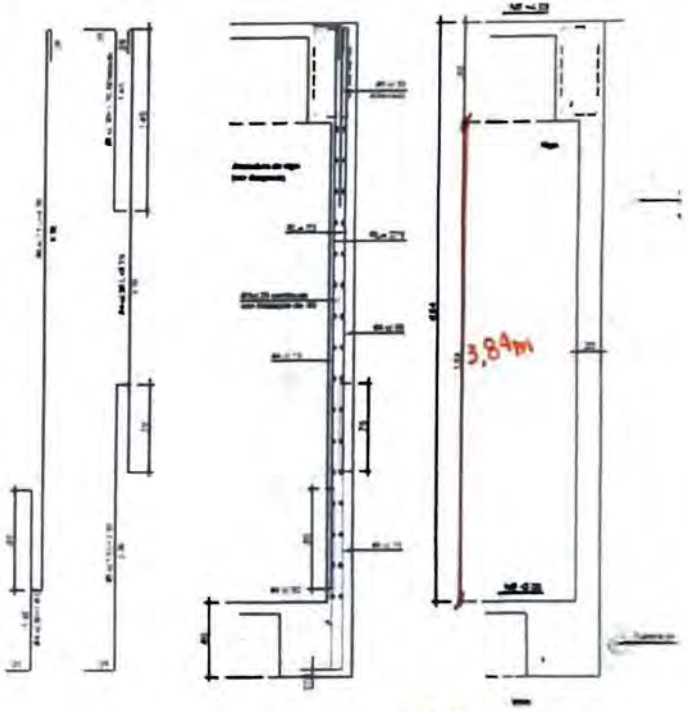
3,84m
e=20cm

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055821	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:	Escaleras			Liberación de actividad:	Base en concreto pobre		


Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
VCIN-E-001						(28.91 x 0.4 x 0.03)	
VCIN-E-002						(28.45 x 0.4 x 0.03)	
VCIM-E-003						(29.46 x 0.4 x 0.03)	
VCIN E-004						(20.72 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-010						(14.46 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-006						(12.07 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-007						(12.07 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-008						(11.00 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-009						(10.78 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-010						(14.46 x 0.4 x 0.03)	
VCIM E-005						(2.68 x 0.4 x 0.03)	

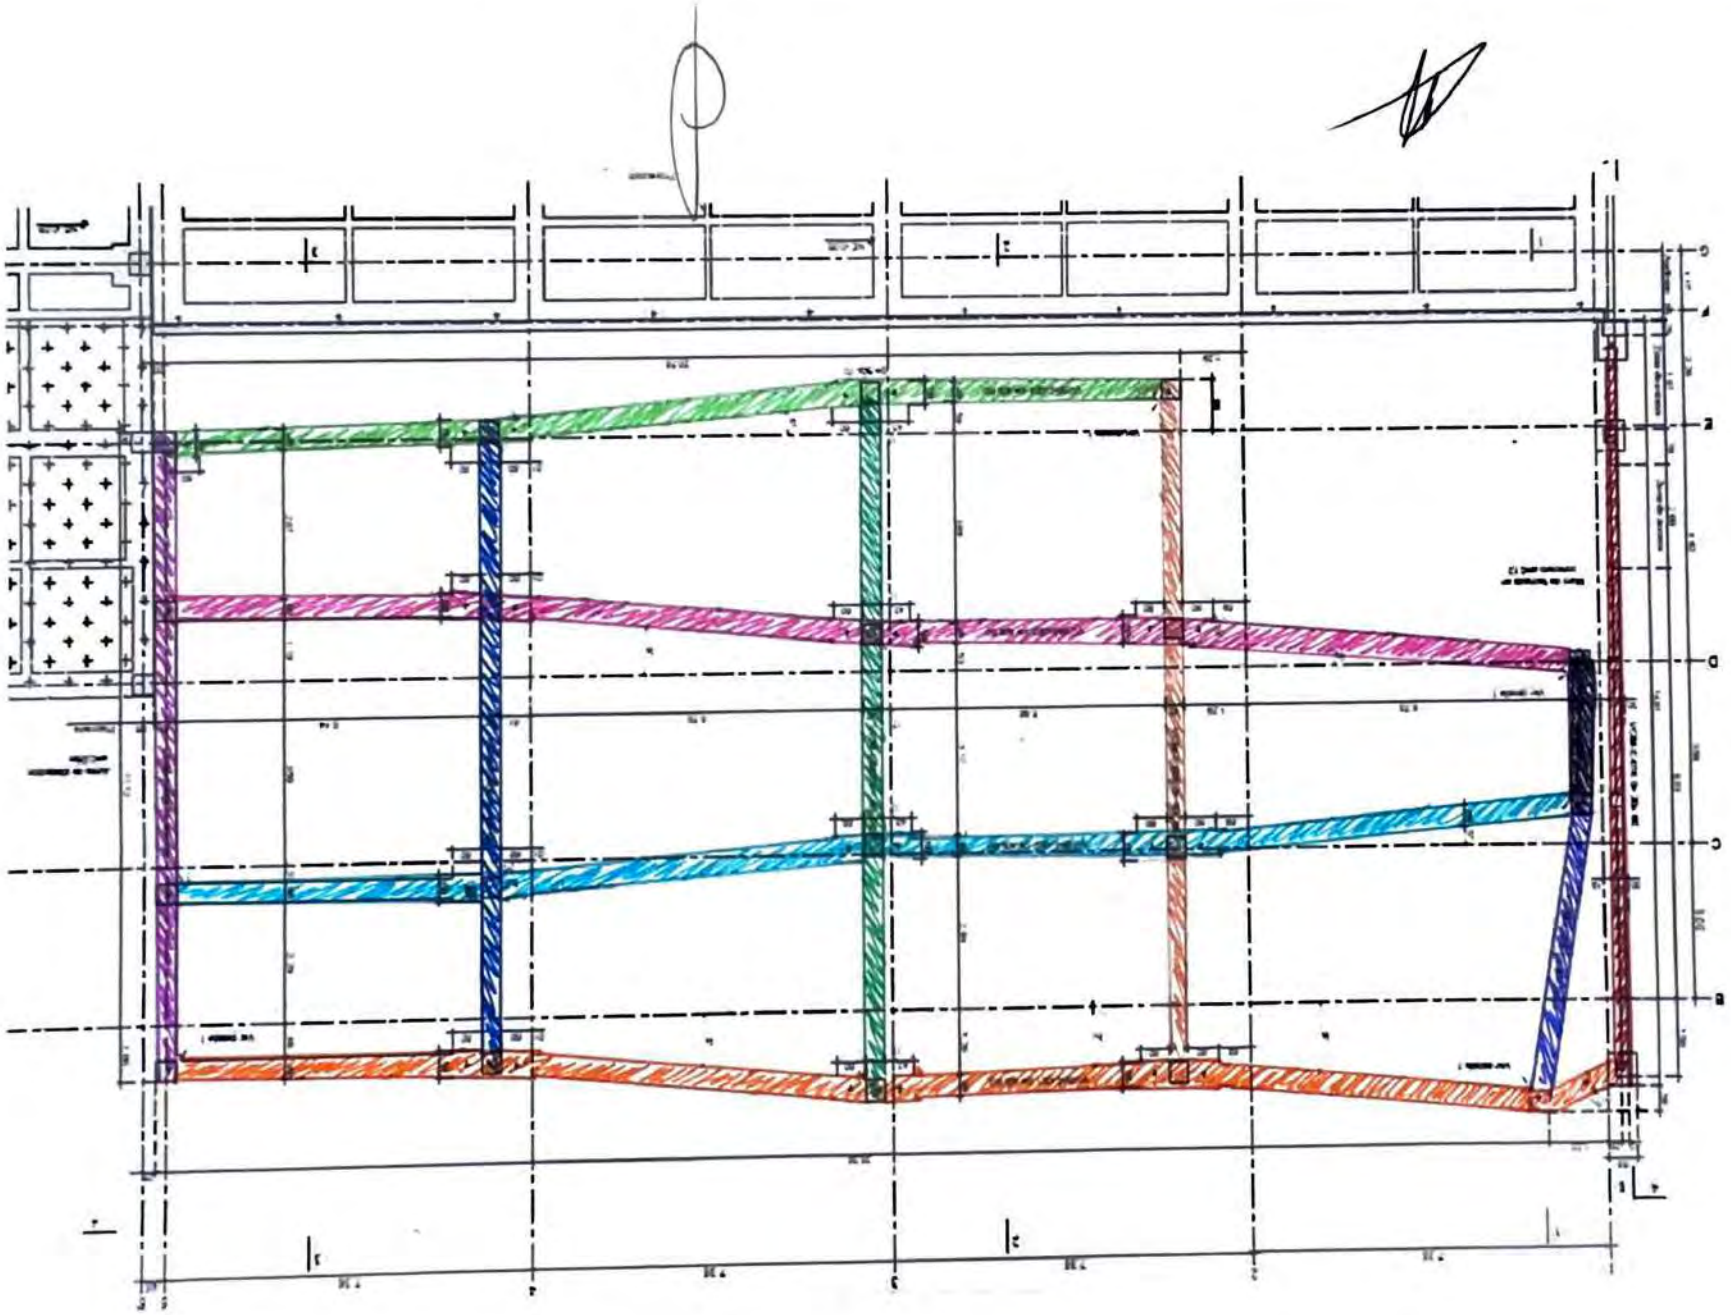

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-6347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:	Auditorio			Liberación de actividad:	Base en concreto pobre 1500 Psi		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
VC-101						(30.08 x 0.6 x 0.03)	
VC-102						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-103						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-104						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-105						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-106						(30.08 x 0.4 x 0.03)	
VC-107						(30.08 x 0.1 x 0.03) Cant. 3	
VC-108						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-109						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-110						(30.08 x 0.1 x 0.03)	
VC-111						(1.81 x 0.7 x 0.03)	
VC-112						(1.81 x 0.1 x 0.03) Cant 2	
VC-113						(1.81 x 0.1 x 0.03)	
VC-111						(52.98 x 0.98 x 0.03)	
VC-112						(52.98 x 0.6 x 0.03)	
VC-113						(52.98 x 0.6 x 0.03)	
VC-114						(52.98 x 0.98 x 0.03)	
VC-114						(4.81 x 0.7 x 0.03)	

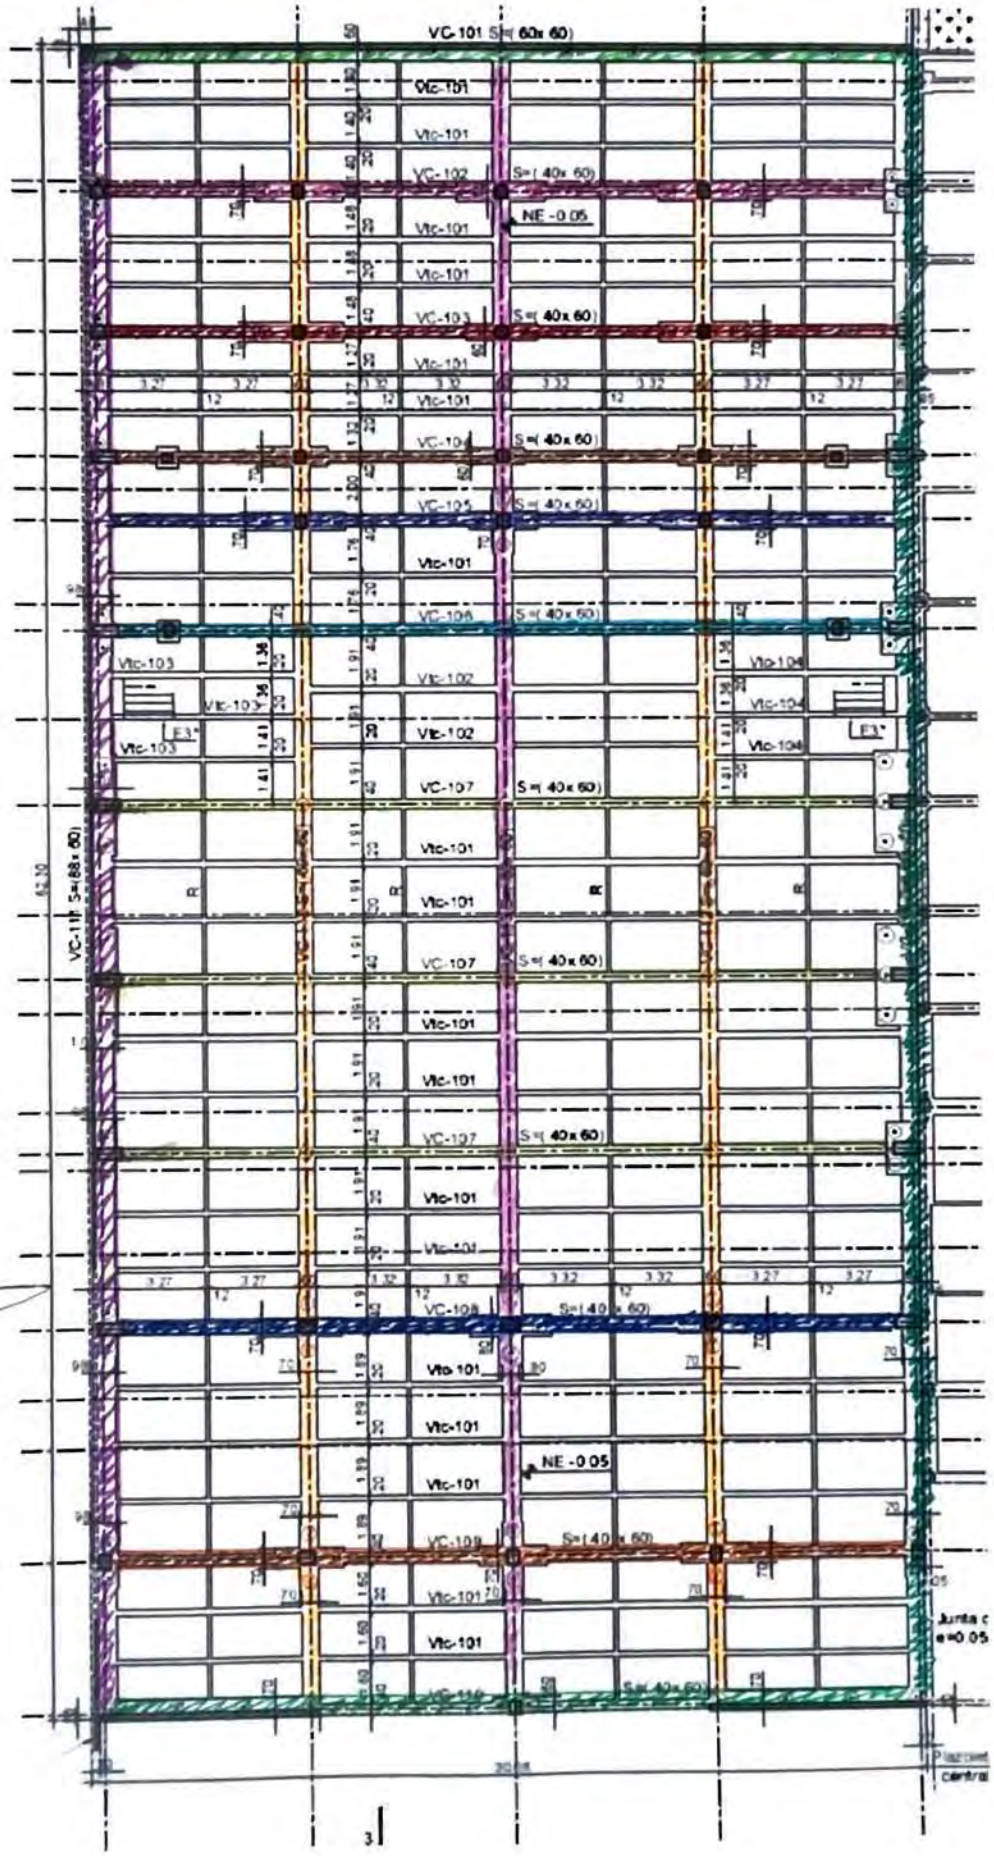
VC-101 S=(60x 60)
Vtc-101
VC-102 S=(40x 60)
NE -0.05
VC-103 S=(40x 60)
VC-104 S=(40x 60)
VC-105 S=(40x 60)
VC-106 S=(40x 60)
Vtc-103
Vtc-102
Vtc-104
VC-107 S=(40x 60)
VC-108 S=(40x 60)
VC-109 S=(40x 60)
VC-110 S=(88x 60)
Junta c
e=0.05

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	Contrato de Obra	CO1.PCCNTR.5055621	Interventoría:	Consorcio artes 2023	Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:	Plazoleta			Liberación de actividad:	Base en concreto pobre 1500 Psi		

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones	Firma
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
VC-118, VC-121, VC-123 VC-126 VC-127				X		(26,00 x 0,9 x 0,03)	
VC-128 VC-130, VC-132				X		(26,00 x 0,1 x 0,03)	
Vfc-109, Vfc-109, Vfc-109, Vfc-110, Vfc-113				X		(26,00 x 0,2 x 0,03)	
Vfc-114, Vfc-116, Vfc-116, Vfc-116, Vfc-116				X		(26,00 x 0,2 x 0,08)	
Vfc-118, Vfc-118, Vfc-118, Vfc-118, Vfc-119				X		(26,00 x 0,2 x 0,03)	
Vfc-111				X		(9,75 x 0,2 x 0,03)	
Vfc-104				X		(9,85 x 0,2 x 0,03)	
VE-122, VC-129				X		(11,22 x 0,1 x 0,03)	
Vfc-112, Vfc-117				X		(11,22 x 0,2 x 0,03)	
VC-101, VC-102, VC-103, VC-104, VC-106				X		(35,5 x 0,6 x 0,03)	



CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 1

AUDITORIO

DIÁMETRO (cm)	CANTIDAD (und)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL POR PILOTE	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL POR PILOTE	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
40	34	22		4#5 L=12m		63 F#3		
50	85	22		5#5 L=12m		63 F#3		
60	18	22		5#6 L=12m		63 F#3		

CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 1

ESCALERAS

DIÁMETRO (cm)	CANTIDAD (und)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL POR PILOTE	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
40	33	20		4#5 L=12m		59 F#3		

CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 1

RAMPA

DIÁMETRO (cm)	CANTIDAD (und)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL POR PILOTE	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
40	17	22		4#5 L=12m		63 F#3		

CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 2

PLAZOLETA

DIÁMETRO (CM)	CANTIDAD (UN)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
40	116	20		4#5 L=10,60m	28 F #3c0.075 61 F#3 L=10.60 33 #3c0.25	61 F#3		
50	45	20		5#5 L=10,60m	28 F #3c0.075 61 F#3 L=10.60 33 #3c0.25	61 F#3		
60	33	20		5#6 L=10,60m	28 #3c0.075 55 F#3 L=10.60 27 #3c0.30	55 #3		

CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 2

AULA POLIVALENTE

DIÁMETRO (CM)	CANTIDAD (UN)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIGURA
40	18	20		4#5 L=10,60m	35F@3c0.075 66 F#3 L=10.60 31F@3c0.25	66 F#3		
60	2	20		5#6 L=10,70m	35F@3c0.075 61 F#3 L=10.70 29F@3c0.30	61 F#3		

DIÁMETRO (CM)	CANTIDAD (UN)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
40	40	20		4#5 L=10,60m	58 F#3 L=10.70	58 F#3		

CONSORCIO ARTES 2023

DESPIECES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PILOTES ETAPA 3

SALONES


DIÁMETRO (cm)	CANTIDAD (UN)	LONGITUD (m)	REFUERZO LONGITUDINAL	CANTIDAD ACERO	REFUERZO TRANSVERSAL	CANTIDAD ACERO	OBSERVACIONES	FIRMA
50	45	20		5#5 L=10,60m	2 @ 0.075 60 F#3 L=10.60 33 @ 0.25	60 F#3		
60	41	20		5#6 L=10,90m	279 @ 0.075 15 @ 0.150 79 @ 0.25	55 F#3		
70	9	20		7#6 L=10,90m		55 F#3		

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-001	1	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		2	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		3	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		4	X		
		5	Estribos conf. 1-2	10	3	0,13		X		
		6	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13		X		
		7	Estribos 1-2	19	3	0,26		X		
		8	Longitudinal interno superior 2-3	2	4		4	X		
		9	Longitudinal interno inferior 2-3	2	4		4	X		
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		12	Estribos 2-3	18	3	0,26		X		
		13	Longitudinal interno superior 3-4	2	4		1	X		
		14	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4		1	X		
		15	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		16	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		17	Estribos 3-4	24	3	0,26		X		
		18	Longitudinal interno superior 4-5	2	4		1	X		
		19	Longitudinal interno inferior 4-5	2	4		1	X		
		20	Estribos conf. Interior 1 / 4-5	4	3	0,15		X		
		21	Estribos conf. Interior 2 / 4-5	4	3	0,15		X		
		22	Estribos 4-5	15	3	0,26		X		
		23	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13		X		
		24	flejes L =1,64	108	3			X		
		25	Feljes L=2,04	24	3			X		
		26	ganchos L=0,79	24	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-002	1	Longitudinal superior	2	6		5	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		3	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		4	X		
		5	Estribos conf. 1-2	4	3	0,13		X		
		6	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13		X		
		7	Estribos 1-2	23	3	0,26		X		
		8	Longitudinal interno superior 2-3	2	4		1,00	X		
		9	Longitudinal interno inferior 2-3	2	4		1,00	X		
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		12	Estribos 2-3	18	3	0,26		X		
		13	Longitudinal interno superior 3-4	2	4			X		
		14	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4			X		
		15	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		16	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		17	Estribos 3-4	24	3	0,26		X		
		18	Longitudinal interno superior 3-4	2	4		1,00	X		
		19	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4		1,00	X		
		20	Estribos conf. Interior 1 / 3-4	4	3	0,15		X		
		21	Estribos conf. Interior 2 / 3-4	4	3	0,15		X		
		22	Estribos 3-4	15	3	0,26		X		
		23	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13		X		
		24	flejes L =1,64	108	3			X		
		25	Feljes L=2,04	24	3			X		
		26	ganchos L=0,79	24	3			X		

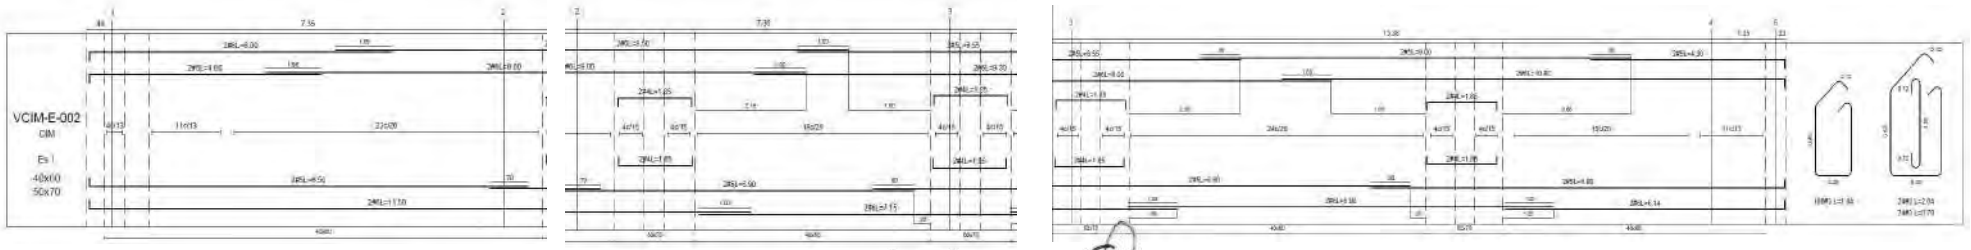


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-003	1	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		5	X		
		3	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		5	X		
		5	Estribos conf. 1-2	4	3	0,13		X		
		6	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13		X		
		7	Estribos 1-2	22	3	0,26		X		
		8	Longitudinal interno superior 2-3	2	4		1,00	X		
		9	Longitudinal interno inferior 2-3	2	4		1,00	X		
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		12	Estribos 2-3	18	3	0,26		X		
		13	Longitudinal interno superior 3-4	2	4			X		
		14	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4			X		
		15	Estribos conf. Interior 1 / 2-3	4	3	0,15		X		
		16	Estribos conf. Interior 2 / 2-3	4	3	0,15		X		
		17	Estribos 3-4	24	3	0,26		X		
		18	Longitudinal interno superior 3-4	2	4		1,00	X		
		19	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4		1,00	X		
		20	Estribos conf. Interior 1 / 3-4	4	3	0,15		X		
		21	Estribos conf. Interior 2 / 3-4	4	3	0,15		X		
		22	Estribos 3-4	15	3	0,26		X		
		23	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13		X		
		24	flejes L =1,64	108	3			X		
		25	Feljes L=2,04	24	3			X		
		26	ganchos L=0,79	24	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES


CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-004	1	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		3	X		
		3	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		3	X		
		5	Estribos conf. 3	11	3	0,13		X		
		6	Estribos 3	13	3	0,27		X		
		7	Longitudinal interno superior 3-4	2	4		1,00	X		
		8	Longitudinal interno inferior 3-4	2	4		1,00	X		
		9	Estribos conf. Interior 1 / 3-4	4	3	0,16		X		
		10	Estribos conf. Interior 2 / 3-4	4	3	0,16		X		
		11	Estribos 3-4	24	3	0,27		X		
		12	Longitudinal interno superior 4-5	2	4		1,00	X		
		13	Longitudinal interno inferior 4-5	2	4		1,00	X		
		14	Estribos conf. Interior 1 / 4-5	4	3	0,16		X		
		15	Estribos conf. Interior 2 / 4-5	4	3	0,16		X		
		16	Estribos 4-5	19	3	0,27		X		
		17	Estribos conf. 4-5	4	3	0,13		X		
		18	flejes L =1,64	71	3			X		
		19	Feljes L=2,04	16	3			X		
		20	ganchos L=0,79	16	3			X		






FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES GENERALES**

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-005	1	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		2	X		
		3	Longitudinal inferior	2	6		2	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		5	Estribos D-C	18	3	0,13		X		
		6	Estribos C-B	11	3	0,27		X		
		7	Estribos C-B	8	3	0,27		X		
		8	Estribos B	11	3	0,13		X		
		18	flejes L =1,64	48	3			X		
		19	Flejes L=2,04	16	3			X		
		20	ganchos L=0,79	16	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-006	1	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		1	X		
		3	Longitudinal superior	2	7		1	X		
		4	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		5	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		6	Estribos E-D	11	3	0,13		X		
		7	Estribos conf. E-D	4	3	0,27		X		
		8	Estribos E-D	11	3	0,13		X		
		9	Estribos D-C	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. D-C	3	3	0,27		X		
		11	Estribos D-C	11	3	0,13		X		
		12	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. C-B	5	3	0,27		X		
		14	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		15	Flejes L=1,64	78	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-007	**1**	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		1	X		
		4	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		6	Estribos E-D	11	3	0,13		X		
		7	Estribos conf. E-D	5	3	0,27		X		
		8	Estribos E-D	11	3	0,13		X		
		9	Estribos D-C	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. D-C	3	3	0,27		X		
		11	Estribos D-C	11	3	0,13		X		
		12	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. C-B	5	3	0,27		X		
		14	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		15	Flejes L=1,64	79	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ J.	

CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-008	1	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		2	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		3	Estribos E-D	22	3	0,13		X		
		4	Estribos conf. E-D	11	3	0,13		X		
		5	Estribos D-C	8	3	0,27		X		
		6	Estribos conf. D-C	11	3	0,13		X		
		8	Estribos C-B	22	3	0,13		X		
		9	Flejes L=1,64	74	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones	
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No		
VCIM	VCIM-E-009	1	Longitudinal superior	2	6		2	X			
		2	Longitudinal superior	2	5		2	X			
		3	Longitudinal inferior	2	5		2	X			
		4	Longitudinal inferior	2	6		2	X			
		5	Estribos E-D	22	3	0,13		X			
		6	Estribos conf. E-D	11	3	0,13		X			
		7	Estribos D-C	8	3	0,27		X			
		8	Estribos conf. D-C	11	3	0,13		X			
		9	Estribos C-B	22	3	0,13		X			
		10	Flejes L=1,64	74	3			X			

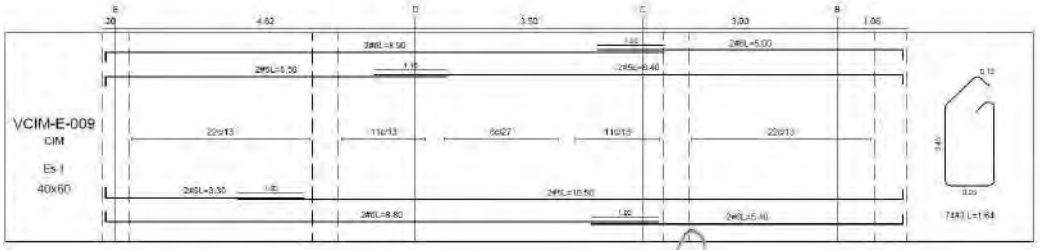


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / ESCALERAS EXTERIOR
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-04_ESC-EXT-1 _DVCIM

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VCIM-E-010	1	Longitudinal superior	3	5		2	X		
		2	Longitudinal inferior	3	5		2	X		
		3	Estribos E	10	3	0,13		X		
		4	Estribos conf. E-D	11	3	0,13		X		
		5	Estribos E-D	4	3	0,26		X		
		6	Estribos conf. E-D	11	3	0,13		X		
		8	Estribos D-C	18	3	0,13		X		
		9	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. C-B	6	3	0,26		X		
		11	Estribos C-B	11	3	0,13		X		
		12	Flejes L=1,64	82	3			X		

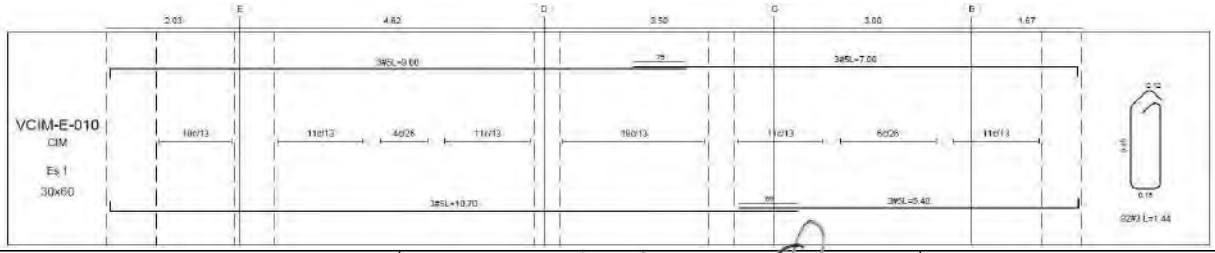


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS


Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

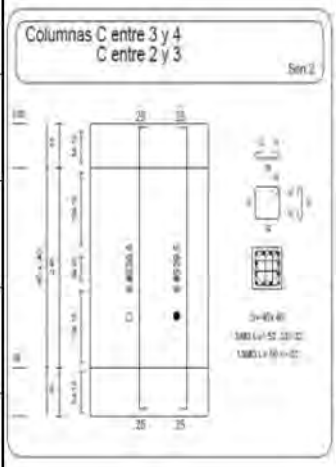Elemento	Ubicación	Ubicación del refuerzo	Planos			Cumple		DESPIECE COLUMNA	Observaciones
			Cantidad	Diámetro	Separación	Si	No		
Columnas	C entre 3 y 4; C entre 2 y 3	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X			
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+3,00	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

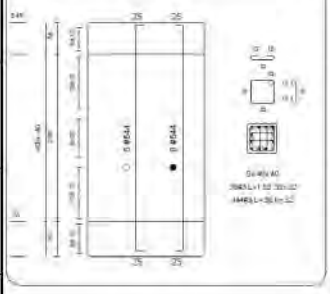Columnas	**D entre 1 y 2; C' entre 1 y 2**	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X		Columnas D entre 1 y 2 C' entre 1 y 2 Sin 2 	
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+3,45	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos cont. Medio	5	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

Columnas	**Tipo 3**	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X			
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+2,55	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos N+0,05	8	3/8"	0,10	X			

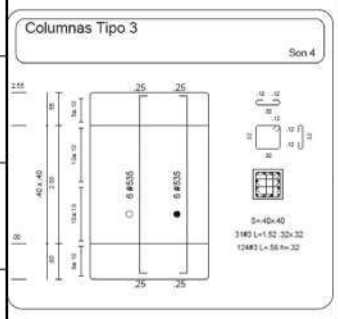


FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES GENERALES**

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

Columnas	**E-F entre 2 y 3; E-F entre 3 y 4**	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X		Columnas E-F entre 2 y 3 E-F entre 3 y 4 Son 2	
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+4,80	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

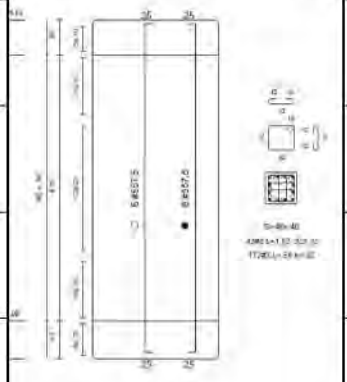


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	ARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

Columnas	**D-E entre 4 y 5; E entre 4 y 5; D-E-5**	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X		Columnas D-E entre 4 y 5 E entre 4 y 5 D-E-5 Son 4	
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+4,35	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,20	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

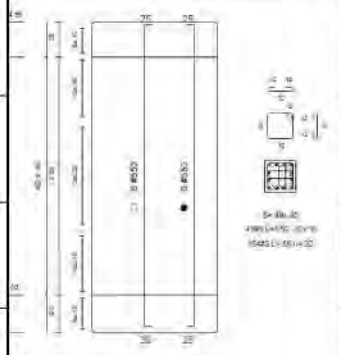

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS


Columnas	**Tipo 2**	Longitudinal lateral 1	6	5/8"		X		Columnas Tipo 2	
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+2,10	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos cont. Inferior	8	3/8"	0,20	X			
		Estribos N+0,05	8	3/8"	0,10	X			

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS


Columnas	**Tipo 1**	Longitudinal lateral 1	4	3/4"		X		Columna Tipo 1 Es:1 	
		Longitudinal lateral 2	8	5/8"		X			
		Estribos N+1,45	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos cont. Inferior	4	3/8"	0,20	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES GENERALES**
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

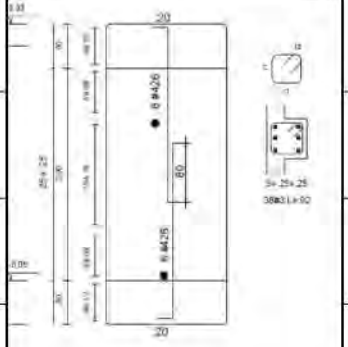
Columnas	**1 entre A y B (Zona Muro)**	Longitudinal superior 1	6	1/2"		X	Columna 1 Entre A y B (Zona muro) Es 1 	
		Longitudinal inferior 2	6	1/2"		X		
		Estribos N+3,33	6	3/8"	0,10	X		
		Estribos conf.superior	8	3/8"	0,08	X		
		Estribos cont. Medio	10	3/8"	0,16	X		
		Estribos conf. Inferior	8	3/8"	0,08	X		
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X		

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

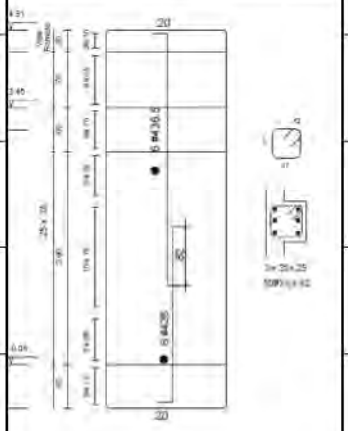Columnas	**1 entre C y D (Zona Muro)**	Longitudinal superior 1	6	1/2"		X	Columna 1 Entre C y D (Zona muro) Es 1 	
		Longitudinal inferior 2	6	1/2"		X		
		Estribos N+4,51 viga remate	3	3/8"	0,10	X		
		Estribos N+4,51	9	3/8"	0,08	X		
		Estribos N+3,45 superior	6	3/8"	0,10	X		
		Estribos N+3,45 medio superior	8	3/8"	0,08	X		
		Estribos N+3,45 medio inferior	10	3/8"	0,16	X		
		Estribos N+3,45 inferior	8	3/8"	0,08	X		
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X		

FIRMA CONTRATISTA


FIRMA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES GENERALES


CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS


Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS ESCALERAS

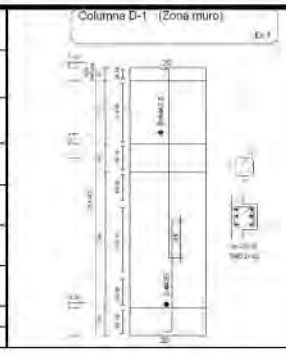Columnas	**D-1 (Zona Muro)**	Longitudinal superior 1	6	1/2"		X			
		Longitudinal inferior 2	6	1/2"		X			
		Estribos N+5,12 viga remate	3	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+5,12 inferior	17	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 superior	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,45 medio superior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 medio inferior	10	3/8"	0,16	X			
		Estribos N+3,45 inferior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

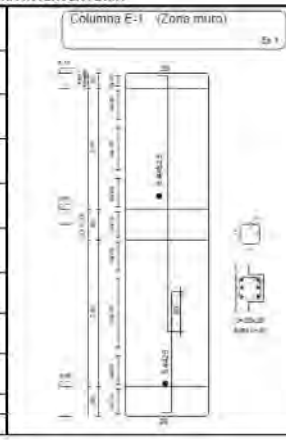Columnas	**E-1 (Zona Muro)**	Longitudinal superior 1	6	1/2"		X			
		Longitudinal inferior 2	6	1/2"		X			
		Estribos N+6,13 superior	3	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+6,13 medio superior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+6,13 medio inferior	6	3/8"	0,16	X			
		Estribos N+6,13 inferior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 superior	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,45 medio superior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 medio inferior	10	3/8"	0,16	X			
		Estribos N+3,45 inferior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

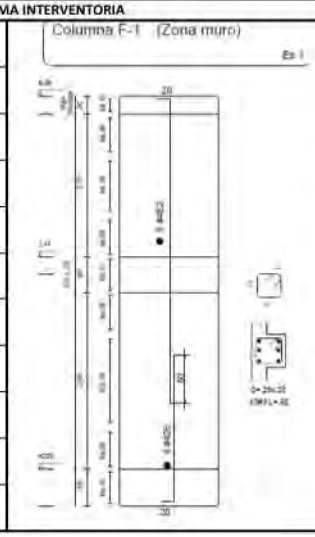Columnas	**F-1 (Zona Muro)**	Longitudinal superior 1	6	1/2"		X			
		Longitudinal inferior 2	6	1/2"		X			
		Estribos N+6,08 superior	3	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+6,08 medio superior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+6,08 medio inferior	6	3/8"	0,16	X			
		Estribos N+6,08 inferior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 superior	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,45 medio superior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+3,45 medio inferior	10	3/8"	0,16	X			
		Estribos N+3,45 inferior	8	3/8"	0,08	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

VoBo. Contratista | **VoBo. Interventoría**


MARTINEZ

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS


Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / AUDITORIO
Fecha:	
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-07_AUD-DVG-CIMENTACIÓN

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 101	1	Longitudinal superior	3	5		8			
		2	Longitudinal Inferior	3	5		8			
		3	Estribos conf. 1-2	11	3	0,11				
		4	Estribos 1-2	14	3	0,26				
		5	Estribos conf. 1-2	11	3	0,11				
		6	Estribos conf. 2-3	11	4	0,11				
		7	Estribos 2-3	14	4	0,26				
		8	Estribos conf. 2-3	11	3	0,11				
		9	Estribos conf. 3-4	11	3	0,11				
		10	Estribos 3-4	14	3	0,26				
		11	Estribos conf. 3-4	11	4	0,11				
		12	Estribos conf. 4-5	11	4	0,11				
		13	Estribos4-5	14	3	0,26				
		14	Estribos conf. 4-5	11	3	0,11				
		15	Flejes L=2,10	144	3					
		16	ganchos L=0,72	144	3					




FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 102	1	Longitudinal superior	2	5		4			
		2	Longitudinal superior	2	6		4			
		3	Longitudinal superior	2	7		1			
		4	Longitudinal inferior	2	6		6			
		5	Longitudinal inferior	2	5		2			
		6	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13				
		7	Estribos 1-2	15	3	0,26				
		8	Longitudinal interno superior 2	3	5		1,00			
		9	Longitudinal interno inferior 2	3	7		1,00			
		10	Longitudinal interno traslapo 2	4	7		1,00			SEGUNDA FILA
		11	Estribos conf. Interior 1 / 2	11	3	0,13				
		12	Estribos conf. Interior 2 / 2	11	3	0,13				
		13	Estribos 2-3	16	3	0,26				
		14	Longitudinal interno superior 3	3	5					
		15	Longitudinal interno inferior 3	3	7					
		16	Longitudinal interno traslapo 2	4	7		1,00			SEGUNDA FILA
		17	Estribos conf. Interior 1 / 3	11	3	0,13				
		18	Estribos conf. Interior 2 / 3	11	3	0,13				
		19	Estribos 3-4	16	3	0,26				
		20	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		21	Longitudinal interno inferior 4	3	7					
		22	Longitudinal interno traslapo 4	4	7		1,00			SEGUNDA FILA
		23	Estribos conf. Interior 1 / 4	11	3	0,13				
		24	Estribos conf. Interior 2 / 4	11	3	0,13				
		25	Estribos 4-5	15	3	0,26				
		26	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		27	Flejes L =1,70	84	3					
		28	Flejes L=2,30	66	3					
		29	ganchos L=0,72	66	3					




FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 103	1	Longitudinal superior	2	5		5			
		2	Longitudinal superior	2	6		4			
		3	Longitudinal inferior	2	6		6			
		4	Longitudinal inferior	2	5		1			
		5	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13				
		6	Estribos 1-2	15	3	0,26				
		7	Longitudinal interno superior 2	3	5		1,00			
		8	Longitudinal interno inferior 2	3	7		1,00			
		9	Longitudinal interno traslapo 2	4	6		1,00			SEGUNDA FILA
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2	11	3	0,13				
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2	11	3	0,13				
		12	Estribos 2-3	18	3	0,26				
		13	Longitudinal interno superior 3	2	5					
		14	Longitudinal interno inferior 3	2	7					
		15	Longitudinal interno traslapo 2	2	6		1,00			SEGUNDA FILA
		16	Estribos conf. Interior 1 / 3	9	3	0,13				
		17	Estribos conf. Interior 2 / 3	9	3	0,13				
		18	Estribos 3-4	18	3	0,26				
		19	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		20	Longitudinal interno inferior 4	3	8					
		21	Longitudinal interno traslapo 4	4	6		1,00			SEGUNDA FILA
		22	Estribos conf. Interior 1 / 4	11	3	0,13				
		23	Estribos conf. Interior 2 / 4	11	3	0,13				
		24	Estribos 4-5	15	3	0,26				
		25	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		26	Flejes L =1,70	88	3					
		27	Flejes L=2,30	44	3					
		28	Flejes L=2,10	18	3					
		29	ganchos L=0,72	62	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 104	1	Longitudinal superior	2	5		3			
		2	Longitudinal superior	2	6		5			
		3	Longitudinal inferior	2	6		4			
		4	Longitudinal inferior	2	5		4			
		5	Estribos conf. 1-2	14	3	0,13				
		6	Estribos 1-2	11	3	0,13				
		7	Estribos conf. 1-2	8	3	0,26				
		8	Longitudinal interno superior 2	3	5		1,00			
		9	Longitudinal interno inferior 2	3	7		1,00			
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2	6	3	0,13				
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2	6	3	0,13				
		12	Estribos 2-3	22	3	0,26				
		13	Longitudinal interno superior 3	2	5					
		14	Longitudinal interno inferior 3	2	7					
		15	Estribos conf. Interior 1 / 3	5	3	0,13				
		16	Estribos conf. Interior 2 / 3	5	3	0,13				
		17	Estribos 3-4	22	3	0,26				
		18	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		19	Longitudinal interno inferior 4	3	8					
		20	Estribos conf. Interior 1 / 4	6	3	0,13				
		21	Estribos conf. Interior 2 / 4	6	3	0,13				
		22	Estribos 4-5	8	3	0,26				
		23	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		24	Estribos conf. 4-5	14	3	0,13				
		25	Flejes L =1,70	110	3					
		26	Flejes L=2,30	24	3					
		27	Flejes L=2,10	10	3					
		28	ganchos L=0,72	34	3					




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 105	1	Longitudinal superior	2	5		5			
		2	Longitudinal superior	2	6		4			
		3	Longitudinal inferior	2	6		6			
		4	Longitudinal inferior	2	5		2			
		5	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13				
		6	Estribos 1-2	15	3	0,26				
		8	Longitudinal interno superior 2	3	5		1,00			
		9	Longitudinal interno inferior 2	3	7		1,00			
			Longitudinal interno traslapo 2	4	6		1,00			SEGUNDA FILA
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2	11	3	0,13				
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2	11	3	0,13				
		12	Estribos 2-3	18	3	0,26				
		13	Longitudinal interno superior 3	3	5					
		14	Longitudinal interno inferior 3	3	7					
			Longitudinal interno traslapo 2	2	6		1,00			SEGUNDA FILA
		15	Estribos conf. Interior 1 / 3	8	3	0,12				
		16	Estribos conf. Interior 2 / 3	8	3	0,12				
		17	Estribos 3-4	18	3	0,26				
		18	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		19	Longitudinal interno inferior 4	3	7					
			Longitudinal interno traslapo 2	2	6		1,00			SEGUNDA FILA
		20	Estribos conf. Interior 1 / 4	11	3	0,13				
		21	Estribos conf. Interior 2 / 4	11	3	0,13				
		22	Estribos 4-5	15	3	0,26				
		23	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		25	Flejes L =1,70	88	3					
		26	Flejes L=2,30	60	3					
		28	ganchos L=0,72	60	3					




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 106	1	Longitudinal superior	2	5		2			
		2	Longitudinal superior	2	6		4			
		3	Longitudinal superior	2	7		2			
		4	Longitudinal superior	2	8		2			
		5	Longitudinal inferior	2	6		7			
		6	Longitudinal inferior	2	7		1			
		7	Longitudinal interno traslapo 1-2	4	7		1			SEGUNDA FILA
		8	Estribos 1-2	13	3	0,13				
		9	Estribos conf. 1-2	11	3	0,13				
		10	Estribos conf. 1-2	5	3	0,26				
		11	Estribos 1-2	11	3	0,13				
		12	Estribos 2-3	11	3	0,13				
		13	Estribos conf. 2-3	14	3	0,26				
		14	Estribos 2-3	11	3	0,13				
		15	Estribos 3-4	11	3	0,13				
		16	Estribos conf. 3-4	14	3	0,26				
		17	Estribos 3-4	11	3	0,13				
		18	Estribos 4-5	11	3	0,13				
		19	Estribos conf. 4-5	5	3	0,26				
		20	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		21	Estribos 4-5	13	3	0,13				
		22	Longitudinal interno traslapo 1-2	4	7		1			SEGUNDA FILA
		23	Flejes L =1,70	152	3					




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 107	1	Longitudinal superior	2	5		4			
		2	Longitudinal superior	2	7		2			
		3	Longitudinal superior	2	8		1			
		4	Longitudinal inferior	2	5		8			
		5	Longitudinal interno traslapo 1-2	2	6		1			SEGUNDA FILA
		6	Estribos 1-2	11	3	0,13				
		7	Estribos conf. 1-2	14	3	0,26				
		8	Estribos 1-2	11	3	0,13				
		9	Estribos 2-3	11	3	0,13				
		10	Estribos conf. 2-3	14	3	0,26				
		11	Estribos 2-3	11	3	0,13				
		12	Estribos 3-4	11	3	0,13				
		13	Estribos conf. 3-4	14	3	0,26				
		14	Estribos 3-4	11	3	0,13				
		15	Estribos 4-5	11	3	0,13				
		16	Estribos conf. 4-5	13	3	0,26				
		17	Estribos 4-5	11	3	0,13				
		18	Longitudinal interno traslapo 1-2	2	6		1			SEGUNDA FILA
		19	Flejes L =1,70	143	3					




	MARTINEZ	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 108	1	Longitudinal superior	2	5		3			
		2	Longitudinal superior	2	6		6			
		3	Longitudinal inferior	2	6		7			
		4	Longitudinal inferior	2	6		6			
		5	Longitudinal inferior	2	5		2			
		6	Estribos conf,1-2	11	3	0,13				
		7	Estribos 1-2	15	3	0,26				
		8	Longitudinal interno superior 2	3	5					
		9	Longitudinal interno inferior 2	3	7					
		10	Longitudinal interno traslapo 2	2	6					
		11	Estribos conf. Interior 1 / 2	7	3	0,13				
		12	Estribos conf. Interior 2 / 2	7	3	0,13				
		13	Estribos 2-3	18	3	0,26				
		14	Longitudinal interno superior 3	4	5					
		15	Longitudinal interno inferior 3	4	7					
		16	Longitudinal interno traslapo 3	4	6					
		17	Estribos conf. Interior 1 / 3	9	3	0,13				
		18	Estribos conf. Interior 2 / 3	9	3	0,13				
		19	Estribos 3-4	18	3	0,26				
		20	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		21	Longitudinal interno inferior 4	3	7					
		22	Longitudinal interno traslapo 4	2	6					
		23	Estribos conf. Interior 1 / 4	7	3	0,13				
		24	Estribos conf. Interior 2 / 4	7	3	0,13	1			SEGUNDA FILA
		25	Estribos 4-5	5	3	0,26				
		26	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		27	Flejes L =1,70	88	3					
		28	Flejes L=2,30	28	3					
		29	Flejes L=2,50	18	3					
		30	ganchos L=0,72	64	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 109	1	Longitudinal superior	2	5		5			
		2	Longitudinal superior	2	6		4			
		3	Longitudinal inferior	2	6		6			
		4	Longitudinal inferior	2	5		2			
		5	Estribos conf,1-2	11	3	0,13				
		6	Estribos 1-2	16	3	0,26				
		7	Longitudinal interno superior 2	3	5					
		8	Longitudinal interno inferior 2	3	3					
		9	Longitudinal interno traslapo 2	2	6					
		10	Estribos conf. Interior 1 / 2	7	3	0,13				
		11	Estribos conf. Interior 2 / 2	8	3	0,13				
		12	Estribos 2-3	20	3	0,26				
		13	Longitudinal interno superior 3	3	5					
		14	Longitudinal interno inferior 3	3	7					
		15	Longitudinal interno traslapo 3	2	6					
		16	Estribos conf. Interior 1 / 3	8	3	0,13				
		17	Estribos conf. Interior 2 / 3	8	3	0,13				
		18	Estribos 3-4	20	3	0,26				
		19	Longitudinal interno superior 4	3	5					
		20	Longitudinal interno inferior 4	3	6					
		21	Longitudinal interno traslapo 4	2	5					
		22	Estribos conf. Interior 1 / 4	8	3	0,13				
		23	Estribos conf. Interior 2 / 4	8	3	0,13	1			SEGUNDA FILA
		24	Estribos 4-5	16	3	0,26				
		25	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		26	Flejes L =1,70	94	3					
		27	Flejes L=2,30	47	3					
		28	ganchos L=0,72	47	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 110	1	Longitudinal superior	2	5		8			
		2	Longitudinal inferior	2	5		8			
		3	Longitudinal interno superior 1-2	3	5					
		4	Longitudinal interno inferior 1-2	3	5					
		5	Estribos conf,1-2	11	3	0,13				
		6	Estribos 1-2	16	3	0,26				
		7	Estribos conf,1-2	11	3	0,13				
		8	Estribos conf. 2-3	11	3	0,13				
		9	Estribos 2-3	18	3	0,26				
		10	Longitudinal interno superior 3	2	5					
		11	Longitudinal interno inferior 3	2	5					
		12	Estribos conf. Interior 1 / 3	5	3	0,13				
		13	Estribos conf. Interior 2 / 3	5	3	0,13				
		14	Estribos conf. 3-4	18	3	0,26				
		15	Estribos 3-4	11	3	0,13				
		16	Longitudinal interno superior 4-5	3	5					
		17	Longitudinal interno inferior 4-5	3	5					
		18	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		19	Estribos 4-5	16	3	0,26				
		20	Estribos conf. 4-5	11	3	0,13				
		21	Flejes L=2,30	76	3					
		22	Flejes L =1,70	58	3					
		23	Flejes L =2,10	10	3					
		24	ganchos L=0,72	86	3					




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 112	1	Longitudinal superior 1 fila	2	5					
		2	Longitudinal superior 2 fila	6	6					
		3	Longitudinal superior 2 fila	3	6					
		4	Longitudinal interno superior Y	1	6					
		5	Longitudinal interno inferior Y	1	6					
		6	Estribos conf,Z-Y	11	3	0,13				
		7	Estribos Z-Y	9	3	0,26				
		8	Estribos conf. Interior Y	8	3	0,13				
		9	Estribos conf. Interior Y	8	3	0,13				
		10	Estribos Y-V	30	3	0,20				
		11	Longitudinal interno superior V	1	6					
		12	Longitudinal interno inferior V	1	6					
		13	Estribos conf. Interior V	8	3	0,13				
		14	Estribos conf. Interior V	8	3	0,13				
		15	Estribos conf. Interior V-T	14	3	0,26				
		16	Estribos conf. Interior V-T	11	3	0,13				
		17	Estribos T-Q	11	5	0,13				
		18	Estribos conf. T-Q	12	3	0,26				
		19	Estribos T-Q	11	3	0,13				
		20	Estribos Q-O	11	5	0,13				
		21	Estribos conf. Q-O	12	3	0,26				
		22	Estribos Q-O	11	3	0,13				
		23	Estribos O-M	11	5	0,13				
		24	Estribos conf. O-M	12	3	0,26				
		25	Estribos O-M	11	3	0,13				
		26	Estribos M-L	11	5	0,26				
		27	Estribos conf. M-L	2	3	0,13				
		28	Estribos M-L	11	3	0,26				
		29	Estribos L-K	15	5	0,13				
		30	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		31	Estribos K-I	6	3	0,26				
		32	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		33	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		34	Estribos K-I	6	3	0,26				
		35	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		36	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		37	Estribos I-H	7	3	0,26				
		38	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		39	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		40	Estribos H-F	6	3	0,26				
		41	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		42	Flejes L=2,30	32	3					
		43	Flejes L =2,10	301	3					
		44	ganchos L=0,72	171	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES


Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 113	1	Longitudinal superior 1 fila	2	5					
		2	Longitudinal superior 2 fila	6	6					
		3	Longitudinal superior 2 fila	3	6					
		4	Longitudinal interno superior Y	1	6					
		5	Longitudinal interno inferior Y	1	6					
		6	Estribos conf,Z-Y	11	3	0,13				
		7	Estribos Z-Y	9	3	0,26				
		8	Estribos conf. Interior Y	8	3	0,13				
		9	Estribos conf. Interior Y	8	3	0,13				
		10	Estribos Y-V	30	3	0,20				
		11	Longitudinal interno superior V	1	6					
		12	Longitudinal interno inferior V	1	6					
		13	Estribos conf. Interior V	8	3	0,13				
		14	Estribos conf. Interior V	8	3	0,13				
		15	Estribos conf. Interior V-T	14	3	0,26				
		16	Estribos conf. Interior V-T	11	3	0,13				
		17	Estribos T-Q	11	5	0,13				
		18	Estribos conf. T-Q	12	3	0,26				
		19	Estribos T-Q	11	3	0,13				
		20	Estribos Q-O	11	5	0,13				
		21	Estribos conf. Q-O	12	3	0,26				
		22	Estribos Q-O	11	3	0,13				
		23	Estribos O-M	11	5	0,13				
		24	Estribos conf. O-M	12	3	0,26				
		25	Estribos O-M	11	3	0,13				
		26	Estribos M-L	11	5	0,26				
		27	Estribos conf. M-L	2	3	0,13				
		28	Estribos M-L	11	3	0,26				
		29	Estribos L-K	15	5	0,13				
		30	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		31	Estribos K-I	6	3	0,26				
		32	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		33	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		34	Estribos K-I	6	3	0,26				
		35	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		36	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		37	Estribos I-H	7	3	0,26				
		38	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		39	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		40	Estribos H-F	6	3	0,26				
		41	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		42	Flejes L=2,30	32	3					
		43	Flejes L =2,10	301	3					
		44	ganchos L=0,72	171	3					



MARTINEZ


FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VC	VCIM - 114	1	Longitudinal superior 1 fila	2	5					
		2	Longitudinal superior 2 fila	3	6					
		3	Longitudinal superior 2 fila	6	8					
		4	Longitudinal interno superior Z-Y	1	5					
		5	Longitudinal interno inferior Z-Y	1	5					
		6	Estribos conf. Z-Y	11	3	0,13				
		7	Estribos Z-Y	10	3	0,26				
		8	Longitudinal interno superior Y	1	5					
		9	Longitudinal interno inferior Y	1	5					
		10	Estribos conf. Interior Y	6	3	0,13				
		11	Estribos conf. Interior Y	6	3	0,13				
		12	Estribos conf. Y-V	26	3	0,26				
		13	Longitudinal interno superior V	1	5					
		14	Longitudinal interno inferior V	1	6					
		15	Estribos conf. Interior Y	6	3	0,13				
		16	Estribos conf. Y-V	6	3	0,13				
		17	Estribos conf. V-T	15	3	0,26				
		18	Estribos V-T	11	3	0,13				
		19	Estribos conf. T-Q	11	3	0,13				
		20	Estribos T-Q	13	3	0,26				
		21	Estribos conf. T-Q	11	3	0,13				
		22	Estribos conf. Q-O	11	3	0,13				
		23	Estribos Q-O	12	3	0,26				
		24	Estribos conf. Q-O	11	3	0,13				
		25	Estribos conf. O-M	11	3	0,13				
		26	Estribos O-M	12	3	0,26				
		27	Estribos conf. O-M	11	3	0,13				
		28	Estribos conf. M-K	11	3	0,13				
		29	Estribos M-K	12	3	0,26				
		30	Estribos conf. M-K	11	3	0,13				
		31	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		32	Estribos K-I	6	3	0,26				
		33	Estribos conf. K-I	11	3	0,13				
		34	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		35	Estribos I-H	7	3	0,26				
		36	Estribos conf. I-H	11	3	0,13				
		37	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		38	Estribos H-F	6	3	0,26				
		39	Estribos conf. H-F	11	3	0,13				
		40	Flejes L=2,10	295	3					
		41	Flejes L =2,30	24	3					
		42	ganchos L=0,72	375	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
Vtc	Vtc-101	1	Longitudinal superior 1 fila	2	6					
		2	Longitudinal superior 2 fila	2	5					
		3	Longitudinal superior 2 fila	2	4					
		4	Estribos 1-2	25	3	0,27				
		5	Estribos 2-3	26	3	0,27				
		6	Estribos 3-4	26	3	0,27				
		7	Estribos 4-5	25	3	0,27				
		8	ganchos L=1,30	102	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
Vtc	Vtc-102	1	Longitudinal superior 1 fila	2	6					
		5	Estribos 2-3	26	3	0,27				
		6	Estribos 3-4	26	3	0,27				
		8	ganchos L=1.30	52	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
Vtc	Vtc-103	1	Longitudinal superior 1 fila	2	6					
		5	Estribos 1-2	25	3	0,27				
		8	ganchos L=1,30	25	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES


Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
Vtc	Vtc-104	1	Longitudinal superior 1 fila	2	6					
		5	Estribos 1-2	25	3	0,27				
		8	ganchos L=1,30	25	3					



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES



CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

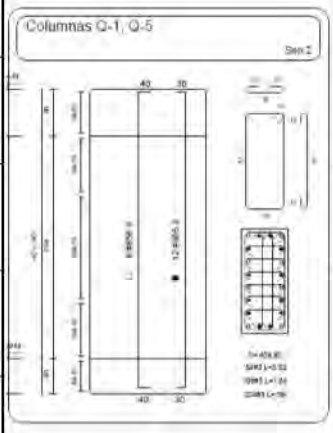Elemento	Ubicación	Ubicación del refuerzo	Planos			Cumple		DESPIECE COLUMNA	Observaciones
			Cantidad	Diámetro	Separación	Si	No		
Columnas	Q-1; Q-5	Longitudinal lateral 1	8	1"		X			
		Longitudinal lateral 2	12	3/4"		X			
		Estribos N+4,59	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	20	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

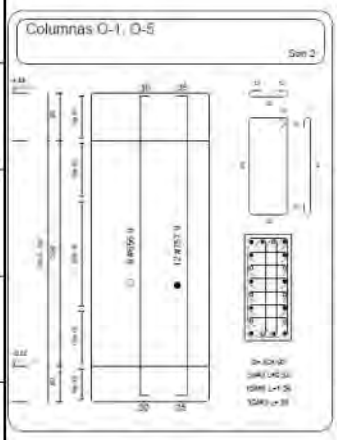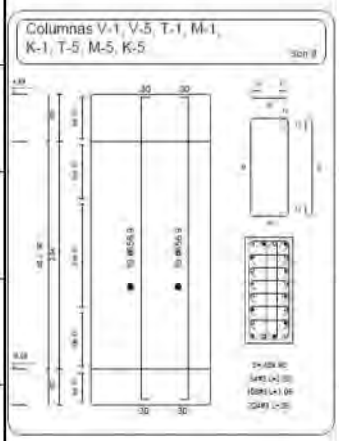
Columnas	**O-1; O-5**	Longitudinal lateral 1	8	3/4"		X			
		Longitudinal lateral 2	12	7/8"		X			
		Estribos N+4,59	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos cont. Medio	20	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			
Columnas	**V-1; V-5; T-1; M-1; K-1; T-5; M-5; K-5**	Longitudinal lateral 1	10	3/4"		X			
		Longitudinal lateral 2	10	3/4"		X			
		Estribos N+4,59	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	20	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS



Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

Columnas	**K-1'; K-4'**	Longitudinal lateral 1	5	5/8"		X			
		Longitudinal lateral 2	5	5/8"		X			
		Estribos N+4,59 superior	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+4,59 inferior	5	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,48 superior	4	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,48 superior medio	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+3,48 inferior medio	13	3/8"	0,10	X			
		Estribos +3,48 inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

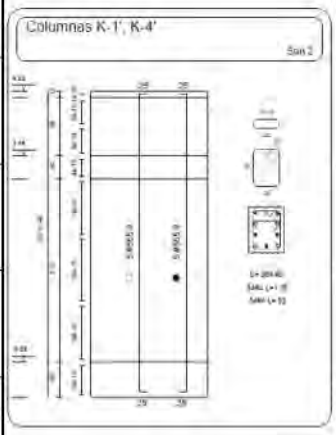

CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

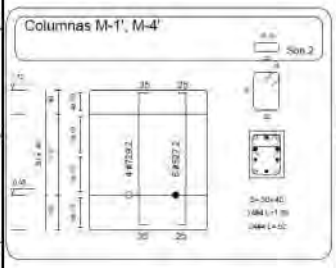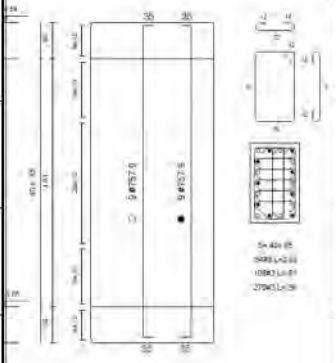Columnas	**M-1'; M-4'**	Longitudinal lateral 1	4	7/8"		X		Columnas M-1', M-4' Son 2 	
		Longitudinal lateral 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+1,72	4	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	7	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	7	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			
Columnas	**V-2; V-3; V-4**	Longitudinal lateral 1	9	7/8"		X		Columnas V-2, V-3, V-4 Son 3 	
		Longitudinal lateral 2	9	7/8"		X			
		Estribos N+4,59	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	22	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	10,00	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS



Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

Columnas	**Y-1; I-1; I-5; Y-5; G'-1; G'-5**	Longitudinal lateral 1	7	3/4"		X			
		Longitudinal lateral 2	7	3/4"		X		Columnas Y-1, I-1, I-5, G'-1, G'-5 Son 5	
		Estribos N+4,59	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estrbos conf. Medio	20	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			
Columnas	**K-2; K-3; K-4; I-4; I-3; I-2**	Longitudinal superior 1	6	5/8"		X			
		Longitudinal inferior 2	6	5/8"		X		Columnas K-2, K-3, K-4, I-4, I-3, I-2 Son 6	
		Estribos N+4,59	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf.superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	22	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS


Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

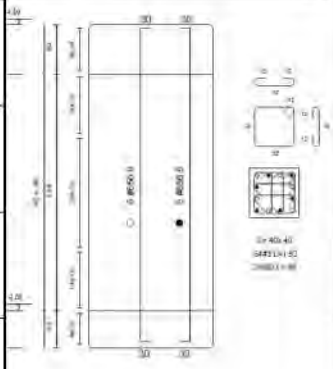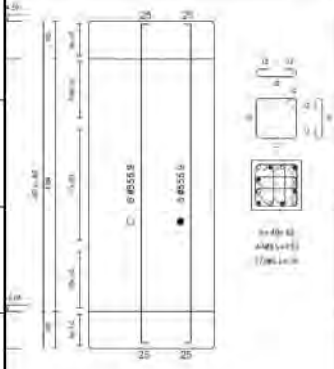Columnas	**Z-3**	Longitudinal superior 1	6	3/4"		X		Columna Z-3 Es 1 	
		Longitudinal inferior 2	6	3/4"		X			
		Estribos N+4,59	8	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	20	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			
Columnas	**G'-2;G'-3;G'-4**	Longitudinal superior 1	6	5/8"		X		Columnas G'-2, G'-3, G'-4 Son 3 	
		Longitudinal inferior 2	6	5/8"		X			
		Estribos N+4,59	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	11	3/8"	0,20	X			
		Estibos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO

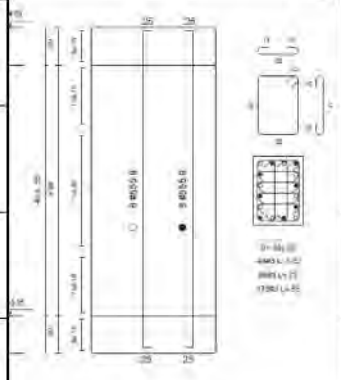
Columnas	**Y-4; Y-3; Y-2**	Longitudinal superior 1	8	5/8"		X		Columnas Y-3, Y-2 Sin 2 	
		Longitudinal inferior 2	8	5/8"		X			
		Estribos N+4,59	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	11	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE COLUMNAS AUDITORIO



Columnas	**L-2;L-3;L-4**	Longitudinal superior 1	7	5/8"		X		Columnas L-2, L-3, L-4 Sen 3	
		Longitudinal inferior 2	7	7/8"		X			
		Estribos N+4,59	6	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Superior	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos conf. Medio	11	3/8"	0,20	X			
		Estribos conf. Inferiro	10	3/8"	0,10	X			
		Estribos N+0,05	6	3/8"	0,10	X			

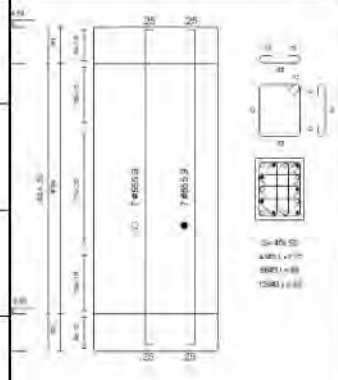

VoBo. Contratista	VoBo. Interventoria
	ARTINEZ





CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE MURO DE CONTENCIÓN Y DADOS DE CIMENTACIÓN AUDITORIO

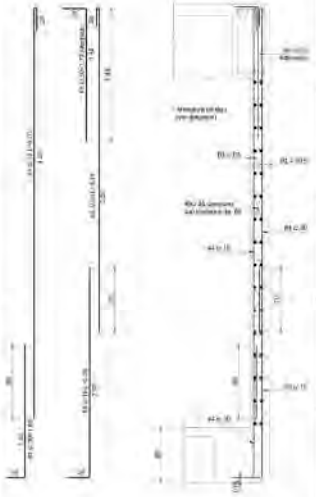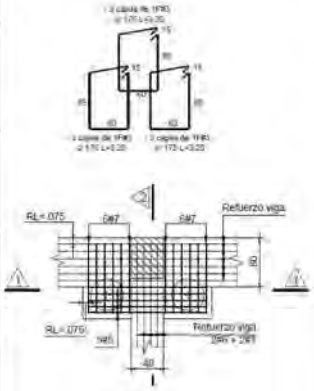Elemento	Ubicación	Ubicación del refuerzo	Planos			Cumple		DESPIECE COLUMNA	Observaciones
			Cantidad	Diámetro	Separación	Si	No		
MURO DE CONTENCION	TIPO 1	Longitudinal traslapo 1	100	1/2"	0,3	X			
		Longitudinal traslapo 2	201	1/2"	0,15	X			
		Longitudinal traslapo 1	201	5/8"	0,15	X			
		Longitudinal traslapo 2	100	1/2"	0,30	X			
		Longitudinal alternado	100	5/8"	0,30	X			
		Transversal 1 (12m)	31	3/8"	0,25	X			
		Transversal 2 (7,20m)	15	3/8"	0,25	X			
DADOS	TIPO 1	Longitudinal superior	5	5/8"	0,08	X			
		Longitudinal inferior	5	7/8"	2,13	X			
		Longitudinal superior 2	6	3/4"	0,10	X			
		Longitudinal inferior 2	7	7/8"	2,47	X			
		Estribos	9	3/8"	0,18	X			

CONSORCIO ARTES 2023	FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS	



Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE MURO DE CONTENCIÓN Y DADOS DE CIMENTACIÓN AUDITORIO

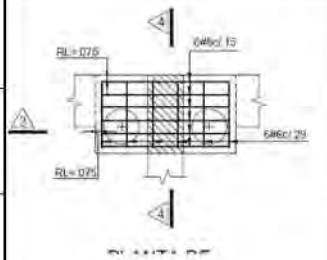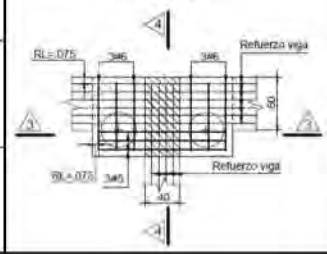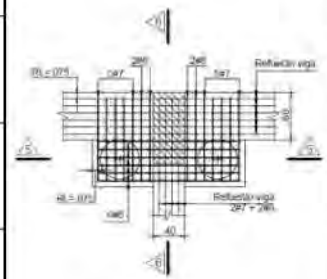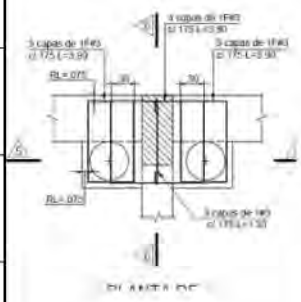DADOS	**TIPO 2**	Longitudinal superior	3	3/4"	0,1	X			
		Longitudinal inferior 1	6	1"	0,13	X			
		Longitudinal superior 2	6	3/4"	0,29	X			
		Longitudinal inferior 2	6	3/4"	0,29	X			
		Longitudinal interno	4	1/2"	0,25	X			
DADOS	**TIPO 3**	Longitudinal superior 1	6	5/8"	0,1	X			
		Longitudinal superior 2	10	7/8"	0,11	X			
		Longitudinal superior 3	4	1"	0,11	X			
		Longitudinal inferior 1	8	7/8"	0,26	X			
		Longitudinal inferior 2	7	7/8"	0,18	X			
		Estribos	9	3/8"	0,18	X			
		Estribos 2	3	3/8"	0,18	X			

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
Fecha:	26/06/2024
Plano(s) de referencia:	DESPIECE DE MURO DE CONTENCIÓN Y DADOS DE CIMENTACIÓN AUDITORIO

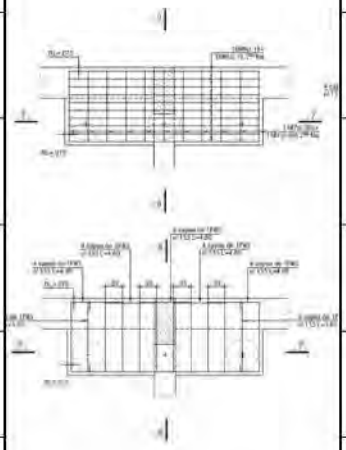DADOS	**TIPO 4**	Longitudinal superior 1	24	7/8"	0,085	X			
		ongitudinal superior 2da fil	7	5/8"	0,13	X			
		Longitudinal superio 3	8	1"	0,85	X			
		Longitudinal inferior 1	11	7/8"	0,37	X			
		Longitudinal inferior 2	10	1"	0,18	X			
		Estribos	28	3/8"	0,13	X			
DADOS	**TIPO 5**	Estribos	6	3/8"	0,3	X			


VoBo. Contratista	VoBo. Interventoria
	ARTINEZ

CONSORCIO ARTES 2023

FORMATO DE LIBERACIÓN DE ACEROS

Contrato:	CO1.PCONTR.5055521
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
Frente de obra:	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES / PLAZOLETA
Fecha:	25/06/2024
Plano(s) de referencia:	CCZ-E-03_ESC-EXT-1_ DVOM

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		SI	No	
VCIM	VC-1N1	1	Longitudinal superior	3	5		8	X		
		2	Longitudinal superior	3	5		8	X		
		3	Longitudinal superior	2	5		5	X		
		4	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		5	Estribos conf. 7-8	11	3	0,13		X		
		6	Estribos conf. 7-8	14	3	0,26		X		
		7	Estribos conf. 8-9	11	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. 9-10	11	3	0,13		X		
		9	Estribos conf. 9-10	6	3	0,26		X		
		10	Estribos conf. 10-11	7	3	0,26		X		
		11	Estribos conf. 10-11	11	3	0,13		X		
		12	Estribos conf. 11-12	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. 12-13	8	3	0,26		X		
		14	Estribos conf. 12-13	11	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. 13'-14	11	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. 14-15	8	3	0,26		X		
		17	Estribos conf. 14-15	11	3	0,13		X		
		18	Estribos conf. 15-16	11	3	0,13		X		
		19	Estibos conf. 16-17	8	3	0,26		X		
		20	Estribos conf. 16-19	11	3	0,13		X		
		21	Estribos conf. 19-19'	7	3	0,26		X		
		22	Estribos conf. 19'-20	11	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 21-22	11	3	0,13		X		
		24	Estribos conf. 21-22'	14	3	0,26		X		
		25	Estribos conf. 22'-23	11	3	0,13		X		
		26	Longitudinal inferior	3	5		8	X		
		27	Longitudinal inferior	3	5		7	X		
		28	Flejes L =2,40	125	3			X		
		29	Felles L=2,10	21	3			X		
		30	ganchos L=0,72	447	3			X		



FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		SI	No	
VCIM	VC-1N2	1	Longitudinal superior	8	5		8	X		
		2	Longitudinal superior	3	6		8	X		
		3	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		4	Longitudinal interno superior	1	6		8	X		
		5	Longitudinal interno inferior	1	7		2	X		
		6	Longitudinal interno inferior	1	6		4	X		
		7	Estribos conf. 7-8	11	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. 7-8	14	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. 8-9	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. 9-10	11	3	0,13		X		
		11	Estribos conf. 9-10	7	3	0,26		X		
		12	Estribos conf. 10-11	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. 11-12	11	3	0,13		X		
		14	Estribos conf. 11-12	8	3	0,26		X		
		15	Estribos conf. 12-13	11	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. 13'-14	11	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. 14-15	7	3	0,26		X		
		18	Estribos conf. 14-15	11	3	0,13		X		
		19	Estribos conf. 15-16	11	3	0,13		X		
		20	Estribos conf. 16-17	8	3	0,26		X		
		21	Estribos conf. 17-18	11	3	0,13		X		
		22	Estribos conf. 18-19	11	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 19-20	7	3	0,26		X		
		24	Estribos conf. 19'-20	11	3	0,13		X		
		25	Estribos conf. 21-22	11	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 21-22'	14	3	0,26		X		
		27	Estribos conf. 22'-23	11	3	0,13		X		
		28	Longitudinal inferior	3	5		7	X		
		29	Longitudinal inferior	3	6		8	X		
		30	Longitudinal inferior	3	5		4	X		
		31	Longitudinal inferior	3	5		4	X		
		32	flejes L =2,10	87	3			X		
		33	Felles L=2,30	47	3			X		
		34	Flejes L=2,40	94	3			X		
		35	ganchos L=0,72	559	3			X		




FIRMA CONTRATISTA | **FIRMA INTERVENTORIA** | **OBSERVACIONES GENERALES**

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Pianos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-103	1	Longitudinal superior	3	6		4	X		
		2	Longitudinal superior	8	7		3	X		
		3	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		4	Longitudinal superior	2	7		4	X		
		5	Longitudinal interno superior 7-8	1	4			X		
		6	Longitudinal interno inferior 7-8	1	4			X		
		7	Longitudinal interno superior 8-10	1	4			X		
		8	Longitudinal interno inferior 8-10	1	4			X		
		10	Longitudinal interno superior 10-12	1	7			X		
		11	Longitudinal interno superior 19 -22	1	6			X		
		12	Longitudinal interno inferior 19 -22	1	6			X		
		13	Estribos conf. 7-8	12	3	0,13		X		
		14	Estribos conf. 7-8	14	3	0,26		X		
		15	Estribos conf. 8-9	11	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. 9-10	11	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. 9-10	4	3	0,26		X		
		18	Estribos conf. 10-11	13	3	0,27		X		
		19	Estribos conf. 10-11	14	3	0,13		X		
		20	Estribos conf. 11-12	12	3	0,13		X		
		21	Estribos conf. 11-12	8	3	0,27		X		
		22	Estribos conf. 12-13	14	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 13-14	14	3	0,13		X		
		24	Estribos conf. 14-15	8	3	0,27		X		
		25	Estribos conf. 14-15	14	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 16-16	14	3	0,13		X		
		27	Estribos conf. 16-17	14	3	0,13		X		
		28	Estribos conf. 17-18	11	3	0,13		X		
		29	Estribos conf. 18-19	16	3	0,13		X		
		30	Estribos conf. 19-20	4	3	0,26		X		
		31	Estribos conf. 19-20	11	3	0,13		X		
		32	Estribos conf. 21-22	12	3	0,13		X		
		33	Estribos conf. 21-22	14	3	0,26		X		
		34	Estribos conf. 22-23	11	3	0,13		X		
		35	Longitudinal inferior	2	6		3,00	X		
		36	Longitudinal inferior	3	6		2,00	X		
		37	Longitudinal inferior	3	6		2,00	X		
		38	Longitudinal inferior	3	6		2,00	X		
		39	Longitudinal inferior	1	7			X		
		40	Longitudinal inferior	2	6		2,00	X		
		41	Longitudinal inferior	2	7		3,00	X		
		42	Longitudinal inferior	8	7		3,00	X		
		43	Flejes L =2,10	13	3			X		
		44	Flejes L=2,90	63	3			X		
		45	Flejes L=2,30	48	3			X		
		46	Flejes L=2,50	25	3			X		
		47	Flejes L=2,70	26	3			X		
		48	Flejes L=2,60	84	3			X		
		49	Flejes L=2,00	4	3			X		
		50	Ganchos L=1,02	135				X		
		51	ganchos L=0,71	155	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Pianos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-104	1	Longitudinal superior	3	7		2	X		
		2	Longitudinal superior	2	7		2	X		
		3	Longitudinal superior	3	6		4	X		
		4	Longitudinal superior	2	6		4	X		
		5	Longitudinal superior	3	6		3	X		
		6	Longitudinal superior	18	3	0,17		X		
		7	Longitudinal interno superior 7-8	2	4			X		
		8	Longitudinal interno superior 8-10	1	4			X		
		9	Longitudinal interno superior 19'-21	1	4			X		
		10	Longitudinal interno superior 22'-23	2	7			X		
		11	Longitudinal interno superior 5-7	2	6			X		
		12	Longitudinal interno superior 10-11	2	4			X		
		13	Longitudinal interno superior 12-16	2	4			X		
		14	Longitudinal interno superior 18'-19'	2	4			X		
		15	Longitudinal interno superior 8-10	1	4			X		
		16	Longitudinal interno superior 19'-20	1	4			X		
		17	Estribos conf. 5'-6	17	3	0,13		X		
		18	Estribos conf. 5'-8	16	3	0,27		X		
		19	Estribos conf. 6-7	17	3	0,13		X		
		20	Estribos conf. 7-8	12	3	0,13		X		
		21	Estribos conf. 7-8	14	3	0,26		X		
		22	Estribos conf. 8-8	11	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 9-10	11	3	0,13		X		
		24	Estribos conf. 9-10	9	3	0,13		X		
		25	Estribos conf. 10-11	9	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 10-11	8	3	0,13		X		
		27	Estribos conf. 11-12	11	3	0,13		X		
		28	Estribos conf. 11-12	7	3	0,27		X		
		29	Estribos conf. 12-13	13	3	0,13		X		
		30	Estribos conf. 13-14	13	3	0,13		X		
		31	Estribos conf. 14-15	6	3	0,27		X		
		32	Estribos conf. 14-15	13	3	0,13		X		
		33	Estribos conf. 15-16	13	3	0,13		X		
		34	Estribos conf. 16-17	6	3	0,27		X		
		35	Estribos conf. 17-18	12	3	0,13		X		
		36	Estribos conf. 18-18'	8	3	0,13		X		
		37	Estribos conf. 18'-19	8	3	0,13		X		
		38	Estribos conf. 19'-20	8	3	0,13		X		
		39	Estribos conf. 19'-20	12	3	0,13		X		
		40	Estribos conf. 21-22	12	3	0,13		X		
		41	Estribos conf. 21-22	14	3	0,26		X		
		42	Estribos conf. 22'-23	11	3	0,13		X		
		43	Longitudinal interno inferior 10-11	2	4			X		
		44	Longitudinal interno inferior 18'-19	2	4			X		
		45	Longitudinal interno inferior 9-10	1	4			X		
		46	Longitudinal interno inferior 19-19'	1	4			X		
		47	Longitudinal interno inferior 6-7	2	7			X		
		48	Longitudinal interno inferior 8-10	2	4			X		
		49	Longitudinal interno inferior 12-16	2	4			X		
		50	Longitudinal interno inferior 18'-19'	1	6			X		
		51	Longitudinal interno inferior 19'-23	3	6			X		
		52	Longitudinal inferior	8	7		2,00	X		
		53	Longitudinal inferior	8	6			X		
		54	Longitudinal inferior	7	6		2,00	X		
		55	Longitudinal inferior	1	4			X		
		56	Longitudinal inferior	7	6		3,00	X		
		57	Longitudinal inferior	8	6		3,00	X		
		58	Longitudinal inferior	7	7		2,00	X		
		59	Longitudinal inferior	7	6			X		
		60	Flejes L=2,60	33	3			X		
		61	Flejes L=3,00	17	3			X		
		62	Flejes L=2,30	40	3			X		
		63	Flejes L=1,90	28	3			X		
		64	Flejes L=2,10	47	3			X		
		65	Flejes L=2,50	75	3			X		
		66	Flejes L=2,10	52	3			X		
		67	Ganchos L=1,07	67	3			X		
		68	Ganchos L=0,72	155	3			X		
		69	Ganchos L=0,82	202	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
		1	Longitudinal superior	2	5		2	X		
		2	Longitudinal superior	8	5		6	X		
		3	Longitudinal superior	3	6		3	X		
		4	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		5	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		6	Longitudinal superior	2	7		2	X		
		7	Longitudinal interno superior 6-7	1	6			X		
		8	Longitudinal interno superior 8-10	1	4			X		
		9	Longitudinal interno superior 19-21	1	4			X		
		10	Longitudinal interno superior 22'-23	2	5			X		
		11	Longitudinal interno superior 5-6	2	7			X		
		12	Longitudinal interno superior 6-7	1	6			X		
		13	Longitudinal interno superior 10-11	3	4			X		
		14	Longitudinal interno superior 12-16	2	4			X		
		15	Longitudinal interno superior 18'-19	2	4			X		
		16	Longitudinal interno superior 9-10	1	4			X		
		17	Longitudinal interno superior 19'-20	1	4			X		
		18	Estribos conf. 5-6	13	3	0,13		X		
		19	Estribos conf. 6'-6	18	3	0,27		X		
		20	Estribos conf. 6-7	3	3	0,27		X		
		21	Estribos conf. 6-7	13	3	0,13		X		
		22	Estribos conf. 7-8	12	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 7-8'	14	3	0,26		X		
		24	Estribos conf. 8-9	11	3	0,13		X		
		25	Estribos conf. 9'-10	11	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 9-10	8	3	0,13		X		
		27	Estribos conf. 10-11	9	3	0,13		X		
		28	Estribos conf. 10-11	8	3	0,13		X		
		29	Estribos conf. 11-12	12	3	0,13		X		
		30	Estribos conf. 13-14	6	3	0,27		X		
		31	Estribos conf. 12-13	13	3	0,13		X		
		32	Estribos conf. 13-14	13	3	0,13		X		
		33	Estribos conf. 14-15	6	3	0,27		X		
VCIM'	VC-105	34	Estribos conf. 14-15	13	3	0,13		X		
		35	Estribos conf. 15-16	13	3	0,13		X		
		36	Estribos conf. 16-17	6	3	0,13		X		
		37	Estribos conf. 17-18	12	3	0,13		X		
		38	Estribos conf. 18-18'	8	3	0,13		X		
		39	Estribos conf. 18'-19	8	3	0,13		X		
		40	Estribos conf. 19-20	8	3	0,13		X		
		41	Estribos conf. 19'-20	12	3	0,13		X		
		42	Estribos conf. 21-22	12	3	0,13		X		
		43	Estribos conf. 21-22	14	3	0,26		X		
		44	Estribos conf. 22'-23	11	3	0,13		X		
		45	Longitudinal interno inferior 10-11	2	4			X		
		46	Longitudinal interno inferior 6-7	1	4			X		
		47	Longitudinal interno inferior 9-10	1	4			X		
		48	Longitudinal interno inferior 18'-19'	2	4			X		
		49	Longitudinal interno inferior 22'-23	1	5			X		
		50	Longitudinal interno inferior 8-10	1	4			X		
		51	Longitudinal interno inferior 12-16	2	4			X		
		52	Longitudinal inferior	3	5		3	X		
		53	Longitudinal inferior	2	6			X		
		54	Longitudinal inferior	2	6		8	X		
		55	Longitudinal inferior	8	6		2	X		
		56	Longitudinal inferior	3	7		3	X		
		57	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		58	Flejes L=2,14	51	3			X		
		59	Flejes L=2,34	15	3			X		
		60	Flejes L=2,10	59	3			X		
		61	Flejes L=1,90	28	3			X		
		62	Flejes L=2,30	28	3			X		
		63	Flejes L=2,50	75	3			X		
		64	Flejes L=2,10	52	3			X		
		65	Ganchos L=0,84	46	3			X		
		66	Ganchos L=0,72	144	3			X		
		67	ganchos L=0,82	202	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES
	MARTINEZ	

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Pines			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-106	1	Longitudinal superior	7	7		7	X		
		2	Longitudinal superior	8	6		4	X		
		3	Longitudinal superior	3	7		6	X		
		4	Longitudinal superior	2	8		3	X		
		5	Longitudinal superior	2	4		3	X		
		6	Longitudinal superior	1	5		1	X		
		7	Longitudinal superior	1	4		1	X		
		8	Estribos conf. 5'-6	11	3	0,13		X		
		9	Estribos conf. 5'-6	20	3	0,28		X		
		10	Estribos conf. 6-7	9	3	0,26		X		
		11	Estribos conf. 6-7	11	3	0,13		X		
		12	Estribos conf. 7-8	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. 7-8	7	3	0,26		X		
		14	Estribos conf. 7-8	11	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. 8-9	22	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. 9-10	11	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. 9-10	4	3	0,26		X		
		18	Estribos conf. 9-10	3	4	0,22		X		
		19	Estribos conf. 10-11	16	3	0,13		X		
		20	Estribos conf. 11-12	16	3	0,13		X		
		21	Estribos conf. 12-13	8	3	0,27		X		
		22	Estribos conf. 12-13	16	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 13'-14	16	3	0,13		X		
		24	Estribos conf. 14-15	7	3	0,27		X		
		25	Estribos conf. 14-15	16	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 15-16	16	3	0,13		X		
		27	Estribos conf. 16-17	8	3	0,27		X		
		28	Estribos conf. 17-18	16	3	0,13		X		
		29	Estribos conf. 18-19	16	3	0,13		X		
		30	Estribos conf. 19'-20	3	3	0,27		X		
		31	Estribos conf. 19'-20	4	3	0,26		X		
		32	Estribos conf. 19'-20	11	3	0,13		X		
		33	Estribos conf. 21'-22	11	3	0,13		X		
		34	Estribos conf. 21'-22	14	3	0,26		X		
		35	Estribos conf. 22'-23	11	3	0,13		X		
		36	Longitudinal interno inferior 19'-21	1	3			X		
		37	Longitudinal interno inferior 22'-23	2	4			X		
		38	Longitudinal interno inferior 6-8	3	4			X		
		39	Longitudinal interno inferior 8-10	2	4			X		
		40	Longitudinal interno inferior 18'-21	8	6			X		
		41	Longitudinal interno inferior 21-23	3	6			X		
		42	Longitudinal inferior	3	6		3	X		
		43	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		44	Longitudinal inferior	3	7		3	X		
		45	Longitudinal inferior	2	7		3	X		
		46	Flejes L=1,90	86	3			X		
		47	Flejes L=2,30	87	3			X		
		48	Flejes L=2,60	145	3			X		
		49	Flejes L=2,10	26	3			X		
		50	Ganchos L=0,72	245	3			X		
		51	Ganchos L=1,02	145	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeración	Ubicación del refuerzo	Pines			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-107	1	Longitudinal superior	7	6		3	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		3	X		
		3	Longitudinal superior	3	6		1	X		
		4	Longitudinal superior	3	8		6	X		
		5	Longitudinal interno superior 6-7	2	5			X		
		6	Longitudinal interno superior 21-22	1	5			X		
		7	Estribos conf. 5'-6	11	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. 5'-6	14	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. 6-7	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. 6-7	14	3	0,13		X		
		11	Estribos conf. 7-8	8	3	0,13		X		
		12	Estribos conf. 7-8	21	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. 8-9	20	3	0,13		X		
		14	Estribos conf. 9-10	20	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. 10-11	20	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. 11-12	11	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. 12-13	10	4	0,26		X		
		18	Estribos conf. 12-13	11	3	0,13		X		
		19	Estribos conf. 13'-14	9	3	0,13		X		
		20	Estribos conf. 14-15	7	3	0,26		X		
		21	Estribos conf. 14-15	11	3	0,13		X		
		22	Estribos conf. 15-16	11	3	0,13		X		
		23	Estribos conf. 16-17	8	3	0,26		X		
		24	Estribos conf. 17-18	11	3	0,13		X		
		25	Estribos conf. 18-19	11	3	0,13		X		
		26	Estribos conf. 19-20	8	4	0,26		X		
		27	Estribos conf. 19-20	11	3	0,13		X		
		28	Estribos conf. 21-22	11	3	0,13		X		
		29	Estribos conf. 21-22	5	3	0,26		X		
		30	Estribos conf. 21-22	4	3	0,13		X		
		31	Estribos conf. 22-23	8	3	0,13		X		
		32	Estribos conf. 22-23	24	3	0,13		X		
		33	Longitudinal interno inferior 6-7	2	5			X		
		34	Longitudinal interno inferior 21-22	1	5			X		
		35	Longitudinal inferior	3	5		8	X		
		36	Longitudinal inferior	2	6		4	X		
		37	Longitudinal inferior	2	5		4	X		
		38	Flejes L=1,90	286	3			X		
		39	Flejes L=2,30	14	3			X		
		40	Flejes L=2,00	8	3			X		
		41	Ganchos L=0,72	22	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-108	1	Longitudinal superior	3	5		4	X		
		2	Estribos conf. 5'-6	11	3	0,13	4	X		
		3	Estribos conf. 5'-6	4	3	0,26		X		
		4	Estribos conf. 5'-6	11	3	0,13		X		
		5	Longitudinal inferior	3	5			X		
		6	Flejes L=1,50	26	3			X		



FIRMA CONTRATISTA | FIRMA INTERVENTORIA | OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-127	1	Longitudinal superior	2	6		1	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		2	X		
		3	Longitudinal superior	2	5		1	X		
		4	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		5	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		6	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		7	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		8	Estribos conf. G'-G	10	3	0,13		X		
		9	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. G-E	24	3	0,13		X		
		11	Estribos conf. E-D	12	3	0,13		X		
		12	Estribos conf. E-D	4	3	0,27		X		
		13	Estribos conf. E-D	12	3	0,13		X		
		14	Estribos conf. D-C	24	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. C-B	20	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. B-A	14	3	0,26		X		
		18	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		19	Longitudinal inferior	2	5		3	X		
		20	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		21	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		22	Longitudinal inferior	2	6		2	X		
		23	Flejes L=1,70	79	3			X		
		24	Flejes L=1,90	76	3			X		



FIRMA CONTRATISTA | FIRMA INTERVENTORIA | OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-128	1	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		3	X		
		3	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		4	Longitudinal superior	2	6		3	X		
		5	Longitudinal superior interno	2	6		2	X		
		6	Estribos conf. G'-G	10	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. G'-G	2	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. G-F	24	3	0,13		X		
		11	Estribos conf. E-D	12	3	0,13		X		
		12	Estribos conf. E-D	4	3	0,27		X		
		13	Estribos conf. E-D	13	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. D-C	24	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. C-B	20	3	0,13		X		
		17	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		18	Estribos conf. B-A	14	3	0,26		X		
		19	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		20	Longitudinal inferior	2	5		3	X		
		21	Longitudinal inferior	2	6		3	X		
		22	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		23	Longitudinal inferior	2	6		2	X		
		24	Flejes L=1,70	79	3			X		
		25	Flejes L=1,90	76	3			X		



FIRMA CONTRATISTA | FIRMA INTERVENTORIA | OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-129	1	Longitudinal superior	2	5		2	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		3	X		
		3	Estribos conf. G-F	23	3	0,13	2	X		
		4	Estribos conf. E-F	11	3	0,13	3	X		
		5	Estribos conf. E-F	5	3	0,26	2	X		
		6	Estribos conf. E-F	11	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. D-C	11	3	0,13		X		
		9	Estribos conf. D-C	2	3	0,26		X		
		10	Estribos conf. D-C	10	3	0,13		X		
		11	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		12	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		13	Flejes L=1,70	73	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-130	1	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		2	Longitudinal superior	2	5		4	X		
		3	Longitudinal superior interno	4	5		2	X		
		4	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13	3	X		
		5	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13	2	X		
		6	Estribos conf. G-F	11	3	0,13		X		
		8	Estribos conf. F-E	11	3	0,13		X		
		9	Estribos conf. E-D	11	3	0,13		X		
		10	Estribos conf. E-D	4	3	0,26		X		
		11	Estribos conf. E-D	11	3	0,13	2	X		
		12	Estribos conf. D-C	11	3	0,13		X		
		13	Estribos conf. D-C	11	3	0,13		X		
		14	Estribos conf. C-B	20	3	0,13		X		
		15	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		16	Estribos conf. B-A	16	3	0,26		X		
		17	Estribos conf. B-A	11	3	0,13		X		
		18	Longitudinal inferior	2	5		3	X		
		19	Longitudinal inferior	2	6		1	X		
		20	Longitudinal inferior	2	5			X		
		21	Flejes L=1,70	152	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	VC-131	1	Longitudinal superior	3	5		1	X		
		2	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13		X		
		3	Estribos conf. G'-G	4	3	0,26		X		
		4	Estribos conf. G'-G	11	3	0,13	3	X		
		5	Longitudinal inferior	3	5		1	X		
		6	Flejes L=1,50	26	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	Vtc-116	1	Longitudinal superior	2	4		1	X		
		2	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		3	Longitudinal superior	2	4		2	X		
		4	Longitudinal superior interno	2	4		1	X		
		5	Estribos conf. G'-G	12	3	0,26		X		
		6	Estribos conf. G-E	12	3	0,26		X		
		7	Estribos conf. E-D	16	3	0,26		X		
		8	Estribos conf. D-C	12	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. C-B	10	3	0,26		X		
		10	Estribos conf. B-A	26	3	0,26		X		
		11	Longitudinal inferior	2	4		2	X		
		12	Longitudinal inferior	2	6		1	X		
		13	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		14	Ganchos L=1,30	48	3			X		
		15	Ganchos L=1,50	40	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	Vtc-117	1	Longitudinal superior	2	4		1	X		
		2	Longitudinal superior	2	4		2	X		
		3	Estribos conf. G'-G	12	3	0,26		X		
		4	Estribos conf. G-E	12	3	0,26	1	X		
		5	Estribos conf. E-D	16	3	0,26		X		
		6	Estribos conf. D-C	12	3	0,26		X		
		7	Longitudinal inferior	2	4		1	X		
		8	Longitudinal inferior	2	4		2	X		
		9	Ganchos L=1,30	12	3			X		
		10	Ganchos L=1,50	40	3			X		




FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	Vtc-117A	1	Longitudinal superior	2	4		1	X		
		2	Estribos conf. L-A	12	3	0,26		X		
		3	Longitudinal inferior	2	4		1	X		
		4	Ganchos L=1,30	12	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	Vtc-118	1	Longitudinal superior	2	5		3	X		
		2	Longitudinal superior	2	6		1	X		
		3	Longitudinal superior interno	2	6		2	X		
		4	Estribos conf. G'-G	12	3	0,26		X		
		5	Estribos conf. G-E	12	3	0,26		X		
		6	Estribos conf. E-D	16	3	0,26		X		
		7	Estribos conf. D-C	12	3	0,26		X		
		8	Estribos conf. C-B	10	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. B-A	27	3	0,26		X		
		10	Longitudinal inferior	2	5		2	X		
		11	Longitudinal inferior	2	6		1	X		
		12	Ganchos L=1,30	89	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

Elemento	Ubicación	Numeracion	Ubicación del refuerzo	Planos			CANT. LONG.	Cumple		Observaciones
				Cantidad	Diámetro	Separación		Si	No	
VCIM	Vtc-119	1	Longitudinal superior	2	5		2	X		
		2	Longitudinal superior	2	6		2	X		
		3	Longitudinal superior interno	2	5		1	X		
		4	Estribos conf. G'-G	12	3	0,26		X		
		5	Estribos conf. G-E	12	3	0,26		X		
		6	Estribos conf. E-D	16	3	0,26		X		
		7	Estribos conf. D-C	12	3	0,26		X		
		8	Estribos conf. C-B	10	3	0,26		X		
		9	Estribos conf. B-A	27	3	0,26		X		
		10	Longitudinal inferior	2	5		3	X		
		11	Ganchos L=1,30	89	3			X		



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA	OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Bloque:	**Auditorio**			**Liberación de actividad:**	**Registro 2"**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Fase I Auditorio				X		Cantidad = 1	
Fase I Auditorio				X		Cantidad = 1	
Fase I Auditorio				X		Cantidad = 2	




CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO FRÁNCES**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
Escaleras				X		Carga (A-B;1-4) Descarga (B-G';3-4) 17,5 m	
Escaleras				X		Carga (A-B;3-5) Descarga (B-G';3-4) 8,08m	
Escaleras				X		Carga (C-D;1-4) Descarga (B-G';3-4) 17,70m	
Escaleras				X		Carga (C-D;3-5) Descarga (B-G';3-4) 8,00m	
Escaleras				X		Carga (D-E;1-4) Descarga (B-G';3-4) 17,80m	
Escaleras				X		Carga (D-E;3-5) Descarga (B-G';3-4) 8,22m	
Escaleras				X		Carga (B-G';3-5) Descarga (G-G';3-4) 16,70m	
Escaleras				X		Carga (G-G';3-5) Descarga (B-G';3-4) 8,90m	
Escaleras				X		Carga (G-G';1-4) Descarga (B-G';3-4) 9,15m	



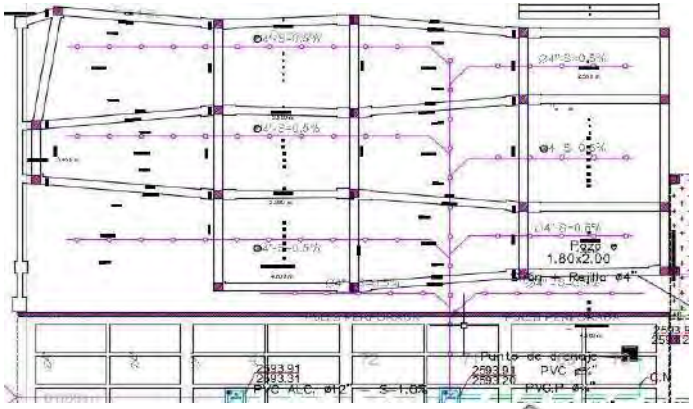


Ing. Fred Arango

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
CJ10-CJ9				X		9,24m	
CJ9-CJ8				X		10,50m	

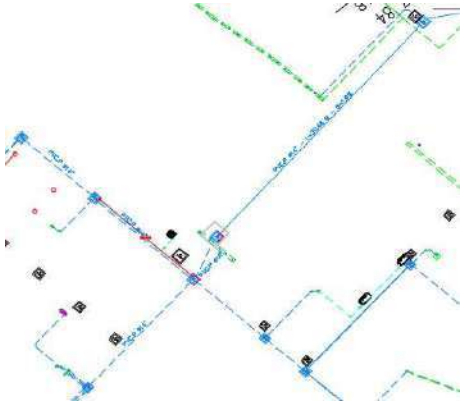


Ing. Fred Arango

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**M2**			**Liberación de actividad:**	**PLACA DE CIMENTACIÓN ALIGERADA H=0,6 CONCRETO 28MPa INCLUYE VIGAS DE CIMENTACIÓN**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
AUDITORIO (F-Z;1-5)				X		30,08x62,3	

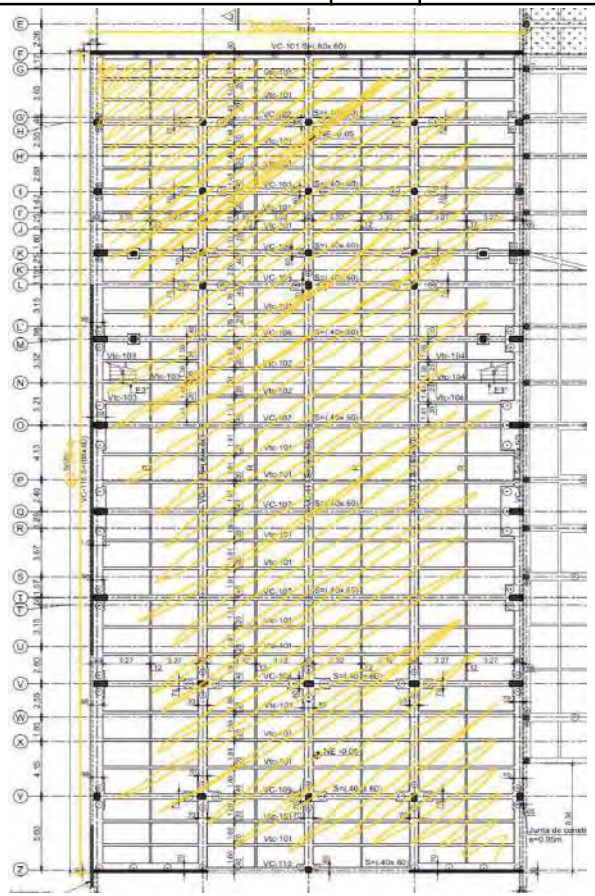



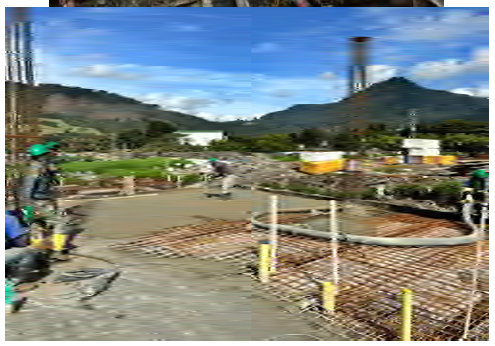

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**PILOTE PREEXCAVADO D=0,4m (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCION NO MENOR DE 5KM)**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
ESCALERAS				X		L=20m Cant. 33	
AUDITORIO				X		L=22m Cant. 34	
RAMPA				X		L=22m Cant. 17	
PLAZOLETA				X		L=20m Cant. 116	
AULA POLIVALENTE				X		L=20m Cant. 18	
ESCALERAS + TANQUE				X		L=20m Cant. 40	









CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**PILOTE PREEXCAVADO D=0,5m (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCION NO MENOR DE 5KM)**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
AUDITORIO						L=22m Cant. 85	
PLAZOLETA						L=20m Cant. 45	
SALONES						L=20m Cant. 45	

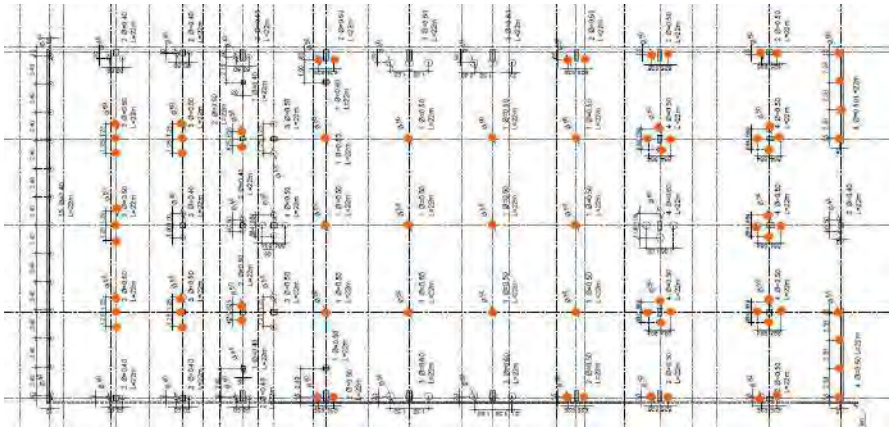

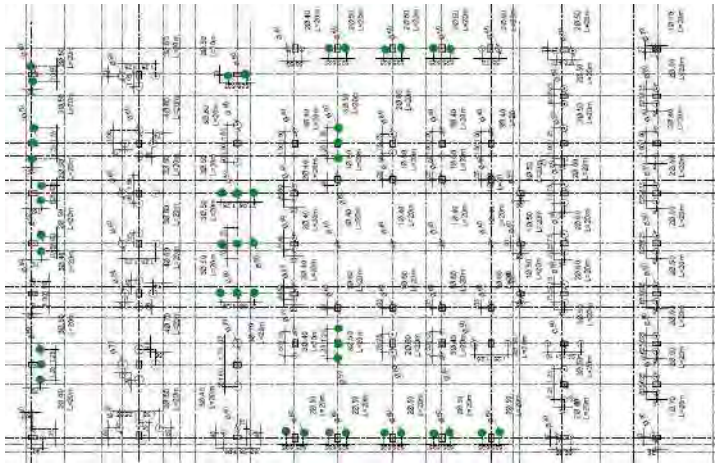

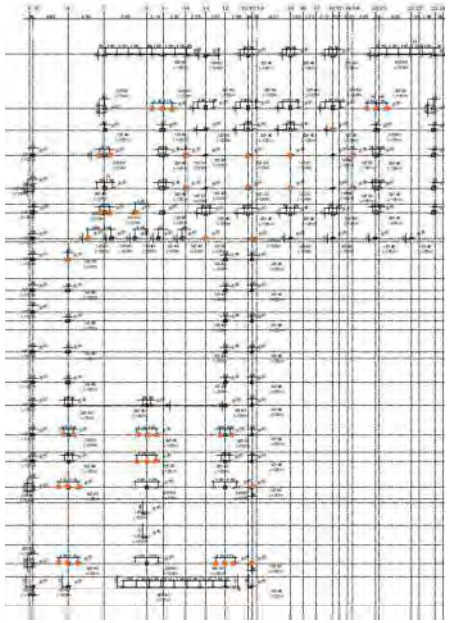



CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**PILOTE PREEXCAVADO D=0,6m (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCION NO MENOR DE 5KM)**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
AUDITORIO						L=22m Cant. 18	
PLAZOLETA						L=20m Cant. 33	
AULA POLIVALENTE						L=20m Cant. 2	
SALONES						L=20m Cant. 41	

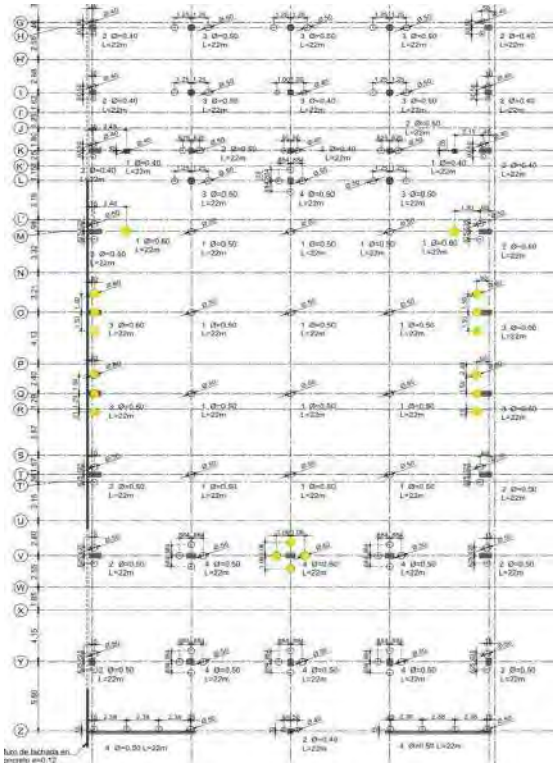


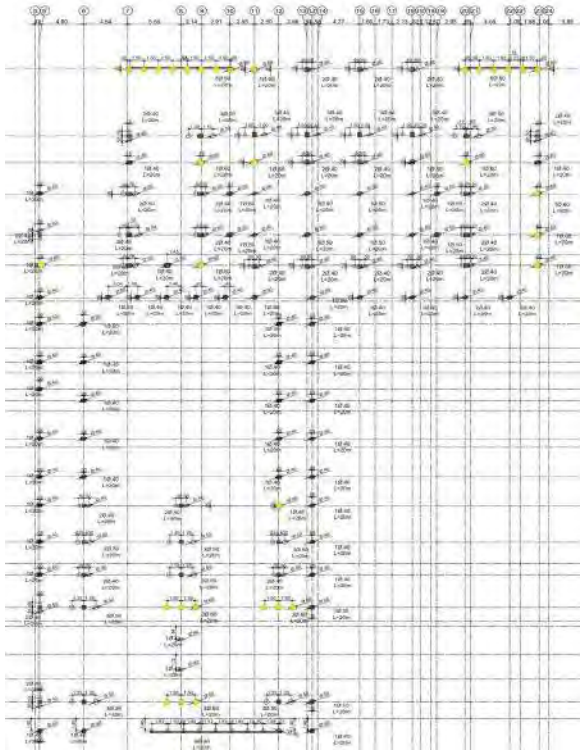

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**ML**			**Liberación de actividad:**	**PILOTE PREEXCAVADO D=0,7m (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCION NO MENOR DE 5KM)**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
SALONES						L=20m Cant. 9	

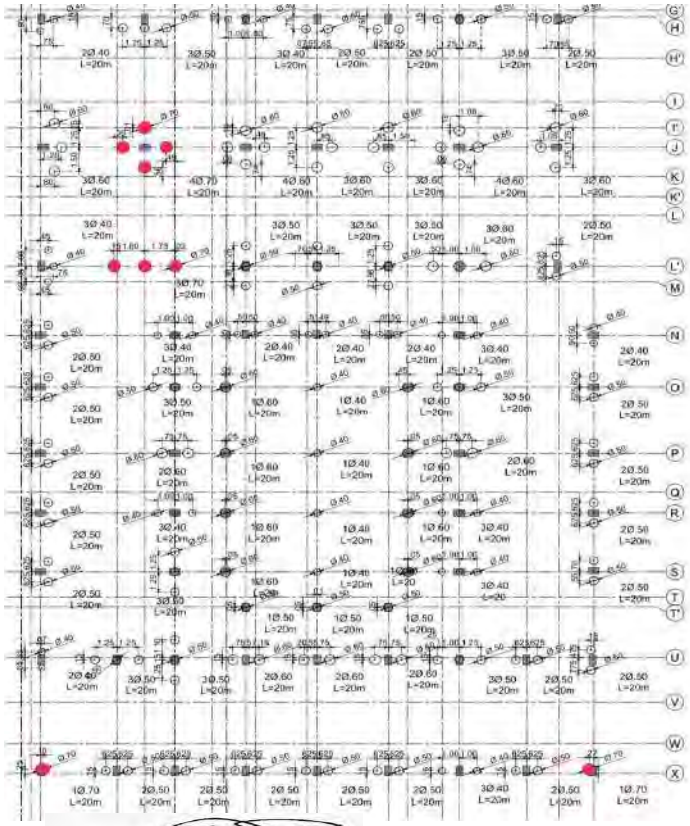

Ing. Fred Arango

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**M³**			**Liberación de actividad:**	**CONCRETO TREMIE 4000 PSI GRAVILLA FINA, 10" ASENTAMIENTO (EXPANSIÓN PILOTES)**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES








Ing Fred Arango

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
Unidad	**M³**			**Liberación de actividad:**	**CONCRETO BOMBEADO PARA ESTRUCTURA ENTREPISOS, PLACAS AEREAS, VIGAS Y VIGUETAS F'c 28 Mpa**		

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	**Firma**
				SI	**NO**		
ACTIVIDADES-CONTRACTUALES							
VCIM E-001				X		30,31x0,4x0,6	
VCIM E-002				X		30,18x0,4x0,6	
VCIM E-003				X		30,16x0,4x0,6	
VCIM E-004				X		20,99x0,4x0,6	
VCIM E-005				X		13,41x0,4x0,6	
VCIM E-006				X		7,58x0,4x0,6	
VCIM E-007				X		11,68x0,4x0,6	
VCIM E-008				X		11,93x0,4x0,6	
VCIM E-009				X		10,61x0,4x0,6	
VCIM E-010				X		10,70x0,4x0,6	
SOBREESPESOR VIGAS DE 10cm Y PROFUNDIDAD 7cm				X		1,55x0,2x0,7 (Cant. 11)	

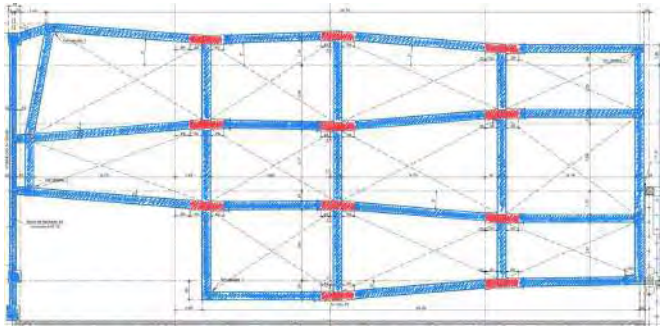



Ing. Fred Arango

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES**		
ÍTEM	**2.1.5**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	DIÁMETRO (m)	L (m)	VOL (m³)		
EDIFICIO SALONES	0,4	0,32	0,04	40	1,60
EDIFICIO SALONES	0,5	0,32	0,06	33	1,98

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

EDIFICIO SALONES PILOTES DE 0.40m

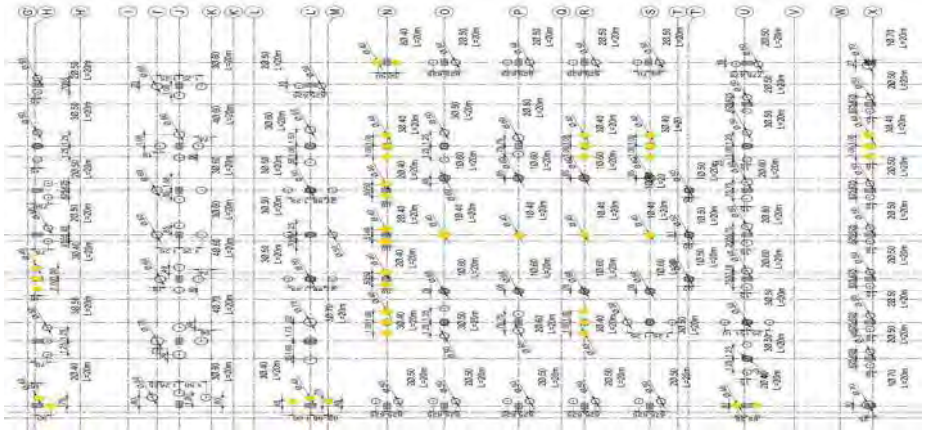



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES**		
ÍTEM	**2.1.5**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

EDIFICIO SALONES PILOTES 0.5m

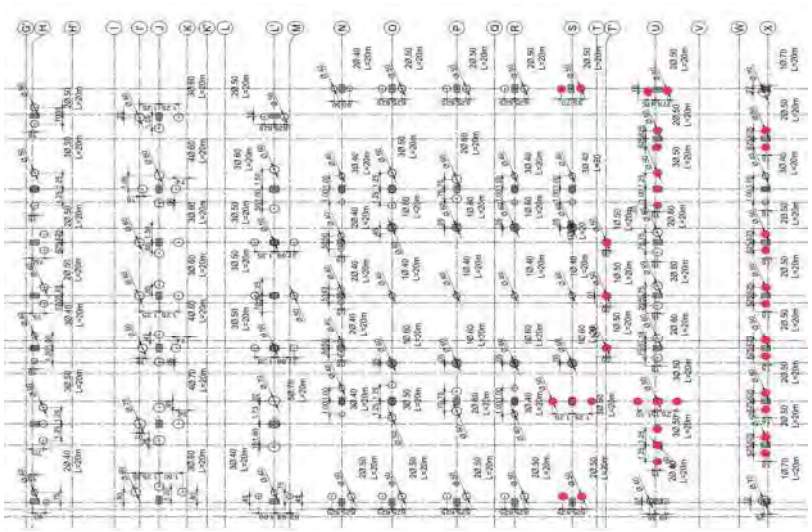



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

NOMBRE: JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

NOMBRE: Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA DADOS DE F'c 28MPa**		
ÍTEM	**2.1.6**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
EDIFICIO SALONES (DADO TIPO 6)	1,1	1,95	1,00	2,145	3	6,44
EDIFICIO SALONES (DESCUENTO DE PLACA A DADOS)	1,1	1,95	0,15	0,32	3	0,97
TOTAL V(m³)						5,47

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

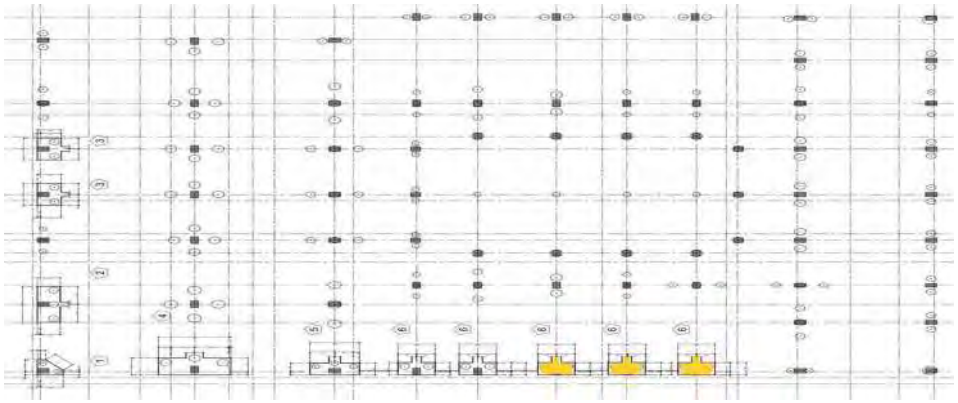



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				SI	NO		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

AUDITORIO

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
V-1; V-5; T-1; M-1; K-1; T-5; M-5; K-5	0,4	0,9	3,84	1,382	8	11,06
K-2; K-3; K-4	0,4	0,4	4,04	0,65	3	1,94
O-1; O-5	0,4	0,9	3,84	1,38	2	2,76
Q-1; Q-5	0,4	0,9	3,84	1,38	2	2,76
V-2; V-3; V-4	0,4	0,65	4,04	1,05	3	3,15
Y-1; Y-5	0,5	0,4	3,84	0,77	2	1,54
Y-2; Y-3; Y-4	0,4	0,55	4,04	0,89	3	2,67
Z-3	0,4	0,4	3,84	0,61	1	0,61
L-2; L-3; L-4	0,4	0,5	4,04	0,81	3	2,42
TRAMO ACARTELADO L-2; -3; L-4	0,5	0,4	4,04	0,40	3,00	1,21
TOTAL V(m³)						30,13

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

PLAZOLETA

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
A-13; A-15; A-18; A-20; A-23; C-23; D-23; E-23; G-23; B-23	0,4	0,6	3,84	0,922	10	9,22
B-13; B-15; B-18; B-20; G-20; C-20; D-20; E-20	0,4	0,6	4,04	0,97	8	7,76
G'-11; G'-7/8; G'-8/9; G'-9/10	0,4	0,5	4,04	0,81	4	3,23
G-18; G-15; G-13; G-11; C-18; C-15; C-13; C-11; D-19'; E-19'; D-10; E-10	0,4	0,5	3,84	0,77	12	9,22
TRAMO ACARTELADO (G'-11; G'-7/8; G'-8/9; G'-9/10)	0,5	0,4	4,04	0,40	4	1,62
TRAMO ACARTELADO (G-18; G-15; G-13; G-11; C-18; C-15; C-13; C-11; D-19'; E-19'; D-10; E-10)	0,5	0,4	3,84	0,38	12	4,61
TOTAL V(m³)						35,64
TOTAL V(m³) COLUMNAS AUDITORIO Y PLAZOLETA						65,78

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				SI	NO		

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				


ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

AUDITORIO

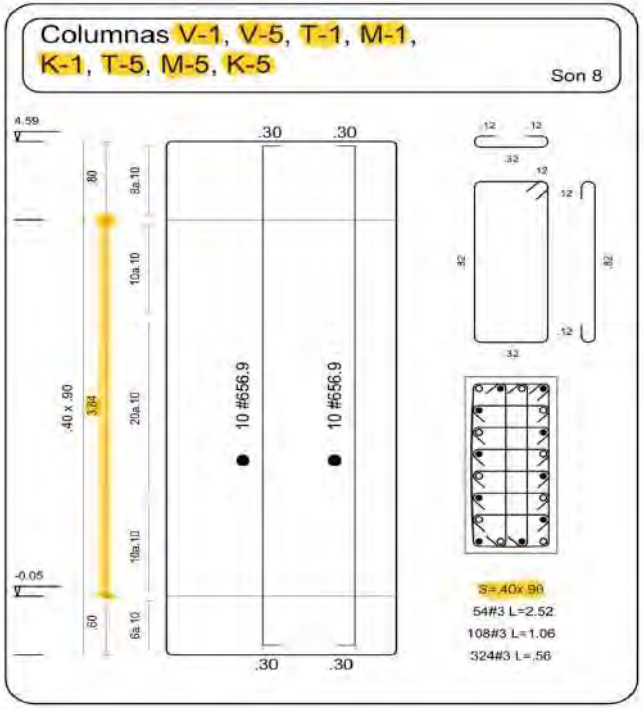

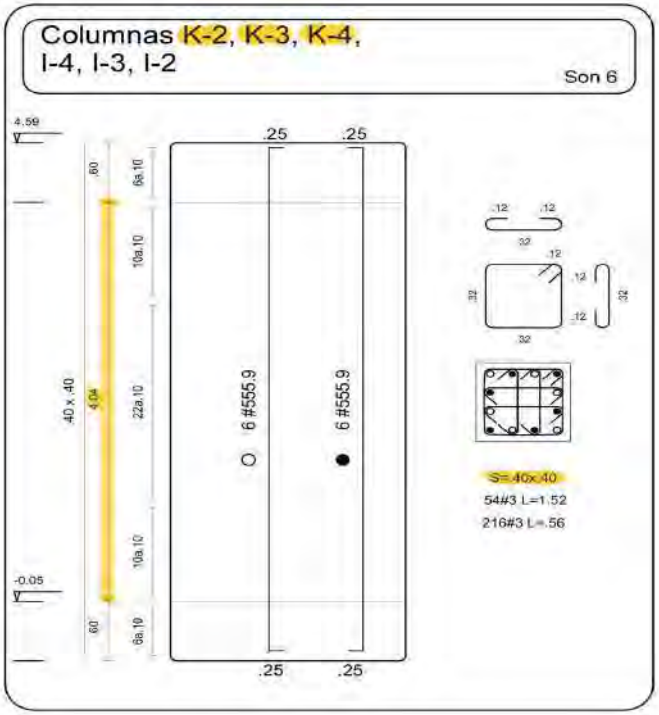

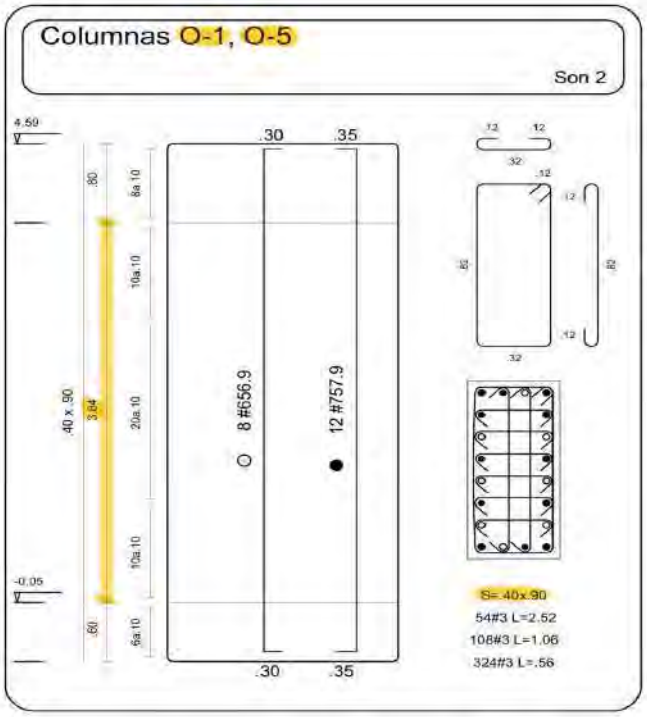



CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

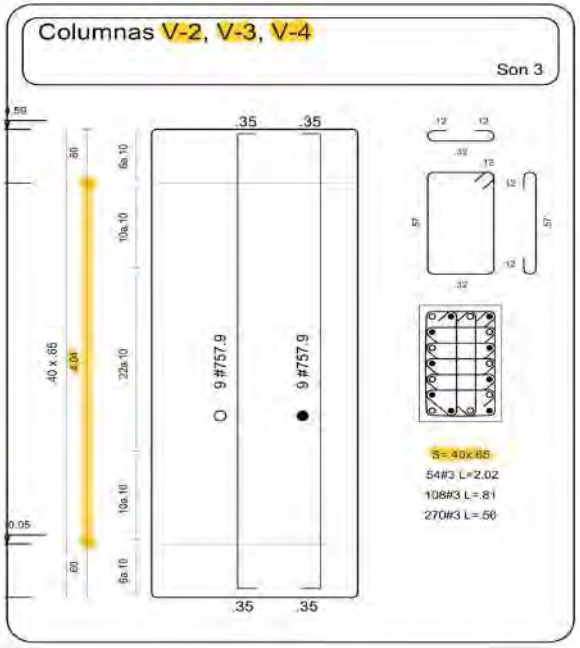

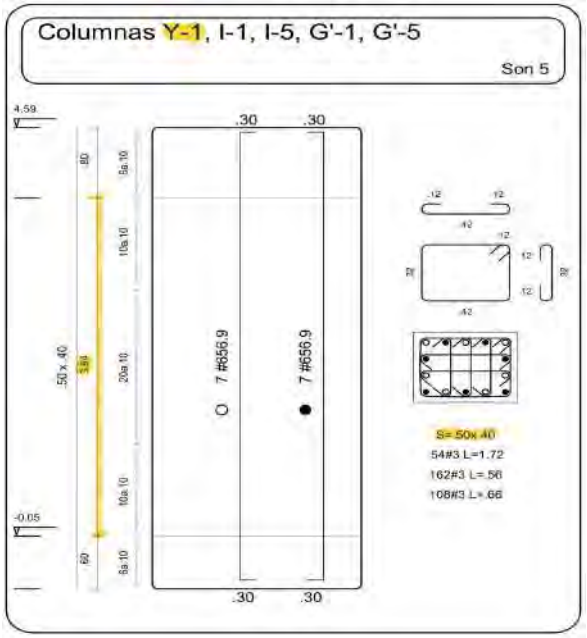

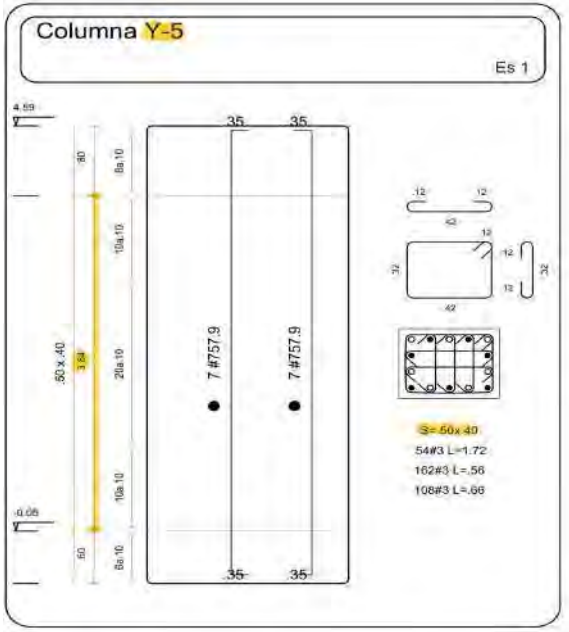



CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

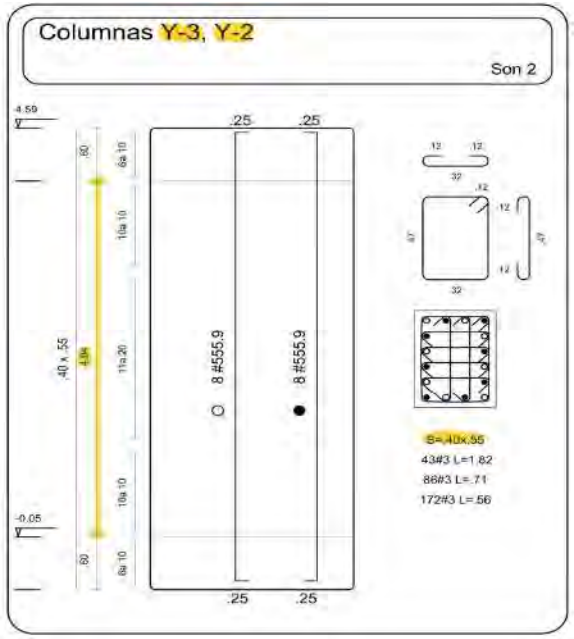

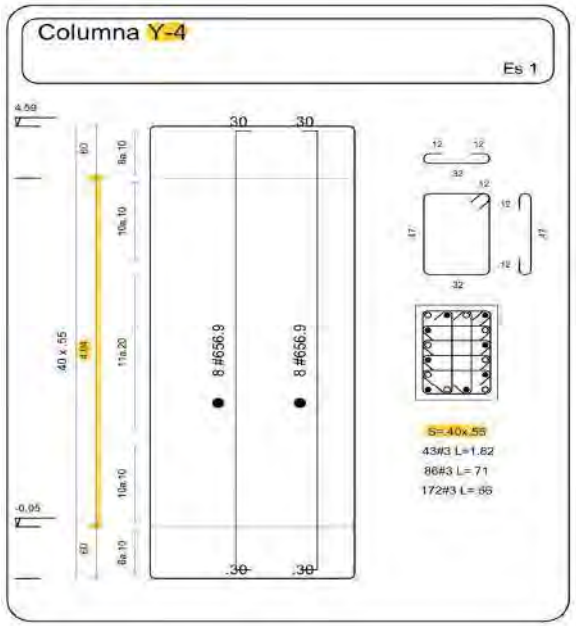

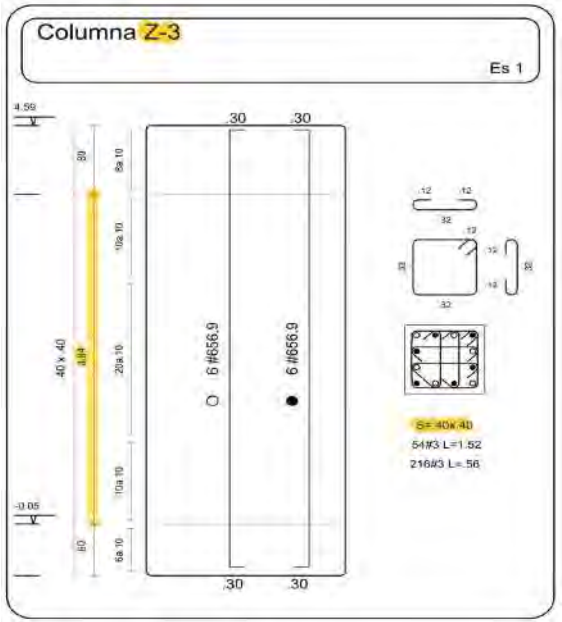



CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

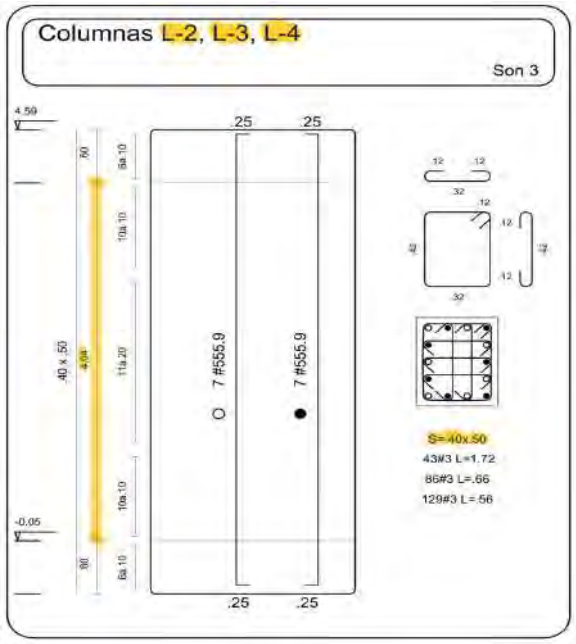

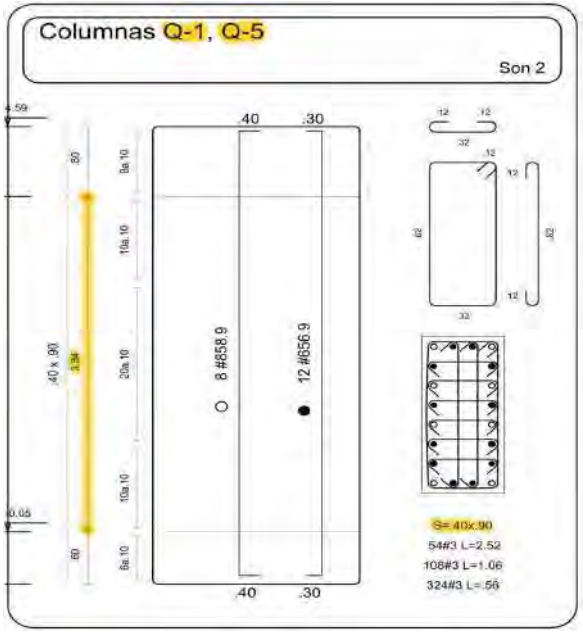

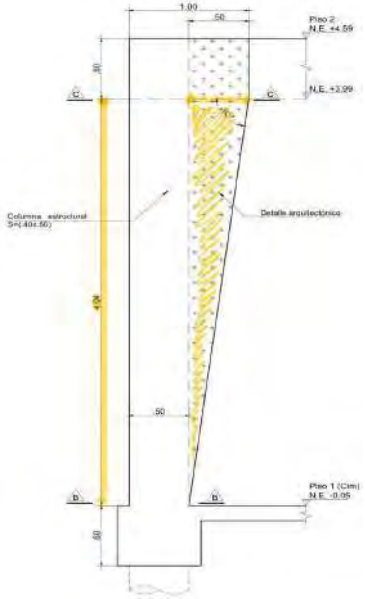


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

PLAZOLETA

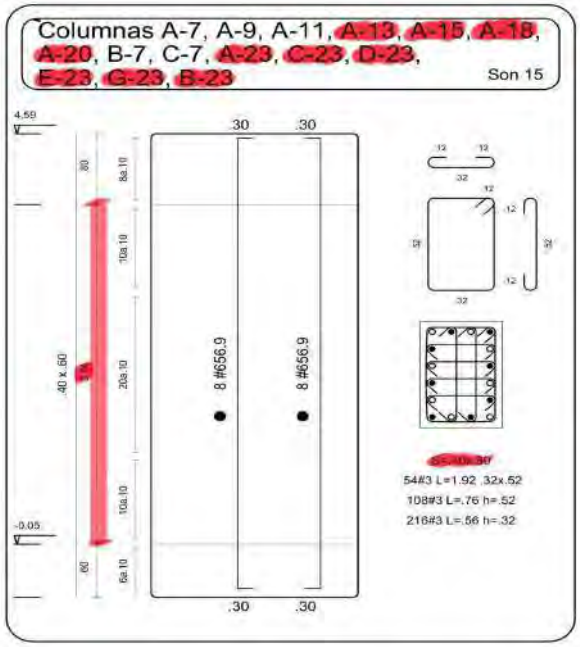

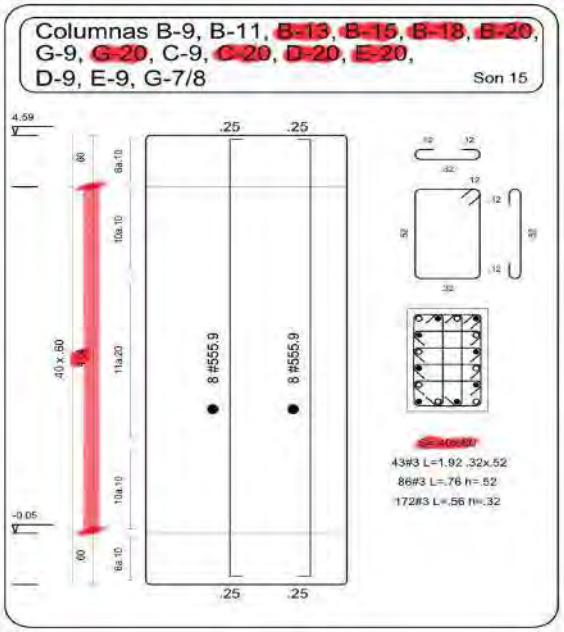

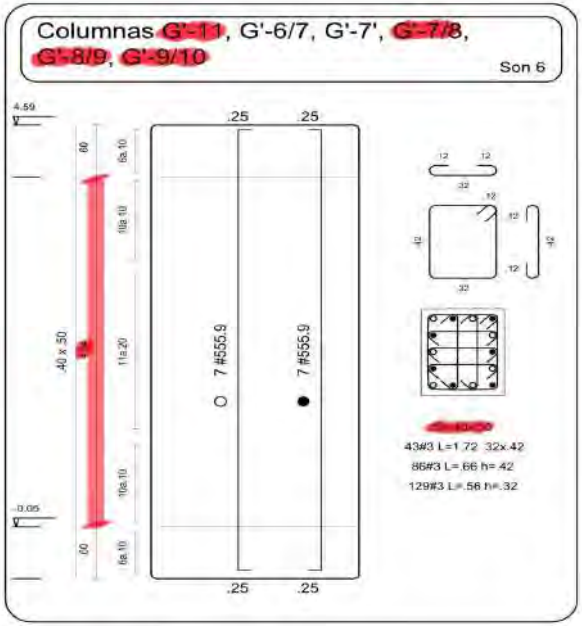



CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA COLUMNAS F'c 35MPa**		
ÍTEM	**2.1.7**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

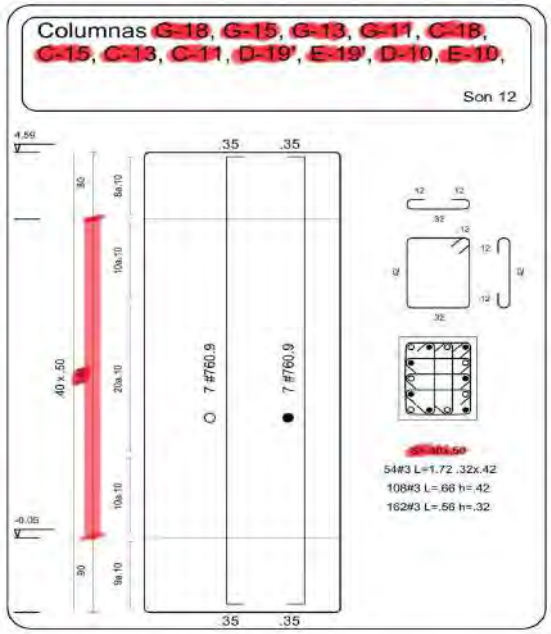

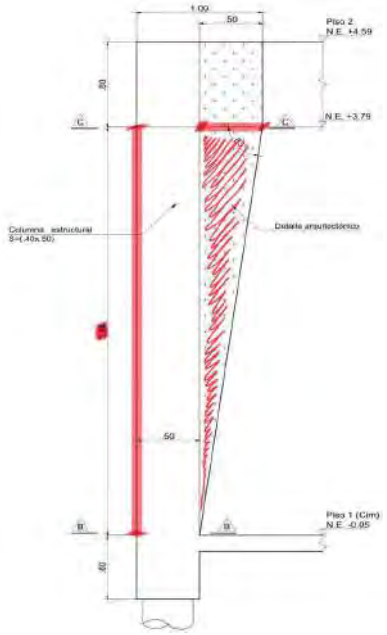

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE:

INTERVENTORIA

NOMBRE:

Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

PLAZOLETA

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOL (m³)		
VC-116 EJE D-G; 5'	8,5	0,6	0,03	0,153	1	0,15
Vtc-105 EJE D-G; 6	8,5	0,3	0,03	0,08	1	0,08
Vtc-118 EJE D-G; 21-22	8,5	0,3	0,03	0,08	2	0,15
Vtc-119 EJE D-G; 22'	8,5	0,3	0,03	0,08	1	0,08
Vtc-109 EJE A-G; 8	22,2	0,3	0,03	0,20	1	0,20
VC-105 EJE E; 5'-10	19,7	0,6	0,03	0,35	1	0,35
VC-105 EJE E; 19'-23	10,65	0,6	0,03	0,19	1	0,19
VC-119; VC-117; VC-124; VC125 EJE G-Y	53,82	0,6	0,03	0,97	4	3,88
VTC-103; VTC-115 EJE G-Y	53,82	0,3	0,03	0,48	2	0,97
VC-120 EJE O-Y	25,64	0,6	0,03	0,46	1,00	0,46
Vtc 107 A	25,64	0,3	0,03	0,23	2,00	0,46
Vtc-107	25,64	0,3	0,03	0,23	6,00	1,38
VC-134	10,65	0,6	0,03	0,19	1,00	0,19
VC-108	4	0,6	0,03	0,07	4,00	0,29
VC-110	3,88	0,6	0,03	0,07	1,00	0,07
RIOSTRA TIPO 1 EJE 5-6	4,1	0,3	0,03	0,04	1,00	0,04
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,2	0,3	0,03	-0,0018	6,00	-0,01
VC-111; VC-113; VC-114; VC-115	28,3	0,6	0,03	0,5094	4,00	2,04
VC-112	28,3	0,6	0,03	0,5094	2,00	1,02
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,3	0,3	0,03	-0,0027	28,00	-0,08
TOTAL PLAZOLETA V(m³)						11,91

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

AULA POLIVALENTE

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
PLACA DE AULA POLIVALENTE COMPLETA	17,77	22,56	0,03	12,027	1	12,03

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)		
VTC-102	13,4	0,2	0,36	0,05	1	0,62
VTC-104	15,37	0,2	0,36	0,05	1	0,71
VTC-107	12,35	0,2	0,36	0,05	1	0,57
VTC-110	11,08	0,2	0,36	0,05	1	0,51
VTC-113	9,68	0,2	0,36	0,05	1	0,45
VTC-101	2,77	0,15	0,36	0,05	1	0,12
VTC-103	4	0,15	0,36	0,05	1	0,17
VTC-106	4,97	0,2	0,36	0,05	1	0,23
VTC-109	4,44	0,2	0,36	0,05	1	0,20
VTC-112	3,74	0,2	0,36	0,05	1	0,17
VTC-105	12,18	0,2	0,36	0,05	1	0,56
VTC -108	8,57	0,2	0,36	0,05	1	0,39
VTC-111	8,47	0,2	0,36	0,05	1	0,39
VC-114	8,4	0,5	0,38	0,05	1	0,53
VC-113	7,78	0,5	0,38	0,05	1	0,49
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,4	0,5	0,38	0,05	1	-0,13
VC-112	9,06	0,5	0,38	0,05	1	0,57
VC-111	6,62	0,5	0,38	0,05	1	0,42

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

VC-110	4,33	0,5	0,38	0,05	1	0,27
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,4	0,5	0,38	0,05	1	-0,08
VC-109	5,32	0,5	0,38	0,05	1	0,34
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,4	0,5	0,38	0,05	1	-0,08
VC-108	5,83	0,5	0,38	0,05	1	0,37
VC-101	20,39	0,5	0,38	0,05	1	1,28
VC-102	19,2	0,5	0,38	0,05	1	1,21
VC-115	3,38	0,5	0,38	0,05	1	0,21
VC-103	11,12	0,55	0,38	0,05	1	0,73
VC-104	3,75	0,55	0,38	0,05	1	0,25
VC-105	11,3	0,55	0,38	0,05	1	0,74
TOTAL V(m³)						12,22
TOTAL V(m³) AULA POLIVALENTE						24,24

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

EDIFICIO SALONES

ELEMENTO	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOL (m³)		
VC-101	30,88	0,7	0,03	0,65	1	0,65
VC-102	29,01	0,9	0,03	0,78	1	0,78
VC-103	28,46	0,9	0,03	0,77	1	0,77
VC-104	30,54	0,7	0,03	0,64	1	0,64
VC-105	30,54	0,8	0,03	0,73	1	0,73
VC-106	30,54	0,9	0,03	0,82	1	0,82
VC-107	30,54	0,9	0,03	0,82	1	0,82
VC-108	30,54	0,7	0,03	0,64	1	0,64
VC-109	15,74	0,65	0,03	0,31	1	0,31
VC-110	30,86	0,9	0,03	0,83	1	0,83
VC-111	31,06	0,7	0,03	0,65	1	0,65
VC-112	46	0,7	0,03	0,97	1	0,97
VC-118	6,3	0,7	0,03	0,13	1	0,13
VC-113	46	0,8	0,03	1,10	1	1,10
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	9	-0,07
VC-114	9,55	0,7	0,03	0,20	1	0,20
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	1	-0,01
VC-114B	19	0,9	0,03	0,51	1	0,51
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	1	-0,01
VC-115	46	0,7	0,03	0,97	1	0,97
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	9	-0,07
VC-116	9,55	0,5	0,03	0,14	1	0,14

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	1	-0,01
VC-116A	14,5	0,5	0,03	0,22	1	0,22
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	4	-0,03
VC-116B	19	0,9	0,03	0,51	1	0,51
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	2	-0,02
VC-117	46,05	0,5	0,03	0,69	1	0,69
DESCUENTO DE INTERSECCIONES ENTRE VIGAS	0,5	0,5	0,03	-0,01	9	-0,07
VC-118	6,3	0,5	0,03	0,09	1	0,09
VC-120	27	0,75	0,03	0,61	1	0,61
VC-121	15,98	0,55	0,03	0,26	1	0,26
PATIO EDIFICIO SALONES	16,4	9,96	0,05	8,17	1	8,17
DESCUENTO INTERSECCION VC 105; 106; 107; 108	9,98	0,5	0,03	-0,15	4	-5,99
DESCUENTO INTERSECCION VC 115	16,45	0,5	0,03	-0,25	1	-2,47
TOTAL EDIFICIO SALONES V(m³)						13,51
TOTAL BASE EN CONCRETO POBRE 1500PSI V(m³)						49,67

Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente Interventoría**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	
				X	**NO**		

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

PLAZOLETA

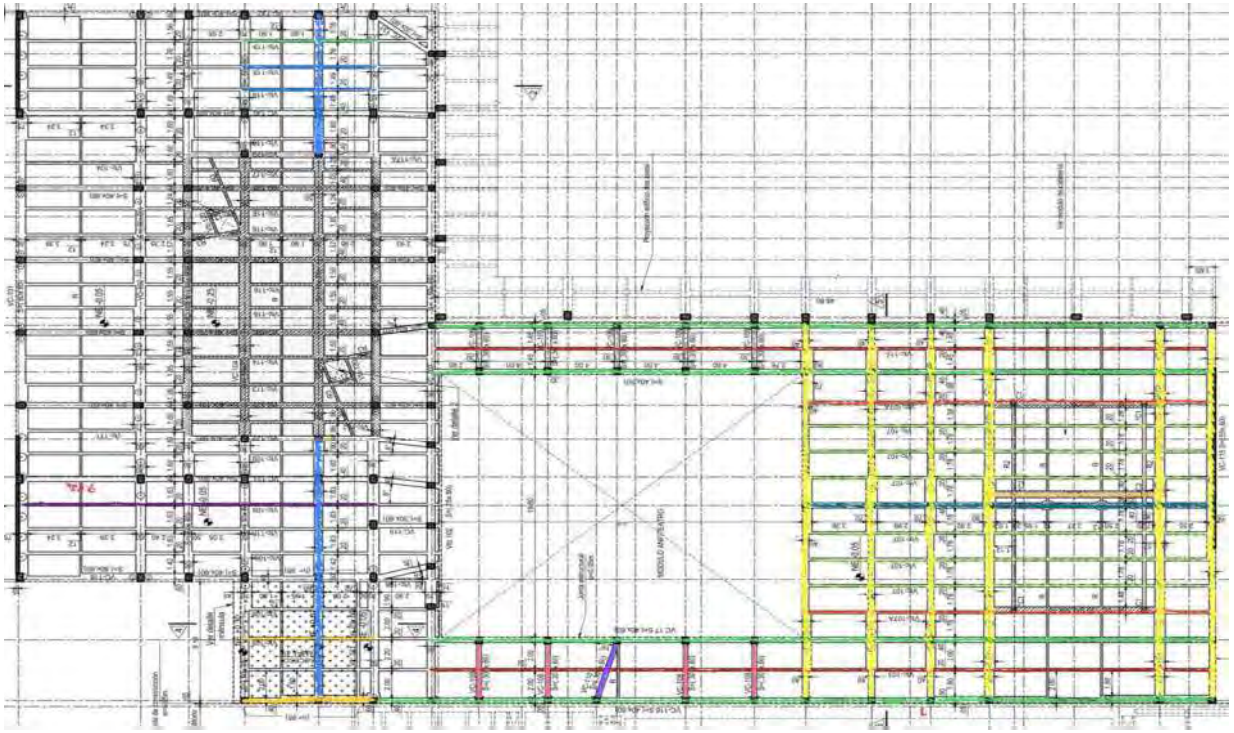





CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

AULA POLIVALENTE

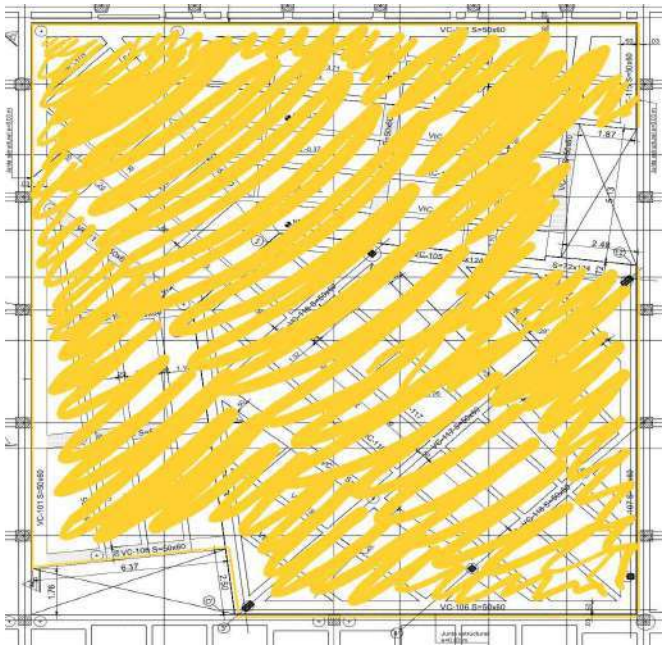

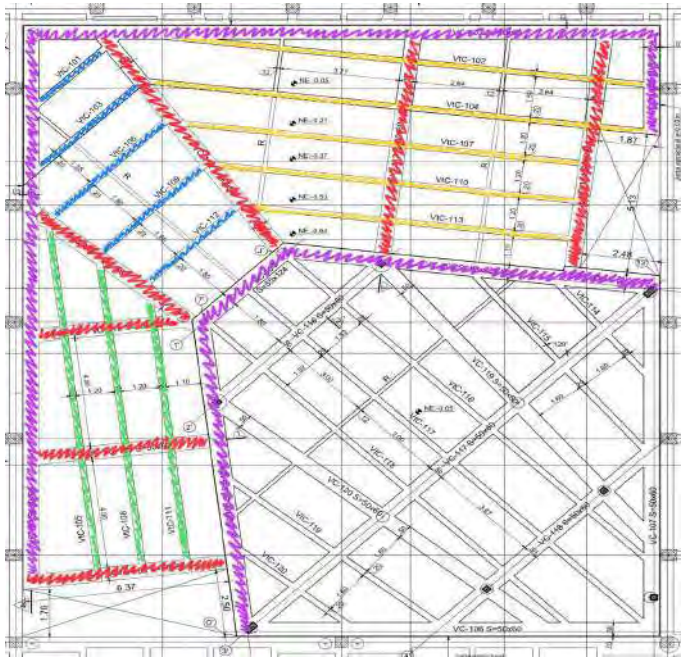


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI**		
ÍTEM	**2.1.10**	**UNIDAD**	**M³**				

EDIFICIO SALONES

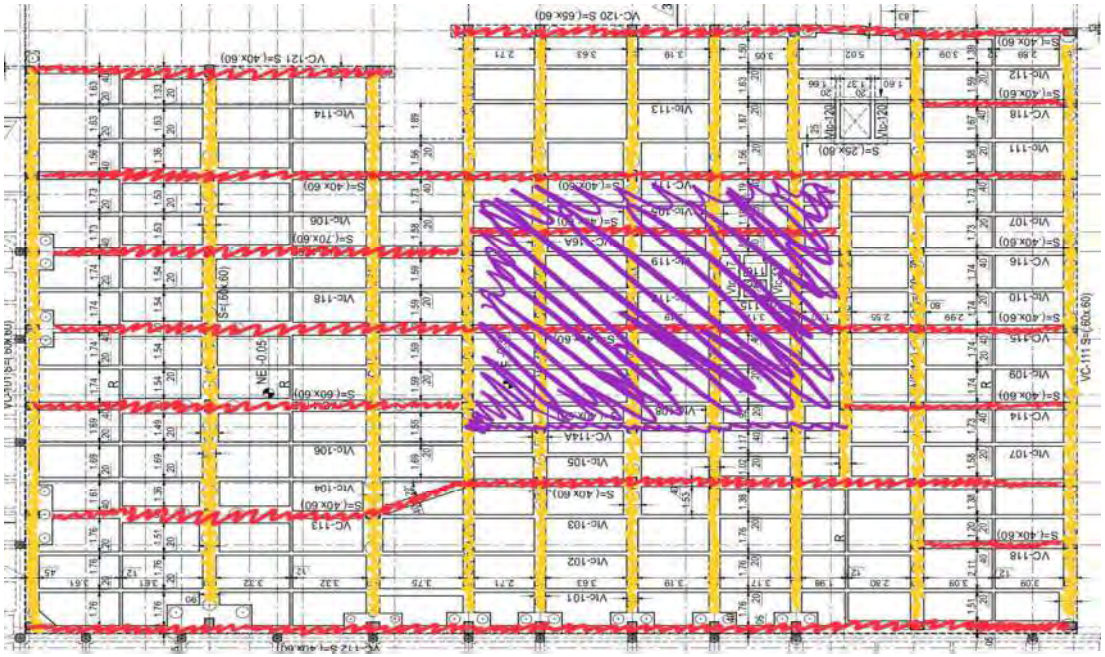



NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE:

INTERVENTORIA

NOMBRE:

Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023

INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES

IN-CA2023-5347795


Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO F'c 35MPa, H=2 a 4m**		
ÍTEM	**2.3.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
PLAZOLETA (MURO DE CONTENCION 1) EJE A; 21-23	6,76	0,2	3,84	5,19	1	5,19
TOTAL V(m³)						5,19

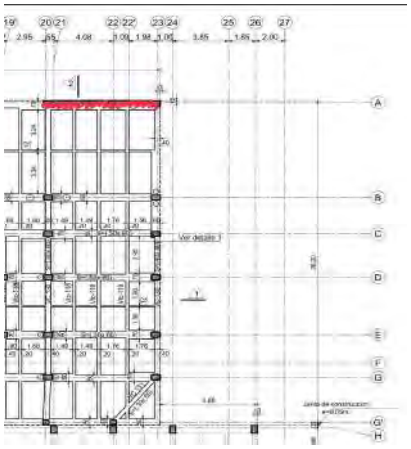







Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

NOMBRE: JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

NOMBRE:
Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA GRADERÍAS DE F'c 28MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

AULA POLIVALENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
VC-101	20,77	0,5	0,60	6,23	1	6,23
VC-102	19,74	0,5	0,60	5,92	1	5,92
VC-108	6,37	0,5	0,60	1,91	1	1,91
VC-109	5,34	0,5	0,60	1,60	1	1,60
VC-110	4,32	0,5	0,60	1,30	1	1,30
VC-111	6,32	0,5	0,60	1,90	1	1,90
VC-112	9,56	0,5	0,60	2,87	1	2,87
VC-113	7,95	0,5	0,60	2,39	1	2,39
VC-114	8,59	0,5	0,60	2,58	1	2,58
VC-115	3,5	0,5	0,60	1,05	1	1,05
VTC-101	2,92	0,2	0,60	0,35	1	0,35
VTC-102	12,93	0,2	0,60	1,55	1	1,55
VTC-103	5,3	0,2	0,60	0,64	1	0,64
VTC-104	12,79	0,2	0,60	1,53	1	1,53
VTC-105	11,49	0,2	0,60	1,38	1	1,38
VTC-106	4,87	0,2	0,60	0,58	1	0,58
VTC-107	12,2	0,2	0,60	1,46	1	1,46
VTC-108	10	0,2	0,60	1,20	1	1,20
VTC-109	4,38	0,2	0,60	0,53	1	0,53
VTC-110	11,14	0,2	0,60	1,34	1	1,34

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA GRADERÍAS DE F'c 28MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				


ACTIVIDADES-CONTRACTUALES						
VTC-111	9,64	0,2	0,60	1,16	1	1,16
VTC-112	3,89	0,2	0,60	0,47	1	0,47
VTC-113	9,07	0,2	0,60	1,09	1	1,09
AREA PLACA	158,83		0,15	23,82	1	23,82
RIOSTRAS R.1	8,76	0,12	0,60	0,63	1	0,63
RIOSTRAS R.2	6,15	0,12	0,60	0,44	1	0,44
RIOSTRAS R.3	8,27	0,12	0,60	0,60	1	0,60
VC-103	11,74	0,5	1,24	7,28	1	7,28
VC-104	4,01	0,5	1,24	2,49	1	2,49
VC-105	11,89	0,5	1,24	7,37	1	7,37
TOTAL V(m³)						83,64

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO PARA GRADERÍAS DE F'c 28MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

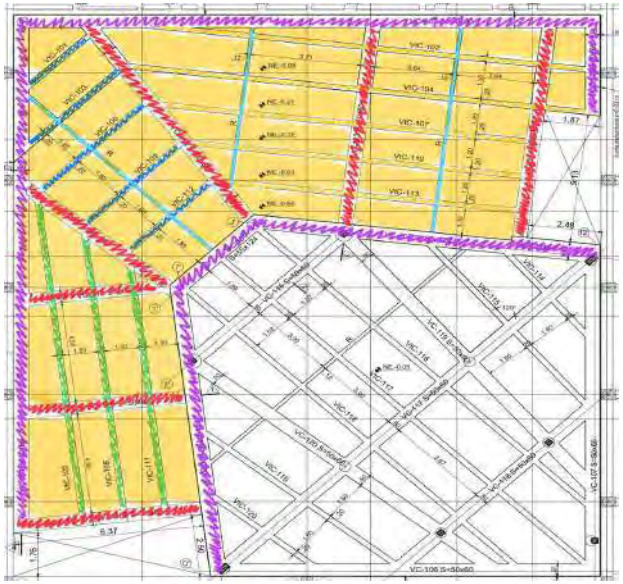



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría			
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
				X		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO MURO FACHADAS E=0.12m F'c=21MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

AUDITORIO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD (UN)	V total (m³)
	DIÁMETRO (m)	PESO (kg)	ALTURA (m)	VOL (m³)		
MURO FACHADA EJES B-F; 1	0,4	0,12	2,95	0,14	1	0,14
COLUMNAS MURO FACHADA EJE B-F; 1	0,25	0,13	2,95	0,10	5	0,48
DESCUENTO VANO PUERTA 1	2,2	0,12	2,57	-0,68	1	-0,68
DESCUENTO VANO PUERTA 2	1,87	0,12	2,35	-0,53	1	-0,53
MURO FACHADA EJE L-Z; 1	44,63	0,12	3,84	20,57	1	20,57
DESCUENTO VANO	13,1	0,12	3,84	-6,04	1	-6,04
TOTAL V(m³)						13,94


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO MURO FACHADAS E=0.12m F'c=21MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

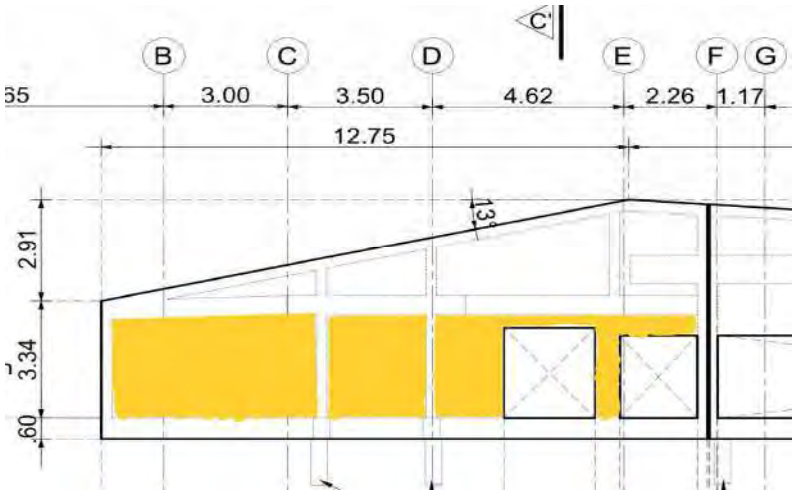



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	RELLENOS, BASES Y CONCRETOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO MURO FACHADAS E=0.12m F'c=21MPa**		
ÍTEM	**2.6.1**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS





NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

NOMBRE: JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

NOMBRE: Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL							
Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	ACERO ESTRUCTURAL	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.**		
ÍTEM	**3.1.1**	**UNIDAD**	**KG**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD (UN)	No. CARTILLA DESPIECE	PESO TOTAL (kg)
	DIÁMETRO (m)	PESO (kg)			
EDIFICIO SALONES PILOTES	0,4	92,19	40	1	3687,60
	0,5	119,21	33	1	3933,93
PESO TOTAL PILOTES (kg)					7621,53

LOCALIZACIÓN	PESO (kg)	No. CARTILLA DESPIECE	PESO TOTAL (kg)
DADOS AUDITORIO	1801,23	2	1801,23
COLUMNAS AUDITORIO	9581,91	3	9581,91
MURO CONTENCION TIPO 1 EJE F; 1-5	1410,4	2	1410,40
MURO FACHADA EJE F-Z; 1	842,16	4	842,16
VIGAS PLAZOLETA	32851,17	5	32851,17
RIOSTRAS PLAZOELTA	651,08	5	651,08
COLUMNAS PLAZOLETA	39072,47	6	39072,47
VIGAS RAMPA PEATONAL	3269,27	7	3269,27
VIGAS AULA POLIVALENTE	7636,55	8	7636,55
PESO TOTAL ESTRUCTURAS CIMENTACION (kg)			97116,24

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	ACERO ESTRUCTURAL	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.**		
ÍTEM	**3.1.1**	**UNIDAD**	**KG**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**PESO POR METRO CUADRADO (kg/m²)**	**PESO TOTAL (kg)**
	ÁREA PLACA (m²)	**ÁREA ZONAS COMUNES (m²)**	**DIFERENCIA ENTRE ÁREA PLACA Y ZONAS COMUNES (m²)**		
PARILLA 3/8 AUDITORIO	1873,98	345,35	1528,63	11,17	-94,8
PARILLA 3/8 PLAZOLETA	2192,13	345,24	1846,89	11,17	20629,76
PARILLA 3/8 AULA POLIVALENTE ZONA GRADERÍAS	228,63	-	-	11,17	2553,80
PARILLA 3/8 AULA POLIVALENTE ZONA PLATAFORMA	190,66	-	-	11,17	2129,67
TOTAL PESO PARILLA 3/8" (kg)					25218,43
TOTAL V(m³)					129956,20







Criterios	**Residente Contratista**		**VoBo Residente**				
	Fecha	**Firma**	**Fecha**	**Cumple**		**Observaciones**	
				SI	**NO**		

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	ACERO ESTRUCTURAL	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.**		
ÍTEM	**3.1.2**	**UNIDAD**	**KG**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		ÁREA PLACA ZONA HÚMEDA (m²)	ÁREA ÚTIL MALLA (m²)	PESO UNIDAD DE MALLA (kg)	CANTIDAD DE UNIDADES DE MALLA (UN)	MALLAS POR PLACA (UN)	TOTAL MALLAS ÁREA (UN)	PESO TOTAL (kg)
	LARGO (m)	ANCHO (M)							
AUDITORIO EJE G-J; 2-5 (M-295)	8,5	23,1	196,35	11,685	65,9	17	2	34	2240,60
	6,45	23,1	148,995	11,685	65,9	13	2	26	1713,40
PLAZOLETA EJE O-S; 5-12 (M-295)	11,7	4,4	51,48	11,685	65,9	4	2	8	527,20
	6	4,1	24,6	11,685	65,9	2	2	4	263,60
PLAZOLETA EJE A-D; 9-12 (M-295)	6,45	17,4	112,23	11,685	65,9	10	2	20	1318,00
	2,5	6	15	11,685	65,9	1	2	2	131,80
PLAZOLETA EJE V-Y; 7-13 (M-295)	4,4	17,4	76,56	11,685	65,9	7	2	14	922,60
AUDITORIO MALLA MURO EJE F-Z; 1 (M-257)	44,63	3,84	121,0792	11,685	57,4	10	2	20	1148,00
PESO TOTAL MALLA ELECTROSOLDADA (kg)									8265,20


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	ACERO ESTRUCTURAL	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.**		
ÍTEM	**3.1.2**	**UNIDAD**	**KG**				

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

AUDITORIO

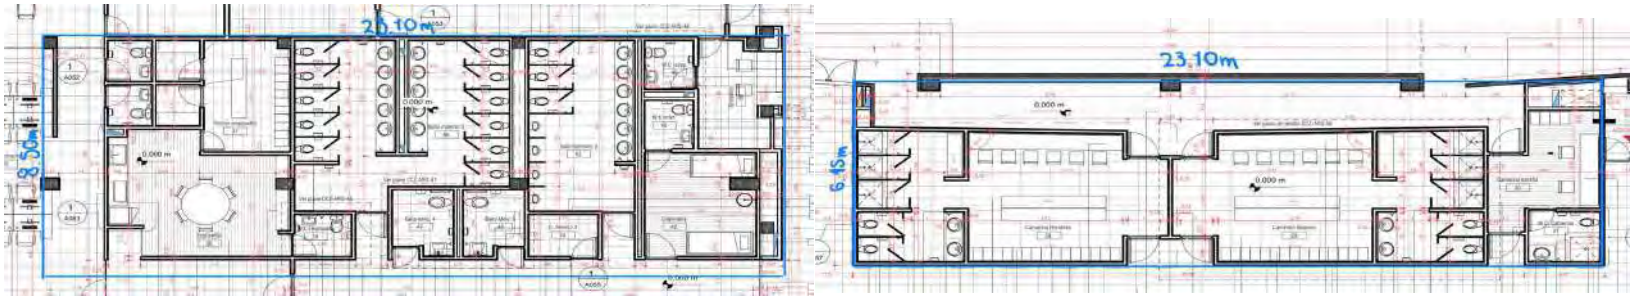

PLAZOLETA



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				Firma
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		MARTINEZ

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nª DE HOJA:**	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	**ELABORO:**	TOPOGRAFIA C.A.2024
LOCALIZACION:	FASE 1	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED SANITARIA																
CJ-13	BJ	AULAS	2,40	2,5%	2	2593,260	2593,260	2592,977	2592,918	0,25	0,43	0,49	0,46	0,28	0,06	0,21
CJ-4	CJ-3	AULAS	1,77	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,062	2593,042	0,30	0,40	0,42	0,41	0,22	0,05	0,15
CJ-3	C2"	AULAS	5,30	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,255	2593,207	0,30	0,21	0,25	0,23	0,37	0,16	0,17
CJ-3	C2"	AULAS	1,53	1,0%	3	2593,260	2593,260	2593,270	2593,255	0,28	0,17	0,18	0,17	0,07	0,04	0,02
CJ-3	C2"	AULAS	1,65	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,285	2593,270	0,25	0,13	0,14	0,13	0,06	0,04	0,01
CJ-3	C2"	AULAS	0,35	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,253	2593,250	0,25	0,16	0,16	0,16	0,01	0,01	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,22	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,262	2593,260	0,25	0,15	0,15	0,15	0,01	0,01	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,19	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,267	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,14	0,01	0,00	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,12	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,266	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	4,65	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,245	2593,205	0,30	0,22	0,26	0,24	0,33	0,14	0,15
CJ-3	C2"	AULAS	4,60	0,4%	2	2593,260	2593,260	2593,265	2593,245	0,25	0,15	0,17	0,16	0,18	0,12	0,05
CJ-3	C2"	AULAS	0,80	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,272	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,14	0,03	0,02	0,01
CJ-3	C2"	AULAS	0,80	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,273	2593,264	0,25	0,14	0,15	0,14	0,03	0,02	0,01
CJ-3	C4"	AULAS	5,40	0,7%	4	2593,260	2593,260	2593,244	2593,205	0,30	0,22	0,26	0,24	0,39	0,16	0,18
CJ-3	C4"	AULAS	2,00	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,260	2593,244	0,28	0,18	0,19	0,18	0,10	0,06	0,04
CJ-3	C4"	AULAS	0,30	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,263	2593,260	0,25	0,15	0,15	0,15	0,01	0,01	0,00
CJ-3	CJ 2	AULAS	3,20	1,2%	2	2593,260	2593,260	2593,136	2593,097	0,25	0,27	0,31	0,29	0,24	0,08	0,15
CJ-2	CJ-1	AULAS	3,61	0,7%	4	2593,260	2593,260	2593,175	2593,151	0,30	0,29	0,31	0,30	0,33	0,11	0,19
CJ-1	C2"	AULAS	1,80	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,170	2593,151	0,28	0,27	0,29	0,28	0,14	0,05	0,08
CJ-1	C2"	AULAS	2,27	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,192	2593,170	0,25	0,22	0,24	0,23	0,13	0,06	0,07
CJ-1	C2"	AULAS	4,88	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,201	2593,151	0,30	0,26	0,31	0,29	0,42	0,15	0,23
CJ-1	C2"	AULAS	1,20	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,212	2593,201	0,30	0,25	0,26	0,26	0,09	0,04	0,05
CJ-1	C2"	AULAS	2,40	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,212	2593,193	0,28	0,22	0,24	0,23	0,15	0,07	0,08
CJ-1	C2"	AULAS	1,67	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,230	2593,212	0,25	0,18	0,20	0,19	0,08	0,04	0,03
CJ-1	C2"	AULAS	0,25	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,202	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01
CJ-1	C2"	AULAS	0,12	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00
CJ-1	C2"	AULAS	0,08	1,3%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
CJ-1	C2"	AULAS	0,15	0,7%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00
CJ-1	BJ	AULAS	1,50	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,208	2593,193	0,30	0,25	0,27	0,26	0,12	0,05	0,06
CJ-17	C2"	AULAS	2,80	0,9%	3	2593,260	2593,260	2593,189	2593,164	0,28	0,25	0,27	0,26	0,20	0,08	0,11
CJ-17	C2"	AULAS	0,35	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,193	2593,189	0,28	0,24	0,25	0,25	0,02	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,40	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,193	2593,190	0,28	0,24	0,25	0,24	0,03	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,40	1,0%	3	2593,260	2593,260	2593,196	2593,192	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,45	0,9%	3	2593,260	2593,260	2593,197	2593,193	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,02
CJ-17	C2"	AULAS	0,45	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,200	2593,195	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,02
													TOTAL	4,16	1,68	2,15

TUBERIA SN	
2"	19,85
3"	12,58
4"	28,31

TUBERIA PL	
2"	
3"	
4"	

FILTROS	
LONG	0,00

TOPOGRAFO CONTRATISTA	RESIDENTE CONTRATISTA	TOPOGRAFO INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA


	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nª DE HOJA:**	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	**LOCALIZACION:**	Auditorio y Tanque
LOCALIZACION:	FILTROS	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	LONG FILTRO	RECEBO
FILTRO PERIMETRAL																	
Y	CAJA	FILTRO	19,51	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,988	2593,090	0,30	0,47	0,37	0,42	2,49		19,51	0,72
CAJA	TAPON	FILTRO	23,40	0,4%	4	2593,260	2593,260	2593,091	2593,196	0,30	0,37	0,27	0,32	2,24		23,40	0,13
TAPON	RAMPA	FILTRO	20,70	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,990	2593,090	0,30	0,47	0,37	0,42	2,63		20,70	0,76
RED SANITARIA																	
										TOTAL					0,00	63,61	1,60

FILTROS	
LONG	63,61

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00

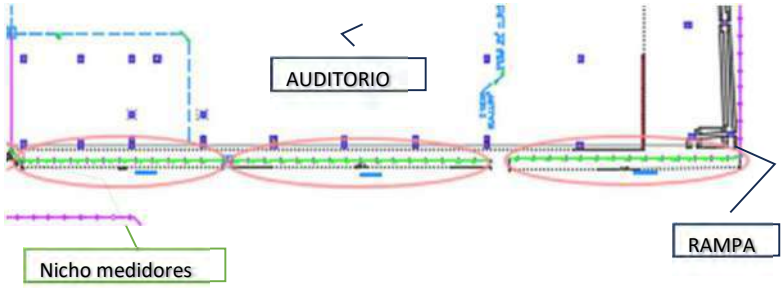

TOPOGRAFO CONTRATISTA	RESIDENTE CONTRATISTA	TOPOGRAFO INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA


	CONTROL DE CALIDAD				
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES				
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural		**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024	
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa		**Nª DE HOJA:**	1 DE 1	
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023		**LOCALIZACION:**	Auditorio y Tanque	
LOCALIZACION:	FASE 1		**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira	

REDES										**CANTIDADES**							
CAJA	**CAJA**	**AREA**	**LONG TRAMO**	**PENDIENTE**	**DIAMETRO "**	**COTA RASANTE**		**COTA Llomo**		**EXCAVACION**					**RELLENO**		
						INICIAL	**FINAL**	**INCIAL**	**FINAL**	**BD**	**H. EXC**		**PROM**	**EXCAV.**	**ARENA**	**LONG FILTRO**	**RECEBO**
RED PLUVIAL																	
F1	CJ-10	FILTRO	16,32	0,6%	4	2593,260	2593,260	2592,803	2592,903	0,30	0,66	0,56	0,61	3,00		16,32	1,51
F2	CJ-12	FILTRO	6,00	0,5%	4	2593,260	2593,260	2593,108	2593,138	0,30	0,35	0,32	0,34	0,61		6,00	0,07
RED SANITARIA																	
										TOTAL					**0,00**	**22,32**	**1,58**

FILTROS	
LONG	22,32

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00

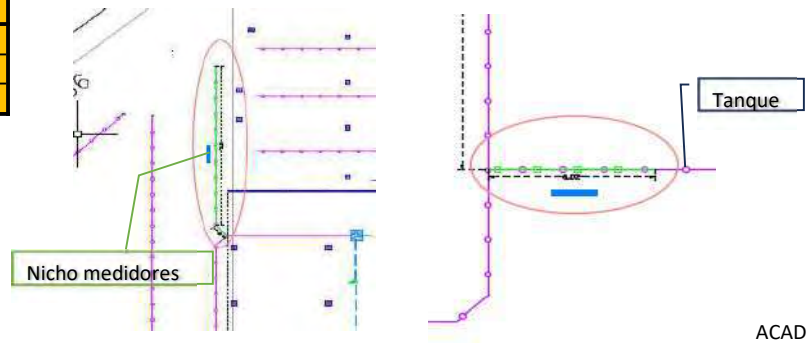

ACAD

TOPOGRAFO CONTRATISTA	**RESIDENTE CONTRATISTA**	**TOPOGRAFO INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nª DE HOJA:**	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	CONTIENE:	Redes Hidrosanitarias
LOCALIZACION:	FASE 1	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES										**CANTIDADES**						
CAJA	**CAJA**	**AREA**	**LONG TRAMO**	**PENDIENTE**	**DIAMETRO "**	**COTA RASANTE**		**COTA Llomo**		**EXCAVACION**				**RELLENO**		
						INICIAL	**FINAL**	**INCIAL**	**FINAL**	**BD**	**H. EXC**	**PROM**	**EXCAV.**	**ARENA**	**LONG FILTRO**	**RECEBO**
RED PLUVIAL																
CJ 16	EJE 27-X	FILTRO	27,05	0,5%	4	2593,260	2593,260	2593,290	2593,426	0,30	0,17	0,04	0,10	0,85		27,05	
CJ 12	RAMPA	FILTRO	20,00	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,290	2592,392	0,30	1,17	1,07	1,12	6,76		20,00	4,92
RED SANITARIA																
										TOTAL			**7,60**	**0,00**	**47,05**	**4,92**

FILTROS	
LONG	47,05

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA

TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

RESIDENTE
INTERVENTORIA


	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES ACUEDUCTO		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nª DE HOJA:**	**1 DE 1**
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	**ELABORO:**	**TOPOGRAFIA C.A 2024**
LOCALIZACION:	FASE 1	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES

IDENTIFICACION	LONGITUD	DIAMETRO	ACCESORIOS				DETALLE
			CODO	BUJE	TEE	REGISTRO	
PLAZOLETA	2,3	3"	1		1		
PLAZOLETA	39,9	3"			2		
PLAZOLETA	10,4	3"			2		




TUBERIA AP			CODO	BUJE	TEE	REGISTRO
1 1/2"						
1/2"						
2						
3	**52,6**		**1**	**0**	**5**	**0**
3/4"						



TOPOGRAFO
CONTRATISTA



RESIDENTE
CONTRATISTA



TOPOGRAFO
INTERVENTORIA




RESIDENTE
INTERVENTORIA

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES ACUEDUCTO		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nº DE HOJA:**	**1 DE 1**
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	**ELABORO:**	**TOPOGRAFIA C.A 2024**
LOCALIZACION:	FASE 1	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES

IDENTIFICACION	LONGITUD	DIAMETRO	ACCESORIOS				DETALLE
			CODO	BUJE	TEE	REGISTRO	
CALIENTE	2,9	3/4"					
CALIENTE	19	3/4"					
CALIENTE	1,8	1"					
CALIENTE	6,6	1					
CALIENTE	5	1					
CALIENTE	3,1	3/4"					
CALIENTE	3,38	3/4"					
CALIENTE	2,68	3/4"					
CALIENTE	1,8	3/4"					
CALIENTE	3,25	3/4"					
CALIENTE	1,42	3/4"					
FRIA	0,53	1 1/2"					
FRIA	0,87	1 1/2"					
FRIA	2,24	1 1/2"					
FRIA	1,8	2					
CALIENTE	8,5	3/4"					
CALIENTE	2,45	3/4"					
CALIENTE	2	3/4"					
FRIA	1,55	2					
FRIA	2,85	2					
FRIA	1,8	3/4"					
FRIA	4,84	2					
FRIA	2,5	1 1/2"					
FRIA	2,89	2					
FRIA	4,15	3/4"					
FRIA	2,94	2					
FRIA	2,15	3/4"					
FRIA	3,23	2					
FRIA	0,62	2					
FRIA	2,7	1 1/2"					
FRIA	1,8	3/4"					
FRIA	1,9	3/4"					
FRIA	3,46	2					
FRIA	1,55	2					
FRIA	0,8	2					
FRIA	1,45	2					
FRIA	1,7	2					
FRIA	1,8	2					
FRIA	2,2	3/4"					
FRIA	1,9	1/2"					
FRIA	1,97	1/2"					
FRIA	2,8	1/2"					
	3,75	3/4"					
FRIA	2,85	3/4"					
FRIA	2,17	2					
FRIA	3,15	3/4"					
FRIA	2,53	2					
FRIA	5,14	1 1/2"					
FRIA	1,5	2 1/2"					
FRIA	2,6	2					
FRIA	2,12	1					
FRIA	0,45	1/2"					
FRIA	0,64	3/4"					
FRIA	2,34	3/4"					
FRIA	1,35	3/4"					
FRIA	3,12	2					
FRIA	1,35	2					
FRIA	1,42	3/4"					
FRIA	1,35	3/4"					
FRIA	2,31	3/4"					

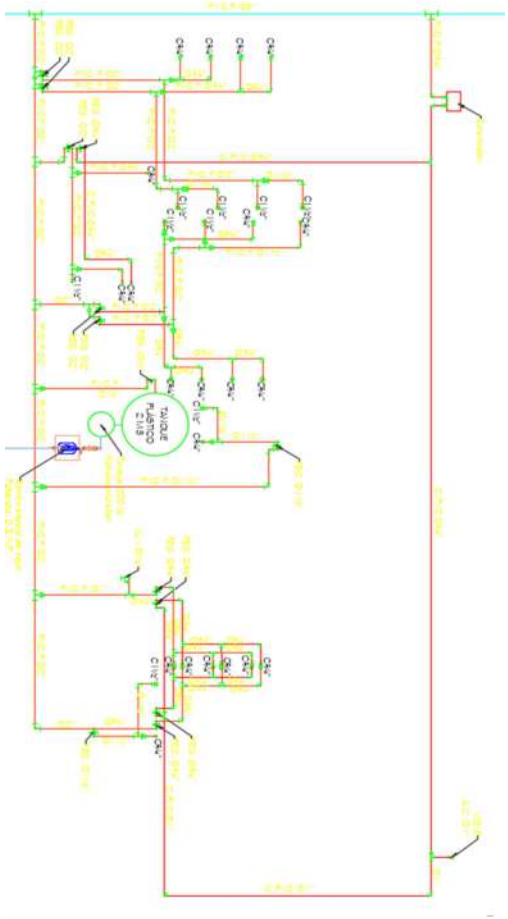

TUBERIA AP	
1"	**15,52**
1 1/2"	**15,48**
1/2"	**7,12**
2	**43,25**
3/4"	**83,64**

CODO	BUJE	TEE	REGISTRO
			3

TOPOGRAFO
CONTRATISTA

RESIDENTE
CONTRATISTA


TOPOGRAFO
INTERVENTORIA

RESIDENTE
INTERVENTORIA

	CONTROL DE CALIDAD		
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES ACUEDUCTO		
CONTRATO DE OBRA:	Construccion Centro Cultural	**FECHA:**	miércoles, 4 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	**Nº DE HOJA:**	**1 DE 1**
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	**ELABORO:**	**TOPOGRAFIA C.A 2024**
LOCALIZACION:	FASE 1	**CLIENTE:**	Municipio de Zipaquira

REDES

IDENTIFICACION	LONGITUD	DIAMETRO	ACCESORIOS				DETALLE
			CODO	BUJE	TEE	REGISTRO	
POTABLE	0,84	3"	1				
POTABLE	5,34	3"	1		3	1	
POTABLE	6,29	3"	1		2		
POTABLE	2,95	3"			1		

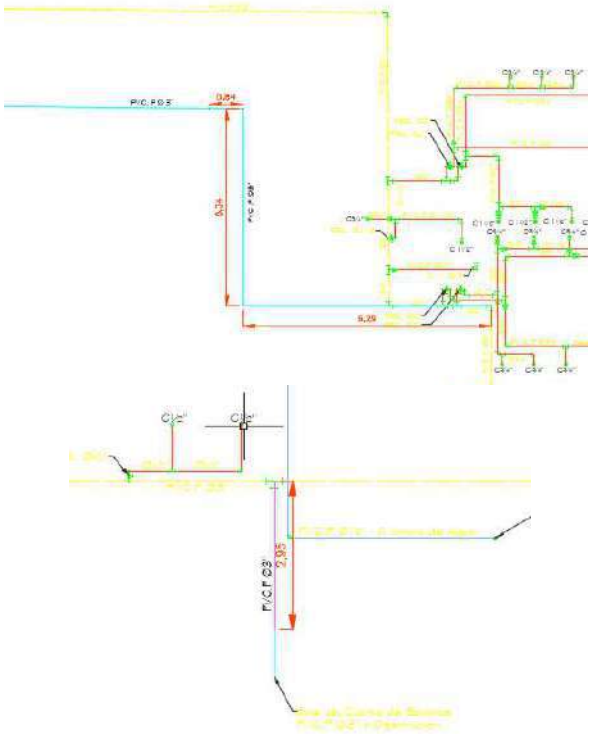

TUBERIA AP			CODO	BUJE	TEE	REGISTRO
3"	15,42		3	0	6	1

TOPOGRAFO CONTRATISTA	RESIDENTE CONTRATISTA	TOPOGRAFO INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	NO PREVISTOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**PLACA DE CIMENTACION ALIGERADA H=60CM CONCRETO 28MPA INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION**		
ÍTEM	**NP-01**	**UNIDAD**	**M²**				


ACTIVIDADES-CONTRACTUALES


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		TOTAL M²
	LARGO (m)	ANCHO (m)	
PLAZOLETA (1)	12,55	9,19	115,33
PLAZOLETA (2)	43	26,2	1126,60
PLAZOLETA (3)	28,7	48,8	1400,56
DESCUENTO DE ZONA AULA POLIVALENTE (4)	22,56	19,8	-446,69
ÁREA AULA POLIVALENTE (DETERMINADA POR PLANO .DWG)	175,31		175,31
SALONES (5)	13,62	32,11	437,34
DESCUENTA DE ZONA FOSO ASCENSOR (6)	1,85	1,37	-2,53
TOTAL CONCRETO PLACA DE CIMENTACIÓN			2805,92

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

PLAZOLETA

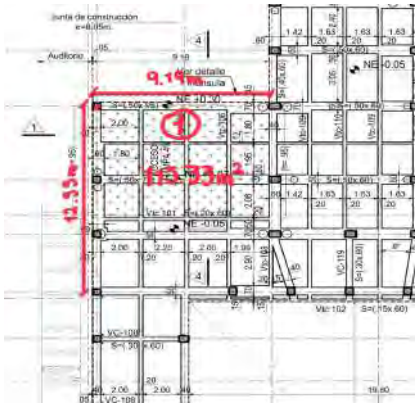

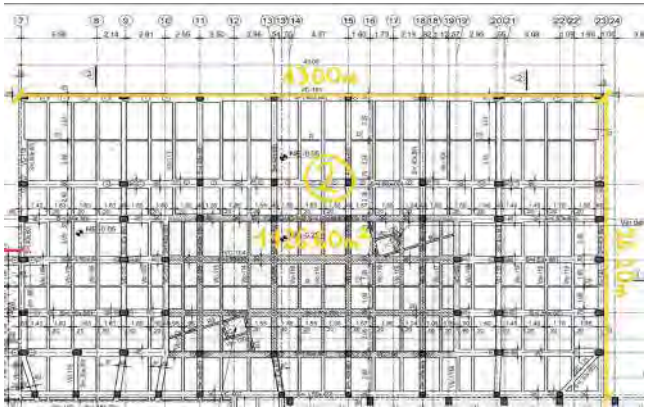

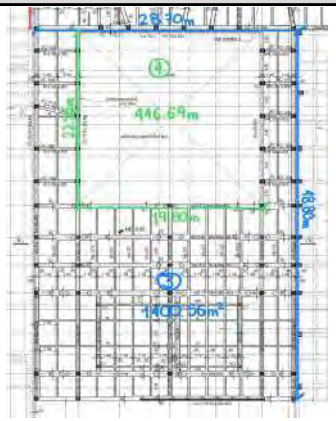

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría			
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones
				X	NO	

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	NO PREVISTOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**PLACA DE CIMENTACION ALIGERADA H=60CM CONCRETO 28MPA INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION**		
ÍTEM	**NP-01**	**UNIDAD**	**M²**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

AULA POLIVALENTE Y SALONES

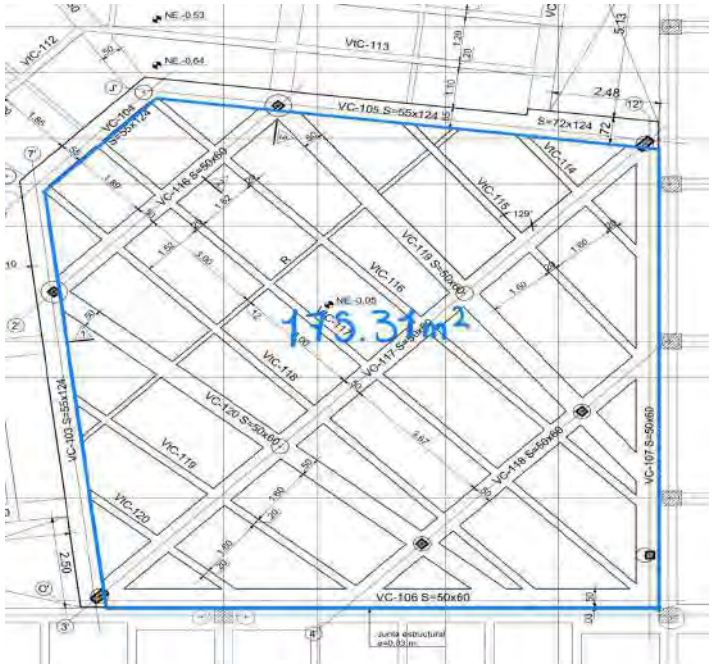



NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

NOMBRE: JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

NOMBRE: Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	NO PREVISTOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)**		
ÍTEM	**NP-02**	**UNIDAD**	**ML**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD (UND)	TOTAL METROS LINEALES (ML)
	DIÁMETRO (m)	LONGITUD (m)		
EDIFICIO DE SALONES	0.4	20	40	800.00
METROS LÍNEALES TOTALES (ML)				800.00

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS

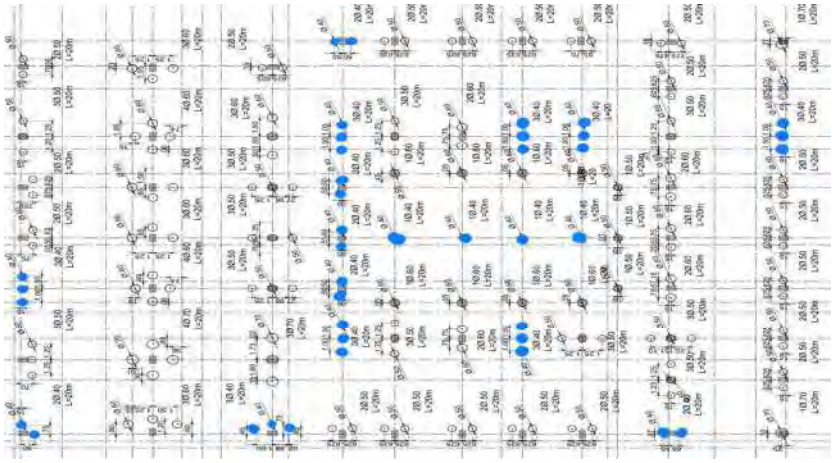



Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				Firma
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				X	NO		
REFERENCIAS -							

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE:

INTERVENTORIA

NOMBRE: Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795 Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL


Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	NO PREVISTOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM CON CONCRETO 4000PSI (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)**		
ÍTEM	**NP-03**	**UNIDAD**	**ML**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD (UND)	TOTAL METROS LINEALES (ML)
	DIÁMETRO (m)	LONGITUD (m)		
EDIFICIO DE SALONES	0.5	20	33	660.00
METROS LÍNEALES TOTALES (ML)				660.00

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS



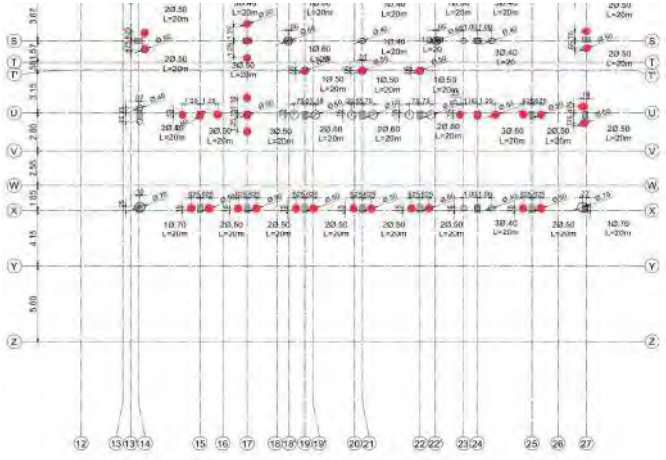

Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				SI	NO		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

CONTRATISTA

NOMBRE: JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

NOMBRE: Wilson Fernando Martínez Quintero

CONSORCIO ARTES 2023	INSPECCIÓN INTERNA - LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	IN-CA2023-5347795
		Versión No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONEZ ZIPAQUIRA						
Contratista:	CONSORCIO CMCZ	**Contrato de Obra**	CO1.PCCNTR.5055621	**Interventoría:**	Consorcio artes 2023	**Contrato de Interventoria**	CO1.PCCNTR.5347795
ACTA PARCIAL No.	**2**	**CAPÍTULO**	NO PREVISTOS	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**CONCRETO TREMIE 4000 PSI GRAVILLA FINA, 10PULG DE ASENTAMIENTO (EXPANSION PILOTES)**		
ÍTEM	**NP-06**	**UNIDAD**	**M³**				

ACTIVIDADES-CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN (m³)	CANTIDAD	TOTAL M³ (EXP 16.85%)
	DIÁMETRO (m)	ÁREA (m²)	LONGITUD (m)			
EDIFICIO DE SALONES	0.4	0.13	20	2.51	40.00	100.53
EDIFICIO DE SALONES	0.5	0.20	20	3.93	33.00	129.59
TOTAL M³ (EXP 16.85%)						230.12

REFERENCIAS - ESQUEMAS - CARTERAS - OTROS






Criterios	Residente Contratista		VoBo Residente Interventoría				
	Fecha	Firma	Fecha	Cumple		Observaciones	
				SI	NO		

NOTA: La firma de la persona encargada de cerrar la N.C. al igual que la fecha de cierre se deben diligenciar únicamente cuando se verifique que efectivamente el tratamiento dado garantiza el cumplimiento a satisfacción de la variable inspeccionada.

JAIME MADERO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	N°
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
1.	29 Noviembre 2023	9:30	11:00.	Centro Cultural.
Objeto de la reunión:	Seguimiento contrato de obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	COL-PCCNTR-5055621	
Objeto del Contrato de obra	Construccion centro cultural y de convenciones tipo de artistas del municipio de zipaquira.	
Contratista de obra	Consorcio Mego construcciones zipa.	

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Siendo 29 de noviembre se encuentra en el campamento de obra en una mesa de trabajo lo consultorio del proyecto, contratista de obra e interventoria, con el fin de socializar y aclarar temas a tratar en lo siguiente acta:	
• El topografo de obra indica que al realizar el levantamiento topografico, en el cual tambien indico que ha realizado esta actividad en retirados ocasiones y que se genero el mismo error, el topografo indico que tomo como eje existente la cerca que se encuentra en el lindero del lote, cuando el tomo sus datos y al ubicar los puntos de localizacion del proyecto se presento que los aislamientos No se encuentran cumpliendo,	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

• La consultaria indica que la implantación que realizaron en la consultoria se realizo en compañía de planeación y por ende indica que la cerca NO se tomo como eje en el levantamiento inicial ya que como se dondo inicialmente los puntos de referencia de diseño fueron indicados por planeación. • Por parte de la secretaria de obras publicas se acuerdo que se deben respetar los anchos de aislamiento y todos los partes se encuentran de acuerdo. • El secretario de obras publicas manifiesta que a la fecha NO se encuentra estipulado y reglamentado al perfil vial y los aislamientos del acceder la traquita. • El secretario de obras publicas indica que para la solución de la situacion que se esta presentando se debe realizar una mesa de trabajo con el departamento de planeación. • La consultoria indica que el lindero que se tomo inicialmente fue dado por planeacion y que a la fecha se hace un supuesto de la proyeccion de la via Alameda del zipa, y que al hacer todos los diseños del centro cultural NO se tuvo en cuenta el eje de la via, sino el lindero que le indicaron en su momento, por ende tambien ata que se encuentra un plano firmado sellado y aprobado ~~para~~ que se presento para la licencia de construcción. y la misma fue otorgada. • El ~~consu~~ constructor indica que el pantano se encuentra con una diferencia de 6cm con la rasante de la via y por lo tanto propone que la rasante del proyecto sea elevando 20 cm. • El consultor indica que de acuerdo a lo propuesto realizado por el constructor se puede viabilizar, pero el se llego a presentar un acta con esto, este debe ser asumido por el constructor.	

• El consulto lo indico al contratista que la propuesta al ser un proceso ~~dda~~ constructivo, debe ser presentado y sustentado a lo interventoria, con el fin de entrar con los actividades.	
• El contratista solicito a la consultoria le sea entregado un documento formal (plano) georeferenciado, con coordenadas para que posteriormente se realice la verificación en terreno y de igual forma continuar con las actividades, para la coordinacion de la información se establece reunion el dia 04 de Diciembre de 2023, en la cual se deben presentar obra, consultoria, escenario de obras publicos e interventoria. 9:00 a.m en el predio sol canto colonial.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Wilson Fernando Martinez Quintero
Cargo: Residente de Interventoria

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ivan Posada/ Sindy Pinilla	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SS / AG/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
WILSON MARTINEZ	INTER	C. Cultural		3114777977	
LYDA M. ESTUPIÑAN	INTER.	C. CULTURAL	LPEQ.LYDA@GMAIL.COM	3108521462	
Maribel Caballero	Top. Inter.	C. Cultural	maribeltopografia@gmail.com	3103335673	
Sergio A Ramirez	Arq. Diseñador (contrato)	consorcio Arquitectura centro cultural	Centrocultural.zipaquira@g...	3017131544	
Juan Gonzalez	Diseñador Arq.	consorcio Arquitectura centro cultural	centro cultural zipaquira@gmail.com	3143335551	
DANIEL RODRIGUEZ	DISEÑADOR ARC.	CONSORCIO ARQUIT.	centro cultural.zipaquira@g...	3133543940	
DANIEL HUERTAS SENOSIAIN	AUX. ADMINISTRATIVO	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES	d.huertas@megamark.com	3108194140	
Edward A Diaz C.	Topografo Contrato	Consorcio Megaconstrucciones	eduard3023@gmail.com	3183375923	
Guillermo Noriega	Direct. Consultoria	serviciosnor@gmail.com	Consultoria	3207355893	
Fdo. Forero T.	S. Obra publica	Ing. Residente Obra		311-491-200	
Ana Barreto.	Interventoria.	Grandesartes2015@gmail.com	Centro artes 2015	3133154236	
Fred Arango P.	Resid. Obra.	C.M.Z.	Farango@megamark.com	3133420445	

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
2.	06 diciembre 2023.	7:30 a.m.		Centro cultural
Objeto de la reunión:				

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621.		
Objeto del Contrato de obra	Construcción centro cultural y de convenciones para artistas del municipio de Zipaquira.		
Contratista de obra	Consorcio Mega construcciones Zipa.		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• Obras publicas indica que a la fecha No se presenta informacion de los hojas de vida de todo el personal que se debe presentar al 100% de dedicacion.	
• Indica obras publicas interventoria que no se ha presentado cronograma de obra, para lo cual Interventoria adjunta que el cronograma se envio por Email, la cual fue aprobado y con la misma se realizaron los informes 1, 2 y 3 los cuales ya han sido entregado.	
• Obras publicas solicita que las observaciones que se realizaron sobre los hojas de vida presentados por la Interventoria deben ser subsanadas.	Interventoria: 11 de Diciembre de 2023.
• Obras publicas indica que las hojas de vida presentadas con [illegible] de los profesionales que se encuentran en obra	

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

• Interventoría indica que el día 30 de noviembre de 2023 se envió por correo se radico el oficio IN-CA 2023-5347795-023 con oficio con el ASUNTO: Localización topográfica de cabeza de aguas saludas dentro del área de una abanada del Zipa Indeco oriental con centro cultivo", en la cual se hace entrega del tramiento topográfica con la demarcación de la via como se hablo en el comité anterior y se alyo que la información debe ser enviada al consultor para que el mismo nos indique los puntos de localización de implantación del proyecto, por la cual esta interventoría solicita respuesta de lo mismo.	Claves públicos: 06-diciembre de 2023.
• El contratista de obra indica que a la fecha no se le ha aprobado el APU de retiro de asfalto, para la cual la interventoría responde que NO cumple con la licencia para la actividad nombrada, El contratista responde que el unico lugar que el material puede ser disposición es mandanedo a la cual se le solicito al contratista que se haga llegar en nuevo APU.	Contratista: 08-diciembre de 2023.

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Andrey Deñas Rubayo	Profesional	Obras Públicas	obrastec.prof2@cpaguay.gov	3144865980	
Camilo Valencia Atehortúa	contratista SIUP	S.O.P	obras.cont@cpaguay.gov.co	—	
Jaime Madero	Director obra	Constructor	id.proinarte.com/jai.madero@proinarte.com	3002117061	
Andrés Hernandez	R.L.CMZ	Constructor	a.hernandez@proinarte.com	3208681342	
Wilson Martinez	Dir Interv	C. Artes 2023	wilsonmartinez@hotmail.com	3114577977	
LYDIA M. GAMBOA	PROF. INTERV.	C/ARTES 2023	ARQ.LYDIA@GMAIL.COM	3108521462	
Fred Aranga P.	Resid. Obras	C.M.Z.	f.aranga@proinarte.com	313 3489697	
Lina Barrera	Interventoria	claicos 2023	contratacionartes2023@gmail.com	3233984252	
YADIEL HUERTAS	AUX TECNICO	CMZ	d.huertas@proinarte.com	3108196190	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dilan Rosales/ Sindy Pinilla	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Camilo Valencia
Cargo: Coordinación de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinación PS

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
03	03-01-2018	9:00	10:40	Secretaria de obras publicas.
Objeto de la reunión:	Presentación del nuevo personal de secretaria de obras publicas			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	001 PCONTR 3055075		
Objeto del Contrato de obra	Construcción centro cultural y adecuaciones tierra de cultivos del municipio de zipaquira		
Contratista de obra	Consorcio mego constructores zipa.		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se hace la presentacion de la Arquitecta Sandra Alvarez como nueva secretaria de obras publicas, el Ingeniero Joaquin Romero como apoyo tecnico a la supervisión y el acompañamiento de la Ingeniera Andrea Bueno, en el mismo se tratan temas administrativos, como lo son aprobación de pagos de orden, presentación de cronograma de obra, realización entrego de informes del contratista de obra, interventoria dos 25 de cada mes y de interventoria o supervision el de cada mes, se informo el estado actual del proyecto, porcentaje ejecutado, porcentaje programado, diferencias, estado financiero.	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
[illegible]	Andrés Flechas/ Milem Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinadores Procesos	Cargo: Profesional PUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRC-03
		F. APROB.	F. REV.
		10/08/2017	23/01/2018

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fred Arango P.	Residente Obra	CMC2	f.orango@grupomorte.com	313-3+89697	
Daniel Huertas	Arquitecto Auxiliar	CMC2	d.huertas@proinarti.com	3108196110	
Una Barreto	Interventoria	Consorcio altos 1025	consorcioaltos102@gmail.com	3233984236	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Rosado/ Sindy Pueño	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	[illegible]
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: SST [illegible]

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
05.	18 enero 2024.	9:14	10:45.	Centro cultural zipaquira.
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1 PCCN TR 5055626.		
Objeto del Contrato de obra	Construcción centro cultural y de conversione tiero de artistas del municipio de zipaquira.		
Contratista de obra	Consorcio mego construcciones zpa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
	Entrego de actas de comite NO 03. 04 y 05	Interventoria	18-01-24.	

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• El municipio solicito el envio de las actas de veracidad firmadas por la interventoria.	Entrego de actas de veracidad firmadas 18-01-24.
• La interventoria junto a la supervision le solicita al contratista de obra la documentacion de la maquinaria minima que se encuentra en el anexo tecnico	Contratista de obra 19-01-24.
• Aprobacion de la documentacion por parte de la interventoria dos dias habiles a partir de la fecha de entrego del contratista.	22-01-24 Interventoria.
• la supervision indico que a la fecha se mantiene los tramites de calidad.	
• Entrego de informes semanales de obra e interventoria a la supervision el dia 22 de enero de 2024.	Interventoria 22-01-24 Contratista. 20-01-24

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

• la supervisión comunico que el día 15 de enero de 2024 envió una solicitud a la interventoría de las hojas de vida del personal a la que la interventoría responde que presento inconvenientes con la documentación para que el día martes 23 de enero de 2024 sean subsanado.	
• El contratista de obra indica que la actualización PMT con el radicado 017 - 2024 con fecha de inicio de 01 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.	
• La supervisión solicita la permanencia del profesional SISO por parte del contratista de obra a la cual el contratista indica que hasta presencia desde el día 14 de enero de 2024, pero también refiere que cada subcontratista cuenta con profesional SST, como se encuentra en campo de obra la SST del personal de pilotaje.	
• Se le solicita al contratista de obra la actualización del estado de los provisionales de obra a la cual el ingeniero electrico del contratista indica que se ha radicado por tercera vez la solicitud y que en el momento se encuentran a la espera de la respuesta, fecha de radicación 03 de enero de 2024, fecha de respuesta 15 días hábiles, el contratista requiere que se revise un transformador que se encuentra en el area del lote, para la cual la supervisión indica que el ente encargado o administrador es el departamento de secretaria general y que la solicitud se debe realizar formalmente, se aclara que el transformador se encuentra en el predio del lado, es decir que los matriculas son diferentes. Se espera a reunion con la secretaria general.	

- El contratista indica que para la provisional de obra se requiere el tramite de la factibilidad ya que no se cuenta con el documento, dicho lo anterior el contratista de obra solicita a la interventoría que el doomento mencionado sea requerido al consultor.
- El contratista indica que el 19 de enero del 2024 se hara prueba de plitaje.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: WILSON MARTINEZ Q
Cargo: R Obra

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Milem Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Andry Deza R.	Profesional de apoyo a la supervisión	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA	obrastec.prof@zipaquira.gov.co	3144865980	
Wilson Martinez	C. Artes Dir	Cons Artes 2023		3145777972	
Carlos Garavito	Gte Tecnico	Mega consorcio	cgaravito@proinark.com	3204499390	
Jaime Madero	Director de Obra	Mega construcciones consorcio	ja.madero@proinark.com	3002117061	
Julieth Torres Castro.	Resi Administrativa	Consorcio Megaconstrec. Zipa	j.torres@proinark.com	311 519 3734	
Orlando León	Residente de SST (C. ARTES)	CONS ARTES 2023	orlando leon7112@gmail.com	3208085020	
DANIEL HUERTAS	ARQUITECTO AUXILIAR.	CONSORCIO MEGACONSTRUC	d.huertas@proinark.com	3108196140	
FREDD ARANGO P.	ING. RESID. OBRA	CONSORCIO. MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	f.arango@gmail.com.	313-3489692.	
María Juliana Martínez Peña	Personal Técnico	Consorcio Artes 2023	majulianamaipe1901@gmail.com	3116679497	Juliana M.
Lina María Barreto P.	Inspector.	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	3233984235	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Poveda/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Juan Carlos Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SST/AC/ Gerente

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	N°
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
09.	15 de febrero de 2023	9:00 a. m.	11:15 a. m.	Centro Cultural Zipaquirá
Objeto de la reunión:	Seguimiento de contrato			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1 PCCNTR 5055621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural Zipaquirá	y de convenciones Tierra de artistas del municipio de	
Contratista de obra	Consorcio Hega Construcciones Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
La interventoría indica al contratista de obra que a la fecha el cumplimiento de la entrega de los formatos de ensayos de laboratorio NO se observa y la solicitud se ratifica.	
La interventoría indica que el valor del contrato que se encuentra en la pagina secop II es de $ 65 720579 SAS y en la minuta del contrato indica que el valor del contrato es $ 65 000 893 724 350 por ende se solicita a la supervisora que la misma se debe aclarar y por tal motivo se queda a la espera de la respuesta y viabilidad del proceso a seguir.	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Powered by CamScanner

• la interventoria indico que a la fecha el documento de la EPZ se encuentra en tramite para firma del alcalde y por tal motivo el tramite de la provisional sigue pendiente a lo que la supervisora indico que a la fecha aun no le retornan el documento firmado.

El contratista de obra indico que el tramite de la provisional de energia se encuentra en proceso para lo cual manifiesto que la empresa EVEL hará visita de campo, para continuar con la conexion de la provisional, para lo anterior se debe realizar un NP para el transformador que será necesario para dicho conexión. El ingeniero electrico posesional del contratista de obra indico que para dicho conexion el solicito que el medidor sea independiente. El contratista realiza la entrega formal del punto de conexion definitiva.

• la interventoria manifiesta a la suspension que a la fecha no ha sido posible contactarse con el señor Edgar Rey y por ende no ha sido posible la firma del señor mencionado en el acta de vecindad, para lo anterior se manifiesto que se enviara el acta mediante al correo electronico a la siguiente direccion de E-mail, palmairlab@gmail.com.

• La interventoria manifiesto que a la fecha faltan 4 NP para la actividad de pilotaje, NP de placa aligerada, NP de transformador se encuentra en tramite para lo anterior. se requiere la formalizacion del NP, balance del contrato, acta de pactacion de precios no previstos. y justificacion de actividades.

• En comun acuerdo la fecha del informe y las actas de actividades a los 30 de cada mes.

Al terminar el comite de obra se logra la comunicacion con el señor Edgar Rey para la cual se logra

Powered by CamScanner

la consilicación y ~~gestion~~ técnica la obra comenzo desde el 20 al 25 de febrero se esta a la espera de la confirmación.

la interventoria da a conocer los porcentajes a la fecha 14 de febrero del 2024 los cuales son porcentaje programado acumulado 5.41%, real ejecutado 3.37% y porcentaje financiero ~~2.20%~~ 2.20%.

la interventoria manifiesto o ~~pide~~ sugiere que la bitacora debe ser escrito en ~~una~~ conjunto.

Powered by CamScanner

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	15 de febrero 2024	**LUGAR:**	Centro Cultural Zipaquirá	**ACTA DE SEGUIMIENTO No:**	09
CONTRATO DE OBRA:	CO1 PCCNTR 5058621	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del municipio de Zipaquirá		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Julieth Torres	Res. Administrativa	CMCZ	J.torres@proinark.com	3115193734	Julieth T.
María Juliana Martínez Peña	Interventoría	Consorcio Artes 2023	—	—	Juliana M
Lina María Barrero Parada	Interventoría	Consorcio Artes 2023	—	—	
Gerardo Ramos	ESP. Predios	consorcio	gerardo.ramos@predtel.com	3104156676	
FABIAN DIAZ	ESP. GESTION SOCIAL	CONSORCIO ARTES 2023	Fabianmauriciodiaze Yahoo.es	3105657582	
Wilson Martínez	Inter.	Consorcio Artes	ingwilsonmartin@yahoo.es	3114577977	
LYDA M. GAMBOA	INTERVENTORIA	C. ARTES.	ARQ.LYDA@GMAIL.COM	3108524462	
Orlando León	Inter.	C. Artes	orlandoleon7112@gmail.com	3208085020	
Andy Duno	S. OBRAS PUBLICAS	S. OBRAS PUBLICAS	obrastec.prd@zipaquira.gov.co	3144855200	
Jaime Medero	Director de obra	constructor.	ja.proinark.com	3002117006	
Carlos Carrillo	Gte Tec Consorcio	S Consorcio	c.carrillo@proinark.com	3204499390	
Fred Arango P.	Resid. Obra.	CMCZ.	farango@proinark.com	313 3489697.	
DANIEL HUERTAS	ARQUITECTO AUXILIAR	CMCZ	d.huertas@proinark.com	3107196140	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
04.	11-01-2024.	9:00 a.m	11:00 a.m	Centro Cultural.
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contiato.			
INFORMACIÓN DE CONTRATOS				
Contrato de obra No.	001 PCCNTR 505569			
Objeto del Contrato de obra	Construcción centro cultural y de convenciones teatro de artistas del municipio de Zipaquira.			
Contratista de obra	Consorcio mega construcciones zipa.			

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Actualización PMT.	Contratista.		
2				

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
El contratista obra informa que el subcontratista de la actividades de pilotes ingresara a la obra para lo cual la interventoria solicita que la informacion del personal ingresar sea enviado para la aprobación del mismo. Se reitera la actualizacion del plan de manejo de trafico ya que el mismo se encuentra sin vigencia	
desde el dia 31 de enero del 2023, a la fecha no se informa por parte del contratista de obra el estado del tramite. La supervision solicita que se realice la señalizacion dentro del proyecto, referente a lavado de llantas, residuos peligros y todo lo pertinente a la ruta de evacuacion. La supervisión solicita en informe mensual a lo cual	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Se le informa que no se ha enviado ya que se esta a la espera de la actualización de logos por el cambio de administracion.

Por otro parte contratista e interventoria realizan la sugerencia de la entrega del informe semanal para los dias jueves y asi realizar el seguimiento de los cantidades ejecutados y programas.

La interventoria solicito la actualizacion de los hamites de los provisionales de obra, a la fecha no se cuenta con informacion al respecto.

La interventoria y el contratista de obra informan a la poblacion que a la fecha aun se encuentra en el area del proyecto el vivero y de seis viveristas, para lo cual se realiza la solicitud que los mismos sean desalojados del area de construcción para evitar infortunios futuros.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo. Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		**LUGAR:**		**ACTA DE SEGUIMIENTO No:**	
CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
NOMBRE	**CARGO**	**EMPRESA**	**CORREO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narvaez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo. Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
06	25-01-24	9:30 a.m.		Centro cultural
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.			
Objeto del Contrato de obra			
Contratista de obra			

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Cumplimiento entrega documentación ~~proveedores~~ radicado.			
2.	Entrego de examenes ocupacionales personal pilotaje.			

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• El interventor Ing Wilson martinez informa al contratista que a la fecha No se evidencia el radicado de los provisionales de obra el contratista informa que aun se encuentra en tramite, compromiso de entrega 30-01-24, el contratista indica que la información que se le fue entregado respecto a fase 3 se encuentra vencido y aun por eso no cuenta con el radicado del proceso.	Contratista 30-01-24.
• Porcentaje ejecutado 1.55% programado 7.48% tiempo transcurrido 130 dias, valor ejecutado costo total $858.117.031.	
• La interventoria indica al contratista de obra que se debe mejorar y reforzar el trabajo SISO, ya que la señalización se encuentra o se evidencia pobre.	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

• La interventoria le indico al contratista que la entrega del informe mensual se debe realizar hoy 25-01-24. El contratista indico que la documentación de la maquinaria faltante sea entregado el dia 29 de enero de 2024.	
• El contratista solicito que se le aclarara cual es la ultima version de los planos sellados, el contratista indico que mediante el oficio CHC2-CO1.PCCNTR.5055 62-2023-042 a lo cual la interventoria realizo la solicitud a la supervision mediante el oficio IN-CA-7025-5347795-046 y a la fecha No se tiene respuesta de la misma.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Milem Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Wilson F. Martinez Q	DIR INTER	Consorcio Artes 2023	ingwilsonmartinez@Yahoo.es	3114577977	
Lina Maria Bareta	Interventoria	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	———	
Maria Juliana Martinez Peña	Interventoria	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	-	Juliana M.
Lileth Negrete Torres	Res. Administrativa	Consorcio Mga 2pa	l.torres@proinark.com	3115193734	
Jaime Madero	Director obra	consorcio megacons.	j.madero@proinark.com	3002117061	
FRED ARANGO P	RESID. OBRA.	CMCZ	f.arango@proinark.com	3133489697	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Ossa/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Wilson F. Martinez Q	DIR INTER	Consorcio Artics 2023	ingwilsonmartinez@Yahoo.es	3114577977	
Lina Maria Barreto	Interventoria	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	———	
Maria Juliana Martinez Peña	Interventoria	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	-	Juliana M.
Mileth Alejandra Torres	Res. Administrativa	Consorcio Mga 2023	Jtorres@proinark.com	3115193737	
Jaime Madero	Director obra	consorcio megacons.	j.madero@proinark.com	3002117061	
FRED ARANGO P	RESID. OBRA.	CMCZ	f.arango@proinark.com	313 3489697	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina [illegible] Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
07.	01 Febrero 2024	9:00a.m	10:37. a.m.	Centro Cultural Tipaquira.
Objeto de la reunión:	Seguimiento de contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.			
Objeto del Contrato de obra			
Contratista de obra			

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1.	Entrega documentacion pavimentos de obra			
2.	Documentacion maquinaria minimo requerida			

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• El contratista de obra indico que el compromiso de la documentacion de la maquinaria minimo requerida aun no se cumple.	Contratista 06-02-24.
• La supervision indico y sugiere que los formatos de ensayos de laboratorio se deben implementar a la fecha.	
• La interventoria. informo porcentajes de programacion y ejecucion son los siguientes para la semana del 22 de enero de 2024 hasta 27 de enero de 2024, los cuales son ejecutado semanal 0.17%. ejecutado acumulado 1.77%.; programado semanal 0.88% y programado acumulado 3.06%, para lo cual el contratista indico que se encuentra en una revision de APU para los actividades que se estan realizando. ajustando y con-	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

alcanzo el acuerdo el costo de la actividad de pilotaje por lo que se acuerda ~~xx~~ con el contratista de obra que la actividad se esta realizando como se indica de acuerdo a la especificacion y planimetria	Contratista. 06-02-24.
• la interventoria indica a la supervision que a la fecha no se cuenta con la respuesta del oficio en el cual se informa y solicita los planos sellados tanto en fisico como en digital.	Supervisión. 06-02-24.
• la interventoria comunico que a la fecha no cuenta con la informacion sobre los tramites de los provisionales de obra, para lo que el contratista indica que envian la documentacion	Contratista 20-02-24.
• la supervision indica que ~~en~~ el caso que ya se ha expuesto en reiterados oficios, el cual es el tema del vivente, nos comunica que secretaria de gobierno le indica que se han intentado comunicar y no es posible la comunicacion con el mismo, por lo que la interventoria solicita que se debe oficializar la comunicacion y el proceder de la situacion, ya que en el momento se estan generando inconvenientes.	
• El contratista informa que la otra maquina de pilotaje llego el dia de hoy 21-02-24, aun nos esta en funcionamiento, ya que se encuentra en prueba para el inicio de las actividades.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Milem Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Julieth Torres	Res. Administrativa	Consorcio Mega 2021	j.torres@proinark.com	3115193734	
Jaime Madero	Director de Obra	jd.madero@proinark.com	Constructora	3002117081	
FEED ARANGO P	RESID. OBRA.	C.M.C.Z.	f.arango@proinark.com	313 3489697	
Sindy Dueñas R	Prof. apoyo Sup.	AHZ	obrastec.prof@zipaquira.gov.co	3144865800	
LIDA M. GAMBOA	INTERVENTORIA.	CONSORCIO ARTES 2023	ARQ.LYDA@GMAIL.COM	3108524462	
Ana Maria Barreto	Interventoria.	Consorcio Artes 2023	consorcioartes@gmail.com	3233984236	

ELABORADO POR	REVISADO POR	OBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
08	08 febrero 2024	9:00	10:00	Centro Cultural Zipaquira.
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5083621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del municipio de Zipaquirá		
Contratista de obra	Consorcio Mega Construccion Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• La interventoria indica al contratista que se esta a la espera de la entrega de los formatos de ensayos de laboratorio.	Contratista 09-02-24.
• En comun acuerdo con el contratista de obra se llega al acuerdo que de los tomas de cilindros que tengan, la interventoria faltara dos cilindros por toma.	
• La supervisión indica que el dia 09 de febrero se hara entrega de los planos sellados de cimentacion y estructura, y sanitarios.	Supervision 09-02-24.
• La interventoria informo que a la fecha no recibe la solicitud del APU hablado en reuniones anteriores, para lo que el contratista indico que seria entregado el dia de hoy	Contratista 08-02-24.
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Powered by CamScanner

• El contratista indico que los trabajadores de la poucional de obra en cuanto a cadenas no cuentan con la respuesta, indica que ayer realizo visita y en compromiso se debe enviar el documento de la radicación del mismo.	Contratista 09-02-24.
• La interventoria indica los porcentajes actualizados semana del 22 de febrero al 29 enero al 03 de febrero % Programado semanal 0.94 % Programado acumulado 4.0 % Ejecutado financiero Semanal 0.13 % Ejecutado financiero acumulado 1.84%	
% Ejecutado real semal 0.63 % Ejecutado real acumulado. 2.61%, para lo anterior se indico que segun el porcentaje ejecutado se presento una diferencia de 2.15% y segun el	
porcentaje real ejecutado es de 1.39%.	
• Se indico que al 01 de 03 del 24 se realizara la entrega del campamento de interventoria.	Contratista 01-03-24.
• La interventoria indico que cuanto a la situacion que se ha presentado en la actividad de	
pilotaje se debes registrar y soportar de los que presentan novedad.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Powered by CamScanner

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Diego A. Montoya	Estru. Interv.		diegomontoya1983@hotmail.com	3103326621	
Carlos Garzuto	Consorcio		c.garzuto@proinark.com	3204490890	
Julieth Torres	Consorcio Megacipa		j.torres@proinark.com	3115193784	
Jaime Madero	Dr Obra		j.madero@deroncproinark.com	3002117061	
Andry Reyes R	Profesional de apoyo a la supervisión		obrastec.prof@zapopanaqua.co	3145285...	
WILSON MARTINEZ Q	Con. Artes 2023		ingwilsonmartinez@yahoo.com	3114577971	
NOAM. GAMBOA T.	INTERVENTORIA	CON. ARTES 2023	AREA.LYDA@GMAIL.COM	3108521462	
Lina Barreto	Interventoría	Consorcio Artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	———	
DANIEL HUERTAS	ARQUITECTO AUXILIAR	CMCZ	d.huertas@proinark.com	3108196196	
Nubia Satoba	SST	CMCZ	nubiasatoba2@hotmail.	3194271854	
Marie Juliana Martínez Peña	Interventoría	Consorcio Artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	3176615197	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
10	22 febrero 2024.	10:00 a.m.	11:50 a.m.	Centro cultural zipaquira
Objeto de la reunión:	Seguimiento contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1 PCCNTR 5055621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas		del municipio de Zipaquirá
Contratista de obra	Consorcio Hega Construcciones Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
• Dando inicio al comité de obra No 10 en el cual se hace recorrido por los mencionados, Andry Duarte apoyo a la supervisión, contratista de obra, residente pilotaje e interventoría se informa que a la fecha se cuentan con 56 pilotes realizados a la fecha. • En el campamento de obra se encuentran los propietarios del predio que a la fecha no cuenta con el acta de vecindad, para lo anterior se menciona que de los propietarios que se relacionan en el acta de vecindad, solo se encuentran presentes los señores Edgar Leonardo Rey Lopez de Mesa identificado con CC. 11.338.827 y el señor Nesta Oswaldo Rey Lopez de Mesa identificado con CC 11.339.489 y se aclara que en la presente reunion no se cuenta	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

Powered by CamScanner

con presencia de los demás propietarios. Por otra parte se realiza acto de cierre y se consigna firma de los propietarios manifestados. Se adjunta Acta de vecindad firmada. ———

Se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con la interventoría a los actos de vecindad.

- La interventoría indica que en conjunto con la supervisión se informa al contratista que en la oficina de secretaría de obras publicas reposan los planos firmado y sellado, para la entrega la ing Andry

Informa que el consultor envio un enlace en el cual se contiene la ultima versión de los planos para la entrega y atendiendo a la solicitud se informa que se revisa dicha y comparando los versiones y se encuentra alguna diferencia se solicita copia de l' mismo. ———

- La interventoría indica que no cuenta con la información de NP acerca del -tramitado y por otra parte se solicita nuevamente la entrega del balance

Obra:
Entrega de NP 23 febrero 2024

y así continuar con la aprobación de los actividades No previstas y modificatorio del contrato. ———

- El contratista de obra indicas que necesita la ampliación del cuarto ya que a la fecha se están presentando inconvenientes con el manifestado. ———

Supervision 29-02-2024

- Se le indica a la supervisión que a la fecha el

proceso de la provisional de obra, a la cual se obtiene la respuesta que el tramite No ha sido firmado por parte del Alcalde, el contratista indica que el se tramite debe asumir un pago del resto de los derechos a la provisional, para la entrega

Powered by CamScanner

la aspiradora indica que hará nuevamente el tramite para que el tanque sea firmado y continuar con el proceso de la pavimentación de obra, para el tema con el Acueducto.

- El ingeniero electrico de la obra indica que a la fecha es viable la opción que se había planteado en conexión de medio tensión al transformador que se encuentra hacia el cementerio, el ingeniero indico que en tiempos de cadena puede tardar un tiempo de 3 o 4 meses. El consorcio se encuentra a la espera del replanteamiento para iniciar con la canalización de la pavimentación. Ayuda y colabora con pozos de alcantarillado la localización de la canalización.

Porcentajes:

% financiero 2,22%, Real ejecutado 4.21% y Programado 5.88%.

- La interventoría solicita que el campamento debe ser en bloque por temas de seguridad.

- El contratista solicita que para la prueba de integridad del pilotaje requiere que la interventoría indique que porcentaje requiere las pruebas y que pilotes son, para lo anterior la interventoría se compromete que para el día martes 27 de febrero se realizara reunión virtual en la cual debe estar ing geotecnista, ing estructural, residente de interventoría y en la cual se debe llegar al acuerdo.

Powered by CamScanner

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 22-02/2024		LUGAR:	Centro Cultural Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	10.
CONTRATO DE OBRA:	CO1PCCNTR5055621	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Construcción Centro Cultural y de Convivencia Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Nestor Rey L	Propietario	Fca Rey Lopez del.	festival160 hotmail.com	3102506319	
EDGAR REY L.	Propietario	Fca Rey Lopez del	palmaitoco@gmail.com	311.8099256	
Andy Bonilla	Profesional de apoyo	S. Obras Publicas	obrastec.pot2@up.gov.co	3144865300	
Julieth Torres	Ing Administrativa	C. Megaconstrucciones	jtorres@proinark.com	3115193734	
Jaime Madera	Director Obra	C. Megaconstrucciones	ja.madera@proinark.com	300 2117061	
Gerardo Ramos	Esp. Redes SSCC.	Consorcio	gerardo.ramos@inectel.com	3104156676	
FRED ARANGO P.	RESID. OBRA.	CMCZ.	f.arango@proinark.com	3133489697.	
Lina Maria Barato	Interventoria	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VECINDAD

ZIPAQUIRÁ
CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. CONTRATO :	CO1.PCCNTR.5055621						Hoja	1	de 1
OBJETO:									
CONTRATISTA:									
INTERVENTOR:									
SUPERVISOR:						CARGO			
No. REGISTRO		FECHA		ELABORÓ	ARQ. DANIEL HUERTAS	REVISÓ	ING. FRED ARANGO		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA DEL PREDIO



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	HERMANOS REY LÓPEZ, RELACIONADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL PREDIO.		
DIRECCIÓN	AVENIDA INDUSTRIAL		
TELÉFONO		No. PISOS	N/A
FRENTE (Mts)	215,41 MTS	ESTRATO	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
ALCANTARILLADO	S	PRESENTA UNA RED MUNICIPAL PARA VIA ALAMEDA DEL ZIPA
ENERGÍA	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELÉFONO	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
GAS	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELEVISIÓN - CABLE	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL			URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL		X	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO		¿CUAL
OBSERVACIONES - DESCRIPCION					

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR E . PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas d entrepiso, cubiertas, otros)

LOTE VECINO POR EL LINDEF O ORIENTAL DEL PROYECTO, EL CUAL PERTENECE A LOS HERMANOS REY LÓ EZ DE MESA, LOS CUALES RELACIONO A CONTINUACIÓN. ERIKA HELENA REY .ÓPEZ DE MESA CC 35.414.896, NESTOR OSWALDO REY LÓPEZ DE MESA CC 11.339.487; CHRISTIAN FABIAN REY LOPEZ DE MESA CC 11.344.617; RICARDO ALBERTO REY LÓPEZ DE MESA CC 11.340-441 Y EDGAR LEONARDO REY LÓPEZ DE MESA CC 11.338.827. L TE REGULAR Y UNIFORME EN SU TOPOGRIA CON RED DE ALCANTARILLADO INSTALADA, CUENTA CON CERCAS DE MADERA LAS CUALES NO SE INTERVIENEN Y SU CONDICIÓN ES DETERIORADA Y ALAMBRE DE PUAS EN EL MISMO ESTADO. EL CERRAMIENTO DE LA OBRA QUEDÓ SEPARADO DEL CERRAMIIENTO DEL LOTE. APROXIMADAMENTE 80 CM PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS FUTUROS. SE RELACIONA UN FORMATO ANEXO EN EL CUAL FIRMAN TODOS LOS PROPIETARIOS. EN ESTE FORMATO FIRMA EL SEÑOR EDGAR REY EL CUAL FUE EL CONTACTO PARA LA PRESENTE ACTA.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	EDGAR Rey L.	Nombre:	Nesto Rey	Nombre:	
C.C. / NIT	11.338827	C.C. / NIT	11.339487.	C.C. / NIT	4211730
PROPIETARIOS DEL PREDIO.				REPRESENTANTE CONTRATISTA	

Firma	
Nombre:	Ina Bautista
C.C. / NIT	1049645952
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	

Original: S.O.P
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
11	29 febrero 2024.	10: 15.	11:40 a.m.	Centro Cultural Zipaquira.
Objeto de la reunión:	Seguimiento del contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1. PCCNTR. 5053621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas		del municipo de Zipaquirá
Contratista de obra	Consorcio Hega Construcciones Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR


No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se do apertura al comite numero 11 en el cual la interventoria indica al contratista de obra, que para la aprobación del PP. Filtro perimetral se debe realizar y entregar el detalle del filtro. 2. Por otro parte se habló de la revisión de los planos sellados con el material que se encuentran en dive, para lo cual se informa que se encuentran en revisión. 3. El contratista indica que el dia 26 de febrero se realizo el envio de los PP o actividades no previstos, para lo anterior la interventoria indica que se realizaran descuadres por parte de la interventoria de manera ~~verbal~~ verbal y para lo anterior el contratista envio la información el 29 de febrero del 2024 y la misma se encuentra en revisión. 4. La interventoria indico que los pruebas de integridad de pilotes para lo anterior ~~la~~ ya el	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Powered by CamScanner

peatonal geotecnista indico que por medio de la norma se obtiene un concepto de realizar las pruebas al 20%. de la cantidad total de pilotes lo que corresponde a 122 unidades, para lo anterior el contratista de obra acepto la solicitud de la interventoria. se concluye que que el contratista de obra realizado 15%. e interventor el 5%. 5. la interventoria le indico al contratista de obra la situacion de los pilotes que presentan asentamientos despues del vaciado para lo que el contratista indico que se tomara medidas al momento de entrega de los dados. 6. Se informa los porcentajes de avance por parte de interventoria: Porcentaje real ejecutado 5.10%, Porcentaje financiero acumulado 2.34%, porcentaje programado acumulado 7.35%, dicho lo anterior se concluye que: La diferencia del real ejecutado y el programado es de 2.25%, y del porcentaje financiero y el programado es de 5.01%	
7. El contratista indica que se sigue presentando a la fecha la estadia del invierno. a la fecha y para lo anterior se aclaro que la interventoria no se ha referido en varias ocasiones a la ocupacion y que por esto parte se han incumplido los compromisos adquiridos, por ende el contratista al mostrar su inconformismo por parte de la entidad, realizado la solicitud de suspension. 8. la interventoria en cabeza de la peatonal SST indica los no conformidades que se han presentado y no se han subsanado a la fecha como lo son: • Sendero peatonal, señalizacion, documentacion de personal, capacitaciones de ocupante, inquilinato y su diferencia:	Contratista: Sendero peatonal 29-02-24.

Powered by CamScanner

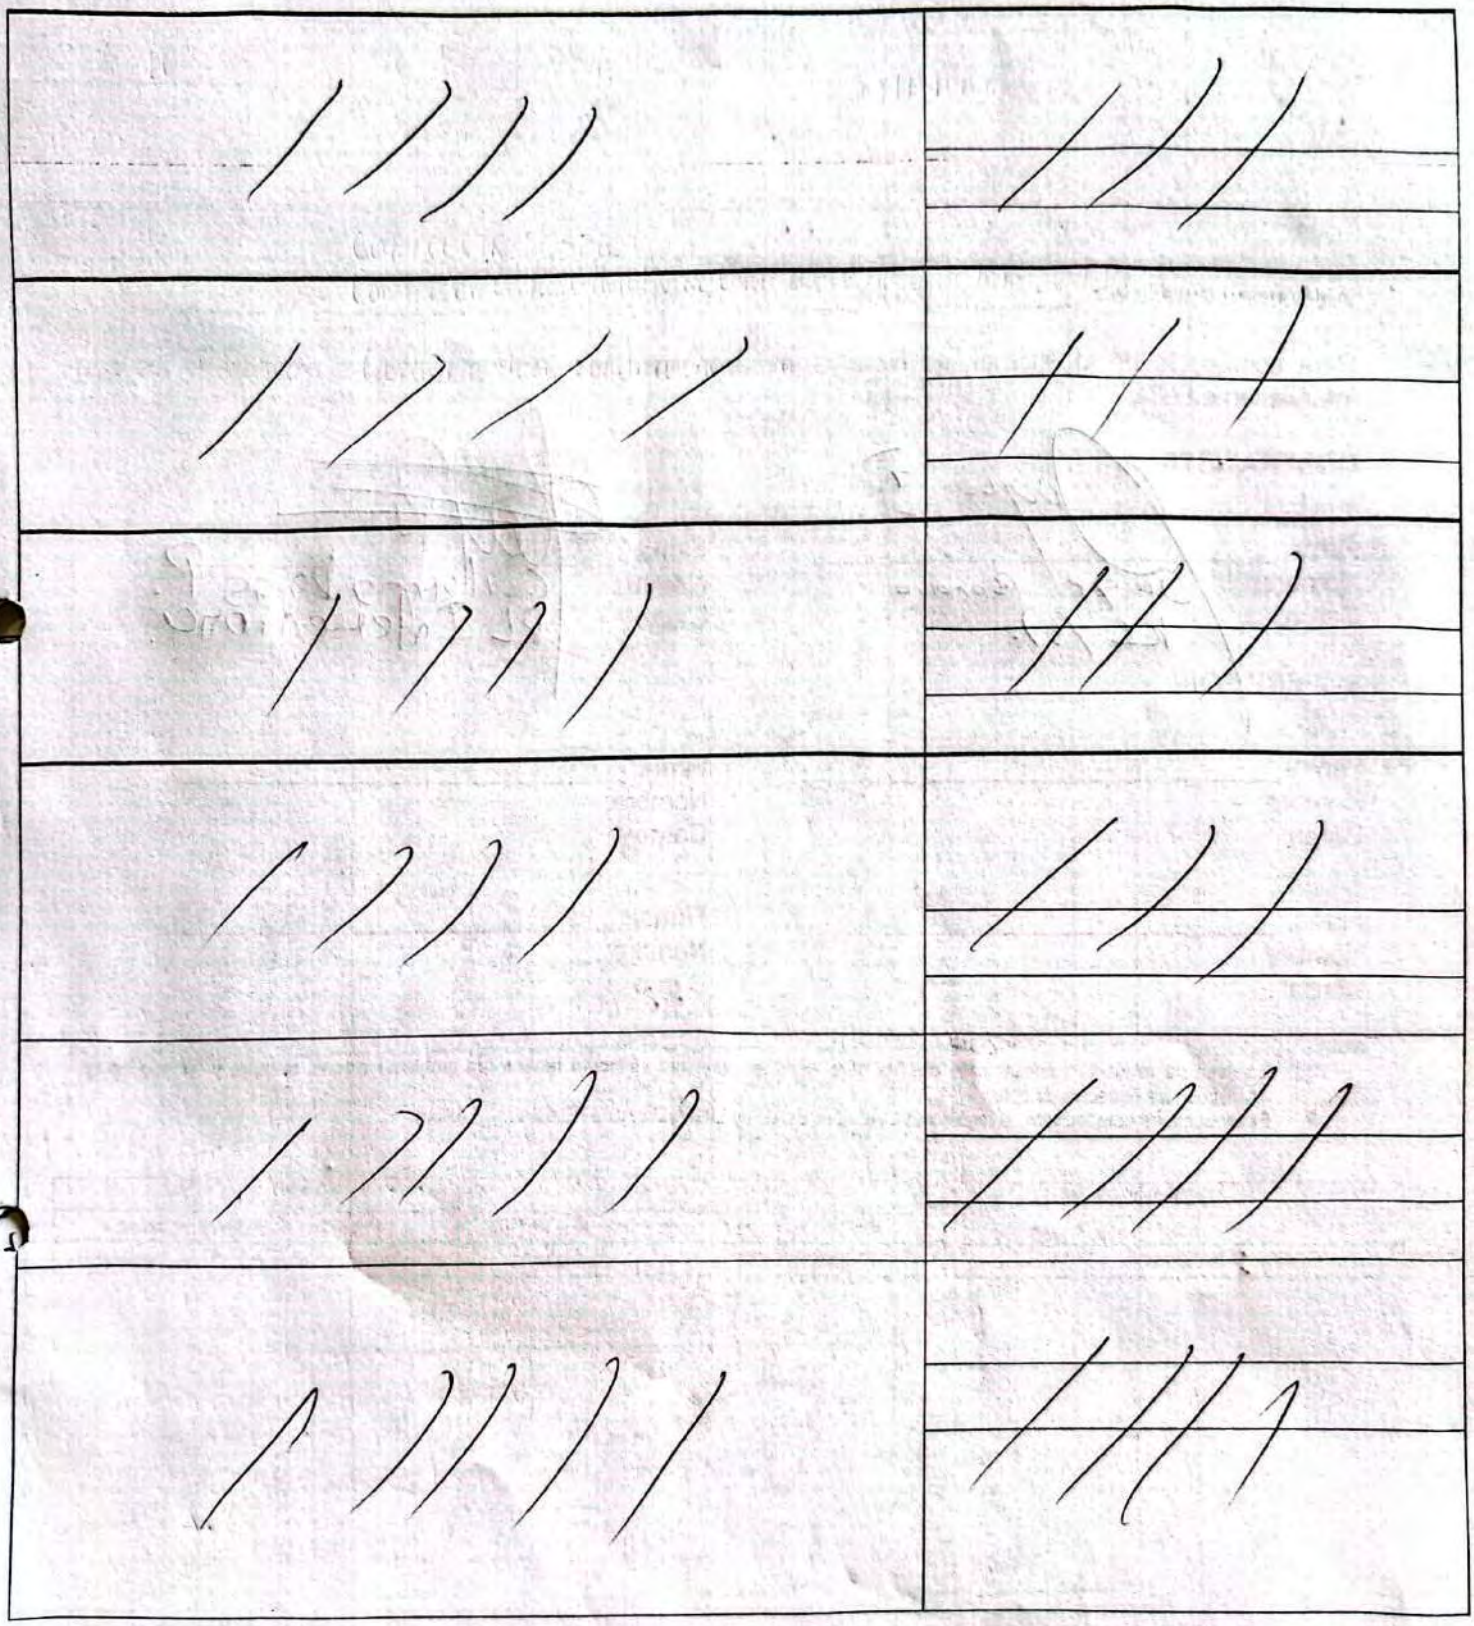

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ ( ) días del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: Jaige Becera
Cargo: RL (s).

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Guillermo Rojas P.
Cargo: RL Interventoric.

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Powered by CamScanner

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	22 de febrero 2024	LUGAR:	Centro Cultural Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	77
CONTRATO DE OBRA:	CO1PCCNTR5055621	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del municipio de Zipaquirá		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Wilson Martínez	Dir	Consorcio Artes 2023	ingwilsonmartinez@yahoo.es	3174577977	
Diego A. Montoya	Interv	Consorcio Artes 2023	diegomontoya1983@hotmail.com	3103326625	
Jaime Madero	Dir Obra constructor	Consorcio Mequas	ja.madero@proinork.com	3008470 61	
Carlos Garzón	Dte Obra	consorcio mequas	cgarzon@proinork.com	3204499390	
Guillermo Rojas	RL/Interventor	Artes 2023	gjrop12@gmail.com	3208545375	
Jorge Becerra	RL(s) Contratista	Contratista	J.becerra@pcolmak.com	3208081341	
[illegible]	INTERVENTORIA	ARTES 2023	APQ.LYDA@GMAIL.COM	3108521462	
FABIAN DIAZ	INTERVENTORIA ASESOR GESTIONA	CONSORCIO ARTES 2023	Fabianmauricio diaz@yahoo.es	3105657582	
Julieta Torres	Ing Residente Admn	consorcio mequas 2024	J.torres@proinork.com	311 519 3734	
Fred Arango P.	Resid. Obra.	C.M.C.Z.	F.arango@gmail.com.	313 3489697	
Lina Maria Bareño Parada	Interventoria	consorcioartes2023	Consorcioartes2023@gmail.com	323 318 4235	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	N
		F. APROB.	F. REV.	
		10/08/2017	26/01/2018	0

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
12.	08 Marzo de 2024	8:23		Centro cultural zipaquira
Objeto de la reunión:	Seguimiento del contrato			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5033621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural Zipaquirá	y de Convencion a Tierra de Artistas del municipio de	
Contratista de obra	Concordio Hega Construcciones Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Dando apertura al comité de obra numero 12, teniendo como punto numero 1. se hablo del compromiso por parte del contratista en el cual se hablo del cambio de especificación del tubo perimetral, para lo anterior el contratista indica que se anulo dicho compromiso y se dejara el item 8.14 como lo indica el contrato.	
2. El contratista indica que a lo fecha no se han entregado por parte de la supervision la entrega formal de los planos de la version final, para lo anterior la interventoria refiere que a lo fecha se ha hecho la solicitud por diferentes medios la entrego de los mismos, para lo anterior contratista e interventoria solicitan nuevamente la entrega digital de los planos sellados. Interventoria y contratista se desplazaran a oficina de obras publicas el lunes 11-04-2024	Desplazamiento contratista e interventoria. 11 Marzo 2024
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	
		F. APROB.	F. REV.
		10/08/2017	26/01/2018

3. El contratista realiza tercera entrega de con lo presupuesto y la interventoria indica que se encuentra en revision de la informacion enviada por el contratista el dia 07 de Marzo de 2024. 4. Se refiere la situación presentada por parte de obra e interventoria sobre la situación del viviente, para lo anterior indica la suspension que en la semana por parte del secretario de gobierno se realizo la actividad de busqueda del viviente para llegar a un acuerdo, pero no fue posible encontrarlo. en el item. 5. la interventoria indica que a la fecha no se ha realizado la entrega del informe mensual por parte del contratista y se le recuerda que tiene como fecha maxima de entrega el dia 03 de cada mes y que por ende la interventoria se encuentra en incumplimiento por falta de la informacion faltante del contratista. 6. La interventoria indica que a la fecha no reabe informacion sobre el oficio enviado el dia mail en el cual habla de la revision de la canal o cuenco perimetral que ha causado problemas por inundaciones. 7. se informan porcentajes de obra se ~~informan~~ indican porcentaje avance 2:75%. y programado 10.20 acumulado. 8. El contratista indica que ha encantado no contaminados en los planos de corte de la placa de contrapiso restando una diferencia de 5cm, por lo anterior se concluye que se dejara la altura que indique en los planos estructurales. 9. la interventoria y contratista de obra indican que todo el personal operativo se encuentra al dia en cuanto a planillas y maquinaria se encuentra con todo la documentacion actualizada, cero accidentes y cero incidentes.	Interventoria envia a supervisor 08-03-2024.

Powered by CamScanner

	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	F.
		F. APROB.	F. REV.
		10/08/2017	25/01/2018

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	08 de Marzo de 2024	LUGAR:	Centro Cultural Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	12
CONTRATO DE OBRA:	CO1PCCNTR5055621	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del municipio de Zipaquirá		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
LYDA M. GARZON.	INTERVENTORIA.	C.ARTES 2023	ARQ. LYDA@GMAIL.COM	3108524462	
Wilson Martinez O	Interventoria	C. Artes 2023		3114577977.	
Laura Vanessa P	Interventoria	C. Artes 2023	interventoriaSSTCC@Gmail.com	3125497880	
Ing Mario Bareño.	Interventoria	Cartes 2023	arquitectos2023@gmail.com	———	
Julieth Tarq	Contratista	Consorcio Negativo	J.tores@promark.com	3145193384	
Nubia Sotaq	contratista	Consorcio zip	sstcm@hotmail.com	3194221850	
Fred Arango P.	Resid. Obra C.M.C.Z.	C.M.C.Z.	f.arango@gmail.com	3133489697	
Carlos Garzon	Cte Tecnico	CMCZ.	C.garzon@promark	3204499390	
Jaime Madero	contratista	CMCZ	jamadero@promark	3002117061	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	
		10/08/2017	26/01/2018	0

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
13	14 de Marzo de 2024.	10:30	12:00m	Centro cultural Zipaquira
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621		
Objeto del Contrato de obra	Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá		
Contratista de obra	Consorcio Hego Construcción Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
1. la interventoría indica que se encuentra en revisión de las versiones finales de los planos entregados por el ente municipal, para lo anterior se realiza el compromiso de la revisión de los diseños hidráulicos y sanitarios para el 21 de Marzo de 2024, por parte de obra e interventoría. 2. la interventoría refiere la situación presentado por parte del usuario de obra, porque a la fecha no se realiza nada para la condición de uso del mismo, por lo anterior se toma en consideración el aislamiento la cual se hará tan pronto la propuesta. 3. la interventoría indica que a la fecha no se allega respuesta del oficio 077 4. se retoma la información y no conformidad presentada por el contratista en la diferencia del cote de la placa de contrapiso, en la anterior se llego al acuerdo	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Powered by CamScanner

que se tendio en cuenta lo allego que indican los planos estructurales, dicho lo anterior se llego a la conclusion que el ing estructural especialista de la interventoria, directa de obra y residente de obra, para la validez de la misma se contrapartimo de los mencionados. 5. La interventoria en el area SST indico que se encuentra en obra 39 personal operativo, 8 personal de interventoria y 7 personal de CMGZ, la interventoria indica que el dia 15 de Marzo del 2024 se envio el oficio 065 por parte de la interventoria en donde se indican y reiteran no conformidades. 6 El municipio indico que el contrato es una solucion parcial ya que se debe buscar una solucion definitiva. 6. La supervision indico que se encuentra en revision del informe, el mismo fue respondido por parte de la supervision labios publicos si es necesario el ajuste del mismo, se realizara. 7. La supervision indico que los presentados en del modificatorio se encuentran actas y formatos con logo y informacion actualizado. 8. La interventoria indico que realizara de manera oficial la respuesta a lo solicitado realizado por el contratista, sobre la valla informativa de la licencia. 9. La interventoria indico que ya realizo estudio sobre los pilotes a los que se realizaron pruebas PIT, para lo anterior se realizara de manera oficial la relacion de los pilotes a los que la interventoria solicita realizar la prueba. lo anterior escrito ha sido en estudio realizado por el especialista estructural y especialista en geotecnia, 10 La interventoria especialista estructural indico que ante la problematica presentada en los pilotes fueron como lo son ET-P2, ET-P18 presentaron inconformidades, para lo anterior se solicita que el especialista estructural del consorcio rego construccion tipo realice el concepto estructural sobre el recalce y como seria la union de concreto nuevo y concreto viejo. 11. La interventoria indico y recordo que el PMT esta proximo a vencer 13 de marzo 2024 para lo anterior el contratista indico que el dia 20 del

Cumplimiento dora.

Interventoria

14-03-24. Oficio de respuesta valla informativa

Powered by CamScanner

Mano del 2024 inicial el tramite a la prolonga. 12. la interventoria indico que segun el PMA indicado por el contratista de obra se adoio que para la recoleccion de residuos convencionales se tendria que realizar una solicitud por parte del contratista de obra. 13 Porcentaje de obra 7.86%. y porcentaje programado 11% 14. El contratista de obra indica que para lo procesional de agua la entidad le solicita cuadro de nodos. y agua potable, cate de redes exterior, para lo anterior el contratista indica que envio la información. 15 El contratista indica que en la placa de cimentacion encuentro detalle de una malla electrosoldada de 3/8' de 20x20 para lo anterior se acuerdo que los especialistas estructu- les realizaran reunion 18 de Mano 2024. 14. la supervisora indico que solicitan el cambio del dia de comite para los dias lunes a las 2:30.

Solicitud EPZ - contratista
14-03-24.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	CONSORCIO ARTES 2023	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		19-09-2023	19-09-2025

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	08 marzo de 2024	LUGAR:	Centro Cultural Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	13
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1PCCNTR5055621				

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
FABIAN DIAZ	ESPECIALISTA EN GESTIÓN	CONSORCIO ARTES 2023	consorcioartes2023@gmail.com	3105557582	
Diego Montoya	Estructural Interventoría	Consorcio Artes 2023	diegomontoya1985@hotmail.com	3103326625	
FRED ARANGO P.	RESID. OBRA.	CMCZ.	f.arango@proinark.com	3133489697	
Carlos Garavito	Ele Obra.	CMCZ	c.garavito@proinark.com	3204499390	
Interventores	Ing Residente Admon	CMCZ.	j.flores@proinark.com	3115193134	
Jaime Madero	Director Obra	CMCZ	ja.madero@proinark.com	3002117061	
Jagen Romero	Director SOP	Alcaldía	director.obra@zipaquira.gov.co	3016111955	
Andrey Devia R	Profesional SOP	ALCALDIA	obrasisc.prof@zipaquira.gov.co	3144865950	
Maribel Cubillos	Topografo Int	Consorcio Artes	Maribelfuncgrafico@gmail.com	3103315673	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
14	22 de Marzo 2024	2:30 p.m.		Centro cultural zipaquira.
Objeto de la reunión:	Seguimiento de obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
1 Se encuentra presente en acto de lectura y comite de obra: Supervisan Ing Andry Reinos, Contratista Ing Fredd Arango, Ing Jaime Madero y Nubia Santana SST) e Interventoria, Ing Wilson Martinez, Arq Lyda Gamboa, Ing Maribel Cubillos y por último Ing Uno Barreto, Se inicia lectura del acto anterior comite de obra No. 13, 1. la interventoria indica que no es viable el aislamiento del vuente, para lo anterior la interventoria requiere que se debe portar una fecha limite para la solución presentado, desde la fecha de inicio del contrato, por lo mismo si no se da pronta solucion, la interventoria recomienda suspension de actividades para bant-	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINA
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
no. la supervisor indica el numero del vigente 3137143588 con el fin de que sea lo posible comunicación con el mencionado o en dado caso si alguna entidad llego a presentarse en la obra, sea posible la comunicación. 2 la interventoria indica que el oficio 077 no refleja respuesta, el mismo habla de la revisión de la cuenca pluvial, la supervisor indica que sea lo dicho hablado o lo peticion. 3 la interventoria recuerda los puntos estudiados a saber, concepto estructural oficio de poca contopisa, pilotes huecos y malla electrosoldada 318' 20x20, para lo dicho el contratista manifiesta que ha hecho acercamiento con el consultor y se concluye que se hará malla y no se dejará varilla como se indico en los diseños, pero se requiere el concepto tecnico de manejo vicial. 4. la interventoria acoba las observaciones presentadas en el informe 6 para lo anterior el contratista absorbio lo dicho en reunion el dia 26 de marzo de 2024. 5. la interventoria indica que al la fecha se ha enviado la actualización de los formatos para el modificatorio, dicho lo anterior la supervisión rechaza la justificación de los actividades, para lo cual, solicito que lo mismo debe ser Tecnica, administrativo y financiero, la interventoria solicito al contratista lo mismo justificación 6. la interventoria indica que a la fecha no cuenta con la prorroga de la licencia y por lo mismo incumple en el compromiso adquirido en el comite anterior 7 El contratista de obra indica que ha realizado pruebas PIT a 11 pilotes. 8. Se informa que han transcurrido 187 dias y a la fecha se cuenta con un porcentaje ejecutado real 7.96%, programado acumulado 11.65%, financiero 2.94%, se solicita ajuste de cronograma de actividades cuando el modificatorio sea aprobado. 9 la interventoria indica que a la fecha no se tiene claridad del proceso para la instalacion de la parcial de obra, para lo cual la supervisión comunica que en conocimiento con el consultor, se debe realizar una mesa de trabajo con los pares, interventoria, supervisión, contratista y EPZ, se encuentra en estudio de como se debe realizar la solicitud ante EPZ, la supervisor comunica que el dia 25 o 27 del Marzo se contara con una respuesta. 10 la supervision realiza la observación a los campamentos existentes en obra, pero los mismos no cumplen con la especificación que se encuentra en el contrato, por ende se debe realizar seguimiento.	Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Contratista Fecha: 26 de marzo de 2024. Descripción: Responsable: Contratista 26 de marzo de 2024. Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

PRESENTES

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Jaime Madero.	Director Obra	C M C Z	j.madero@promark.com	———	
Fred Arango P.	Residente Obra	C M C Z.	farango@promark.com	3133489697.	
Andy Dorcas R.	Apoyo a la Sup.	A. M. 2.	obrastec.prof@2p.	3144865980	
LYDA M. GAMBOA	INTERVENTORIA	C/ARTES 2023	ARQ. LYDA@GMAIL.COM	3108521462	
Wilson Martinez Q.	INTEL.	C/ARTES 2023	ingwilsonma.hinez@yahoo.es	3114577977	
Lina Maria Barreto P.	Interventoria	consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	3233984226	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
15	01 Abril de 2024	2:50		
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato de obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**
En el lugar se encuentra presente consorcio CHCZ, Ing Fiedd Arango, Ing. Jaime Madalo, Ing Jolieth Torres, Interventoria Ing. Wilson Martinez, Arq Lido Gamboa, profesional SST Laura Prieto, Ing Juliana Martinez y Ing Ino Burgos, Secretaria de obras publicas Ing. Andra Arenas. punto a tratar: 1. Como primer punto el contratista de obra informa sobre el hecho presentado el dia 22 de marzo de 2024 y en el mismo se realiza la situación del momento ya que en el comite anterior la interventoria indico que si lo problematico continuaba se solicitaba la suspensión del contrato, para lo mismo se le requiere al contratista de obra que allegue la	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINA
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
solicitud de solución inmediata ante la problemática presentada, la misma debe ser enviado a la secretaria general Dona Marcela Andrade a la secretaria de seguridad Fernando Castillo. 2. La interventoria solicita al contratista de obra la matriz de riesgo como compromiso para el día 08 de Abril del 2024. 3. Se ratifica la	Responsable: Fecha:
peticion realizado en el oficio 077 a lo que la supervision informo que a la fecha no cuenta con respuesta alguna. y tambien se reitera la visita por parte de la EPZ para tratar ~~temas~~ temas relacionados a la conexion de la provisional para la entrada no se cuenta con respuesta alguna. 4. Para este punto se reitera la necesidad del concepto estructural sobre el cambio de varillo a cambio malla y de igual manera se habla del escalce de pilotes. 5. La interventoria comunica al contratista de obra que los compromisos adquiridos se deben cumplir en los tiempos establecidos en los cuales se presentan los observaciones del informe No. 6. A cual tiene observaciones, se dieron en conocimiento el dia 22 de marzo del 2024 y como compromiso por parte del contratista quedo como fecha de entrega el dia 26 de Marzo de 2024, el mismo ha sido incumplido y se aplico el dia de hoy 01 de abril del 2024, incumpliendo los compromisos adquiridos. 6. La interventoria reitera el compromiso adquirido el dia 26-Marzo-2024 el cual habla de la justificacion de los Actividades NO planeados, compromiso incumplido a la fecha. 7. La interventoria indica que a la fecha el PAT se encuentra vencido y que se esta a la espera del 2024-120-1-2988-3 radicado 19 marzo 2024. 8. La interventoria profesional SST indica que se encuentra en obra 58 personas activas, referente a lo solicitado se informa que el oficio 092 enviado el dia 21 de marzo del 2024, no ha sido respondido, el contratista indica que el mismo sera enviado el dia de hoy 01 de Abril del 2024. 9. Se indican porcentaje real ejecutado 9.36%, financiado 3.18 y programado 13.10% con un total de 149 dias.	Descripción: Contratista de obra 04 de Abril del 2024. Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Contratista de obra 01 Abril de 2024. Fecha: Descripción: Contratista de obra 01 Abril de 2024. Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

NSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

PRESENTES

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Andy Deras R	Prof. Apoyo Supervi	S. Obras Publicas	obrastec.prof@g.pogra.	3449859580	
FRED ARANGO P	Resid. Obra	C.M.C.Z.	f.arango@prosmark.com	313-3489697	
Jaime Madero	Director Obra	C.M.C.Z	ja.madero@prosmark.com	3002147061	
Julieta Torres	Res. Administativa	CMCZ	J.torres@prosmark.com	3115193734	
Wilson Martinez O.	INTER	CONS/Artes 2024	ingwilsonmartinez@yahoo.com	3114577977	
LYDA Y SAMBONI	INTER.	CONSARTES 2023	AREA.LYDA@GMAIL.COM	3108521462	
Laura Vanessa Prieto.	Interventoria	Cons/Artes 2023	interventoriasstcc@gmail.com	3125497880	
Ana Maria Barreto	Interventoria.	Consorcio artes 2023	consorcio artes 2023@gmail.com	———	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Lugar
16	10 de abril del 2024	3:15 p.m	5:00p.m	Centro cultural y de convenciones, Zipaquira
Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	CONSORCIO ARTES 2023

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1.	Situación presentada viviente No CO1. PCCNTR.5055621-2023-089	Consorcio CMCZ		08-04-2023
2.	Entrega matriz de riesgo de obra	Consorcio CMCZ	08-04-2024	SIN CUMPLIR
3.	Actualización PMT	Consorcio CMCZ		SIN CUMPLIR

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
En lugar se encuentran presentes: Ing. Fred arando, Ing. Jaime Madero, Ing. Garavito, Ing, Julieth Torres, profesional ssr Nubia Santana, INTERVENTORIA: Ing, Wilson Martinez, Arq. Lyda Gamboa, Ing. Lina Barreto y profesional SST Ing. Laura Prieto y SUPERVISION: Arq. Sandra Atuesta, Ing Joaquin Romero y la Ing. Andry Dueñas. PUNTOS A TRATAR: Se da lectura al acta anterior. 1. Co-	Descripción:
Mo primera instancia se trata la situación presentada con el viviente y se da cumplimiento al compro- Miso adquirido por parte del contratista de obra, sobre la comunicación enviada por medio del oficio No CO1. PCCNTR.5055621-2023-089, para lo anterior la supervisión indica que se hará el desalojo	Responsable: Supervisión
Del mismo, con secretaria de seguridad y con policía. (miércoles 17 de abril del 2024). 2. La interven- Toria habla sobre el compromiso de la matriz de riesgo, para lo cual el contratista de obra indica que	Fecha: 17-04-2024
La misma no será allegada, puesto que de acuerdo a una consulta o estudio realizada por el contra- Tista considera que no es necesario entregarla, por lo mismo la interventoría solicita que la respuesta Debe ser entregada de manera formal mediante un documento.3. La interventoría informa sobre el Estado actual de la petición realizada a la EPZ, sobre el mantenimiento de la canales y redes, para lo	Descripción: Contratista 12 de abril del 2024
Mismo se evidencia respuesta por parte de la supervisión el dia 02 de abril del 2024, en el cual indica	Responsable:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Que desde la secretaria de obras públicas, se realizó traslado, mediante el radicado RAD-1190, Así Mismo se habla sobre al provisional de obra y el contratista indica que para la misma realizo el pago Sobre la factibilidad y se esta a la espera de la factura para los derechos de la provisional, asi mismo Se encuentra a la espera de la junta directiva que se realizara el día 15 de abril del 2024, para la aprobación de la misma y se esperaría respuesta de la semana del 15 al 22 de abril. El contratista Indica que ante la situación presentada en la cuenca, se puede presentar un contra bombeo, lo mis-Mo, se pueden presentar problemas futuros y se con la petición se pretende prever problemáticas. futuras. **4.** La supervisión indica que se le debe comunicar, oficialmente los cambios estructurales **5.** La supervisión indica y reitera que las fechas de compromisos, deben ser cumplidas, tanto de obra Como de interventoría, ya que, si no se cumple con la entrega de los mismos, los desembolsos por Parte de enterritorio o el pago de las actas se puede ver afectado, al no contar con la información Real y actualizada del contrato, para lo mismo el contratista se compromete a realizar la entrega de Los informes mensuales los días 02 de cada mes, sin importar dominicales y festivos. La interventoRia le solicita al contratista que de acuerdo a las observaciones emitidas por la supervisión sobre el Informe No.7, se deben adjuntar facturas y todo lo relacionado con los pagos relacionados al anticipo Y así mismo corroborar la información que se encuentra consignada en los extractos enviados por el Contratista de obra. Para lo anterior el contratista indica que se le dará cumplimiento el día 12 de Abril del 2024. **6.** La interventoría indica que a la fecha el PMT, se encuentra vencido, para lo anterior El contratista indica que se ha comunicado con la entidad responsable y que recibe en respuesta, Que el documento no ha sido prorrogado, ya que por inconvenientes internos del municipio, no se ha Dado tramite a ninguna petición. **7.** Porcentaje real ejecutado 10.03%, financiero, 3.46% y programaDo 16.00%, 203 dias.	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

PRESENTES

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	10 de abril de 2024	LUGAR:	Centro cultural y de convenciones	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	16
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Andy Deiro L	Pol. Planeación	Alcaldía SP	desarrollo.pol@zipaquira	3144865380	
Jaime Madero	Director Obra	CMZ	ja.madero@proinork.com	3002117061	
Carlos Gaviria	Gte Tecnico	CMZ	c.gaviria@proinork.com	3204499890	
Martin Torres	Res. Administrativo	CMZ	jtorres@proinork.com	3115193734	
Joaquin Romero	Dr SIOP	Alcaldía ZP	dir.obrasz.pq.cun	3008114815	
Maribel Cobillos N.	Topografa	Consorcio Artes	Consorcio artes2023@gmail.com	3103315273	
FREDY ARANGO P	RES. OBRA.	CMCZ	f.arango@proinork.com	3133489697	
Sandra Acosta	Supervisora	Alcaldía	s.obras@zipaquira	3043502755	
Wilson Martinez	Residente	Con. Artes 2023	ingwilsonmartinez@yahoo.es	3114577977	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
17.	15 Abril de 2024.	3:00 p.m.		Centro cultural Zipoquira
Objeto de la reunión:	Seguimiento contrato de obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Personal presente en comité: Consorcio CMC2, Ing Fidel Arango, Ing Jaime Madero, Ing Julieth Torres e Ing Gerardo Ramos, Interventoría: Ing Wilson Martinez, Ing Diego Montoya, Arq Lupe Gamboa, Ing Juliana Martinez e Ing Lina Portela y Supervisión Ing Andry Dieras. Puntos a tratar: 1. De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité del día 10 de abril, para la cual se le necesita al contratista de obra el envio de la matriz de riesgo o la respuesta oficial de la solicitud realizada por la interventoria. 2. Se informa que los documentos anexados para el seguimiento del Anticipo deben ser factura y no documento pro forma o alguna orden de pago. Se informan porcentajes estado real 10,85, financiero 350 y programado 77.59%.	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
El ing Gerardo Especialista declaro del contratista indico que en revisión de diseños, no se encuentra planimetria de detalles de incendios y por ende en el presupuesto No se consigna esta información. Asi mismo indico que en la información aportada por el consultor, se encontraron diseños, sin firma tando del consultor, como de interventoria, la interventoria indico que la situacion de la planimetria tambien se presenta en aguas residuales, se deja como compromiso la solicitud por correo a supervisión.	Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fred Arango P	Resp. Obra	CMCZ.	f.arango@protmark.com	3133489692	
Jaime Madero	Director Obra	CMCZ	ja.madero@protmark.com	3002117061	
Gerardo Ramos	Esp. Redes Seco	CMCZ	gerardo.ramos@inecte.com	3101256676	
Diego Montoya	Asesor Estruct. Interv.	Consorcio Artes	diegomontoya1483@hotmail.com	3163326624	
Maria Juliana Martinez	Interventoría	Interventoría	consorcioartes2023@gmail.com	—	
Andy Duarte G	S.O.P.	S.O.P.	obrastec.prof@supagro.com	3144805480	
Wilson F. Martinez C	C/Artes 2023	INTER	ingwilsonmartinez@yahoo.com	3144577977	
Julieta Torres	Consorcio Negocios	Res. Administrativa	J.torres@protmark.com	3115193734	
Lina Barrera	Interventoría	Consorcio artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	3233984235	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERM...
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
18	22 de Abril del 2024	3:00 p.m	4:30 p.m	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá
Objeto de la reunión:	**Seguimiento al contrato de obra**			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Compromiso retiro viviente	S.O.P	17 de Abril del 2024	INCUMPLIDO
2	Matriz de riesgo	Constructor		INCUMPLIDO
3	Oficio información planimétrica faltante	Constructor	19 de Abril del 202	INCUMPLIDO

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
En el presente comité se encuentran presentes: **CONSORCIO CMCZ:** Ing. Carlos Garavito, Ing, fred Arango e Ing. Julieth Torres, **CONSORCIO ARTES 2023;** Ing. Wilson Martnez, Ing Maribel Cubillos, Sst Laura Prieto Ing. Lina Barreto e Ing Juliana. **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:** Ing. Sandra Atuesta, Ing Andry Dueñas, Ing Camilo Ing, Joaquin Romero Puntos a tratar: **1.** L a supervisión indica que en la revisión del modifica- Torio Presentado por el contratista de obra y el cual ha sido aprobado por la interventoría, así se solicita que se aclare el NP – 001 PLACA DE CI-	Descripción: Responsable: Fecha:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	
MENTACION, la cual habla de la implantación de CASETON DE LONA 0,80 X 0,35, para lo anterior se hace la trazabilidad de lo sucedido, para Tomar la decisión de la implantación del mismo. A lo que el contratista Junto a la interventoría indican que de acuerdo a los diseños, la confor- macion de vigas y viguetas se debería realizar con el terreno natural, para Lo que se recuerda que en el terreno natural se encontraron capas de Residuos no naturales, los cuales dificultaban y no permitían la confor- Macion de los elementos estructurales mencionados, para lo anterior en La revisión de estudios y diseños, se realizaron mesas de trabajo con el Consultor a lo que el mismo respondió, que se debía tamizar los restudios Para lo que el constructor, vio inviable la posibilidad, se realizaron estudios, cotizaciones y se buscaron alternativas, pero no fue posible en- Contrar otro alivio, el contratista de obra informa que en su momento se Planteo la reutilización del material que resulto de la limpieza del terreno Y se realizaron vías perimetrales para el uso interno de la obra y para Evitar más excavación de la que se estaba presentando la estructura fue Elevada 40 cm del nivel inicial, la interventoría indica con la elevación Mencionada, se evita un sistema de bombeo, por lo anterior la supervi- Sión indica que, que, de ser así, en la justificación económica y en la im- Platación del casetón se debe balancear con estas actividades que se Están indicando que no se van a realizar, con las que se deben tener en Cuenta de las no previstas. La supervisión indica que se debe informar Cuando se tenga un impacto económico. **2.** el contratista de obra indica Que de acuerdo a la revisión que se ha realizado a los diseños, se ha Planteado el cambio de grafil, por malla electrosoldada, tema que se ha Dicho en repetidas ocasiones, pero se debe revisar, para que el mismo, No impacte en el balance, por lo anterior se realizará un comité de espe- Cialistas estructurales, para la socialización y aprobación de la propuesta **3.** La interventoría indica que se debe estar pendiente del balance, para mantener un equilibrio económico, ya que el presupuesto de la obra tiene precios 2021, para lo que la supervisión indica que el contratista debe Prever esta situación, ya que, a la presentación de la propuesta, se debió realizar una proyección económica. **4.** La interventoría indica sobre El incumplimiento del retiro del viviente, a lo cual la supervisión indica que la labor se realizara el dia 24de abril del 2024. **5.** La interventoría informa Que el contratista no ha enviado el oficio con la información faltante Acerca de la planimetría faltante, sobre planos eléctricos y detección, Para lo anterior el contratista de obra indica que al mismo se le dará cum- Plimiento el dia 22 de abril del 2024 **6.** El contratista indica que en el área Polivalente, se presentan unos cortes, pero en el diseño estructural se Muestra placa en concreto y en los renders se muestra como prado, Para lo que el contratista también indica que necesita aclara el detalle Y asi continuar con las actividades, en el área de la plazoleta, se presen- Ta la misma situación y por ultimo el contratista indica que en la estructu-	Descripción: Responsable: Fecha: **COMPROMISOS** Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Ra metálica, la cual se encuentra en la cubierta, se están presentando Inquietudes, para lo que la supervisión, propone realizar reunión con el Consultor para la aclaración de las dudas presentadas.**7.** La interventoría Solicita que la excavación que se debe realizar en el área del aula poli- Valente, debe ser aprobada por la interventoría para la continuación de la Actividad. **8.** Se informan porcentajes de obra: ejecutado real 12.30% Programado acumulado 19.16% y, avance financiero 4.39% 217 días Transcurridos.	Responsable: Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción: Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:	22 de abril del 2024	LUGAR:	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	18
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
FREDY ARANGO P	Resid. Obra	CMCZ.	f.arango@promark.com	3133409097	
Julieta Tono	Resi. Administrativo	CMCZ	j.tores@promark.com	3115193734	
Carlos Garavito	SIG. Rec.	CMCZ	c.garavito@promark.com	3204499390	
CARLOS VARGAS LEGARE	CONTRATISTA S.O.P	S.O.P	OBRAS.CONST@ZIPAQUIRA.GOV.CO	—	
Andry Dueñas R	Prof. SOP	S.OP	obrastec@2.pagina.com	3144865780	
Joaquin Romero.	Dir. TecObras	SOP	dir.obras@zipaquira	3008114955	
Laura Reto C	Interventoria SST	int	interventoriasstcc@gmail.com	3125497880	Laura Reto C.
María Juliana Martínez Peña	Interventoría	Consorcio Artes 2023	consorcioartes2023@gmail.com	—	Juliana M.
Wilson F. Martínez Quintero	Interventores	Consorcio. Artes 2023	seguridadenmarcha@yahoo.es	3145777727	
Lina María Barreto	Interventoría	Consorcioartes2023	consorcioartes2023@gmail.com	———	
Maribel Caballero N.	Interventoria	Consorcioartes2023	"	310 3315673	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
19	29 Abril de 2024	2:30 p.m	4:00pm	Centro cultural y de convenciones
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5033621		
Objeto del Contrato de obra	Contrucción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca		
Contratista de obra	Consorcio Mega Contrucciones Zipa		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Asistentes: Ing Fred Arango, Ing Jaime Hodoo, Ing Carlos Galvis, Ing Lileth Torres, Ing Wilson Martínez, Ing Maribel Caballos, Ing. Juliano Martínez, Ing Una Bonilla, profesional SST Lavio, Piñeros y Ing. Andry Ramos. 1. Como primer punto se da lectura al acta anterior, como primer punto se habla del compromiso incumplido, para desarrollo del inversitte el cual tenia como fecha el 24 de Abril del 2024, para lo cual se indica que lo mencionado se debe reprogramar. 2. Se toma sobre la consulta realizado pa el constructor sobre el area del acta pollvalente, para lo que la supervisor indica que se debe revisar a detalle a a punto de vista de la supervisión es una estructura en concreto y un acabado arquitectonico, pero se debe esperar la respuesta del consultor; se realizara reunion 02 de Mayo del 2024 para tomar de consultores con el diseñador. 3 Se habla del	
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	**COMPROMISOS**

Powered by CamScanner

cambio de varillo #3/8" a malla electrosoldada, para lo anterior se le solicita al contratista el estudio de la optimizacion de los rendimientos, para lo anterior el contratista indica que se encuentra en el estudio del mismo, la interventoria indica que se debe estudiar la parte tecnica, yo que de acuerdo a los diseños, se esta dando celeridad a los actividades por los cilindros presentados y que las analisis que se han hecho se han tomado con los especialistas, la supervision indica que se debe proyectar estos decisiones que se han tomado. 4. El constructor indica que se esta ajustando a los costos que el consultor propuso, lo anterior yo que se indica que se estan sufragando sobre costos en las actividades programadas que se estan cotizando, para lo anterior la interventoria indica que se debe argumentar los observaciones presentados. 5 la interventoria realizar relacion a EPR sobre el indicado #90 del 01 de Abril del 2024, sobre lo solicitado realizado sobre la revision de los cobros presentados. 5. se informa sobre la entrega del informe mensual #8 se entregara el dia 01 de Mayo del 2024 y al todo se encuentra en orden la interventoria lo entregara el dia 03 de Mayo del 2024. 6. El contratista indica que que lo provisional de acueducto se encuentra en tiempo de EPR y de energia se encuentran en tiempos de la entidad. 6. la supervision indica que el modificatorio no ha sido recibido, para lo que la interventoria indica que se descuento lo informado realizado, el contratista indica que encuesta la infancia con el dia de hoy 29 de Abril del 2024, por lo anterior la interventoria realizara revision y se hara reunion con supervision el dia 30 de abril del 2024. Se informan los porcentajes real ejecutado 73.47%, financiero 9.89% programado 20.77%.

Dos transcurridos 234. dias.

INTERVENTORIA

Interventoria

Jefe
Juliet Torres - Contratista
Carlos Carvajal. J. L.
Jaime Madero J.
Interventoria.

Jorge Becerra

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
20	06 de Mayo del 2024	2:40 p.m	4:15 p.m	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá
Objeto de la reunión:	**Seguimiento al contrato de obra**			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
En el presente comité se encuentran presentes: **CONSORCIO CMCZ:** Ing, fred Arango e Ing. Julieth Torres e ing Jaime Madero **CONSORCIO ARTES 2023;** Ing. Wilson Martnez, Ing Maribel Cubillos, Sst Laura Prieto Ing. Lina Barreto. **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:** Ing Andry Dueñas, Arq. Sandra Atuesta e Ing, Joaquin Romero	Descripción: Responsable: Fecha:
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	Descripción:
1.La interventoría indica temas a tratar y en primera instancia habla del re	

Powered by CamScanner

Tiro del viviente y como segundo punto, se habal del radicado 1190, el Cual hace referencia a la revisión de vallado, para lo que anterior, la su-Pervision indica que a la fecha no se cuenta con respuesta alguna, de los Temas mencionados. **2.** La interventoría indica que para la reunión realizada el día jueves con el consultor, no se conto con la agenda que seria Entregada por el contratista de obra, sin embargo, se menciona que se Realizo la reunión prevista, para lo anterior el contratista indica, que Se trataron temas de acabados, detalles y demás dudas, algunas fueron Aclaradas y otras quedaron en revisión, pero así mismo se plantearon Reuniones periódicas con la consultoría para aclaración de dudas, tanto Virtuales o presenciales, de acuerdo como se solicite, para lo anterior. Se realizo acta, la misma será adjunta a la presente. **3.** la interventoría in-Dica, que el contratista envió el informe mensual el dia jueves 02 de mayo Del 2024, el cual presenta observación y las mismas fueron indicadas por La interventoría y no han sido subsanadas a la fecha, por lo dicho anterio-Mente, la interventoría queda impedida para la radicación del informe Mensual, hasta el envío y aprobación del informe del constructor. **5.** La Supervisson indica que a la fecha no se cuenta con información sobre el Cambio que se había planteado del cambio de varilla, por malla Electrosoldada, para lo anterior la interventoría indica que se debe eva-Luar la optimización de rendimientos, ya que los mismos tienen afecta-Ciones económicas, las mismas están siendo compensadas, en mano De obra, por otra parte, se indica que, por temas de espaciamiento, no es Viable la instalación de la varilla, por lo mismo, se indica que se sugiere La instalación de la malla, así mismo la supervisión solicita que todas los Cambios de especificaciones, tanto en material y todas las decisiones Que se tomen, sobre cambios presentados, deben ser informados y asis-Tidas por los especialistas por la entidad. El contratista indica que en el Método constructivo para la instalación de la malla, no se tuvo en cuenta El tema de costos, pero el cambio se tuvo en cuenta con los especialistas Lo cual, fue aprobados por los estructurales, ya que el material cumple Con las condiciones, el mismo se encuentra como material existente en El presupuesto del contrato. Por lo anterior la supervisión indica que el Cambio debe ser aprobado por la consultoría. La interventoría indica que En el comité #18 se habló de la situación presente, en el cual se hablo Que el material ya estaba en sitio y en varias oportunidades, la intervento-Ria y el contratista ha hecho toda la gestión para lograr la reunión con el Especialista de la consultoría y no ha sido posible, por lo tanto, se reitera Que se realizó reunión entre constructor e interventoría especialista estructural y se dio aprobación a la propuesta presentada por el construc-Tor. Para lo anterior el constructor indica que todos los cambios que se Están presentando, son el pro de la ejecución y correcto funcionamiento Del proyecto, ya que de manera técnica la parrilla no es viable, por las Razones presentadas en reuniones anteriores. La supervisión indica que A la fecha, no se con la justificación o el concepto de aprobación del	Responsable: Fecha: **COMPROMISOS** Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

material presentado, por lo mismo solicita que el concepto debe ser Enviado y justificado. **4.** La interventoría indica porcentaje de avance real 14.02%, programado 21.61 Y financiero 5.02%, 232 dias transcurridos a la fecha.	Responsable: Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción: Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:	06 de Mayo del 2024	LUGAR:	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	20
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Wilson F. Martinez Quintero	Consorcio Artes 2023	INTERVENTORIA	ingwilsonmartinez@yahoo.com	3114577977	
Sandra Atuesta	Supervision	Alcaldia	s.obras@zipaquira	3043502255	
Andy Duno R	Profesional de Apoyo	S. O. P.	dantec.pol@zipaquira.	3144865485	
Maribel Cubillos	Topografa	Interventoria	Consorcioartes2023@gmail	3103315673	
laura Pleto	Consorcio Artes	interventoria	interven.bircsscc@gmail.com	3125497880	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
22	20 de Mayo del 2024	02:30 p.m	3:15 p.m	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá
Objeto de la reunión:	**Seguimiento al contrato de obra**			

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.5055621
Objeto del Contrato de obra.	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"
Contratista de obra.	**CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA**
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.5347795
Objeto del Contrato De interventoría.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203"
Contratista de interventoría	**CONSORCIO ARTES 2023**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
En el presente comité se encuentran presentes: **CONSORCIO CMCZ:** Ing, fred Arango e Ing. Julieth Torres e ing Jaime Madero **CONSORCIO ARTES 2023;** Ing. Wilson Martnez, Ing Maribel Cubillos, Sst Laura Prieto Ing. Lina Barreto, Ing. Juliana Martinez **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:** Ing Andry Dueñas, Camilo Torres	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	Descripción:
1.La interventoría realiza la presentación del Arq. Andrés Duran e Ing.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

Ingrith Morales como integrantes del equipo de la interventoría. 2. La Interventoría le recuerda al contratista de obra los compromisos adquiri-Dos en el comité No.21, los cuales fueron enviados mediante el oficio IN-CA2023-5347795-118, el dia 18 de mayo del 2024, para lo cual el con-Tratista indica que el mismo será atendido el día de hoy (20 de mayo), Fecha que se estableció como fecha de entrega máxima. 3. La supervi-Sion indica que persiste el tema del viviente y a la fecha no ha sido Posible la solución a la problemática presentada. 4. La supervisión Indica que el modificatorio se encuentra en tramite y el mismo se encuen-Tra en el departamento de jurídica de la entidad (alcaldía). 5. Se reitera Por parte de la interventoría la importancia de la revisión de las cantida-Des, las cuales han sido conciliadas entre contratista e interventoría, para Lo anterior se acuerda reunión virtual el día 21 de mayo del 2024 a las 8:00 a.m. 6. Se comunica que el día 24 de mayo del 2024, se realizara Visita por parte del consejo municipal, para lo anterior la interventoría, Requiere al contratista de obra mejora en los siguientes aspectos, sende-Ros peatonales, señalización, rutas de acceso, rutas de evacuación y Demás aspectos a mejorar. 7. Se reitera que a la fecha no se cuenta con Respuesta al oficio IN-CA2023-5347795-077, que tiene como asunto "PETICIÓN DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y REDES DE CONDUCCIÓN DEBIDO A INUNDACIONES" y el día 02 de abril del 2024, se recibió respuesta por parte del EPZ por medio del oficio 1190 Donde se indica que la solicitud fue radicada, pero a la fecha no se Se realiza la subsanación de la petición presentada. Para lo anterior, se Comunica que se hará reiteración de la misma. 8. Se le solicita al Al contratista de obra realizar la formalización de toda la información que Ha recibido por parte del consultor. 9. Porcentaje real ejecutado 15.19, Programado 23.48 y financiero 5.37% 245 dias transcurridos. 10. La inter Ventoria asume el compromiso de entrega de los nuevos perfiles profesio Nales para el dia 24 de mayo del 2024. 11. El contratista indica que a la Fecha no se cuenta con respuesta a algunas inquietudes que se presen Tan en los diseños y por lo anterior, enviara comunicado con las mismas El dia 21 de mayo del 2024.	Responsable: Fecha: **COMPROMISOS** Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	.F. INICIO	F. TERMINACION
		19/09/2023	18/09/2026

	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023	ACTA DE COMITE	F. INICIO.	F. TERMINACION.
		14/12/2012	13/05/2021

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:	20 de Mayo del 2024	LUGAR:	Centro cultural y de convenciones Zipaquirá	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	22
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.5347795				

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Wilson Martinez		Consorcio Teatro	Ingwilsonmartinez@yahoo.com	3145777777	
Andy Dieno R	Profesional de Apoyo	S. Obras Públicas	obras.tec.prof@zipaquira.go	3144865478	
Fred Arango P.	Resid. Técnico	C M C Z.	farango@promark.com	3133489697	
Haibel Cubillos N.	Topografo	Consorcio Artes	Consorcio Artes2023@gmail.	3103315673	
Jaime Medina	Dr. Obra	C M C Z.	Ja.madera@promark.com	3002117061	

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	23	**FECHA:**	30 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		**% de avance**	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
EJECUTADO FINANCIERO 16.72% Y PROGRAMADO 23.58% DIAS 245 TRANSCURRIDOS.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato[1], verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

[1] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Powered by CamScanner

1. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DEL ACTA, ENVIO DEL INFORME FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TECNICO, EN EL CAMBIO DE ESPECIFICACION DE VARILLA 3/8" POR MALLA
2. LA MODIFICACION AL CONTRATO QUEDO APROBADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2024, POR TAL MOTIVO EL DIA 24 DE MAYO LA INTERVENTORIA SOLICITO MEDIANTE EL OFICIO IN-CA2023-5347795-125, LA **REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA,** EL MISMO FUE ATENDIDO EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024, EN EL DJUNTO SE EVIDENCIA EL **PLAN DE CONTINGENCIA** Y AL MISMO SE ESTA HACIENDO SEGUIMIENTO, PARA LO ANTERIOR LA INTERVENTORIA OBSERVA QUE PARA EL DOCUMENTO RECIBIDO SE DEBE ACLARAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CUAL ES EL INCREMENTO DE TRABAJADORES EN LAS CUADRILLAS, SE DEBE JUSTIFICAR Y ANEXAR COMO SE TIENE ESTIPULADO EL AVANCE EN ACTIVIDADES, PARA QUE EL RETRASO QUE SE EVIDENCIA SE PUEDA ALIVIANAR Y MINIMIZAR. ASI LAS COSAS EL CONTRATISTA INDICA QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA ESTA SIENDO COMPARADO CON LA REPROGRAMACION.
3. SE ACALRA QUE LA PRIMERA ACTA DEBE SER SOBRE EL 15% Y QUE PARA LAS SIGUEINTES ACTAS, SE SUGIERE ACATAR LA FORMA DE PAGO DEL CONVENIO, LA CUAL ES: 35%, 55%, 75%, 90% Y 10% DE LIQUIDACION.
4. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER ENTREGA DEL PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
5. SE REALIZA REVISION DE LOS SOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR PARA EL ACTA PARCIAL.
6. DE ACUERDO A MESA DE TRABAJO, SE DA APROBACION A LA PORPUESTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA DE LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LAS AREAS CRITICAS.
7. EL INGENIERO DIEGO MONTOYA ESPECIALISTA ESTUCTURAL DE LA INTERVENTORIA LE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBE TENER PRECAUCION EN LAS ACTAVIDAD DE AMARRE DE ACERO, YA QUE SE EVIDENCIAN FALENCIAS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.
8. EL INGENIERO MARIO GUTIERREZ ESPECILISTA ELECTRICO LE OBSERVA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA EN LA DOBRE PARRILLA DEBE TENER SEPARADORES A MENOR DISTANCIA, PARA QUE LA MISMA NO SE VEA AFECTADA POR EL PESO DEL ACERO.
9. SE ACLARA QUE LOS COMITES SERAN REALIZADOS LOS DIAS JUEVES DE TODAS LAS SEMANAS, 8:00 A.M

En el proyecto se encuentran laborando 13 profesionales, 2 de oficina 70 trabajadores, operarios u obreros para un total de 85.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

2. PROGRAMA DE PROYECTO

Powered by CamScanner

SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.
URBANISMO:
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación DE LAS OBLIGACIONES ESPECIÍFICAS DEL CONTRATO (OBRA Y/O INTERVENTORIA)

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.

5. RIESGOS

Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen
Acción de Proyecto No.

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	

Describa la No Conformidad o compromiso.

Powered by CamScanner

Describa las acciones a implementar.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	AUDLY DUEÑAS	
En Representación de	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS P.A.S.	
Correo electrónico	Obrastec.pral@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3144865620	Firma
NOMBRE	WILSON I. MARTINEZ O.	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	
Correo electrónico	Angwilsonmartinez@yahoo.com.	
Teléfono	3114577777	Firma
NOMBRE	Jaime Madero Alarcon	
En Representación de	CMC 2	
Correo electrónico	Ja.madero@proinark.com	
Teléfono	3002117061	Firma
NOMBRE	Mario Alberto Cabrera	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	Opiaciosocombia@gmail.com	
Teléfono	3102681833	Firma
NOMBRE	Andrés Durán López	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andresduran.arq@gmail.com	
Teléfono		Firma
NOMBRE	Maribel Cubillos N	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	cunimary@gmail.com	
Teléfono	3103317373	
NOMBRE	Ingrid Morales	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	Interventoriassfcc@gmail.com	
Teléfono	3173055694	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		

Powered by CamScanner

Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	24	**FECHA:**	06 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	257 días de ejecución de obra
EJECUTADO FINANCIERO 16.01% Y PORCENTAJE PROGRAMADO 26.17%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato[1], verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA 06/06/2024 SE ENTREGARA LA REPROGRAMACION.

[1] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Powered by CamScanner

2. REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL AVAL EN LOS CAMBIOS EN LOS DISEÑOS PARA EL 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
3. ASENSOR REVISION DE LA CAPACIDAD.

En el proyecto se encuentran laborando 13 profesionales, 2 de oficina 70 trabajadores, operarios u obreros para un total de 85.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

2. PROGRAMA DE PROYECTO

SUMIISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS.
URBANISMO:
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

1. LA INTERVENTORIA SOLICITA SE REALICE LA PROGRAMACION SEMANAL POR PARTE DEL CONTRARTISTA, LA CUAL SERA EL SEGUIMIENTO QUE SE REALIZARA DE AHORA EN ADELANTE PARA VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA DESPUES DEL MODIFICATORIO.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación DE LAS OBLIGACIONES ESPECIÍFICAS DEL CONTRATO (OBRA Y/O INTERVENTORIA)

1. LA ENTIDAD CONTRATANTE (ALCALDIA) REVISARA CON ASIENDA, EL TEMA DE LOS NPS PARA EL TEMA DE PAGOS.
2. EL CONTRATISTA INFORMA QUE LA EPZ NO A FIRMADO LA BIAVILIDAD DE LA CONECCION DE AGUAS LLUNIAS Y AGUAS NEGRAS DEL PROYECTO. LA ALCALDIA REITERARA LA PETICION REALIZADA YA POR EELOS A LA EPZ. REALIZADA EL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
3. LA ALCANDÍA (SUPERVISIÓN) SE COMPROMETE A REVISAR JUNTO CON JURÍDICA COMO MANEJAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL TIEMPO INICIAL VERSUS EL MODIFICATORIO.

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.

1. EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA REALIZARA REVISION DE LA DOCUMETACIOM PARA CORTE NUMERO UNO (1).

5. RIESGOS

Powered by CamScanner

Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

Cuando proceda

1. LA ALACALDIA REVISARA LA REVALIDACION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, LA CUAL VENCE EL 3 DE OCTUBRE, CON EL FIN QUE EL CONTRASTISTA REALICE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA DICHA RENOVACION.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No.

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoria	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES

NOMBRE	Wilson Martinez	Firma
En Representación de	Consorcio Arte 2024	
Correo electrónico		
Teléfono	3114577977	
NOMBRE	Diego Montoya	Firma
En Representación de	Consorcio Arts 2024	
Correo electrónico		
Teléfono	3103326625	
NOMBRE	Andy Leeno	Firma
En Representación de	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
Correo electrónico	obrastec.pot@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3144865980	
NOMBRE		

Powered by CamScanner

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		

Powered by CamScanner

Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[2]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[2] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoría y el Representante Legal.

Powered by CamScanner

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	25	**FECHA:**	13 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	273 días de ejecución de obra
EJECUTADO FINANCIERO 16.68% y PORCENTAJE PROGRAMADO 27.85%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato[1], verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR la interventoría solicita la entrega de la reprogramación ya que se encontraron inconsistencias en la entregada el día 7 de junio de 2024, puesto que se encuentran

[1] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Powered by CamScanner

descripción explicita de actividades de SST y la parte operativa las cuales deben ir incluidas bajo la conformación del plan de contingencia. Pero no se hace alusión al dentro del plan de contingencia en cuanto la especificación del número de cuadrillas, maquinaria, personal, jornadas y/o horarios de trabajo.

2. De acuerdo con el ascensor se indica que el vano del foso es para un ascensor con una capacidad de 2 personas, sin embargo, se realiza solicitud de supervisión que el ascensor sea para 11 personas de acuerdo con el aforo presentado en el proyecto y con lo establecido en el presupuesto, por lo que se realizara cambios estructurales los cuales no afectan el presupuesto ni las dimensiones del proyecto. El contratista indica que en los próximos días enviará especificación de ascensor entregada por el proveedor con el fin de escalar dicha información al consultor para su debido aval. En donde especificara que el foso del ascensor debe ser de 2.20m por 1.65m. lo que según el contratista deberá ampliar el foso 15cm de ancho por 38cm de largo.
3. No se encuentra información de la conexión del transformador y el medidor del proyecto.
4. Se encuentran en recorrido de obra por revisión de interventoría, que la columna L-4 presenta inclinación, por ende, se solicita concepto estructural por parte del especialista del contratista que no presente problemas más adelante por cargas y que el proceso de ejecución cumpla con los establecido, asi mismo la columna K-5 se presentó abombamiento, para lo cual se solicita proceso de reparación de la columna para previa aprobación por especialista de la interventoría antes de realizar el procedimiento.
5. En la Viga VCIM – 103 de acuerdo con lo revisado en planos no se evidencia aceros longitudinales, lo que presenta un momento de flexión a los flejes, por ende, por parte de especialista estructural se solicita la inclusión de aceros longitudinales amarrados a los flejes, lo que evita este inconveniente en la viga en el momento de la fundida de la misma.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo 72 personas
- Personal administrativo contratista 12 profesionales.
- Personal interventoría 7 profesionales.

2. PROGRAMA DE PROYECTO

Fundida DE pilotes.
Demolición de cabezas de pilotes.
Amarre acero vigas de cimentación plazoleta.
Amarre de castillos columnas acceso principal escaleras.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Powered by CamScanner

1. El contratista se compromete a entregar el plan de contingencia el día de mañana 14 de junio de 2024, de acuerdo con la subsanación de observaciones dadas por la interventoria.
2. El Informe ejecutivo de acta de corte se encuentra en revisión por parte de la interventoría
3. La supervisión solicita se realice revisión a los porcentajes entregados ya que se encuentran desbalances de acuerdo con los meses entregados anteriormente. Asi mismo solicita la revisión de los informes de interventoria con respecto a la evidencia de los avances de obra generalizados.
4. De acuerdo con la solicitud realizada el 20 de mayo de 2024, en donde se solicita la disponibilidad de la EPZ de la conexión de las redes de aguas lluvias y aguas negras, se informa por parte de la entidad contratante (Alcaldía municipal) que esta fue firmada y está a la espera de que la recoja el contratista con el fin que autoricen la cuadrilla que realice dicha actividad para conexión por parte de la obra.
5. Las pólizas actualizadas ya fueron entregadas a la supervisión para su revisión.

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.

1. La interventoría solicita la entrega del informe de la amortización del anticipo por parte del contratista. Obteniendo un plan para los cobros de cada una de las actas de corte de obra.
2. El contratista indica que amortizara el 15% del anticipo, en cada una de las actas de corte, y en el acta antes del corte final para la entrega del proyecto amortizara el faltante, la interventoría da a conocer que este porcentaje puede ser igual o mayor al 40% del valor del anticipo; a lo cual el contratista afirma que no es problema para la empresa que se realice de esta forma.

5. RIESGOS

Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No.

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	

Powered by CamScanner

Describa las acciones a implementar.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Wilson Martinez Quintero.	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	ingwilsonmartinez@yahoo.com	
Teléfono	3114517777	
NOMBRE	Maribel Cubillos N.	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	maribeltopografia@gmail.com.	
Teléfono	3103317673	
NOMBRE	Ingrid Morales	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	Ingeniera.sst94@gmail.com	
Teléfono	3173055679	
NOMBRE	Diego Montoya	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	diegomontoya1983@hotmail.com	
Teléfono	3103326625	
NOMBRE	Andy Julieth Dueñas Cabayo	Firma
En Representación de	S.O.P. ALCALDIA DE ZIPAQUIRA	
Correo electrónico	obrastec.pot@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3144865480	
NOMBRE	FRED ARANGO P.	Firma
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	f.arango@proinark.com.	
Teléfono	313-3748697.	
NOMBRE	Jaime Madero	Firma
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	ja.madero@proinark.com	
Teléfono	3002117061	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		

Powered by CamScanner

Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Powered by CamScanner

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[2]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

[2] En caso de *obra:* director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o *apoderado.*
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoría y el Representante Legal.

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	26	**FECHA:**	20 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	273 días de ejecución de obra
EJECUTADO FINANCIERO 16.68% y PORCENTAJE PROGRAMADO 27.85%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato[1], verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. Se entregará la programación por parte del contratista con observaciones, las cuales eran subsanadas para el dia 26 de junio de 2024.

[1] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Powered by CamScanner

2. El contratista se encuentra haciendo revisión de las especificaciones técnicas del ascensor con el fin de realizar la entrega a la interventoria de los cambios a realizar y buscar el aval del consultor
3. Se aprueba las especificaciones de ampliación de foso del ascensor de 1,65 por 2,50m con el fin de cumplir con la capacidad especificada en el diseño (11 personas) y estos se especificará en el plano récord.
4. Se solicita por parte del especialista eléctrico que se comiencen a ejecutar los planos récord.
5. Se solicita por parte del especialista eléctrico de la interventoría que se tengan las precauciones necesarias para la instalación de los pases de tubería atreves de las vigas, la idea es que no halla la necesidad de realizar arañas, y/o nudos que afecten la correcta instalación del cableado.
6. Codensa entrega factura de cobro por porcentaje, mientras Codensa realiza entrega del nuevo medidor, después que el contratista solicito revisión del punto eléctrico. Y este medidor se encuentra deteriorado por mala manipulación.
7. El contratista informa que Enel Codensa ya cuenta con la ubicación exacta para la entrega del punto eléctrico.
8. El procedimiento de reparación de la columna K5 y L5 se aprueba por la interventoría la interventoría solicita se entregué la descripción del procedimeirnto para la reparación de la columna L4 el día marte 25 de junio de 2024.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo 72 personas
- Personal administrativo contratista 12 profesionales.
- Personal interventoría 7 profesionales.

2. PROGRAMA DE PROYECTO

Anexo acta técnica de la parte eléctrica.
Cajas eléctricas al interior de los hallas manejo técnico en corredores

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. El contratista se compromete a entregar el plan de contingencia el día de mañana 14 de junio de 2024, de acuerdo con la subsanación de observaciones dadas por la interventoría.
2. El informe ejecutivo de acta de corte se encuentra en revisión por parte de la interventoría
3. La supervisión solicita se realice revisión a los porcentajes entregados ya que se encuentran desbalances.
4. La interventoría realizara el seguimiento a la conexión de aguas lluvias y aguas residuales del proyecto.

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Powered by CamScanner

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.

5. RIESGOS
Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS
Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Wilson F Martinez O.	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2024	
Correo electrónico	ingwilsonmartinez@yahoo.com.	
Teléfono	3145729979	
NOMBRE	Andy Deñas R.	Firma
En Representación de	Secretaria de obras Públicas	
Correo electrónico	obrastec.prof@zipaquira.gov.co	

Powered by CamScanner

Teléfono		
NOMBRE	Jaime Medero	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	Ja.proinark@gmail.com	
Teléfono	3002147061	Firma
NOMBRE	Carlos Gazzuto	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	C.gazzuto@proinark.com	
Teléfono	6218894.	Firma
NOMBRE	FRED ARANGO P.	
En Representación de	C.M.C.Z.	
Correo electrónico	farango@proinark.com	
Teléfono	313-3489697	Firma
NOMBRE	Julieth Torres Castro.	
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	J.torres@proinark.com.	
Teléfono	3115193734.	
NOMBRE	Maribel Cubillos N.	
En Representación de	Interventoria CB.2024	
Correo electrónico	Manbeltopografia@gmail.com	
Teléfono	3103315877	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		

Powered by CamScanner

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[2]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

_____

[2] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoria y el Representante Legal.

Powered by CamScanner

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	27	**FECHA:**	27 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		**% de avance**	273 días de ejecución de obra
EJECUTADO FINANCIERO 16.68% y PORCENTAJE PROGRAMADO 27.85%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1. El ascensor queda con un área libre de 1.65x 2,25x 1,50 de profundidad. Esta medida sirve para cualquiera de los proveedores que se valla a ejecutar.
2. Codensa manifestara que la instalación de medidor se realizara en los siguientes 15 días hábiles a partir de 14 de junio del presente año. **Caso radicado Enel Codensa 000805661**
3. Los planos récord se están revisando junto con la trazabilidad de la liberación de las actividades, dende se deberá evidenciar los cambios que se homologuen, y de igual manera estos cambios deberá aparecer en la bitácora de obra con el fin de mas adelante realizar la correspondiente verificación.
4. El contratista hace entrega de un oficio en donde evidencia que las columnas no necesitan modificación por problemas estructurales.

Scanned with CamScanner

5. **La interventoría lee las aprobaciones dadas por el especialista estructural, las cuales serán anexadas a esta acta. Junto con el oficio entregado por el interventoría.**
El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades. **En el proyecto se encuentran laborando:** • **Personal operativo 72 personas** • **Personal administrativo contratista 12 profesionales.** • **Personal interventoría 7 profesionales.**
2. PROGRAMA DE PROYECTO
1. **Entrega de programación para el dia sábado 29 de junio del 2024.**
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. **Supervisión solicita a la interventoría Revisar por interventoría el tema de multas, con el fin de iniciar incumplimientos por tema de no entrega de la programación.**
4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.
5. RIESGOS
Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

Scanned with CamScanner

Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Wilson F. Martinez Quintero	Firma
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	Prowilsonmartinez@yahoo.com	
Teléfono	3114577977	
NOMBRE	Fred Arango P.	Firma
En Representación de	C.M.C.Z.	
Correo electrónico	f.arango@proinarc.com	
Teléfono	313. 3789697.	
NOMBRE	Julieta Toms.	Firma
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	J.toms@proinarc.com.	
Teléfono	3115193734.	
NOMBRE	Jaime Madero	Firma
En Representación de	CCZ	
Correo electrónico	M.madero@proinarc.com	
Teléfono	3002117061	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		

Scanned with CamScanner

Teléfono		Firma
NOMBRE	Gerardo Ramos M.	
En Representación de		
Correo electrónico	gerardo.ramos@predial.com	
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoría y el Representante Legal.

Scanned with CamScanner



Zipaquirá, 26 de Junio de 2024

CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-135

Señores
CONSORCIO ARTES 2023
Atn. Ing. JUAN ANDRES PAREDES
Representante Legal
Zipaquirá-Colombia

Asunto: RADICADO INFORME TECNICO SOBRE ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO.


El día 20 junio de 2024, se radicó el comunicado **CMCZ-131** con **asunto "SOLICITUD APORBACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO DE COLUMNAS"**, en el cual se informa las alteraciones presentadas en las las columnas correspondientes a los ejes K/5 y M/5 y su a vez se proponía una solución avalada por el especialista estructural.
Así mismo, damos a conocer dos casos puntuales adicionales:
1-**La columna acartelada L-4** (una de sus caras inclinada) en el eje L/4 presenta un leve giro en su estructura en la parte superior; quedo girada 1,8 cm de su posición original, rango de giro que no genera ningún inconveniente en su diseño estructural pues las caras laterales y la cara posterior están a plomo, por lo que se establece por parte nuestra que seria solo un inconveniente estético leve y normal considerando la altura de la columna 4.06 mts no seria notorio este pequeño giro.

2a columnas K-5 Y 2b col M5 , presentó a la hora de la fundida un abombamiento en una de las caras (cara sur), la cual se dio por una falla en el momento de acodalar o asegurar la formaleta de la columna. Este fue un evento, que se le presento a uno de nuestros subcontratistas en el momento del vaciado del concreto a la columna y fue inevitable corregirlo en el momento porque se podía estallar la columna. Se le dio la instrucción de dejarla con este abombamiento el cual era solo estético para posteriormente mirar cómo se corregía a través de un proceso correctivo.

3-El muro de fachada de 12 cm (que no tiene función estructural) entre ejes M-O vs. eje 1, presentó a la hora de la fundida un abombamiento en la pata del muro (parte inferior), la cual se dio por una falla, que no pertenece a errores técnicos por parte del Consorcio, sino que obedece a falla de un elemento de acero de la formaleta (una corbata) la cual se fracturó. Este acontecimiento es inevitable controlarlo, pues se inspeccionan visualmente antes de instalarlas y se asegura según lo indica el proceso de encofrado y su proveedor.

CONSORCIO
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Nit. 901.722.718-6
Carrera 16 No. 96-64, Oficina 407
Bogotá - Colombia
(601) 6210189
megaconstruccioneszipa@gmail.com


Scanned with CamScanner

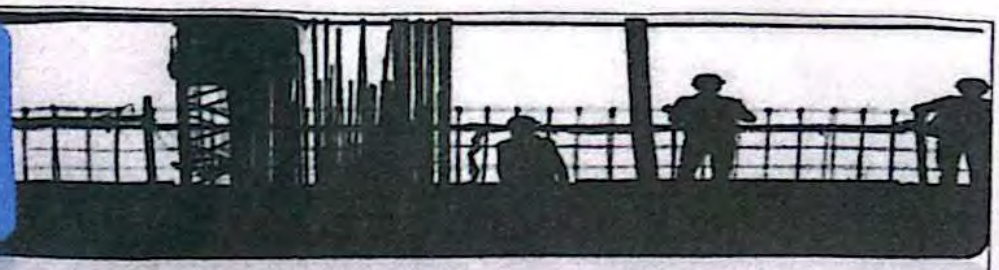

Creemos conveniente no intervenir ningún elemento de los antes mencionados, ya que son alteraciones que no interfieren en su comportamiento estructural, únicamente afecta su condición estética, la cual, analizando los planos arquitectónicos. Hay solución puntual para cada elemento y no afecta directamente el desarrollo ni concepción arquitectónica del proyecto.

A continuación, exponemos cada caso puntual:

1-Plano de ubicación columnas eje L-4

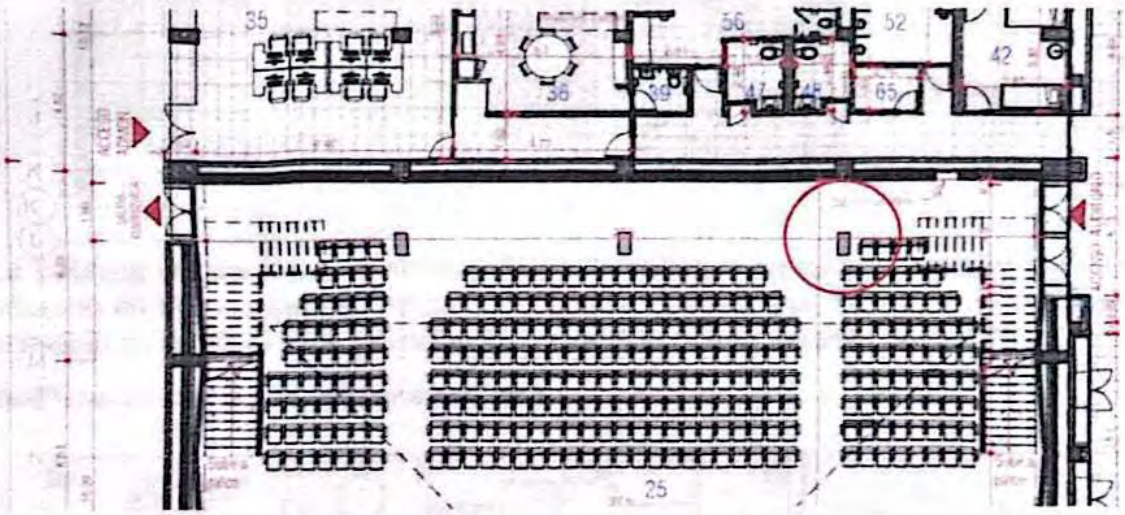


La columna del eje L-4 está enmarcada por varios acabados que corresponden a la fachada interna del auditorio. Está compuesta por: pañete estuco y pintura, lo cual permite corregir en su momento este pequeño giro.

CONSORCIO
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Nit. 901.722.718-6
Carrera 16 No. 96-64, Oficina 407
Bogotá - Colombia
(601) 6210189
megaconstruccioneszipa@gmail.com


Scanned with CamScanner

2a-Plano de ubicación columnas eje K-5

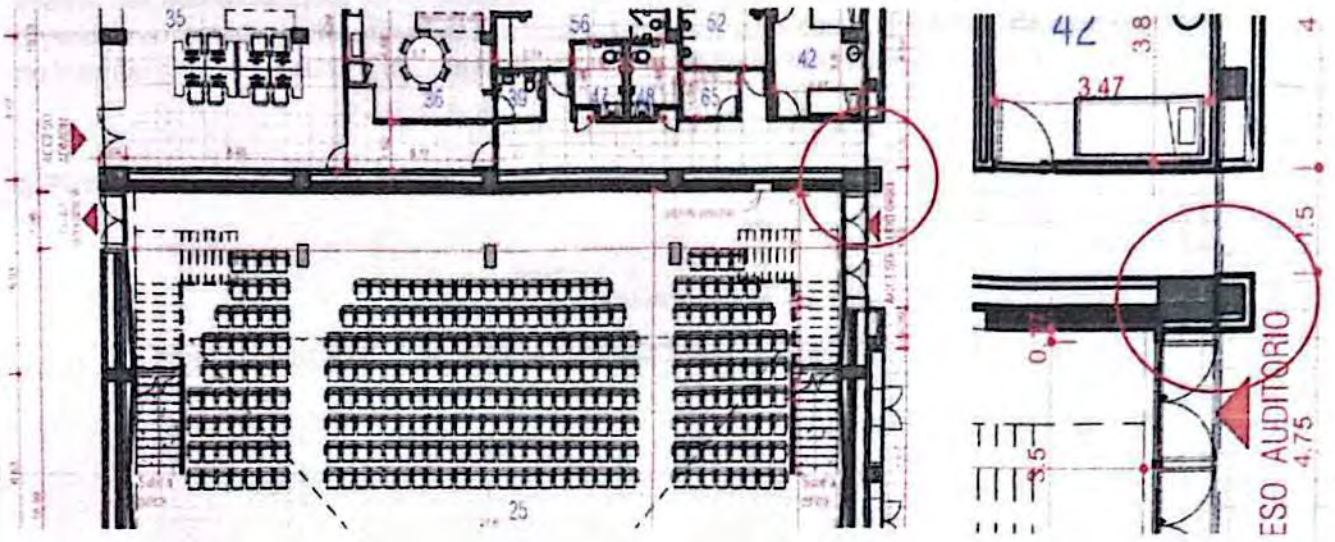

La columna del eje K-5 está enmarcada por la cara que presenta la novedad por un muro adosado en mampostería en bloque junto con su acabado final. La condición actual de este elemento no interfiere en la ejecución del proyecto lo cual no necesita intervenirla.

2b-Plano de ubicación columnas eje M-5

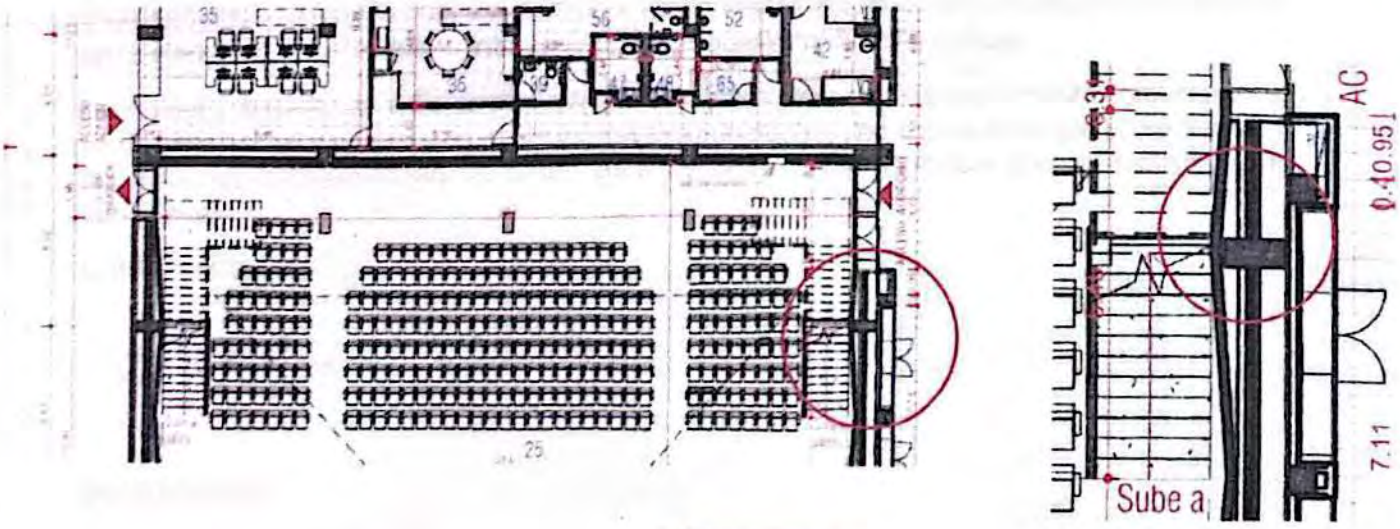

CONSORCIO
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Nit. 901.722.718-6

Carrera 16 No. 96-64, Oficina 407
Bogotá - Colombia
(601) 6210189
megaconstruccioneszipa@gmail.com

Scanned with CamScanner

Bogotá D.C., 26 de Junio de 2024

Señores
CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Atn. Ing. JAIME MADERO
Director de Obra

REF.: RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-131CON RELACIÓN A LA SOLICITUD APROBACION PROCESO CORRECTIVO DE COLUMNAS K-5 y M-5 DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES.

Cordial Saludo,

Se revisa y se AVALA el procedimiento propuesto por ustedes, considerándose apropiado para la anomalía presentada en las columnas K-5 y M-5 del auditorio del proyecto en referencia, acotando que, como se expresa en el oficio es un tema de sobre espesor, sin afectarse en ninguna manera la composición estructural de estos elementos.

Se recomienda buscar tener más medidas de control en los diferentes procedimientos constructivos, tomando los correctivos correspondientes, incluyendo el personal de obra, para buscar minimizar esta problemática.

Atentamente,

ING. ESP. ESTRUCTURAL - DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA
ASESOR ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA
M.P. 15202148513 BYC

Scanned with CamScanner

Bogotá D.C., 26 de junio de 2024

Señores
CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Atn. Ing. JAIME MADERO
Director de Obra

REF.: RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-130 RELACIÓN A LA PROCESO CONSTRUCTIVO PASE DE TUBERIAS EN VIGAS DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES.

Cordial Saludo,

Una vez revisada la propuesta de pase de tubería en vigas, y contrastándolo con lo que dice la NSR-10 en el aparte C.6.3 de donde cita lo siguiente:

REGLAMENTO

que se empleó para calcular su resistencia, o de la requerida para la protección contra el fuego.

C.6.3.5 — Excepto cuando los planos de los ductos y tuberías hayan sido aprobados por el profesional facultado para diseñar, las tuberías y ductos embebidos en una losa, muro o viga (diferentes de los que sólo pasan a través de estos elementos) deben satisfacer C.6.3.5.1 a C.6.3.5.3.

C.6.3.5.1 — No deben tener dimensiones exteriores mayores que 1/3 del espesor total de la losa, muro o viga, donde estén embebidos.

C.6.3.5.2 — No deben estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro o ancho medido de centro a centro.

C.6.3.5.3 — No deben afectar significativamente la resistencia del elemento.

Se puede verificar que cumple con estas condiciones establecidas, teniendo en cuenta que para la placa de cimentación de 45cm de altura libre de vigas el diámetro máximo del pase es de 15cm, que en pulgadas seria como lo estipula la propuesta con 6".

Por lo anterior, esta interventoría AVALA dicha propuesta constatando que no afecta significativamente la estructura original.

Atentamente,

ING. ESP. ESTRUCTURAL - DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA
ASESOR ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA
M.P. 15202148513 BYC

Scanned with CamScanner

CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-130

Señores
CONSORCIO ARTES 2023
Atn. Ing. JUAN ANDRES PAREDES
Representante Legal
Zipaquirá-Colombia

Asunto: RADICADO SOLICITUD APROBACION PROCESO CONSTRUCTIVO PASE DE TUBERIAS EN VIGAS

Referencia: CONTRATO DE OBRA-CO1.PCCNTR.5055621

Por medio de la presente, según lo solicitado en comité de obra, se relaciona el detalle correspondiente al pase de tubería en vigas elaborado por el Ingeniero Felipe Forero estructural del contratista

De lo anterior, el Consorcio Megaconstrucciones Zipa solicita la revisión y aprobación de la ejecución de este proceso constructivo en las zonas donde sea necesario el pase de tubería entre vigas.

Sin otro en particular;

JAIME MADERO
Director de Obra
CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Nit:
Detalle pase de vigas – Asesor estructural

901.722.718Anexo:
CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
Nit. 901.722.718-6
Carrera 16 No. 96-64, Oficina 407
Bogotá - Colombia
(601) 6210189
cmegaconstruccioneszipa@gmail.com

Scanned with CamScanner

FELIPE A. FORERO LUQUE
INGENIERO CIVIL


Bogotá, junio 18 de 2024

Señores
CONSORCIO MEGA COSNTRUCCIONES ZIPA
Atentamente Arq. NELSON ANDRES HERNANDEZ DIAZ
Zipaquirá

REF. PLACA DE CIMENTACION-MODULO AUDITORIO
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA.

Cordial saludo.

Anexo detalle para pases de tuberías en vigas.

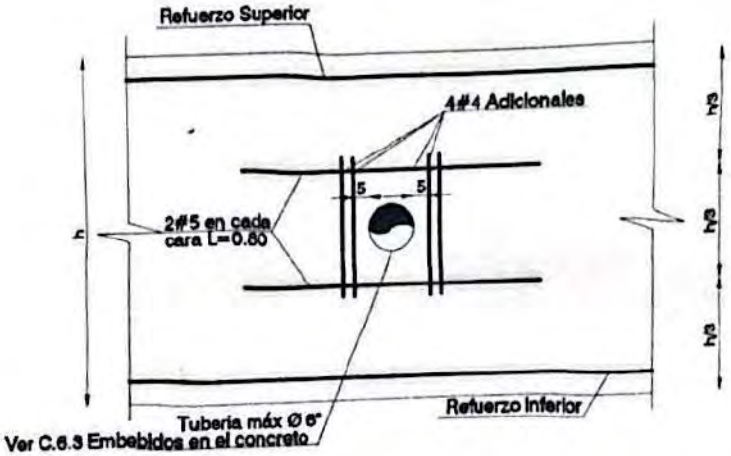

DETALLE DE REFUERZO ADICIONAL EN PASES DE TUBERIAS HORIZONTALES

Cualquier aclaración gustosamente la atenderé.

FELIPE A. FORERO LUQUE
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

CARRERA 66 No 96-80 BOGOTA TELEFONO 315 3323797
forluque@gmail.com

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	28	**FECHA:**	04 DE JULIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoria (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	294 días de ejecución de obra
EJECUTADO FINANCIERO 20.88% y PORCENTAJE PROGRAMADO 22.47%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Toda modificación debe quedar plasmada legalmente en la bitácora.
2. El contratista informa que realizó seguimiento al tema de la conexión y cambio del transformador el cual al día de hoy no ha tenido respuesta.
3. La supervisión realiza la observación que la tubería del filtro francés no está contando con el cambio de tubería, y no hace parte de la especificación técnica.
4. El capítulo de impermeabilización no está incluido en el presupuesto. La supervisión solicita que el contratista realice este trabajo para enviar a la supervisión del proyecto e ir mirando la posibilidad de realizar una adición presupuestal al proyecto.

Powered by CamScanner

5. El consultor evidenció y propuso un cambio de especificaciones para el cambio de material de la fachada en algunas áreas.
6. Los tanques no tienen rebose.
7. No se tiene previsto Juntas de Construcción entre los bloques. Estas deberán ser de 5.00cm, el contratista pregunta ¿Qué elemento estructural puede utilizar?
8. El constructor propone cambio de tuberías PVC y EMT a HCH40. Se propone realizar mesa de trabajo con el especialista eléctrico el día 11 de junio del presente año para revisar ese tema.
9. Polivalente lleva una cuneta prefabricada hacia las vigas principales, se solicita al constructor colocar el cambio de la especificación en la bitácora.

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo:
- Personal administrativo contratista:
- Personal interventoría:

2. PROGRAMA DE PROYECTO

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. La interventoría dice que el porcentaje de atraso para multa es el 0.5% la supervisión revisará este porcentaje con la parte jurídica para ver si hay necesidad de realizar y/o solicitar otro.
2. La supervisión se compromete a realizar entrega el día de hoy a las observaciones sobre el corte.
3. La licencia de construcción pierde vigencia en dos meses, la supervisión analizará que documentos adicionales al porcentaje del 50% de la estructura se deben anexar.
4. Interventoría solicita se realice entrega del paz y salvo del personal que al día de hoy se ha retirado de la obra.

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.

5. RIESGOS

Powered by CamScanner

Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS
Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoria	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Andrés Duran López	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andresduran.arq@gmail.com	
Teléfono	3213147567	Firma
NOMBRE	MARILYN NICOLLE RODRIGUEZ B.	
En Representación de	INTERVENTORÍA	
Correo electrónico	CONSORCIOARTES2023@GMAIL.COM	
Teléfono	3107209930	Firma
NOMBRE	Heribel Cubillos N.	
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Consorcioartes2023@gmail.com	
Teléfono	310 3215673	Firma
NOMBRE		

Powered by CamScanner

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE	Yaro Albert Arenas M	
En Representación de	Consorcio aires 2023 cgpal. -	
Correo electrónico	aplicaciones colombia @ gmail.-	
Teléfono	3102681639	Firma
NOMBRE	Jaime Medoro	
En Representación de	C.M.C.	
Correo electrónico	ja.medoro@hotmail.com	
Teléfono	3002117061	
NOMBRE	Andy Daza R.	
En Representación de	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
Correo electrónico	obrastec.prof@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3144865480	Firma
NOMBRE	Wilson Martinez Q.	
En Representación de	CGM Artes 2023	
Correo electrónico		
Teléfono	3114577977	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		

Powered by CamScanner

Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoria y el Representante Legal.

Powered by CamScanner

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	29	**FECHA:**	11 DE JULIO DE 2024
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoria (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	301 días de ejecución de obra
EJECUTADO EJECUTADO 21.41% y PORCENTAJE PROGRAMADO 23.80%			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del acta se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Interventoría solicita realizar un control en taller de la estructura metálica. El contratista confirmar fecha de la visita a taller.
2. El contratista oficia unas jnconsistencias en la estructura para que se realice reunión con el consultor estructural para revisar los hallazgos de la estructura.
3. La interventoría afirma que hay un tema con la visita del consultor estructural desde ya hace un tiempo. El cual no ha dado respuesta sobre esta. Se hablará este tema con la supervisión.
4. La interventoría evidencia que el tema del tanque ya fue revisado y mencionó que hay unas observaciones que el contratista deberá subsanar con el fin de dar aprobación.

Powered by CamScanner

5. El contratista vuelve a hacer acotación de que el proyecto no cuenta con el ítem de impermeabilización en las terrazas, y que es evidente que se debe realizar, esta para no afectar las áreas debajo de estas, las cuales tienen acabados en madera, terminaciones acústicas, cielo raso, que pueden verse afectados si no se realiza como se debe esta impermeabilización.
6. La interventoría sugiere al contratista que debe entregar planos con las áreas a impermeabilizar.
7. El contratista y la interventoría aclaran que para este tipo de proyectos la supervisión debería tener un Supervisor estructural independiente; el cual debe estar legalmente dentro del contrato, la interventoría lo va a notificar a la supervisión en el próximo comité. Con el fin que este inicie a firmar los cambios a nivel estructural.
8. Las juntas de dilatación, el contratista oficiara para escalar este tema y que el consultor de su opinión sobre el tema.
9. La interventoría afirma que el criterio para la toma de decisión del cambio de tubería eléctrica, será oficiado sobre lo que el contratista debe tener en cuenta porque la verdad hasta el momento no es válida del concepto que emite el contratista para realizar ese cambio. Se cuadra reunión con constructor e interventoría para el tema eléctrico queda para el martes 16 de julio a las 9:00 am.
10. La interventoría solicita que el diseño de sonido tenga la experticia para que este acorde con las áreas en donde se va a implementar.
11. La factibilidad de la instalación de la energía a la obra es de un año y en papeles esta desde el 2021, se debe oficializar mediante documento donde se indicará las recomendaciones para este tema.

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo:
- Personal administrativo contratista:
- Personal interventoría:

2. PROGRAMA DE PROYECTO

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Powered by CamScanner

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros.
5. RIESGOS
Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS
Cuando proceda

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Andres Duran Lopez	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andres.duran.alq@gmail.com	
Teléfono	321 3147567	Firma
NOMBRE	MARLYN NICOLLE RODRIGUEZ D.	
En Representación de	INTERVENTORIA.	
Correo electrónico	CONSORCIOARTES2023@GMAIL.COM	Firma

Powered by CamScanner

Teléfono		
NOMBRE	Heribel Cubillos N.	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	Consorciocaites2023@gmail.com.	
Teléfono	3103315673	Firma
NOMBRE	Hans Albert Gutierrez	
En Representación de	Consorciocaites 2023@gmail.c	
Correo electrónico	aplicaproyectos2018@gmail.c	
Teléfono		Firma
NOMBRE	Jaime Medina	
En Representación de	CMCT	
Correo electrónico	Ja.madero	
Teléfono	3002117061	Firma
NOMBRE	Wilson Martinez O	
En Representación de	C. Artel 2023	
Correo electrónico		
Teléfono	3114577977	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		

Powered by CamScanner

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

_____

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el Director de Interventoría y el Representante Legal.

Powered by CamScanner

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: InterventoríaCopia: Contratista

Powered by CamScanner
