DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VECINDAD

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. CONTRATO :	CO1.PCCNTR.5055621						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA								
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023								
SUPERVISOR:	ING. FERNANDO FORERO						CARGO	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS ZIPAQUIRA	
No. REGISTRO		FECHA	12/12/23	ELABORÓ	ARQ. DANIEL HUERTAS		REVISÓ	ING. FRED ARANGO	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
DIRECCIÓN	AVENIDA INDUSTRIAL		
TELÉFONO	3124813129	No. PISOS	N/A
FRENTE (Mts)	268,57 MTS	ESTRATO	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	RED MUNICIPAL
ALCANTARILLADO	S	RED MUNICIPAL
ENERGÍA	S	RED MUNICIPAL
TELÉFONO	S	OPERADORES PRIVADOS
GAS	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELEVISIÓN - CABLE	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL	
OBSERVACIONES - DESCRIPCION:	AVENIDA INDUSTRIAL KM 267		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

VIA AVENIDA INDUSTRIAL, ASFALTADA DE TRES CARRILLES. VÍA EN BUEN ESTADO, BORDILLO Y SARDINELES EN VARIOS PUNTOS GOLPEADOS, SUMIDEROS TAPADOS CON BASURA, APARENTEMENTE SIN MANTENIMIENTO, RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS, CON POZOS DE INSPECCION, CON TAPAS EN CONCRETO EN BUEN ESTADO. CUENTA CON 9 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA VÍA, TODOS EN BUEN ESTADO Y UNA SEÑAL DE LIMITE DE VELOCIDAD EN MAL ESTADO. SEPARADOR VERDE, SIN MANTENIIENTO POR EL QUE PASA LINEA DE ALTA TENSION.

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Fred Arango P.	Nombre: Wilson Martinez Quintero
C.C. / NIT	C.C. / NIT 19788168.	C.C. / NIT 1160275
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Daniel Huertas Serrazin
ARQ. DANIEL HUERTAS
1070769270

Original: S.O.P
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VECINDAD

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. CONTRATO :			CO1.PCCNTR.5055621				Hoja	1 de 1	
OBJETO:			CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA:			CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA						
INTERVENTOR:			CONSORCIO ARTES 2023						
SUPERVISOR:			ING. FERNANDO ROPERO				CARGO	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS ZIPAQUIRA	
No. REGISTRO		FECHA	12/12/23	ELABORÓ	ARQ. DANIEL HUERTAS		REVISÓ	ING. FRED ARANGO	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA DEL PREDIO









"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
DIRECCIÓN	AVENIDA INDUSTRIAL		
TELÉFONO	3124813129	No. PISOS	N/A
FRENTE (Mts)	218 MTS	ESTRATO	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	CONTADOR SUMINISTRADO POR EL ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO	S	APARENTEMENTE SI CONECTA A LA RED DE AGUAS NEGRAS
ENERGÍA	S	CUENTA CON POSTES DE ENERGIA INTERNOS
TELÉFONO	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
GAS	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELEVISIÓN - CABLE	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL	X	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL	
OBSERVACIONES - DESCRIPCION:	AVENIDA INDUSTRIAL # 1-207				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

LOTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA QUE COLINDA CON EL PROYECTO EN EL COSTADO OCCIDENTAL CON 72 MTS Y POR EL COSTADO SUR CON 146 MTS. ES UN LOTE EN EL QUE ACUMULAN RESIDUOS VARIOS Y TIENEN ARRENDADO PARA GANADO. EL LOTE SE ENCUENTRA CON CERRAMIENTO EN CERCA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS, ASI MISMO UN ACCESO EN PORTON EN MADERA, QUE PRESENTA DETERIORO POR EL TIEMPO. EL PASTO ALTO, NO PERMITE DAR CUENTA DEL ESTADO ACTUAL DEL SUELO, QUE PARECE ESTAR EN BUEN ESTADO, UNIFORME. CUENTA CON ARBOLES SIN REGISTRO DE LA CAR, POSEE UNA QUEBRADA QUE NO SE HA DRAGADO NI SE HA HECHO MANTENIMIENTO, LO CUAL PRESENTA UN RIESGO PARA EL LOTE Y EL PROYECTO.

Firma
Nombre:
C.C. / NIT
PROPIETARIO DEL PREDIO

Firma
Nombre: FRED ARANGO P.
C.C. / NIT 19488701.
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Daniel Huertas Serrano
ARQ. DANIEL HUERTAS
1020769270

Firma
Nombre: Wilson Martinez Quintero
C.C. / NIT 7160215
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
WM MARTINEZ Q.

Original: S.O.P
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VECINDAD

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. CONTRATO :	CO1.PCCNTR.5055621						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA								
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARTES 2023								
SUPERVISOR:	ING. FERNANDO FORERO						CARGO	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS ZIPAQUIRA	
No. REGISTRO		FECHA	12/12/23	ELABORÓ	ARQ. DANIEL HUERTAS		REVISÓ	ING. FRED ARANGO	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA DEL PREDIO

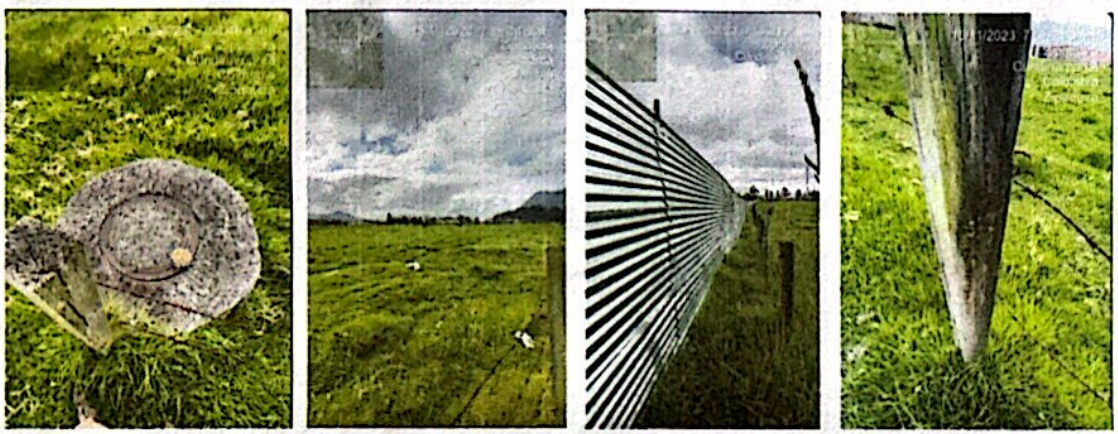

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	NO SE TIENE CONOCIMIENTO, SE HA IDO VARIAS VECES PERO NO HAY NADIE		
DIRECCIÓN	AVENIDA INDUSTRIAL		
TELÉFONO		No. PISOS	N/A
FRENTE (Mts)	215,41 MTS	ESTRATO	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
ALCANTARILLADO	S	PRESENTA UNA RED MUNICIAPL PARA VIA ALAMEDA DEL ZIPA
ENERGÍA	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELÉFONO	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
GAS	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
TELEVISIÓN - CABLE	N	NO SE TIENE CONOCIMIENTO
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL	X	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL	
OBSERVACIONES - DESCRIPCION:	AVENIDA INDUSTRIAL #1-207				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

LOTE VALDIO EL CUAL NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, YA QUE E VARIAS OCACISONES NOS HEMOS ACERCADO Y NO SE HA LOGRADO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROPIETARIO. LOTE REGULAR EN TOPOGRIA CON RED DE ALCANTARILLADO INSTALADA, Y CON CERCAS EN ESTADO REGULAR DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS. EL CERRAMIENTO DE LA OBRA QUEDÓ SEPARADO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS FUTUROS.

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Fred Arango R.	Nombre: Wilson Martinez Quintero
C.C. / NIT	C.C. / NIT 19.322.161	C.C. / NIT 7160275
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Arq. Daniel Huertas Sanchez
ARQ. DANIEL HUERTAS
1020769276

Original: S.O.
Copias: Contratista, Interventoria, Propietari

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 02 de mayo de 2024. IN-CA2023-5347795-109

Señores
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS
ARQ. SANDRA ATUESTA
Secretaria de Obras Públicas
Zipaquirá.

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN MODIFICATORIO

Respetados Señores:

Esta interventoría, en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del marco del contrato de la referencia y en seguimiento al contrato de obra, remitimos para su REVISIÓN Y APROBACIÓN el modificatorio 001 del proyecto en ejecución.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente



ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ARTES 2023

	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA	CA-1-001
	CONSORCIO ARTES 2023	VERSIÓN No. 1
	ACTA DE ACEPTACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES	

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Fecha de aceptación de estudios y diseños aportados | 20 | 12 | 23 |

Contrato de Obra No. CO.1PCCNTR.5055621 **Fecha de suscripción** | 19 | 9 | 23 |

Contratista CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

Objeto:

"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA"

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5347795 **Fecha de suscripción** | 19 | 9 | 23 |

Interventor CONSORCIO ARTES 2023

Objeto:

"INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203

INFORMACIÓN DEL PROYECTO REVISADO

Región: ANDINA **Departamento:** BOGOTA D.C. **Municipio** ZIPAQUIRÁ

Nombre de la institución cultural: CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

Nombre de la sede a intervenir: CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ **ZIPAQUIRÁ** **Urbano** X **Rural**

Dirección del predio AVENIDA INDUSTRIAL 1-207 **Barrio/Corregimiento / Vereda:** **VEREDA PORTACHUELO**

Consultor encargado de la elaboración de los estudios y diseños NCR INGENIERIA SAS – CONSORCIO DISEÑOS ZIPQUIRÁ CULTURAL

Contratante: ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

A continuación, las partes manifiestan su conformidad con los estudios y diseños proporcionados por el Municipio de Zipaquirá para iniciar la construcción. Los cuales consideran adecuados y apropiados como base para ejecutar la obra contratada por la Entidad. Asimismo, mediante la firma de esta acta certifican que dichos productos son idóneos para llevar a cabo la construcción del Centro Cultural de Zipaquirá.

NOTA: No obstante, es importante aclarar que lo anterior no implica asumir la responsabilidad correspondiente a los consultores que desarrollaron los estudios y diseños. Además, se requiere la asistencia del consultor y sus asesores para resolver observaciones menores que aún no se han identificado.

EL CONSORICIO ARTES 2023 deja constancia de que, respecto a todos los estudios entregados por la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, se han realizado algunas observaciones a la consultoría. En consultoría, estos diseños necesitan complementos que se irán implementando a lo largo de la construcción del proyecto, y podrían surgir modificaciones que generen variaciones en las cantidades de obra, así como obras adicionales.

PRODUCTO REVISADO Y ACEPTADO		
ÍTEM	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
Diseño Arquitectónico	Revisión a los ajustes al diseño arquitectónico	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Diseño Estructural	Revisión a los ajustes al diseño Estructural	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Diseño hidráulico	Revisión a los ajustes al diseño hidráulico	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Diseño eléctrico	Revisión a los ajustes al diseño eléctrico	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Estudio de Suelos	Revisión al estudio de suelos	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Diseño topográfico	Revisión al levantamiento topográfico	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra
Diseño Acústico	Revisión a los ajustes al diseño acústico	Quedan pendientes los ajustes y los complementos a los diseños que se realizarán en obra.
LICENCIAS Y PERMISOS DE ENTIDADES PUBLICAS	Revisión a las Licencias y permisos	Quedan pendientes los documentos faltantes para el trámite de TPO de obra y conexión de servicios públicos.

APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA

Rep. Legal: NELSON ANDRES HERNANDEZ DIAZ

CC 79.752.237

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARTES 2023

Rep. Legal JUAN ANDRES PAREDES

CC 79.940.439

SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA

Nombre Completo

C.C

	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	CA-003
	CONSORCIO ARTES 2023	Versión 01
	ACTA DE APROBACIÓN DE ENSAYOS DE RESISTENCIA Y FLUIDEZ DE CONCRETOS Y PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES	

Obra:	Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas de Zipaquirá, Cundinamarca		
Contrato de Obra:	CO1.PCCNTR.5055621	**Contratista:**	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
Contrato de Interventoría	CO1.PCCNTR.5347795	**Interventor :**	CONSORCIO ARTES 2023

Fecha elaboración de acta:	17 de julio de 2024	Lugar:	Zipaquirá, Cundinamarca

1. OBJETO DEL ACTA

Este documento tiene como propósito deja constancia de la aprobación de los resultados de los ensayos de resistencias y fluidez de concretos, y de las pruebas de integridad de pilotes ejecutadas en el marco del contrato de construcción del Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas de Zipaquirá, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

2. ENSAYOS DE CONCRETO

A continuación, se detallan los resultados de los ensayos de resistencia y fluidez de concretos realizados:

Ensayos de resistencia a la comprensión:

Periodo analizado:	21/02/2024 al 17/02/2024	
Proveedor de servicios de laboratorio:	JML ENSAYOS E INGENIERIA S.A.S	
Tipo de concreto:	Concreto Tremie	
Resultados Obtenidos:	**Edad de los cilindros:**	28 días
	Resistencia promedio:	30 MPa
	Resistencia especificada en el diseño:	28 MPa
Observación:	Los resultados cumplen con la resistencia especificada en el diseño, de acuerdo con la Norma NSR-10 y especificaciones contractuales.	


Ensayos de fluidez (Cono de Abrams; Slump test):

Periodo analizado:	23/01/2024 al 17/07/2024	
Tipo de concreto:	Concreto Tremie	
Resultados Obtenidos:	**Asentamiento promedio:**	10"
	Rango especificado:	10"
Observación:	Los resultados cumplen con el rango especificado.	

	CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	CA-003
	CONSORCIO ARTES 2023	Versión 01
	ACTA DE APROBACIÓN DE ENSAYOS DE RESISTENCIA Y FLUIDEZ DE CONCRETOS Y PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES	

3. PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PILOTES			
Se resumen los resultados de las pruebas de integridad de pilotes realizadas:			
Periodo analizado:			
Proveedor de servicios de laboratorio:	JML ENSAYOS E INGENIERIA S.A.S		
Número de pilotes evaluados:	91		
Resultados:	**Integridad:**	Integridad verificada en 91 pilotes	
	Anomalías detectadas:	No se detectan	
Observación:	Las pruebas cumplen con los criterios de integridad y seguridad estructural definidos en el diseño y en las especificaciones contractuales.		

4. CONCLUSIONES Y APROBACIÓN
Despues de revisar y analizar los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas mencionadas, se concluye que:
- Los ensayos de resistencia y fluidez de concreto cumplen con las especificaciones técnias requeridad.
- Las pruebas de integridad de pilotes cumplen con los requisitos de integridad y seguridad estructural.

5. FIRMAS			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**FECHA**
Wilson Martínez	Residente de interventoría		17 de julio de 2024
Fred Arango	Residente de contratista		17 de julio de 2024
JML ENSAYOS E INGENIERIA S.A.S	Representante de laboratorio		17 de julio de 2024

TOPOGRAFIA

INFORME ACTA 01

Centro cultural zipa


Contrato de Interventoría



TOPOGRAFA

Maribel Cubillos Nieto

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

Responsables	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboró	Maribel Cubillos N.		
	TOPOGRAFA		
Revisó			
	DIRECTOR INTERVENTORIA		
Aprobó			
	SUPERVISOR		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	N de Copias	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
INTERVENTORIA	1	02/08/2024	ACTIVIDADES REVISADAS Y APROBADAS POR TOPOGRAFIA ACTA DE CORTE 01

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 4

3 PRELIMINAR 5

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO. 5

4 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES 6

4.1 REVISON DE COORDENADAS DE LOS DISTINTOS DELTAS. 6
4.2 RELLENO EN MATERIAL COMUN (RECEBO) 7
4.3 REVISON Y RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS. 8
4.4 REVISION Y RECIBO DE PILOTAJE 8
4.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 9

5 REGISTRO FOTOGRAFICO 10

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 11

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Ilustración 1: Localización del Municipio ZIPAQUIRA. 4
Ilustración 2: localización excavación y relleno 7
Ilustración 3: localización estructuras 9

Tabla 1: Coordenadas Gps, proyecto 6
Tabla 2: DELTAS DE TRABAJO 7
Tabla 3: Localización redes y filtros 8

1 INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de ZIPAQUIRA, manifestó el interés de contratar los la interventoría para la ejecución del proyecto. CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

Este informe hace parte del PRODUCTO: TOPOGRAFIA. El cual incluye la revisión y verificación de cotas y coordenadas de las diferentes actividades realizadas en el proyecto. Siendo este el informe correspondiente al acta 02.

2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 LOCALIZACIÓN



Ilustración 1: Localización del Municipio ZIPAQUIRA.

Zipaquirá es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Sabana Centro, de la que es capital y sede de su diócesis. Se encuentra a 29 kilómetros de Bogotá, hace parte de su área metropolitana; a 450 kilómetros de Medellín, y a 117 kilómetros de Tunja.

Es el segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de explotación de sal más importantes del país, razón por la que también es conocida como la Capital Salinera de Colombia.

El lote limita al norte con la Avenida Industrial, al oeste con la Plaza de Ferias, y al este y al sur con predios privados sin construcciones. En cuanto a aislamientos se plantean 15m frente a la vía Avenida Industrial. Teniendo presente la vía proyectada desde el POT como Alameda el Zipa al costado oriente del lote se es necesario un aislamiento de 22.5m más un antejardín de 5m para un total de 27.5m de retiro. Finalmente se destaca un cuerpo de agua que cruza por el centro del lote lo que implica un aislamiento de 30m a cada lado de este.

3 PRELIMINAR

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO.

Topográficamente esta sección territorial está dividida en dos regiones bien definidas:
a. Región plana situada al oriente, rica en pastos aprovechados para la ganadería.
b. Región montañosa situada al occidente, (rica en minerales) entre la que se destacan entre otras las siguientes alturas:
- El cerro del Zipa bajo el cual se encuentra la mina y su monumental templo subterráneo de sal, el Páramo de Guerrero rico en yacimientos de carbón, la serranía de Ventalarga con Pantano Redondo
- El cerro del Calzón.

Centro Cultural y de Convenciones se construye en el lote propuesto por parte de la Alcaldía de Zipaquirá, el cual se encuentra ubicado sobre la Avenida Industrial en el área urbana sector La Fragüita en un lote contiguo al Frigorífico del Municipio. De acuerdo con el concepto de norma urbanística está identificado con No Catastral 01-00-0718-0001-000.
Este lote cuenta con tratamiento de desarrollo establecido en el Acuerdo 12 de 2013 “Por el cual se modifica excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquirá, adoptado mediante el Acuerdo No. 12 de 2000 y ajustado mediante el Acuerdo No. 008 de 2003; y se dictan otras disposiciones según plano CU-02 “Tratamiento en suelo urbano y de expansión urbana”.

4 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES

4.1 REVISON DE COORDENADAS DE LOS DISTINTOS DELTAS.

El contratista instala dos GPS en el punto base que transmite al GPS Rover los datos suficientes para generar una solución fija, se utilizó una máscara de elevación de 15°, el GPS base y Rover quedaron configurados de manera que cada época es igual a 1 segundo.

Una vez verificada la información de los GPS y revisada la información de campo, se procedió a hacer una toma de datos del predio actual para poder obtener una rasante actual, para posteriores excavaciones tener la información y poder calcular volúmenes.

Se presentan unos volúmenes por parte del contratista los cuales se dejan como informativo, las cantidades exactas de excavación se irán calculando con forme se realicen las excavaciones.

Se presenta un plano de implantación del proyecto, para revisión y aprobación por la entidad.

Tabla 1: Coordenadas Gps, proyecto

- Gauss Kruger.

ORIGEN GAUSS KRUGER			
IDENTIDICACION	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1–3212220568	1045795.349	1008861.812	2545.146 m
GPS 2 –3212220568	1045796.356	1008670.019	2544.847 m


- Origen Nacional.

ORIGEN NACIONAL			COTA
GPS 1-3212220568	2111717.642	4889452.376	2545.146 m
GPS 2-3212220568	2111718.963	4889260.788	2544.847 m



Fuente: propia

Tabla 2: DELTAS DE TRABAJO

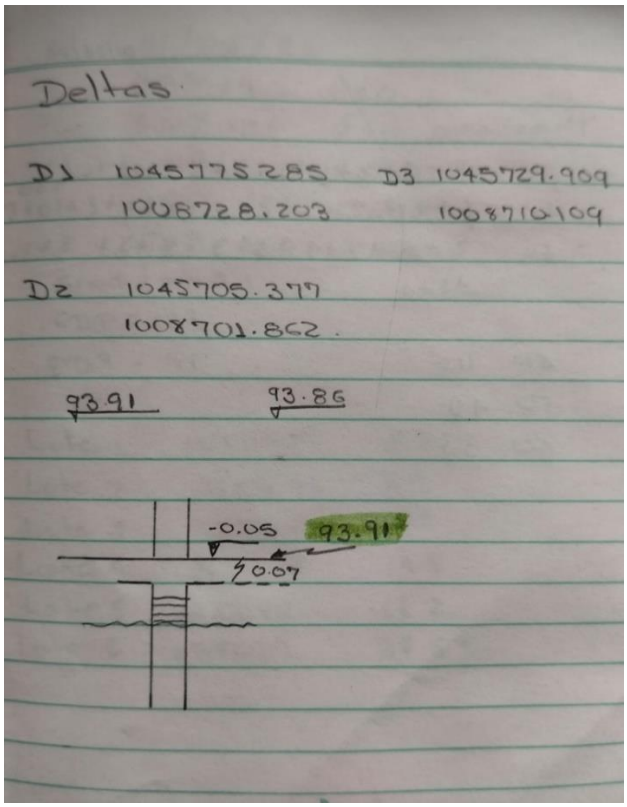


Fuente: Propia

4.2 RELLENO EN MATERIAL COMUN (RECEBO)

Se realiza excavación y relleno del terreno natural. El relleno es material recebo común.


Ilustración 2: localización excavación y relleno

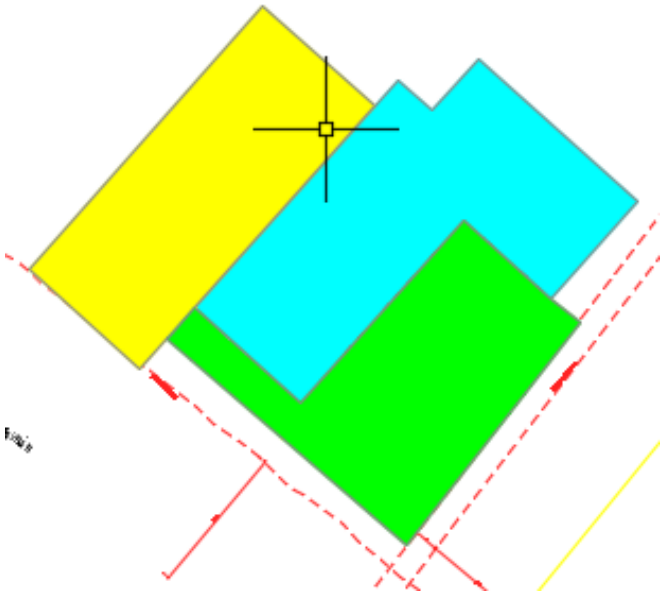

4.3 REVISON Y RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS.

Durante el periodo se inició el replanteo de redes hidrosanitarias en el área del Auditorio y la plazoleta y posterior excavación de las mismas.
Se dejan escantillones para excavación. Actividad realizada en conjunto entre topografía del contratista e interventoría


Tabla 3: Localización redes y filtros

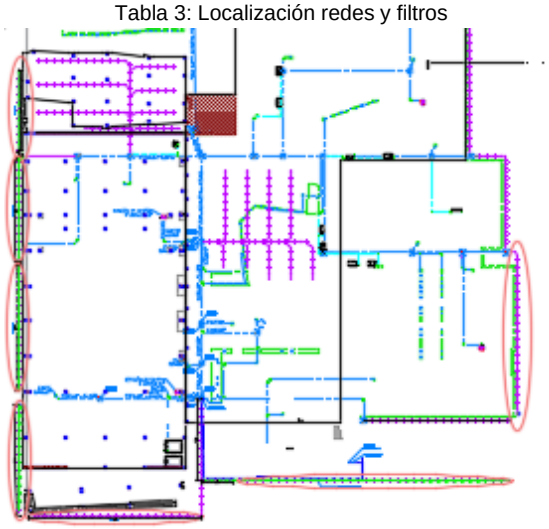

Fuente: propia

4.4 REVISION Y RECIBO DE PILOTAJE


mes se continuo con la actividad de excavación y fundida de pilotes, los cuales son replantados por la comisión de topografía del contratista y verificados y recibidos por esta interventoría. Se revisan coordenadas y cota de terminado de canasta en acero. Se dejan 4 cm altas, pero se ha observado que el asentamiento de estas canastas en algunos casos en mayor a los 4 cm.

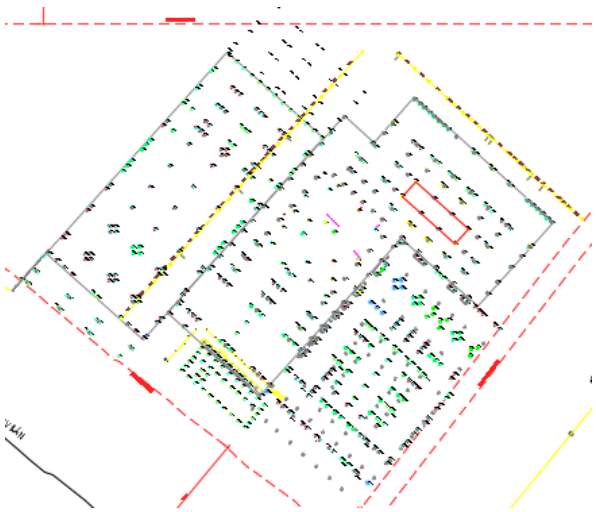

4.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Durante el periodo se replantearon vigas y columnas de salones y de la placa de entre piso del auditorio, plazoleta y salones se dejaron materializados en estacas y placa de piso con pintura y puntilla, se replantearon vigas y columnas del auditorio y plazoleta para el amarre del acero e izada de castillos de las columnas, de igual forma se replantearon los ejes de la fase tres y se dejaron materializados en estacas y monumentos en concreto para garantizar que no se muevan. Se dejaron marcados los ejes las aulas y plazoleta, se realizó seguimiento de las diferentes áreas y ejes marcados con anterioridad, se revisan escuadras para dar inicio a las actividades de replanteo de mampostería.

Ilustración 3: localización estructuras

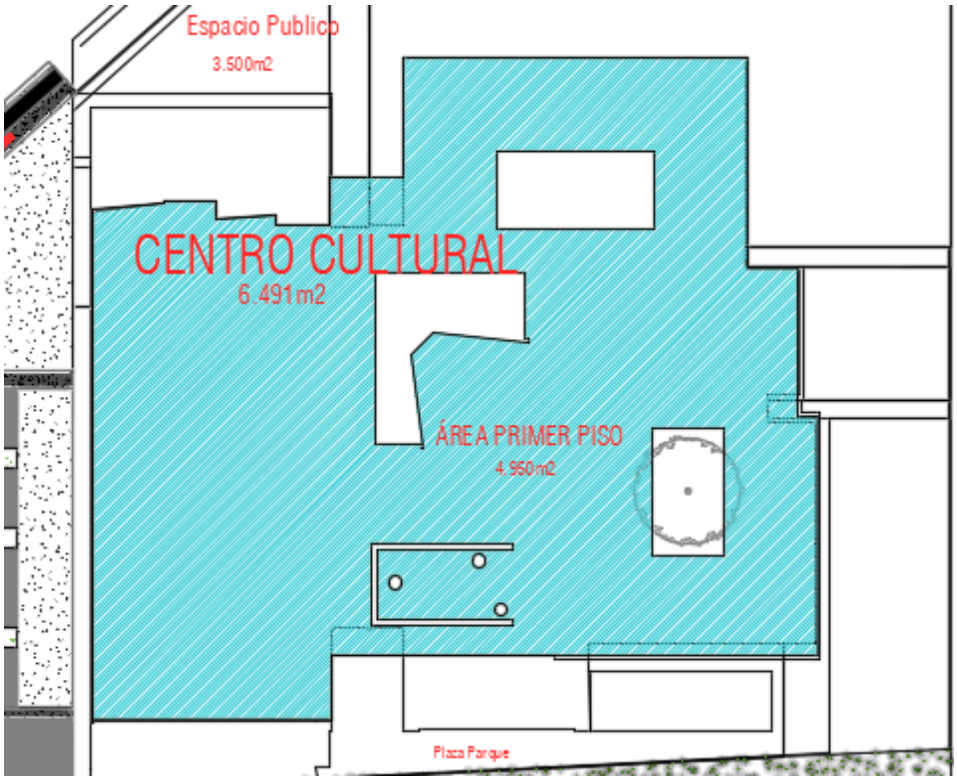

Fuente: archivo Proyecto

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Replanteo de ejes para cimientos</td><td>Revisión y control niveles estructuras</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Revisión y replanteo de redes hidrosanitarias.</td><td>Revisión e inspección de actividades topográficas.</td></tr>
</table>

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El contratista realizo la georeferenciación de 2 placas en bronce y posterior levantamiento topográfico del área donde se realizará el proyecto. Actividad supervisada y recibida por interventoría.

- El contratista inicia actividades de replanteo, excavación y relleno del área donde se ejecutará el proyecto. Se controla por topografía cotas de excavación y relleno.

- Se reviso replanteo de pilotes y cota terminado de canasta en acero cota 2593.86, cota cero (0.00) del proyecto 2593.96

- Se realizaron actividades de replanteo de ejes zona plazoleta y auditorio, dejando los ejes marcados en estacas con pintilla.

- Se marcaron estantíllanos para excavación de redes hidrosanitarias y filtros del auditorio, Plazoleta y salones.

- Se realiza el recibido de las diferentes actividades por topografía teniendo una tolerancia de +/- 0.005 m.

- Los equipos utilizados por el contratista tienen vigente los certificados de calibración.

TOPOGRAFIA

INFORME ACTA 02

Centro cultural zipa


Contrato de Interventoría



TOPOGRAFA

Maribel Cubillos Nieto

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

Responsables	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboró	Maribel Cubillos N.		
	TOPOGRAFA		
Revisó			
	DIRECTOR INTERVENTORIA		
Aprobó			
	SUPERVISOR		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	N de Copias	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
INTERVENTORIA	1	02/09/2024	ACTIVIDADES REVISADAS Y APROBADAS POR TOPOGRAFIA ACTA DE CORTE 02

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 4

3 PRELIMINAR 5

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO. 5

4 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES 6

4.1 REVISON DE COORDENADAS DE LOS DISTINTOS DELTAS. 6
4.2 REVISON Y RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS. 7
4.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 12
4.4 LOCALIZACION DE PLATINAS ESTRUCTURA METALICA 14

5 REGISTRO FOTOGRAFICO 16

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 17

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Ilustración 1: Localización del Municipio ZIPAQUIRA. 4
Ilustración 2: Redes Instaladas 8
Ilustración 3: localización estructuras 12
Ilustración 4: excavación mecánica del tanque 13
Ilustración 5: localización platinas auditorio 14

Tabla 1: Coordenadas Gps, proyecto 6
Tabla 2: DELTAS DE TRABAJO 6
Tabla 3: Resumen de cantidades redes hidrosanitarias 7
Tabla 4: Coordenadas replanteadas. 12
Tabla 5: Coordenadas replanteadas Tanque. 13
Tabla 6: Coordenadas replanteo placa entrepiso Auditorio y aula polivalente 14
Tabla 7: coordenadas replanteadas 15

1 INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de ZIPAQUIRA, manifestó el interés de contratar los la interventoría para la ejecución del proyecto. CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

Este informe hace parte del PRODUCTO: TOPOGRAFIA. El cual incluye la revisión y verificación de cotas y coordenadas de las diferentes actividades realizadas en el proyecto. Siendo este el informe correspondiente al acta 02.

2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 LOCALIZACIÓN



Ilustración 1: Localización del Municipio ZIPAQUIRA.

Zipaquirá es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Sabana Centro, de la que es capital y sede de su diócesis. Se encuentra a 29 kilómetros de Bogotá, hace parte de su área metropolitana; a 450 kilómetros de Medellín, y a 117 kilómetros de Tunja.

Es el segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de explotación de sal más importantes del país, razón por la que también es conocida como la Capital Salinera de Colombia.

El lote limita al norte con la Avenida Industrial, al oeste con la Plaza de Ferias, y al este y al sur con predios privados sin construcciones. En cuanto a aislamientos se plantean 15m frente a la vía Avenida Industrial. Teniendo presente la vía proyectada desde el POT como Alameda el Zipa al costado oriente del lote se es necesario un aislamiento de 22.5m más un antejardín de 5m para un total de 27.5m de retiro. Finalmente se destaca un cuerpo de agua que cruza por el centro del lote lo que implica un aislamiento de 30m a cada lado de este.

3 PRELIMINAR

3.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO.

Topográficamente esta sección territorial está dividida en dos regiones bien definidas:
a. Región plana situada al oriente, rica en pastos aprovechados para la ganadería.
b. Región montañosa situada al occidente, (rica en minerales) entre la que se destacan entre otras las siguientes alturas:
- El cerro del Zipa bajo el cual se encuentra la mina y su monumental templo subterráneo de sal, el Páramo de Guerrero rico en yacimientos de carbón, la serranía de Ventalarga con Pantano Redondo
- El cerro del Calzón.

Centro Cultural y de Convenciones se construye en el lote propuesto por parte de la Alcaldía de Zipaquirá, el cual se encuentra ubicado sobre la Avenida Industrial en el área urbana sector La Fragüita en un lote contiguo al Frigorífico del Municipio. De acuerdo con el concepto de norma urbanística está identificado con No Catastral 01-00-0718-0001-000.
Este lote cuenta con tratamiento de desarrollo establecido en el Acuerdo 12 de 2013 “Por el cual se modifica excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquirá, adoptado mediante el Acuerdo No. 12 de 2000 y ajustado mediante el Acuerdo No. 008 de 2003; y se dictan otras disposiciones según plano CU-02 “Tratamiento en suelo urbano y de expansión urbana”.

4 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES

4.1 REVISON DE COORDENADAS DE LOS DISTINTOS DELTAS.

Mensualmente se hace revisión de los 3 deltas que se encuentran dentro del proyecto con respecto a los 2 GPS que fueron instalados sobre la vía principal.

Tabla 1: Coordenadas Gps, proyecto

- Gauss Kruger.


ORIGEN GAUSS KRUGER			
IDENTIDICACION	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1–3212220568	1045795.349	1008861.812	2545.146 m
GPS 2 –3212220568	1045796.356	1008670.019	2544.847 m

- Origen Nacional.

ORIGEN NACIONAL			COTA
GPS 1-3212220568	2111717.642	4889452.376	2545.146 m
GPS 2-3212220568	2111718.963	4889260.788	2544.847 m

Fuente: propia

Tabla 2: DELTAS DE TRABAJO

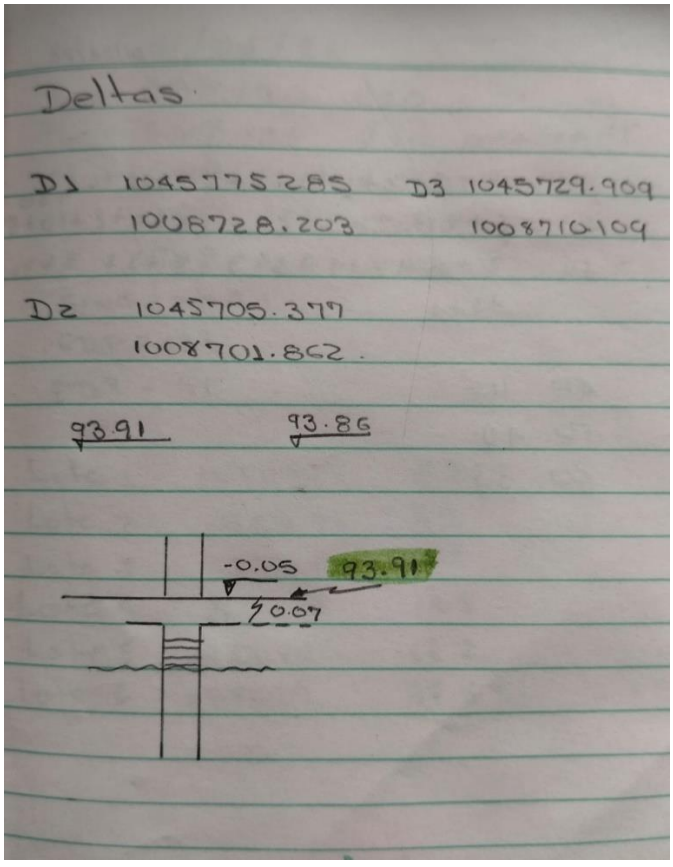

Fuente: Propia

4.2 REVISON Y RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS.

Durante el periodo se continuo con las actividades de excavación manual e instalación de filtro francés en tubería de Ø4" perforada. actividad para la cual el contratista con su comisión de topografía hizo el respectivo replanteo de los tramos y se dejaron estantíllones para la excavación y posterior instalación de tubería, estas actividades fueron revisadas y aprobadas por la topografía de la interventoría. Después de ser instalada la tubería se revisar que fueran los diámetros especificados en planos se procedió a recibir por topografía las distintas redes instaladas, verificando que cumplieran los diámetros, pendientes y longitudes de los diferentes tramos.

Tabla 3: Resumen de cantidades redes hidrosanitarias

		CONTROL DE CALIDAD			
		VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES			
CONTRATO DE OBRA:	Construccion	viernes, 24 de mayo de 2024			
CONTRATISTA:	Consorcio	1 DE 1			
INTERVENTORIA:	rcio Arte	TOPOGRAFIA C.A.2023			
LOCALIZACION:	FASE 1	Municipio de Zipaquira			
CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES					
DESCRIPCION		CORTE 10 6-jun	CORTE 11 14-jun	CORTE 12 22-jun	ACUMULADO
EXCAVACION MANUAL REDES		38,51	6,86	4,16	376,15
EXCAVACION MANUAL CAJAS		0,00	0,00	0,00	18,98
RELLENO RECEBO		31,71	5,61	2,15	292,27
RELLENO ARENA		5,25	1,09	1,68	45,89
CAJAS		0,00	0,00	0,00	41,00
TUBERIA RED SANITARIA	2"	4,95	0,00	19,85	142,91
TUBERIA RED SANITARIA	3"	2,78	0,00	12,58	67,60
TUBERIA RED SANITARIA	4"	35,32	2,90	28,31	333,75
TUBERIA RED SANITARIA	6"				146,84
TUBERIA RED SANITARIA	8"				0,00
TUBERIA RED SANITARIA	10"				0,00
TUBERIA RED SANITARIA	12"				0,00
TUBERIA RED PLUVIAL	2"		26,45	0,00	34,29
TUBERIA RED PLUVIAL	3"		3,10		3,10
TUBERIA RED PLUVIAL	4"	111,07	8,40		297,46
TUBERIA RED PLUVIAL	6"	18,00			76,24
TUBERIA RED PLUVIAL	8"				56,78
TUBERIA RED PLUVIAL	10"				14,01
TUBERIA RED PLUVIAL	12"				0,00
TUBERIA RED PLUVIAL	14"				19,74
FILTRO	4"				112,05

	CONTROL DE CALIDAD
	VERIFICACION TOPOGRAFICA DE REDES
CONTRATO DE OBRA:	Construccion — martes, 30 de julio de 2024
CONTRATISTA:	Consorcio — 1 DE 1
INTERVENTORIA:	rcio Arte — TOPOGRAFIA C.A.2023
LOCALIZACION:	FASE 1 — Municipio de Zipaquira

CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES

DESCRIPCION		CORTE 13 5-jul	CORTE 14 12-jul	CORTE 15 17-jul	CORTE 16 26-jul	ACUMULADO
EXCAVACION MANUAL REDES						376,15
EXCAVACION MANUAL CAJAS						18,98
RELLENO RECEBO		4,92	1,58	1,60	6,74	307,11
RELLENO ARENA						45,89
CAJAS						41,00
TUBERIA RED SANITARIA	2"					147,81
TUBERIA RED SANITARIA	3"					70,70
TUBERIA RED SANITARIA	4"					335,65
TUBERIA RED SANITARIA	6"					146,84
TUBERIA RED SANITARIA	8"					0,00
TUBERIA RED SANITARIA	10"					0,00
TUBERIA RED SANITARIA	12"					0,00
TUBERIA RED PLUVIAL	2"					29,39
TUBERIA RED PLUVIAL	3"					0,00
TUBERIA RED PLUVIAL	4"					295,56
TUBERIA RED PLUVIAL	6"					76,24
TUBERIA RED PLUVIAL	8"					56,78
TUBERIA RED PLUVIAL	10"					14,01
TUBERIA RED PLUVIAL	12"					0,00
TUBERIA RED PLUVIAL	14"					19,74
FILTRO	4"	47,05	22,32	63,61		245,03

Fuente: propia

Ilustración 2: Redes Instaladas

CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	CONTIENE:	Redes Hidrosanitarias
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO	COTA RASANTE INICIAL	COTA RASANTE FINAL	COTA Llomo INICIAL	COTA Llomo FINAL	EXCAVACION BD	EXCAVACION H. EXC	EXCAVACION PROF	EXCAV.	RELLENO ARENA	RELLENO LONG FILTR	RELLENO RECEB
RED PLUVIAL																
CJ 16	EJE 27-X	FILTRO	27,05	0,5%	4	2593,260	2593,260	2593,290	2593,426	0,30	0,17	0,04	0,10	0,85		27,05	
CJ 12	RAMPA	FILTRO	20,00	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,290	2592,392	0,30	1,17	1,07	1,12	6,76		20,00	4,92
RED SANITARIA																	
										TOTAL				7,60	0,00	47,05	4,92

FILTROS	
LONG	47,05

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00


CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	LOCALIZACION:	Auditorio y Tanque
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO"	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROF	EXCAV.		ARENA	LONG FILTR	RECEB
RED PLUVIAL																	
F1	CJ-10	FILTRO	16,32	0,6%	4	2593,260	2593,260	2592,803	2592,903	0,30	0,66	0,56	0,61	3,00		16,32	1,51
F2	CJ-12	FILTRO	6,00	0,5%	4	2593,260	2593,260	2593,108	2593,138	0,30	0,35	0,32	0,34	0,61		6,00	0,07
RED SANITARIA																	
										TOTAL					0,00	22,32	1,58

FILTROS	
LONG	22,32

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00

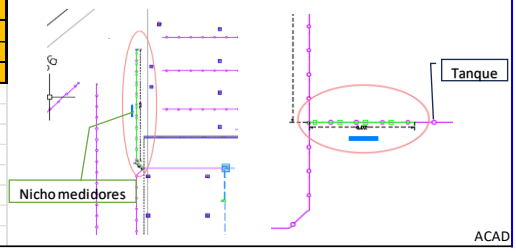


CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	LOCALIZACION:	Auditorio y Tanque
LOCALIZACION:	FILTROS	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO"	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROF	EXCAV.		ARENA	LONG FILTR	RECEB
FILTRO PERIMETRAL																	
Y	CAJA	FILTRO	19,51	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,988	2593,090	0,30	0,47	0,37	0,42	2,49		19,51	0,72
CAJA	TAPON	FILTRO	23,40	0,4%	4	2593,260	2593,260	2593,091	2593,196	0,30	0,37	0,27	0,32	2,24		23,40	0,13
TAPON	RAMPA	FILTRO	20,70	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,990	2593,090	0,30	0,47	0,37	0,42	2,63		20,70	0,76
RED SANITARIA																	
										TOTAL					0,00	63,61	1,60

FILTROS	
LONG	63,61

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00




CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	LOCALIZACION:	Auditorio y Tanque
LOCALIZACION:	FILTROS	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES							
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO"	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO		
						INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROF	EXCAV.		ARENA	LONG FILTR	RECEB
FILTRO PERIMETRAL																	
F1	RAMPA	FILTRO	32,30	0,5%	4	2593,260	2593,260	2592,392	2592,540	0,30	1,07	0,92	1,00	9,70		32,30	6,74
RED SANITARIA																	
										TOTAL					0,00	32,30	6,74

FILTROS	
LONG	32,30

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00



CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	ELABORO:	TOPOGRAFIA C.A. 2024
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED PLUVIAL																
CJ 14	SF	POLIVALENTE	5,50	2,2%	4	2593,260	2593,260	2592,960	2592,840	0,30	0,50	0,62	0,56	0,93	0,17	0,72
CJ-14	CJ-14"	POLIVALENTE	11,20	0,9%	4	2593,260	2593,260	2592,817	2592,717	0,30	0,64	0,74	0,69	2,35	0,34	1,92
CJ-14"	TRG	POLIVALENTE	20,40	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,025	2592,817	0,30	0,44	0,64	0,54	3,33	0,62	2,54
CJ 4	CJ-5	POLIVALENTE	18,00	1,0%	6	2593,260	2593,260	2592,502	2592,322	0,35	1,01	1,19	1,10	6,98	0,63	6,02
CJ-5	BJ	POLIVALENTE	10,34	1,1%	4	2593,260	2593,260	2592,610	2592,501	0,30	0,85	0,96	0,91	2,83	0,31	2,43
CJ-4	CJ-3	POLIVALENTE	15,80	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,480	2592,320	0,30	0,98	1,14	1,06	5,06	0,48	4,45
CJ-3	CJ-2	POLIVALENTE	8,60	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,580	2592,490	0,30	0,88	0,97	0,93	2,40	0,26	2,07
CJ-2	CJ-14"	POLIVALENTE	7,40	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,656	2592,580	0,30	0,81	0,88	0,84	1,88	0,22	1,60
CJ-15	SF1-SF2	POLIVALENTE	3,73	1,3%	4	2593,260	2593,260	2593,140	2593,090	0,30	0,32	0,37	0,35	0,39	0,11	0,25
CJ-15	SF2-SF3	POLIVALENTE	1,90	1,6%	4	2593,260	2593,260	2592,640	2592,610	0,30	0,82	0,85	0,84	0,48	0,06	0,41
CJ-15	SF1	POLIVALENTE	15,38	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,140	2592,985	0,30	0,32	0,48	0,40	1,85	0,46	1,26
CJ-3	SF1	POLIVALENTE	8,18	0,9%	4	2593,260	2593,260	2592,562	2592,485	0,30	0,90	0,98	0,94	2,31	0,25	2,00
CJ-3	SF2	POLIVALENTE	2,64	1,0%	4	2593,260	2593,260	2592,567	2592,540	0,30	0,89	0,92	0,91	0,72	0,08	0,62
RED SANITARIA																
CJ-31	C2"	POLIVALENTE	4,35	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,010	2592,966	0,25	0,40	0,44	0,42	0,46	0,11	0,34
CJ-31	C2"	POLIVALENTE	0,60	1,0%	2	2593,260	2593,260	2592,972	2592,966	0,25	0,44	0,44	0,44	0,07	0,02	0,05
CJ-32	C2"	POLIVALENTE	2,78	1,0%	3	2593,260	2593,260	2592,875	2592,847	0,28	0,56	0,59	0,58	0,44	0,08	0,35
CJ-18	CJ-5	POLIVALENTE	20,02	0,8%	4	2593,260	2593,260	2592,900	2592,730	0,30	0,56	0,73	0,65	3,90	0,60	3,14
CJ-18	C-17	POLIVALENTE	15,30	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,076	2592,926	0,30	0,39	0,54	0,46	2,13	0,46	1,54
												TOTAL		38,51	5,25	31,71

TUBERIA SN	
2"	4,95
3"	2,78
4"	35,32

TUBERIA PL	
4"	111,07
6"	18,00
8"	

FILTROS	
LONG	0,00

CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	ELABORO:	TOPOGRAFIA C.A. 2024
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC		PROM	EXCAV.	ARENA	RECEBO
RED PLUVIAL																
CJ 2	pto drenaje	POLIVALENTE	21,55	1,0%	2	2593,260	2593,260	2592,960	2592,740	0,25	0,45	0,67	0,56	3,03	0,54	2,45
CJ 2	bj	POLIVALENTE	4,30	2,3%	4	2593,260	2593,260	2592,817	2592,717	0,30	0,64	0,74	0,69	0,90	0,13	0,74
CJ 17	bj	POLIVALENTE	1,90	1,5%	4	2593,260	2593,260	2593,025	2592,997	0,30	0,44	0,46	0,45	0,26	0,06	0,19
CJ 17	bj	POLIVALENTE	3,10	1,0%	3	2593,260	2593,260	2592,502	2592,472	0,28	0,93	0,96	0,95	0,81	0,09	0,71
CJ 17	bj	POLIVALENTE	1,50	1,0%	2	2593,260	2593,260	2592,610	2592,595	0,25	0,80	0,82	0,81	0,30	0,04	0,26
CJ 17	bj	POLIVALENTE	0,85	1,2%	2	2593,260	2593,260	2592,480	2592,470	0,25	0,93	0,94	0,94	0,20	0,02	0,18
CJ 17	bj	POLIVALENTE	0,85	1,2%	2	2593,260	2593,260	2592,580	2592,570	0,25	0,83	0,84	0,84	0,18	0,02	0,16
CJ 17	bj	POLIVALENTE	0,85	0,6%	2	2593,260	2593,260	2592,656	2592,651	0,25	0,75	0,76	0,76	0,16	0,02	0,14
CJ 27	bj	POLIVALENTE	0,85	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,140	2593,132	0,25	0,27	0,28	0,27	0,06	0,02	0,04
CJ 3	bj	POLIVALENTE	2,20	0,9%	4	2593,260	2593,260	2592,640	2592,620	0,30	0,82	0,84	0,83	0,55	0,07	0,47
RED SANITARIA																
CJ 18	BJ	POLIVALENTE	2,90	0,8%	4	2593,260	2593,260	2593,010	2592,986	0,30	0,45	0,48	0,46	0,41	0,09	0,29
												TOTAL		6,86	1,09	5,61

TUBERIA SN	
2"	0,00
3"	0,00
4"	2,90

TUBERIA PL	
2"	26,45
3"	3,10
4"	8,40

FILTROS	
LONG	0,00

CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	ELABORO:	TOPOGRAFIA C.A. 2024
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROF	EXCAV.		ARENA	RECEBO
RED SANITARIA																
CJ-13	BJ	AULAS	2,40	2,5%	2	2593,260	2593,260	2592,977	2592,918	0,25	0,43	0,49	0,46	0,28	0,06	0,21
CJ-4	CJ-3	AULAS	1,77	1,1%	4	2593,260	2593,260	2593,062	2593,042	0,30	0,40	0,42	0,41	0,22	0,05	0,15
CJ-3	C2"	AULAS	5,30	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,255	2593,207	0,30	0,21	0,25	0,23	0,37	0,16	0,17
CJ-3	C2"	AULAS	1,53	1,0%	3	2593,260	2593,260	2593,270	2593,255	0,28	0,17	0,18	0,17	0,07	0,04	0,02
CJ-3	C2"	AULAS	1,65	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,285	2593,270	0,25	0,13	0,14	0,13	0,06	0,04	0,01
CJ-3	C2"	AULAS	0,35	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,253	2593,250	0,25	0,16	0,16	0,16	0,01	0,01	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,22	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,262	2593,260	0,25	0,15	0,15	0,15	0,01	0,01	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,19	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,267	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,14	0,01	0,00	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	0,12	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,266	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
CJ-3	C2"	AULAS	4,65	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,245	2593,205	0,30	0,22	0,26	0,24	0,33	0,14	0,15
CJ-3	C2"	AULAS	4,60	0,4%	2	2593,260	2593,260	2593,265	2593,245	0,25	0,15	0,17	0,16	0,18	0,12	0,05
CJ-3	C2"	AULAS	0,80	0,9%	2	2593,260	2593,260	2593,272	2593,265	0,25	0,14	0,15	0,14	0,03	0,02	0,01
CJ-3	C2"	AULAS	0,80	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,273	2593,264	0,25	0,14	0,15	0,14	0,03	0,02	0,01
CJ-3	C4"	AULAS	5,40	0,7%	4	2593,260	2593,260	2593,244	2593,205	0,30	0,22	0,26	0,24	0,39	0,16	0,18
CJ-3	C4"	AULAS	2,00	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,260	2593,244	0,28	0,18	0,19	0,18	0,10	0,06	0,04
CJ-3	C4"	AULAS	0,30	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,263	2593,260	0,25	0,15	0,15	0,15	0,01	0,01	0,00
CJ-3	CJ 2	AULAS	3,20	1,2%	2	2593,260	2593,260	2593,136	2593,097	0,25	0,27	0,31	0,29	0,24	0,08	0,15
CJ-2	CJ-1	AULAS	3,61	0,7%	4	2593,260	2593,260	2593,175	2593,151	0,30	0,29	0,31	0,30	0,33	0,11	0,19
CJ-1	C2"	AULAS	1,80	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,170	2593,151	0,28	0,27	0,29	0,28	0,14	0,05	0,08
CJ-1	C2"	AULAS	2,27	1,0%	2	2593,260	2593,260	2593,192	2593,170	0,25	0,22	0,24	0,23	0,13	0,06	0,07
CJ-1	C2"	AULAS	4,88	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,201	2593,151	0,30	0,26	0,31	0,29	0,42	0,15	0,23
CJ-1	C2"	AULAS	1,20	0,9%	4	2593,260	2593,260	2593,212	2593,201	0,30	0,25	0,26	0,26	0,09	0,04	0,05
CJ-1	C2"	AULAS	2,40	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,212	2593,193	0,28	0,22	0,24	0,23	0,15	0,07	0,08
CJ-1	C2"	AULAS	1,67	1,1%	2	2593,260	2593,260	2593,230	2593,212	0,25	0,18	0,20	0,19	0,08	0,04	0,03
CJ-1	C2"	AULAS	0,25	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,202	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01
CJ-1	C2"	AULAS	0,12	0,8%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00
CJ-1	C2"	AULAS	0,08	1,3%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
CJ-1	C2"	AULAS	0,15	0,7%	2	2593,260	2593,260	2593,204	2593,203	0,25	0,21	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00
CJ-1	BJ	AULAS	1,50	1,0%	4	2593,260	2593,260	2593,208	2593,193	0,30	0,25	0,27	0,26	0,12	0,05	0,06
CJ-17	C2"	AULAS	2,80	0,9%	3	2593,260	2593,260	2593,189	2593,164	0,28	0,25	0,27	0,26	0,20	0,08	0,11
CJ-17	C2"	AULAS	0,35	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,193	2593,189	0,28	0,24	0,25	0,25	0,02	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,40	0,8%	3	2593,260	2593,260	2593,193	2593,190	0,28	0,24	0,25	0,24	0,03	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,40	1,0%	3	2593,260	2593,260	2593,196	2593,192	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,01
CJ-17	C2"	AULAS	0,45	0,9%	3	2593,260	2593,260	2593,197	2593,193	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,02
CJ-17	C2"	AULAS	0,45	1,1%	3	2593,260	2593,260	2593,200	2593,195	0,28	0,24	0,24	0,24	0,03	0,01	0,02
										TOTAL				4,16	1,68	2,15

TUBERIA SN	
2"	19,85
3"	12,58
4"	28,31

TUBERIA PL	
2"	
3"	
4"	

FILTROS	
LONG	0,00


CONTRATISTA:	Consorcio Mega Construcciones Zipa	Nº DE HOJA:	1 DE 1
INTERVENTORIA:	Consorcio Artes 2023	LOCALIZACION:	Auditorio y Tanque
LOCALIZACION:	FASE 1	CLIENTE:	Municipio de Zipaquira

REDES										CANTIDADES						
CAJA	CAJA	AREA	LONG TRAMO	PENDIENTE	DIAMETRO "	COTA RASANTE		COTA Llomo		EXCAVACION					RELLENO	
						INICIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	BD	H. EXC	PROF	EXCAV.		ARENA	LONG FILTRO	RECEBO
RED PLUVIAL																	
F1	CJ-10	FILTRO	16,32	0,6%	4	2593,260	2593,260	2592,803	2592,903	0,30	0,66	0,56	0,61	3,00		16,32	1,51
F2	CJ-12	FILTRO	6,00	0,5%	4	2593,260	2593,260	2593,108	2593,138	0,30	0,35	0,32	0,34	0,61		6,00	0,07
RED SANITARIA																	
										TOTAL				0,00	22,32		1,58

FILTROS	
LONG	22,32

TUBERIA SN	
2"	0,00
4"	0,00
6"	0,00

TUBERIA PL	
4"	0,00
6"	0,00
8"	0,00




Fuente: Propia

4.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Durante el periodo se replantearon vigas y columnas de salones y de la placa de entre piso del auditorio, plazoleta y salones se dejaron materializados en estacas y placa de piso con pintura y puntilla, se replantearon vigas y columnas del auditorio y plazoleta para el amarre del acero e izada de castillos de las columnas, de igual forma se replantearon los ejes de la fase tres y se dejaron materializados en estacas y monumentos en concreto para garantizar que no se muevan. Se dejaron marcados los ejes las aulas y plazoleta, se realizó seguimiento de las diferentes áreas y ejes marcados con anterioridad, se revisan escuadras para dar inicio a las actividades de replanteo de mampostería.

Ilustración 3: localización estructuras

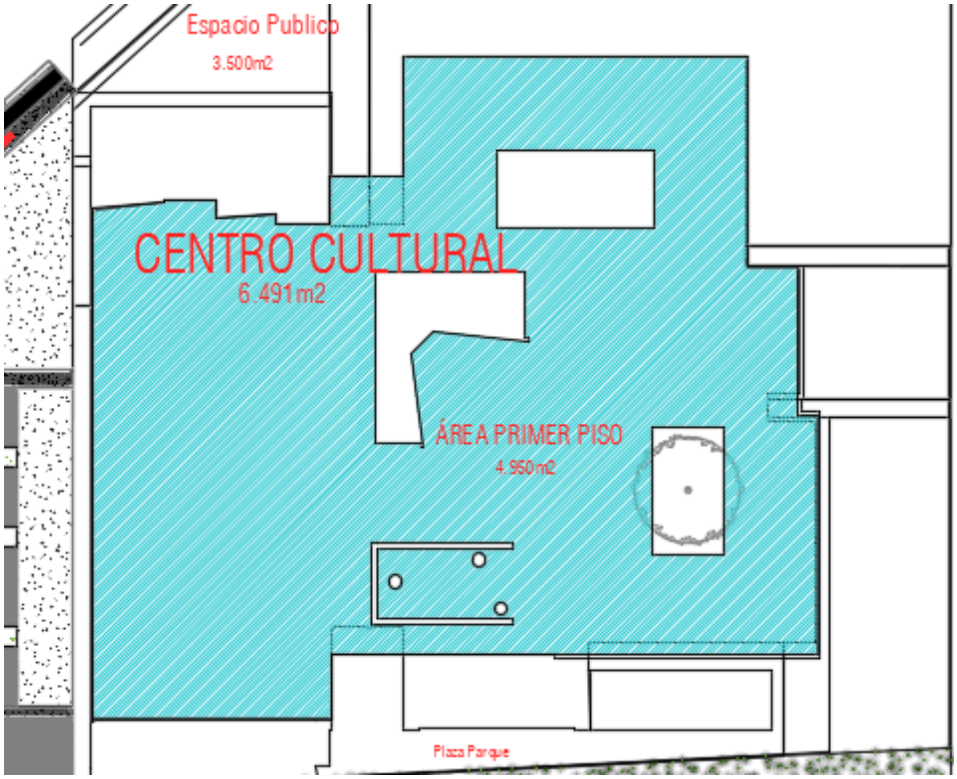

Fuente: archivo Proyecto

Tabla 4: Coordenadas replanteadas.

E=1008900.808	N=1045687.038
E=1008915.508	N=1045687.038
E=1008900.808	N=1045677.137
E=1008915.508	N=1045677.137
E=1008940.148	N=1045705.637
E=1008967.999	N=1045705.637


E=1008967.999 N=1045691.088
E=1008940.148 N=1045691.088
E=1008956.528 N=1045664.077
E=1008981.848 N=1045664.077
E=1008956.528 N=1045641.936
E=1008981.848 N=1045641.936

Fuente: Propia

Del tanque se dejaron materializados en estacas y se procedió a la excavación mecánica del tanque, se realizó seguimiento de las diferentes áreas y ejes marcados con anterioridad, se revisan escuadras.

Ilustración 4: excavación mecánica del tanque


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Construccion Centro Cultural				CONTRATISTA: Consorcio Mega Construcciones Zipa			INTERVENTORIA: CONSORCIO ARTES 2023	
FECHA:	29/07/2024			PÁGINA	1	DE: 1	OBSERVACIONES :	EXCAVACIÓN TANQUE
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACION	
	LARGO	ANCHO	ALTO					
EXCAVACION TANQUE								
TANQUE	20,52	8,15	0,49	1,00	81,95	M3		
					Subtotal	81,95	ARCHIVO ACAD	
								81,95
							VIENEN	0,00
							EXCAVACION MECANICA TANQUE TOTAL	81,95

Fuente: Propia

Tabla 5: Coordenadas replanteadas Tanque.

1 E=1008933.778 N=1045630.362
2 E=1008954.302 N=1045630.362
3 E=1008954.302 N=1045638.513
4 E=1008933.778 N=1045638.513

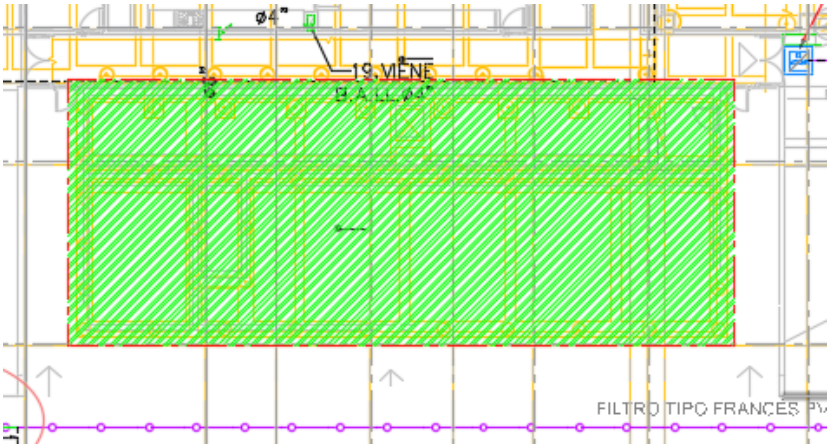

Fuente: Propia


Tabla 6: Coordenadas replanteo placa entrepiso Auditorio y aula polivalente

1 E= 36.1122 N= 92.0859 eje B-02
2 E= 50.8122 N= 92.0859 eje B-10
3 E= 50.8122 N= 80.9619 eje E-10
4 E= 36.1122 N= 80.9619 eje E-02
1 E= 78.3620 N= 92.0859 eje B-10
2 E= 102.7522 N= 92.0859 eje B-20
3 E= 102.7522 N= 85.5859 eje D-20
4 E= 78.3620 N= 85.5859 eje D-10

4.4 LOCALIZACION DE PLATINAS ESTRUCTURA METALICA

Se realizo el replanteo y posterior instalación de platinas en el área del auditorio, para instalación de la estructura metálica. Posterior a la instalación se hace revisión de su nivel y localización.

Ilustración 5: localización platinas auditorio

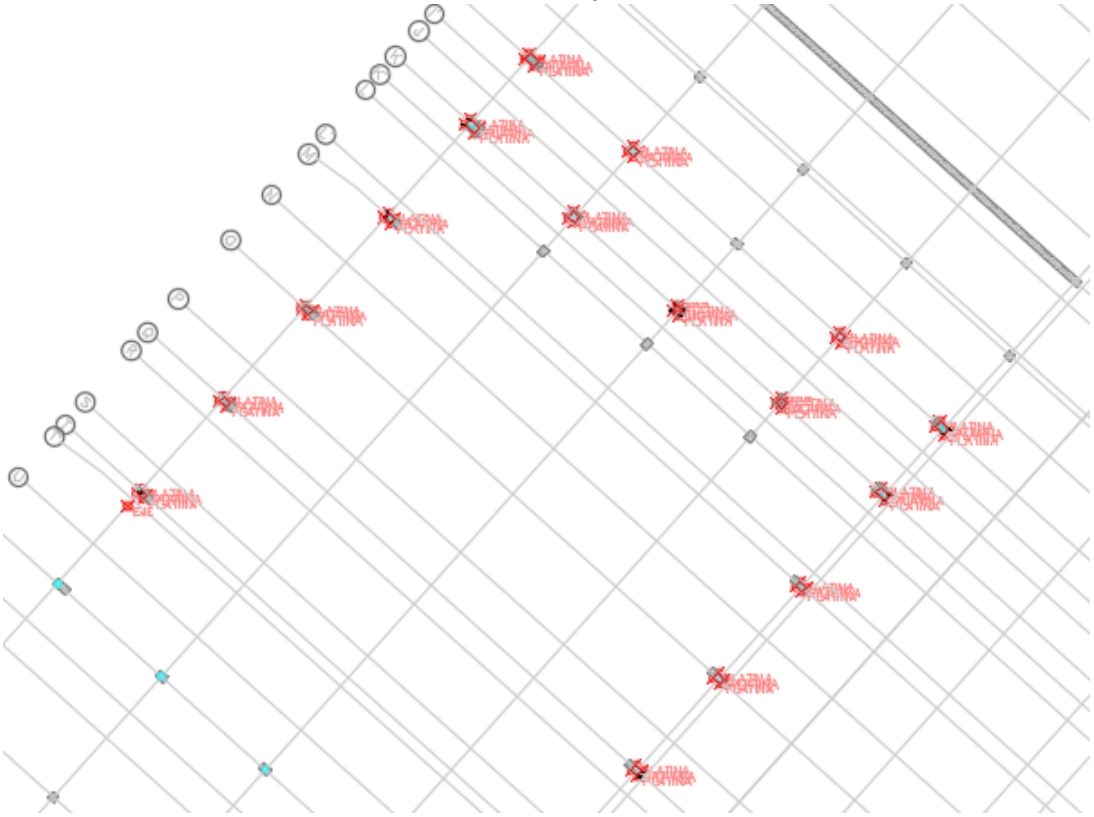

Fuente: propia

Tabla 7: coordenadas replanteadas


1	E 1008731.9757	N 1045747.5346
2	E 1008727.6141	N 1045742.6749
3	E 1008723.2526	N 1045737.8151
4	E 1008718.8911	N 1045732.9554
5	E 1008740.7712	N 1045713.3182
6	E 1008745.1328	N 1045718.1780
7	E 1008749.4943	N 1045723.0377
8	E 1008753.8559	N 1045727.8975
9	E 1008758.2174	N 1045732.7572

Ejes platinas

E=1008718.221	N=1045732.209
E=1008718.891	N=1045732.955
E=1008723.253	N=1045737.815
E=1008727.614	N=1045742.675
E=1008731.976	N=1045747.535
E=1008736.337	N=1045752.394
E=1008739.457	N=1045755.870
E=1008744.927	N=1045750.961
E=1008741.807	N=1045747.485
E=1008747.277	N=1045742.576
E=1008752.747	N=1045737.666
E=1008755.867	N=1045741.142
E=1008761.337	N=1045736.233
E=1008758.217	N=1045732.757
E=1008753.856	N=1045727.897
E=1008749.494	N=1045723.038
E=1008745.133	N=1045718.178
E=1008740.771	N=1045713.318

Fuente: Propia

5 REGISTRO FOTOGRAFICO
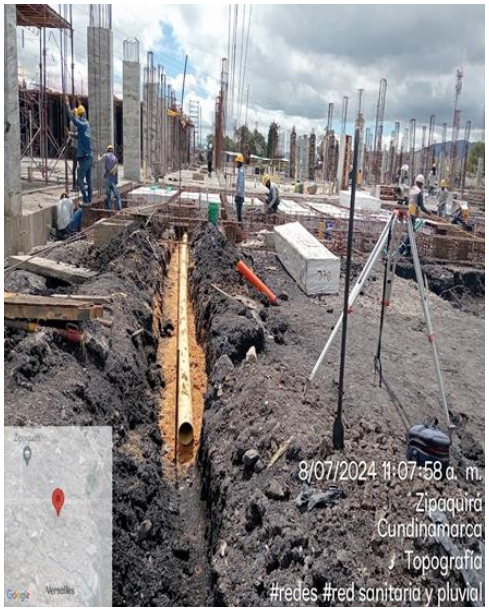
<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>marcación de niveles fundida placas entrepiso</td><td>Revisión y control niveles redes hidro-sanitarias</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Revisión y replanteo de redes hidrosanitarias.</td><td>Revisión e inspección terminado de platinas metálicas.</td></tr>
</table>

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se realizaron actividades de topografía conjuntas entre contratista e interventoría, como fue replanteo de ejes placa de entre piso zona plazoleta, aula polivalente y salones en primer piso. replanteo de ejes zona plazoleta segundo piso, y auditorio segundo piso.

- Se marcaron escantillones para excavación de redes hidrosanitarias y filtros del auditorio, Plazoleta y salones.

- Se hace revisión a replanteo del tanque.

- Se realiza el recibido de las diferentes actividades por topografía teniendo una tolerancia de +/- 0.005 m.

- Se dejaron niveles para fundida de placas y/o vigas, al igual que se verifico constantemente la verticalidad de las columnas y muros fundidos.

- Se dejaron niveles para fundida de placas y/o vigas, al igual que se verifico constantemente la verticalidad de las columnas y muros fundidos.

- Se replantean las platinas del auditorio y se dejan instaladas en sitio por el subcontratista.

- Los equipos utilizados por el contratista tienen vigente los certificados de calibración.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-16, 10:39:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058008639

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 04/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS		
Documento	NI900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79940439	JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 2.000.000	$ 250.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.200	$ 28.200	$ 917.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-08, 08:35:40 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1058899990

Periodo Cotización 202309 **Periodo Servicio** 202310

PAGADA 2023-11-08 20:26:05.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-08, 08:36:10 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1058899993

Periodo Cotización 202310 **Periodo Servicio** 202311

PAGADA 2023-11-08 20:28:30.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-22, 04:14:19 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1059923992

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-22 16:10:02.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-22, 04:15:04 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1059924003

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2023-12-22 16:12:51.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-12, 09:14:33 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1061363195

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-12 21:10:49.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30					F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-14, 05:25:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1062283346

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 14/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS		
Documento	NI900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79940439	JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 2.000.000	$ 250.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.200	$ 6.400	$ 895.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-10, 10:37:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063233807

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 25/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS		
Documento	NI900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79940439	JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 2.000.000	$ 250.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.200	$ 16.900	$ 906.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-06, 03:46:52 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1064395935

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202405

PAGADA 2024-06-12 18:40:16.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900823315	**Dirección**	CR 18 #109 A - 30 APTO 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019278499		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	**Identificación**	CC 79940439		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79940439		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PAREDES ACOSTA JUAN ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS001		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF22	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	2 %	$ 40.000	3 %	$ 60.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 889.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	15638806	9455289103	E	2023/09/08	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,764,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		23030 1	30	$2,320,625	$371,300	EPS008	30	$2,320,625	$290,100	CCF24	30	$2,320,625	$92,900	14-11	30	$2,320,625	0.522%	$12,200	30	$2,320,625	$116,200	No	$882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(3)**																				$4,640,625	$742,500			$4,640,625	$580,100			$4,640,625	$185,700			$4,640,625		$24,400		$4,640,625	$232,200		$1,764,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	15638806	9455289103	E	2023/09/08	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,764,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$742,500	$0	$0	$742,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,700	$0	$0	$185,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$580,100	$0	$0	$580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,100	$0	$0	$290,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,300	$0	$0	$139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$139,300	$0	$0	$139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,900	$0	$0	$92,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				**3**	**$1,764,900**	**$0**	**$0**	**$1,764,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	23416491	9456645610	E	2023/10/09	2023/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,764,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
1	CC	1030613556	FINO LINA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR		230301	30	$2,320,625	$371,300	EPS008	30	$2,320,625	$290,100	CCF24	30	$2,320,625	$92,900	14-11	30	$2,320,625	0.522%	$12,200	30	$2,320,625	$116,200	No	$882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(3)**				$4,640,625	$742,500			$4,640,625	$580,100			$4,640,625	$185,700			$4,640,625		$24,400		$4,640,625	$232,200		$1,764,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	23416491	9456645610	E	2023/10/09	2023/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,764,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$742,500	$0	$0	$742,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,700	$0	$0	$185,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$580,100	$0	$0	$580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,100	$0	$0	$290,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,300	$0	$0	$139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$139,300	$0	$0	$139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,900	$0	$0	$92,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				**3**	**$1,764,900**	**$0**	**$0**	**$1,764,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	265610988	9457943703	E	2023/11/09	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,764,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		23030 1	30	$2,320,625	$371,300	EPS008	30	$2,320,625	$290,100	CCF24	30	$2,320,625	$92,900	14-11	30	$2,320,625	0.522%	$12,200	30	$2,320,625	$116,200	No	$882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(3)**																				$4,640,625	$742,500			$4,640,625	$580,100			$4,640,625	$185,700			$4,640,625		$24,400		$4,640,625	$232,200		$1,764,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	265610988	9457943703	E	2023/11/09	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,764,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$742,500	$0	$0	$742,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,700	$0	$0	$185,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$580,100	$0	$0	$580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,100	$0	$0	$290,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,300	$0	$0	$139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$139,300	$0	$0	$139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,900	$0	$0	$92,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				**3**	**$1,764,900**	**$0**	**$0**	**$1,764,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316795015	9459356745	E	2023/12/11	2023/12/04	COLTEFINANCIERA	0	$1,764,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		23030 1	30	$2,320,625	$371,300	EPS008	30	$2,320,625	$290,100	CCF24	30	$2,320,625	$92,900	14-11	30	$2,320,625	0.522%	$12,200	30	$2,320,625	$116,200	No	$882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(3)**																				$4,640,625	$742,500			$4,640,625	$580,100			$4,640,625	$185,700			$4,640,625		$24,400		$4,640,625	$232,200		$1,764,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316795015	9459356745	E	2023/12/11	2023/12/04	COLTEFINANCIERA	0	$1,764,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$742,500	$0	$0	$742,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,700	$0	$0	$185,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$580,100	$0	$0	$580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,100	$0	$0	$290,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,300	$0	$0	$139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$139,300	$0	$0	$139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,900	$0	$0	$92,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				**3**	**$1,764,900**	**$0**	**$0**	**$1,764,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	376303835	9460865637	E	2024/01/10	2024/01/03	BANCOLOMBIA	0	$1,764,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,480,625	$556,900			$3,480,625	$435,100			$3,480,625	$139,300			$3,480,625		$18,300		$3,480,625	$174,200		$1,323,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		23030 1	30	$2,320,625	$371,300	EPS008	30	$2,320,625	$290,100	CCF24	30	$2,320,625	$92,900	14-11	30	$2,320,625	0.522%	$12,200	30	$2,320,625	$116,200	No	$882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total			**Afiliados(3)**																				$4,640,625	$742,500			$4,640,625	$580,100			$4,640,625	$185,700			$4,640,625		$24,400		$4,640,625	$232,200		$1,764,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	376303835	9460865637	E	2024/01/10	2024/01/03	BANCOLOMBIA	0	$1,764,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$742,500	$0	$0	$742,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$185,700	$0	$0	$185,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$580,100	$0	$0	$580,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,100	$0	$0	$290,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,300	$0	$0	$139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$139,300	$0	$0	$139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,900	$0	$0	$92,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				**3**	**$1,764,900**	**$0**	**$0**	**$1,764,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	10716926	9462651673	E	2024/02/08	2024/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,275,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
1	CC	1030613556	FINO LINA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR							X											230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS008	30	$2,601,000	$104,100	CCF24	30	$2,601,000	$104,100	14-11	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(3)**																				$5,201,000	$832,200			$5,201,000	$208,100			$5,201,000	$208,100			$5,201,000		$27,200		$0	$0		$1,275,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	10716926	9462651673	E	2024/02/08	2024/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,275,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$832,200	$0	$0	$832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$832,200	$0	$0	$832,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,200	$0	$0	$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,100	$0	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,275,600	$0	$0	$1,275,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	497711331	9463318543	E	2024/03/08	2024/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,275,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS008	30	$2,601,000	$104,100	CCF24	30	$2,601,000	$104,100	14-11	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(3)**																				$5,201,000	$832,200			$5,201,000	$208,100			$5,201,000	$208,100			$5,201,000		$27,200		$0	$0		$1,275,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	497711331	9463318543	E	2024/03/08	2024/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,275,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$832,200	$0	$0	$832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$832,200	$0	$0	$832,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,200	$0	$0	$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,100	$0	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,275,600	$0	$0	$1,275,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557837229	9465297367	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$1,275,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
1	CC	1030613556	FINO LINA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR		230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS008	30	$2,601,000	$104,100	CCF24	30	$2,601,000	$104,100	14-11	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(3)**						$5,201,000	$832,200			$5,201,000	$208,100			$5,201,000	$208,100			$5,201,000		$27,200		$0	$0		$1,275,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557837229	9465297367	E	2024/04/08	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$1,275,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$832,200	$0	$0	$832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$832,200	$0	$0	$832,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,200	$0	$0	$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,100	$0	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,275,600	$0	$0	$1,275,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	38111733	9466820778	E	2024/05/09	2024/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,275,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,901,000	$624,200			$3,901,000	$156,100			$3,901,000	$156,100			$3,901,000		$20,400		$0	$0		$956,800
1	CC	1030613556	FINO LINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1057579786	TEJEDOR OSCAR																		230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS008	30	$2,601,000	$104,100	CCF24	30	$2,601,000	$104,100	14-11	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GERENTE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: GERENTE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
3	CC	1123086084	LOPEZ EDDNA		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(3)**																				$5,201,000	$832,200			$5,201,000	$208,100			$5,201,000	$208,100			$5,201,000		$27,200		$0	$0		$1,275,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901463334	1	PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 68 D 25 86 OF 715 TO A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	38111733	9466820778	E	2024/05/09	2024/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,275,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$832,200	$0	$0	$832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$832,200	$0	$0	$832,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,200	$0	$0	$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$208,100	$0	$0	$208,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,100	$0	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,275,600	$0	$0	$1,275,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	23416196	9457268131	I	2023/10/03	2023/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1,484,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
1	CC	79730607 VILLABONA JAIME																		230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,475,000
Total	**Afiliados(1)**																				$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	23416196	9457268131	I	2023/10/03	2023/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1,484,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$5,400	$0	$855,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$850,000	$5,400	$0	$855,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$3,900	$0	$628,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$3,900	$0	$628,900
TOTAL				**1**	**$1,475,000**	**$9,300**	**$0**	**$1,484,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	265598300	9458721216	I	2023/11/02	2023/11/08	BANCOLOMBIA	6	$1,484,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,475,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	265598300	9458721216	I	2023/11/02	2023/11/08	BANCOLOMBIA	6	$1,484,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$5,200	$0	$855,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$850,000	$5,200	$0	$855,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$3,800	$0	$628,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$3,800	$0	$628,800
TOTAL				**1**	**$1,475,000**	**$9,000**	**$0**	**$1,484,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	316828279	9459751766	I	2023/12/04	2023/12/04	COLTEFINANCIERA	0	$1,475,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
1	CC	79730607 VILLABONA JAIME																		23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,475,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	316828279	9459751766	I	2023/12/04	2023/12/04	COLTEFINANCIERA	0	$1,475,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$0	$0	$850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$850,000	$0	$0	$850,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$1,475,000**	**$0**	**$0**	**$1,475,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	376248400	9460678419	I	2024/01/03	2024/01/03	BANCOLOMBIA	0	$1,475,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,475,000
Total	**Afiliados(1)**																				$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,475,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	376248400	9460678419	I	2024/01/03	2024/01/03	BANCOLOMBIA	0	$1,475,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$0	$0	$850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$850,000	$0	$0	$850,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$1,475,000**	**$0**	**$0**	**$1,475,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	10715962	9462664092	I	2024/02/02	2024/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,430,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0	$0	$0			$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0	$0	$0			$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0	$0	$0			$1,425,000
1	CC	79730607 VILLABONA JAIME																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total	**Afiliados(1)**																				$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0	$0	$0			$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	10715962	9462664092	I	2024/02/02	2024/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,430,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$2,900	$0	$802,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$2,900	$0	$802,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$2,300	$0	$627,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$2,300	$0	$627,300
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$5,200**	**$0**	**$1,430,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	497553500	9463760682	I	2024/03/04	2024/03/06	BANCOLOMBIA	2	$1,427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	497553500	9463760682	I	2024/03/04	2024/03/06	BANCOLOMBIA	2	$1,427,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$1,400	$0	$801,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$1,400	$0	$801,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$1,100	$0	$626,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$1,100	$0	$626,100
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$2,500**	**$0**	**$1,427,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	557759075	9465253961	I	2024/04/02	2024/04/05	BANCOLOMBIA	3	$1,428,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	557759075	9465253961	I	2024/04/02	2024/04/05	BANCOLOMBIA	3	$1,428,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$2,100	$0	$802,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$2,100	$0	$802,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$1,600	$0	$626,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$1,600	$0	$626,600
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$3,700**	**$0**	**$1,428,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	38111027	9466618704	I	2024/05/03	2024/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,429,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607 VILLABONA JAIME																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total		**Afiliados(1)**																			$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	38111027	9466618704	I	2024/05/03	2024/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,429,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$2,600	$0	$802,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$2,600	$0	$802,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$2,100	$0	$627,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$2,100	$0	$627,100
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$4,700**	**$0**	**$1,429,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	687932308	9468309495	I	2024/06/05	2024/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,426,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	687932308	9468309495	I	2024/06/05	2024/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,426,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$700	$0	$800,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$700	$0	$800,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$500	$0	$625,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$500	$0	$625,500
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$1,200**	**$0**	**$1,426,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	750025401	9469538258	I	2024/07/03	2024/07/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,425,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607	VILLABONA JAIME																	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total		**Afiliados(1)**																			$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	750025401	9469538258	I	2024/07/03	2024/07/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,425,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$0	$0	$800,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$0**	**$0**	**$1,425,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824665501	9470782518	I	2024/08/02	2024/08/05	BANCOLOMBIA	3	$1,428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000
1	CC	79730607 VILLABONA JAIME																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,425,000
Total		**Afiliados(1)**																			$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730607		VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 C 73 49 TO 13 OF 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6006833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824665501	9470782518	I	2024/08/02	2024/08/05	BANCOLOMBIA	3	$1,428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$1,800	$0	$801,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$1,800	$0	$801,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$1,400	$0	$626,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$1,400	$0	$626,400
TOTAL				**1**	**$1,425,000**	**$3,200**	**$0**	**$1,428,200**

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 18 de Enero de 2024. IN-CA2023-5347795-042

Señores
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
Arq. SANDRA ATUESTA.
Secretaria de obras públicas.
Zipaquirá

REF: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: RADICACIÓN ACTUALIZACION PMT CENTRO CULTURAL.

Respetados Señores:

Cordial saludo por medio del presente se informa que se realizó revisión de la entrega del PMT (Plan de Manejo de Tráfico) actualizado cuya vigencia está entre las fechas del 01 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, se adjunta documento para su conocimiento.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente.



ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ARTES 2023

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
1	26/9/2023	2023-130,1-13492-1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD GENERAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRA
2	13/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-002	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Respuesta al Oficio IN-CA2023-5347795-001- RADICACION HOJAS DE VIDA
3	13/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-003	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Respuesta al Oficio IN-CA2023-5347795-002 - RADICACION CRONOGRAMA DE OBRA
4	17/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-004	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Respuesta al Oficio IN-CA2023-5347795-002 - RADICACION CRONOGRAMA DE OBRA Y CRONOGRAMA DE FLUJO
5	18/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-005	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Respuesta al Oficio IN-CA2023-5347795-003 - RADICACION PLANILLAS PERSONAL DE OBRA Y MAQUINARIA
6	17/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-006	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICACION INFORME TOPOGRAFIA
7	19/10/2023	2023-130,1-13492-1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REITERACION GENERAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRA
8	24/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-007	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA N.1 DEL 19 DE SEP AL 30 DE SEP
9	24/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-008	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-005 RADICADO POLIZAS DE INICIO ACTUALIZADAS
10	24/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-009	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-006 RADICADO PMT
11	31/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-011	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICACION CRONOGRAMA DE OBRA Y CRONOGRAMA DE FLUJO AJUSTADOS
12	31/10/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-012	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA AJUSTADO N.1 DEL 19 DE SEP AL 30 DE SEP
13	7/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-013	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-015 RADICADO CRONOGRAMA DE OBRA Y CRONOGRAMA DE FLUJO AJUSTADOS
14	8/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-014	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO NIVELACION DE TERRENO Y VOLUMENES DEL CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
15	8/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-015	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO SOLICITUD DE APROBACION DE NO PREVISTO N001 – RETIRO DE BASURAS
16	9/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-016	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-015 RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA SUBSANADO N.1
17	9/11/2023	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RV: OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DE INICIO CE 167-2221203 ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA
18	9/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-017	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA N.2
19	9/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-018	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-014 ENTREGA DOCUMENTACION SEGUIMIENTO DE CONTRATO
20	9/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-019	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO SOLICITUD DE APROBACION DE NO PREVISTO N001 – RETIRO DE BASURAS CON SOPORTES
21	15/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-020	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-020 RADICADO SOLICITUD DE APROBACION DE NO PREVISTO N001 V2 – RETIRO DE BASURAS CON SOPORTES
22	21/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-021	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO CAMBIO HOJA DE VIDA - RESIDENTE DE OBRA

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
23	24/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-022	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD DE EVALUACIÓN A OBSERVACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES Y NIVEL 0+00
24	24/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-023	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD DOCUMENTACION PARA TRAMITES DE CONEXIÓN DE PROVISIONAL DE OBRA LUZ – AGUA
25	29/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-024	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA N.3
26	30/11/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-025	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS DENTRO DEL AREA DE VIA ALAMEDA DEL ZIPA LINDERO ORIENTAL CON CENTRO CULTURAL
27	4/12/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-026	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	REITERACION SOLICITUD INFORMACIÓN DE LAS COORDENADAS PARA IMPLANTACIÓN CON EJE DE VÍ DEFINIDO
28	4/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA OFICIO No. IN-CA2023-5347795-023
29	4/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REUNION DE SEGUIMIENTO CENTRO CULTURAL
30	4/12/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-027	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	REITERACION SOLICITUD PARA APLICACIÓN CONSTRUCCION DE PILOTES SISTEMA CFA (PILOTES DE BARRENA CONTINUA)
31	5/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REUNION DE SEGUIMIENTO CENTRO CULTURAL
32	6/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICADO SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CENTRO CULTURAL
33	7/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RV: Zipaquirá diseños complejo cultural oficio 043
34	11/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Solicitud Rendimientos Financieros
35	12/12/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-028	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICACION A.P.U DISPOSICION FINAL DE BASURAS
36	13/12/2023	CMCZ-CO1L.PCCNTR.5055621-2023-029	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	REITERACION SOLICITUD DOCUMENTACION PARA TRAMITES DE CONEXIÓN DE PROVISIONAL DE OBRA LUZ-AGUA
37	13/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado: Comité de Obra Centro Cultural y de Conveciones de Zipaquirá
38	13/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RV: Zipaquira diseños complejo cultural oficio 044
39	13/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Solicitud Proyectos Centro Cultural y Teatro Roberto Macdouall
40	15/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Radicado 2023-130.1-17240-1 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EL CONTRATOS DE INTERVENTORIA DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRÁ
41	18/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Solicitud Rendimientos Financieros Centro Cultural
42	20/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA RADICADO IN-CA2023-5347795-031
43	20/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION 2023-130.1-17430-1 REITERACION A PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE, CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRÁ

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
44	21/12/2023	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEGUIMIENTO CENTRO CULTURAL
45	26/12/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-030	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICACION ACTAS DE VECINDAD
46	27/12/2023	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	GENERACION FACTURA FV-2-12
47	27/12/2023	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	GENERACION FACTURA FV-2-13
48	27/12/2023	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	GENERACION NOTA CREDITO NC-2-2
49	27/12/2023	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	GENERACION FACTURA FV-2-14
50	27/12/2023	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	Seguridad Social Octubre y Noviembre
51	29/12/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-031	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL DE OBRA N. 4
52	2/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REUNION SEGUIMIENTO CENTRO CULTURAL
53	2/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RV: IN-CA2023-5347795-034
54	11/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICADO 2024-130.1-290-1
55	12/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-024
56	12/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-032
57	12/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-033	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO DOCUMENTACION PILOTEADORA-CONDIAL
58	12/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-034	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO PLANILLA PERSONAL PILOTES Y PREOPERACIONAL PILOTEADORA
59	12/1/2024	CMCA-CO1.PCCNTR.5055621-2023-035	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO SOLICITUD APROBACION FORMATOS SST PARA FUNDIDA DE PILOTES
60	12/1/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RELACION GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
61	12/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-036	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO DE OBRA N. 4
62	15/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	VOLÚMENES EXCAVACIÓN 01
63	15/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	cartera volúmenes excavación contratista
64	15/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-027
65	15/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-019
66	15/1/2026	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Informes de seguimiento del proyecto
67	16/1/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA RADICADO MENSUAL SUBSANADO DE OBRA N. 4
68	16/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-037
69	16/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	VOLÚMENES SEMANA 15-01-2024
70	16/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-037	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO V3 DE OBRA N. 4
71	18/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-038	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO RESPUESTA IN-CA2023-5347795-039 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ACTUALIZADO
72	18/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	Acta de recibo GPS y memoria de volumenes, firmado.
73	18/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Serie 3 aprobado
	18/1/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-039	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO V4 DE OBRA N.4
74	18/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Respuesta a "la relación soportes de los giros realizados por medio de Fiduciaria Alianza"
75	19/1/2024	OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-040	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-034 Y IN-CA2023-5347795-029 RADICADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
76	19/1/2024	OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-041	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-038 RADICADO DOCUMENTOS SST CONTRATISTA PILOTAJE CONDIAL
77	22/1/2024	OFICIO-CO1,PCCNTR.5055621-2023-042	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD DE VERSIÓN ÚLTIMA DE PLANOS ACTUALIZADOS
78	22/1/2024	OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-043	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO V5 DE OBRA N. 4
79	22/1/2024	OFICIO-CO1.PCCNTR.5055621-2023-044	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD FACTIBILIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y GAS
80	22/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A IN-CA2023-5347794-048
81	23/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A IN-CA2023-5347794-049
82	23/1/2024	OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-045	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA20235347795-044 Y IN-CA2023-5347795-041 RADICADO DOCUMENTACION PERSONAL ACTIVO EN OBRA
83	23/1/2024	OFICIO-CO1.PCCNTR.5055621-2023-046	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-043 Y IN-CA2023-5347795-040 RADICADO DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA Y OPERARIOS
84	23/1/2024	OFICIO-CO1.PCCNTR.5055621-2023-047	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORMES TECNICOS SEMANALES, 1 AL 6 DE ENERO Y AL 13 DE ENERO DEL 2024
85	23/1/2024	OFICIO SG-23-2024TRD-100-03	CONCEJO DE ZIPAQUIRA	INVITACIÓN INTERVENCIÓN SESIONES PLENARIAS VISITA OBRAS
	23/1/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Formatos de Calidad Actualizados para Proyectos
86	24/1/2024	OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-048	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO HOJAS DE VIDA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SST
87	24/1/2024	RADICADO 2024-130.1-657-1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EL CONTRATOS DE INTERVENTORIA DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRÁ
88	25/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-049	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EAI EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL
89	25/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-050	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA N.5
90	26/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	RELACION PILOTES FUNDIDOS AL 26/01/2024
91	26/1/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ENVIO ACTAS DE VECINDAD SUBSANADAS
92	26/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-051	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TECNICO SEMANAL DEL 15 AL 20 DE ENERO
93	29/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CARTERAS DE EXCAVACION Y RELLENO SEMANA 21 AL 17
94	30/1/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CMCZ-032 PROPUESTAS SALIDAS A REDES HIDROSANITARIAS PÚBLICAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS
95	30/1/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CARTA, Solicitud certificados de calibración equipos y personal topografía
96	31/1/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-052	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PLAN DE GESTION - HSEQ
97	1/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-053	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO V2 DE OBRA N. 5 via WeTransfer

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
98	1/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INFORME DE AVANCE CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DE ZIPAQUIRÁ
99	2/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-056 Actas de Vecindad
100	2/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-054	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TÉCNICO SEMANAL DEL 22 DE ENERO AL 27 DE ENERO
101	2/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-052
86	5/2/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CANTIDADES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO AL 02/02/2024
87	6/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-055	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-051 RADICADO DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA
88	6/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Solicitud Informes Mensuales
89	6/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-056	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTA DE "SOLICITUD REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE ENERO" EMITIDO POR LA ALCALDÍA
90	7/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A IN-CA2023-5347795-059 ENTREGA INFORME N.5 - OBSERVACIONES
91	7/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-057	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME MENSUAL SUBSANADO V3 DE OBRA N.5
92	13/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-058	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD FACTIBILIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y GAS
93	13/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-059	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-061 RADICADO SOLICITUD APROBACION NO PREVISTOS, PLACA DE CONTRAPISO - PILOTES
94	14/2/2023	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-060	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL TÉCNICO DE OBRA N. 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO
95	14/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-048 (OBSERVACIONES DE INFORMES)
96	14/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-060
97	14/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
98	15/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-061	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONEZ ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACIÓN NO PREVISTO EXPANSIÓN DE CONCRETO PARA PILOTES
99	15/2/2024	CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-062	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-067 RADICADO PROCESO CONSTRUCTIVO PILOTAJE
100	19/2/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RELACIÓN GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONTRUCCIONES ZIPA
101	19/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-063	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA N.5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024 INCLUIDO ACTA DE COBRO E INVERSIÓN DE ANTICIPO
102	19/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD ACLARACIÓN FINANCIERA
103	21/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-062
104	21/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-065

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
105	22/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-064	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONEZ ZIPA	RADICADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024
106	22/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-065	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACIÓN DE CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR INFILTRACIÓN
107	23/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Drive información Centro Cultural y de Convenciones
108	23/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-070
109	24/2/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	Afiliación ARL Profesionales Zipaquirá
110	26/2/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-072
111	26/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-066	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-073 RADICADO NO PREVISTOS PLACA DE CIMENTACIÓN, PILOTAJE, PROVISIONAL DE OBRA, CAJAS DE PASO Y BALANCE PRESUPUESTAL
112	29/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-067	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-068 RADICADO RESPUESTA PROBLEMÁTICA CAMBIO VOLUMÉTRICO DE PILOTES
113	29/2/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONEZ ZIPA	BALANCE Y APUS DE PREVISTOS CENTRO CULTURAL
114	29/2/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-068	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD RADICADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANTE LA CAR
115	05/03/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-069	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TÉCNICO MENSUAL N. 6
116	4/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-070	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD MANTENIMIENTOS CANALES Y REDES DE CONDUCCION POR CAUSAS DE INUNDACION
117	5/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-071	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD VALLA DE CONSTRUCCIÓN
118	7/3/2024	E-MAIL	CONCRELAB	OF 42093 CONCRELAB
119	7/3/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ENVÍO DEL BALANCE CON LOS OTROS FORMATOS Y NO PREVISTOS
120	8/3/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SUBSANACION INFORME N. 6
121	11/3/2024	CMCA.CO1.PCCNTR.5055621-2023-072	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACIÓN NOPREVISTOS ELECTRICOS
122	12/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-078
123	12/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-073	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-084 RADICADO SOLICITUD ACLARACIÓN PRESENCIA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
124	12/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-074	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORMES TECNICOS SEMANALES 29 DE ENERO AL 3 FEB, 5 FEB AL 10 FEB, 12 FEB AL 17 FEB, 19 FEB AL 24 FEB Y 26 FEB AL 2 MAR
125	13/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-075	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD APROBACION PROPUESTA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS PERIMETRAL A LOS BLOQUES 1, 2 Y 3
126	13/3/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CARTA EJES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
127	13/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-076
128	14/3/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	RE: AUTORIZACIÓN EMPRESA RN
129	14/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-076	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024
130	14/3/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	FORMATOS LOGO ACTUALIZADO - CENTRO CULTURAL
131	15/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-082
132	15/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-077	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-085 RADICADO CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
133	15/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-078	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD RECOLECCIÓN DE BASURAS
134	15/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RE: RADICACIÓN DE INFORMES N.6 OBRA E INTERVENTORÍA OBSERVACIONES
135	15/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-079
136	15/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-079	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD REUNIÓN DE TEMAS SST
137	18/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-069
138	18/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-080	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-086
139	19/3/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	Radicado SOLICITUD DE PRORROGA PMT
140	19/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REITERACIÓN ENVIO DE INFORME #5. ENERO CCCZ
141	19/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REITERACION RADICACION DE INFORMES N. 6 E INTERVENTORIA OBSERVACIONES
142	19/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL EN OBRA
143	20/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA E-MAIL SOLICITUD PLANOS Y PERFILES PARA CONEXIÓN DE REDES HIDROSANITARAS
144	20/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEVOUCIÓN JUSTIFICACIÓN NPS
145	21/3/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	NO PREVISTOS CENTRO CULTURAL - JUSTIFICACIÓN - BENEFICIO AL PROYECTO - CANTIDAD
146	21/3/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-081	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD REPOGRAMACIÓN COMITPE DE OBRA 1 DE ABRIL 2024
147	21/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-091
148	23/3/2024	E-MAIL	FRED ARANGO	INFORME DE ENSAYOS
149	23/3/2024	E-MAIL	FRED ARANGO	INFORME DE RECALCES PILOTES
150	26/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMPROMISOS COMITÉ
151	26/3/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-090
152	1/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INFORME 6 DE MARZO MODIFICADO -ANEXOS
153	1/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-082	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CONCEPTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS Y PROPUESTA RECALCE DE PILOTES
154	1/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-083	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-095 RADICADO JUSTIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
155	2/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-084	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5447795-092 Y IN-CA2023-5447795-096 RADICADO DOCUMENTACIÓN SST
156	2/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A HOJAS DE VIDA SUBSANADAS
157	2/4/2024	E-MAIL	EPZ	SOLICITUD RADICADO 2024-130,1-3335-1
156	2/4/2024	E-MAIO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUES A ENVIO DE INFORME SUBSANADO DEL 27 DE MARZO DE 2024
157	2/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RV: Zipaquirá complejo cultural
158	3/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ENVIO DOCUMENTO MOFICADO DE JUSTIFICACIÓN
159	4/4/2024	E-MAIL	DANIELA ROJAS CONCRELAB	PROFORMA 0244- CONSORCIO ARTES 2023
160	4/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-085	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TECNICO MENSUAL N.7
161	4/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-086	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	PRPUESTA ALTERNATIVA CAMBIO DE REFUERZO EN PLACA DE CIMENTACIÓN-MODULO AUDITORIO
162	4/4/2024	E.MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	JUSTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS - MODIFICATORIO
163	6/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-087	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORÍA
164	6/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-088	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INCONFORMIDAD FUNCIONES SST-INTERVENTORIA
165	6/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-089	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE RETIRO VIVIENTE DE OBRA

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
166	8/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-090	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	EJECUCIÓN DE LABORES EN SEMANA SANTA
167	8/4/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	Re: Formatos Semanales solicitados CONSORCIO
168	8/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ENVÍO DE PLANILLA CONDIAL
169	8/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-091	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-099 DOCUMENTACIÓN SST
170	8/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INFORME N.7 - MARZO - SUBSANADO
171	8/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-089
172	8/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5447795-099
173	9/4/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	Plano actualizado para aguas lluvias
174	9/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Respuesta a oficio IN-CA2023-5447795-100
175	9/4/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	INFORME MARZO
176	9/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-090
177	10/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTACIÓN BALANCE
178	10/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Respuesta a oficio IN-CA2023-5347795-101
179	11/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCUONES ZIPA	RELACION GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
180	11/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-092	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RELACIÓN FACTURAS INVERSIÓN DE ANTICIPO
181	12/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-093	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PMT-ABRIL
182	12/4/2024	E-MAIL	SST CMCZ	Respuesta a oficio IN-CA2023-5347795-104
183	15/4/2024	E-MAIL	JULIETH TORRES	GIROS ZIPAQUIERA CTO GAS NATURAL
184	15/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-094	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO MATRIZ DE RIESGOS
185	19/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	JUSTIFICACION TECNICA PLACA DE CIMENTACION Y CONCEPTO ESTRUCTURAL
186	19/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Aclaración de modificatorio
187	19/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Respuesta a oficio IN.CA2023-5347795-102
188	19/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTACIÓN AJUSTADA MODIFICATORIO CENTRO CULTURAL
189	22/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-095	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RELACIÓN PLANOS ELECTRICOS
190	22/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL EN OBRA
191	23/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA DE JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS, APUS, BALANCE, MODIFICATORIO Y ACTAS
192	24/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-096	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACLARACIÓN DE DETALLES ESTRUCTURALES EN POLIVALENTE
193	24/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-097	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024
194	24/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SEGUIMIENTO DE CANTIDADES CCCZ
195	24/4/2024	E-MAIL	LUZ ASTRID CURREA RAMIREZ	SOLICITUD ADELANTAR REQUERIMIENTO CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
196	24/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA ACTA DE COMITÉ No. 18 del 22 de abril de 2024
197	24/4/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-098	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD EXTRACTOS BANCARIOS
198	24/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUES A OFICIO IN-CA2023-5347795-101
199	24/04/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-099	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORMES TECNICOS SEMANALES 1 AL 9 DE MARZO, 11 AL 16 DE MARZO, 18 AL 23 DE MARZO Y 25 AL 30 DE MARZO
200	25/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	APUS AJUSTADOS-ZIPAQUIRA
201	27/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	BALANCE AJUSTADO - CENTRO CULTURAL

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
202	29/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	BALANCE AJUSTADO MODIFICATORIO N.1 CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
203	30/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RELACIÓN GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONTRUCCIONES ZIPA
204	30/4/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-101
205	30/4/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	220623032024EstaciónSouthNTS-362LS12214EdwarDíaz.pdf
206	30/4/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Formato de supervisión para corte de obra
207	1/5/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTOS AJUSTADOS BALANCE-MODIFICATORIO N,1 CENTRO CULTURAL ZIPAQUIERA
208	2/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-103	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO MODIFICATORIO N.1 AJUSTADO CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
209	2/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-101	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A IN-CA2023-5347795-107
210	2/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ACTUALIZACIÓN FORMATOS DE CALIDAD
211	2/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-102	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TECNICO MENSUAL N. 8
212	3/5/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	INFORME TECNICO ABRIL SST
213	6/5/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INFORME SST V2
214	7/5/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	INFORME SST
215	07/05/2024	E.-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD DE ACCESO A PROYECTO
216	8/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.OCCNTR.5347795
217	8/5/2024	E-MAIL	JULIETH TORRES	RESPUESTA A DETALLES DEL COMITPE
218	9/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RADICADO 2024-130,1-5557-1 CONCEPTO TÉCNICO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
219	10/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-104	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACTA DE COBRO N.1
220	14/5/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	MEMORIAS CANTIDADES SEMANA DEL 6 AL 12 DE MAYO
221	15/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-105	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORMES TÉCNICOS SEMANALES A AL 6 DE ABRIL. 8 AL 13 DE ABRIL, 15 AL 20 DE ABRIL Y 22 AL 27 DE ABRIL
222	17/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN.CA2023-5347795-116
223	17/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RADICADO 2024-130,1-6044-1 Solicitud de Revisión, atención y ajuste de actividades de Obra Centro Cultural y de Convenciones
224	18/5/2024	E.MAIL	SST CMCZ	NOTIFICACION DE NOVEDADES
225	20/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-106	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PROCESO CONSTRUCTIVO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
226	20/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-107	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO TRAZABILIDAD DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CONSULTORIA
227	21/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RV: Tralado radicado IN-CA2023-5347795-119 Centro Cultural Tierra de Artistas de Zipaquirá
228	22/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-109	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TRISMESTRAL 1 DEL PROYECTO CENTRO CULTURAL DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS. PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
227	23/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-110	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA 0	RAIDCADO INFORMES TECNICOS SEMANALES 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, 6 AL 11 DE MAYO Y 13 AL 18 DE MAYO
228	23/5/2024	E.MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTACIÓN FORMATO ACTUALIZADO MODIFICATORIO N.1 CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
229	23/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-108	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO COMPARATIVO TECNICO-ECONOMICO DE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN RELACION A PARRILLA DE 3/8" ELABORADA EN SITIO PARA PLACA DE CIMENTACION
230	24/5/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CANTIDADES REDES HIDROSANITARIAS
231	24/5/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	MEMORIAS REDES Y RELLENO
232	25/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-111	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-123 RADICADO CONSULTAS ESTRUCTURALES

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
233	25/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-112	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO TRAZABILIDAD REUNION CONSULTORIA Y DUDAS EN TEMAS ACUSTICOS Y VENTANERIA
234	27/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-113	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DANDO RESPUESTA A OFICIO 125 Y 126 ORDEN Y ASEO
235	27/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-114	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD ULTIMO RECIBO PAGO DE MEDIDOR
236	27/5/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RELACION GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
237	27/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-115	CONSORCIO MEGA CONSTRUCIONES ZIPA	DANDO RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-127 PUNTO DE ENCUENTRO EN OBRA
237	28/5/2024	E-MAIL	LAURA VANESSA PRIETO	INFORMES MENSUALES SST
238	28/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-116	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RENDIMIENTO FINANCIEROS ABRIL 2024
239	29/5/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CARTERAS RED SANITARIA
240	29/5/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-117	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-125
241	31/5/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RV: Zipaquirá centro cultural oficio
242	1/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-118	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TÉCNICO MENSUAL N.9
243	1/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CANTIDADES ALC.SAN
244	6/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	Informe mes de Mayo 2024 Topografía
245	6/6/2024	E-MAIL	Interventoria Cultural	INFORME INTERVENTORIA SST MAY
246	7/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-120	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-140
247	7/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-121	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PROGRAMACIÓN AJUSTADA MODIFICATORIO N1
248	8/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	CANTIDADES DE OBRA POR TOPOGRAFIA SEMANA 2 AL 8 DE JUNIO 2024
249	7/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR5055621-2023-122	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A SOLICITUD OFICIO IN-CA2023-5347795-138
250	8/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNT.5055621-2023-123	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-142 RADICADO POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO N.1
251	8/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-124	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-139 ACTA N.1 Y ANEXOS
252	11/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-125	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO FICHAS TÉCNICA TRANSFORMADOR Y PLANTA ELÉCTRICA
253	11/6/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-141
254	11/6/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A RADICADO IN-CA2023-5347795-133
255	12/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-126	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESÚESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-144 RADICADO ACTA DE COBRO N.1 AJUSTADA
256	14/6/2024	RAD 2024-130.1-7966-1	CAMILO VANEGAS LA TORRE	solicitud de revisión, atención ya ajuste a actividades de obra centro cultural y de convenciones segun hallazgos del recorrido de obra del dia 13 de junio de 2024
257	14/6/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INFORME N.9 MES DE MAYO-AJUSTADO
258	14/6/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACTA N.1 AJUSRADA AL 15,02% - CENTRO CULTURAL V2
259	14/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-127	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO IN-CA2023-5347795-145 RADICADO PLANTE DE CONTINGENCIA AJUSTADO
260	15/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	memorias
261	17/6/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE FIRMA INTERVENTORIA APUS ACTA N.1
262	18/6/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TRISMETRAL AMBIENTAL N.2 CENTRO CULTURAL
263	18/6/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACTA DE COBRO N.1 - CENTRO CULTURAL - AJUSTADA
264	20/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-129	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACCIONES NECESARIAS PARA EL CASINO
265	20/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-130	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO PASE DE TUBERÍAS EN VIGAS

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
266	20/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-131	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACION PROCESO CORRETIVO DE COLUMNAS
267	20/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-132	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO ACTA DE COBRO N.1 AJUSTADA JUNTO CON ANEXOS
268	22/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	MEMORIAS CANTIDADES SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO
269	24/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-133	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-151
270	24/6/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA IN-CA2023-5347795-146
271	26/6/2024	E-MAIL	CAMILO VANEGAS LA TORRE	aclaración de fecha del radicado 2024-130.1-7966-1
272	26/6/2024	E-MAIL	CAMILO VANEGAS LA TORRE	aclaración de fecha del radicado 2024-130.1-7966-1
273	27/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-134	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REVISION Y ANALISIS DE CANTIDADES SISTEMA DE FACHADA COLGANTE
274	26/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-135	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TECNICO SOBRE ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
275	28/6/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	Memorias red potable semana
276	29/6/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-136	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-147Y IN-CA2023-5347795-149 RADICADO PROGRAMACIONAJUSTADA
277	2/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-137	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO INFORME TECNICO MENSUAL N.10
278	3/7/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RELACION GIROS FIDUCIA CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA
279	3/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-138	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADIADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024
280	3/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-139	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD APROBACION ESPECIFICACIONES ASCENSOR
281	3/7/2024	E-MAIL	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACTA DE REUNION - CONSULTORIA 27 JUNIO 2024
282	4/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-140	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CORRECCION DEL INFORME No. 10 SST
283	4/7/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	DEOLUCION IN-CA2023-5347795-152 RADICACIÓN ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
284	5/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-141	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO SOLICITUD INFORMACION ESTADO DE REVISION ACTA PARCIAL DE CORTE N. 1
285	5/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-142	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	LIMPIEZA EN LA AVENIDA INDUSTRIAL
286	5/7/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	INFORME MENSUAL DE TOPOGRAFIA MES DE JUNIO-2024
287	5/7/2024	E-MAIL	MARIBEL CUBILLOS NIETO	MEMORIAS DE CANTIDADES SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO
288	6/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-143	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA OFICIO IN-CA2023-5347795-159 RADICADO INFORME TECNICO MENSUAL No. 10
289	8/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-144	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA CORREO OBSERVACIONES ACTA No. 1 SUPERVISION-RADICADO ACTA DE CORTE No. 1 AJUSTADA
290	9/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-145	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ALCANCE RESPUESTA CORREO OBSERVACIONES ACTA N. 1 SUPERVISION-RADICADO ACTA DE CORTE N. 1 AJUSTADA
291	9/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-146	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD APROBACION VERTEDERO DE DESAGUES DE LOS TANQUES DE AGUAS LLUVIAS Y CONTRA INCENDIO
292	10/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-147	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ALCANCE RESPUESTA OBSERVACIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA MESA DE TRABAJO VIRTUAL A ACTA N. 1-RADICADO ACTA DE CORTE N. 1 AJUSTADA V6
293	10/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-148	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PLANOS DE DETALLE Y DESPIECE PARA CONTINUAR ACTIVIDADES DE DESARROLLLO DE ESTRUCTURA METÁLICA
294	11/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-149	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO PROGRAMACION FIRMADA - CENTRO CULTURAL

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	DIRIJIDO POR:	ASUNTO
295	12/7/2024	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACTA DE REUNIÓN CONSULTORIA 12 DE JULIO 2024-CENTRO CULTURAL
296	12/7/2024	E-mail	MARIBEL CUBILLOS NIETO	MEMORIAS CANTIDADES SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024
297	16/7/2024	E-MAIL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	DEVOLUCION 2 IN-CA2023-5347795-163_SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
298	22/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-150	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RADICADO RESPUESTA CONDUCTO REGULAR
298	17/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-151	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD REVISIÓN ACTIVIDAD IMPERMEABILIZACIÓN
299	17/7/2024	CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-152	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD REVISIÓN ACTA DE CORTE BORRADOR N. 2

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
1	10/10/2023	IN-CA2023-5347795-001	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Solicitud hojas de vida de personal para el desarrollo del proyecto.
2	10/10/2023	IN-CA2023-5347795-002	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Solicitud cronograma de actividades.
3	10/10/2023	IN-CA2023-5347795-003	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-006, ASUNTO " RADICACION INFORME TOPOGRAFIA
4	20/10/2023	IN-CA2023-5347795-004	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	
5	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-005	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Actualizacion de polizas
6	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-006	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	Aprobacion de PMT
7	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-007	2023-130,1-10377-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Radicacion actualizacion de polizas
8	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-008	2023-130,1-10378-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ACTUALIZACION HOJAS DE VIDA PERSONL PROFESIONAL INTERVENTORIA
9	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-009	2023-130,1-10379-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA
10	24/10/2023	IN-CA2023-5347795-010	2023-130,1-10381-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA
11	25/10/2023	IN-CA2023-5347795-011	2023-130,1-10400-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Respuesta requerimiento que tiene como ASUNTO: TRAMITE ANTICIPO CONTRATO CO1.PCCNTR.5055621 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE Zipatjuirá, CUND.INAMARCA"
12	26/10/2023	IN-CA2023-5347795-012	2023-130,1-10493-3	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ACTUALIZACION DE POLIZAS DE CONTRATISTA DE OBRA
13	26/10/2023	IN-CA2023-5347795-013	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	APLAZAMIENTO DE REUNION CITADA EN OFICIO IN-CA2023-5347795-004
14	31/10/2023	IN-CA2023-5347795-014	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD DOCUEMENTACION PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATO
15	2/11/2023	IN-CA2023-5347795-015	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIOS CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-011 Y CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-012
16	8/11/2023	IN-CA2023-5347795-016	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA
17	9/10/2023	IN-CA2023-5347795-017	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-013
18	9/10/2023	IN-CA2023-5347795-018	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-016 Y RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-017
19	10/11/2023	IN-CA2023-5347795-019	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION DE INFORMES MENSUALES, OBRA E INTERVENTORIA

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
20	14/11/2023	IN-CA2023-5347795-020	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-019
21	23/11/2023	IN-CA2023-5347795-021	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-020.
22	30/11/2023	IN-CA2023-5347795-022	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD DOCUMENTACION PARA TRAMITES DE CONEXIÓN DE PROVISIONAL DE OBRA LUZ – AGUA.
23	1/12/2023	IN-CA2023-5347795-023	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS DENTRO DEL AREA DE VIA ALAMEDA DEL ZIPA LINDERO ORIENTAL CON CENTRO CULTURAL
24	15/12/2023	IN-CA2023-5347795-024	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA RADICADO 2023-130.1-17240-1
25	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-025	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1-PCCNTR.5055621-2023-022
26	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-026	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1-.PCCNTR.5055621-2023-024
27	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-027	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACION DE INFORMES 3 OBRA E INTERVENTORIA
28	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-028	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIOS CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-022, CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-025, CMCZ-CO1-PCCNTR.5055621-2023-026 Y CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-027
29	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-029	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRARO No, CO1.PCCCNTR.5055621
30	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-030	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-028
31	20/12/2023	IN-CA2023-5347795-031	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REITERACION DE SOLICITUD DOCUMENTACION PARA TRAMITES DE CONEXCION DE PROVISIONAL DE OBRA LUZ-AGUA
32	27/12/2023	IN-CA2023-5347795-032	E- mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.	REITERACION A SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRARO No. CO1.PCCCNTR.5055621
33	26/12/2023	IN-CA2023-5347795-033	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD
34	27/12/2023	IN-CA2023-5347795-034	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO #2023-130.1-16821-1
35	27/12/2023	IN-CA2023-5347795-035	E- mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
36	15/1/2024	IN-CA2023-5347795-036	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-036
37	16/1/2024	IN-CA2023-5347795-037	E.mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMUNICADO SOBRE SEMOVIENTES Y VIVIENTES EN AREA DE TRABAJO CENTTRO CULTURAL
38	16/1/2024	IN-CA2023-5347795-038	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-034
39	17/1/2024	IN-CA2023-5347795-039	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
40	17/1/2024	IN-CA2023-5347795-040	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA EN OBRA
41	17/1/2024	IN-CA2023-5347795-041	E.-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y AYUDANTES
42	18/1/2024	IN-CA2023-5347795-042	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACIÓN ACTUALIZACIÓN PMT CENTRO CULTURAL
43	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-043	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCINES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA EN OBRA
44	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-044	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y AYUDANTE
45	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-045	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	COMUNICADO SOBRE DAÑO CAUSADO POR SEMOVIVIENTES EN LA PLACA CONTRAPISO DONDE SE APOYA SILO DE CONCRETO
46	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-046	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMUNICACIÓN DE OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-042 SOLICITUD DE VERSIÓN ÚLTIMA DE PLANOS ACTUALIZADOS
47	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-047	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 4
48	22/1/2024	IN-CA2023-5347795-048	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ENTREGA INFORME N. 4 OBRA E INTERVENTORÍA
49	23/1/2024	IN-CA2023-5347795-049	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD FIRMADAS
50	29/1/2024	IN-CA2023-5347795-050	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REITERACIÓN SOLICITUD DE VERSIÓN ÚLTIMA DE PLANOS ACTUALIZADOS
51	29/1/2024	IN-CA2023-5347795-051	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	TERCERA REITERACIÓN SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA EN OBRA
52	29/1/2024	IN-CA2023-5347795-052	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES INTERVENTORÍA
53	30/1/2023	IN-CA2023-5347795-053	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES DE ESTA INTERVENTORÍA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) AL CONTRATISTA MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
54	30/1/2024	IN-CA2023-5347795-054	E-mail	CONSORCIO MEGRA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD NOMBRAMIENTO OFICIAL DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
55	30/1/2024	IN-CA2023-5347795-055	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD SUBSANASIÓN INFORME MENSUAL N. 5
56	30/1/2024	IN-CA2023-5347795-056	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SUBSANASIÓN OBSERVACIONES ACTAS DE VECINDAD
57	6/2/2024	IN-CA2023-5347795-057	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACLARACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PILOTES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE PROBLEMÁCTICA EXISTENTE
58	5/2/2024	IN-CA2023-5347795-058	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES DE INFORME DE OBRE N .5
59	6/2/2024	IN-CA2023-5347795-059	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ENTREGA OFICIAL DE INFORME DE INTERVENTORÍA N. 5
60	8/2/2024	IN-CA2023-5347795-060	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ENTREGA SUBSANACIONES HOJAS DE VIDA PROFESIONALES CENTRO CULTURAL

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
61	12/2/2024	IN-CA2023-5347795-061	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ACTAS DE COMITÉ
62	12/2/2024	IN-CA2023-5347795-062	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD VERSIÓN ÚLTIMA DE PLANOS ACTUALIZADOS
63	13/2/2024	IN-CA2023-5347795-063	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN ENTREGA DE INFORME DE OBRA N. 5
64	13/2/2024	IN-CA2023-5347795-064	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD ACLARACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PILOTES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE PROBLEMÁTICA EXISTENTE.
65	13/2/2024	IN-CA2023-5347795-065	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CAMBIO DE FECHA DE CORTE MENSUAL DE OBRA
66	13/2/2024	IN-CA2023-5347795-066	E-mail	SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS	COMUNICACIÓN OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR-2023-044
67	15/2/2024	IN-CA2023-5347795-067	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN DE SOLICITUD ACLARACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PILOTES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE PROBLEMÁTICA EXISTENTE
68	20/2/2024	IN-CA2023-5347795-068	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	PROBLEMATICA RESPECTO A CAMBIO VOLÚMETRICO DE PILOTES
69	20/2/2024	IN-CA2023-5347795-069	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS	RADICACIÓN DE INFORMES N. 5 OBRA E INTERVENTORÍA
70	20/2/2024	IN-CA2023-5347795-070	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	APROBACIÓN INFORME MENSUAL N. 5
71	21/2/2024	IN-CA2023-5347795-071	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ENTREGA SUBSANACIONES HOJAS DE VIDA PROFESIONALES CENTRO CULTURAL
72	26/2/2024	IN-CA2023-5347795-072	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD DE DISCRIMINACIÓN DE ALCANCE AIU DEL CONTRATO DE OBRA
73	26/2/2024	IN-CA2023-5347795-073	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE COMITÉ N. 10.
74	26/2/2024	IN-CA2023-5347795-074	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN SST
75	27/2/2024	IN-CA2023-5347795-075	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE ENSAYOS DE LABORATORIO - PRUEBAS PIT
76	4/3/2024	IN-CA2023-5347795-076	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD RADICADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANTE LA CAR
77	4/3/2024	IN-CA2023-5347795-077	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PETICIÓN DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y REDES DE CONDUCCIÓN DEBIDO A INUNDACIONES.
78	5/3/2024	IN-CA2023-5347795-078	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD VALLA DE CONSTRUCCIÓN
79	11/3/2024	IN-CA2023-5347795-079	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	APROBACIÓN MODIFICATORIO DE CONTRATO
80	11/3/2024	IN-CA2023-5347795-080	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 6
81	11/3/2024	IN-CA2023-5347795-081	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RADICACIÓN DE INFORMES N. 6 OBRA E INTERVENTORIA
82	11/3/2024	IN-CA2023-5347795-082	E-mail	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS	REITERACIÓN COMUNICADO SOBRE VIVIENTE EN ÁREA DE TRABAJO CENTRO CULTURAL
83	12/3/2024	IN-CA2023-5347795-083	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PMT
84	12/3/2024	IN-CA2023-5347795-084	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD PRESENCIA DE INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
85	13/3/2024	IN-CA2023-5347795-085	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPOS Y PERSONAL TOPOGRAFÍA

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
86	13/3/2024	IN-CA2023-5347795-086	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INICIAL FALTANTE Y REQUERIMIENTO DE ACITIVDADES AUSENTES
87	18/3/2024	IN-CA2023-5347795-087	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-079
88	18/3/2024	IN-CA2023-5347795-088	E-mail	CIO MEGA CONSTRUCCIO	SOLICITUD PARA PRUEBAS PIT
89	19/3/2024	IN-CA2023-5347795-089	E-mail	RETARIA DE OBRAS PÚBL	JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS
90	19/3/2024	IN-CA2023-5347795-090	E-mail	RETARIA DE OBRAS PÚBL	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORME N. 5 OBRA E INERVENTORIA
91	21/3/2024	IN-CA2023-5347795-091	E-mail	RETARIA DE OBRAS PUBL	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN COMITÉ DE OBRA DEL 01 DE ABRIL 2024
92	21/3/2024	IN-CA2023-5347795-092	E-mail	CIO MEGA CONSTRUCCIO	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.-CO1.PCCNTR.5055621-2023-080
93	1/4/2024	IN-CA2023-5347795-093	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PRÓRROGA PMT
94	1/4/2024	IN-CA2023-5347795-094	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DEVOLUCIÓN MODIFICATORIO CONTRATO
95	1/4/2024	IN-CA2023-5347795-095	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE COMUNICACIÓN A EPZ DE PETICIÓN MANTENIMIENTO DE CANALES Y REDES DE CONDUCCIÓN
96	2/4/2024	IN-CA2023-5347795-096	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN OFICIO IN-CA2023-5347795-092
97	4/4/2024	IN-CA2023-5347795-097	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR-5055621-20023-084
98	4/4/2024	IN-CA2023-5347795-098	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES	RESPUESTA A REVISIÓN DE INFORME N°7 SST
99	6/4/2024	IN-CA2023-5347795-099	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES	RESPUESTA NO APROBACIÓN INFORME No. 7
100	9/4/2024	IN-CA2023-5347795-100	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD PRÓRROGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
101	9/4/2024	IN-CA2023-5347795-101	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RADICADO INFORMES N.7 OBRA E INTERVENTORIA
102	9/4/2024	IN-CA2023-5347795-102	E-mail	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS	JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS
103	11/4/2024	IN-CA2023-5347795-103	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A PROPUESTA ALTERNATIVA CAMBIO DE REFUERZO EN PLACA DE CIMENTACIÓN-MODULO AUDITORIO
104	11/4/2024	IN-CA2023-5347795-104	E-mial	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA GAS NATURAL
105	24/4/2024	IN-CA2023-5347795-105	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	COMUNICACIÓN DE OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055261-2023-096 "SOLICITUD ACLARACIÓN DE DETALLES ESTRUCTURALES EN POLIVALENTE"
106	25/4/2024	IN-CA2023-5347795-106	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD DE PLANOS ELÉCTRICOS FALTANTES
107	30/4/2024	IN-CA2023-5347795-107	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES
108	02/05/2024	IN-CA2023-5347795-108	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	JUSTIFICACION ACTIVIDADES NO PREVISTAS
109	2/5/2024	IN-CA2023-5347795-109	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD APROBACION MODIFICATORIO
110	2/5/2024	IN-CA2023-5347795-110	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ No. 19
111	8/5/2024	IN-CA2023-5347795-111	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AVAL Y JUSTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA A MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA
112	8/5/2024	IN-CA2023-5347795-112	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD APROBACION MODIFICATORIO
113	8/5/2024	IN-CA2023-5347795-113	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACIÓN INFORMES No. 8 OBRA E INTERVENTORÍA
114	9/5/2024	IN-CA2023-5347795-114	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 7 Y8
115	15/5/2024	IN-CA2023-5347795-115	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE SUBSANACIÓN A OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
116	15/5/2024	IN-CA2023-5347795-116	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RESPUESTA A OFICIO "CONCEPTO TÉCNICO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN" DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA
117	15/5/2024	IN-CA2023-5347795-117	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOLICITUD NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES
118	18/5/2024	IN-CA2023-5347795-118	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ENTREGA COMPROMISOS COMITÉ No. 21
119	18/5/2024	IN-CA2023-5347795-119	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PRESENCIA ING. ESTRUCTURAL CONSULTOR
120	20/5/2024	IN-CA2023-5347795-120	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROTOCOLO DE INGRESO DE OBRA
121	20/5/2024	IN-CA2023-5347795-121	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ No. 21
122	21/5/2024	IN-CA2023-5347795-122	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	REITERACIÓN DE PETICIÓN DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y REDES DE CONDUCCIÓN DEBIDO A INUNDACIONES
123	23/5/2024	IN-CA2023-5347795-123	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	COMUNIDADO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTO A REUNIÓN CON ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE CONSULTORÍA
124	23/5/2024	IN-CA2023-5347795-124	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN DE SOLICITUD ENTREGA DE COMPROMISOS COMITÉ No. 21,
125	27/5/2024	IN-CA2023-5347795-125	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA
126	27/5/2024	IN-CA2023-5347795-126	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN SOBRE EL ORDEN Y ASEO
127	27/5/2024	IN-CA2023-5347795-127	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	PUNTO DE ENCUENTRO EN OBRA
128	27/5/2024	IN-CA2023-5347795-128	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD EVIDENCIA DE ENSAYOS ASENTAMIENTOS DE CONCRETO
129	27/5/2024	IN-CA2023-5347795-129	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	COMUNICADO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-114
130	28/5/2024	IN-CA2023-5347795-130	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTACIÓN SEMANAL SST
131	29/5/2024	IN-CA2023-5347795-131	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
132	29/5/2024	IN-CA2023-5347795-132	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO DE OBSERVACIONES HECHAS REFERENTE AL CONCEPTO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024
133	29/5/2024	IN-CA2023-5347795-133	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN, ATENCIÓN Y AJUSTE A ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
134	30/5/2024	IN-CA2023-5347795-134	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	COMUNICADO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-111
135	2/6/2024	IN-CA2023-5347795-135	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	COMUNICADO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
136	2/6/2024	IN-CA2023-5347795-136	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-108 CON RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DE MALLAS Y ACERO N. 3 PARA LA LOSA DE CIMENTACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y CONVENCIONES
137	5/6/2024	IN-CA2023-5347795-137	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 9 SST
138	6/6/2024	IN-CA2023-5347795-138	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
139	6/6/2024	IN-CA2023-5347795-139	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES AL OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-104 RADICADO BORRADOR ACTA DE COBRO N.1 CENTRO CULTURAL
140	7/6/2024	IN-CA2023-5347795-140	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CORRECCIÓN DEL NFORME N. 9 SST
141	7/6/2024	IN-CA2023-5347795-141	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RADICACIÓN DE INFORMES N. 9 OBRA E INTERVENTORÍA
142	7/6/2024	IN-CA2023-5347795-142	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA
143	11/6/2024	IN-CA2023-5347795-143	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RADICACIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO N.1
144	11/6/2024	IN-CA2023-5347795-144	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REITERACIÓN OFICIO IN-CA2023-5347795-139 – ACTA PARCIAL No. 1
145	13/6/2024	IN-CA2023-5347795-145	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SEGUIMIENTO OFICIO CMCZ.PCCNTR.5055621-2023-117
146	14/6/2024	IN-CA2023-5347795-146	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL RESIDENTE INTERVENTORÍA II E INSPECTOR DE INTERVENTORÍA I
147	17/6/2024	IN-CA2023-5347795-147	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SEGUIMIENTO OFICIO CMCZ.PCCNTR.5055621-2023-121_PROGRAMACION AJUSTADA
148	19/6/2024	IN-CA2023-5347795-148	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	ACCIONES NECESARIAS PARA EL CASINO
149	26/6/2024	IN-CA2023-5347795-149	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SEGUIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA AJUSTADA
150	20/6/2024	IN-CA2023-5347795-150	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RESPUESTA SOLICITUD DE REVISIÓN, ATENCIÓN Y AJUSTE A ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES SEGÚN HALLAZGOS DEL RECORRIDO DE OBRA DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024 RAD.2024-130-1-7966-1
151	20/6/2024	IN-CA2023-5347795-151	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD LIMPIEZA EN LA AVENIDA INDUSTRIAL
152	26/6/2024	IN-CA2023-5347795-152	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 0	RADICACION ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
153	27/6/2024	IN-CA2023-5347795-153	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR.5055621-2023-131 CON RELACION A LA SOLICITUD APROBACION PROCESO CORRECTIVO DE COLUMNAS K-5 Y M-5 DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
154	27/6/2024	IN-CA2023-5347795-154	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA A OFICIO CMCZ-CO1.PCCNTR-5055621-2023-130 CON RELACION AL PROCESO CONSTRUCTIVO PASE DE TUBERIAS EN VIGAS DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
155	27/6/2024	IN-CA2023-5347795-155	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL INSPECTOR DE INTERVENTORIA I Y II
156	2/7/2024	IN-CA2023-5347795-156	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SEGUIMIENTO REALIZADO A LA CONEXIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL PROYECTO. SEGÚN EL COMPROMISO DEL COMITÉ NÚMERO 24 DEL SEIS (6) DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

N°	FECHA	N° DE CONSECUTIVO	RADICADO	DIRIJIDO A:	ASUNTO
157	3/7/2024	IN-CA2023-5347795-157	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	CORRECION DEL INFORME N°10 SST
158	3/7/2024	IN-CA2023-5347795-158	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	REUBICACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA
159	4/7/2024	IN-CA2023-5347795-159	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10_JUNIO
160	4/7/2024	IN-CA2023-5347795-160	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	REVISION CONTRATO CO1.OCCNTR.5055621_CLAUSULA 15 MULTAS
161	6/7/2024	IN-CA2023-5347795-161	E-mail	SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 10 LA INTERVENTORÍA DEL MES DE JUNIO_CONTRATO CO1.PCCNTR.5347795
162	10/7/2024	IN-CA2023-5347795-162	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO)
163	10/7/2024	IN-CA2023-5347795-163	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ENTREGA DE ACTA PARCIAL N° 1
164	10/7/2024	IN-CA2023-5347795-164	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	RESPUESTA COMUNICADO CMCZ-CO1.PCCNTR-2023-146_VERTEDERO TANQUES
165	16/7/2024	IN-CA2023-5347795-165	E-mail	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA
166	17/7/2024	IN-CA2023-5347795-166	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRCCIONES ZIPA	Respeto de la líneas de mando
167	17/7/2024	IN-CA2023-5347795-167	E-mail	CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA	OBSERVACIONES DE ENTREGA DE ACTA PARCIAL N°1 POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE_MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 23 de agosto de 2024. IN-CA2023-5347795-200

Señores
CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA.
Arq. NELSON ANDRES HERNÁNDEZ DÍAZ
Representante legal.
Zipaquirá.

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-157;176 “SOLICITUD INFORMACIÓN Y ACLARACIÓN TÉCNICA SOBRE DETALLES NO ESPECIFICADOS EN PLANOS ESTRUCTURALES NI ARQUITECTÓNICOS.

Saludo,

Buenos días, en relación a las dudas relacionadas con la información faltante estructural del apoyo de la escalera E-1, con respecto al muro faltante de contención y al Muro fachada escalera E-1 ejes E, F/5, nos remitimos a la consultoría siendo una información de diseño que no está en los planos entregados y que en nuestro caso como interventoría no podemos realizar, por ende escalamos estas dudas a la supervisión y a su vez a la consultoría.

ING. ESP. ESTRUCTURAL - DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA

ASESOR ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA

M.P. 15202148513 BYC

ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 29 de mayo de 2024. IN-CA2023-5347795-132

Señores
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. SANDRA ATUESTA
Secretaria de Obras Públicas
Zipaquirá.

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: **RESPUESTA A OFICIO DE OBSERVACIONES HECHAS REFERENTE AL CONCEPTO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024**

Respetados Señores:

De manera muy atenta, nos permitimos aclarar, que el procedimiento que se siguió para hacer las observaciones de las juntas de construcción evidenciadas en el Auditorio, fue inicialmente mediante la visita a obra por parte del asesor estructural de la Interventoría, el cual hizo la inspección rutinaria, y en el proceso le hizo verbalmente las indicaciones expresadas en el oficio al Contratista de obra, pero de igual forma se aclara que mediante el mismo oficio enviado a la Supervisión se hizo la misma observación escrita al contratista, citando textualmente: "y se les reitera por medio de este comunicado", siendo así que las observaciones hechas al contratistas se hicieron tanto verbal como escrita. En consecuencia, consideramos un tanto fuera de lugar el oficio por parte de ustedes manifestando la inconformidad.

Por nuestra parte, buscaremos mejorar cada día en la calidad de nuestros trabajos para evitar cualquier inconveniente, además de buscar mantener una buena comunicación del avance de la obra tanto técnica como jurídicamente dentro del marco del respeto profesional que todos nos merecemos.

CONSORCIO ARTES 2023



_____

ING. ESP. ESTRUCTURAL - DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA
ASESOR ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA
M.P. 15202148513 BYC



_____

ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 15 de Mayo de 2024. IN-CA2023-5347795-116

Señores
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. SANDRA ATUESTA.
Secretaria de Obras Públicas.
Zipaquirá.

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO DE “CONCEPTO TÉCNICO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN” DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA.

Cordial Saludo,

Una vez revisada la solicitud a conceptuar referente a las juntas de construcción que se presentan en la construcción de la placa de cimentación del Auditorio, se aclara que luego de la fundida, esta interventoría les hizo verbalmente los comentarios al contratista, por medio de su residente, de estos procesos constructivos a tener en cuenta para continuar con la fundición de la placa, corroborando lo que expresa el oficio, en relación al aparte C.6.4. de la NSR-10 de las “Juntas de construcción”, y que se les reitera por medio de este comunicado con lo siguiente:

- Limpiar muy bien las juntas con soplete, para eliminar el polvo y las partículas sueltas que quedan residual a la anterior fundida.
- Secar los empozamientos de agua que puedan contaminar y cambiar el diseño de la mezcla.
- Inmediatamente antes de iniciar la fundida se debe aplicar una lechada fresca a las caras que van a quedar en contacto con la nueva mezcla.
- En relación con la ubicación de las juntas de construcción se recomienda seguir que sea en el tercio central, aunque se deja la anotación que esta va enfocada a losas de entrepiso. No hay alguna aclaración para losas de cimentación en las que toda su superficie está en contacto con el suelo y los esfuerzos cortantes se ven en gran manera contrarrestados por esta condición.
- Si la siguiente fundida se demora en aplicarse más de 15 días, se debe aplicar un epóxico para la unión de concreto viejo con nuevo.
- Se solicita al contratista adjuntar plano estructural con la actualización de la ubicación de la junta de construcción para referenciarlo en el proceso constructivo.
- Adicionalmente se solicita que de acuerdo con la programación de obra se allegue previamente este plano con

la solicitud de la realización de futuras juntas para la revisión y aprobación.

- Se aclara que no es competencia de la interventoría programar y dibujar en planos estas juntas sino la de validar y aprobar de acuerdo con la programación de obra del contratista.

Se anexa registro fotográfico,

Sin otro particular, me suscribo cordialmente



ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ARTES 2023

Atentamente,




ING. ESP. ESTRUCTURAL - DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA

ASESOR ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA

M.P. 15202148513 BYC

CONSORCIO ARTES 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO
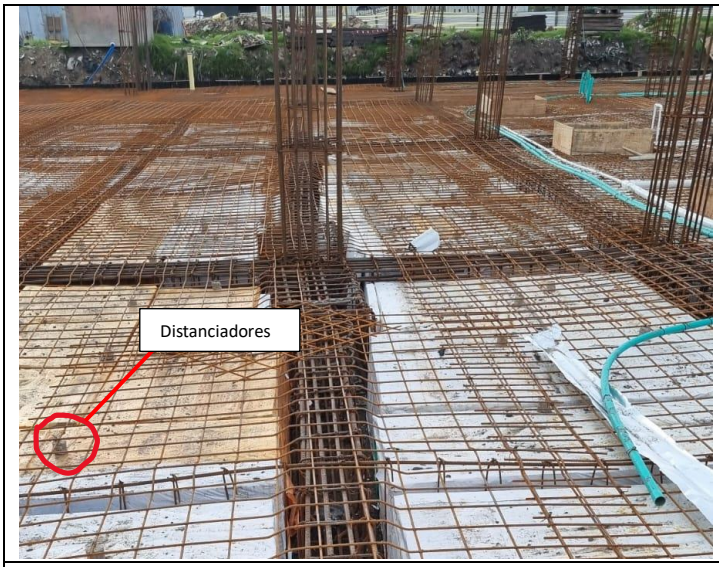
<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Sección de placa a fundir Auditorio</td><td>Colocación del concreto con vibrocompactador</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Junta de construcción antes de la limpieza</td><td>Junta de construcción antes de la limpieza</td></tr>
</table>

	
Junta de construcción limpia	**Construcción homogénea del concreto (En visita se comprobó la inexistencia de fisuras)**

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 26 de febrero de 2024. IN-CA2023-5347795-075

Señores
CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA
ARQ. ANDRES HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
AVENIDA INDUSTRIAL No.1-207
Zipaquirá - Cundinamarca

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 ““INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”.

ASUNTO: **SOLICITUD DE ENSAYOS DE LABORATORIO - PRUEBAS PIT.**

Respetados Señores:

Con la presente estamos solicitando al **CONSORCIO MEGA CONSTRUCCIONES ZIPA**, se sirvan efectuar los ensayos de laboratorio correspondientes a la prueba PIT (Pile Integrity Test) – Ensayo No Destructivo sobre los pilotes que se vienen ejecutando en la obra, en concordancia con el número de pilotes que corresponden a la suma de 609 unidades (12.488 M) distribuidos de la siguiente manera:

OBRA - CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS							
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA							
CANTIDAD DE PILOTES - OBRA							
No.		ZONA	No. DE PILOTES	DIÁMETRO (M)	ETAPA	LONGITUD UNITARIA (M)	LONGITUD TOTAL (M)
1	ETAPA 1	ESCALERA E-1	33,0	0,40	1	20,0	660,0
2		AUDITORIO	34,0	0,40		22,0	748,0
			85,0	0,50		22,0	1870,0
			18,0	0,60		22,0	396,0
3		RAMPA	17,0	0,40		22,0	374,0
TOTALES ETAPA 1			**187,0**				**4048,0**
4	ETAPA 2	PLAZOLETA	116,0	0,40	2	20,0	2320,0
			45,0	0,50		20,0	900,0
			33,0	0,60		20,0	660,0
5		AULA POLIVALENTE	18,0	0,40		20,0	360,0
			2,0	0,60		20,0	40,0
6		ESCALERA E-2 + TANQUE	40,0	0,40		20,0	800,0
TOTALES ETAPA 2			**254,0**				**5080,0**
7	ETAPA 3	EDIFICIO DE SALONES	40,0	0,40	3	20,0	800,0
			78,0	0,50		20,0	1560,0
			41,0	0,60		20,0	820,0
			9,0	0,70		20,0	180,0
TOTALES ETAPA 3			**168,0**				**3360,0**
TOTALES ETAPAS			**609,0**				**12488,0**

Los pilotes descritos se vienen trabajando con la broca helicoidal o tipo barreno en concreto de 4000 PSI y asentamiento de 10" en grava fina.

Es de anotar que el **CONSORCIO ARTES 2023** como interventor del proyecto, solicita realizar estas pruebas con el fin de verificar la continuidad de los elementos de concreto reforzado como lo son los pilotes; garantizando la transferencia de cargas de la estructura al subsuelo, así como el funcionamiento durante y posterior a la actividad sísmica y cargas axiales que pueda recibir el elemento.

Es de anotar que el ensayo PIT está regido por la norma NSR 10 y a su vez por la ASTM D 5882, por lo cual se solicita realizar la prueba en un 20% de la totalidad de pilotes, lo que corresponde a 122 Unidades. La prueba consiste en buscar definir la longitud del elemento, defectos e irregularidades presentadas durante la construcción, mediante una onda que por fuerza externa viaje a lo largo del pilote desde la punta del mismo hasta el final en donde existe el cambio de material.

Las ventajas de la prueba en cuanto a la calidad del elemento, genera para las partes la tranquilidad de entregar un pilote consistente con el procedimiento constructivo que traerá las siguientes ventajas:

- Detección de defectos o anomalías tales como:
  - Fracturas mayores.
  - Estrechamientos.
  - Estrangulamientos.
  - Incrustaciones de suelos.
- Determinación de la longitud de los pilotes.

Por otro lado y para asegurar una correcta ejecución de la prueba se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Asegurar que la edad mínima del concreto de los pilotes a probar sea de siete (7) días o cuando el concreto alcance el 75% de la resistencia de diseño.
- La superficie superior del pilote debe estar seca, horizontal, lisa y limpia. Es de anotar que la prueba debe efectuarse sobre el pilote ya descabezado.
- El equipo de prueba de integridad debe estar expuesto a la menor cantidad de ruidos con el fin de obtener una alta resolución; en el área de la obra no debe de haber motores o equipos que produzcan o generen ruidos a las señales de la prueba.
- Se solicitará el suministro de un ayudante de apoyo durante la ejecución de las pruebas para la preparación final del pilote.
- Se solicitará el registro de los datos de geometría, resistencia, volúmenes teóricos y reales de concreto, tiempo de llegada, temperatura y descarga de la Mixer.

Como conclusiones de la prueba, se obtendrán los siguientes aspectos:

- La realización de las pruebas no representa un costo significativo contra el beneficio de estar seguros de la calidad del elemento obtenido en su integridad y continuidad.

- Representa una herramienta de trabajo que evalúa solamente la continuidad, sus posibles variaciones y defectos en las secciones, permitiendo identificar el estado del pilote y su margen de incertidumbre durante el proceso constructivo antes de iniciar con la fase de construcción de la super estructura.

Las pruebas deberán efectuarse aleatoriamente en las unidades de pilote y los elementos que presenten descensos en su nivel una vez después de fundidos será de obligatoriedad la realización de la prueba.

Es de anotar que ya han sido identificados los pilotes cuyos descensos de concreto durante la fundida se han presentado para su cierre y culminación, estos elementos han sido localizados específicamente por el contratista de obra y la interventoría del proyecto.

Cualquier aclaración o ampliación que soliciten al respecto, estaré atento a solucionarla.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

Atentamente,



ING. FABIAN MAURICIO DIAZ TORRES
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA VIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 05 de septiembre de 2024. **IN-CA2023-5347795-215**

Señores
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. SANDRA ATUESTA.
Secretaria de Obras Públicas.
Zipaquirá – Cundinamarca

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: RADIACIÓN DE ENTREGA DE ACTA PARCIAL N° 2

En atención al asunto, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **CO1.PCCNTR.5347795** cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”.** Esta interventoría hace entrega del acta parcial No. 2, de acuerdo a las revisiones previamente realizadas en conjunto con el contratista y la supervisión.

- **Primera entrega parcial** – 17 de julio de 2024 por medio del oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-152,** se realiza una entrega del acta No. 2 a manera de borrador, se evidencia que en esta no se encuentran los archivos anexos a la misma, solo memorias.
- Esta interventoría comunica al contratista bajo el oficio **IN-CA2023-5347795-170** enviado el 24 de julio de 2024, en donde se solicita que las actas parciales, deben venir completas junto con informe, balance, programación, planillas SST, y demás documentos correspondientes para su debida revisión. Sin embargo, es de aclarar que esta interventoría reviso de manera interna la documentación enviada, con el fin de adelantar tramites.
- **Segunda entrega** – 29 de julio de 2024 por medio del oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-159,** se realiza respuesta por parte del contratista a las observaciones anteriormente realizadas. Con la entrega de los anexos correspondientes para su revisión completa. Esta interventoría da respuesta el 20 de agosto de 2024, bajo el oficio **IN-CA2023-5347795-170,** luego de varias mesas de trabajo realizadas en conjunto con el contratista.
- **Tercera entrega** – El contratista bajo el oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-190,** enviado el día 24 de agosto de 2024, realiza envío de la subsanación de observaciones del oficio de la interventoría anteriormente nombrado. Esto nuevamente realizado bajo mesas de trabajo en conjunto con el contratista directamente en obra.
- De acuerdo a las mesas de trabajo, nuevamente esta interventoría reitera las observaciones anteriormente realizadas, ya que no son subsanadas en su totalidad si no de manera parcial, esto se entrega bajo el oficio **IN-CA2023-5347795-207** entregado el día 27 de agosto de 2024.
- **Cuarta entrega –** El contratista bajo el oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-195,** enviado el día 30 e agosto de 2024, realiza subsanación de las observaciones dadas por esta interventoría y de acuerdo a las mesas de trabajo en conjunto realizadas directamente en obra.
- El día 4 de septiembre de 2024, se realiza comité de seguimiento de obra, en donde se le comunica al contratista el uso de los formatos actualizados los cuales fueron enviados por esta interventoría mediante correo electrónico el día 2 de agosto de 2024 y en mesas de trabajo fue solicitado el cambio, sin embargo el contratista hizo caso omiso a la directriz, razón por la cual esta interventoría se vio obligada a nombrarlo en comité y que fuera decisión de la supervisión (Entidad Contratante), razón por la cual se realizo dicho cambio y el contratista envía la actualización de formatos el mismo día 4 de septiembre de 2024

- **Quinta entrega –** El contratista realiza envío del acta actualizada en los formatos respectivos el dia 4 de septiembre de 2024, bajo el oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-202**

Lo anterior fue revisado en conjunto con el contratista, verificando medidas en campo, en diferentes mesas de trabajo con pleno conocimiento de esta interventoría, ya que, durante las revisiones, se hicieron más devoluciones con respecto a las correcciones entregadas. Sin embargo, estas ya fueron subsanadas en su totalidad y por parte de la interventoría nos permitimos dar **AVAL** de las memorias entregadas y remitirlo a la supervisión para su revisión y aprobación final.

Dentro de la entrega de este oficio se anexa lo siguiente:

CONTRATISTA:

1. ACTA DE COBRO N.1 - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA v3 (Pdf)
2. ACTA DE COBRO N.1 - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA v3 (Pdf)
3. MEMORIAS DE CANTIDADES - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA FIRMADAS (Pdf)
4. INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
5. ACTAS DE VECINDAD - CENTRO CULTURAL ZIPA
6. CERTIFICACION PARAFISCALES
7. PLANILLAS PERSONAL CONTRACTUAL
8. CARTILLAS DE ACERO
9. POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO N.1
10. PRE FACTURA 001 - ACTA 01 - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
11. PMT CENTRO CULTURAL – ABRIL
12. CONTROL E INSPECCION DE ENSAYOS CILINDORS Y PIT
13. CERTIFICACION PERSONAL OBLIGACIONES CONTRACTUALES
14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIRMADOS
15. VALES CONCRETO
16. PROGRAMACION
17. ACTA DE APROPIACION DE DISEÑOS
18. DISEÑOS DE MEZCLAS – CONCRETOS
19. LICENCIA CANTERA – AGREGADOS CONCRETO
20. CARTA CERTIFICACION CEMENTO, AGREGADOS Y ADITIVOS
21. LICENCIA CANTERA – PROVEEDOR RECEBO
22. METODO DISEÑO DE MEZCLAS Y ANTECEDENTES

INTERVENTORÍA:

1. CERTIFICADO ACTA PARCIAL No. 1
2. INFORME DE INTERVENTORÍA ACTA PARCIAL No. 1
3. INFORME DE INTERVENTORÍA SST ACTA PARCIAL No. 1
4. CURVA S CONTROL INTERVENTORIA
5. CERTIFICACION JURAMENTADA_CONTROL ANTICIPO
6. CERIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
7. JUR-AB-FR261 INFORME PERSONA JURIDICA_ CONTROL DE INTERVENTORÍA
8. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL No. 2
9. LIBERACION DE MEMORIAS DE CANTIDADES
10. HOJA DE VIDA PILOTES
11. INFORME DE TOPOGRAFIA

Quedamos atentos a observaciones y/o comentarios.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,



ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARTES 2023
Anexo: Archivo, CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

CONSORCIO ARTES 2023

Zipaquirá, 26 de junio de 2024. **IN-CA2023-5347795-152**

Señores
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. SANDRA ATUESTA.
Secretaria de Obras Públicas.
Zipaquirá – Cundinamarca

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 **“**“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”**.**

ASUNTO: **RADICACIÓN ENTREGA DE ACTA PARCIAL N° 1**

En atención al asunto, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **CO1.PCCNTR.5347795** cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203”.** Esta interventoría hace entrega del acta parcial No. 1, de acuerdo a las revisiones previamente realizadas en conjunto con el contratista y la supervisión.

- Primera entrega parcial – 10 de mayo de 2024 por medio del oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-2023-104,** se aclara que no se evidencian el pilotaje ya que no se encontraba aun el plan de contingencia para la realización de los mismos. Este se respondió bajo el oficio **IN-CA2023-5347795-139** enviado el 6 de junio de 2024, luego de mesa de trabajo en conjunto con el contratista.
- Segunda entrega parcial – 8 de junio de 2024 por medio del oficio **CMCZ.CO1.PCCNTR.5055621-124,** se realiza respuesta por parte del contratista a las observaciones anteriormente realizadas. Nuevamente se realiza reiteración de oficio de las observaciones por parte de la interventoría (**REITERACIÓN OFICIO IN-CA2023-5347795-139 – ACTA PARCIAL No.1)** enviado mediante el oficio **IN-CA2023-5347795-144**
- Luego de revisión en conjunto y mesas de trabajo en obra, se realizan entregas de las subsanaciones finales a las observaciones del acta parcial N°1 de las siguientes fechas 18 de junio de 2024, 20 de junio de 2024 y 25 de junio de 2024.

Lo anterior fue revisado en conjunto con la supervisión, verificando medidas en campo, en diferentes mesas de trabajo con pleno conocimiento del contratista, ya que, durante las revisiones, se hicieron más devoluciones con respecto a las correcciones entregadas. Sin embargo, estas ya fueron subsanadas en su totalidad y por parte de la interventoría nos permitimos dar **AVAL** de las memorias entregadas y remitirlo a la supervisión para su revisión y aprobación final.

Dentro de la entrega de este oficio se anexa lo siguiente:

CONTRATISTA:

1. ACTA DE COBRO N.1 - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA v3 (Excel y Pdf)
2. INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
3. ACTAS DE VECINDAD - CENTRO CULTURAL ZIPA
4. CERTIFICACION PARAFISCALES
5. PLANILLAS PERSONAL CONTRACTUAL
6. PLAN DE CALIDAD
7. POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO N.1

8. PRE FACTURA 001 - ACTA 01 - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA
9. PMT CENTRO CULTURAL – ABRIL
10. HSEQ
11. PLAN GERENCIAL
12. LABORATORIOS
13. CERTIFICADO PERSONAL COLOMBIANO
14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIRMADOS
15. VALES RECEBO
16. VALES CONCRETO
17. HOJA DE VIDA PILOTES - CONTROL DE CONCRETO
18. CERTIFICACION PERSONAL OBLIGACIONES CONTRACTUALES
19. DIVULGACION VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE ZIPAQUIRA
20. ZIPA- PROGRAMACION 30-05-2024 - CENTRO CULTURAL (Mpp)
21. MEMORIAS DE CANTIDADES - CENTRO CULTURAL ZIPAQUIRA FIRMADAS (Pdf)

INTERVENTORÍA:

1. CERTIFICADO ACTA PARCIAL No. 1
2. INFORME DE INTERVENTORÍA ACTA PARCIAL No. 1
3. INFORME DE INTERVENTORÍA SST ACTA PARCIAL No. 1
4. CERIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
5. CURVA S CONTROL INTERVENTORIA
6. JUR-AB-FR261 INFORME PERSONA JURIDICA_ CONTROL DE INTERVENTORÍA
7. REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
8. LIBERACION DE MEMORIAS DE CANTIDADES

Quedamos atentos a observaciones y/o comentarios.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARTES 2023
Anexo: Archivo, CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES ZIPA

ACTA 15/ OCTUBRE DE 2024

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL*
(Aprovechamiento)

ASOREMA certifica que **MEGACONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA**, entregó en el ECA: Estación de Clasificación y Aprovechamiento, los residuos de icopor que a continuación se detallan, para dar cumplimiento a
La normatividad ambiental vigente sobre residuos ordinarios y especiales: Ley 142 de 1996, Decreto 1077 de 2015, Decreto 598 de 2016, Resolución 1407 de 2018, Decreto 2412 de 2018, entre otros. **Decreto 1713 de 2002 MADS***

FECHA DE DISPOSICION	TIPO DE RESIDUO	U/M	CANTID.	DESTINACION
15 de octubre 2024	**ICOPOR**	M3	400	**El material se retira de la obra en el proyecto de construcción del centro cultural y con convenciones tierra de artistas de zipaquira**

GENERADOR	MEGACONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA
NIT	901.722.718-6
DIRECCION	Oficina: CR 16 96 64 - Of. 407
CIUDAD	Bogotá

Se expide a los 15 días del mes de Octubre de 2024

Atentamente,

ASOREMA Presidencia

JOSELIN CASTAÑEDA T
Presidente
ASOREMA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101182026**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**05**	**2023**	**18**	**05**	**2023**	**00:00**	**10**	**10**	**2023**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARTES 2023		**NAD: 350.399-0**
DIRECCIÓN: CR 68 D NRO. 25 - 86 OF 715 TO A	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	8088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		**NIT: 899.999.318-6**
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 7 - 70	CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	5939150

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 DE 2023, REFERENTE A LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA IDENTIFICADA CON NIT 899999318-6 Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP.

LA GARANTIA DE SERIEDAD CUBRIRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	**18/05/2023**	**10/10/2023**	**$621,326,890.50**

FECHA ADJUDICACIÓN : 25/05/2023

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ROJAS PIÑEROS GUILLERMO	79690557	5.00
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	900823315-1	30.00
PROYINT SAS	901463334-1	32.00
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS	901506454-1	33.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****745,592.00	$ ******20,000.00	$ *****145,462.00	$ **********911,054.00	$ ******621,326,890.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101182026

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101182026	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	05	2023	18	05	2023	00:00	10	10	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARTES 2023		**NAD: 350.399-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 68 D NRO. 25 - 86 OF 715 TO A		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		8088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		**NIT: 899.999.318-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 5 NRO. 7 - 70		ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA		5939150

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-44-101182026

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101182026**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**05**	**2023**	**18**	**05**	**2023**	**00:00**	**10**	**10**	**2023**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARTES 2023		**NAD: 350.399-0**
DIRECCIÓN: CR 68 D NRO. 25 - 86 OF 715 TO A	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	8088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		**NIT: 899.999.318-6**
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 7 - 70	CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	5939150

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****745,592.00	$ ******20,000.00	$ *****145,462.00	$ **********911,054.00	$ ******621,326,890.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002113961151(3900)000000911054(96)20240517

REFERENCIA PAGO:

1100211396115-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101182026, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de MAYO de 2023

14-44-101182026

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	08	09	2023	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ARTES 2023	NIT: 901.749.475-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 68 D NRO. 25 - 86	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	NIT: 899.999.318-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 5 NO 7 70	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	8522656

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203.

EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA PRESENTE POLIZA ES LA ALCANDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA NIT. 899.999.318-6 Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE No. CO1.PCCNTR.5347795, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (12,298,270.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(2,341,421.00)	$ ******(14,664,692.00)	$ **(1,449,759,227.34)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	08	09	2023	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ARTES 2023	NIT: 901.749.475-9	CR 68 D NRO. 25 - 86	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	NIT: 899.999.318-6	CLL 5 NO 7 70	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	8522656

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Carulla · Corresponsal

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (12,298,270.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(2,341,421.00)	$ ******(14,664,692.00)	$ **(1,449,759,227.34)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	08	09	2023	00:00	08	09	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARTES 2023		NIT: 901.749.475-9
DIRECCION: CR 68 D NRO. 25 - 86	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		NIT: 899.999.318-6
DIRECCIÓN: CLL 5 NO 7 70	**CIUDAD:** ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8522656

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ROJAS PIÑEROS GUILLERMO	79690557	5.00
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	900823315-1	30.00
PROYINT SAS	901463334-1	32.00
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS	901506454-1	33.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192859, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2023

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	19	09	2023	00:00	19	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARTES 2023	NIT: 901.749.475-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 68 D NRO. 25 - 86	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	NIT: 899.999.318-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 5 NO 7 70	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	8522656

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5347795 REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203.

EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA PRESENTE POLIZA ES LA ALCANDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA NIT. 899.999.318-6 Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2023	19/01/2026	$414,216,922.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/09/2023	19/09/2028	$207,108,461.05	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/09/2025	19/09/2030	$828,433,844.19	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE No. CO1.PCCNTR.5347795, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,298,270.00	$ ******25,000.00	$ ***2,341,421.00	$ ********14,664,692.00	$ ****1,449,759,227.34	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	19	09	2023	00:00	19	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARTES 2023		NIT: 901.749.475-9
DIRECCIÓN: CR 68 D NRO. 25 - 86	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		NIT: 899.999.318-6
DIRECCIÓN: CLL 5 NO 7 70	CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8522656
ADICIONAL:			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gran Colombia Gold Credibanco

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,298,270.00	$ ******25,000.00	$ ***2,341,421.00	$ ********14,664,692.00	$ ****1,449,759,227.34	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002114692487(3900)000014664692(96)20240918

REFERENCIA PAGO:
1100211469248-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101192859	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2023	19	09	2023	00:00	19	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO ARTES 2023		NIT: 901.749.475-9	
DIRECCION: CR 68 D NRO. 25 - 86	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6018088846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		NIT: 899.999.318-6	
DIRECCIÓN: CLL 5 NO 7 70	**CIUDAD:** ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8522656

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ROJAS PIÑEROS GUILLERMO	79690557	5.00
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	900823315-1	30.00
PROYINT SAS	901463334-1	32.00
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS	901506454-1	33.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192859, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2023

14-44-101192859

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General
