BITÁCORA

lunes, 18 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**lunes, 18 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	Si	No	No	No	No	Si	Si

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada con lluvias fuertes. Se detienen actividades y se continuará el día de mañana.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

Se inicia el día con la firma del acta de inicio del contrato de obra GGC-114-2024 con objeto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)" .

Se recibe por parte del contratista las afiliaciones del personal a ingresar en la ejecución de obra los cuales son los siguientes:

- HERIBERTO ANTONIO REYES ARAMBULET, Identificación PT 6.867.590
- YSMAEL SEGUNDO FLORES, Identificación PT 4.601.462
- LUIS EDUARDO MARTINEZ PAYARES, Identificación CC 78.766.628
- ELVIN NAVA FLOREZ, Identificación PT 4.861.486

Se da inicio a las actividades de obra para el cerramiento del predio con la poda del cesped, desmonte de postes existentes con alambre de púas, replanteo.

Por otra parte se realiza la intervención para la demolición del Antiguo Fito, con retro excavadora, dos volquetas y el respectivo retiro de los Residuos de materiales de construcción - RCD en botadero certificado por la autoridad ambiental.

'**Actividades SST y Ambientales:** Se recibe afiliaciones por parte del contratista de obra y planillas de seguridad social de subcontratistas; se realiza recorrido SST y Ambiental donde se verifica la gestión por parte del personal SST del constructor para controlar los peligros identificados en la obra y minimizar la exposición a los riesgos. Se evidencia actividades de orden y aseo por parte del personal operativo directo del constructor con la clasificación de residuos sólidos que se generan como resultado de las diferentes actividades y materiales empleados. Se evidencia el uso completo de la dotación y los EPP adecuados para las diferentes actividades que realizan y herramienta que manipulan.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Desmonte cerramiento existente

Comentarios:



FOTO 2: Desmonte cerramiento existente

Comentarios:



FOTO 3: Desmonte cerramiento existente

Comentario:



FOTO 4: Desmonte cerramiento existente

Comentarios:



FOTO 5: Demolición antiguo Fito

Comentario:



FOTO 6: Demolición antiguo Fito

Comentarios:

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
2	DESCOCOL	OPERATIVOS	1
3	D A JARAMILLO SAS	OPERATIVOS	2
		TOTAL PERSONAL	**10**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

martes, 19 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**martes, 19 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	Si	No	No	No	No	Si	Si

Observaciones: Inicio de mañana nublada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada con lluvias fuertes. Se detienen actividades y se continuará el día de mañana.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

Se continúan las actividades de obra para el cerramiento del predio con el desmonte de postes existentes con alambre de púas, replanteo y excavación manual para la infraestructura a ejecutar.

Por otra parte se realiza la intervención para la demolición del Antiguo Fito, con retro excavadora, dos volquetas y el respectivo retiro de los Residuos de materiales de construcción - RCD en botadero certificado por la autoridad ambiental. Se finaliza esta actividad realizando toda al demolición y el retiro de los escombros generados.

El ingeniero residente de obra y el ingeniero residente de interventoria realizan la toma de medidas del área para el cielo raso de los archivos, las longitudes para los cierres de espacios con malla electrosoldada, estructura para al cubierta en policarbonato, la ubicacion de los vidrios a desmontar y suministrar, y la carpinteria metalica para las rejas de las ventanas, esto con el fin de realiza el balance de mayores y menores cantidades.

'**Actividades SST y Ambientales:** Se llevo a cabo una charla breve, con una duración aproximada de 5 minutos, sobre cómo se reporta un accidente e incidente de trabajo y la forma correcta de realizar el reporte, posteriormente, se realizó un recorrido enfocado en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y aspectos ambientales. Durante este recorrido, se verificó que el personal estuviera utilizando de manera adecuada los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para las distintas actividades. Además, se supervisaron las acciones y comportamientos de los trabajadores, con el propósito de identificar y prevenir actos inseguros, promoviendo así un entorno laboral seguro y saludable.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Excavación cerramiento Nuevo

Comentarios:



FOTO 2: Toma de medidas para balance

Comentarios:

	
FOTO 3: Toma de medidas para balance	FOTO 4: Toma de medidas para balance
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Demolición antiguo Fito	FOTO 6: Demolición antiguo Fito
Comentario:	**Comentarios:**


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
2	DESCOCOL	OPERATIVOS	1
3	D A JARAMILLO SAS	OPERATIVOS	2
		TOTAL PERSONAL	**10**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

miércoles, 20 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**miércoles, 20 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	Si	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

Se continúan las actividades de obra para el cerramiento del predio con la excavación manual para la infraestructura a ejecutar. El contratista cuenta con atrasos, ya que en las instalaciones el proveedor no cuenta con energía electrica por fallos en la zona, por este motivo no se envían materiales como acero y alambre recocido al sitio de trabajo.

El ingeniero residente de obra y el ingeniero residente de interventoria realizan recorrido para ubicar los puntos donde se debe realizar el cerramiento, se observa que hay una zona del cerramiento ubicado al costado izquierdo del ingreso a la entidad, el cual cuenta con gran cantidad de material organico y sobre esa zona tambien hay arboles de gran tamaño, se realiza esta observación para que la siguiente semana en comité se hable sobre el tema de la posible tala de los arboles y que medidas a tomar para realizar los tramites ambientales con las entidades del departamento y/o municipio.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:Se llevó a cabo un recorrido en las instalaciones del ICA con el propósito de verificar las actividades programadas y asegurar que estas se desarrollen bajo condiciones seguras y conforme a las normativas establecidas. Durante el recorrido, se identificó la necesidad de renovar algunos Elementos de Protección Personal (EPP) debido al desgaste observado en los mismos, procediendo a su entrega inmediata para garantizar la protección adecuada del personal. Adicionalmente, se realizó una breve sensibilización enfocada en el cuidado de las manos y el uso seguro de herramientas manuales, destacando su importancia para prevenir lesiones y fomentar prácticas seguras en las actividades diarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Excavación cerramiento Nuevo

Comentarios:



FOTO 2: Excavación cerramiento Nuevo

Comentarios:

	
FOTO 3: Recorrido y toma de medidas para balance	FOTO 4: Recorrido y toma de medidas para balance
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Recorrido y toma de medidas para balance	FOTO 6: Recorrido y toma de medidas para balance
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

jueves, 21 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**jueves, 21 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	Si	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

La noche anterior se presentan fuertes lluvias, lo cual genera empozamiento de agua sobre la excavación que se está realizando, se procede a vaciar un poco para continuar con la actividad.

Se continúan las actividades de obra para el cerramiento del predio con la excavación manual para la infraestructura a ejecutar. El contratista cuenta con atrasos, ya que en las instalaciones el proveedor no cuenta con energía electrica por fallos en la zona, por este motivo no se envían materiales como acero y alambre recocido al sitio de trabajo.

Se adelantan actividades de poda y limpieza en el costado sur - oriental de la entidad, esto para no generar muchos atrasos mientras llega el suministro del material.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se llevó a cabo una sesión informativa con todo el personal sobre la importancia de mantener un ambiente de trabajo seguro y libre de sustancias. Se revisaron los puntos clave de la política de consumo de alcohol y drogas, haciendo hincapié en las sanciones por incumplimiento. Además, se realizó un recorrido de inspección en las diferentes áreas del ICA, verificando el estado de las instalaciones y equipos, así como el cumplimiento de las normas de seguridad.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 2: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:

	
FOTO 3: Recibo suministro materiales	FOTO 4: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Replanteo, descapote y limpieza, costado Sur-Oriente	FOTO 6: Replanteo, descapote y limpieza, costado Sur-Oriente
Comentario:	**Comentarios:**


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

viernes, 22 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**viernes, 22 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

Se continúan las actividades de obra para el cerramiento del predio con el lleno y compactado con recebo común, y solado en concreto de 13,8MPa para la infraestructura a ejecutar. Al contratista le llega el suministro de material sobre el medio día, al finalizar el solado, se procede a cortar, figurar y amarrar acero de 5/8" para pedestales y longitudinales de viga de cimentación, con flejes de 3/8".

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se ejecutó una inspección improvisada con el objetivo de evaluar el uso correcto de los EPP. Se observó que la mayoría del personal utilizaba los elementos de protección de manera adecuada. Adicionalmente, se impartió una pequeña charla sobre la importancia de identificar los riesgos presentes en las áreas de trabajo, así como los procedimientos para reportarlos y proponer mejoras. Se verificó el orden y la limpieza de las diferentes áreas, enfatizando la necesidad de mantener los espacios libres de herramientas y objetos que puedan generar accidentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 2: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 3: Recibo suministro materiales

Comentario:



FOTO 4: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 5: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentario:



FOTO 6: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

sábado, 23 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**sábado, 23 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

Se continúan las actividades de obra para el cerramiento del predio con. El contratista de obra continúa con el corte, figurado y amarre acero de 5/8" para pedestales y longitudinales de viga de cimentación, con flejes de 3/8". Se tiene contemplado que el día lunes se finalice el figurado de acero y se continue con el vaciado de concreto para la viga de cmentación.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Durante el recorrido de hoy, se evaluaron las condiciones de seguridad y salud en las diferentes áreas de trabajo. Se impartió una charla de cinco minutos sobre la prevención de lesiones osteomusculares, haciendo hincapié en los riesgos asociados a posturas inadecuadas y al levantamiento de cargas. Se verificó el orden y la limpieza de las estaciones de trabajo, así como la disponibilidad y uso adecuado de los EPP. Se identificaron algunas oportunidades de mejora las cuales serán abordadas en la próxima reunión de seguridad.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 2: Solado 13,8MPa cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:

	
FOTO 3: Corte, figurado y armado de acero	FOTO 4: Corte, figurado y armado de acero
Comentario:	**Comentarios:**


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoria
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoria



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

lunes, 25 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**lunes, 25 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra continúa con el corte, figurado y amarre acero de 5/8" para pedestales y longitudinales de viga de cimentación, con flejes de 3/8". Instalación de formaleta, sacando niveles, etc.Se tiene contemplado la finalización de estas actividades para el día de hoy, se programa fundida de concreto para el día de mañana martes 26 de noviembre.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se llevó a cabo una revisión en las instalaciones del ICA para evaluar las condiciones de seguridad en las actividades programadas, asegurando que cumplieran con las normativas vigentes y promovieran un entorno laboral seguro. Durante el recorrido, se identificaron Elementos de Protección Personal (EPP) en estado de desgaste, lo que motivó su reposición inmediata para garantizar la seguridad del personal. Además, se ofreció una breve charla enfocada en el uso correcto de los EPP y en la importancia de reportar oportunamente su deterioro para facilitar su reemplazo adecuado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Instalación de acero, cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:



FOTO 2: Instalación de acero, cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ

Comentarios:

	
FOTO 3: Instalación de acero, cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ	FOTO 4: Instalación de acero, cerramiento Nuevo, costado Nor-Occ
Comentario:	**Comentarios:**


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoria
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoria



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

martes, 26 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**martes, 26 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con la instalación de la formaleta en madera para al viga de cimentación, sobre las 02:30pm se inicia la fundida de concreto para la viga de cimentación, se finaliza al actividad a las 04:00pm con la fundida de 10 metros lineales de viga completa. Se tiene previsto para mañana 27 de finalizar de fundir todo el tramo restante de la viga de cimentación.

También en el proceso de fundida de concreto se instala el acero para los pedestales con varilla longitudinal de 5/8" y flejes de 3/8" a cada 20cm

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se realiza un recorrido en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y aspectos ambientales, verificando las acciones implementadas por el personal de SST del constructor para gestionar los peligros identificados en la obra y reducir la exposición a riesgos laborales. Durante el recorrido, se observan actividades de orden y limpieza ejecutadas por el personal operativo del constructor, incluyendo la correcta clasificación de los residuos sólidos generados como resultado de los trabajos y materiales utilizados. Además, se constata que los trabajadores hacen uso completo de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para las tareas asignadas y la manipulación de las herramientas necesarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Instalación de acero y formaleta

Comentarios:



FOTO 1: Instalación de acero y formaleta

Comentarios:

	
FOTO 3: Instalación de acero y formaleta	FOTO 4: Vaciado de concreto de 3.000PSi, viga cimentación
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Vaciado de concreto de 3.000PSi, viga cimentación	FOTO 6: Acero para pedestales 5/8" y 3/8" flejes
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

miércoles, 27 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**miércoles, 27 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con la instalación de la formaleta en madera para al viga de cimentación, sobre las 11:00am se inicia la fundida de concreto para la viga de cimentación, se finaliza al actividad a las 03:00pm con la fundida de 32,75 metros lineales de viga completa. Se finaliza la fundida de toda la viga de cimentación con una longitud total de 44,2 metros lineales. Se tiene previsto para mañana 28 de inciar con el figurado del acero para la viga de sobrecimiento.

Se instalaron todo el acero para los pedestales donde van ubicados los postes para el cerramiento, todo realizado como se encuentra en los diseños.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se realizó una inspección en las instalaciones del ICA con el objetivo de verificar las actividades programadas y garantizar que se desarrollaran bajo condiciones seguras, conforme a las normativas vigentes. Durante este recorrido, se observó que algunos Elementos de Protección Personal (EPP) presentaban desgaste, por lo que se procedió a su renovación inmediata para asegurar la protección adecuada del personal. Además, se llevó a cabo una breve charla de sensibilización sobre la importancia del cuidado de las manos y el uso seguro de herramientas manuales, destacando cómo estas prácticas son clave para prevenir lesiones y fomentar un entorno laboral más seguro en las tareas diarias

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Vaciado de concreto para viga de cimentación

Comentarios:



FOTO 2: Vaciado de concreto para viga de cimentación

Comentarios:

	
FOTO 3: Vaciado de concreto para viga de cimentación	FOTO 4: Vaciado de concreto para viga de cimentación
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Vaciado de concreto para viga de cimentación	FOTO 6: Vaciado de concreto para viga de cimentación
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

jueves, 28 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**jueves, 28 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con el corte, figurado y amarre de acero lingitudinal de 3/8" y estribos de 3/8" para la viga de sobrecimiento, Se tiene previsto para mañana 29 de inciar con la fundida de la viga de sobrecimiento de 0,20m X 0,20m para el cerramiento con malla eslabonada.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

Se realiza visita por parte del contratista de obra y de la interventoría para programar el inicio de actividades en esta sede, lo cual en el contrato de obra GGC-114-2024 dice que las actividades en todas las sedes debe ser simultaneo.

Queda el compromiso por parte del contratista de obra el inicio de las actividades en Rionegro y Puerto Berrio para el día lunes 02 de diciembre del presente año.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

En el transcurso de la jornada, se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal sobre la correcta disposición de residuos y el manejo del código de colores para su clasificación, promoviendo buenas prácticas ambientales. Adicionalmente, se informó al personal ubicado en las sedes de Rionegro y Puerto Berrío sobre la necesidad de realizar próximamente los cursos de trabajo en alturas, asegurando el cumplimiento de este requisito. Durante la tarde, se realizó el recorrido habitual, verificando las acciones de comportamiento seguro y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad en las actividades desarrolladas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

La Selva, Rionegro



FOTO 1: Visita a Rionegro

Comentarios:



FOTO 2: Visita a Rionegro

Comentarios:

Tulio Ospina, BELLO	
	
FOTO 3: Armado e instalación acero refuerzo para viga sobrecimiento	FOTO 4: Armado e instalación acero refuerzo para viga sobrecimiento
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Armado e instalación acero refuerzo para viga sobrecimiento	FOTO 6: Armado e instalación acero refuerzo para viga sobrecimiento
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

viernes, 29 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**viernes, 29 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con el corte, figurado y amarre de acero lingitudinal de 3/8" y estribos de 3/8" para la viga de sobrecimiento, Se tiene previsto para mañana 30 de inciar con la fundida de la viga de sobrecimiento de 0,20m X 0,20m para la estructura del cerramiento con malla eslabonada.

En el recorrido realizado por parte de interventoría y el contratista de obra se observa que para el cerramineto con la malla eslabonada están las longitudes de 44,20ml en el costado noroccidente colindante con cemex, 47ml en el costado sur oriente colindante con interactuar y de 15ml en el costado sur occidente colindante con interactuar

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

Queda el compromiso por parte del contratista de obra el inicio de las actividades en Rionegro y Puerto Berrio para el día lunes 02 de diciembre del presente año.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Se realizó una inspección sorpresa en la sede de Rionegro. En general, el personal demostró un buen uso de los EPP. No obstante, se identificó que varios trabajadores no contaban con los arneses de seguridad y líneas de vida necesarios para realizar las tareas a altura. Dada esta situación, se procedió a detener las actividades que implicaban trabajar en altura hasta contar con los equipos de protección adecuados. Se aprovechó la oportunidad para reforzar la importancia de utilizar todos los EPP requeridos según el procedimiento de trabajo seguro.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Instalación formaleta y acero para viga de sobrecimiento



FOTO 2: Instalación formaleta y acero para viga de sobrecimiento

Comentarios:	Comentarios:
	
FOTO 3: Recorrido por punto donde se va a realizar cerramiento con malla eslabonada	FOTO 4: Recorrido por punto donde se va a realizar cerramiento con malla eslabonada
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

sábado, 30 de noviembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**sábado, 30 de noviembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día corte, figurado y amarre de acero lingitudinal de 3/8" y estribos de 3/8" para la viga de sobrecimiento, se continúa con el vaciado de concreto de 3.000PSi para la viga de sobrecimiento de 0,20m X 0,20m para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación.

Por otra parte, al contratista de obra le llega el suministro de mampostería de 0,20x0,20x0,40m para el cerramiento con malla eslabonada.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

Queda el compromiso por parte del contratista de obra el inicio de las actividades en Rionegro y Puerto Berrio para el día lunes 02 de diciembre del presente año.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

'Actividades SST y Ambientales:

Con el objetivo de prevenir accidentes, se realizó una capacitación al personal sobre las medidas de seguridad a seguir al realizar trabajos en altura. Se enfatizó la importancia del uso correcto de los equipos de protección personal y se verificó su disponibilidad en las diferentes áreas de trabajo. Se inspeccionaron las zonas de trabajo en altura para identificar y corregir cualquier condición insegura. Se diligenciaron los permisos de trabajo seguro correspondientes y se recordó al personal la importancia de reportar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Suministro de material



FOTO 2: Vaciado concreto viga sobrecimiento

Comentarios:	Comentarios:
	
FOTO 3: Vaciado concreto viga sobrecimiento	FOTO 4: Vaciado concreto viga sobrecimiento
Comentario:	**Comentarios:**
	
FOTO 5: Vaciado concreto viga sobrecimiento	FOTO 6: Vaciado concreto viga sobrecimiento
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

lunes, 2 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA**	**BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA**		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**lunes, 2 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día donde se continúa con el vaciado de concreto de 3.000PSi para la viga de sobrecimiento de 0,20m X 0,20m para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación, traslado de los bloques de mampostería, para iniciar con la instalación de la mamposteria.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista no puede iniciar labores el día de hoy por que no se autorizó el ingreso del personal por parte de Agrosavia.

SEDE PUERTO BERRÍO.

Se realiza visita por parte del contratista de obra e interventoría a la sede de Puerto Berrío, donde se revisa el estado de las viga canales de la cubierta, la cubierta, las filtraciones de humedad generadas por la cubierta, estuco, cielos rasos, pinturas, etc. El contratista de obra inicia actividades el día 03 de diciembre de 2024.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

Se le solicita al contratista por parte de interventoría la entrega de la programación actualizada con la fecha de la firma del acta de inicio y el balance de mayores y menores cantidades.

Actividades SST y Ambientales:

Se reciben las afiliaciones a seguridad social por parte del contratista de obra, así como las planillas correspondientes de los subcontratistas. Se lleva a cabo un recorrido de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, durante el cual se verifica la gestión implementada por el personal de SST del constructor para controlar los peligros identificados en la obra y reducir la exposición a riesgos. Adicionalmente, se observa que el personal operativo directo del constructor realiza actividades de orden y aseo, incluyendo la adecuada clasificación de los residuos sólidos generados a partir de las diversas actividades y materiales empleados. Por último, se constata el uso correcto y completo de la dotación y los Elementos de Protección Personal (EPP), así como la correcta manipulación de las herramientas empleadas en las actividades realizadas

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Desencofrado de viga sobrecimiento y Traslado de mampostería

Comentarios:



FOTO 2: Desencofrado de viga sobrecimiento y Traslado de mampostería

Comentarios:

Puerto Berrío

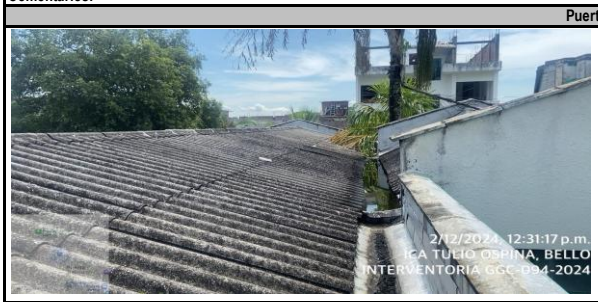


FOTO 3: Visita para el inicio de actividades en Berrío

Comentario:



FOTO 4: Visita para el inicio de actividades en Berrío

Comentarios:

	
FOTO 5: Visita para el inicio de actividades en Berrío	FOTO 6: Visita para el inicio de actividades en Berrío
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL			
	EMPRESA	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	ADMINISTRATIVOS	3
		OPERATIVOS	4
		TOTAL PERSONAL	**7**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

martes, 3 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualizacion:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**martes, 3 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana soleada, finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día donde se continúa con el vaciado de concreto de 3.000PSi para la viga de sobrecimiento de 0,20m X 0,20m para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación de una longitud d restante de 2ml que faltó, trasladó de los bloques de mampostería e inicio de la instalación de la mamposteria.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con el desmonte de cielo raso y desmonte de cubierta de la sede.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista de obra inicia actividades el día 04 de diciembre de 2024, ya que por parte de la vigilancia de la entidad solicitan los certificados de afiliación a EPS y por ese motivo no se dan inicio a las actividades el día de hoy.

Actividades SST y Ambientales:

Se realizó una capacitación de dos horas con el objetivo de reforzar conocimientos en los siguientes temas: manejo de herramientas manuales, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), manejo de residuos sólidos, orden y aseo, y riesgos locativos. Durante la sesión, se enfatizó en la importancia de mantener entornos laborales saludables y en la práctica constante de estas buenas prácticas en los lugares de trabajo. Adicionalmente, se llevó a cabo una inspección de herramientas manuales, verificándose que todas se encuentran en buen estado y aptas para su uso seguro.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Formaleta de viga sobrecimiento e instalación de mampostería

Comentarios:



FOTO 2: Formaleta de viga sobrecimiento e instalación de mampostería

Comentarios:

Puerto Berrío	
La Selva, Rionegro	
	
FOTO 3: Desmonte cielo raso y cubierta	FOTO 4: Desmonte cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**

	
FOTO 5: Desmonte cielo raso y cubierta	FOTO 6: Desmonte cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	14

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST- MA	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

miércoles, 4 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**miércoles, 4 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	Si	Si	Si	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con lluvia fuerte , finaliza la mañana nublada, inicio de tarde nublada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con el trasladó de los bloques de mampostería e inicio de la instalación de la mamposteria para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con el desmonte de cielo raso y desmonte de cubierta de la sede; el contratista realiza el suministro de teja de la teja de barro.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista de obra inicia actividades el día 04 de diciembre de 2024, ya que por parte de la vigilancia de la entidad solicitan los certificados de afiliación a EPS, se inicia en la sede de Puerto Berrío por la limpieza manual de viga canales.

Se realiza cómite virtual No.2, en el cual se habló sobre el tema del tiempo contractual y solicitud de prorroga en tiempo por parte del contratista de obra al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, donde queda pendiente un comité para resolver esta solicitud y de igual forma el contratista se compromete a realizar un avance del 30-35% de obra al 20 de diciembre del presente año.

Actividades SST y Ambientales:

Se diligencia el permiso de trabajo seguro en alturas y se realiza una inspección de los Elementos de Protección Personal (TSA) necesarios para las actividades programadas para el día de hoy. Además, se lleva a cabo una charla de 5 minutos enfocada en la reducción del riesgo de caídas en el lugar de trabajo, destacando las medidas preventivas que deben tomarse. Finalmente, se verifica que el personal esté utilizando correctamente su dotación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Formaleta de viga sobrecimiento e instalación de mampostería

Comentarios:



FOTO 2: Formaleta de viga sobrecimiento e instalación de mampostería

Comentarios:



FOTO 3: Desencofrado de viga sobrecimiento y Traslado de mampostería

Comentarios:



FOTO 4: Desencofrado de viga sobrecimiento y Traslado de mampostería

Comentarios:

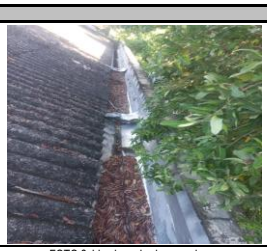
Puerto Berrío	
	
FOTO 5: Limpieza de viga canal	FOTO 6: Limpieza de viga canal
Comentario:	**Comentarios:**
La Selva, Rionegro	
	
FOTO 7: Desmonte cielo raso y cubierta	FOTO 8: Desmonte cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**

	
FOTO 9: Desmonte cielo raso y cubierta	FOTO 10: Suministro teja de barro
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR


PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	14

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST- MA	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra



FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría



ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra



WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

jueves, 5 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualizacion:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**jueves, 5 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	Si	Si	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con el trasladó de los bloques de mampostería e inicio de la instalación de la mamposteria para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con el desmonte de cielo raso y desmonte de cubierta de la sede; el contratista realiza el suministro de teja de la teja de barro.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista de obra inicia actividades el día 04 de diciembre de 2024, ya que por parte de la vigilancia de la entidad solicitan los certificados de afiliación a EPS, se inicia en la sede de Puerto Berrío por la limpieza manual de viga canales.

Actividades SST y Ambientales:

En las instalaciones del ICA, se revisaron las condiciones de seguridad de las actividades programadas, verificando su cumplimiento con las normativas vigentes para garantizar un entorno laboral seguro, como parte del recorrido, se detectaron EPP desgastados, por lo que se realizó la reposición inmediata de los elementos necesarios, asegurando la protección óptima del personal involucrado, asimismo, se impartió una breve charla sobre el uso adecuado de los elementos y reportar a tiempo su desgaste para realizar la debida reposición.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:



FOTO 2: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:



FOTO 3: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:



FOTO 4: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:

Puerto Berrío	
	
FOTO 5: Desmonte de cielo raso y cubierta	FOTO 6: Desmonte de cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**
La Selva, Rionegro	
	
FOTO 7: Demolición manual de meson en concreto Cocina	FOTO 8: Desmonte cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**

	
FOTO 9: Desmonte cielo raso y cubierta	FOTO 10: Suministro teja de barro
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	14

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST- MA	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

viernes, 6 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		**Código:** EJE-INT-ADE-FO-001 **Versión:** 1 **Fecha de Actualización:** 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**viernes, 6 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	Si	Si	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con el trasladó de los bloques de mampostería e inicio de la instalación de la mamposteria para la estructura del cerramiento con malla eslabonada ubicada en el costado Noroccidente de la edificación.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con el desmonte de cielo raso y desmonte de cubierta de la sede; se realiza la demolición del mesón en concreto, desmonte de aparatos sanitarios, cancelación de puntos hidraulicos, divisiones para baños, etc. Se revisa con el contratista que para la cubierta hace falta instalar una viga la cual sea la que soporte los polines de 4x2" y el caballete de la teja de barro, el cual no está contemplado en el presupuesto, se debe generar un item no previsto.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio y oficina sala de espera.

Actividades SST y Ambientales:

Durante el recorrido por las áreas de trabajo, se realizaron diversas actividades para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas establecidas. Se llevó a cabo el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y se diligenció el permiso correspondiente para trabajos en alturas. Además, se inspeccionaron los equipos de Trabajo Seguro en Alturas (TSA) para verificar su correcto estado y funcionalidad. Se supervisaron las condiciones de orden y aseo en las zonas de trabajo, identificando aspectos por mejorar, y se realizaron observaciones especificas al personal con recomendaciones enfocadas en acciones de mejora. Adicionalmente, se entregaron los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios y se gestionó la disposición adecuada de aquellos elementos que ya no serán utilizados

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO




FOTO 1: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:



FOTO 2: Instalación de mampostería bloque cemento

Comentarios:

Puerto Berrío	
	
FOTO 5: Desmonte de cielo raso y cubierta	FOTO 6: Desmonte de cielo raso y cubierta
Comentario:	**Comentarios:**
La Selva, Rionegro	
	
FOTO 7: Instalación de mampostería para viga 4x8" de cubierta	FOTO 8: Instalación de mampostería para viga 4x8" de cubierta
Comentario:	**Comentarios:**

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR


PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	14

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024


DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST- MA	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría




NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra



FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría



ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra



WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

lunes, 9 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA	CONSORCIO JACOBO 2024	Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**lunes, 9 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia el día con la instalación de tubería de 2" para el cerramiento con malla eslabonada, los postes pintados, debidamente con su angulo de inclinación a 45° y todos los accesorios que se indican es las especificaciones tecnicas. Tambien se inicia con la excavación en la zona 45 para continuar con las actividades de solado, viga de cimentación, viga sobrecimiento, etc.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con la demolición de enchape (piso) de toda la sede cocina, oficicina principal, atención usuarios, bodega. etc.Se revisa con el contratista que para la cubierta hace falta instalar una viga la cual sea la que soporte los polines de 4x2" y el caballete de la teja de barro, el cual no está contemplado en el presupuesto, se debe generar un item no previsto. Tambien llega la madera el día de hoy, se prepara todo para iniciar con la inmunizada de esta.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio, oficina sala de espera

Actividades SST y Ambientales:

Con el objetivo de prevenir accidentes, se realizó una capacitación al personal sobre las medidas de seguridad a seguir al realizar trabajos en altura. Se enfatizó la importancia del uso correcto de los equipos de protección personal y se verificó su disponibilidad en las diferentes áreas de trabajo. Se inspeccionaron las zonas de trabajo en altura para identificar y corregir cualquier condición insegura. Se diligenciaron los permisos de trabajo seguro correspondientes y se recordó al personal la importancia de reportar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Instalación de postes 2"



FOTO 2: Instalación de postes 2"



FOTO 3: Excavación tramo Cra 45



FOTO 4: Excavación tramo Cra 45

Puerto Berrío



FOTO 5: Desinstalación e instalación teja eternit nueva

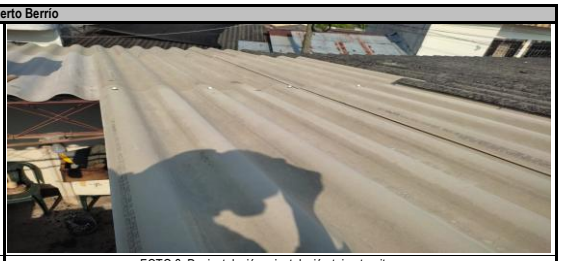


FOTO 6: Desinstalación e instalación teja eternit nueva

La Selva, Rionegro



FOTO 7: Demolición de enchape



FOTO 8: Demolición de enchape

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	14

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

martes, 10 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA	CONSORCIO JACOBO 2024	Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**martes, 10 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra continúa con la instalación de tubería de 2" para el cerramiento con malla eslabonada, los postes pintados, debidamente con su angulo de inclinación a 45° y todos los accesorios que se indican es las especificaciones tecnicas. Tambien se inicia con la excavación en la zona 45 para continuar con las actividades de solado, viga de cimentación, viga sobrecimiento, etc.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista inicia labores con la demolición de enchape (piso) de toda la sede cocina, oficicina principal, atención usuarios, bodega. etc.Se revisa con el contratista que para la cubierta hace falta instalar una viga la cual sea la que soporte los polines de 4x2" y el caballete de la teja de barro, el cual no está contemplado en el presupuesto, se debe generar un item no previsto. Tambien llega la madera el día de hoy, se prepara todo para iniciar con la inmunizada de esta.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio, oficina sala de espera

Actividades SST y Ambientales:

Se realizó una inspección sorpresa en la sede de Rionegro. En general, el personal demostró un buen uso de los EPP. No obstante, se identificó que varios trabajadores no contaban con los arneses de seguridad y líneas de vida necesarios para realizar las tareas a altura. Dada esta situación, se procedió a detener las actividades que implicaban trabajar en altura hasta contar con los equipos de protección adecuados. Se aprovechó la oportunidad para reforzar la importancia de utilizar todos los EPP requeridos según el procedimiento de trabajo seguro.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Fundida de pedestales de postes 2"



FOTO 2: Fundida de pedestales de postes 2"



FOTO 3: Excavación tramo Cra 45



FOTO 4: Excavación tramo Cra 45

Puerto Berrío



FOTO 5: Ampliación bajantes 4"



FOTO 6: Ampliación bajantes 4"

La Selva, Rionegro



FOTO 7: Demolición de enchape



FOTO 8: Demolición de enchape

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	3
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	13

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

miércoles, 11 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**miércoles, 11 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia la fundida de concreto de 3.000PSi para los pedestales donde van ubicados los postes de 2" para el cerramiento con malla eslabonada, los postes pintados, debidamente con su angulo de inclinación a 45° y todos los accesorios que se indican es las especificaciones tecnicas. Tambien se inicia con la aplicación y compactación de recebo común para posterior a esta actividad continuar con el concreto solaso en la Cra 45 para continuar con las actividades de viga de cimentación, viga sobrecimiento, etc.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista continúa labores con la demolición de enchape (piso) de toda la sede cocina, oficicina principal, atención usuarios, bodega. etc.Se instala la viga de 8"x4", la cual sea la que soporte los polines de 4x2" y el caballete de la teja de barro, el cual no está contemplado en el presupuesto, se debe generar un item no previsto.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio, oficina sala de espera, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 y bodegas 1y2. Por otra parte tambien se inicia de instalar la cubierta nueva.

Actividades SST y Ambientales:

En el transcurso de la jornada, se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal sobre la correcta disposición de residuos y el manejo del código de colores para su clasificación, promoviendo buenas prácticas ambientales. Adicionalmente, se informó al personal ubicado en las sedes de Rionegro y Puerto Berrío sobre la necesidad de realizar próximamente los cursos de trabajo en alturas, asegurando el cumplimiento de este requisito. Durante la tarde, se realizó el recorrido habitual, verificando las acciones de comportamiento seguro y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad en las actividades desarrolladas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Fundida de pedestales de postes 2"



FOTO 2: Fundida de pedestales de postes 2"

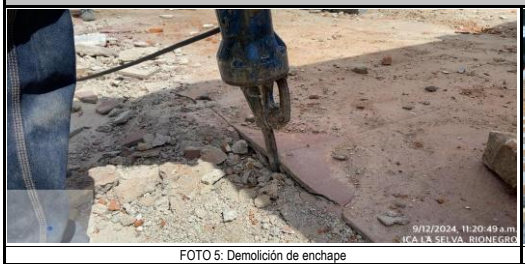
Puerto Berrío



FOTO 3: Desmonte de cielo raso y cubierta



FOTO 4: Instalación de cubierta Nueva

La Selva, Rionegro	
	
FOTO 5: Demolición de enchape	FOTO 6: Instalación Viga 8"x4" y Polines 2"x4" en pino

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	3
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	**13**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

jueves, 12 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA		Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**jueves, 12 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia la fundida de concreto de 3.000PSi para los pedestales donde van ubicados los postes de 2" para el cerramiento con malla eslabonada, los postes pintados, debidamente con su angulo de inclinación a 45° y todos los accesorios que se indican es las especificaciones tecnicas. Tambien se inicia con la aplicación y compactación de recebo común para posterior a esta actividad continuar con el concreto solaso en la Cra 45 para continuar con las actividades de viga de cimentación, viga sobrecimiento, etc.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista continúa labores con la demolición de enchape (piso) de toda la sede cocina, oficicina principal, atención usuarios, bodega. etc.Se instala la viga de 8"x4", la cual sea la que soporte los polines de 4x2" y el caballete de la teja de barro, el cual no está contemplado en el presupuesto, se debe generar un item no previsto.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio, oficina sala de espera, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 y bodegas 1y2. Por otra parte tambien se inicia de instalar la cubierta nueva.

Tambien se realizan actividades de poda y recogida de material dentro de la sede.

Actividades SST y Ambientales:

Se realizó una inspección en las instalaciones del ICA con el objetivo de verificar las actividades programadas y garantizar que se desarrollaran bajo condiciones seguras, conforme a las normativas vigentes. Durante este recorrido, se observó que algunos Elementos de Protección Personal (EPP) presentaban desgaste, por lo que se procedió a su renovación inmediata para asegurar la protección adecuada del personal. Además, se llevó a cabo una breve charla de sensibilización sobre la importancia del cuidado de las manos y el uso seguro de herramientas manuales, destacando cómo estas prácticas son clave para prevenir lesiones y fomentar un entorno laboral más seguro en las tareas diarias

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Instalación de malla eslabonada



FOTO 2: Instalación de malla eslabonada

Puerto Berrío



FOTO 3: Poda de cesped



FOTO 4: Poda de cesped

La Selva, Rionegro	
	
FOTO 5: Instalación de machimbre e inmunizada de la madera	FOTO 6: Instalación de machimbre e inmunizada de la madera


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	3
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	**13**


INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra



FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría



ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra



WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

viernes, 13 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA	CONSORCIO JACOBO 2024	Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**viernes, 13 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra incia la fundida de concreto de 3.000PSi para los pedestales donde van ubicados los postes de 2" para el cerramiento con malla eslabonada, los postes pintados, debidamente con su angulo de inclinación a 45° y todos los accesorios que se indican es las especificaciones tecnicas. Se realiza la formaleteada y posterior fundida de lagrimal.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista continúa labores con la instalación del manto asfaltico sobre el machimbre instalado, para posterior a esta actividad realizar la instalación del icopor y tejas de barro de 40x25cm.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la desinstalación de cielo raso y del desmonte de cubierta en asbesto cemento en el área del auditorio, oficina sala de espera, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 y bodegas 1y2. Por otra parte tambien se inicia de instalar la cubierta nueva.

Actividades SST y Ambientales:

Se realiza un recorrido en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y aspectos ambientales, verificando las acciones implementadas por el personal de SST del constructor para gestionar los peligros identificados en la obra y reducir la exposición a riesgos laborales. Durante el recorrido, se observan actividades de orden y limpieza ejecutadas por el personal operativo del constructor, incluyendo la correcta clasificación de los residuos sólidos generados como resultado de los trabajos y materiales utilizados. Además, se constata que los trabajadores hacen uso completo de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para las tareas asignadas y la manipulación de las herramientas necesarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Fundida de lagrimal



FOTO 2: Fundida de lagrimal

Puerto Berrío



FOTO 5: Instalación enchape baño hombre



FOTO 4: Instalación enchape baño hombre

La Selva, Rionegro



FOTO 5: Instalación de manto asfaltico



FOTO 6: Instalación de manto asfaltico

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	3
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	13

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría

NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra

FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría

ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

lunes, 16 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA	CONSORCIO JACOBO 2024	Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**lunes, 16 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra realiza el pago para el suministro del cielo raso Tile Lay In en alisinc, correspondiente para la intervención de la edificación nuevaen las áreas de archivos, pecuaria. Se tiene previsto que para el día jueves llegue el material.

El contratista de obra incia el día donde se relaliza el amarre de acero para la viga de cimentación con varillas longitudinales de 5/8" y flejes de 3/8" para realizar el vaciado de concreto el día de mañana.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista continúa labores con la instalación del manto asfaltico sobre el machimbre instalado, para posterior a esta actividad realizar la instalación del icopor y tejas de barro de 40x25cm.

Se realiza cortes con pulidora para demoliciones de muros en bodega, división baños existentes, pasos para tuberia de agua potable.Se hace la demolición de muros en bodega, división de baños, el muro que conectará la oficina principal con la bodega.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la instalación de enchape en el balo de hombres, y el emboquillado. Tambien se continúa con el desmonte de cubierta e instalación de la misma. Tambien se realiza la instalación de acceso para bajantes para tubería de 4".

Actividades SST y Ambientales:

Se llevó a cabo una inspección en las instalaciones del ICA con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades programadas y asegurar que se realizarán bajo condiciones seguras, de acuerdo con las normativas vigentes. Durante el recorrido, se identificó desgaste en algunos Elementos de Protección Personal (EPP), lo que llevó a su renovación inmediata para garantizar la protección adecuada del personal. Además, se realiza una capacitación sobre primeros auxilios, enfatizando la relevancia de estas prácticas para prevenir lesiones y promover un entorno laboral seguro en las actividades diarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Amarre, figurado de acero viga cimentación



FOTO 2: Amarre, figurado de acero viga cimentación


Puerto Berrío



FOTO 3: Instalación de enchape y emboquillado



FOTO 4: Accesos para tubería de 4"

La Selva, Rionegro	
	
FOTO 5: Demolición de muros en mamposteria	FOTO 6: Demolición de muros en mamposteria

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR


PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	4
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	**14**

INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024


DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra



FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría



ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra



WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría

martes, 17 de diciembre de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INTERVENTORIA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO-ICA	BITACORA INFORME DIARIO INTERVENTORÍA	CONSORCIO JACOBO 2024	Código: EJE-INT-ADE-FO-001 Versión: 1 Fecha de Actualización: 18/11/2024

FECHA REALIZACION INFORME	**martes, 17 de diciembre de 2024**			
OBJETO DEL CONTRATO :	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-114-2024		**CONTRATISTA:**	**PERING SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	4 meses	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	**INICIO**	18-11-24	**FIN:**	30-12-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana nublada , finaliza la mañana soleada, inicio de tarde soleada y finaliza la jornada soleada.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SEDE TULIO OSPINA, BELLO.

El contratista de obra realiza el pago para el suministro del cielo raso Tile Lay In en alisinc, correspondiente para la intervención de la edificación nuevaen las áreas de archivos, pecuaria. Se tiene previsto que para el día jueves llegue el material.

El contratista de obra realiza el vaciado de concreto de la viga de cimentación de 0,30m x 0,35m, ya se cuenta con el figurado del acero de la viga de sobre cimiento, la cual se contempla su fundida el día de mañana.

SEDE LA SELVA, RIONEGRO.

El contratista continúa labores con la instalación del manto asfaltico sobre el machimbre instalado, para posterior a esta actividad realizar la instalación del icopor y tejas de barro de 40x25cm.

Se realiza cortes con pulidora para demoliciones de muros en bodega, división baños existentes, pasos para tuberia de agua potable.Se hace la demolición de muros en bodega, división de baños, el muro que conectará la oficina principal con la bodega.

Se realiza la cancelacion de puntos hidraulicos y sanitarios.

SEDE PUERTO BERRÍO.

El contratista inicia el dá en la sede de Puerto Berrío realizando la instalación de enchape en el balo de hombres, y el emboquillado. Tambien se continúa con el desmonte de cubierta e instalación de la misma. Tambien se realiza la instalación de acceso para bajantes para tubería de 4", se instala tubería de 4" para bajantes de vigas canales de la cubierta de la sede.

Actividades SST y Ambientales:

Se lleva a cabo el recorrido habitual, durante el cual se observan y analizan los comportamientos de los trabajadores para identificar lecciones aprendidas. Asimismo, se inspecciona el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y se verifica que las condiciones de trabajo sean seguras. Además, se organiza la información del personal en carpetas para mantener un registro actualizado y ordenado. Finalmente, se imparte una charla de cinco minutos sobre el código de colores, con el objetivo de reforzar su comprensión y aplicación en el entorno laboral.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tulio Ospina, BELLO



FOTO 1: Instalación de acero



FOTO 2: Instalación de acero

Puerto Berrío



FOTO 3: Accesos para tubería de 4"



FOTO 5: Accesos para tubería de 4"

La Selva, Rionegro	
	
FOTO 5: instalaciones hidrosanitarias 1/2"	FOTO 6: Cancelación punto hidraulico


CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

PERSONAL				
	EMPRESA	SEDE	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**
1	PERING SAS	Bello	ADMINISTRATIVOS	3
			OPERATIVOS	3
		Rionegro	ADMINISTRATIVOS	
			OPERATIVOS	2
		Puerto Berrío	ADMINISTRATIVOS	2
			OPERATIVOS	3
			TOTAL PERSONAL	**13**


INTERVENTORIA - CONSORCIO JACOBO 2024		
DETALLE	**NOMBRE**	**CARGO**
Elaboró	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA	Ingeniero Residente Interventoría
Elaboró	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST-	PAOLA ANDREA PEÑA PEÑA	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó SST-	YESICA GONZALEZ SALAS	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría
Aprobó	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	Dirección de Interventoría



RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
Residente Interventoría



NELSON ENRIQUE PEREZ CORREA
Residente de obra



FAIBER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Residente Interventoría



ANDY JAVIER ANAYA NIETO
Residente de obra



WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Residente Interventoría
