INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES

Contratista: ÁLVARO GÓMEZ ARIAS		
Número del Contrato: 133 - 2024	Clase del Contrato: Instalación de alumbrado navideño	
Informe de Actividades N°: 001	Periodo informe: Del: 1 de diciembre Al: 23 de diciembre 2024	
Fecha de presentación del informe: 23 de diciembre del 2024		
Objeto: Contratar la instalación, mantenimiento, reparación, montaje, puesta en funcionamiento y desmonte de arreglos navideños del municipio de La Virginia para el año 2024		
Plazo meses (30) días ( )	Valor Total del Contrato: $227.000.000	
Fecha de Inicio: 1 de diciembre del 2024	Fecha de Terminación: 31 de diciembre del 2024	
Adición 1:	Prórroga 1:	
Adición 2:	Prórroga 2:	
Adición 3:	Prórroga 3:	
Nueva Fecha de terminación:		
Nuevo valor contratado:		
Supervisor y/o interventor: Juan Camilo González Aguirre		
Cargo Supervisor y/o interventor: Subgerente De Planeación		

* Discrimina únicamente las actividades desarrolladas con respecto al alcance contratado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ACUERDO A LOS ALCANCES (Enumerar la actividad que aplica a cada alcance).

1. **Compra de materia prima.**

Los materiales seleccionados para el alumbrado navideño responden a criterios específicos de durabilidad, sostenibilidad, eficiencia energética y estética. Estos criterios son esenciales para asegurar que las decoraciones no solo embellezcan al municipio, sino que también resistan las condiciones climáticas, optimicen el consumo eléctrico y contribuyan al cuidado del medio ambiente.

La adquisición de esta materia prima asegura que el alumbrado navideño cumpla con los siguientes beneficios:

- Promoción del turismo: El alumbrado atrae visitantes de otras regiones, incentivando el comercio local y generando ingresos adicionales para los habitantes del municipio.
- Fomento de la cohesión social: Las decoraciones navideñas crean un ambiente de unión y alegría entre la comunidad.

- Sostenibilidad y eficiencia: Al optar por materiales LED y estructuras duraderas, se contribuye a la reducción del impacto ambiental y al ahorro en los costos de energía.
- Seguridad: Los materiales seleccionados cumplen con normas de seguridad, minimizando riesgos para los operarios y el público en general.

El proceso de adquisición se llevó a cabo mediante cotizaciones con proveedores confiables, asegurando la mejor relación calidad-precio. Cada gasto está documentado y se encuentra disponible para su revisión, promoviendo la transparencia en la gestión de recursos.
La materia prima adquirida para el alumbrado navideño de La Virginia, Risaralda, está plenamente justificada por su calidad, funcionalidad y contribución al éxito del evento. Esta inversión no solo garantiza una celebración memorable, sino que también refuerza el compromiso del municipio con sus habitantes y visitantes, consolidando una tradición.

2. Elaboración de las figuras en estructura metálica.

- Diseño y Planeación

El proceso comienza con la creación del diseño de la figura navideña. Se realizan bocetos detallados y planos técnicos para definir las dimensiones, proporciones y detalles decorativos de la estructura. En esta etapa también se seleccionan los materiales adecuados, como alambres, varilla galvanizada de 4mm y tubos metálicos.

- Corte y Modelado de la Estructura Metálica

Con el diseño aprobado, se cortan las piezas metálicas a las medidas necesarias utilizando herramientas especializadas, como sierras y cortadores. Luego, se procede al modelado, donde las piezas se doblan y moldean para dar forma a la figura. Esta etapa requiere precisión para garantizar que los componentes encajen perfectamente.

- Ensamblaje de la Figura

Las piezas metálicas se ensamblan mediante técnicas de soldadura. Se asegura la estructura utilizando puntos de soldadura estratégicos para garantizar su estabilidad y resistencia. Durante este proceso, se realizan ajustes para alinear las piezas correctamente y obtener la forma deseada.

- Acabados

Una vez ensamblada, la figura se somete a un proceso de limpieza para eliminar residuos de soldadura y garantizar una superficie lisa. Luego, se aplica una capa de pintura anticorrosiva para proteger el metal.

- 6. Revisión de Calidad

Se realiza una inspección final para garantizar que la figura cumpla con los estándares de calidad y se revisa la estabilidad de la estructura.

3. **Instalación de luces a las figuras.**

- Preparación de la Figura y las Luces

Se verifica que las luces LED, cables y conectores funcionen correctamente y estén en perfecto estado. Los controles son forrados en cinta negra de tal manera que el agua no tenga entrada y pueda dañarlos.

- Planificación de la Distribución de las Luces

Se analiza la figura para determinar cómo se distribuirán las luces, buscando resaltar los contornos, detalles decorativos y puntos clave del diseño. Se definen las áreas donde se colocarán los puntos de iluminación y se seleccionan los colores y tipos de luces más adecuados.

- Fijación de las Luces a la Estructura

Con la planificación lista, se inicia la fijación de las luces LED a la estructura metálica. Este paso se realiza utilizando amarras plásticas, asegurando que las luces queden bien sujetas y alineadas correctamente.

- ✓ Para figuras con formas complejas, las luces se colocan en secciones, garantizando un trabajo uniforme.
- ✓ Se evita ejercer demasiada presión sobre los cables para prevenir daños o cortos circuitos.

- Conexión Eléctrica y Organización de los Cables.

Durante este proceso, se organiza el cableado para que quede oculto o discretamente alineado con la estructura, manteniendo un acabado limpio y seguro. Se utilizan cinta negra para cubrir lo estrictamente necesario y así evitar accidentes eléctricos y proteger las conexiones de la intemperie.

- Pruebas de Funcionamiento

Antes de finalizar, se realizan pruebas encendiendo las luces para comprobar que todas funcionen correctamente y que no haya problemas de conexión. Si se detectan fallas, se solucionan de inmediato, verificando los puntos de unión y las conexiones eléctricas.

- Ajustes Finales y Seguridad

Una vez que las pruebas han sido satisfactorias, se hacen ajustes finales para garantizar que las luces estén bien distribuidas y firmemente sujetas. También se verifica que la instalación cumpla con las normas de seguridad eléctrica, especialmente si la figura estará expuesta al aire libre.

4. **Cubrir en tela la estructura metálica dándole horma y forma a la figura.**

- Preparación de la Estructura Metálica

Se realiza una inspección detallada de la estructura metálica para garantizar que esté completamente limpia, libre de óxido y sin bordes filosos que puedan dañar la tela. En caso de ser necesario, se aplica una capa de pintura protectora para evitar la corrosión y mejorar la adhesión de los materiales.

- Selección de la Tela y Materiales

Se elige un tipo de tela adecuado según el diseño y las condiciones de uso de la figura. Materiales como lona, malla textil o telas sintéticas resistentes al agua son comunes para figuras expuestas al aire libre. Se consideran factores como la textura, color y elasticidad para garantizar que se adapten perfectamente a la estructura.

- Corte de la Tela

Basándose en las dimensiones y formas de la figura, se cortan las piezas de tela necesarias. Este paso requiere precisión para minimizar desperdicios y asegurar que las piezas encajen perfectamente sobre la estructura. Las piezas se cortan en patrones que permitan cubrir cada sección de la figura sin pliegues o irregularidades.

- Fijación Inicial de la Tela a la Estructura

La tela se empieza a fijar a la estructura metálica utilizando herramientas como pegante maxon. Se ajusta cuidadosamente para evitar arrugas y garantizar una superficie uniforme.

- Moldeado y Ajuste de la Tela

Una vez que la tela está asegurada en los puntos principales, se estira y ajusta para dar horma y forma a la figura. Este paso requiere habilidad para resaltar los detalles de la estructura, como curvas, pliegues o relieves. Si es necesario, se realizan cortes adicionales o se unen las piezas de tela entre sí para adaptarlas a la forma deseada.

- Refuerzo y Acabados

Para garantizar la durabilidad del cubrimiento, se refuerzan las uniones y bordes de la tela con más pegamento. Se revisan todos los puntos de fijación para asegurarse de que la tela esté firmemente adherida y no se desprenda con facilidad.

- Revisión Final y Presentación

Antes de dar por terminado el proceso, se realiza una inspección general para verificar que la tela esté bien tensada, sin pliegues ni áreas descubiertas. También se prueba la resistencia de la fijación y la estética final de la figura.

5. **Diseño y pintura en aerografía a cada figura.**

- Creación del Diseño

El proceso comienza con la conceptualización del diseño de la figura navideña. Se realizan bocetos a mano o en software de diseño para definir los detalles, colores y patrones decorativos que se aplicarán a la superficie. En esta etapa, se tienen en cuenta el estilo, los elementos navideños característicos y teniendo en cuenta también las características de las figuras del mar.

- Preparación de la Superficie

Antes de la pintura, se prepara la superficie de la figura, previamente cubierta de tela, se revisa que esté lisa y sin imperfeccione para así garantizar que la pintura se adhiera correctamente. Se aplica una base para realzar los colores que se usarán en la aerografía.

- Selección de Colores y Materiales de Aerografía

Se eligen los colores de pintura, pinturas especiales para aerografía, que ofrecen una buena cobertura y durabilidad. También se seleccionan plantillas, máscaras y boquillas de aerógrafo adecuadas para crear los detalles deseados, desde áreas amplias hasta líneas finas.

- Aplicación de la Pintura Base

Con el aerógrafo, se aplica la pintura base que servirá como fondo de la figura. Esta capa inicial asegura un acabado uniforme y proporciona una base sólida para los detalles decorativos. Se utiliza una técnica de pulverización uniforme para evitar manchas o acumulaciones de pintura.

- Pintura de Detalles y Sombras

Una vez seca la base, se trabaja en los detalles decorativos. Usando plantillas o a mano alzada, se aplican patrones según el tipo de figura y la temática. También se añaden sombras y degradados para dar profundidad y realismo al diseño. La aerografía permite transiciones suaves de color que realzan el efecto visual.

- Capas de Resaltado y Brillo

Para resaltar ciertas áreas, se aplican colores más claros o metálicos que añaden luminosidad y un efecto tridimensional. Se pueden incluir detalles o con efectos de brillo para darle un toque diferencial, marcado y llamativo a la figura.

- Protección y Sellado

Una vez completado el diseño, se aplica un barniz transparente en aerosol o líquido para proteger la pintura de la intemperie y garantizar su durabilidad. Este acabado también ayuda a realzar los colores y proporciona una superficie brillante o mate según el efecto deseado.

- Revisión Final

Finalmente, se inspecciona la figura para garantizar que todos los detalles estén bien definidos y que no haya imperfecciones en la pintura. Una vez aprobada, la figura está lista para su instalación o exposición, lista para deslumbrar con su diseño artístico y vibrante.

6. Bordeado de figura con manguera led o neón Flex

- Selección de la Manguera LED o Neón Flex.

Se elige el tipo de manguera luminosa más adecuada según el diseño y las condiciones de uso. La manguera LED es ideal para lograr efectos luminosos duraderos y de calidad, mientras que el neón Flex ofrece una iluminación más uniforme y vibrante. Se seleccionan los colores y longitudes requeridos, y se prueban antes de la instalación.

- Preparación y bordeado de la Manguera.

Se empieza a bordear la estructura de la figura con manguera LED o neón Flex a las longitudes necesarias para cada sección de la figura, esta se fija con amarras plásticas para que quede firme, una vez se rodee la figura en los contornos para resaltar su forma y detalles, se procede a cortar siguiendo las marcas de corte indicadas por el fabricante para evitar dañar los circuitos internos. Se preparan las conexiones eléctricas, instalando terminales y aislando los extremos con protectores de silicona y cinta negra para el sellado y así garantizar seguridad y durabilidad.

- Conexión Eléctrica y Organización de Cables

Una vez instalada, se conecta la manguera a la fuente de alimentación. los cables se organizan cuidadosamente para mantener una apariencia limpia y evitar riesgos eléctricos. Se revisa que todas las conexiones estén aisladas correctamente para protegerlas de la intemperie, ya que son figuras que estarán al aire libre.

- Prueba de Iluminación

Con las conexiones eléctricas completadas, se realiza una prueba de encendido para verificar que todas las secciones de la manguera LED o neón Flex funcionen correctamente. Si se detecta algún fallo, se revisan las conexiones y los puntos de fijación para solucionarlo.

- Ajustes Finales y Revisión de Seguridad

Tras confirmar que la iluminación es uniforme y que la manguera está bien fijada, se realizan los ajustes finales. Esto incluye reforzar áreas donde sea necesario y asegurarse de que los cables estén fuera del alcance de posibles tensiones. También se verifica que la instalación cumpla con las normas de seguridad eléctrica.

- Entrega e Instalación

Una vez finalizado el bordeado, la figura está lista para su instalación en el espacio designado. Se conecta a la fuente de energía definitiva y se realiza una prueba final para garantizar que la figura navideña destaque con su iluminación vibrante y precisa, lista para deslumbrar en cualquier entorno.

7. Instalación de figuras en los parques y calles del municipio de La Virginia, Risaralda

La decoración navideña es un elemento clave para generar un ambiente festivo y acogedor en el municipio de La Virginia, Risaralda. A continuación, se detalla el proceso planificado para la instalación de las figuras navideñas en las principales calles y parques:

Planeación y Diseño

Se realiza definición de los sitios estratégicos donde se instalarán las figuras, como parques principales, avenidas centrales y zonas de alta concurrencia.

- Diseño temático: Se define un concepto central para las decoraciones, buscando reflejar el espíritu navideño y la identidad cultural del municipio.

- Verificación de calidad: Se inspecciona que los materiales cumplan con los estándares de seguridad y durabilidad requeridos, así mismo cómo lo pactado en el contrato.

- Preparación de las Figuras

Se realiza una prueba de funcionamiento de las luces y figuras para garantizar que estén en óptimas condiciones.

- Reparaciones y ajustes: Si es necesario, se efectúan reparaciones menores o ajustes en las figuras antes de la instalación.

Instalación

- Equipo de trabajo: Un equipo especializado se encarga de la colocación de las figuras, asegurando su correcta fijación y conexión eléctrica.

- Distribución: Se organizan las decoraciones según el diseño planificado, teniendo en cuenta la armonía visual y la seguridad de los transeúntes.

- Seguridad: Se utilizan herramientas y equipos de protección personal para garantizar la seguridad de los operarios.

- Verificación y Encendido

Inspección final: Se realiza una revisión completa de las instalaciones para detectar posibles fallos o riesgos.

- Encendido oficial: Se programa un evento para el encendido el 7 de diciembre, de las luces, invitando a la comunidad a participar y disfrutar del resultado. S e alquila pantalla gigante por parte de los contratistas del navideño.

- Mantenimiento y Monitoreo

Revisiones periódicas: Durante la temporada navideña, se efectúan inspecciones regulares para garantizar el buen estado de las figuras y luces.

Reparaciones: En caso de daños o fallos, se procede a su reparación inmediata.

Luego de la elaboración de las figuras, estando completamente terminadas, se procede a ir haciendo de manera gradual y por sectores la instalación, dónde una parte del personal realiza el trabajo en alturas, instalando las figuras, otra parte del personal tiende el cableado eléctrico y realiza las respectivas conexiones.
Por otra parte, las figuras que van en el suelo son instaladas por otras personas, dejándolas listas para el personal de electricidad realizar el respectivo trabajo.

Un grupo de trabajadores realiza la instalación de luces en las fachadas de la alcaldía, casa de la cultura e iglesia, también se realiza techo en tendido de luces sobre la calle de la alcaldía, así mismo los árboles y samanes de las calles son rodeados por luces led y manguera led.

OTRAS ACTIVIDADES

1. **Contratación de personal certificado en trabajo seguro en alturas para instalación de figuras, luces y conexiones eléctricas.**

La instalación de decoraciones navideñas, incluyendo figuras, luces y conexiones eléctricas en alturas, requiere la participación de personal certificado en trabajo seguro en alturas. Este documento describe el proceso para la contratación de dicho personal, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral y la calidad en la ejecución del trabajo.

- Identificación de Necesidades

Determinación de actividades: Se identifican las tareas específicas que requieren trabajo en alturas, como la instalación de luces en postes, árboles y fachadas.

Definición de perfiles: Se establecen los requisitos del personal, incluyendo certificación vigente en trabajo seguro en alturas y experiencia en instalaciones eléctricas y decorativas.

- Ejecución y Supervisión
- Asignación de tareas: Se organiza el equipo de trabajo y se asignan responsabilidades claras.
- Supervisión: Un encargado realiza inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas y la calidad del trabajo.
- Reportes: Se implementa un sistema de comunicación por medio telefónico o whatsapp para documentar avances y resolver incidencias.

Este proceso asegura la contratación de personal capacitado, garantizando tanto la seguridad en la ejecución como el cumplimiento de los estándares requeridos para la instalación de decoraciones navideñas en alturas.

Previamente se contrata personal para realizar trabajo en alturas y trabajo eléctrico, a estas personas se les exige cómo requisito el certificado de trabajo seguro en alturas y se afilian a la seguridad social, para el desarrollo de todas las actividades se tiene un coordinador de trabajo seguro en alturas, la cual constantemente realiza inspecciones y recomendaciones tanto para los trabajadores como para los puntos de trabajo.

2. afiliación a la seguridad social.

Comprometidos con el cumplimiento de las normativas laborales y el bienestar de los trabajadores, se definió el siguiente proceso para la afiliación a la seguridad social de las personas que participen en los proyectos de instalación y mantenimiento del alumbrado navideño:

- Recolección de Documentos

Cada trabajador deberá proporcionar los siguientes documentos básicos para iniciar el proceso de afiliación:

- Copia de la cédula de ciudadanía
- Datos básicos actualizados.

- Registro

Se envían la documentación y datos correspondientes a la persona encargada de la vinculación para su posterior afiliación a la eps y arl sura en riesgo 5 (Toda la documentación de afiliación fue enviada a Laura Marcela Cárdenas, quien fue la responsable del proceso de Seguridad Y Salud En El Trabajo)

- Inscripción en el Sistema de Seguridad Social.

La persona encargada realizó la inscripción del trabajador en las siguientes entidades:

- Salud: Afiliación al régimen contributivo en una EPS (Entidad Promotora de Salud).

- Riesgos Laborales: Inscripción en una ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cual fue SURA en riesgo 5, de acuerdo a la actividad que desempeñaban, ya que era de alto riesgo al tener que ver con trabajo en alturas y trabajo eléctrico.

Una vez se realizó el proceso, por parte de la empresa se hizo la verificación de que efectivamente estaban activos en las entidades a las que se le fuesen a hacer los aportes, así mismo la profesional en SST hizo su respectiva verificación del proceso.

- Aportes y Pagos

Se gestiona el cálculo y pago de los aportes a la seguridad social, garantizando que los valores correspondientes a salud y riesgos laborales sean cancelados en los plazos establecidos por la ley. Los trabajadores recibirán un comprobante de estos pagos.

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Antes de iniciar sus actividades, los trabajadores deberán asistir a una capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo, enfocada en los riesgos específicos asociados al alumbrado navideño, como alturas y manejo de herramientas eléctricas.

Nota Importante: Este proceso está diseñado para garantizar la protección integral de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas legales vigentes en materia de seguridad social.

3. Contratación de personas para vigilancia de los sitios en los que se encuentran ubicadas las figuras y toda la instalación de luces navideñas.

La seguridad del montaje del navideño, incluidas las figuras y las instalaciones de luces, es fundamental para garantizar su conservación y protección. A continuación, se detalla el proceso para la contratación de personal encargado de la vigilancia en los sitios donde se ubican estos elementos.

- Identificación de Necesidades

Determinación de puntos de vigilancia: Se identifican los sitios estratégicos que requieren supervisión, como parques, plazas, avenidas y otros espacios públicos.

Definición del perfil del personal: Se establecen los requisitos para los vigilantes, incluyendo experiencia en seguridad, capacidad de respuesta ante incidentes y disponibilidad para turnos nocturnos.

- Ejecución y Supervisión

Distribución de turnos: Se organizan los horarios de vigilancia, tratando de cubrir todas las zonas iluminadas y donde se encuentran las figuras y todo el montaje del navideño como tal.

Supervisión: Un coordinador verifica el cumplimiento de las funciones mediante rondas o informes por WhatsApp o vía telefónica.

Reportes: Los vigilantes reportan cualquier anomalía o incidente de forma inmediata.

Este proceso garantiza la protección de las decoraciones navideñas y refuerza la seguridad en los espacios públicos, brindando tranquilidad a la comunidad y preservando la belleza de las instalaciones.

Se tienen personas realizando ronda constantemente, con el fin de en la medida de lo posible prevenir hurtos y daños tanto en las figuras, como en el cableado eléctrico y las conexiones.

4. Contratación de profesional de Seguridad y Salud En El Trabajo.

La contratación de un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es esencial para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales, la protección del personal y la prevención de riesgos durante la

ejecución de actividades relacionadas con la instalación de figuras y luces navideñas. A continuación, se detalla el proceso de contratación:

- Identificación de Necesidades

Definición del rol: Se determinan las responsabilidades del profesional de SST, incluyendo la evaluación de riesgos, la implementación de medidas preventivas y la capacitación del personal.

Requisitos del perfil: Se especifican las competencias necesarias, como:

- Título profesional en SST o afines.
- Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia comprobada.
- Curso de coordinador de trabajo seguro en alturas.

Inducción: Se brinda información sobre el proyecto y las expectativas del rol.

- Ejecución y Supervisión

Desarrollo de planes de seguridad: El profesional diseña e implementa estrategias para mitigar riesgos laborales.

- Capacitación: Se realizan talleres para entrenar al personal en medidas de seguridad.
- Supervisión: Se lleva a cabo una vigilancia constante de las actividades para asegurar el cumplimiento de las normativas.
- Informe final: El profesional entrega un informe detallando las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Este proceso garantiza la contratación de un profesional capacitado para gestionar la seguridad laboral, promoviendo un ambiente seguro y cumpliendo con las disposiciones legales en el marco del proyecto.

- Se contrata a la profesional Laura Marcela Cárdenas, con el fin de tener establecido un plan de seguridad y salud en el trabajo para preservar la vida e integridad de los trabajadores.

- Previamente se revisa el estado de salud de los trabajadores, sus certificados y respectivas afiliaciones, posteriormente se les hace entrega de equipos de protección personal (casco, botas con punta de platina, arnés)

- Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Antes de iniciar sus actividades, los trabajadores deberán asistir a una capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo, enfocada en los riesgos específicos asociados al alumbrado navideño, como alturas y manejo de herramientas eléctricas.

EVIDENCIA (Fotos, planillas, etc.)

1. Compra de materia prima.






YA TAI LE
1295A
1290A




LED
DECORATIVE
LIGHTS


YA TAI LE


1000L LED LUZ DE NAVIDAD
1000L LED LUZ DE NAVIDAD
1200A
2477
2470








LX LUMIMAX
INST. LED LINEAL







MERCARY
Breaker
1P Riel
BRICKELL

2. Elaboración de figuras en estructura metálica y transporte hacia la Virginia.





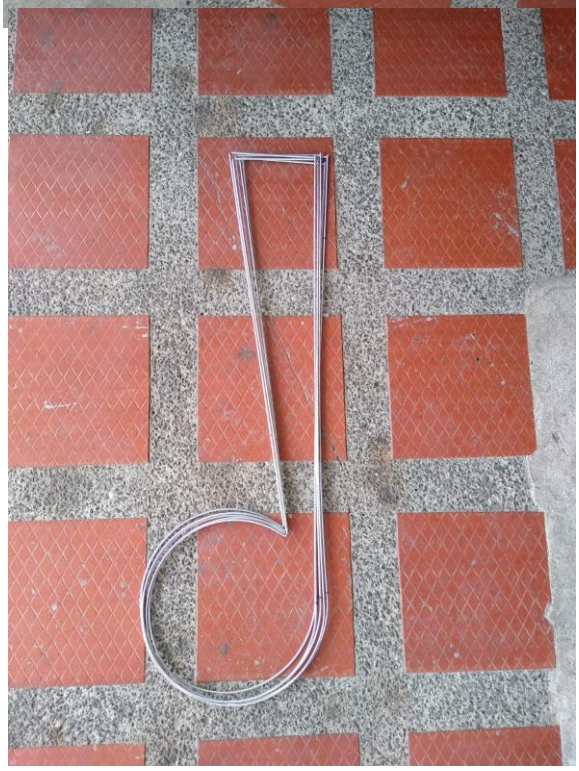










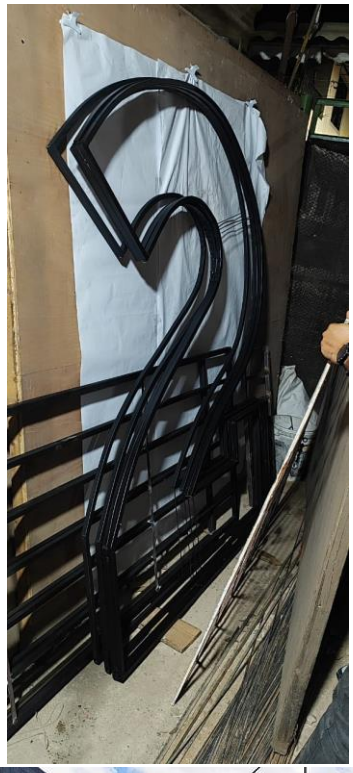









3. Instalación de luces en las figuras y en las calles.




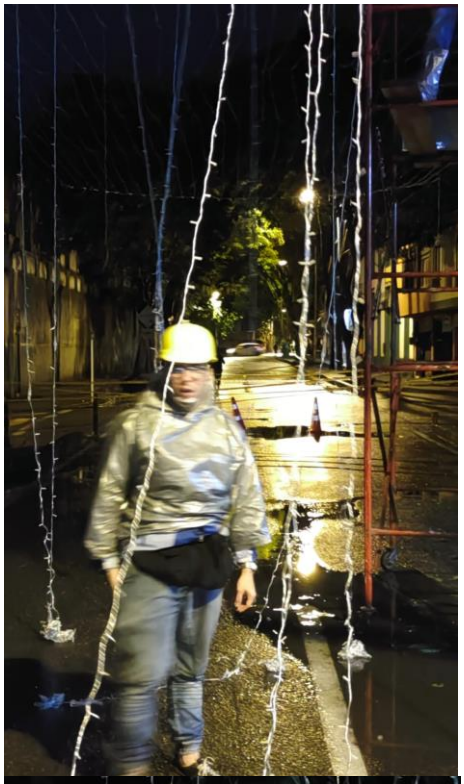





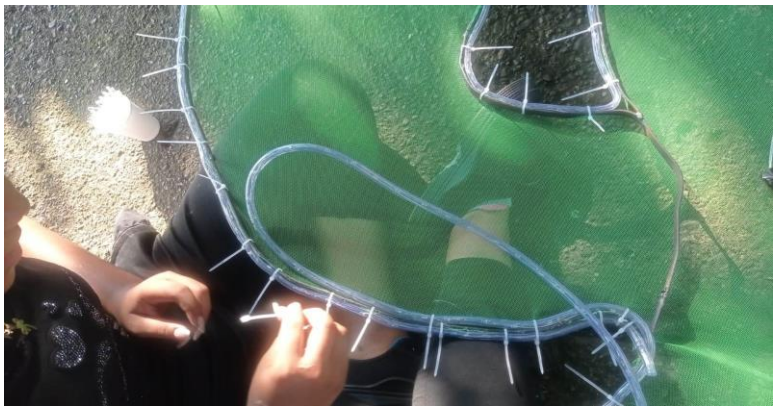

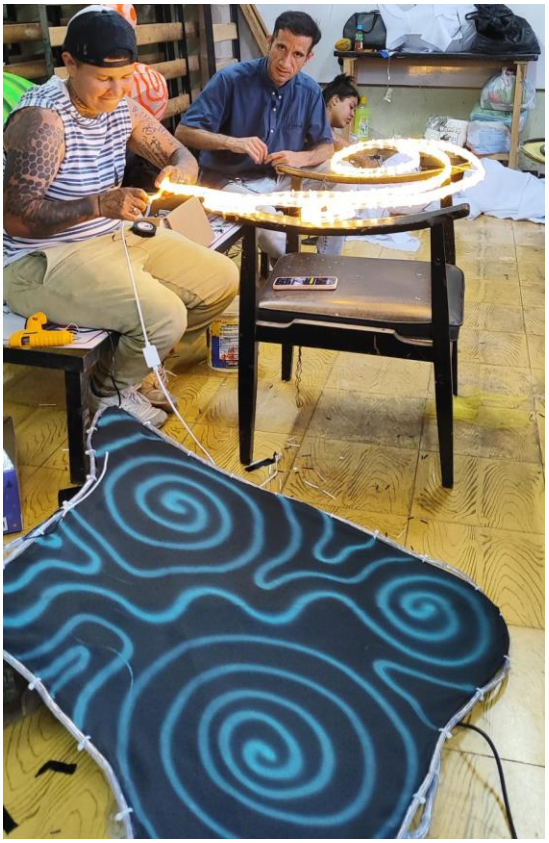



































2025





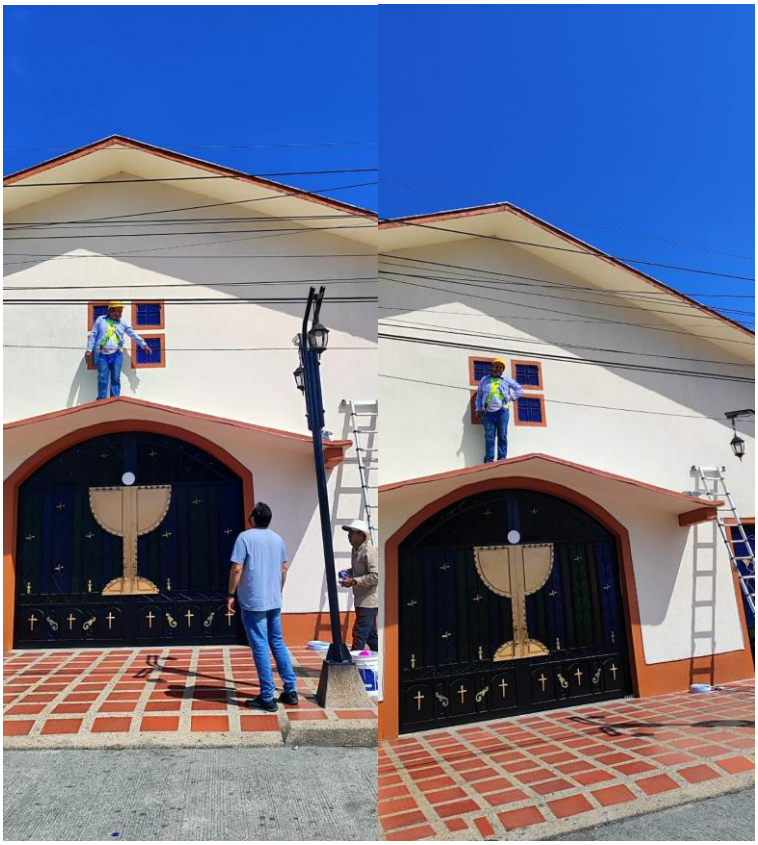














4. Cubrir en tela la estructura metálica dándole horma y forma a la figura.





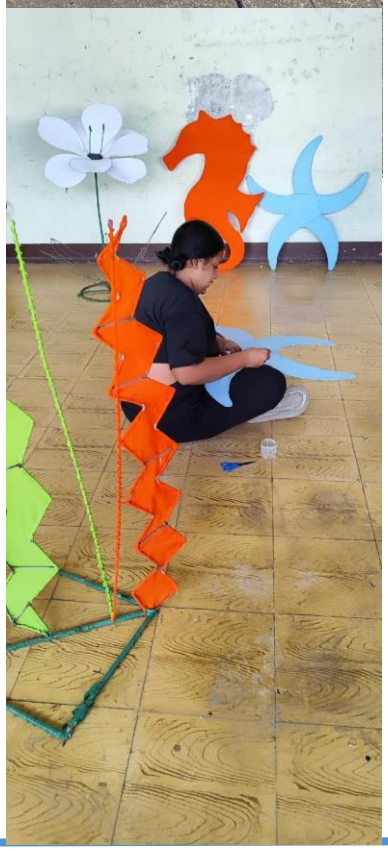


















































5. Diseño y pintura en aerografía a cada figura.








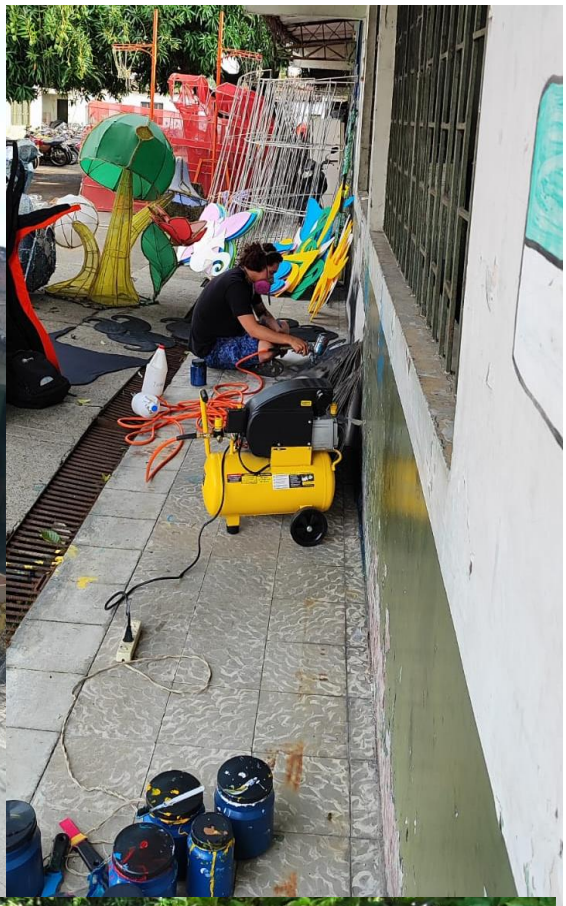


94



4.

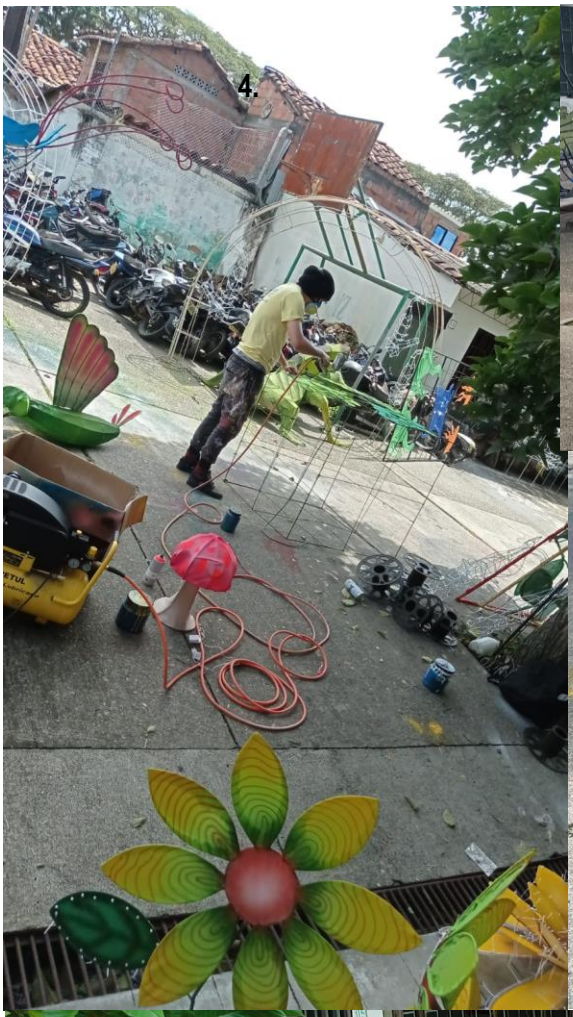









6. Inauguración










2025




30










GRACIAS

Entrega de equipos de protección personal EPP





OBSERVACIONES

- Una vez instaladas algunas figuras, proceden a realizar poda de césped y algunos árboles en la calle 5 y en el parque de las iguanas, lo cual nos retrasa un poco y debido a esto se presentan re procesos. Por otra parte, dejan el pasto que cortaron y ramas obstaculizando.












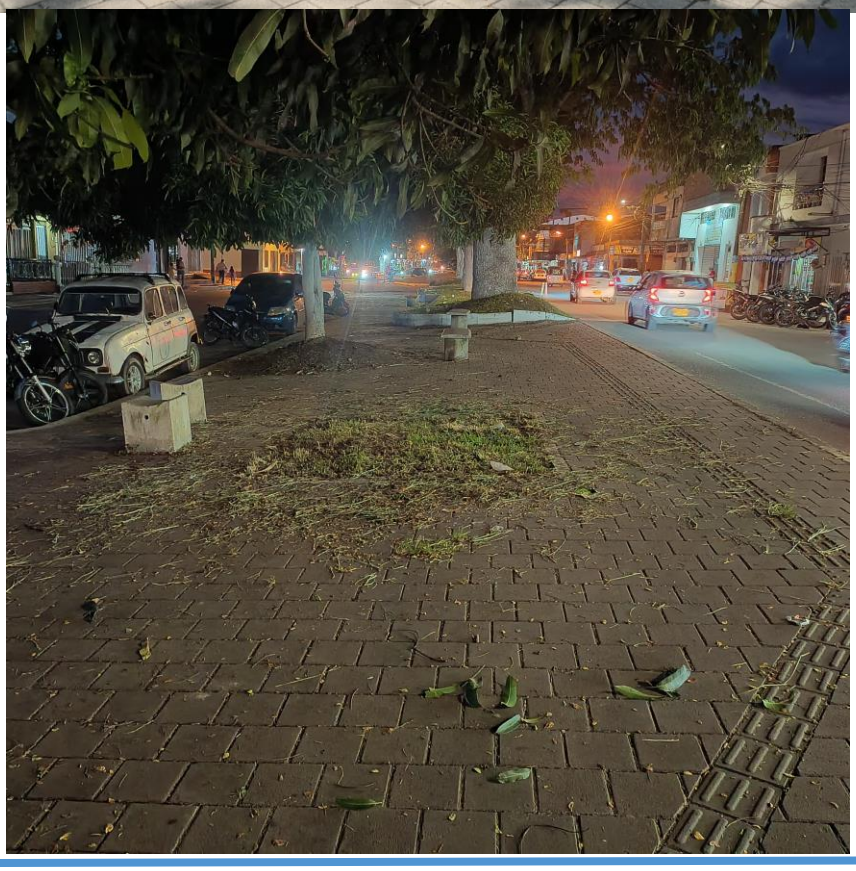

Anexo 1

Informe de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST elaborado por la profesional LAURA MARCELA CÁRDENAS

Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Actividades sst de acompañamiento e inspección realizadas en cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Empresa de servicios públicos de La Virginia ESP, durante la ejecución del contrato de montaje de alumbrado navideño. En él se evidencia también que la empresa ALVARO GOMEZ ARIAS cumplió con la normatividad establecida, así como con las medidas preventivas, correctivas y de mejora que se determinaron a lo largo de la labor culminando el montaje con un indicador de cero (0) accidentes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Verificación de documentación

Se realiza verificación de afiliación a seguridad social y ARL del personal con el fin de revisar que el nivel del riesgo coincida con la actividad a realizar (altura- electricidad).

Evidencias:


ARL | sura

Medellín, 29 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INTEGRA AGENTES DE SEGUROS S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000305 ALTURAS ELECTRICO		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
01860873	RIVERA OBANDO OSCAR MARIO	30/11/2024		C1941411	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/11/2024 19:20:19.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asterisco (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.230.33.130, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO


ARL | sura

Medellín, 29 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INTEGRA AGENTES DE SEGUROS S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000203 EMPLEO TEMPORAL		Clase: 3		Porcentaje Cotización:	2.436 %
C1005 1623	MARTINEZ GUAPACHA LUIS EDUARDO	30/11/2024		d8253125	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/11/2024 19:22:04.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asterisco (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.230.33.130, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO


ARL | sura

Medellín, 02 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Estado
C1128624922	BALLESTEROS GRAMADOS LUZ DENIS	03/12/2024		x16243161	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1010088452343778690

Atentamente,


Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 21:51:30.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asterisco (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.78.17.131, 192.230.104.10, 172.16.42.57.

VIGILADO

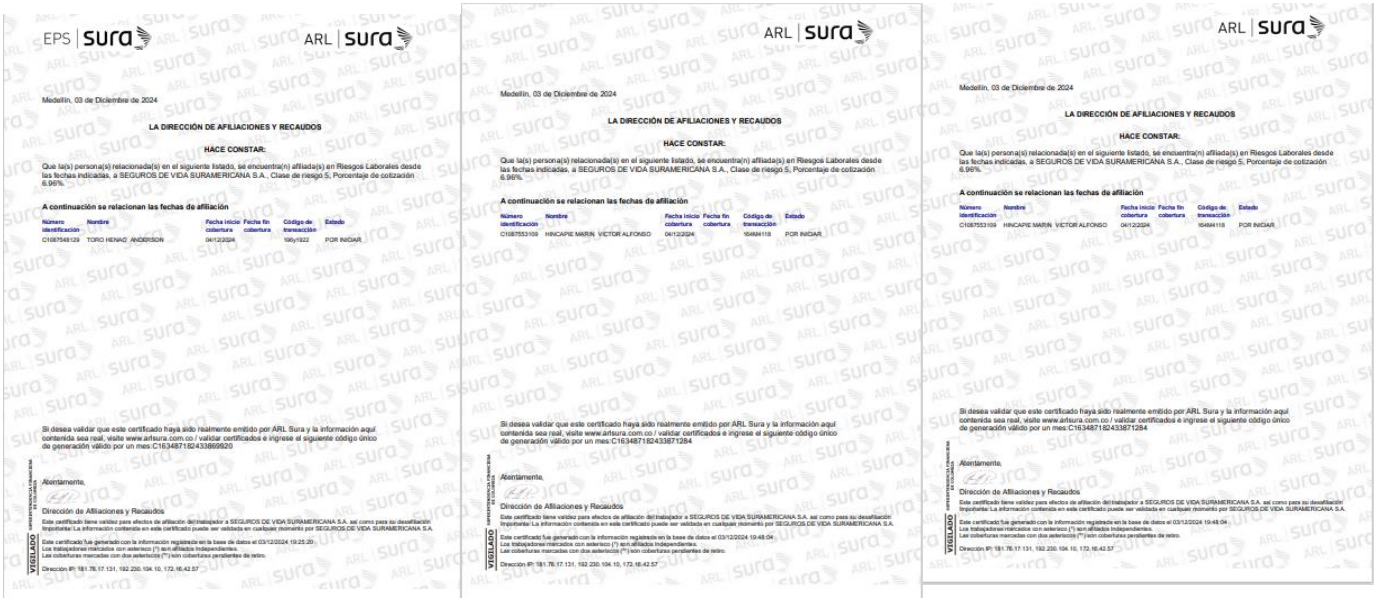

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 03 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Estado
C1067548129	TORO HENAO ANDERSON	04/12/2024		1965/1922	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C163487182433869520

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/12/2024 19:25:20

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.78.17.131, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 03 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Estado
C1067553109	HINCAPIE MARIN VICTOR ALFONSO	04/12/2024		1648N118	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C163487182433871284

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/12/2024 19:48:04

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.78.17.131, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 03 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Estado
C1067553109	HINCAPIE MARIN VICTOR ALFONSO	04/12/2024		1648N118	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C163487182433871284

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/12/2024 19:48:04

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.78.17.131, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

STAFF AND SERVICES SAS

NIT: 900870257-2

Con autorización del ministerio de trabajo NR:08SE2021220100000050096
con código de acreditación CELAC 18-CPR-002,código de certificación CELAC: No.30.394-2

CERTIFICA QUE :

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUAPACHA

Cédula de ciudadanía Nº 10.051.623

Empresa: GOMEZ ARIAS ALVARO
NIT: 10024095-1
Representante Legal: GOMEZ ARIAS ALVARO
ARL: SURA

Cumpliendo con lo establecido en la resolución 4272 de 2021

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en :

TRABAJADOR AUTORIZADO

STAFF & SERVICES

Realizado en Bogotá D.C. del (30) del mes de Noviembre de 2024 al (03) del mes de Diciembre de 2024 con una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los (03) del mes de Diciembre de 2024

FOLIO

Sonia Elizabeth Herrera Bello.
Representante Legal

JULIAN ALBERTO PEREZ DIAZ
Entrenador



CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

STAFF AND SERVICES SAS

NIT: 900870257-2

Con autorización del ministerio de trabajo NR:08SE2021220100000050096
con código de acreditación CELAC 18-CPR-002,código de certificación CELAC: No.30.394-2

CERTIFICA QUE :

OSCAR MARIO RIVERA OBANDO

Cédula de ciudadanía Nº 18608573

Empresa: GOMEZ ARIAS ALVARO
NIT: 10024095-1
Representante Legal: GOMEZ ARIAS ALVARO
ARL: SURA

Cumpliendo con lo establecido en la resolución 4272 de 2021

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en :

TRABAJADOR AUTORIZADO

STAFF & SERVICES

Realizado en Bogotá D.C. del (30) del mes de Noviembre de 2024 al (03) del mes de Diciembre de 2024 con una intensidad de 32 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los (03) del mes de Diciembre de 2024

2. Charla de seguridad sobre aspectos SST y elementos de protección personal

Luego de verificar algunos hallazgos en el inicio de actividades se reúne personal con el fin de retroalimentar algunos aspectos importantes sobre seguridad y salud en el trabajo y la importancia de utilizar los elementos de protección personal adecuados para la labor.

Evidencia:





3. **Entrega de elementos de protección personal:**

Se identifica personal faltante por equipos de protección contra caídas y se realiza la respectiva entrega.










4. **Inspección de equipos y acompañamiento en actividades de alto riesgo**

Se realiza acompañamiento al personal durante la instalación del alumbrado de la iglesia la inmaculada, y el tanque de almacenamiento de la ESP y actividades en alturas de la carrera 5, asi mismo se verifican equipos de protección contra caídas.


IGLESIA DE DIOS

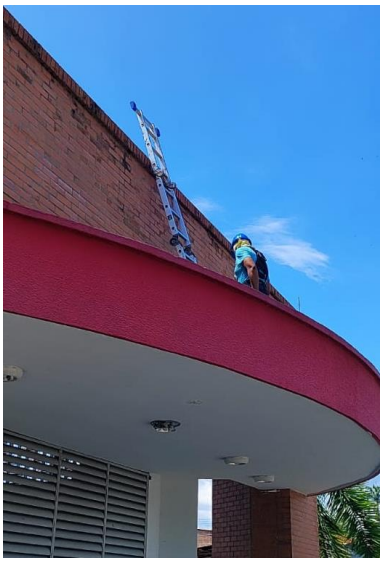

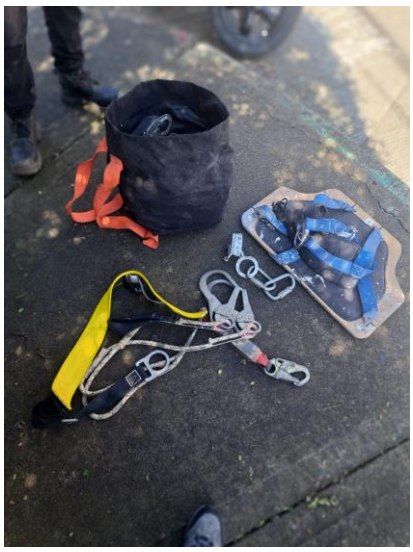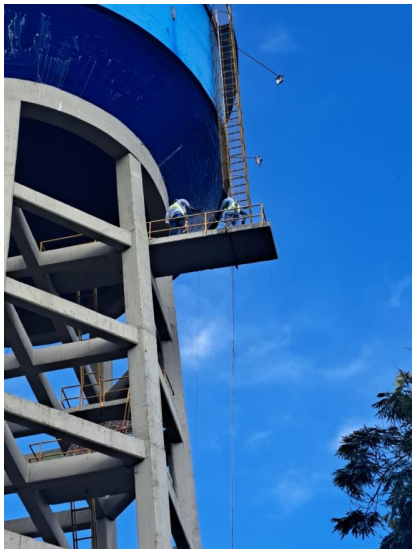


Indicadores de incidentes y accidentes:

Durante la realización del montaje de alumbrado se presentaron cero (0) accidentes

INDICADORES ACCIDENTALIDAD MONTAJE

MES	NUMERO EMPLEADOS	N EVENTOS	HHT	N DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS
DICIEMBRE	5	0	185	0	0,00%	0,00	0,00
TOTALES	**5**	**0**	**185**	**0**	**0%**	**0,00**	**0,00**

LAURA MARCELA CARDENAS GOMEZ
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo
LPSST 1241-22

Alvaro Gómez Arias
Contratista y/o Representante legal
