SGC-CP-16804-24
Neiva, diciembre 31 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Atn. Ingeniero Leonel Fernando Obregón Salazar.
Supervisor designado CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No.453 de 2024.

Asunto: Informe de interventoría No2.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.2
2. Informes semanales del periodo
3. Acta asistencia comité
4. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	2	Periodo comprendido entre el :	1 de noviembre de 2024	y el:	30 de noviembre de 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.			**Objeto:**	REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		
Contrato Nº:	453 DE 2024			**Contrato Nº:**	443 DE 2024		
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	C.C:	79.142.300	**Contratista:**	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	C.C:	7.693.769
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES			**Plazo Inicial:**	TRES (3) MESES		
Plazo adicional 1:	N/A			**Plazo adiciona 1:**	N/A		
Plazo total:	TRES (3) MESES			**Plazo total:**	TRES (3) MESES		
Fecha de Inicio:	09 de octubre de 2024			**Fecha de Inicio:**	09 de octubre de 2024		
Fecha de Terminación:	07 de enero de 2025			**Fecha de Terminación:**	07 de enero de 2025		
Fecha Suspensión 1:	N/A			**Fecha de Suspensión:**	N/A		
Fecha Reinicio 1:	N/A			**Fecha de Reinicio:**	N/A		
Valor Inicial:	$		37.447.657,00	**Valor Inicial:**	$		366.798.613,00
Valor adicional 1:	$		-	**Valor adicional 1:**	$		-
Valor total:	$		37.447.657,00	**Valor total:**	$		366.798.613,00
Valor pagado:	$		-	**Valor pagado:**	$		-
Valor por pagar:	$		37.447.657,00	**Valor por pagar:**	$		366.798.613,00
Nombre Supervisor:	LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR			**Nombre Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	9/10/2024	12/07/2026	$ 7.489.531,40
Prestaciones sociales	9/10/2024	12/01/2029	$ 7.489.531,40
Calidad del servicio	9/10/2024	7/10/2030	$ 7.489.531,40

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	9/10/2024	9/07/2025	$ 73.359.722,60
Buen manejo del anticipo	9/10/2024	9/07/2025	$ 110.039.583,90
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.laborales	9/10/2024	8/01/2028	$ 36.679.861,00
Estabilidad y calidad de la obra	8/01/2025	8/01/2030	$ 73.359.722,60
Responsabilidad civil extracontractual	9/10/2024	8/01/2025	$ 260.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de interventoría No.1		

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de obra No.1		

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

Ingenieria & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	2,92%	20,59%	23,51%
% Ejecutado	2,74%	6,64%	9,39%
Diferencia	-0,18%	-13,95%	-14,12%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 10.698,04	$ 75.532,48	$ 86.230,52	23,51%
% Ejecutado	$ 10.055,17	$ 24.369,11	$ 34.424,28	9,39%
Diferencia	-$ 642,87	-$ 51.163,37	-$ 51.806,24	-14,12%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se realizó la aplicación de graniplast y desmonte de cielo raso en el auditorio y en el centro de atencion al ciudadano se realizo la revision y mantenimiento de la cubierta, mantenimiento del cielo raso y aplicacon de vinilo en paredes interiores.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	2		100,00%	0,00%	2
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	2	0	100,00%	0,00%	2
TOTALES	2		100,00%		

CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	5		35,71%	0,00%	5
TÉCNICO	3		21,43%	0,00%	3
M.O.N.C.	6		42,86%	0,00%	6
TOTAL	14	0	100,00%	0,00%	14
TOTALES	14		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**2**

Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

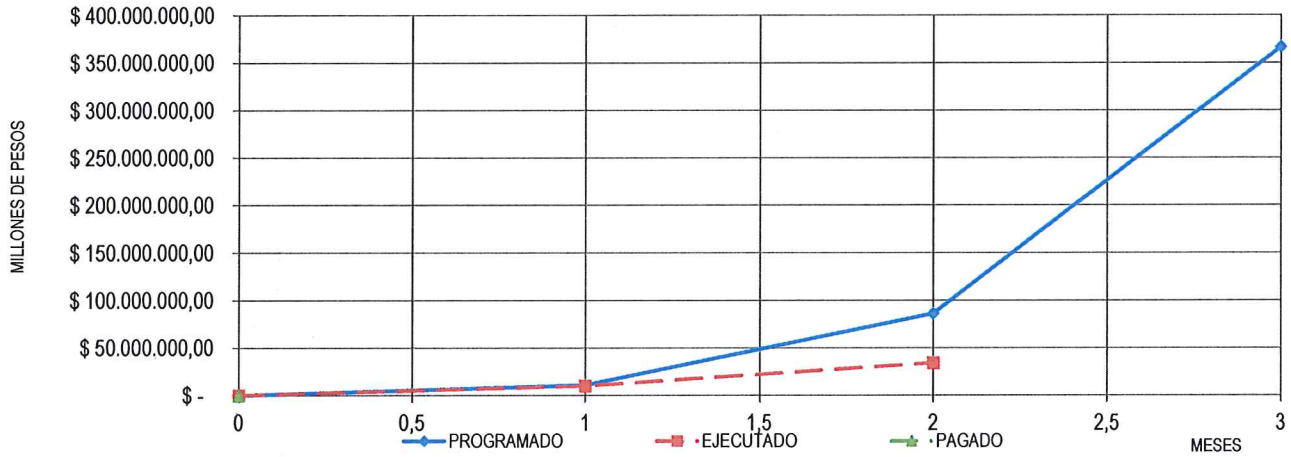

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En este periodo el contratista hace entrega de la documentacion para la modificatoria 1 con adicion de recursos e inclucion de items no previstos para la revision de interventoría y aprobacion de la entidad.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA Cargo: Inspector de Interventoría	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	443 DE 2024	Contratista:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
Periodo:	1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	Director de Interventoria:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	INFRAESTRUCTURA FISICA												
1	AREA AUDITORIO												
1,1	Localización y replanteo.	M2	312,48	2.643,00	$ 825.884,00	312,48		312,48	$ 825.884,00	$ -	$ 825.884,00		
1,2	Desmonte de cubierta en asbesto cemento y teja de barro tipo colonial.	M2	337,47	22.722,00	$ 7.667.993,00	337,47		337,47	$ 7.667.993,00	$ -	$ 7.667.993,00		
1,3	Desmonte e instalacion de cielo raso en icopor.	M2	240,00	8.197,00	$ 1.967.280,00					$ -	$ -	240,00	$ 1.967.280,00
1,4	Suministro e instalacion de cubierta teja española	M2	337,47	108.846,00	$ 36.732.259,00					$ -	$ -	337,47	$ 36.732.259,00
1,5	Suministro e instalacion de caballete incluye tornillos de fijacion.	M2	50,92	50.143,00	$ 2.553.282,00					$ -	$ -	50,92	$ 2.553.282,00
1,6	Graniplast para fachadas.	M2	239,43	30.761,00	$ 7.365.106,00		50,00	50,00		$ 1.538.050,00	$ 1.538.050,00	189,43	$ 5.827.056,00
1,7	Estuco y vinilo sobre muro.	M2	396,22	17.967,00	$ 7.118.885,00					$ -	$ -	396,22	$ 7.118.885,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 64.230.689,00				$ 8.493.877,00	$ 1.538.050,00	$ 10.031.927,00		$ 54.198.762,00
	ADMINISTRACION		18,00%		$ 11.561.524,00				$ 1.528.898,00	$ 276.849,00	$ 1.805.747,00		$ 9.755.777,00
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 1.284.614,00				$ 30.578,00	$ 30.761,00	$ 200.639,00		$ 1.083.975,00
	UTILIDAD		5,00%		$ 3.211.534,00				$ 1.529,00	$ 76.903,00	$ 501.596,00		$ 2.709.938,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 610.192,00				$ 291,00	$ 14.612,00	$ 95.303,00		$ 514.889,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 80.898.553,00				$ 10.055.173,00	$ 1.937.175,00	$ 12.635.212,00		$ 68.263.340,00
2	AREA CENTRO DE ATENSION AL CIUDADANO												
2,1	Fabricacion e instalacion de rejillas sumideros nuevos y completos	M2	118,55	149.501,00	$ 17.723.344,00					$ -	$ -	118,55	$ 17.723.344,00
2,2	Mantenimiento y reparacion de rejillas sumideros	M2	46,00	96.827,00	$ 4.454.042,00					$ -	$ -	46,00	$ 4.454.042,00
2,3	Revision de cubierta y correccion de goteras realizando desmonte y monte en teja fibrocemento y/o termoacustica con curado en cinta asfaltica	M2	174,00	49.007,00	$ 8.527.218,00		174,00	174,00		$ 8.527.218,00	$ 8.527.218,00		
2,4	Mantenimiento y reparacion de cielo raso en drywall	M2	174,00	35.960,00	$ 6.257.040,00		174,00	174,00		$ 6.257.040,00	$ 6.257.040,00		
2,5	Suministro e instalacion de rejilla plastica de ventilacion	UND	6,00	82.295,00	$ 493.770,00					$ -	$ -	6,00	$ 493.770,00
2,6	Vinilo sobre muro	M2	140,00	17.968,00	$ 2.515.520,00		140,00	140,00		$ 2.515.520,00	$ 2.515.520,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 39.970.934,00				$ -	$ 17.299.778,00	$ 17.299.778,00		$ 22.671.156,00
	ADMINISTRACION		18,00%		$ 7.194.768,00				$ -	$ 3.113.960,00	$ 3.113.960,00		$ 4.080.808,00
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 799.419,00				$ -	$ 345.996,00	$ 345.996,00		$ 453.423,00
	UTILIDAD		5,00%		$ 1.998.547,00				$ -	$ 864.989,00	$ 864.989,00		$ 1.133.558,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 379.724,00				$ -	$ 164.348,00	$ 164.348,00		$ 215.376,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 50.343.392,00				$ -	$ 21.789.071,00	$ 21.789.071,00		$ 28.554.321,00
3	ADECUACIONES SALA CEIBAS												
3,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	UND	1,00	3.999.900,00	$ 3.999.900,00					$ -	$ -	1,00	$ 3.999.900,00
3,2	Suministro e Instalación De Vidrio 5mm Incoloro Templado Para Las Ventanas Instalado Sobre Empaque Neopreno Y Pisavidrio A Presión, Se Instalarán Vidrio A Tope.	UND	2,00	2.809.644,00	$ 5.619.288,00					$ -	$ -	2,00	$ 5.619.288,00
3,3	Suministrar e instalar diez (10) sillas ergonómicas tipo operador, con reposa cabezas, reposa brazos, respaldo en la zona lumbar	UND	10,00	1.008.800,00	$ 10.088.000,00					$ -	$ -	10,00	$ 10.088.000,00
3,4	Suministrar e instalar una mesa de reuniones tipo sala de juntas de diez puestos.	UND	1,00	6.813.639,00	$ 6.813.639,00					$ -	$ -	1,00	$ 6.813.639,00
3,5	Suministrar e instalar un tablero digital interactivo	UND	1,00	15.196.742,00	$ 15.196.742,00					$ -	$ -	1,00	$ 15.196.742,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE SUMINISTRO				$ 41.717.569,00				$ -	$ -	$ -		$ 41.717.569,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 7.926.338,00				$ -	$ -	$ -		$ 7.926.338,00
COSTO TOTAL DE SUMINISTRO					$ 49.643.907,00				$ -	$ -	$ -		$ 49.643.907,00
4	ADECUACION SALA SOLUCIONES TECNOLOGICAS												
4,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	UND	1,00	3.999.900,00	$ 3.999.900,00					$ -	$ -	1,00	$ 3.999.900,00
4,2	Suministro e Instalación de UPS de 3KVA	UND	1,00	8.114.725,00	$ 8.114.725,00					$ -	$ -	1,00	$ 8.114.725,00
4,3	Suministro e Instalación de Gabinete	UND	1,00	3.048.075,00	$ 3.048.075,00					$ -	$ -	1,00	$ 3.048.075,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE SUMINISTRO				$ 15.162.700,00				$ -	$ -	$ -		$ 15.162.700,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 2.880.913,00				$ -	$ -	$ -		$ 2.880.913,00
COSTO TOTAL DE SUMINISTRO					$ 18.043.613,00				$ -	$ -	$ -		$ 18.043.613,00
5	SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAD												
5,1	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES									$ -			
5,1,1	Alimentador general a tablero de distribucion general	M	200,00	$ 170.823,00	$ 34.164.600,00					$ -	$ -	200,00	$ 34.164.600,00
5,2	ALIMENTADORES TIPO TRACCION Y LIBRES DE HALOGENOS			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,2,1	Salida cableado para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra sistema normal 20A en muro	M	140,00	$ 27.465,00	$ 3.845.100,00					$ -	$ -	140,00	$ 3.845.100,00
5,2,2	Salida cableado para tomacorriente bifasico para aire acondicionado con polo a tierra en muro	M	140,00	$ 52.890,00	$ 7.404.600,00					$ -	$ -	140,00	$ 7.404.600,00
5,2,3	Salida cableado para LAMPARA DE EMRGENCIA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	M	96,00	$ 27.465,00	$ 2.636.640,00					$ -	$ -	96,00	$ 2.636.640,00

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
5,2,4	Salida cableado para REFLECTORES FACHADA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	M	24,00	$ 31.030,00	$ 744.720,00					$ -	$ -	24,00	$ 744.720,00
5,2,5	Salida cableado para LAMPARA ERMETICA TIPO REFLECTOR con polo a tierra sistema normal 20A en muro	M	72,00	$ 31.030,00	$ 2.234.160,00					$ -	$ -	72,00	$ 2.234.160,00
5,2,6	Salida cableado para LAMPARA TIPO PANEL LED DE 18 W con polo a tierra sistema normal 20A en muro	M	64,00	$ 31.030,00	$ 1.985.920,00					$ -	$ -	64,00	$ 1.985.920,00
5,2,7	Salida cableado para CONTROL DE ILUMINACION con sistema normal 20A en muro .	M	48,00	$ 31.030,00	$ 1.489.440,00					$ -	$ -	48,00	$ 1.489.440,00
5,3	TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,3,1	Suministro e instalacion de tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador.	UND	1,00	$ 4.349.432,00	$ 4.349.432,00					$ -	$ -	1,00	$ 4.349.432,00
5,4	MEDICIÓN Y PUESTA A TIERRA			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,4,1	Malla a tierra de auditorio. 2 varillas copperweld 2,4 m, 1 cajas inspeccionables, interconexión Cable 1/0	UND	1,00	$ 2.595.332,00	$ 2.595.332,00					$ -	$ -	1,00	$ 2.595.332,00
5,5	SALIDAS ELÉCTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES, SENSORES Y OTROS)			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,5,1	Suministro e instalacion de toma doble 110 v tipo Levinton con polo a tierra	UND	18,00	$ 19.271,00	$ 346.878,00					$ -	$ -	18,00	$ 346.878,00
5,5,2	Suministro e instalacion de toma 220 v doble tipo Levinton con polo a tierra	UND	7,00	$ 20.435,00	$ 143.045,00					$ -	$ -	7,00	$ 143.045,00
5,5,3	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	6,00	$ 19.271,00	$ 115.626,00					$ -	$ -	6,00	$ 115.626,00
5,6	MONTAJE DE LUMINARIAS CINTA LED			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,6,1	Suministro e instalacion de panel LED 6" - 18W redondo empotrado.	UND	8,00	$ 114.998,00	$ 919.984,00					$ -	$ -	8,00	$ 919.984,00
5,6,2	Suministro e instalacion de LUMINARIA ERMETICA tipo refeltor de 50 w.	UND	9,00	$ 192.792,00	$ 1.735.128,00					$ -	$ -	9,00	$ 1.735.128,00
5,6,3	Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA Mickey Mouse.	UND	8,00	$ 114.998,00	$ 919.984,00					$ -	$ -	8,00	$ 919.984,00
5,6,4	Suministro e instalacion de LUMINARIA TIPO REFLEXTOR para exteriores	UND	2,00	$ 183.092,00	$ 366.184,00					$ -	$ -	2,00	$ 366.184,00
5,7	SALIDAS DE TV VOZ Y DATOS			$ -	$ -					$ -	$ -		
5,7,1	Salida para tv a terminal coaxial 75 ohm (con tuberia PVC de 1ø3/4" 15 mts)	UND	2,00	$ 367.438,00	$ 734.876,00					$ -	$ -	2,00	$ 734.876,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 66.731.649,00				$ -	$ -	$ -	$	66.731.649,00
	ADMINISTRACION		18,00%		$ 12.011.697,00				$ -	$ -	$ -	$	12.011.697,00
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 1.334.633,00				$ -	$ -	$ -	$	1.334.633,00
	UTILIDAD		5,00%		$ 3.336.582,00				$ -	$ -	$ -	$	3.336.582,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 633.951,00				$ -	$ -	$ -	$	633.951,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 84.048.512,00				$ -	$ -	$ -	$	84.048.512,00
6	INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES												
6,1	Cable SFTP CLASS FA L50H	M	810,00	$ 4.530,00	$ 3.669.300,00					$ -	$ -	810,00	$ 3.669.300,00
6,2	Cable trenzado 312 fase amarilla o azul	M	150,00	$ 8.199,00	$ 1.229.850,00					$ -	$ -	150,00	$ 1.229.850,00
6,3	Cable trenzado 312 fase roja	M	150,00	$ 8.199,00	$ 1.229.850,00					$ -	$ -	150,00	$ 1.229.850,00
6,4	Punto de datos con certificacion y etiquetado	UND	17,00	$ 739.986,00	$ 12.579.762,00					$ -	$ -	17,00	$ 12.579.762,00
6,5	Gabinete de pared	UND	1,00	$ 2.513.876,00	$ 2.513.876,00					$ -	$ -	1,00	$ 2.513.876,00
6,6	Herraje Tera 4p anguar	UND	1,00	$ 667.652,00	$ 667.652,00					$ -	$ -	1,00	$ 667.652,00
6,7	MTP cassette f.o/om4 24 hilos 2lc	UND	4,00	$ 2.325.859,00	$ 9.303.436,00					$ -	$ -	4,00	$ 9.303.436,00
6,8	Patch panel F.O. cassettes F.O. MTP-24 hilos 2lc	UND	3,00	$ 654.037,00	$ 1.962.111,00					$ -	$ -	3,00	$ 1.962.111,00
6,9	F.O. preconectorizada 12H OM4 LSOH 40M	UND	2,00	$ 4.934.638,00	$ 9.869.276,00					$ -	$ -	2,00	$ 9.869.276,00
6,10	Cajas de inspeccion	UND	6,00	$ 120.256,00	$ 721.536,00					$ -	$ -	6,00	$ 721.536,00
6,11	SGB	UND	1,00	$ 970.000,00	$ 970.000,00					$ -	$ -	1,00	$ 970.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 44.716.649,00				$ -	$ -	$ -	$	44.716.649,00
	ADMINISTRACION		18,00%		$ 8.048.997,00				$ -	$ -	$ -	$	8.048.997,00
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 894.333,00				$ -	$ -	$ -	$	894.333,00
	UTILIDAD		5,00%		$ 2.235.832,00				$ -	$ -	$ -	$	2.235.832,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 424.808,00				$ -	$ -	$ -	$	424.808,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 56.320.619,00				$ -	$ -	$ -	$	56.320.619,00
7	EQUIPO DE RED DE DATOS												
7,1	AT-X 18gp switch de borde 18 puertos	UND	1,00	$ 5.240.514,00	$ 5.240.514,00					$ -	$ -	1,00	$ 5.240.514,00
7,2	Modulos SFP	UND	4,00	$ 223.100,00	$ 892.400,00					$ -	$ -	4,00	$ 892.400,00
7,3	Access point doble banda	UND	3,00	$ 1.619.900,00	$ 4.859.700,00					$ -	$ -	3,00	$ 4.859.700,00
7,4	Patch cord TERA 4PR/RJ45 1M	UND	10,00	$ 66.164,00	$ 661.640,00					$ -	$ -	10,00	$ 661.640,00
7,5	Patch cord TERA 4PR/RJ45 2M	UND	4,00	$ 83.462,00	$ 333.848,00					$ -	$ -	4,00	$ 333.848,00
7,6	Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M	UND	4,00	$ 41.912,00	$ 167.648,00					$ -	$ -	4,00	$ 167.648,00
7,7	Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H	UND	4,00	$ 107.127,00	$ 428.508,00					$ -	$ -	4,00	$ 428.508,00
7,8	Patch cord CAT6A - certificados 5m			$ 66.706,00	$ -					$ -	$ -		
7,9	GXT5-6000 RT208	UND	1,00	$ 10.525.000,00	$ 10.525.000,00					$ -	$ -	1,00	$ 10.525.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE SUMINISTRO				$ 23.109.258,00				$ -	$ -	$ -	$	23.109.258,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 4.390.759,00				$ -	$ -	$ -	$	4.390.759,00
COSTO TOTAL DE SUMINISTRO					$ 27.500.017,00				$ -	$ -	$ -	$	27.500.017,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 295.639.448,00				$ 8.493.877,00	$ 18.837.828,00	$ 27.331.705,00	$	268.307.743,00
	ADMINISTRACION		18,00%		$ 38.816.986,00				$ 1.528.898,00	$ 3.390.809,00	$ 4.919.707,00	$	33.897.279,00
	IMPREVISTOS		2,00%		$ 4.312.999,00				$ 30.578,00	$ 376.757,00	$ 546.635,00	$	3.766.364,00
	UTILIDAD		5,00%		$ 10.782.495,00				$ 1.529,00	$ 941.892,00	$ 1.366.585,00	$	9.415.910,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 17.246.685,00				$ 291,00	$ 178.960,00	$ 259.651,00	$	16.987.034,00
	COSTO AIU (25%)				$ 71.159.165,00				$ 1.561.296,00	$ 4.888.418,00	$ 7.092.578,00	$	64.066.587,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 366.798.613,00				$ 10.055.173,00	$ 23.726.246,00	$ 34.424.283,00	$	332.374.330,00

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 366.798.613,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 366.798.613,00**

V/R ANTICIPO: $ 110.039.583,90
% ANTICIPO: 30,00%
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial de obra No.1					$ -	$ 110.039.583,90	$ -	$ 366.798.613,00	
2	Acta de recibo parcial de obra No.2					$ -	$ 110.039.583,90	$ -	$ 366.798.613,00	
	TOTAL			**$ -**		**$ -**	**$ 110.039.583,90**	**$ -**	**$ 366.798.613,00**	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 37.447.657,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 37.447.657,00**

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial de interventoria No.1					N/A	N/A	$ -	$ 37.447.657,00	
2	Acta parcial de interventoria No.2					N/A	N/A	$ -	$ 37.447.657,00	
	TOTAL			**$ -**				**$ -**	**$ 37.447.657,00**	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

2

Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	443 DE 2024	**Contratista:**	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
Periodo:	1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
A	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**		%
1	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.	9.39
2	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas-de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	El contratista de obra Aacredito el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.	9.39
3	Mantener indemne a la CAM de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	El contratista de obra durante el periodo mantuvo indemne a la Cam de cualquier tipo de reclamacion	9.39
4	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la CAM o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	El contratista de obra responde por el contrato con las polizas adquiridas.	9.39
5	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	El contratista de obra asume en cualquier caso las indemnizaciones que se lleguen a presentar por cualquier daño a tercero.	9.39
6	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o lleguen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	El contratista de obra asumio todos los gastos de legalizacion del contrato.	9.39
7	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	El contratista de obra no ha cedido el contrato	9.39
8	Notificar a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.	9.39
9	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	El contratista cuenta con las polizas actualizadas al acta de inicio del contrato.	9.39
10	Proporcionar al Interventor, cuando este lo requiera, informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra.	El contratista de obra ha entregado la informacion requerida por el inerventor	9.39
11	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	El contratista de obra asume los riesgos previsibles de la ejecucion del contrato.	9.39
12	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	El contratista de obra ejecutó la obra de acuerdo a loas condiciones ofrecidas desde el inicio del contrato	9.39
13	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	El contratista de obra presento todos los documentos requeridos para firma de acta de inicio	9.39
14	Acreditar el cumplimiento en el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23.	El contratista de obra Aacredito el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	9.39
15	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.	El contratista de obra doto a cada trabajador de ls elementos de seguridad.	9.39
16	Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados; y a su terminación retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad vigente.	El contratista de obra dispuso bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad de todo los mecanismos necesarios para la seguridad de la maquinaria y materiales que empleó durante el periodo, con el fin de evitar hurtos, pérdidas y daños.	9.39
	Presentar acta de disposición de residuos contaminados y de construccion emitida por entidad autorizada para la disposicion final.	El contratista de obra cumplió con la disposición adecuada de los residuos generados por las actividades ejecutadas en el periodo.	9.39
	Se debera llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demas acontecimientos, debe permitir la comprencion general de la obra y desarroll de las actividades de acuerdo con el plazo de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el contratista y el supervisor delegado, adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la entidad contratante.	El contratista de obra lleva la bitacora al dia con todas las actividades realizadas en el periodo.	9.39
	Mantener durante la ejecución del contrato las medidas de seguridad en el área de intervención, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.	El contratista de obra mantuvo las medidas de seguridad de los materiales, en el area de intervencion	9.39
17	El Contratista velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.	El contratista de obra cumplió con la normatividad ambiental legal vigente para este tipo de obra.	9.39
C	**OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**		
1	Adoptar la política de cero papel y demás programas de ahorro y uso eficiente de los recursos, implementados por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	El contratista de obra adoptó la política de "Cero papel" y demás programas de uso eficiente de los recursos, implementados por la Corporación.	9.39
2	Seguir las recomendaciones impartidas por el Sistema Integrado de Gestión, depositando adecuadamente los residuos sólidos en los puntos ecológicos y apagar y/o desconectar los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos que no se estén utilizando.	El contratista cumple con las recomendaciones impartidas por el sistema integrado de gestion	9.39
3	Cumplir con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviere obligado a ello, de acuerdo con la normatividad vigente.	El contratista de obra cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra.	9.39
4	Presentar informes mensuales y uno final de ejecución del Contrato al supervisor.	El contratista de obra presento los informes mensuales.	9.39
5	Costear y mitigar los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos.	El contratista de obra asume cualquier tipo de riesgo asignado en la matriz de riesgo	9.39

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	**2**

Ingeniería & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	Director de obra:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de noviembre de 2024	al	30 de noviembre de 2024

FOTOGRAFÍA No.1




DESMONTE DE CIELO RASO EN AUDITORIO

FOTOGRAFÍA No.2



APLICACIÓN DE GRANIPLAST EXERIOR AUDITORIO

FOTOGRAFÍA No.3

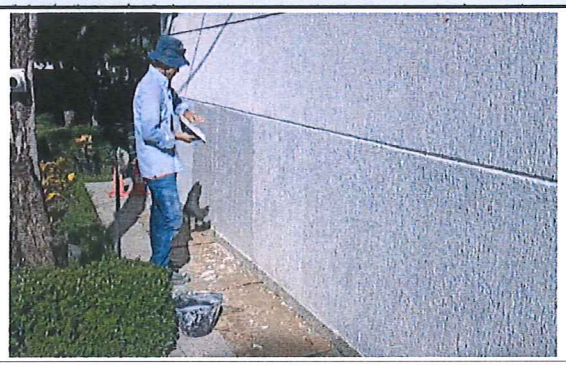

APLICACIÓN DE GRANIPLAST EXERIOR AUDITORIO

FOTOGRAFÍA No.4



MANTENIMIENTO CUBIERTA CAC

FOTOGRAFÍA No.5



MANTENIMIENTO CIELO RASO CAC

FOTOGRAFÍA No.6



PINTURA CON VINILO EN INTERIOR CAC

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 443 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	11 de noviembre de 2024	PERIODO No.	4	DEL	4/11/2024	AL	10/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Neiva - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	453 DE 2024				CONTRATO No.:	443 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA			
NIT / C.C.:	79.142.300				NIT / C.C.:	7.693.769			
PLAZO INICIAL:	3	MESES			PLAZO INICIAL:	3	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	0	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	58				DÍAS POR EJECUTAR	58			
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	32	DIAS	EQUIVALE AL	35,6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	32	DIAS	EQUIVALE AL	35,6%
VALOR INICIAL :	$	37.447.657,00			VALOR INICIAL :	$	366.798.613,00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	37.447.657,00			VALOR ACTUALIZADO:	$	366.798.613,00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	37.447.657,00			VALOR POR PAGAR:	$	366.798.613,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	9/10/2024	9/10/2024	0
1	**AREA AUDITORIO**			no iniciado
1.1	Localización y replanteo.	21/10/2024	21/10/2024	0
1.2	Desmonte de cubierta en asbesto cemento y teja de barro tipo colonial.	21/10/2024	21/10/2024	0
1.3	Desmonte e instalacion de ciero raso en icopor.	4/11/2024	4/11/2024	0
1.4	Suministro e instalacion de cubierta teja española	28/10/2024		no iniciado
1.5	Suministro e instalacion de caballete incluye tornillos de fijacion.	11/11/2024		no iniciado
1.6	Graniplast para fachadas.	18/11/2024		no iniciado
1.7	Estuco y vinilo sobre muro.	2/12/2024		no iniciado
2	**AREA CENTRO DE ATENSION AL CIUDADANO**			no iniciado
2,1	Fabricacion e instalacion de rejillas sumideros nuevos y completos	2/12/2024		no iniciado
2,2	Mantenimiento y reparacion de rejillas sumideros	18/11/2024		no iniciado
2,3	Revision de cubierta y correccion de goteras realizando desmonte y monte en teja fibrocemento y/o termoacustica con curado en cinta asfaltica	18/11/2024		no iniciado
2,4	Mantenimiento y reparacion de cielo raso en drywall	2/12/2024		no iniciado
2,5	Suministro e instalacion de rejilla plastica de ventilacion	25/11/2024		no iniciado
2,6	Vinilo sobre muro	2/12/2024		no iniciado
3	**ADECUACION SALA CEIBAS**			no iniciado
3,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
3,2	Suministro e Instalación De Vidrio 5mm Incoloro Templado Para Las Ventanas Instalado Sobre Empaque Neopreno Y Pisavidrio A Presión, Se Instalarán Vidrio A Tope.	16/12/2024		no iniciado
3,3	Suministrar e instalar diez (10) sillas ergonómicas tipo operador, con reposa cabezas, reposa brazos, respaldo en la zona lumbar	23/12/2024		no iniciado
3,4	Suministrar e instalar una mesa de reuniones tipo sala de juntas de diez puestos.	23/12/2024		no iniciado
3,5	Suministrar e instalar un tablero digital interactivo	23/12/2024		no iniciado
4	**ADECUACION SALA SOLUCIONES TECNOLOGICAS**			no iniciado
4,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
4,2	Suministro e Instalación de UPS de 3KVA	23/12/2024		no iniciado
4,3	Suministro e Instalación de Gabinete	23/12/2024		no iniciado
5	**SISTEMA ELECTRICO**			no iniciado
5,1	**ACOMETIDA Y ALIMENTADORES**			no iniciado
5,1,1	Alimentador general a tablero de distribucion general	2/12/2024		no iniciado
5,2	**ALIMENTADORES TIPO TRACCION Y LIBRES DE HALOGENOS**			no iniciado
5,2,1	Salida cableado para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,2	Salida cableado para tomacorriente bifasico para aire acondicionado con polo a tierra en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,3	Salida cableado para LAMPARA DE EMRGENCIA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,4	Salida cableado para REFLECTORES FACHADA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,5	Salida cableado para LAMPARA ERMETICA TIPO REFLECTOR con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,6	Salida cableado para LAMPARA TIPO PANEL LED DE 18 W con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,7	Salida cableado para CONTROL DE ILUMINACION con sistema normal 20A en muro .	2/12/2024		no iniciado
5,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS**			no iniciado
5,3,1	Suministro e instalacion de tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador.	9/12/2024		no iniciado
5,4	**MEDICIÓN Y PUESTA A TIERRA**			no iniciado
5,4,1	Malla a tierra de auditorio. 2 varillas copperweld 2,4 m, 1 cajas inspeccionables, interconexión Cable 1/0	9/12/2024		no iniciado
5,5	**SALIDAS ELÉCTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES, SENSORES Y OTROS)**			no iniciado
5,5,1	Suministro e instalacion de toma doble 110 v tipo Levinton con polo a tierra	11/11/2024		no iniciado
5,5,2	Suministro e instalacion de toma 220 v doble tipo Levinton con polo a tierra	9/12/2024		no iniciado
5,5,3	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	9/12/2024		no iniciado
5,6	**MONTAJE DE LUMINARIAS CINTA LED**			no iniciado
5,6,1	Suministro e instalacion de panel LED 6" - 18W redondo empotrado.	9/12/2024		no iniciado
5,6,2	Suministro e instalacion de LUMINARIA ERMETICA tipo refeltor de 50 w.	9/12/2024		no iniciado
5,6,3	Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA Mickey Mouse.	9/12/2024		no iniciado
5,6,4	Suministro e instalacion de LUMINARIA TIPO REFLEXTOR para exteriores	9/12/2024		no iniciado
5,7	**SALIDAS DE TV VOZ Y DATOS**			no iniciado
5,7,1	Salida para tv a terminal coaxial 75 ohm (con tuberia PVC de 1ø3/4" 15 mts)	23/12/2024		no iniciado
6	**INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES**			no iniciado
6,1	Cable SFTP CLASS FA L50H	9/12/2024		no iniciado
6,2	Cable trenzado 312 fase amarilla o azul	9/12/2024		no iniciado
6,3	Cable trenzado 312 fase roja	9/12/2024		no iniciado

6,4	Punto de datos con certificacion y etiquetado	9/12/2024		no iniciado
6,5	Gabinete de pared	23/12/2024		no iniciado
6,6	Herraje Tera 4p anguar	23/12/2024		no iniciado
6,7	MTP cassette f.o/om4 24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,8	Patch panel F.O. cassettes F.O. MTP-24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,9	F.O. preconectorizada 12H OM4 LSOH 40M	23/12/2024		no iniciado
6,10	Cajas de inspeccion	9/12/2024		no iniciado
6,11	SGB	23/12/2024		no iniciado
7	**EQUIPO DE RED DE DATOS**			no iniciado
7,1	AT-X 18gp switch de borde 18 puertos	23/12/2024		no iniciado
7,2	Modulos SFP	23/12/2024		no iniciado
7,3	Access point doble banda	23/12/2024		no iniciado
7,4	Patch cord TERA 4PR/RJ45 1M	23/12/2024		no iniciado
7,5	Patch cord TERA 4PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,6	Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,7	Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H	23/12/2024		no iniciado
7,8	Patch cord CAT6A - certificados 5m	23/12/2024		no iniciado
7,9	GXT5-6000 RT208	23/12/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 42.366.822,08	11,55%	-8,63%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 10.698.039,00	2,92%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Andres Felipe Sanchez	7.693.769	Ing Residente
Rodrigo Ayerbe Zaavedra	7.700.920	Ing Electrico
Robinson Andres Cardoso	1.075.223.088	Profesional en Salud Ocupacional
Rafael Augusto Cotes	7.687.219	Apoyo ing residente
Mario Ceron Charry	111.787.758	Ing Control y Datos
Saul Alexander Layton	7.709.322	Apoyo de Obra civil
Jose Alirio Lizcano Gutierrez	1.075.304.406	Apoyo de Obra civil
Manuel Fernando Calderon	7.713.568	Apoyo de Obra civil
Juan Diego Trujillo Herrera	1.003.864.059	Apoyo de Obra civil
Edgar Augusto Calderon	7.691.740	Apoyo de Obra civil
Jhon Alexander Montealegre	1.003.806.535	Apoyo de Obra electrica
Jhon Edinson Mora	1.003.829.262	Apoyo de Obra electrica
Jhon Faiber Canacue	1.075.283.614	Apoyo de Obra electrica
Jose Maria Correa	7.696.987	Apoyo de Obra electrica

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	5	0	35,71%	0,00%	5
	TECNICO	3	0	21,43%	0,00%	3
	M.O/N.C	6	0	42,86%	0,00%	6
	TOTALES	**14**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continúa ejecutando actividades en el auditorio tales como: excavacion y regatas para instalaciones eléctricas electrica y desmonte del cielo raso en icopor.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La inerventoria inspeccionó las actividades realizadas por el contratista para evidenciar el cumpliento de las especificaciones tecnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EXCAVACION PARA TUBERIA ELECTRICA



DESMONTE DE CIELO RASO EN AUDITORIO



DESMONTE DE CIELO RASO EN AUDITORIO



DESMONTE DE CIELO RASO EN AUDITORIO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LEONEL FERNANDO OBREGON

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 443 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	18 de noviembre de 2024	PERIODO No.	5	DEL	11/11/2024	AL	17/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Neiva - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	453 DE 2024			CONTRATO No.:	443 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			CONTRATISTA	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA		
NIT / C.C.:	79.142.300			NIT / C.C.:	7.693.769		
PLAZO INICIAL:	3	MESES		PLAZO INICIAL:	3	MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
PLAZO ADICIONAL:		MESES		PLAZO ADICIONAL:	0	MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	51			DÍAS POR EJECUTAR	51		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	39	DIAS	EQUIVALE AL 43,3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	39	DIAS	EQUIVALE AL 43,3%
VALOR INICIAL :	$ 37.447.657,00			VALOR INICIAL :	$ 366.798.613,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.447.657,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 366.798.613,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 37.447.657,00			VALOR POR PAGAR:	$ 366.798.613,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	9/10/2024	9/10/2024	0
1	**AREA AUDITORIO**			no iniciado
1.1	Localización y replanteo.	21/10/2024	21/10/2024	0
1.2	Desmonte de cubierta en asbesto cemento y teja de barro tipo colonial.	21/10/2024	21/10/2024	0
1.3	Desmonte e instalacion de ciero raso en icopor.	4/11/2024	4/11/2024	0
1.4	Suministro e instalacion de cubierta teja española	28/10/2024		no iniciado
1.5	Suministro e instalacion de caballete incluye tornillos de fijacion.	11/11/2024		no iniciado
1.6	Graniplast para fachadas.	18/11/2024	11/11/2024	7
1.7	Estuco y vinilo sobre muro.	2/12/2024		no iniciado
2	**AREA CENTRO DE ATENSION AL CIUDADANO**			no iniciado
2,1	Fabricacion e instalacion de rejillas sumideros nuevos y completos	2/12/2024		no iniciado
2,2	Mantenimiento y reparacion de rejillas sumideros	18/11/2024		no iniciado
2,3	Revision de cubierta y correccion de goteras realizando desmonte y monte en teja fibrocemento y/o termoacustica con curado en cinta asfaltica	18/11/2024		no iniciado
2,4	Mantenimiento y reparacion de cielo raso en drywall	2/12/2024		no iniciado
2,5	Suministro e instalacion de rejilla plastica de ventilacion	25/11/2024		no iniciado
2,6	Vinilo sobre muro	2/12/2024		no iniciado
3	**ADECUACION SALA CEIBAS**			no iniciado
3,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
3,2	Suministro e Instalación De Vidrio 5mm Incoloro Templado Para Las Ventanas Instalado Sobre Empaque Neopreno Y Pisavidrio A Presión, Se Instalarán Vidrio A Tope.	16/12/2024		no iniciado
3,3	Suministrar e instalar diez (10) sillas ergonómicas tipo operador, con reposa cabezas, reposa brazos, respaldo en la zona lumbar	23/12/2024		no iniciado
3,4	Suministrar e instalar una mesa de reuniones tipo sala de juntas de diez puestos.	23/12/2024		no iniciado
3,5	Suministrar e instalar un tablero digital interactivo	23/12/2024		no iniciado
4	**ADECUACION SALA SOLUCIONES TECNOLOGICAS**			no iniciado
4,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
4,2	Suministro e Instalación de UPS de 3KVA	23/12/2024		no iniciado
4,3	Suministro e Instalación de Gabinete	23/12/2024		no iniciado
5	**SISTEMA ELECTRICO**			no iniciado
5,1	**ACOMETIDA Y ALIMENTADORES**			no iniciado
5,1,1	Alimentador general a tablero de distribucion general	2/12/2024		no iniciado
5,2	**ALIMENTADORES TIPO TRACCION Y LIBRES DE HALOGENOS**			no iniciado
5,2,1	Salida cableado para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,2	Salida cableado para tomacorriente bifasico para aire acondicionado con polo a tierra en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,3	Salida cableado para LAMPARA DE EMRGENCIA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,4	Salida cableado para REFLECTORES FACHADA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,5	Salida cableado para LAMPARA ERMETICA TIPO REFLECTOR con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,6	Salida cableado para LAMPARA TIPO PANEL LED DE 18 W con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,7	Salida cableado para CONTROL DE ILUMINACION con sistema normal 20A en muro .	2/12/2024		no iniciado
5,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS**			no iniciado
5,3,1	Suministro e instalacion de tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador.	9/12/2024		no iniciado
5,4	**MEDICIÓN Y PUESTA A TIERRA**			no iniciado
5,4,1	Malla a tierra de auditorio. 2 varillas copperweld 2,4 m, 1 cajas inspeccionables, interconexión Cable 1/0	9/12/2024		no iniciado
5,5	**SALIDAS ELÉCTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES, SENSORES Y OTROS)**			no iniciado
5,5,1	Suministro e instalacion de toma doble 110 v tipo Levinton con polo a tierra	11/11/2024		no iniciado
5,5,2	Suministro e instalacion de toma 220 v doble tipo Levinton con polo a tierra	9/12/2024		no iniciado
5,5,3	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	9/12/2024		no iniciado
5,6	**MONTAJE DE LUMINARIAS CINTA LED**			no iniciado
5,6,1	Suministro e instalacion de panel LED 6" - 18W redondo empotrado.	9/12/2024		no iniciado
5,6,2	Suministro e instalacion de LUMINARIA ERMETICA tipo refeltor de 50 w.	9/12/2024		no iniciado
5,6,3	Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA Mickey Mouse.	9/12/2024		no iniciado
5,6,4	Suministro e instalacion de LUMINARIA TIPO REFLEXTOR para exteriores	9/12/2024		no iniciado
5,7	**SALIDAS DE TV VOZ Y DATOS**			no iniciado
5,7,1	Salida para tv a terminal coaxial 75 ohm (con tuberia PVC de 1ø3/4" 15 mts)	23/12/2024		no iniciado
6	**INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES**			no iniciado
6,1	Cable SFTP CLASS FA L50H	9/12/2024		no iniciado
6,2	Cable trenzado 312 fase amarilla o azul	9/12/2024		no iniciado
6,3	Cable trenzado 312 fase roja	9/12/2024		no iniciado

6,4	Punto de datos con certificacion y etiquetado	9/12/2024		no iniciado
6,5	Gabinete de pared	23/12/2024		no iniciado
6,6	Herraje Tera 4p anguar	23/12/2024		no iniciado
6,7	MTP cassette f.o/om4 24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,8	Patch panel F.O. cassettes F.O. MTP-24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,9	F.O. preconectorizada 12H OM4 LSOH 40M	23/12/2024		no iniciado
6,10	Cajas de inspeccion	9/12/2024		no iniciado
6,11	SGB	23/12/2024		no iniciado
7	**EQUIPO DE RED DE DATOS**			no iniciado
7,1	AT-X 18gp switch de borde 18 puertos	23/12/2024		no iniciado
7,2	Modulos SFP	23/12/2024		no iniciado
7,3	Access point doble banda	23/12/2024		no iniciado
7,4	Patch cord TERA 4PR/RJ45 1M	23/12/2024		no iniciado
7,5	Patch cord TERA 4PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,6	Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,7	Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H	23/12/2024		no iniciado
7,8	Patch cord CAT6A - certificados 5m	23/12/2024		no iniciado
7,9	GXT5-6000 RT208	23/12/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 62.266.930,00	16,98%	-13,53%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 12.635.214,00	3,44%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Andres Felipe Sanchez	7.693.769	Ing Residente
Rodrigo Ayerbe Zaavedra	7.700.920	Ing Electrico
Robinson Andres Cardoso	1.075.223.088	Profesional en Salud Ocupacional
Rafael Augusto Cotes	7.687.219	Apoyo residente de obra
Mario Ceron Charry	111.787.758	Ing Control y Datos
Saul Alexander Layton	7.709.322	Apoyo de Obra civil
Jose Alirio Lizcano Gutierrez	1.075.304.406	Apoyo de Obra civil
Manuel Fernando Calderon	7.713.568	Apoyo de Obra civil
Juan Diego Trujillo Herrera	1.003.864.059	Apoyo de Obra civil
Edgar Augusto Calderon	7.691.740	Apoyo de Obra civil
Jhon Alexander Montealegre	1.003.806.535	Apoyo de Obra electrica
Jhon Edinson Mora	1.003.829.262	Apoyo de Obra electrica
Jhon Faiber Canacue	1.075.283.614	Apoyo de Obra electrica
Jose Maria Correa	7.696.987	Apoyo de Obra electrica

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	5	0	35,71%	0,00%	5
	TECNICO	3	0	21,43%	0,00%	3
	M.O/N.C	6	0	42,86%	0,00%	6
	TOTALES	**14**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continúa actividades en el centro de atención al ciudadano y auditorio tales como: graniplast en exteriores y excavacion para canalización electrica.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La inerventoria inspeccionó las actividades realizadas por el contratista para evidenciar el cumpliento de las especificaciones tecnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EXCAVACION PARA TUBERIA ELECTRICA



APLICACIÓN DE GRANIPLAST CAC



APLICACIÓN DE GRANIPLAST CAC



APLICACIÓN DE GRANIPLAST CAC

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

'VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LEONEL FERNANDO OBREGON

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 443 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	25 de noviembre de 2024	PERIODO No.	6	DEL	18/11/2024	AL	24/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Neiva - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	453 DE 2024				CONTRATO No.:	443 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA			
NIT / C.C.:	79.142.300				NIT / C.C.:	7.693.769			
PLAZO INICIAL:	3	MESES			PLAZO INICIAL:	3	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	0	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	44				DÍAS POR EJECUTAR	44			
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	46	DIAS	EQUIVALE AL	51,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	46	DIAS	EQUIVALE AL	51,1%
VALOR INICIAL :	$	37.447.657,00			VALOR INICIAL :	$	366.798.613,00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	37.447.657,00			VALOR ACTUALIZADO:	$	366.798.613,00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	37.447.657,00			VALOR POR PAGAR:	$	366.798.613,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	9/10/2024	9/10/2024	0
1	**AREA AUDITORIO**			no iniciado
1,1	Localización y replanteo.	21/10/2024	21/10/2024	0
1,2	Desmonte de cubierta en asbesto cemento y teja de barro tipo colonial.	21/10/2024	21/10/2024	0
1,3	Desmonte e instalacion de cielo raso en icopor.	4/11/2024	4/11/2024	0
1,4	Suministro e instalacion de cubierta teja española	28/10/2024		no iniciado
1,5	Suministro e instalacion de caballete incluye tornillos de fijacion.	11/11/2024		no iniciado
1,6	Graniplast para fachadas.	18/11/2024	11/11/2024	7
1,7	Estuco y vinilo sobre muro.	2/12/2024		no iniciado
2	**AREA CENTRO DE ATENSION AL CIUDADANO**			no iniciado
2,1	Fabricacion e instalacion de rejillas sumideros nuevos y completos	2/12/2024		no iniciado
2,2	Mantenimiento y reparacion de rejillas sumideros	18/11/2024		no iniciado
2,3	Revision de cubierta y correccion de goteras realizando desmonte y monte en teja fibrocemento y/o termoacustica con curado en cinta asfaltica	18/11/2024	18/11/2024	0
2,4	Mantenimiento y reparacion de cielo raso en drywall	2/12/2024	18/11/2024	14
2,5	Suministro e instalacion de rejilla plastica de ventilacion	25/11/2024		no iniciado
2,6	Vinilo sobre muro	2/12/2024		no iniciado
3	**ADECUACION SALA CEIBAS**			no iniciado
3,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
3,2	Suministro e Instalación De Vidrio 5mm Incoloro Templado Para Las Ventanas Instalado Sobre Empaque Neopreno Y Pisavidrio A Presión, Se Instalarán Vidrio A Tope.	16/12/2024		no iniciado
3,3	Suministrar e instalar diez (10) sillas ergonómicas tipo operador, con reposa cabezas, reposa brazos, respaldo en la zona lumbar	23/12/2024		no iniciado
3,4	Suministrar e instalar una mesa de reuniones tipo sala de juntas de diez puestos.	23/12/2024		no iniciado
3,5	Suministrar e instalar un tablero digital interactivo	23/12/2024		no iniciado
4	**ADECUACION SALA SOLUCIONES TECNOLOGICAS**			no iniciado
4,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
4,2	Suministro e Instalación de UPS de 3KVA	23/12/2024		no iniciado
4,3	Suministro e Instalación de Gabinete	23/12/2024		no iniciado
5	**SISTEMA ELECTRICO**			no iniciado
5,1	**ACOMETIDA Y ALIMENTADORES**			no iniciado
5,1,1	Alimentador general a tablero de distribucion general	2/12/2024		no iniciado
5,2	**ALIMENTADORES TIPO TRACCION Y LIBRES DE HALOGENOS**			no iniciado
5,2,1	Salida cableado para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,2	Salida cableado para tomacorriente bifasico para aire acondicionado con polo a tierra en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,3	Salida cableado para LAMPARA DE EMRGENCIA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,4	Salida cableado para REFLECTORES FACHADA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,5	Salida cableado para LAMPARA ERMETICA TIPO REFLECTOR con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,6	Salida cableado para LAMPARA TIPO PANEL LED DE 18 W con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,7	Salida cableado para CONTROL DE ILUMINACION con sistema normal 20A en muro .	2/12/2024		no iniciado
5,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS**			no iniciado
5,3,1	Suministro e instalacion de tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador.	9/12/2024		no iniciado
5,4	**MEDICIÓN Y PUESTA A TIERRA**			no iniciado
5,4,1	Malla a tierra de auditorio. 2 varillas copperweld 2,4 m, 1 cajas inspeccionables, interconexión Cable 1/0	9/12/2024		no iniciado
5,5	**SALIDAS ELÉCTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES, SENSORES Y OTROS)**			no iniciado
5,5,1	Suministro e instalacion de toma doble 110 v tipo Levinton con polo a tierra	11/11/2024		no iniciado
5,5,2	Suministro e instalacion de toma 220 v doble tipo Levinton con polo a tierra	9/12/2024		no iniciado
5,5,3	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	9/12/2024		no iniciado
5,6	**MONTAJE DE LUMINARIAS CINTA LED**			no iniciado
5,6,1	Suministro e instalacion de panel LED 6" - 18W redondo empotrado.	9/12/2024		no iniciado
5,6,2	Suministro e instalacion de LUMINARIA ERMETICA tipo refeltor de 50 w.	9/12/2024		no iniciado
5,6,3	Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EMERGENCIA Mickey Mouse.	9/12/2024		no iniciado
5,6,4	Suministro e instalacion de LUMINARIA TIPO REFLEXTOR para exteriores	9/12/2024		no iniciado
5,7	**SALIDAS DE TV VOZ Y DATOS**			no iniciado
5,7,1	Salida para tv a terminal coaxial 75 ohm (con tuberia PVC de 1ø3/4" 15 mts)	23/12/2024		no iniciado
6	**INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES**			no iniciado
6,1	Cable SFTP CLASS FA L50H	9/12/2024		no iniciado
6,2	Cable trenzado 312 fase amarilla o azul	9/12/2024		no iniciado
6,3	Cable trenzado 312 fase roja	9/12/2024		no iniciado

6,4	Punto de datos con certificacion y etiquetado	9/12/2024		no iniciado
6,5	Gabinete de pared	23/12/2024		no iniciado
6,6	Herraje Tera 4p anguar	23/12/2024		no iniciado
6,7	MTP cassette f.o/om4 24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,8	Patch panel F.O. cassettes F.O. MTP-24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,9	F.O. preconectorizada 12H OM4 LSOH 40M	23/12/2024		no iniciado
6,10	Cajas de inspeccion	9/12/2024		no iniciado
6,11	SGB	23/12/2024		no iniciado
7	**EQUIPO DE RED DE DATOS**			no iniciado
7,1	AT-X 18gp switch de borde 18 puertos	23/12/2024		no iniciado
7,2	Modulos SFP	23/12/2024		no iniciado
7,3	Access point doble banda	23/12/2024		no iniciado
7,4	Patch cord TERA 4PR/RJ45 1M	23/12/2024		no iniciado
7,5	Patch cord TERA 4PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,6	Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,7	Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H	23/12/2024		no iniciado
7,8	Patch cord CAT6A - certificados 5m	23/12/2024		no iniciado
7,9	GXT5-6000 RT208	23/12/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 74.156.118,67	20,22%	-12,93%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 26.726.824,00	7,29%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Andres Felipe Sanchez	7.693.769	Ing Residente
Rodrigo Ayerbe Zaavedra	7.700.920	Ing Electrico
Robinson Andres Cardoso	1.075.223.088	Profesional en Salud Ocupacional
Rafael Augusto Cotes	7.687.219	Apoyo residente de obra
Mario Ceron Charry	111.787.758	Ing Control y Datos
Saul Alexander Layton	7.709.322	Apoyo de Obra civil
Jose Alirio Lizcano Gutierrez	1.075.304.406	Apoyo de Obra civil
Manuel Fernando Calderon	7.713.568	Apoyo de Obra civil
Juan Diego Trujillo Herrera	1.003.864.059	Apoyo de Obra civil
Edgar Augusto Calderon	7.691.740	Apoyo de Obra civil
Jhon Alexander Montealegre	1.003.806.535	Apoyo de Obra electrica
Jhon Edinson Mora	1.003.829.262	Apoyo de Obra electrica
Jhon Faiber Canacue	1.075.283.614	Apoyo de Obra electrica
Jose Maria Correa	7.696.987	Apoyo de Obra electrica


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	5	0	35,71%	0,00%	5
	TECNICO	3	0	21,43%	0,00%	3
	M.O/N.C	6	0	42,86%	0,00%	6
	TOTALES	**14**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuo actividades en el centro de taención al ciudadano tales como: revision y mantenimiento de cubierta con cinta asfaltica, se inició mantenimiento al cielo raso.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA


6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría inspeccionó las actividades realizadas por el contratista para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

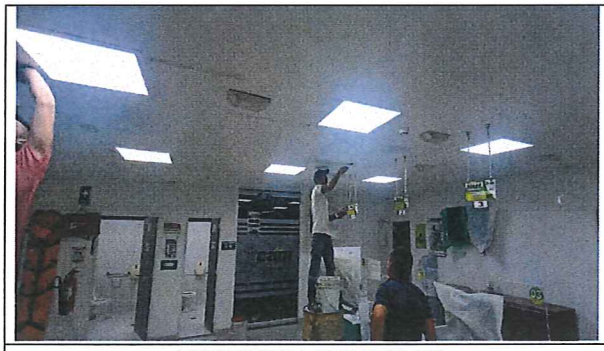	
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CAC	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CAC
	
MANTENIENTO A CIELO RASO CAC	MANTENIENTO A CIELO RASO CAC

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LEONEL FERNANDO OBREGON

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 443 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2024	PERIODO No.	7	DEL	25/11/2024	AL	1/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Neiva - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	453 DE 2024				CONTRATO No.:	443 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA			
NIT / C.C.:	79.142.300				NIT / C.C.:	7.693.769			
PLAZO INICIAL:	3	MESES			PLAZO INICIAL:	3	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	9 de octubre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	0	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	37				DÍAS POR EJECUTAR	37			
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de enero de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	90	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	53	DIAS	EQUIVALE AL	58,9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	53	DIAS	EQUIVALE AL	58,9%
VALOR INICIAL :	$	37.447.657,00			VALOR INICIAL :	$	366.798.613,00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	37.447.657,00			VALOR ACTUALIZADO:	$	366.798.613,00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	37.447.657,00			VALOR POR PAGAR:	$	366.798.613,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	9/10/2024	9/10/2024	0
1	**AREA AUDITORIO**			no iniciado
1,1	Localización y replanteo.	21/10/2024	21/10/2024	0
1,2	Desmonte de cubierta en asbesto cemento y teja de barro tipo colonial.	21/10/2024	21/10/2024	0
1,3	Desmonte e instalación de cielo raso en icopor.	4/11/2024	4/11/2024	0
1,4	Suministro e instalación de cubierta teja española	28/10/2024		no iniciado
1,5	Suministro e instalación de caballete incluye tornillos de fijación.	11/11/2024		no iniciado
1,6	Graniplast para fachadas.	18/11/2024	11/11/2024	7
1,7	Estuco y vinilo sobre muro.	2/12/2024		no iniciado
2	**AREA CENTRO DE ATENSION AL CIUDADANO**			no iniciado
2,1	Fabricación e instalación de rejillas sumideros nuevos y completos	2/12/2024		no iniciado
2,2	Mantenimiento y reparación de rejillas sumideros	18/11/2024		no iniciado
2,3	Revisión de cubierta y corrección de goteras realizando desmonte y monte en teja fibrocemento y/o termoacústica con curado en cinta asfáltica	18/11/2024	18/11/2024	0
2,4	Mantenimiento y reparación de cielo raso en drywall	2/12/2024	18/11/2024	14
2,5	Suministro e instalación de rejilla plástica de ventilación	25/11/2024		no iniciado
2,6	Vinilo sobre muro	2/12/2024	25/11/2024	7
3	**ADECUACION SALA CEIBAS**			no iniciado
3,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
3,2	Suministro e Instalación De Vidrio 5mm Incoloro Templado Para Las Ventanas Instalado Sobre Empaque Neopreno Y Pisavidrio A Presión, Se Instalarán Vidrio A Tope.	16/12/2024		no iniciado
3,3	Suministrar e instalar diez (10) sillas ergonómicas tipo operador, con reposa cabezas, reposa brazos, respaldo en la zona lumbar	23/12/2024		no iniciado
3,4	Suministrar e instalar una mesa de reuniones tipo sala de juntas de diez puestos.	23/12/2024		no iniciado
3,5	Suministrar e instalar un tablero digital interactivo	23/12/2024		no iniciado
4	**ADECUACION SALA SOLUCIONES TECNOLOGICAS**			no iniciado
4,1	Suministro e Instalación De Aire Acondicionado de 18000 BTU Tipo Inverter Incluye Soporte Metálico Para La Unidad Condensadora.	16/12/2024		no iniciado
4,2	Suministro e Instalación de UPS de 3KVA	23/12/2024		no iniciado
4,3	Suministro e Instalación de Gabinete	23/12/2024		no iniciado
5	**SISTEMA ELECTRICO**			no iniciado
5,1	**ACOMETIDA Y ALIMENTADORES**			no iniciado
5,1,1	Alimentador general a tablero de distribución general	2/12/2024		no iniciado
5,2	**ALIMENTADORES TIPO TRACCION Y LIBRES DE HALOGENOS**			no iniciado
5,2,1	Salida cableado para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,2	Salida cableado para tomacorriente bifásico para aire acondicionado con polo a tierra en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,3	Salida cableado para LAMPARA DE EMRGENCIA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,4	Salida cableado para REFLECTORES FACHADA con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,5	Salida cableado para LAMPARA ERMETICA TIPO REFLECTOR con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,6	Salida cableado para LAMPARA TIPO PANEL LED DE 18 W con polo a tierra sistema normal 20A en muro	2/12/2024		no iniciado
5,2,7	Salida cableado para CONTROL DE ILUMINACION con sistema normal 20A en muro .	2/12/2024		no iniciado
5,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS**			no iniciado
5,3,1	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador.	9/12/2024		no iniciado
5,4	**MEDICIÓN Y PUESTA A TIERRA**			no iniciado
5,4,1	Malla a tierra de auditorio. 2 varillas copperweld 2,4 m, 1 cajas inspeccionables, interconexión Cable 1/0	9/12/2024		no iniciado
5,5	**SALIDAS ELÉCTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES, SENSORES Y OTROS)**			no iniciado
5,5,1	Suministro e instalación de toma doble 110 v tipo Levinton con polo a tierra	11/11/2024		no iniciado
5,5,2	Suministro e instalación de toma 220 v doble tipo Levinton con polo a tierra	9/12/2024		no iniciado
5,5,3	Suministro e instalación de interruptor sencillo	9/12/2024		no iniciado
5,6	**MONTAJE DE LUMINARIAS CINTA LED**			no iniciado
5,6,1	Suministro e instalación de panel LED 6" - 18W redondo empotrado.	9/12/2024		no iniciado
5,6,2	Suministro e instalación de LUMINARIA ERMETICA tipo refeltor de 50 w.	9/12/2024		no iniciado
5,6,3	Suministro e instalación de LUMINARIA DE EMERGENCIA Mickey Mouse.	9/12/2024		no iniciado
5,6,4	Suministro e instalación de LUMINARIA TIPO REFLEXTOR para exteriores	9/12/2024		no iniciado
5,7	**SALIDAS DE TV VOZ Y DATOS**			no iniciado
5,7,1	Salida para tv a terminal coaxial 75 ohm (con tubería PVC de 1ø3/4" 15 mts)	23/12/2024		no iniciado
6	**INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES**			no iniciado
6,1	Cable SFTP CLASS FA L50H	9/12/2024		no iniciado
6,2	Cable trenzado 312 fase amarilla o azul	9/12/2024		no iniciado
6,3	Cable trenzado 312 fase roja	9/12/2024		no iniciado

6,4	Punto de datos con certificación y etiquetado	9/12/2024		no iniciado
6,5	Gabinete de pared	23/12/2024		no iniciado
6,6	Herraje Tera 4p anguar	23/12/2024		no iniciado
6,7	MTP cassette f.o/om4 24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,8	Patch panel F.O. cassettes F.O. MTP-24 hilos 2lc	9/12/2024		no iniciado
6,9	F.O. preconectorizada 12H OM4 LSOH 40M	23/12/2024		no iniciado
6,10	Cajas de inspección	9/12/2024		no iniciado
6,11	SGB	23/12/2024		no iniciado
7	**EQUIPO DE RED DE DATOS**			no iniciado
7,1	AT-X 18gp switch de borde 18 puertos	23/12/2024		no iniciado
7,2	Módulos SFP	23/12/2024		no iniciado
7,3	Access point doble banda	23/12/2024		no iniciado
7,4	Patch cord TERA 4PR/RJ45 1M	23/12/2024		no iniciado
7,5	Patch cord TERA 4PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,6	Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M	23/12/2024		no iniciado
7,7	Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H	23/12/2024		no iniciado
7,8	Patch cord CAT6A - certificados 5m	23/12/2024		no iniciado
7,9	GXT5-6000 RT208	23/12/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 86.230.523,33	23,51%	-14,12%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 34.424.283,00	9,39%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Andrés Felipe Sánchez	7.693.769	Ing. Residente
Rodrigo Ayerbe Zaavedra	7.700.920	Ing. Eléctrico
Robinson Andrés Cardoso	1.075.223.088	Profesional en Salud Ocupacional
Rafael Augusto Cotes	7.687.219	Apoyo residente de obra
Mario Cerón Charry	111.787.758	Ing. Control y Datos
Saul Alexander Layton	7.709.322	Apoyo de Obra civil
José Alirio Lizcano Gutiérrez	1.075.304.406	Apoyo de Obra civil
Manuel Fernando Calderón	7.713.568	Apoyo de Obra civil
Juan Diego Trujillo Herrera	1.003.864.059	Apoyo de Obra civil
Edgar Augusto Calderón	7.691.740	Apoyo de Obra civil
Jhon Alexander Montealegre	1.003.806.535	Apoyo de Obra eléctrica
Jhon Edison Mora	1.003.829.262	Apoyo de Obra eléctrica
Jhon Faiber Canacue	1.075.283.614	Apoyo de Obra eléctrica
José María Correa	7.696.987	Apoyo de Obra eléctrica

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	5	0	35,71%	0,00%	5
	TECNICO	3	0	21,43%	0,00%	3
	M.O/N.C	6	0	42,86%	0,00%	6
	TOTALES	**14**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuo actividades en el centro de atención al ciudadano tales como: Se realizó la pintura con vinilo y se continuo el mantenimiento al cielo raso.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría inspecciono las actividades realizadas por el contratista para el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se entrego la documentacion requerida para la modificatoria de cantidades y creacion de item nuevo para ser revisada por la entidad.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



MANTENIMIENTO A CIELO RESO CAC



MANTENIMIENTO A CIELO RESO CAC



PINTURA CON VINILO EN CAC



PINTURA CON VINILO EN CAC

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDRES FELIPE QUINTERO CARDONA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: LEONEL FERNANDO OBREGON

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	23 Abril de 2019

TEMA: Comité contrato de obra 443 de 2024 - Adecuaciones | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CAM.

SITIO DEL EVENTO: Sala de juntas - SGA CAM | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 26/11/2024 | HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Rafael Cortes Arbeláez	X		7687.219	Contratista	Ing. Residente	Neiva	3134787250	rafacortes3@gmail.com	✓	
2	Andrés Felipe Sánchez	X		7693769	Contratista	Ing. Contable	Neiva	3103242949	andressanchez73@gmail.com	✓	
3	Miguel Felipe Villarreal U.	X		1075241942	CAM	Contratista	Neiva	3214562495	pipe.v96@hotmail.com	✓	
4	Carolina Quintero		X	1075234855	CAM	asesora TIC	Neiva	3156702467	carquintero@cam.gov.co	✓	
5.	Carlos A. Quiroga	X		79.142.300	INTERV	Contratista	Neiva	3103214225	cquiroac@gmail.com	✓	
6	LEONEL F OBREGON	X		7699626	CAM	PROF. ESP	NEIVA	3138863446	lobregon@camhuila.co	Si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 5 MUJERES: 1

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31598060	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.100	1.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31598060	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	182.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31598060	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.100	1.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31598060	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.600	0	176.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.600	0	176.600
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					182.400	0	1.700	0	184.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901490449	2	HARCOL INGENERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 71 1D 120		323277450			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31843387	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.468.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	31843387	2024-12-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55056506	BONILLA RAMOS MAIRA	2.320.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.320.000	371.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.320.000	92.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.320.000	92.800	2.320.000	161.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	718.300	S	5411201
2	CC 1075299573	PALACIOS YUNDA JOAN ERNESTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
3	CC 75080407	QUINTERO CARDONA ANDRES FELIPE	1.392.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.392.000	222.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.392.000	55.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.392.000	55.700	1.392.000	96.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	431.100	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901490449	2	HARCOL INGENERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 71 1D 120		323277450			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31843387	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.468.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	31843387	2024-12-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.012.000	5.012.000	5.012.000	5.012.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	802.000	0	0	0	802.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	222.800	0	0	0	222.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 2)				3	200.500	0	0	0	200.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	92.800	0	0	0	92.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	107.700	0	0	0	107.700
ARP(Administradoras: 1)				3	265.200	0	0	0	265.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	265.200	0	0	0	265.200
CCF(Administradoras: 1)				3	200.500	0	0	0	200.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	200.500	0	0	0	200.500
Gran Total					1.468.200	0	0	0	1.468.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
