132

INFORME INTERVENTORÍA No. 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 225-CMAB-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 212-LICP-2023

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÀ".

PERIODO DE EJECUCION
02 DE MARZO DE 2024 – 01 DE ABRIL DE 2024

143

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
1. DESCRIPCION GENERAL 5
2. LOCALIZACION 6
3. ALCANCE 8
4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 9
5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9
5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 9
5.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
5.3. RELACIÓN DE PAGOS 10
5.4. BALANCE DEL ANTICIPO 10
5.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 11
5.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 11
5.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 13
5.8. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 13
6. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA 15
7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 17
8. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 18
11. INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO. 25
12. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS (ACTA MODIFICATORIA 1) 26
13. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO 30
13.1. RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES 31
14. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 31
15. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 31
16. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR 32
17. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR 33
18. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 33
18.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 34
18.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 34
18.3. INFORMACIÓN FINANCIERA 34
18.4. RELACIÓN DE PAGOS 35

18.5. BALANCE DEL ANTICIPO 35
18.6. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 35
18.7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 36
18.8. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 37
18.9. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 38

1255

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Líder 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No.225-CMAB-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

Número de Revisión	1
Elaboro:	Carlos Dario Cano Sánchez
Reviso:	Carlos Dario Cano Sánchez
Aprobó:	Carlos Dario Cano Sánchez

1266

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Lider 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No.225-CMAB-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión
	1
Elaboro:	Fabio Hernán Fiesco Gorrón
Reviso:	Carlos Darío Cano Sánchez
Aprobó:	Carlos Darío Cano Sánchez



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION GENERAL

El municipio de La Montañita Caquetá cuenta con tres centros vida denominados AÑOS DORADOS, ubicados en las inspecciones de policía de la unión Peneya, Santuario y la cabecera municipal, estipulados en el Acuerdo municipal No 005 de 25 febrero de 2016 con resolución de funcionamiento 00431 del 24 de diciembre de 2019 de la secretaría departamental de salud, con una atención global de 170 adultos mayores aproximadamente. Es así, que la Administración Municipal con aras de fomentar la atención a la población adulta mayor y así cubrir la necesidad en el municipio requiere la construcción de un centro vida en la inspección de Mateguada.

El grupo poblacional de Personas Mayores, representan la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad sociocultural, que atentan contra la estabilidad y la convivencia ciudadana; No obstante, también pueden representar la facilidad de influir en dinámicas sociales que pueden exponerlos a los actos de riesgos, vulnerabilidad y violencia que generan precariedad y la exclusión. El grupo poblacional de personas mayores, representa la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad social, que atentan contra la estabilidad integral de este grupo poblacional.

Con motivo de ofrecer unas instalaciones idóneas a los adultos mayores residentes del municipio se viene adelantando la construcción de la infraestructura centro vida en la inspección de Mateguadua, teniendo en cuenta las fases y etapas del proyecto (Pre construcción, construcción y postconstrucción).

Con estas adecuaciones se cumplirá con las especificaciones técnicas y los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el funcionamiento de los Centros Vida, pero lo más significativo, los adultos mayores gozaran de instalaciones cómodas y seguras.

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en el municipio de la Montañita Caquetá, en el centro poblado de Mateguadua 1°13´24" N – 75°19´23" W. Este centro poblado se encuentra ubicado sobre la vía que de La Montañita va a la población de San Antonio de Getuchá en el municipio de Milán. Con una distancia aproximada de 37,5 kilómetros de la cabecera municipal de La Montañita.

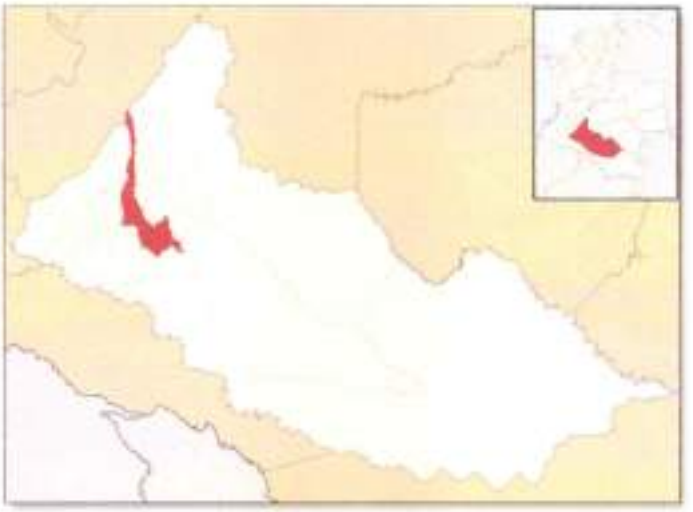


Ilustración 1. *Localización general. Mapa del Municipio de La Montañita, Caquetá (Colombia)*





Ilustración 2. *Localización Veredo Mateguadua.*

1259

LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MUNICIPIO

El municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur — oriente de Colombia, entre las coordenadas: Latitud: 1° 28' 53" N y Longitud: 75° 26' 23" W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar.

Su cabecera municipal está ubicada al norte del Departamento del Caquetá, a 27 kilómetros de la capital, Florencia, sobre la carretera denominada La Marginal de la Selva. Comprende aproximadamente 43.850 hectáreas, principalmente por el clima las características están muy Bien definidas, que cambia desde cálido -húmedo en la base de la cordillera, hasta un frio muy húmedo en las partes altas y define las unidades geomorfoclimaticas, determinando los pisos térmicos. Su relieve montañoso va de quebrado a muy quebrado, con pendientes entre el 25% y 75%.

El Municipio de La Montañita está distribuido territorialmente en cuatro Inspecciones de Policía: Santuario. La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua (Ubicación especifica del proyecto). El área urbana de la cabecera municipal la conforman 5 barrios y el área rural 128 veredas, 11 caseríos en los cuales están las 4 Inspecciones de policía.

Vereda Mateguadua

Cerca de Mateguadua se encuentra la Vereda El Pato, El Porvenir, San Francisco, La Florida, El Líbano, La Esmeralda, Mateguadua, El Vergel, Vereda Reina Alta, Vereda La Esmeralda, Vereda El Pato, Vereda El Temblón, Vereda El Diamante, Vereda El Fono, Vereda El Diez, Vereda El Recreo, Vereda Yumal, Vereda Maticurucito. También se encuentraColegio Mateguadua dentro del poblado.

Afluentes: Quebrada El Pato, Quebrada La Danta, Quebrada La Chipa, Quebrada El Tigre, Quebrada El Danto, Quebrada La Vega, Quebrada El Temblón, Quebrada La Tigra.

3. ALCANCE

El proyecto cuenta con una capacidad para atender a un promedio de 60 y 80 personas de la tercera edad, se plantea una edificación de un solo nivel, donde sus recorridos sean amplios y generosos, zonas llenas de vegetación y senderos al aire libre, también se implementan forman sustentables donde se tiene como prioridad el ahorro de agua, por medio de tanques recolectoras de aguas lluvias, eso para luego ser utilizada en el regado de jardinería y huertas con las que el proyecto contará.

El proyecto se realiza en un lote ubicado en el centro poblado de Mateguadua que tiene como área 2.500 m2 (Area total del lote) y un total de metros cuadrado utilizables de 1.746,49 m2. Las zonas de la edificación se distribuyen en: Administrativa (59 m2), salud y atención integral (30 m2), servicios (255.97 m2), lúdica (583.21 m2) y servicios de uso general (818.31 m2).



Ilustración 3. *Modelado en 3D de la infraestructura Centro Vida.*

4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	212-LICP-2023
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".
Nombre del contratista:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($1.480.593.601) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS UN PESOS MCTE
Valor Anticipo (10%):	($148.059.360) MCTE. – CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
Fecha de iniciación del contrato de obra:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de iniciación del contrato de interventoría:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024

5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 02 de febrero de 2024 al 01 de abril de 2024.

5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5.2.INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1.	2.	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CDF	OTROS
ATENCION INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN						$ 1.480.734.968				
TOTALES						$ 1.480.734.968				

5.3.RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoria.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO DE OBRA
ANEXO 17. INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

5.4.BALANCE DEL ANTICIPO

El contratista renuncia al anticipo.

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$ -	$ -	$ -

	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

5.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	
Descripción	
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	
Descripción	

5.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía MUNIDAL DE SEGUROS S.A.

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00

Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 116.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 270.773,00
Patronal	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 10/11/2023 hasta el 10/06/2024.

Actualización de la póliza según acta de inicio

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	02/02/2024	02/08/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	02/08/2024	02/08/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 06 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/08/2029.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 116.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 270.773,00
Patronal	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Vehiculos propios y no propios	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

Fueron expedidas el 06 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/09/2024.

ANEXO 12. SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

5.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSTRUCTORA DICO&S SAS	02 DE FEBRERO DE 2024	01 E AGOSTO DE 2024

5.8. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- El personal de obra se compone de los siguientes cargos:

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ACREDITA
1	Director De Obra	Ingeniero Civil	Celso Rojas Cleves	25202-096642CND	Si acredita
2	Residente de obra	Ingeniero Civil	Richard Edinson Castrillón Menza	70202-413883TLM	Si acredita
3	Arquitecto	Arquitecto	Alex Raimundo Moisés Romero	0870028245ATL	Si acredita

4	Sisoma	Especialista Salud Ocupacional	Paola Andrea Medina Amezquita	Resolución No.0149 (9 de mayo de 2021)	Si acredita
5	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	Hoover Andrés Trujillo Ramirez	70202-348787 TLM	Si acredita
6	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil	Fabio Hernán Fiesco Gorrón	25202-347151CND	Si acredita

ANEXO 8. Control diario del personal de obra

5.9. EQUIPOS DE OBRA

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra fue la localización y replanteo, ajustes al diseño original con base al resultado de la modelación, cerramiento en lona verde, instalaciones provisionales, limpieza del terreno, y descapote de suelo para inicio de obra.

MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
ESTACION TOTAL	GOWIN	TKS-202	-
NIVEL	TOPCON	AT-B4	-
RETROCARGADOR	CAT	CAT 420F	101HP
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX		450 L

ANEXO 3. Control diario del equipo
ANEXO 1. Evaluación y cumplimiento ambiental de obra

5.10. HERRAMIENTA MENOR

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de marzo se tuvieron en obra la siguiente herramienta menor:

HERRAMIENTA	CANTIDAD
PALA REDONDA	4
PICA	3
CARRETILLA	4
BARRA	3
BARRETON	3
PALADRAGA	2
BALDES	10

El contratista de obra actualmente dentro de la bodega tiene los siguientes materiales de obra:

DESCRIPCION	CANTIDAD
LONA VERDE (50 MTS)	2,00
PLÁSTICO NEGRO	1
LISTONES 5X10	20,00

MADERA (TABLA 24 CM	
CEMENTO	200,00
FLEJES	3.200,00
VARILLAS DE ACERO 1/2"	157,00
VARILLAS DE ACERO 5/8"	500,00

CONCLUIR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Hasta el momento el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

6. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Planilla general de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

- Director de Obra: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
4557327472	CELSO ROJAS CLEVES	80.233.290	No acredita	No acredita	No acredita

- Residente de obra: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
9465546700	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita	No acredita	No acredita

- Arquitecto: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
N.A	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	No acredita	No acredita	No acredita

- Siso: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
9465546700	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita	No acredita	No acredita

- Especialista Estructural: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
N.A	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	No acredita	No acredita	No acredita

- Especialista Hidráulico: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
76142855	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1.018.410.974	No acredita	No acredita	No acredita


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	SUELDO MENSUAL BASICO	SUELDO MENSUAL (I.B.C.)
1	CELSO ROJAS CLEVES	80.233.290	No acredita	-	-
2	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita	$ 1.300.000	$1.300.000
3	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	No acredita	-	-
4	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita	$ 1.300.000	$1.300.000
5	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	No acredita	-	-
6	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1.018.410.974	No acredita	$ 6.500.000	$1.300.000

Nota: El contratista de obra presenta los soportes de pago de SS del mes de febrero, de manera parcial. A la fecha se encuentra pago de las planillas de seguridad social del personal mostrado en el anexo

ANEXO 4. Copia de las planillas de seguridad social del personal de obra

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

El contratista de obra entrega el flujo grama de Avance programado acumulado VS Avance ejecutado acumulado.

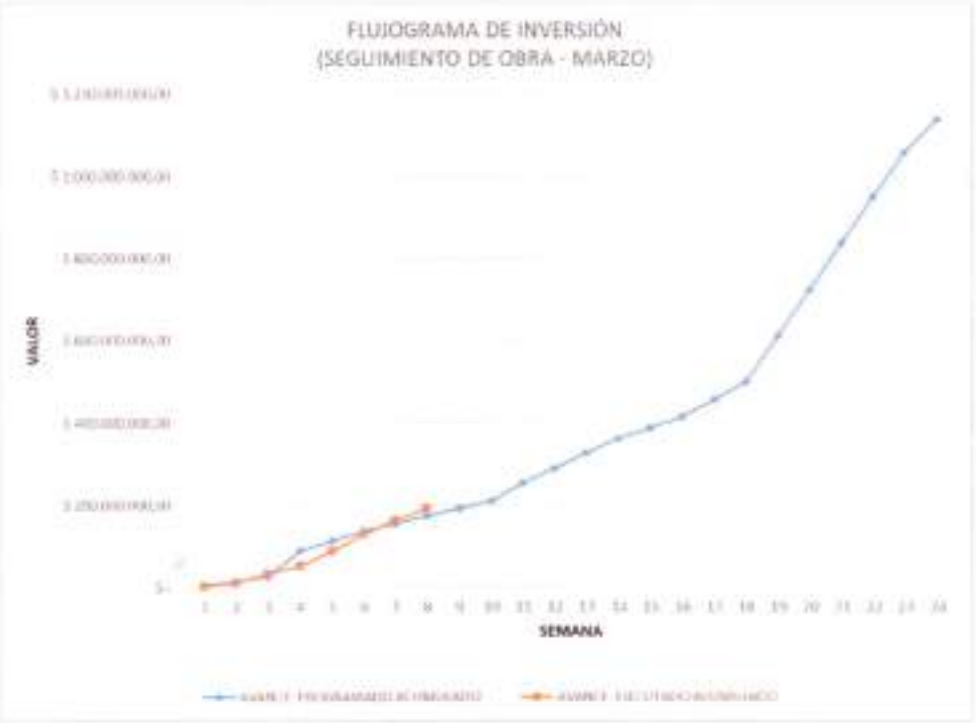

Cumplido un mes de marzo el contratista de obra lleva un avance ejecutado acumulado del 16,94 % frente al programado que es de 15,27 %.

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.610.513,33	0,40%	$ 3.021.078,67	0,265%	$ 4.610.513,33	0,405%	$ 3.021.078,67	0,265%
2	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 8.021.842,67	0,704%	$ 15.320.785,67	1,346%	$ 11.042.921,33	0,970%
3	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 22.432.305,17	1,970%	$ 26.031.058,00	2,286%	$ 33.475.226,50	2,939%
4	$ 64.437.594,25	5,66%	$ 19.411.226,50	1,704%	$ 90.468.652,25	7,943%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 23.902.838,50	2,10%	$ 34.473.189,17	3,027%	$ 114.371.490,75	10,042%	$ 87.359.642,17	7,670%
6	$ 23.902.838,50	2,10%	$ 43.011.089,17	3,777%	$ 138.274.329,25	12,141%	$ 130.370.731,33	11,447%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 32.506.890,17	2,854%	$ 156.077.408,75	13,704%	$ 162.877.621,50	14,301%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 30.046.773,50	2,638%	$ 173.880.488,25	15,267%	$ 192.924.395,00	16,939%

ANEXO 5. *SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION*

8. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

Los componentes que miden el alcance de la obra según el contrato de obra se relacionan en la siguiente tabla, teniendo en cuenta las condiciones actualizadas del balance realizado en el Acta Modificatoria 1:

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES							
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.549,00	$ 6.372.500,00	1425,00		$ 3.632.325,00
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 13.965,00	$ 3.111.945,00	223,00		$ 3.111.945,00
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	1,00		$ 5.363.000,00
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.210,00	$ 3.025.000,00	1.425,00		$ 1.724.250,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS							
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1.352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1.425,00		$ 5.688.600,00
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.679,00	190,16		$ 8.908.996,00
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74		$ 15.901.199,00
3	CIMENTACIÓN							
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.310,00	$ 48.087.791,00	32,95	$ 1.105.090,00	$ 36.412.716,00
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3.754,60	$ 9.910,00	$ 37.208.070,00	2.683,95		$ 26.597.945,00
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,69	$ 1.011.310,00	$ 29.018.327,00	27,35	$ 1.362.856,00	$ 37.273.848,00
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1.926,42	$ 9.910,00	$ 19.100.830,00	4066,27		$ 40.296.736,00
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	29,43	$ 494.180,00	$ 14.543.470,00	3,73		$ 1.843.291,00
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,34	$ 1.083.460,00	$ 61.830.556,00	0,00		
4	ESTRUCTURA							
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	$ 1.394.468,00	$ 23.064.451,00
4,2	CONCRETO F'C 21 MPA VIGAS	M3	32,31	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	23,35	$ 1.412.226,00	$ 32.975.337,00
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.039.505,00	$ 27.520.895,00	73,78	$ 1.085.745,00	$ 80.106.266,00
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5.699,31	$ 9.910,00	$ 56.480.162,00	5026,79		$ 49.815.489,00
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2.429,01	$ 9.910,00	$ 24.071.455,00	3232,03		$ 32.029.417,00
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	478,22		$ 51.483.773,00
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8.994,70	$ 17.721,00	$ 159.385.061,00	0,00		
5	CUBIERTA Y CIELO RASO							
5,1	TEJA MASTERMIL CAL.28 COLOR AZUL	M2	406,5	$ 90.094,00	$ 36.622.236,00	360,00		$ 32.433.840,00
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.858,00	$ 22.374.064,00	357,36		$ 23.173.763,00
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	366,60	$ 12.700,00	$ 4.655.820,00	210,64		$ 2.677.668,00
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,97	$ 282.100,00	$ 5.999.533,00	0,00		
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00		
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
6	MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS							
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	719,84	$ 54.412,00	$ 39.167.934,00	690,86		$ 37.581.074,00
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.286,00	$ 22.905.972,00	848,72		$ 19.716.722,00
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.196.226,00	0,00		
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 13.502,00	$ 13.281.647,00	641,24		$ 8.658.022,00
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.985,00	$ 2.468.353,00	0,00		
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.866.099,00	641,24		$ 7.736.581,00
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 42.118,80	$ 9.744.998,00	468,19		$ 20.187.419,80
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.745,80	$ 3.332.370,00	468,19		$ 6.903.462,00
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	468,19		$ 6.627.996,00
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
7,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.289,00	$ 825.780,00	17,00		$ 701.913,00
7,2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	33,50		$ 584.609,00
7,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,59	$ 11.636,00	$ 111.124,00	12,00		$ 139.632,00
7,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10		$ 315.493,00
7,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,1	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00		$ 246.738,00
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00		$ 3.537.900,00
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	1,00		$ 2.900.078,00
8	SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS							
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,0	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00		$ 1.182.258,00
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 355.716,00	6,00		$ 711.432,00
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.360,00	$ 581.768,00	25,70		$ 497.552,00
8,4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.567,00	42,00		$ 1.329.090,00
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,8	$ 35.435,00	$ 1.197.365,00	60,00		$ 2.126.100,00
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00		$ 139.268,00
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00		$ 1.361.252,00
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	1,00		$ 10.858.760,00
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES							
9,1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 85.535,80	$ 41.394.420,00	374,48		$ 32.013.072,00
9,2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18		$ 13.513.589,00
9,3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00		$ 3.249.080,00
9,4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	169,89		$ 15.031.897,00
9,5	GUARDA ESCOBAS	ML	210,00	$ 21.672,30	$ 4.551.126,00	248,02		$ 5.375.089,00
9,6	MESÓN GRANITO	M2	12,50	$ 257.175,80	$ 3.214.698,00	8,24		$ 2.119.122,00
9,7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.380,80	$ 4.063.000,00	0,00		
9,8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.380,80	$ 4.063.000,00	0,00		
9,9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00		$ 2.699.500,00
9,10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,60	$ 11.837,30	$ 4.376.104,00	0,00		
10	APARATOS SANITARIOS							
10,1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00		
10,2	PUNTO SANITARIO	UND	6,00	$ 1.008.046,80	$ 6.064.368,00	6,00		$ 6.048.276,00
10,3	LAVAMANOS	UND	9,0	$ 346.198,00	$ 3.115.782,00	7,00		$ 2.423.386,00
10,4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 735.800,00	$ 5.886.400,00	17,23		$ 12.677.834,00
10,5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00		
10,6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,0	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE							
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00		
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPO P RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.550,00	$ 2.353.100,00	0,00		
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00		
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 3.326.410,00	$ 3.326.410,00	0,00		
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.890,00	$ 6.373.780,00	0,00		
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00		
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.746.089,89	$ 1.746.089,00	0,00		
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00		
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.550,00	$ 1.018.550,00	0,00		
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD PARA COCINA	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	0,00		
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00		
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA)	UND	3,00	$ 4.562.330,00	$ 13.686.990,00	0,00		
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00		
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00		
11,15	VENTANA TIPO 4,1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00		
11,16	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00		
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00		
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES							
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,80	$ 1.123.640,00	$ 7.860.480,00	5,58		$ 6.247.408,00
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.948,00	$ 4.653.637,00	0,00		
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	6,39	$ 1.120.782,00	$ 6.815.967,00	0,99		
12,4	CINTELES EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	1,28	$ 1.094.868,00	$ 1.400.166,00	0,87		$ 972.253,00
12,5	CUNETA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00		
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	34,80	$ 54.412,00	$ 1.659.852,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS							
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00		$ 2.077.064,00
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 235.173,00	$ 7.055.190,00	30,00		$ 7.055.190,00
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.067,00	$ 16.043.742,00	66,00		$ 16.043.742,00
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 257.488,00	$ 3.112.320,00	10,00		$ 2.074.880,00
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.378,00	$ 682.137,00	3,00		$ 682.137,00
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 265.139,00	$ 1.064.556,00	4,00		$ 1.064.556,00
13,7	Suministro e instalación de Salida Lampara de aplique o riel en tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 208.961,00	$ 1.462.727,00	7,00		$ 1.462.727,00
13,8	Suministro e Instalación de Panel Led de 60x60 cm de empotrar de 40 W	UND	16,00	$ 423.810,00	$ 6.782.704,00	16,00		$ 6.782.704,00
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	36,00		$ 4.668.522,00
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.819,00	$ 1.413.828,00	12,00		$ 1.413.828,00
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencias LED Doble Spot	UND	7,00	$ 115.813,00	$ 1.251.891,00	7,00		$ 1.251.891,00
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 2No8+1No8+1No8 T. AWG por ducto PVC de 1 1/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00		$ 9.736.800,00
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto EMC de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.106,00	$ 746.106,00	1,00		$ 746.106,00
13,14	Suministro e instalación de caja de paso red baja tension subterranea norma codensa CS274	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00		$ 1.253.320,00
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00		$ 831.863,00
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00		$ 204.225,00
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 39.583,00	$ 314.413,00	11,00		$ 314.413,00
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 204.607,00	$ 204.607,00	1,00		$ 204.607,00
13,19	Suministro e Instalación de Arreglo de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 966.100,00	$ 966.100,00	1,00		$ 966.100,00
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección BPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 380.223,00	$ 380.223,00	1,00		$ 380.223,00
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	1,00		$ 1.422.953,00
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.606,00	$ 3.813.606,00	0,00		
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00		$ 855.835,00
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.523,00	$ 528.426,00	0,00		
13,25	Suministro e Instalación de bandeja ventilada 30x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.677,00	$ 237.354,00	0,00		
13,26	Suministro e Instalación de tubería EMT de 3/4" suspendido en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.366,00	62,00		$ 2.278.366,00
14	OTROS ITEMS							
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 610.325,00	$ 4.882.600,00	0,00		
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,40	$ 179.857,00	$ 4.387.427,00	0,00		
15	ITEMS NO PREVISTOS							
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+6MM, INCLUYE MARCO	M2				23,60	$ 783.648,00	$ 18.735.116,00
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+6MM, INCLUYE MARCO	M2				12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML				34,00	$ 636.140,00	$ 21.628.760,00
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3/KM				27947,76	$ 1.990,00	$ 55.606.161,00
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML				163,50	$ 64.423,00	$ 10.533.276,00
15,6	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	kg				2113,00	$ 17.755,00	$ 37.511.190,00
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2				37,50	$ 295.320,00	$ 11.187.000,00
15,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND				1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00
15,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO DESARROLLO =30<=50 CM	ML				33,50	$ 153.650,00	$ 5.147.275,00
15,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				91,70	$ 20.386,00	$ 1.867.562,00
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3				12,07	$ 808.000,00	$ 9.751.960,00
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6"	ML				19,37	$ 72.894,00	$ 1.412.097,00
15,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2				20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00
15,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML				66,30	$ 384.999,00	$ 25.181.849,00
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TN/KM				12378,16	$ 3.906,00	$ 48.328.805,00
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UND				1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00
15,17	CONCRETO F'C 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML				162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.662,00
15,18	APISONADO DE PISO E= 0 CM	M2				544,00	$ 50.850,00	$ 27.662.298,00

ACTIVIDADES DE OBRA

En el periodo comprendido entre el 02 de marzo de 2024 y el 01 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

ITEMS	ACTIVIDADES MES 03	ANOTACIÓN
1	**PRELIMINARES**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Se realiza replanteo para vigas de amarre y pedestales
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**	
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	Se realizan excavaciones de vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	Relleno de zapatas
3	**CIMENTACIÓN**	
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	Zapatas centro vida
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	Acero para zapatas centro vida
3,3	CONCRETO F'C 21MPA PARA VIGAS DE AMARRE	Vigas que soportaran la placa de piso de la estructura
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	Se realiza armado de acero de las vigas de amarre
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	Concreto para acero de vigas de amarre
4	**ESTRUCTURA**	
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	Se realiza el armado de cardillos instalando el acero longitudinal de las columnas, teniendo en cuenta la pendiente del terreno se dejan aceros para pedestales en los ejes mencionados, por lo que las longitudes varian por cada tipo de columna (tipo columna 1,2,3 y 4)
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	Se inicia la instalación de laminas de Metaldeck para placa de piso.

15	ITEMS NO PREVISTOS	
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	instalación de perfil con platinas para placa de entrepiso

Anexo 7. *Prsacta de obra No.2*

Porcentajes de avance por actividad (Según cantidades actualizadas)

ITEMS	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	V. TOTAL		
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1425,00	771,40	$ 1.986.299,00	54,13%	100,00%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**						
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1425,00	771,40	$ 3.079.429,00	54,13%	100,00%
2,2	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	190,16	12,75	$ 897.338,00	6,70%	88,93%
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	61,74	14,38	$ 3.703.583,00	23,29%	56,33%
3	**CIMENTACIÓN**						
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	32,66	22,50	$ 24.864.525,00	68,29%	91,94%
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	2.693,96	166,98	$ 1.054.871,00	6,22%	93,55%
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	27,36	27,14	$ 38.987.749,00	99,23%	99,23%
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	4066,27	454,75	$ 4.509.573,00	11,18%	11,18%
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	3,73	1,49	$ 795.226,00	39,95%	72,12%
4	**ESTRUCTURA**						
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	16,54	4,61	$ 6.428.696,00	27,87%	27,87%
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5026,79	3.992,81	$ 38.260.627,00	79,40%	79,40%
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	3232,63	230,00	$ 2.279.300,00	7,12%	7,12%
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	478,22	41,50	$ 4.468.637,00	8,68%	8,68%
15	**ITEMS NO PREVISTOS**						
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	kg	2113,03	593,29	$ 10.504.199,00	28,08%	28,08%

1936

9. AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución Inicial:	**Seis (6) meses**
Tiempo en Días:	180 días
Plazo de ejecución adicional	N.a
Plazo de ejecución final	N.a

En el siguiente cuadro se plasma los tiempos transcurridos a la fecha de corte del presente informe

INICIOS DE ACTIVIDAD	INICIO	SUSPENSIÓN	DÍAS ACTIVO
INICIO	02 de febrero de 2024		60
REINICIO 1	N.a	N.a	
REINICIO 2	N.a	N.a	
REINICIO 3	N.a	N.a	
DIAS TRANSCURRIDOS			60
% TOTAL DE AVANCE DE TIEMPO DEL CONTRATO			33.33%

10. AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada:	$1.480.593.651,00
Inversión Básica del Contrato:	$ 1.138.918.193,00
Modificatoria 1	$1.480.592.053,00
Inversión Básica ejecutada en el periodo:	$ 140.037.942,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	12,30%
Inversión total ejecutada en el periodo:	$ 182.049.325,00
Porcentaje total ejecutado:	16,94%
Inversión total ejecutada	$ 250.801.714,00
Porcentaje total por ejecutar, pendiente de la liquidación:	83,06%

11. INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

ANEXO 6. *Informes Semanales (Marzo)*

12. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS (ACTA MODIFICATORIA 1)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		JUSTIFICACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 3.548,00	$ 8.872.000,00	-1075,00	-	-$ 2.745.075,00	1425,00	$ 3.633.025,00	
1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	222,00	$ 13.955,00	$ 3.111.990,00	0,00	-	$ -	222,00	$ 3.111.990,00	
1.3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 5.363.000,00	
1.4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.219,00	$ 3.625.000,00	-1075,00	-	-$ 1.310.792,00	1425,00	$ 1.734.208,00	
				SUBTOTAL	$ 17.872.485,00			-$ 4.045.025,00		$ 13.831.540,00	
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS										
2.1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1252,00	$ 3.992,00	$ 5.797.303,00	72,92	-	$ 291.007,00	1425,00	$ 5.688.600,00	
2.2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.579,00	94,05	-	$ 4.405.317,00	190,16	$ 8.907.896,00	
2.3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	3,69	-	$ 822.960,00	62,24	$ 15.901.099,00	
				SUBTOTAL	$ 24.979.020,00			$ 5.519.774,00		$ 30.498.795,00	
3	CIMENTACIÓN										
3.1	CONCRETO PT. 2L MIN ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.710,00	$ 48.097.791,00	-19,60	1.203,096	$ 18.124.314,00	52,95	$ 36.412.716,00	
3.2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	9754,50	$ 9.510,00	$ 27.208.670,00	-1070,55	-	$ 10.810.126,50	2685,95	$ 26.397.945,00	
3.3	CONCRETO P. C. 2L MIN PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,60	$ 1.011.710,00	$ 28.918.331,00	-1,24	1.362,850	$ 1.833.398,00	27,35	$ 27.273.946,00	
3.4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1908,40	$ 9.510,00	$ 18.145.676,00	2237,85	-	$ 21.386.126,50	4066,27	$ 40.296.726,50	
3.5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M2	29,40	$ 494.000,00	$ 14.141.470,00	-25,70	-	$ 12.700.179,00	3,71	$ 1.843.291,00	
3.6	PLACA DE CONTRAPISO e= 10 cm	M2	52,04	$ 1.003.463,00	$ 51.800.598,00	-57,04	-	$ 57.250.598,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 209.760.846,00			$ 81.696.468,00		$ 142.424.626,00	
4	ESTRUCTURA										
4.1	CONCRETO PT. 2L MIN COLUMNAS	M3	13,23	$ 1.003.760,00	$ 20.416.351,00	-2,69	1.204,465	$ 3.791.211,00	10,54	$ 23.664.451,00	
4.2	CONCRETO PT. 2L MIN VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.335,00	$ 35.345.930,00	-9,56	1.412,338	$ 13.494.892,00	23,35	$ 32.975.337,00	
4.3	CONCRETO PT. 2L MIN PLACA NUBIDEK EN METALDECK	M3	28,48	$ 1.039.000,00	$ 27.520.999,00	47,31	1.080,540	$ 51.361.167,00	75,79	$ 80.306.366,00	
4.4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5000,31	$ 9.510,00	$ 50.480.951,00	-972,52	-	$ 9.864.673,00	3026,79	$ 40.615.485,00	
4.5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2420,00	$ 9.510,00	$ 24.011.451,00	803,02	-	$ 7.957.962,00	3223,02	$ 31.969.417,00	
4.6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	381,72	-	$ 32.480.606,00	558,22	$ 51.485.773,00	
4.7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ACERO A 572, INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8994,70	$ 27.722,00	$ 190.999.084,00	-8994,70	-	-$ 190.999.084,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 342.214.779,00			-$ 81.488.003,00		$ 260.484.733,00	
5	CUBIERTA Y CIELO RASO										
5.1	TEJA MULTIDAME CAL.26 COLOR AZUL	M2	406,4892	$ 90.994,00	$ 36.422.729,00	-46,49	-	$ 4.288.998,00	360,00	$ 32.433.846,00	
5.2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,50	$ 64.858,00	$ 22.379.064,00	0,00	-	$ 799.699,00	297,50	$ 23.178.763,00	
5.3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	388,60	$ 12.700,00	$ 4.935.820,00	-155,76	-	$ 1.978.152,00	232,84	$ 2.977.668,00	
5.4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 382.000,00	$ 9.359.623,00	-24,67	-	$ 9.359.623,00	0,00	$ -	
5.5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.344,00	$ 5.867.200,00	-50,00	-	$ 5.867.200,00	0,00	$ -	
5.6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 332.178,00	$ 23.435.733,00	-72,71	-	$ 23.435.733,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 99.894.676,00			$ 41.689.407,00		$ 58.589.273,00	
6	ALBAMPOSTERIA, MUROS, MUÑETES Y PINTURAS										
6.1	MAMPOSTERIA, LADRILLO Nº 4	M2	710,84	$ 54.412,00	$ 38.677.309,00	-28,88	-	$ 1.570.868,00	680,96	$ 37.391.274,00	
6.2	MUÑETE 1:4 INTERIORES	M2	883,60	$ 22.286,00	$ 22.805.917,00	-138,88	-	$ 3.095.251,00	744,72	$ 19.710.731,00	
6.3	MUÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.229,00	-176,50	-	$ 4.195.229,00	0,00	$ -	
6.4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	883,60	$ 12.862,00	$ 12.381.647,00	-342,49	-	$ 4.403.635,00	541,24	$ 6.958.031,00	
6.5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 12.862,00	$ 2.468.353,00	-176,50	-	$ 2.468.353,00	0,00	$ -	
6.6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	883,60	$ 12.862,00	$ 11.468.999,00	-342,49	-	$ 4.331.729,00	541,24	$ 7.756.561,00	
6.7	MURETE NORTE 2.3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.318,00	$ 9.791.668,00	282,19	-	$ 12.447.748,00	468,19	$ 20.187.416,00	
6.8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 34.745,00	$ 7.853.370,00	242,19	-	$ 8.377.092,00	468,19	$ 16.903.462,00	
6.9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLASTICA	M2	226,00	$ 34.158,00	$ 7.720.250,00	242,19	-	$ 8.438.442,00	468,19	$ 16.627.898,00	
				SUBTOTAL	$ 113.363.528,00			-$ 2.741.575,00		$ 107.420.993,00	
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
7.1	PUNTO HIDRAULICO PVC 26 1/2" Y PISTA + 3 M	PTO	30,00	$ 41.284,00	$ 825.780,00	-3,00	-	$ 123.867,00	27,00	$ 701.913,00	
7.2	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,00	$ 17.911,00	$ 584.600,00	0,00	-	$ -	33,00	$ 584.600,00	
7.3	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,55	$ 12.036,00	$ 111.129,00	2,45	-	$ 38.088,00	12,00	$ 129.017,00	
7.4	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.253,00	$ 315.490,00	0,00	-	$ -	34,10	$ 315.490,00	
7.5	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,12	$ 7.257,00	$ 298.408,00	-7,12	-	$ 51.678,00	34,00	$ 246.730,00	
7.6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	1,00	$ 1.279.300,00	$ 1.127.900,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.127.900,00	
7.7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.370,00	$ 2.900.370,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 2.900.370,00	
				SUBTOTAL	$ 6.573.302,00			$ 147.035,00		$ 6.426.363,00	

INFORME DE INTERVENTORÍA N.° 2

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS MODIFICACIONES ACTA			TOTAL CANTIDADES Y VALORES		
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	1 CIMENTACIONES Y OBRAS CIVILES										
1.1	PUNTO SANITARIO PVC Ø 3" Y REDM x 1 M	PTO	14,00	$ 89.447,00	$ 1.252.258,00	0,00	-	$ -	14,00	$ 1.252.258,00	
1.2	PUNTO SANITARIO PVC Ø 4" (1 M)	PTO	5,00	$ 138.772,00	$ 693.716,00	3,00	-	$ 365.716,00	8,00	$ 711.432,00	
1.3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,00	$ 29.392,00	$ 881.760,00	-4,20	-	$ 94.318,80	25,80	$ 787.152,00	
1.4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	46,12	$ 23.845,00	$ 1.100.007,20	-6,40	-	$ 203.477,00	40,00	$ 1.700.000,00	
1.5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,00	$ 29.425,00	$ 1.197.369,20	-8,20	-	$ 308.130,00	80,00	$ 2.120.800,00	
1.6	TRANSITE PVC	UND	3,00	$ 24.017,00	$ 324.551,20	1,00	-	$ 24.017,00	4,00	$ 180.208,20	
1.7	CAJAS DE INSPECCION	UND	3,00	$ 666.418,00	$ 1.301.252,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 1.301.252,00	
1.8	POZO SEPTICO INTERNADO	UND	1,00	$ 10.898.760,00	$ 10.898.760,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 10.898.760,00	
				SUBTOTAL	**$ 17.174.137,00**			**$ 1.038.671,80**		**$ 18.301.212,20**	
	2 PISOS, ENCHAPES Y PEDIDOS										
2.1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 93.935,00	$ 45.461.420,00	-109,80	-	$ 9.371.748,00	374,40	$ 35.013.672,00	
2.2	CERAMICA AREAS ANTIDESLIZANTE	M2	44,00	$ 83.614,00	$ 3.679.016,00	-11,20	-	$ 10.039.401,00	343,20	$ 13.813.699,20	
2.3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 91.317,00	$ 3.652.680,00	9,60	-	$ -	49,60	$ 3.349.080,00	
2.4	CENTRO CERAMICA PISO	M2	136,00	$ 80.886,00	$ 10.999.896,00	-40,32	-	$ 3.316.313,00	106,88	$ 13.672.367,00	
2.5	GUARDA ESCOBAS	ML	240,00	$ 24.473,00	$ 4.553.133,00	36,32	-	$ 821.965,00	276,32	$ 5.375.098,20	
2.6	MESON GRANITO	M2	23,50	$ 267.178,00	$ 5.214.686,00	-4,26	-	$ 1.065.398,00	8,24	$ 5.115.112,00	
2.7	ENCHAPE COCINA SUPERIOR	ML	30,00	$ 406.300,00	$ 4.060.000,00	10,20	-	$ 4.062.000,00	0,00	$ -	
2.8	ENCHAPE COCINA INFERIOR	ML	30,00	$ 406.300,00	$ 4.060.000,00	-10,00	-	$ 4.062.000,00	0,00	$ -	
2.9	LAVAPLATOS COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 3.699.300,00	$ 3.699.300,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 3.699.300,00	
2.10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	386,80	$ 11.677,00	$ 4.376.134,00	-386,80	-	$ 4.376.134,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 99.429.599,00**			**$ 43.428.331,00**		**$ 79.901.319,00**	
	3 CARPINTERIA EN MADERA										
3.1	CABINA WC	UND	6,00	$ 2.612.000,00	$ 15.672.000,00	-4,00	-	$ 10.672.000,00	2,00	$ -	
3.2	PUNTO SANITARIO	UND	5,00	$ 1.868.046,00	$ 9.084.360,00	-3,00	-	$ 3.564.960,00	4,00	$ 6.048.720,00	
3.3	LAVAMANOS	UND	5,00	$ 346.188,00	$ 1.111.752,00	-3,00	-	$ 692.376,00	2,00	$ 1.422.564,00	
3.4	TUBE MANNES WEISS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	6,00	$ 790.000,00	$ 4.686.960,00	8,23	-	$ 6.761.104,00	17,23	$ 11.477.824,00	
3.5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	30,00	$ 113.975,00	$ 3.279.600,00	-30,00	-	$ 3.279.600,00	0,00	$ -	
3.6	DISTRACTOR DE AIRE 220V	UND	5,00	$ 232.975,00	$ 932.975,00	-3,00	-	$ 932.975,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 37.330.975,00**			**$ 26.903.479,00**		**$ 31.149.496,00**	
	11 CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE										
11.1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.498,00	$ 6.357.290,00	0,00	-	$ 6.357.290,00	0,00	$ -	
11.2	PUERTA TIPO 1 MADERA MATAMBUALGA TERMINADO COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	3,00	$ 1.176.900,00	$ 3.353.800,00	-2,00	-	$ 2.353.800,00	0,00	$ -	
11.3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.088.465,00	$ 1.088.465,00	-1,00	-	$ 1.088.465,00	0,00	$ -	
11.4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.328.412,00	$ 2.328.412,00	-1,00	-	$ 2.328.412,00	0,00	$ -	
11.5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.188.350,00	$ 6.373.700,00	-2,00	-	$ 6.373.700,00	0,00	$ -	
11.6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.490,00	$ 1.602.490,00	-1,00	-	$ 1.602.490,00	0,00	$ -	
11.7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.740.088,00	$ 1.740.088,00	-1,00	-	$ 1.740.088,00	0,00	$ -	
11.8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.692.888,00	$ 5.385.776,00	-2,00	-	$ 5.385.776,00	0,00	$ -	
11.9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.618.888,00	$ 1.618.888,00	-1,00	-	$ 1.618.888,00	0,00	$ -	
11.10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD Doble Cocina	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	-1,00	-	$ 2.370.288,00	0,00	$ -	
11.11	VENTANA TIPO CORREDERA (METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.203.832,00	$ 19.222.932,00	-6,00	-	$ 19.222.932,00	0,00	$ -	
11.12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA)	UND	5,00	$ 3.902.000,00	$ 19.688.000,00	-5,00	-	$ 19.688.000,00	0,00	$ -	
11.13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 488.235,00	$ 488.235,00	-1,00	-	$ 488.235,00	0,00	$ -	
11.14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.880,00	$ 342.880,00	-1,00	-	$ 342.880,00	0,00	$ -	
11.15	VENTANA TIPO 4.1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	-3,00	-	$ 775.494,00	0,00	$ -	
11.16	VENTANA TIPO 4.2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	-1,00	$ -	$ 213.180,00	0,00	$ -	
11.17	VENTANA TIPO 4.3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.880,00	$ 342.880,00	-1,00	$ -	$ 342.880,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 61.536.387,00**			**$ -**		**$ -**	

INFORME DE INTERVENTORÍA N.º 2

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD			VALORES MODIFICATORIOS PREVIOS ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		JUSTIFICACIÓN
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
12	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**										
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	-1,44	-	$ 1.618.042,00	5,56	$ 6.247.438,00	
12,2	VEGA ARMASTRE MURO DE CERRAMIENTO	KG	5,40	$ 1.208.566,00	$ 6.665.927,00	-1,40	-	$ 4.683.927,00	0,00	$ -	
12,3	RAMPA EXTERIOR VIA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M2	4,30	$ 1.131.393,00	$ 4.865.367,00	-4,30	-	$ 4.865.367,00	0,00	$ -	
12,4	CORTINAS EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	1,20	$ 1.084.033,00	$ 1.400.198,00	-5,72	-	$ 726.037,00	5,47	$ 673.253,00	
12,5	CAMET A EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.059.306,00	$ 13.790.343,00	-13,13	-	$ 13.790.343,00	0,00	$ -	
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	36,00	$ 34.412,00	$ 1.958.832,00	-36,00	-	$ 1.958.832,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 34.488.016,00			$ 27.577.328,00		$ 6.920.691,00	
13	**ELECTRICO, VOZ Y DATOS**										
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 359.633,00	$ 2.877.064,00	0,00	-	$ -	8,00	$ 2.877.064,00	
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 239.173,00	$ 7.085.190,00	0,00	-	$ -	30,00	$ 7.085.190,00	
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 3No12+1No 12 HFR-(J)	UND	66,00	$ 243.067,00	$ 16.043.742,00	0,00	-	$ -	66,00	$ 16.043.742,00	
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFR-(J)	UND	10,00	$ 207.480,00	$ 2.074.800,00	-8,00	-	$ 1.037.440,00	10,00	$ 2.074.800,00	
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFR-(J)	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 682.137,00	
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFR-(J)	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	0,00	-	$ -	4,00	$ 1.064.556,00	
13,7	Suministro e Instalacion de Salida Lampara de aplique o muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 350.964,00	$ 2.456.727,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 2.456.727,00	
13,8	Suministro e instalacion de Panel Led de 60x60 con de incrustar de 40 W	UND	18,00	$ 433.999,00	$ 6.781.794,00	0,00	-	$ -	18,00	$ 6.781.794,00	
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	-16,00	-	$ 2.049.904,00	38,00	$ 4.868.522,00	
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.999,00	$ 1.415.928,00	0,00	-	$ -	12,00	$ 1.415.928,00	
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble Spot	UND	7,00	$ 176.813,00	$ 1.231.691,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.231.691,00	
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de alumbrado en Cable Cu 3No4+1No6+1No8 T (AWG) por ducto PVC de 1 1/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	48,00	$ 152.280,00	$ 6.491.200,00	30,00	-	$ 2.240.400,00	60,00	$ 8.736.800,00	
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto 3/4C de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 746.139,00	
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CS 274	UND	1,00	$ 1.253.330,00	$ 1.253.330,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.253.330,00	
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 831.863,00	
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 350x350 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 304.125,00	$ 304.125,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 304.125,00	
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 3x30 A	UND	11,00	$ 28.983,00	$ 318.813,00	0,00	-	$ -	11,00	$ 318.813,00	
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 306.607,00	$ 306.607,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 306.607,00	
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 996.100,00	
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 80x80x80 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 390.223,00	
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.422.953,00	
13,22	Suministro e instalación de red y equipo de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.817.600,00	$ 3.817.600,00	-1,00	-	$ 3.817.600,00	0,00	$ -	
13,23	Suministro e instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.107,00	$ 855.535,00	0,00	-	$ -	5,00	$ 855.535,00	
13,24	Suministro e instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 9.515,00	$ 589.930,00	-62,00	-	$ 589.930,00	0,00	$ -	
13,25	Suministro e instalación de bandeja canaleta 35x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	-2,00	-	$ 237.954,00	0,00	$ -	
13,26	Suministro e instalación de tuberia EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 35.743,00	$ 2.216.366,00	0,00	-	$ -	62,00	$ 2.216.366,00	
				SUBTOTAL	$ 68.410.534,00			$ 4.621.730,00		$ 63.888.756,00	
14	**OTROS ITEMS**										
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	6,00	$ 631.325,00	$ 4.882.609,00	6,00	-	$ 4.882.609,00	0,00	$ -	
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	25,48	$ 175.997,00	$ 4.307.427,00	-24,48	-	$ 4.307.427,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 9.190.037,00			$ 9.190.037,00		$ -	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES INDEXADOS CORTE PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES INDEXADAS		ABREVIACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
15 OTROS NO PREVISTOS											
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	23,60	$ 783.645,00	$ 18.700.110,00	23,60	$ 18.700.110,00	
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	12,00	$ 708.095,00	$ 8.473.140,00	12,00	$ 8.473.140,00	
15,3	CUBIERTA TEJA CANGARIC, INCLUYE REDILLA PLASTICA, PAGADA POR M2	ML			$ -	34,00	$ 638.145,00	$ 21.696.760,00	34,00	$ 21.696.760,00	
15,4	TRASNPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE KON KO	M3/KM			$ -	27947,75	$ 1.950,00	$ 54.498.131,00	27947,75	$ 54.498.131,00	
15,5	VIGA CIMEN EN CONCRETO DE 3000 PSI 20X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ -	163,30	$ 99.420,00	$ 16.530.276,00	163,30	$ 16.530.276,00	
15,6	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	KG			$ -	2113,05	$ 17.700,00	$ 37.411.185,00	2113,05	$ 37.411.185,00	
15,7	PUNTA HIERRO EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUE ELEVADO	M3			$ -	37,50	$ 296.322,00	$ 11.187.000,00	37,50	$ 11.187.000,00	
15,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UNI			$ -	1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00	1,00	$ 350.250,00	
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICO DESARROLLO <20<=60 CM	ML			$ -	33,00	$ 171.660,00	$ 5.147.275,00	33,00	$ 5.147.275,00	
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML			$ -	91,70	$ 20.396,00	$ 1.867.582,00	91,70	$ 1.867.582,00	
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3			$ -	12,97	$ 694.000,00	$ 9.001.180,00	12,97	$ 9.001.180,00	
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 40 WAVPORT	ML			$ -	19,27	$ 72.839,00	$ 1.403.897,00	19,27	$ 1.403.897,00	
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL EN ACERO INOXIDABLE	M2			$ -	20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00	20,00	$ 16.640.000,00	
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSEGURIDAD DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML			$ -	66,30	$ 394.545,00	$ 26.161.648,00	66,30	$ 26.161.648,00	
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TONM			$ -	11376,15	$ 3.606,00	$ 48.338.955,00	11376,15	$ 48.338.955,00	
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UNI			$ -	1,00	##########	$ 13.424.500,00	1,00	$ 13.424.500,00	
15,17	CONCRETO PC 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML			$ -	183,00	$ 71.401,00	$ 13.070.062,00	183,00	$ 13.070.062,00	
15,18	CAPRICHO DE PISO E= 5 CM	M2			$ -	944,00	$ 98.650,00	$ 27.662.208,00	944,00	$ 27.662.208,00	
				SUBTOTAL	$ -			$ 324.379.207,00		$ 324.379.207,00	
	COSTO DIRECTO DE OBRA (a)				$ 1.138.018.103,00			$ 33.265.483,00		$ 1.138.018.103,00	
	ADMINISTRACION	25%			$ 284.729.348,00		ADMINISTRACION	25%		$ 284.729.348,00	
	IMPREVISTOS	1%			$ 11.380.182,00		IMPREVISTOS	1%		$ 11.380.182,00	
	UTILIDAD	4%			$ 45.536.728,00		UTILIDAD	4%		$ 45.536.728,00	
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 1.480.664.361,00		COSTO TOTAL DE LA OBRA INDEXADO			$ 1.480.664.361,00	

13. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas. Comité de obra

FECHA	LUGAR	TEMA	OBJETO DE LA REUNIÓN	COMPROMISOS
Comité N.4 08/03/2024	Montañita – Caquetá	Avance de obra y recomendaciones sobre métodos constructivos	• Recomendaciones sobre método constructivos • Lineamientos técnicos para la construcción de elementos estructurales.	• Entrega de resultados de resistencia a la compresión de cimentación (zapatas) • Realización de ensayos de resistencia para elementos estructurales (vigas y columnas)
Comité N.5 27/03/2024	Montañita – Caquetá	Avance de obra y lineamientos técnicos para rellenos y aspectos de seguridad en el trabajo	• Dar a conocer Avance de obra • Observaciones de la importancia de los rellenos y su debida compactación en la cimentación • Solicitar al contratista la debida implementación de sistema de prevención de accidentes y utilización de elementos de protección personal en obra.	• Verificar los rellenos y su debida compactación para proporcionar apoyo y estabilidad (aislamiento de cimientos) • Capacitaciones en campo sobre peligro, riesgos, acto, condición, incidente y accidentes • Verificación y supervisión constante sobre el uso de los elementos de protección personal

13.1.RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

comité n.	fecha del comité	Entidades asistentes al comité	Objetivo del comité
1	08/03/2024	• SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS • DICO&S SAS • ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTAÑITA	14. Recomendaciones sobre método constructivos 15. Lineamientos técnicos para la construcción de elementos estructurales.
2	27/03/2024	• SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS • DICO&S SAS • ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTAÑITA	16. Dar a conocer Avance de obra 17. Observaciones de la importancia de los rellenos y su debida compactación en la cimentación 18. Solicitar al contratista la debida implementación de sistema de prevención de accidentes y utilización de elementos de protección personal en obra.

14. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

El presente informe muestra la revisión de las actividades realizadas por el contratista en el periodo de tiempo del 02 de marzo al 01 de abril de 2024.

ANEXO 15. *Informe de obra*

15. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

15.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
05/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CUADRILLA ORDEN Y ASEO
08/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR-10

11/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
14/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS
29/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	SOLICITUD DE SOPORTE DE PAGOS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

15.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
06/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	CONFORMACION DE CUADRILLA DE ORDEN Y ASEO
12/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR-10
13/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	ATENCION A RECOMENDACIONES SOBRE EPP
15/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

ANEXO 9. *Copia de la correspondencia enviada y recibida*

16. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista de interventoría realiza visitas de obra en donde se evidencia el avance de las actividades del proyecto. Se realiza la observación del personal de obra que NO se acredita el pago de seguridad social para el mes de marzo.

Se recuerda al contratista el debido cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes para la construcción de columnas según la norma sismo resistente NSR-10.

Se verifica que se cumpla con la calidad de las actividades ejecutadas. Se solicita la elaboración de ensayos de laboratorio, control de calidad de los materiales a partir de lo establecido en las especificaciones técnicas. A la fecha se han avanzado en actividades de cimentación de la estructura (concreto estructural y ciclópeo), acero de columnas, rellenos, y finalmente se da inicio a la instalación de lámina en metaldeck para la construcción de

1285

la placa en metaldeck con malla electrosoldada, para esta actividad es necesario instalar una perfilaria metálica (ítem no previsto). Se deben tener en cuenta los diseños de mezclas y según la topografía respetar las diferentes alturas de las columnas para así mismo realizar la fundición de estas.

17. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista de interventoría realiza el desarrollo de informes semanales en donde se muestra el avance obra. Se recomienda al contratista la elaboración de ensayos de resistencia a la compresión del concreto utilizado para zapatas, columnas y vigas (21 Mpa). Por otro lado, se hace énfasis en el control de la ejecución del proyecto, control de los métodos constructivos, controles topográficos de las secciones, localización y nivelación de los elementos estructurales. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir los elementos estructurales de las actividades desarrolladas.

Se recomienda subsanar los pagos de seguridad social del personal de obra que no se acredita para el periodo ejecutado (febrero-marzo).

Secuencia de los informes semanales

N. de informe semanal	Periodo de informe	N. de informe de interventoría
1	04/03/2024 - 10/03/2024	1
2	11/03/2024 - 17/03/2024	
3	18/03/2024 - 24/03/2024	
4	25/03/2024 - 31/03/2024	

ANEXO 6. *Informes Semanales (Marzo)*

18. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	225-CMAB-2023.
Objeto:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

Nombre del contratista:	CONSTRUCTORA DICO&S SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($162.035.160) – CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
Valor Anticipado:	N.A
Fecha de iniciación:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024
Prorroga	N. A
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha de Terminación Contractual Actual:	01 E AGOSTO DE 2024

18.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 02 de febrero de 2024 hasta el 01 de abril de 2024.

18.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

18.3. INFORMACIÓN FINANCIERA

CONSTRUCTORA DICO&S SAS

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1.	2.	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CDF	OTROS

ATENCION INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN						$ 1.480.734.968				
TOTALES						$ 1.480.734.968				

18.4. RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoria.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					

18.5. BALANCE DEL ANTICIPO

El contrato no tiene anticipo, el pago se realizará por medio de avance de obra.

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

18.6. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

Aclaratorio o Modificatorio No. 1	
Descripción	
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	
Descripción	

18.7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato de interventoría fueron expedidas por la compañía "SEGUROS DEL ESTADO S.A."

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA 61-46-101024405– ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	15/12/2023	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	15/12/2023	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725.31
Calidad del servicio	61-46-101024405	15/12/2023	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

Fueron expedidas el 16 de diciembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA 61-46-101024405 – ANEXO 1

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	15/12/2023	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	15/12/2023	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725.31
Calidad del servicio	61-46-101024405	15/12/2023	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL, ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

1289

Fueron expedidas el 12 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Con vigencia desde el 15/12/2023 al 15/12/2028.

Actualización de la póliza de garantía única de cumplimiento de interventoria

PÓLIZA 61-46-101024405 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	02/02/2024	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	02/02/2024	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725
Calidad del servicio	61-46-101024405	02/02/2024	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL, ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

Fueron expedidas el 12 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/08/2029.

ANEXO 16. *SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA*

18.8. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA	02 DE FEBRERO DE 2024	01 DE AGOTO DE 2024
CONSTRUCTORA DICO&S SAS	02 DE FEBRERO DE 2024	01 E AGOTO DE 2024

18.9. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Se relaciona en el siguiente cuadro el personal de interventoria:

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL
1	Director de Interventoria	Ingeniero Civil	Marla Alessandra Dávila	25202-175965 CND
2	Residente de Interventoria	Ingeniero Civil	Fabio Hernán Fiesco Gorrón	25202-347150 CND
3	Topógrafo	Topógrafo	Cristian Andrés Sendoya	01-19130

ANEXO 13. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 14. CONTROL DEL LLUVIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
ANEXO 11. INFORME DE OBRA
ANEXO 10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES-ENSAYOS DE RESISTENCIA

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal de CONSTRUCTORAS DICO&S SAS, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra N.º 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita Caquetá

CERTIFICO:

Que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S como CONTRATISTA de las referidas obras, no ha suministrado a la interventoría las planillas de pago del mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril, se entrega de manera parcial las planillas de pago del mes de febrero.

- SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S – FEBRERO DE 2024.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	PENSION	SALUD	RIESGOS
2	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	9465546700	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500
3	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	9463815334	$ 416.000	$ 325.000	$ 13.600
6	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	29151922	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700
7	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUERIEL	1.018.410.974	75193758	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700

- SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S – MARZO DE 2024.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	PENSION	SALUD	RIESGOS
1	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita			

1392

2	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita			
3	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUERIEL	1.018.410.974	No acredita			

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

1. CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Yo, CARLOS DARÍO CANO SANCHEZ, como representante Legal Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra N.º 225-CMAB-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente entre el 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante Pre acta No.02 (Corte de Obra 2) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

1044

1. CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Yo, CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, como representante Legal de Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra N.° 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

- Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante Preacta No.02 (Corte de Obra 2) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.
- Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS ha construido el campamento y/o adecuando instalaciones para almacenar los materiales, insumos en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, se puede asegurar la existencia de estos y que están de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones del contrato y las aplicables al proyecto.
- Se tiene EVIDENCIA que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS ha suministrado el equipo en el sitio de la obra en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, se puede asegurar que son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

1295

LISTADO DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO 1- INFORME FINANCIERO DE OBRA
ANEXO 2- REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 3- CONTROL DIARIO DEL EQUIPO
ANEXO 4- COPIA DE LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 5- SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSIÓN
ANEXO 6- INFORMES SEMANALES
ANEXO 7- PRE ACTA DE OBRA No 002 (CORTE DE OBRA)
ANEXO 8- CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA
ANEXO 9- COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 10- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES – ENSAYOS DE RESISTENCIA
ANEXO 11-EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA
ANEXO 12 – FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DE OBRA
ANEXO 13 - CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 14 - CONTROL DE LLUVIAS EN EL AREA DEL PROYECTO
ANEXO 15- INFORME DE OBRA
ANEXO 16- SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DE INTERVENTORIA
ANEXO 17- INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

1096

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA ANEXO 4 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO

Inicio: 2-mar-24 Fin: 2-abr-24

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA

CONTRATO No: 212-LICP-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORAZOMAC SAS

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
							$1.480.593.601		$1.480.593.601,00	No se ha registado cobros
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.480.593.601	$ -	$ 1.480.593.601	

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de Interventoria DICO&S SAS

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	INTERVENTORIA TÉCNICA VEREDA MATEGUADUA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ **ANEXO - REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2
		PAGINA	1 DE 11

PERIODO 02/03/2024 A 31/04/2024

OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"**

FECHA: 31/03/2024

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

INTERVENTOR: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME No.2

3.3 CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE





3.4 ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE





3.5 CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm





4.1 CONCRETO FC 21 MPA COLUMNAS





4.2 CONCRETO FC 21 MPA VIGAS

2.3 PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA

1800




2.3	PERFILES METALICOS PARA PLACA DE CONTRAPISO







8.3 - 8.4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" y 4", INCLUYE ACCESORIOS




Firma
Nombre CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoria
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1882

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

ANEXO 8 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

CÓDIGO				
VERSIÓN	1			
PAGINA	1			DE

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA" CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

CONTRATO No.: 225-CMAB-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

PERIODO — Inicio: 2-mar-24 Fin: 1-abr-24

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

DIA / MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	SAB 1	DOM 2	LUN 3	MAR 4	MIE 5	JUE 6	VIE 7	SAB 8	DOM 9	LUN 10	MAR 11	MIE 12	JUE 13	VIE 14	SAB 15	DOM 16	LUN 17	MAR 18	MIE 19	JUE 20	VIE 21	SAB 22	DOM 23	LUN 24	MAR 25	MIE 26	JUE 27	VIE 28	SAB 29	DOM 30	LUN 31
ESTACION TOTAL	GOWIN	TKS-202	-	A		I	A	I	A	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I			
NIVEL TOPOGRÁFICO	TOPCON	AT-B4	-	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA	FORD SAAB51	1987	7.000 Kg/PSI	A		I	A	I	A	I	I		A	A	A	I	I	A		A	I	A	A	I	I		A	A	I	A	I	A	
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX	-	450 L	A		A	A	I	I	I	A		A	I	A	I	I	A		A	I	A	I	A	I		A	I	A	I	A	A	
								A							A							I							A				

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de Interventoria

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

ANEXO 4. COPIA DE LA PLANILLAS DE SS DEL PERSONAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

aportes en línea

Planilla Resumen

1804

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	Cra 4 15-06	FLORENCIA-CAQUETA	3038955153	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510905516	94643281191	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aportes	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBREROS SINERGIA 2022 (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
Centro de Trabajo: OBRAS RIESGO V (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
1	CC	1122719699	BAEZ JHONATAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
1	CC	1117544116	BERNATE EDWIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
1	CC	1118884178	CHACON JESSE	23030 1	1	$43,334	$7,000	SP0085	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
4	CC	1118314582	CORDOBA ELKYN	X	24	$1,040,000	$166,400	SP0042	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
5	CC	1117548115	CUELLAR BRAYAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
6	CC	17683813	CURREO ISRAEL	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
7	CC	1006304546	FISCO STIVEN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
8	CC	1075210670	FRAOCA JUAN	X	1	$43,334	$7,000	SP0042	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
9	CC	1117562104	GOMEZ EDINSON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
10	CC	1117513887	GONZALES GUILLERMO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
11	CC	1118854454	GUZMAN ALEXANDER	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
12	CC	1117549138	HOLGUIN YULIAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
13	CC	1117510888	LLANOS ISMAEL	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
14	CC	1006208316	MARTINEZ DARIO	X	9	$390,000	$62,400	SP0037	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
15	CC	1006507486	MENDEZ ALEXIS	X	9	$390,000	$62,400	SP0042	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
16	CC	1006510839	OSPINA ALEXANDER	X	1	$43,334	$7,000	SP0037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
17	CC	1117005738	OYOLA JUAN	X	1	$43,334	$7,000	SP0037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
18	CC	1006116951	PEREZ SEBASTIAN	X	24	$1,040,000	$166,400	SP0042	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
19	CC	1006108869	QUIACHA HERNANDO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
20	CC	1006511638	ROMAYO CARLOS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
21	CC	1006113462	ROJAS JAROL	X	9	$390,000	$62,400	SP0042	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
22	CC	1007620298	TRUJILLO MAR	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
23	CC	1116203171	TRUJILLO JHON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
Total Afiliados(23)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200

2024/03/13 05:11 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901383654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	CRA 4 15-06	FLORENCIA-CAQUETA	3103853153	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510903515	84642812?1	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$3,460,000	$0	$0	$3,460,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,120,200	$0	$0	$3,120,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$277,400	$0	$0	$277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	23	$865,200	$0	$0	$865,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	$324,200	$0	$0	$324,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$209,800	$0	$0	$209,800
TOTAL				23	$6,696,200	$0	$0	$6,696,200

aportes en línea

Planilla Resumen

1806

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	TV 76 Q 3 A 106 SUR BARRIO EL CHAMIZO	FLORENCIA-CAQUETA	3203859133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	45868851	9463513361	E	2024/03/13	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$999,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Vsp	vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	vct	Irl	Vip							Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1117543132	CASTRILLON RICHARD																	23160	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$650,500
2	CC	36180691	PEREZ CARLOS																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$194,500
3	CC	1117501194	TRUJILLO DERLY																	23160	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$650,500
Total			Afiliados(3)																			$2,600,000	$416,000			$1,950,000	$156,000			$3,900,000	$234,000			$3,900,000	$1,171,500		$0	$0		$1,495,500

2024/03/04 11:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1807

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901280654	8	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	TV 16 G 3 A 106 SUR BARRIO EL CHAMIZO	FLORENCIA-CAQUETA	3102805153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	488688539	94635113[illegible]	E	2024/03/13	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	999,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$0	$0	$271,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$271,500	$0	$0	$271,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				3	$999,500	$0	$0	$999,500

1808

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29151922
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1110535942	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRRSPONDENCIA	AVENIDA COLOMBIA 726	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	EL DONCELLO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	HANDTRU@GMAIL.COM	TELÉFONO	3185639021
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29151922

1809

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110535942	59	No	No	No	18	247	3711001	Salario	TRUJILLO RAMIREZ HOOVER ANDRES	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110535942	X	2024-06-21																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110535942	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut SG	Valor SG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110535942	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90065228 3	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110535942	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

1810

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$31.700	0	$0	$0	$31.700	0	$0	$31.700	0	$0	$0	$31.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$31.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$402.200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018410674	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUÑOZ	TV 50 No 80B 44 SUR	7156430	gallego074@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CAQUETÁ	FLORENCIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75193758	$402.208	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1016410874	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL		TV 16 No 99B 44 SUR	7189430	gallegod74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75100758	$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario Integral	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Retiro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016410874	GALLEGO MURIEL DIEGO ARMANDO	39	X																	28/30	1.300.800	156.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.800	182.100	14-01	1.300.800	1	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

1824

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1255[illegible]		[illegible] ROMERO ALEX RAMUNDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 No. 11 - 14	FLORENCIA-CAQUETA	4352859	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	9463815334	9463815334	I	2024/03/19	2024/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1255[illegible]	[illegible] ALEX																		25-14	30	$2,400,000	$454,000	EPS037	30	$2,400,000	$325,800		0	50	10	14-23	30	$2,400,000	$13,600	0	50	50	No	$754,600
Total	Afiliados(1)																						$2,400,000	$454,000			$2,400,000	$325,800			50	10			$2,400,000	$13,600		50	50		$754,600

2024/07/08 09:02 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1825

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1225[illegible]81		MOISES ROMERO ALEX RAMUNDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 No. 12 - 14	FLORENCIA-CAQUETA	4352899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	946381[illegible]334	946381[illegible]334	I	2024/03/19	2024/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

2024/07/08 09:02 AM


ANEXO 5. SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

FECHA	CRONOGRAMA -SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N. 1	
FEBRERO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	

CR

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	MES 1 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES 2 SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
1	PRELIMINARES	$ 15.681.840	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67		$ 1.680.268,00					
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS	$ 93.488.795		$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 6.080.759 $ 3.460.116,67	$ 6.080.759 $ 3.460.116,67	$ 3.460.116,67			
3	CIMENTACIÓN	$ 142.424.698				$ 17.800.080 $ 14.410.462,50	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080	$ 17.800.080
4	ESTRUCTURA	$ 209.484.733					$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00		
5	CUBIERTA Y CIELO RASO	$ 58.185.271										
6	MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS	$ 107.420.595										
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 8.426.363										
8	SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 18.355.113										
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES	$ 74.061.329										
10	APARATOS SANITARIOS	$ 23.149.486										
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABL	$ -										
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 6.930.681										
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS	$ 58.988.793										
14	OTROS ITEMS	$ -										
15	ITEMS NO PREVISTOS	$ 316.279.257				$ 46.514.907		$ 10.904.109,09				
	COSTO DIRECTO	$ 1.138.819.663,00										
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL		$ 4.618.513,33	$ 10.710.271,34	$ 10.710.271,33	$ 64.427.745,83	$ 29.900.838,50	$ 29.900.838,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL		$ 3.021.078,67	$ 8.431.843,67	$ 22.442.305,17	$ 59.411.206,50	$ 34.479.188,17	$ 40.011.065,17	$ 32.508.600,17	$ 30.644.715,50	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		$ 3.021.078,67	$ 11.542.921,34	$ 33.975.226,50	$ 93.886.433,00	$ 97.330.642,17	$ 137.370.731,33	$ 169.877.621,50	$ 200.534.395,00	$ 200.534.395,00	$ 200.534.395,00

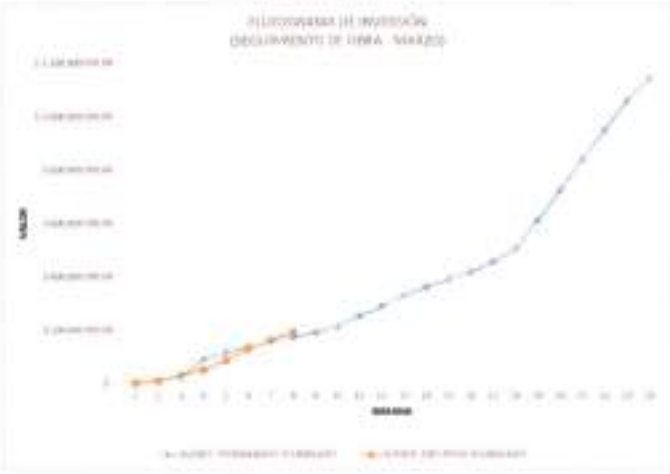

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.810.513,33	0,43%	$ 3.021.378,87	0,266%	$ 4.810.513,33	0,465%	$ 3.021.378,87	0,266%
2	$ 10.711.272,33	0,94%	$ 9.021.843,87	0,794%	$ 10.380.786,67	1,345%	$ 11.043.021,33	0,977%
3	$ 10.713.272,33	0,94%	$ 22.432.305,17	1,973%	$ 20.031.058,00	2,280%	$ 33.475.326,50	2,939%
4	$ 64.437.745,50	5,66%	$ 19.411.225,50	1,704%	$ 90.468.803,50	7,943%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 33.902.938,50	2,12%	$ 34.473.196,17	3,027%	$ 114.371.842,13	10,042%	$ 87.359.542,17	7,670%
6	$ 23.902.938,50	2,12%	$ 43.011.089,17	3,772%	$ 138.274.480,63	12,141%	$ 130.370.731,33	11,447%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 32.506.890,17	2,854%	$ 156.077.560,13	13,704%	$ 162.877.621,50	14,301%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 30.046.773,50	2,638%	$ 173.880.639,63	15,267%	$ 192.924.395,00	16,939%
9	$ 17.803.079,50	1,56%	$ -	0,000%	$ 191.683.719,13	16,830%	$ 192.924.395,00	16,939%
10	$ 17.803.079,50	1,56%	$ -	0,000%	$ 209.486.798,63	18,394%	$ 192.924.395,00	16,939%
11	$ 44.751.552,80	3,93%	$ -	0,000%	$ 254.238.351,43	22,323%	$ 192.924.395,00	16,939%
12	$ 35.374.836,30	3,11%	$ -	0,000%	$ 289.613.187,73	25,433%	$ 192.924.395,00	16,939%
13	$ 35.291.029,30	3,11%	$ -	0,000%	$ 325.004.217,03	28,544%	$ 192.924.395,00	16,939%
14	$ 56.291.028,20	3,11%	$ -	0,000%	$ 381.195.245,33	31,780%	$ 192.924.395,00	16,939%
15	$ 26.948.473,30	2,37%	$ -	0,000%	$ 388.683.719,63	34,125%	$ 192.924.395,00	16,939%
16	$ 26.948.473,30	2,37%	$ -	0,000%	$ 415.612.192,93	36,492%	$ 192.924.395,00	16,939%
17	$ 41.518.791,05	3,65%	$ -	0,000%	$ 457.131.483,98	40,157%	$ 192.924.395,00	16,939%
18	$ 45.826.888,05	3,85%	$ -	0,000%	$ 500.958.872,03	43,989%	$ 192.924.395,00	16,939%
19	$ 111.216.933,93	9,77%	$ -	0,000%	$ 612.175.805,95	53,751%	$ 192.924.395,00	16,939%
20	$ 111.216.933,93	9,77%	$ -	0,000%	$ 723.392.539,88	63,516%	$ 192.924.395,00	16,939%
21	$ 113.399.855,04	9,96%	$ -	0,000%	$ 836.779.140,42	73,471%	$ 192.924.395,00	16,939%
22	$ 113.399.855,04	9,96%	$ -	0,000%	$ 950.190.040,96	83,427%	$ 192.924.395,00	16,939%
23	$ 137.591.107,79	9,45%	$ -	0,000%	$ 1.087.847.148,75	92,882%	$ 192.924.395,00	16,939%
24	$ 81.359.814,25	7,12%	$ -	0,000%	$ 1.138.916.963,00	100,000%	$ 192.924.395,00	16,939%
	$ 1.138.916.963,00	100%						

1819

:ONOGRAMA DE OBRA

SINERGIA

MES 4						MES 5				MES 6				
SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25
$ 37.803.080														
$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473					
						$ 14.571.318	$ 14.571.318	$ 14.571.318	$ 14.571.318					
								$ 26.955.239	$ 26.955.239	$ 26.955.239	$ 26.955.239			
	$ 9.429.303													
		$ 5.162.556	$ 5.162.556											
										$ 35.867.106	$ 35.867.106	$ 35.867.106		
												$ 31.245.496		
							$ 2.356.807	$ 2.356.807	$ 2.356.807					
										$ 21.329.349	$ 21.329.349	$ 21.329.349		
								$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 51.269.815	$ 40.594.907
														$ 40.594.907,13
$ 44.791.552,80	$ 95.374.690,38	$ 36.051.029,80	$ 36.051.029,80	$ 35.848.473,30	$ 35.848.473,30	$ 43.525.791,05	$ 43.525.688,05	$ 111.210.883,69	$ 111.210.883,69	$ 119.986.890,54	$ 119.986.890,54	$ 107.681.187,79	$ 91.069.814,35	$ 65.594.907,13
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.831.096,29
$ 181.924.385,00	$ 181.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 183.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 65.891.230,57

ING. RICHARD EDINSON CASTELLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

ING. CARLOS CAMILO CANO SÁNCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICOSS S.A.S.

1820

ANEXO 6. INFORMES SEMANALES

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1821

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 4/03/2024 AL: 10/03/2024 FECHA DEL INFORME: 11/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. 225-CMAB DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL:	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		3 PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	365 MESES (6)	
PLAZO ACTUAL:	365 MESES (6)	
CONTRAO DE OBRA	212-LICP	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:		1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL		0
FECHA DE PRORROGA:		
FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
FECHA DE REINICIO:	NA	NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:		1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	En ejecucion	7,67%

EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

- [x] CIMENTACION ____ m3
- [ ] ESTRUCTURA ____ m3
- [ ] CUBIERTA Y CIELO RASO ____ m2
- [ ] MAMPOSTERIA ____ m2
- [ ] RED HIDRAULICA ____ ml
- [ ] RED SANITARIA ____ ml
- [x] OTRO. CUAL? ____ UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN


INTERVENTORIA	OBRA
PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	POA CAQUETA
	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA
ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE	
ACTAS COBRADAS $ 0	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE
0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Reiasa de Suspension, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.992.063,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

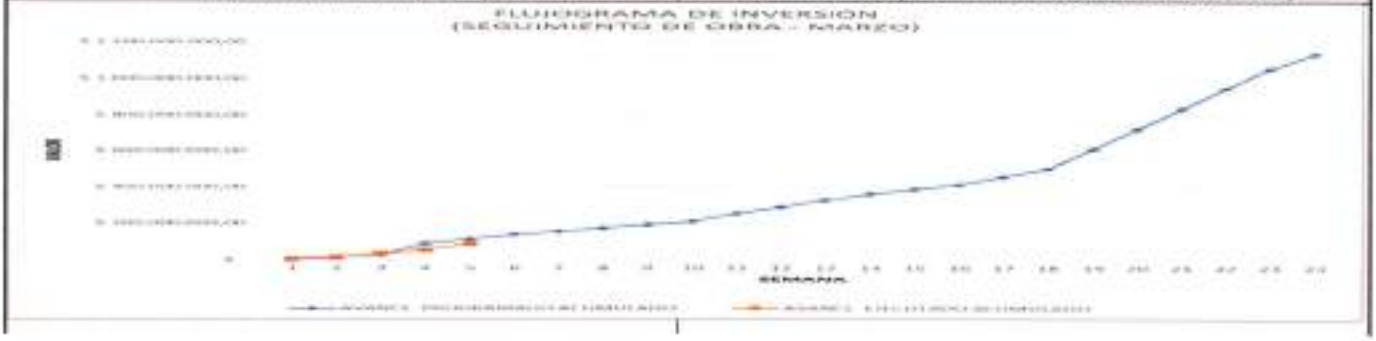

1822

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICON S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

GRAFICO DE AVANCE				GRAFICO DE AVANCE			
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REv POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**SOCIALIZACION**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VALLA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	20,83%	PLAZO FALTANTE:	79,17%	% PROGRAMACION OBRA	10,04%	% OBRA EJECUTADA	7,67%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	20,83%	PLAZO FALTANTE:	79,17%	% PROGRAMACION OBRA	10,04%	% OBRA EJECUTADA	7,67%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se recomienda uso adecuado de elementos de proteccion personal. Debido a las fuertes lluvias se dificultan accesos para entrada de material con volqueta.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE: SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHÍAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACION? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,1	Localizacion y replanteo de redes
2,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1823

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICOR S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 11/03/2024 AL 17/03/2024 FECHA DEL INFORME 18/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA):	No. 225-CMAB DE 2023				PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DICOR S.A.S				PLAZO ACTUAL:	SEIS MESES (6)	
REP. LEGAL:	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ				CONTRAO DE OBRA	212-UCP	FECHA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"				FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
					FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :		2/02/2024
					FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :		1/06/2024
					TIEMPO ADICIONAL		0
VALOR INICIAL :	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -	FECHA DE PRORROGA:		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -	FECHA DE REINICIO:	NA	NA
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -			
		3 PARCIALES	0%	$ -	FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :		1/06/2024
FORMA DE PAGO:	CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA				ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	En ejecucion	11,65%
						EN EJECUCION	

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA	OBRA
METAS FISICAS ACTUALIZADA:	PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
☑ ORIENTACION ____ m3		
ESTRUCTURA ____ m3		
☐ CUBIERTA Y CIELO RASO ____ m2		POA CAQUETA
☐ MAMPOSTERIA ____ m2		
☐ RED HIDRAULICA ____ ml	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA
☐ RED SANITARIA ____ ml		
☑ OTRO, CUAL? ____ UN	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE
	ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN	0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACIÓN				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):



1824

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA RUDAS S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**VEEDURIA CIUDADANA**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	25,00%	PLAZO FALTANTE:	75,00%	% PROGRAMACION OBRA	12,14%	% OBRA EJECUTADA	22,45%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	25,00%	PLAZO FALTANTE:	75,00%	% PROGRAMACION OBRA	12,14%	% OBRA EJECUTADA	22,45%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se verifica que el acero de columnas (castillos) esten aplomados y alineados según los diseños definitivos y el levantamiento topografico resultado de la localizacion y replanteo del proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,2	Excavación para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE

FIRMA

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1825

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 18/03/2024 AL 24/03/2024 FECHA DEL INFORME 25/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. 225-CMA8 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL :	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$	-
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		3 PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: SEIS MESES (6)
PLAZO ACTUAL: SEIS MESES (6)
CONTRAT DE OBRA 212-UCP FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO: 1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL 0
FECHA DE PRORROGA:
FECHA DE SUSPENSION: NA NA
FECHA DE REINICIO: NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO: 1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: En ejecucion 14,80%
EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☑	CIMENTACION	m3
	ESTRUCTURA	m3
☑	CUBIERTA Y CIELO RASO	m2
☐	MAMPOSTERIA	m2
☐	RED HIDRAULICA	ml
☐	RED SANITARIA	ml
☑	OTRO. CUAL?	UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN

INTERVENTORIA

PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA

	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$ 0	

0

OBRA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

POA CAQUETA

RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA

	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$	0,00%

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)

CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA)



1826

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VEEDURIA CIUDADANA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	29,17%	PLAZO FALTANTE:	70,83%	% PROGRAMACION OBRA	13,70%	% OBRA EJECUTADA	14,30%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	29,17%	PLAZO FALTANTE:	70,83%	% PROGRAMACION OBRA	13,70%	% OBRA EJECUTADA	14,30%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se realizan visitas tecnicas de obra por parte de la interventoria y el contratista. Se recomienda mejorar el acopio de materiales en obra y tener en cuenta los estados del clima para los diseños de mezclas

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE	SI ☑	NO ☐	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO?	SI ☑	NO ☐
CUALES? :			PORQUE?		
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS:	SI ☑	NO ☐	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑	VALOR?	$ 0
CAUSALES?: RELOCALIZACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES			EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN?	SI ☑	NO ☐
			PORQUE?		

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
3,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPa ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL:

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1827

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DIOD&S S.A.S	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 25/03/2024 AL 31/03/2024 FECHA DEL INFORME 1/04/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No 225-CMAB DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIOD&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL:	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		# PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)	
PLAZO ACTUAL:	SEIS MESES (6)	
CONTRAT DE OBRA	212-UCP	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :		2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :		1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL		0
FECHA DE PRORROGA:		
FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
FECHA DE REINICIO:	NA	NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :		1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	En ejecucion	16,58%

EN EJECUCIÓN

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

	OMENTACION	ML
	ESTRUCTURA	m3
☑	CUBIERTA Y CIELO RASO	m2
☐	MAMPOSTERIA	m2
☐	RED HIDRAULICA	m2
☐	RED SANITARIA	ml
☑	OTRO. CUAL?	ml
		UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN


INTERVENTORIA			OBRA		
PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"			PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA		
RUBRO:	FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA		PDA CAQUETA		
			RUBRO:	FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	
	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE		ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$ 0		ACTAS COBRADAS	$	0,00%
	0				

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

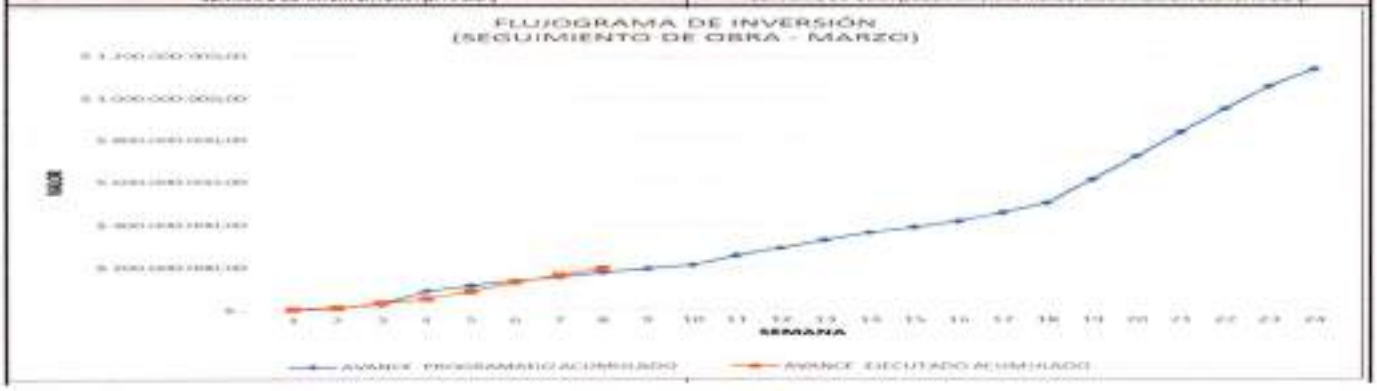

1828

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA OCBA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**VEEDURIA CIUDADANA**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
			VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA							
% AVANCE EN PLAZO:	33,33%	PLAZO FALTANTE:	66,67%	% PROGRAMACION OBRA	15,27%	% OBRA EJECUTADA	16,94%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	33,33%	PLAZO FALTANTE:	66,67%	% PROGRAMACION OBRA	15,27%	% OBRA EJECUTADA	16,94%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se realizan recomendaciones para el amarre de acero longitudinal (traslapos) y transversal (separacion de flejes) para columnas y vigas de amarre. Por otro lado se realizan labores de compactacion de rellenos para nivelar el terreno. Tambien se recalca en los traslapos de malla electrosoldada para la placa

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60 000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60 000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1829

ANEXO 7. PREACTA DE OBRA No.02 (CORTE DE OBRA)

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1220

CONTROL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - MARZO

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**														
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.546,00	$ 6.372.900,00	1425,00		$ 3.632.325,00	853,60	$ 1.898.336,00	771,40	$ 1.966.299,00	1.625,00	54,13%	100,00%
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	220,00	$ 13.995,00	$ 3.111.965,00	223,00		$ 3.111.965,00	126,00	$ 1.758.330,00			126,00		56,50%
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.963.000,00	$ 5.963.000,00	1,00		$ 5.963.000,00	1,00	$ 5.963.000,00			1,00		100,00%
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.216,00	$ 3.025.000,00	1425,00		$ 1.734.200,30	226,00	$ 275.880,00			226,00		15,80%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**														
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1.352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1425,00		$ 5.686.800,00	853,60	$ 2.809.171,00	771,40	$ 3.079.425,00	1.425,00	54,13%	100,00%
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	99,11	$ 48.895,00	$ 4.802.679,00	190,15		$ 9.009.995,30	155,75	$ 7.298.762,00	12,75	$ 597.338,00	168,54	6,70%	88,83%
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	88,06	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74		$ 15.901.166,80	19,78	$ 5.094.359,00	14,36	$ 3.703.583,00	34,16	23,29%	55,33%
3	**CIMENTACIÓN**														
3,1	CONCRETO FC 21 MPA ZAPATAS	M3	47,05	$ 1.011.313,00	$ 48.087.761,00	32,95	$ 1.195.890,00	$ 39.412.716,30	4,50	$ 4.672.908,00	22,50	$ 24.084.525,00	27,00	68,29%	81,94%
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3.754,00	$ 9.913,00	$ 37.208.070,00	2.593,95		$ 35.587.845,00	2348,62	$ 23.255.004,00	166,99	$ 1.654.671,00	2.515,61	6,23%	93,60%
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,68	$ 1.011.315,00	$ 29.018.327,00	27,36	$ 1.362.890,00	$ 37.273.948,00			27,14	$ 36.987.749,00	27,14	99,23%	99,23%
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1.928,42	$ 9.913,00	$ 19.113.630,00	4086,27		$ 40.296.736,00			454,75	$ 4.506.573,00	454,75	11,18%	11,18%
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M2	39,43	$ 494.190,00	$ 14.543.479,00	3,73		$ 1.843.291,00	1,20	$ 593.010,00	1,68	$ 790.326,00	2,89	39,89%	72,12%
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.063.460,00	$ 61.800.000,00	0,00									
4	**ESTRUCTURA**														
4,1	CONCRETO FC 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	$ 1.394.465,00	$ 23.064.451,00			4,61	$ 6.429.464,00	4,61	27,87%	27,87%
4,2	CONCRETO FC 21 MPA VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.100,00	$ 35.345.930,00	23,35	$ 1.412.225,00	$ 32.975.337,00							0,00%
4,3	CONCRETO FC 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.036.505,00	$ 27.520.865,00	73,78	$ 1.085.745,00	$ 80.139.266,00							0,00%
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	8.699,31	$ 9.913,00	$ 86.480.162,00	5026,79		$ 49.815.469,00			3.662,81	$ 30.960.627,00	3.662,81	75,80%	75,80%
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2.429,07	$ 9.913,00	$ 24.071.465,00	3232,83		$ 32.025.417,00			230,00	$ 2.279.300,00	230,00	7,12%	7,12%
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,00	$ 107.079,00	$ 19.005.187,00	478,22		$ 51.493.773,00			41,50	$ 4.466.537,00	41,50	8,68%	8,68%
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572 INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8.984,79	$ 17.721,00	$ 159.365.081,00	0,00									
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**														
5,1	TEJA MASTERMIL CAL 26 COLOR AZUL	M2	406,5	$ 90.054,00	$ 36.622.239,00	360,00		$ 32.433.840,00							
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.868,00	$ 22.374.064,00	357,30		$ 23.173.763,00							
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	369,62	$ 12.700,00	$ 4.695.620,00	212,84		$ 2.677.668,00							
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	34,67	$ 262.100,00	$ 9.089.633,00	0,00									
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00									
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00									
6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**														
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	719,64	$ 54.412,00	$ 39.157.834,00	990,66		$ 37.391.074,00							
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	980,69	$ 23.286,00	$ 22.835.972,00	845,72		$ 19.716.722,00							
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.228,00	0,00									
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	980,69	$ 13.502,00	$ 13.291.547,00	641,24		$ 8.658.022,00							
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.965,00	$ 2.466.350,00	0,00									
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	980,69	$ 12.065,00	$ 11.866.594,00	641,24		$ 7.736.681,00							
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.116,00	$ 9.744.908,00	469,19		$ 20.187.416,00							
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.746,00	$ 3.332.370,00	469,19		$ 9.903.462,50							
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	469,19		$ 6.627.696,50							
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
7,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.299,00	$ 825.780,00	17,00		$ 701.913,00							
7,2	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	33,50		$ 584.609,00							
7,3	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,58	$ 11.636,00	$ 111.524,00	12,00		$ 139.632,00							
7,4	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10		$ 315.493,00							
7,5	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,1	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00		$ 246.738,00							
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00		$ 3.537.900,00							
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	1,00		$ 2.900.078,00							
8	**SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**														
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,0	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00		$ 1.182.258,00							
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 356.716,00	6,00		$ 711.432,00							
8,3	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.860,00	$ 561.768,00	25,75		$ 497.562,00							
8,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.587,00	42,00		$ 1.329.090,00							
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,8	$ 35.425,00	$ 1.197.365,00	60,00		$ 2.125.500,00							
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00		$ 139.268,00							
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00		$ 1.361.252,00							
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.868.760,00	$ 10.868.760,00	1,00		$ 10.868.760,00							

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES														
9.1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 86.505,00	$ 41.384.420,00	374,40		$ 32.013.072,00							
9.2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18		$ 13.513.589,00							
9.3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00		$ 3.249.080,00							
9.4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	189,88		$ 15.031.887,00							
9.5	GUARDA ESCOBAS	ML	240,00	$ 21.672,00	$ 4.661.120,00	248,00		$ 5.375.089,00							
9.6	MESON GRANITO	M2	12,50	$ 267.175,00	$ 3.214.688,00	8,34		$ 2.119.122,00							
9.7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.300,00	0,00									
9.8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.300,00	0,00									
9.9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00		$ 2.699.500,00							
9.10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,80	$ 11.637,00	$ 4.268.104,00	0,00									
10	APARATOS SANITARIOS														
10.1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00									
10.2	PUNTO SANITARIO	UND	8,00	$ 1.008.046,00	$ 8.064.368,00	8,00		$ 8.048.276,00							
10.3	LAVAMANOS	UND	9,0	$ 340.198,00	$ 3.115.782,00	7,00		$ 2.403.386,00							
10.4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 725.800,00	$ 5.806.400,00	17,23		$ 12.677.834,00							
10.5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00									
10.6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,0	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00									
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE														
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00									
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPOP RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	0,00									
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00									
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	0,00									
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	0,00									
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00									
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.086,80	$ 1.745.086,00	0,00									
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00									
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.950,00	$ 1.018.950,00	0,00									
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD PARA COCINA.	UND	1,00	$ 2.370.268,00	$ 2.370.268,00	0,00									
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00									
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA.)	UND	3,00	$ 4.562.300,00	$ 13.686.900,00	0,00									
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00									

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS [illegible]ERO		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 362.660,00	$ 362.660,00	0,00									
11,15	VENTANA TIPO 4.1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00									
11,16	VENTANA TIPO 4,3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00									
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 362.660,00	$ 362.660,00	0,00									
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO FC 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M3	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	5,56		$ 6.247.438,00							
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.946,00	$ 4.663.607,30	0,00									
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	4,36	$ 1.120.783,00	$ 4.910.367,00	0,00									
12,4	DINTELES EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	1,39	$ 1.004.655,00	$ 1.400.190,00	0,87		$ 873.253,00							
12,5	CUNETA EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00									
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	98,00	$ 54.412,00	$ 1.596.802,00	0,00									
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS														
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00		$ 2.077.064,00							
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 236.173,00	$ 7.085.190,00	30,00		$ 7.085.190,00							
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.067,00	$ 16.043.742,00	66,00		$ 16.043.742,00							
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 207.488,00	$ 3.112.320,00	10,00		$ 2.074.880,00							
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	3,00		$ 682.137,00							
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	4,00		$ 1.064.556,00							
13,7	Suministro e Instalación de Salida Lampara de aplique a muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	7,00		$ 1.406.727,00							
13,8	Suministro e Instalación de Panel Led de 60x60 cm de incrustar de 40 W	UND	16,00	$ 423.019,00	$ 6.752.704,00	16,00		$ 6.752.704,00							
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 108.119,00	$ 5.918.426,00	38,00		$ 4.968.022,00							
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	12,00		$ 1.415.028,00							
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble tipo	UND	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	7,00		$ 1.251.691,00							
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 3No4+1No4+1No6 T AWG por ducto PVC de 11/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00		$ 9.736.800,00							
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto IMC de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	1,00		$ 746.139,00							
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CB27-4	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00		$ 1.253.320,00							
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00		$ 831.863,00							
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00		$ 204.225,00							
13,17	Suministro e Instalación de Interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 28.683,00	$ 314.413,00	11,00		$ 314.413,00							
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 206.807,00	$ 206.807,00	1,00		$ 206.807,00							
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	1,00		$ 996.100,00							
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	1,00		$ 390.223,00							
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	1,00		$ 1.422.953,00							
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.800,00	$ 3.813.800,00	0,00									
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00		$ 855.835,00							
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.923,00	$ 526.428,00	0,00									
13,25	Suministro e Instalación de bandeja cablofil 30x8 cm, Incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	0,00									

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA EL MES ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
13,28	Suministro e Instalación de tubería EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.066,00	62,00		$ 2.278.066,00							
14	OTROS ITEMS														
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 670.325,00	$ 4.682.600,00	0,00									
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,48	$ 176.957,00	$ 4.307.427,00	0,00									
15	ITEMS NO PREVISTOS														
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2				23,80	$ 783.649,00	$ 18.730.116,00							
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2				12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00							
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO, INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML				34,00	$ 638.140,00	$ 21.696.760,00							
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3KM				27947,79	$ 1.952,00	$ 54.488.191,20							
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML				163,30	$ 84.423,00	$ 13.520.276,90							
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	Kg				2113,03	$ 17.705,00	$ 37.411.196,00			593,29	$ 10.504.199,00		28,08%	28,08%
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2				37,50	$ 296.320,00	$ 11.187.000,00							
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND				1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00							
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DESARROLLO =20+=80 CM	ML				30,50	$ 183.650,00	$ 5.147.276,00							
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				91,70	$ 20.396,00	$ 1.887.892,00							
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3				13,97	$ 694.000,00	$ 9.001.162,00							
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 8"	ML				19,27	$ 72.854,00	$ 1.423.897,30							
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2				20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00							
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML				66,30	$ 364.696,00	$ 20.181.648,00							
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TNKM				12376,16	$ 3.905,00	$ 48.328.905,00							
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UND				1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00							
15,17	CONCRETO FC 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML				162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.062,00							
15,18	AFINADO DE PISO E= 5 CM	M2				544,00	$ 50.890,00	$ 27.662.298,00							

SUBTOTAL		$ 1.138.918.183,00	$ 1.138.918.983,00	$ 92.886.453,00	$ 140.037.942,00
ADMINISTRACIÓN	25,00%	$ 284.729.546,00	$ 284.729.241,00	$ 13.221.813,00	$ 35.309.480,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 11.389.182,00	$ 11.389.170,00	$ 526.895,30	$ 1.405.379,00
UTILIDAD	4,00%	$ 45.566.726,00	$ 45.566.679,00	$ 2.115.458,30	$ 5.601.518,00
TOTAL		$ 1.480.603.651,00	$ 1.480.602.083,00	$ 88.752.398,00	$ 182.948.335,00

AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO (%)	4,64%	12,30%
CANTIDADES ACUMULADAS	$ 88.752.398,00	$ 350.801.714,00
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)	4,64%	15,94%

CONSTRUCTORA DIGNES S.A.S.
NIT No. 901028158-5
RL. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S.
NIT No. 901.283.034-9
RL. RICHARD EDIMSON CASTRILLÓN MENZA
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 8. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION		1	
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO 01/03/2024 AL 30/03/2024
OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE NATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATO No 212-LICP-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado INICIO	Periodo laborado FIN	No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	mar-24 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PILA O PERIODO EPS Planilla	No. dias cotizados	Razón Social	OBSERVACIONES
						VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB				
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.119.214.582	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.006.596.953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
ALEXIS MENDEZ TIRADO	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		30	1.006.507.466	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
JAROL ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		30	1.000.123.483	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
EDWIS BERNATE	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1117544135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1122729695	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1006521638	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
CELSO ROJAS CLEVES	DIRECTOR DE OBRA	2/02/2024		30	80.233.290	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
RICHAR EDINSON CASTELLON MENZA	RESIDENTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.117.845.232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
ALEX RAIMUNDO MOISESE ROMERO	ARQUITECTO	2/02/2024		30	12.552.581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	SISO	2/02/2024		30	1.018.435.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2/02/2024		30	1.110.535.961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2/02/2024		30	1.018.410.974	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
																																						0		

NOTA: NO SE ACREDITA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR QUE CONTRATO TIENE FECHA DE CORTE AL 1 DE ABRIL Y LA EMPRESA TIENE FECHA LIMITE DE PAGO A LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DEL MES

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Original: Alcaldía de Montañita

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIO DE LA MONTAÑETA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑETA CAQUETA
CONTRATO No: 212-LICP-2023
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Ibc-24																															RES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	EPS Planilla	No. días cotizados	Razón Social	
						JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE						
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2024		24	1.119.214.582							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	24		
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2024		24	1.006.596.953							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	24		
ALEXIS MENDEZ TRIADO	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		9	1.006.507.466																						1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	9		
JAROL ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		9	1.000.123.463																						1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	9		
EDRAS BERNATE	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1117544116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1122726695	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1006521639	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
CELSO ROJAS CLEVER	DIRECTOR DE OBRA	2/02/2024		29	80.233.290	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				29		
RICHAR EDINSON CASTRILLON MENZA	RESIDENTE DE OBRA	2/02/2024		29	1.117.545.232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946857330	29		
ALEX RAIMUNDO MOSQUERA ROMERO	ARQUETECTO	2/02/2024		29	12.552.581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			945815334	29		
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	SISO	2/02/2024		29	1.018.435.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				29		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2/02/2024		29	1.110.535.942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			29/01/2024	29		
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2/02/2024		29	1.018.410.674	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			75/02/15	29		
																																					0		

NOTA

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Original Alcaldía de Montañita

ANEXO 9. COPIA DE LA COORESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1838

Florencia Caquetà 06 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: CUADRILLA DE ORDEN Y ASEO

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que se tendrá en cuenta la recomendación de la creación de la cuadrilla de orden y aseo para el contrato de referencia y se creara en el transcurso de la semana.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1839

Florencia Caquetà 12 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NORMA NSR 10

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que el contratista de obra tiene en cuenta la especificación técnica de la norma NSR 10 para llevar a cabo el método constructivo. se van a respetar los recubrimientos de concreto de la sección de columnas y vigas de amarre (columnas: 3cm y vigas: 4cm), la cuantia mínima requerida para cada sección y el diseño de mezclas.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1840

Florencia Caquetá 13 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: ATENCION A RECOMENDACIONES SOBRE EPP

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que se tomaran en cuenta las recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en el área de la obra, por parte de todos los trabajadores.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1841

Florencia Caquetá 15 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS MES DE MARZO.

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que los ensayos solicitados en el oficio enviado por la interventora el día 14 de marzo, se realizaron el día 11 de marzo para columnas y vigas de amarre.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

1812

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia Caquetá 29 de marzo de 2024

Señores
Montañita – Caquetá
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caqueta

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: Solicitud de soporte de pago de seguridad social "CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, con la intención de solicitar soporte de la planilla de seguridad social del personal de obra.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

1843

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia, 05 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es "'CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: cuadrilla de orden y aseo

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, para solicitar la creación de una cuadrilla de orden y aseo para el área de construcción del contrato de obra de referencia.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

1844

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia, 08 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR 10

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, con la intención de solicitar el cumplimiento de las especificaciones técnicas NSR 10 para el recubrimiento de concreto de la sección de columnas y vigas de amarre (columnas: 3cm y vigas: 4cm), también se deberá cumplir con la cuantía mínima de acero para cada tramo de cada elemento.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

Florencia, 11 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, se le solicita al contratista de obra que verifique el cumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo, respecto al uso de los elementos de protección personal a los trabajadores dentro de la obra, con la intención de evitar accidentes de trabajo.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Florencia, 14 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS MES DE MARZO

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, luego de culminar con la cimentación se solicita al contratista la entrega de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto utilizado (21Mpa) para los elementos:

- Columnas
- Vigas de amarre

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

1847

ANEXO 10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES -ENSAYOS DE RESISTENCIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1848

N°. Certificado: 1513
Fecha: 21/03/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**20/09/2024**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2442**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5955	0,0005	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

1849

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	15/02/2024		
PROXIMA INSPECCION:	14/08/2024		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	NIT :	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	CIUDAD:	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	PROXIMO CONTROL	14/08/2024
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	MARCA	SOUTH
MODELO :	W420-3	SERIE	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10'2mm	GRADUACION MINIMA	20''

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
Inspeccion de cierres angulares de cada eje	lectura inicial	errores encontrados	lecturas después de ajuste
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"	00°00'12"	00°00'00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"	00°00'15"	00°00'00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"	00°00'10"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"	00°00'07"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"	00°00'00"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"	00°00'12"	00°00'00"

1850

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	15/02/2024		
PROXIMA INSPECCION:	14/08/2024		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	NIT :	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	CIUDAD:	MEDELLIN-
TELEFONO :	5017426	PROXIMO CONTROL	14/08/2024
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	MARCA	TOPCON
MODELO :	GPT7501L	SERIE	S/N
ANGULO DE GRADUACION	1"	GRADUACION MINIMA	(2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

1851

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		**MARCA**			SOKKISHA
MODELO		B1C		**SERIE**			6906
AUMENTOS		32X		**PRECISIÓN EN DISTANCIA**			.+/-0.8mm*2kmde nivelación
Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1.254	MM	B2	1.425
A2	1.246	MM	B1	1.375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	0.000


HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

ANEXO 11. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	225-CMAB-2023.
	EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA - CONSOLIDADO	CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Programa PAGA	Ficha Ambiental	Nombre del programa/ ficha ambiental	INFORME 1	INFORME 2
1	Ficha N° 1	Manejo integral de residuos sólidos, escombros, material reutilizable, reciclaje y basuras.	100%	95%
1	Ficha N°2	Manejo de suelos, manejo de obras en concreto y materiales de construcción.	82%	88%
	Ficha N°3	Conservación y restauración de estabilidad de rellenos, taludes y terraplenes.	95%	90%
2	Ficha N°4	Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.	96%	95%
3	Ficha N°5	Manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido. mitigación y prevención.	80%	82%
2	Ficha N°6	Manejo de tránsito y señalización mitigación y prevención.	95%	94%
2	Ficha N°7	Manejo integral de aguas. obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.	92%	94%
2	Ficha N°8	Gestión social.	90%	90%
3	Ficha N°9	Manejo de maquinaria y equipo mitigación y prevención.	92%	91%
3	Ficha N°10	Campamento.	75%	78%
2	Ficha N°11	Programa de manejo y recuperación de la cobertura vegetal. mitigación y prevención	82%	80%

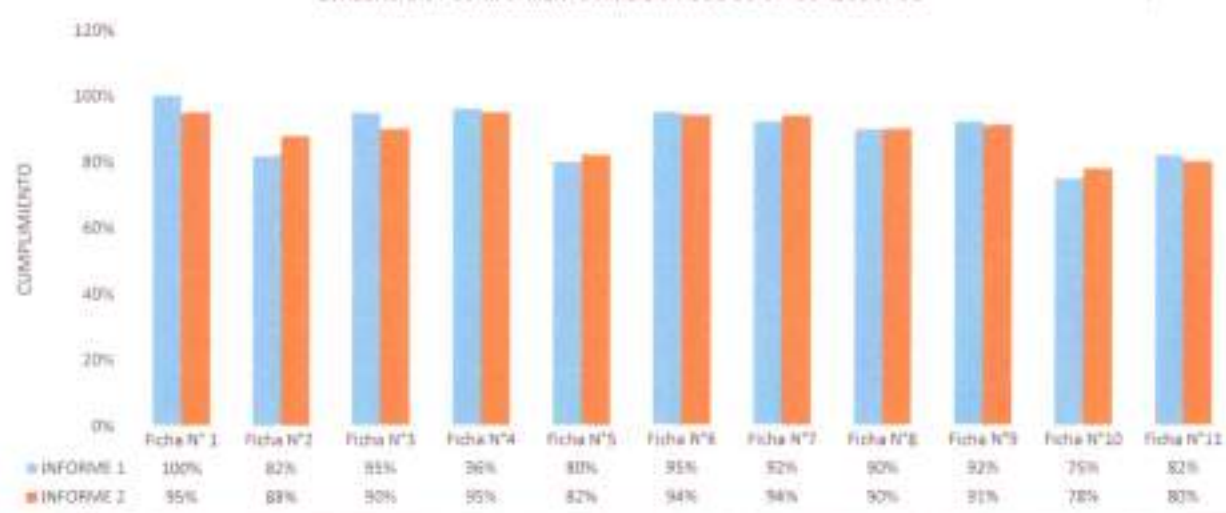

FECHA 1/04/2024

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA DICO&S SAS

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

ANEXO 12. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DE LA OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 8
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CONTRATO No: 212-UOP-2023
PERIODO: Inicio 2-mar-24 Fin 2-abr-24
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	6 MESES	Inicio del contrato	2-feb-24
		Inicio de actividades	2-feb-24
Plazo ejecución contrato adicionado	180 días	Terminación inicial contractual	2-ago-24
Plazo ejecutado	60 días	Terminación final contractual	31-mar-24
Plazo faltante por ejecutar	120 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prorroga	Valor susp. o prorroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de ratificación
			Total aprobado	0 d		N.A
Observaciones			Sin comentarios			

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de ratificación	Fecha de aprobación
1				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
Total aprobados				N.A
Sin comentarios				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$ 1.460.583.601,00
Valor inicial del contrato de CONSULTORÍA	
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)	$ 1.460.583.601,00

ADICIONES

No.	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.460.583.601,00

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo	N.A
Valor del anticipo	$ -

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA POLIZA INICIO	VIGENCIA POLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento (pago anticipo y contratos posteriores del anterior)	10%	10/11/2023	10/11/2024	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 60.981.030	10/11/2023	10/11/2024	
	100%	10/11/2023	10/11/2024	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 146.059.370	10/11/2023	10/11/2024	
Salarios y Prestaciones	5%	10/11/2023	10/05/2027	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 30.490.515	10/11/2024	10/05/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	10/05/2024	10/05/2029	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 121.962.060	10/05/2024	10/05/2029	
Responsabilidad Civil	200 SMMLV%	10/11/2023	28/11/2023	CHU-10000280 ANEXO 0	$ 232.000.000	10/11/2023	28/11/2023	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA POLIZA INICIO	VIGENCIA POLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento (pago anticipo y contratos posteriores del anterior)	10%	2/02/2024	2/02/2025	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 146.059.370	2/02/2024	2/02/2025	
	100%	2/02/2024	2/02/2025	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 146.059.370	2/02/2024	2/02/2025	
Salarios y Prestaciones	5%	2/02/2024	2/05/2027	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 74.029.685	2/02/2024	2/05/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	2/05/2024	2/05/2029	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 296.118.740	2/05/2024	2/05/2029	
Responsabilidad Civil	200 SMMLV%	2/02/2024	2/05/2029	CHU-10002280	$ 232.000.000	2/02/2024	2/05/2029	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

Firma:
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

1856

ANEXO 13. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 9 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORresponde A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
CONTRATO No: 320-CMAM-2023 — CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICOMS SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Feb-24																															MES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1 JUE	2 VIE	3 SAB	4 DOM	5 LUN	6 MAR	7 MIE	8 JUE	9 VIE	10 SAB	11 DOM	12 LUN	13 MAR	14 MIE	15 JUE	16 VIE	17 SAB	18 DOM	19 LUN	20 MAR	21 MIE	22 JUE	23 VIE	24 SAB	25 DOM	26 LUN	27 MAR	28 MIE	29 JUE	30	31	IBC se Planilla	No. días cotizados	Razón Social	
MANUA ALESSANDRA DAVILA RAMIREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2/02/2024		29	1,116,777,367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	29		
FABIO HERNAN FALSCO GIRALDO	RESIDENTE D INTERVENTORIA	2/02/2024		29	1,117,510,381	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	29		
CRISTIAN ANDRES ARGOTTA PEREZ	TOPOGRAFO	2/02/2024		29	1,078,246,403	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	29		
																																				0

1856

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 5 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO: 01/03/2024 AL 30/03/2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE AL CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
CONTRATO No: 320-OBAB-2023 — CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DECIMA SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	mar-24																									MES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1 VIE	2 SAB	3 DOM	4 LUN	5 MAR	6 MIE	7 JUE	8 VIE	9 SAB	10 DOM	11 LUN	12 MAR	13 MIE	14 JUE	15 VIE	16 SAB	17 DOM	18 LUN	19 MAR	20 MIE	21 JUE	22 VIE	23 SAB	24 DOM	25 LUN	26 MAR	27 MIE	28 JUE	29 VIE	30 SAB	31 DOM	SBP en Planilla	No. días cotizados	Ibc mensual	
MARLA ALEXSANDRA DAVILA RAMIREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	01/03/2024		30	1,115,777,367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
FABIO HERNAN TIESCO GORRON	RESIDENTE D ENTERVENTORIA	01/03/2024		30	1,117,513,281	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
CRISTIAN ANDRES SENDOYA PEREZ	TOPOGRAFO	01/03/2024		30	1,078,246,643	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
																																			0

1859

ANEXO 14. CONTROL DE LLUVIAS EN EL AREA DEL PROYECTO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1860

REGISTRO DE LLUVIAS

INSPECCIÓN MATEGUADUA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

VERSIÓN 1
PAG 1 DE 1

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATO No: 225-CMAB-2023
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICOAS SAS

PERIODO
Inicio: 01-mar-24 Fin: 31-mar-24
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

Clase de tiempo			Soleado		Nublado		Lluvias Moderadas		Lluvias Intensas		Observaciones
DIA			Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
VIER	1	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
SÁB	2	Mañana			8:00 AM	12:00 PM					
		Tarde									
DOM	3	Mañana									
		Tarde									
LUN	4	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
MAR	5	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	6	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
JUE	7	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	8	Mañana							10:00 AM	11:50 AM	
		Tarde			3:00 PM	5:00 PM			1:00 PM	3:00 PM	
SÁB	9	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde									
DOM	10	Mañana									
		Tarde									
LUN	11	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
MAR	12	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	13	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
JUE	14	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	15	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
SÁB	16	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde									
DOM	17	Mañana									
		Tarde									
LUN	18	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
MAR	19	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	3:00 PM			4:00 PM	5:00 PM			
MIER	20	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
JUE	21	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
VIER	22	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
SÁB	23	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
DOM	24	Mañana									
		Tarde									
LUN	25	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MAR	26	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	27	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
JUE	28	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	29	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
SÁB	30	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde									
DOM	31	Mañana									
		Tarde									
TOTAL			53,00		87,00		54,00		15,83		212,83
%			24,90%		40,88%		25,37%		8,85%		100,00%



Firma
Nombre: CARLOS SANTIAGO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DICOAS SAS

Firma
Nombre: RICHARD E. CASTRILLON MENZA
REPRESENTANTE LEGAL
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

ANEXO 15. INFORME DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1862

INFORME No.2 DE OBRA
01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA



CONTRATO DE OBRA No. 212-LICP de 2023 cuyo Objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
Representante legal
CONSTRATISTA DE OBRA

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS 4
1.1 Objetivo General 4
1.2 Objetivos específicos 4
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4
2.1. Descripción general 4
2.2. Localización 5
2.3. LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MUNICIPIO 6
3. ALCANCE 7
4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 8
4.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9
4.2. Forma de pago 9
4.3. Aspectos legales, pólizas y garantías de obra 9
4.4. Informe de revisión de documentos precontractuales y diseños 12
5. ASPECTOS TÉCNICOS 13
5.1. Descripción de las actividades desarrolladas 13
5.2. Verificación de personal, equipos y materiales 14
5.2.1. Equipos de obra 14
5.2.2. Herramienta menor 15
5.3. Estado del clima 15
5.4. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 16
5.5. Balance financiero del contrato (avance programado vs ejecutado) 21
5.6. Control de calidad en el concreto 22
6. CONCLUSIONES 22

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se muestra el avance de ejecución de obra, de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Lider 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus caracteristicas lo requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No. 212-LICP-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión		
	1		
Elaboro:	Richard Edinson Castrillón M.	31 de marzo de 2024	
Reviso:	Carlos Dario Cano Sánchez	01 de abril de 2024	
Aprobó:	Carlos Dario Cano Sánchez	01 de abril de 2024	

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores por medio de la construcción del Centro Vida en la inspección de Mateguadua del Municipio de La Montañita-Caquetá.

1.2 Objetivos especificos

- Realizar intervenciones e inversiones en el programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar.
- Desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones de adulto mayor.
- Construir la infraestructura del Centro vida para la atención integral del adulto mayor

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. Descripción general

El municipio de La Montañita Caquetá cuenta con tres centros vida denominados AÑOS DORADOS, ubicados en las inspecciones de policía de la unión Peneya, Santuario y la cabecera municipal, estipulados en el Acuerdo municipal No 005 de 25 febrero de 2016 con resolución de funcionamiento 00431 del 24 de diciembre de 2019 de la secretaria departamental de salud, con una atención global de 170 adultos mayores aproximadamente. Es así, que la Administración Municipal con aras de fomentar la atención a la población adulta mayor y así cubrir la necesidad en el municipio requiere la construcción de un centro vida en la inspección de Mateguada.

El grupo poblacional de Personas Mayores, representan la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad sociocultural, que atentan contra la estabilidad y la convivencia ciudadana; No obstante, también pueden representar la facilidad de influir en dinámicas sociales que pueden exponerlos a los actos de riesgos, vulnerabilidad y violencia que generan precariedad y la exclusión. El grupo poblacional de personas mayores, representa la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad social, que atentan contra la estabilidad integral de este grupo poblacional.

Con motivo de ofrecer unas instalaciones idóneas a los adultos mayores residentes del municipio se viene adelantando la construcción de la infraestructura centro vida en la inspección de Mateguadua,

teniendo en cuenta las fases y etapas del proyecto (Pre construcción, construcción y postconstrucción).

Con estas adecuaciones se cumplirá con las especificaciones técnicas y los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el funcionamiento de los Centros Vida, pero lo más significativo, los adultos mayores gozaran de instalaciones cómodas y seguras.

2.2. Localización

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en el municipio de la Montañita Caquetá, en el centro poblado de Mateguadua 1°13´24" N – 75°19´23" W. Este centro poblado se encuentra ubicado sobre la vía que de La Montañita va a la población de San Antonio de Getuchá en el municipio de Milán. Con una distancia aproximada de 37,5 kilómetros de la cabecera municipal de La Montañita.

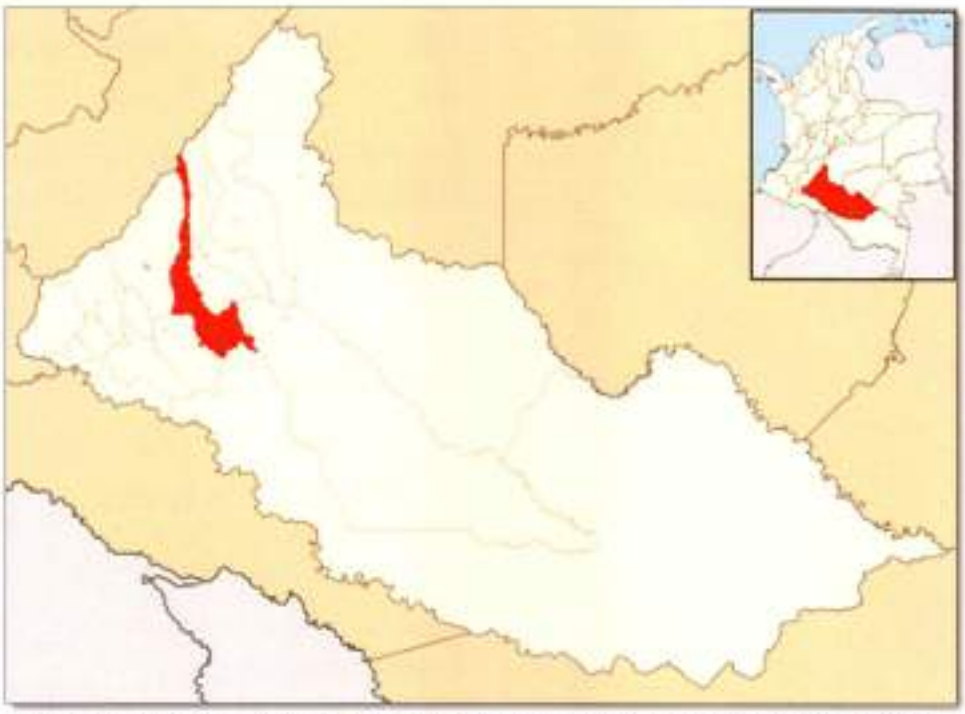


Ilustración 1. *Localización general. Mapa del Municipio de La Montañita, Caquetá (Colombia)*

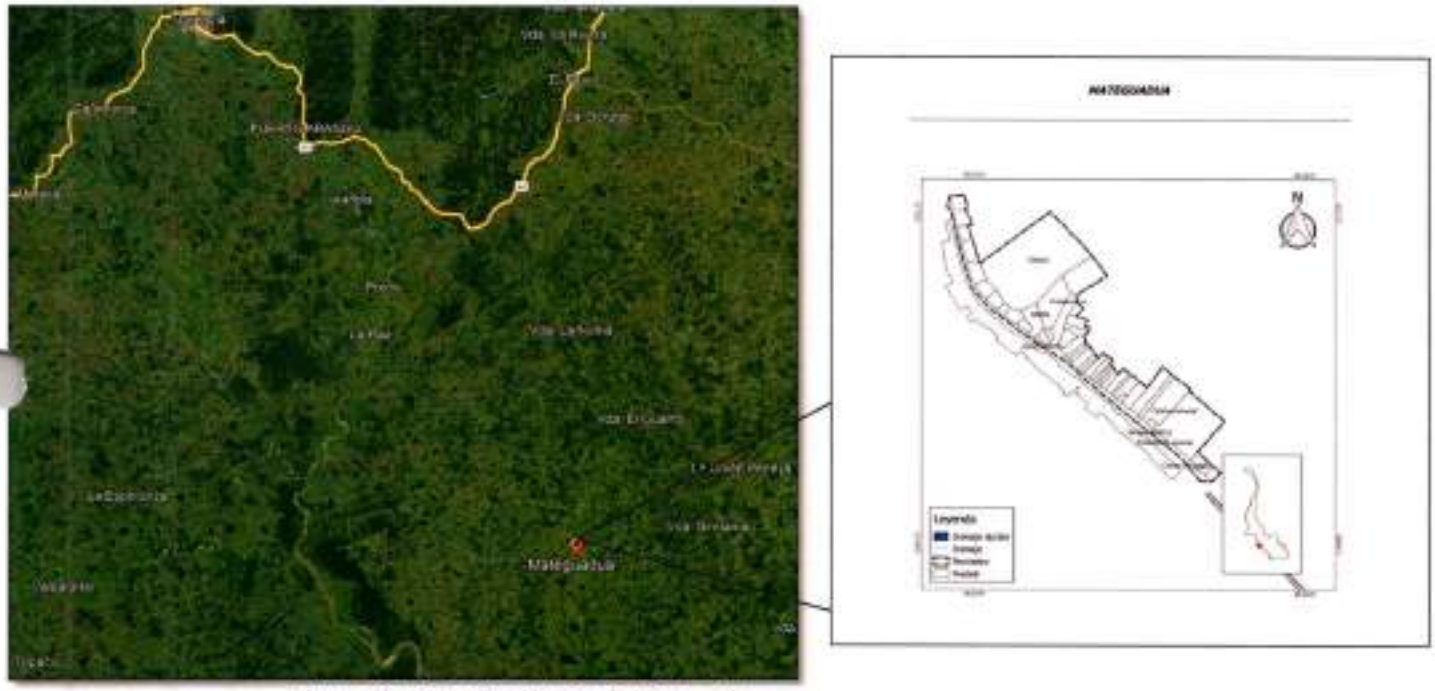


Ilustración 2. Localización Vereda Mateguadua.

2.3. LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MUNICIPIO

El municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur — oriente de Colombia, entre las coordenadas: Latitud: 1° 28' 53" N y Longitud: 75° 26' 23" W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar.

Su cabecera municipal está ubicada al norte del Departamento del Caquetá, a 27 kilómetros de la capital, Florencia, sobre la carretera denominada La Marginal de la Selva. Comprende aproximadamente 43.850 hectáreas, principalmente por el clima las caracteristicas están muy Bien definidas, que cambia desde cálido -húmedo en la base de la cordillera, hasta un frio muy húmedo en las partes altas y define las unidades geomorfoclimaticas, determinando los pisos térmicos. Su relieve montañoso va de quebrado a muy quebrado, con pendientes entre el 25% y 75%.

El Municipio de La Montañita está distribuido territorialmente en cuatro Inspecciones de Policía: Santuario, La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua (Ubicación especifica del proyecto). El área

1866

urbana de la cabecera municipal la conforman 5 barrios y el área rural 128 veredas, 11 caseríos en los cuales están las 4 Inspecciones de policía.

Vereda Mateguadua

Cerca de Mateguadua se encuentra la Vereda El Pato, El Porvenir, San Francisco, La Florida, El Líbano, La Esmeralda, Mateguadua, El Vergel, Vereda Reina Alta, Vereda La Esmeralda, Vereda El Pato, Vereda El Temblón, Vereda El Diamante, Vereda El Fono, Vereda El Diez, Vereda El Recreo, Vereda Yumal, Vereda Maticurucito. También se encuentra el Colegio Mateguadua dentro del poblado.

Afluentes: Quebrada El Pato, Quebrada La Danta, Quebrada La Chipa, Quebrada El Tigre, Quebrada El Danto, Quebrada La Vega, Quebrada El Temblón, Quebrada La Tigra

3. ALCANCE

El proyecto cuenta con una capacidad para atender a un promedio de 60 y 80 personas de la tercera edad, se plantea una edificación de un solo nivel, donde sus recorridos sean amplios y generosos, zonas llenas de vegetación y senderos al aire libre, también se implementan forman sustentables donde se tiene como prioridad el ahorro de agua, por medio de tanques recolectoras de aguas lluvias, eso para luego ser utilizada en el regado de jardinería y huertas con las el proyecto contará.

El proyecto se realiza en un lote ubicado en el centro poblado de Mateguadua que tiene como área 2.500 m2 (Area total del lote) y un total de metros cuadrado utilizables de 1.746,49 m2. Las zonas de la edificación se distribuyen en: Administrativa (59 m2), salud y atención integral (30 m2), servicios (255.97 m2), lúdica (583.21 m2) y servicios de uso general (818.31 m2).



Ilustración 3. *Modelado en 3D de la infraestructura Centro Vida*

4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	212-LICP-2023
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".
Nombre del contratista:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($1.480.593.601) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS UN PESOS MCTE
Valor Anticipo (10%):	($148.059.360) MCTE. – CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
Fecha de iniciación del contrato de obra:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de iniciación del contrato de interventoria:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024

4.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Desde la suscripción del acta de inicio el 02 de febrero de 2024, se han adelantado actividades concernientes al contrato de obra, igualmente, este ha sido sujeto a un reajuste en sus condiciones iniciales debido a la necesidad de implantar los diseños a las condiciones reales del sitio en el cual se desarrolla la obra. Hasta la fecha no se presenta suspensión.

4.2. Forma de pago

La entidad realizará un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se demuestre un avance de obra igual o superior a dicho porcentaje; un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez se demuestre un avance de obra igual o superior al 100% del valor del contrato o el cumplimiento del 100% del objeto del contrato y sus obligaciones; un tercer pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a la liquidación del contrato.

4.3. Aspectos legales, pólizas y garantías de obra

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañia MUNIDAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00

Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 116.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 270.773,00
Patronal	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 10/11/2023 hasta el 10/06/2024.

Actualización de la póliza según acta de inicio

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	02/02/2024	02/08/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	02/08/2024	02/08/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00

1892

4.4. Informe de revisión de documentos precontractuales y diseños

El municipio cuenta con unos diseños del proyecto los cuales fueron entregados informalmente, estos se entregaron mediante medio magnético y se estableció por parte de la alcaldía que estos son los planos definitivos, y estos hacen parte del expediente que dio paso al proceso de contratación, teniendo en cuenta estos planos iniciales y los presupuestos descritos en el contrato de obra y los estudios previos, el contratista de obra y la supervisión en representación de la Alcaldía Municipal por el ingeniero José Hernando Mallungo Flórez, realizaron un jornada de revisión de diseños y verificación de cantidades el día 13 de febrero de 2024.



Ilustración 4. *Imagen satelital del centro poblado Mateguadua con ubicación del proyecto.*

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. Descripción de las actividades desarrolladas

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

ITEMS	MES DE MARZO	ANOTACION
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Se realiza replanteo para vigas de arrarre y pedestales
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS	
2.1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	Descapote de la capa vegetal y adecuación del área a
2.2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	Se realizan excavaciones de vigas de amarre
2.3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	Relleno de zapatas
3	CIMENTACIÓN	
3.1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	Zapatas centro vida
3.2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	Acero para zapatas centro vida
3.3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	Vigas que soportaran la placa de piso de la estructura
3.4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	se realiza armado de acero de las vigas de amarre
3.5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	Concreto para acero de vigas de amare
4	ESTRUCTURA	
4.1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	Se realiza fundida de columnas del pórtico de Centro Vida
4.4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	Se realiza el armado de castillos instalando el acero
4.5	ACERO 60000 PSI VIGAS	Se funde una parte de las vigas del pórtico de centro
4.6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	Se inicia la instalación de laminas de Metaldeck para placa
15	ITEMS NO PREVISTOS	
15.6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	se instala soportes metalicos de las vigas y placa metaldeck

- **Porcentajes de avance por actividad (Según cantidades actualizadas)**

CONTROL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - MARZO

ITEMS	CONDICIONES INICIALES		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	771,40	$ 1.966.299,00	1.425,00	54,13%	100,00%
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS		1,00				
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	771,40	$ 3.079.429,00	1.425,00	54,13%	100,00%
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	12,75	$ 597.338,00	168,54	6,78%	88,63%
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	14,38	$ 3.703.583,00	34,16	23,29%	55,33%
3	CIMENTACIÓN						
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	22,50	$ 24.864.525,00	27,30	68,29%	81,94%
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	766,99	$ 1.654.871,00	2.513,61	6,22%	93,65%
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	27,14	$ 35.987.749,00	27,14	99,23%	99,23%
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	454,75	$ 4.906.573,00	454,75	11,18%	11,18%
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	1,49	$ 736.328,00	2,69	39,95%	72,12%
4	ESTRUCTURA						
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	4,61	$ 6.426.494,00	4,61	27,87%	27,87%
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	3.860,81	$ 36.260.627,00	3.860,81	76,80%	76,80%
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	230,00	$ 2.279.300,00	230,00	7,12%	7,12%
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	41,50	$ 4.498.637,00	41,50	8,68%	8,68%
15	ITEMS NO PREVISTOS						
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	kg	593,29	$ 10.504.199,00		28,08%	28,08%

5.2. Verificación de personal, equipos y materiales

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ACREDITA
1	Director De Obra	Ingeniero Civil	Celso Rojas Cleves	25202-096642CND	Si acredita
2	Residente de obra	Ingeniero Civil	Richard Edinson Castrillón Menza	70202-413883TLM	Si acredita
3	Arquitecto	Arquitecto	Alex Raimundo Moisés Romero	0870028245ATL	Si acredita
4	Sisoma	Especialista Salud Ocupacional	Paola Andrea Medina Amezquita	Resolución No.0149 (9 de mayo de 2021)	Si acredita
5	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	Hoover Andrés Trujillo Ramírez	70202-348787 TLM	Si acredita
6	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil	Diego Armando Gallego Muriel	25202183589CND	Si acredita

Durante la ejecución de las actividades se ha contado con la participación del equipo profesional dispuesto para este proceso, así como, personal no calificado para realizar las actividades físicas de obra. Debido a la dinámica en el desarrollo de las actividades, se ha presentado una rotación en el personal obrero durante este periodo, a pesar de esto, todo el personal ha sido capacitado, afiliado a sistema de seguridad social y riesgos profesionales como es demandado en los procesos de este tipo.

5.2.1. Equipos de obra

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra fueron: Localización y replanteo, ajustes al diseño original con base al resultado de la modelación, cerramiento en lona verde, instalaciones provisionales, limpieza del terreno, descapote del suelo para inicio de obra, excavaciones para cimentación de la estructura y fundida de concreto para zapatas. El equipo utilizado para llevar a cabo las actividades mencionadas fue el siguiente:

MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
ESTACION TOTAL	SOKKIA	IM-105	-
NIVEL	TOPCON	AT-B4	-
RETROCARGADOR	CAT	CAT 420F	101HP
VOLQUETA	FORD	1967	7 TON
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX		450 L

Anexo 3. calibración de equipos de topografía

1825

5.2.2. Herramienta menor

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de febrero se tuvieron en obra la siguiente herramienta menor:

HERRAMIENTA	CANTIDAD
PALA REDONDA	4
PICA	3
CARRETILLA	4
BARRA	3
BARRETON	3
PALADRAGA	2
BALDES	10

5.3. Estado del clima

Durante los dias del mes de marzo, las precipitaciones las precipitaciones aumentaron a un 25% de lluvias moderadas y 9% de lluvias intensas por los que retraso algunas actividades como fundida de vigas amarre y columnas. Por otro lado, los pocos dias soleados permitieron el avance satisfactorio del desarrollo de las excavaciones y fundidas de concreto (vigas y concretos ciclópeos), con un 25% de tiempo soleado y un 41% de dias nublados, donde habia momentos de frescura y sombra durante el desarrollo de diferentes actividades, evitando el desgaste por la radiación solar



Anexo 4. Estado del clima del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024.

5.4. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

Los componentes que miden el alcance de la obra según el contrato de obra se relacionan en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO			VALORES PROYECTADOS HASTA EL PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL V.I	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.998,00	$ 6.372.000,00	1075,00		$ 3.749.175,00	1425,00	$ 3.631.215,00
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 11.855,00	$ 2.111.965,00	0,00	-	$ -	223,00	$ 2.111.965,00
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.361.000,00	$ 5.361.000,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 5.361.000,00
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.215,00	$ 3.025.000,00	1075,00	-	$ 1.300.750,00	1425,00	$ 1.724.250,00
	SUBTOTAL				$ 17.872.965,00			$ 6.049.925,00		$ 12.831.240,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS**									
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1351,00	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	71,01	-	$ 28.097,00	1425,00	$ 5.689.809,00
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.893,00	$ 4.507.879,00	94,01	-	$ 4.406.317,00	190,12	$ 8.908.996,00
2,3	RELLENO EN MATERIAL COMPACTADO	M3	56,55	$ 257.951,00	$ 15.078.836,00	3,19	-	$ 822.988,00	61,74	$ 15.901.289,00
	SUBTOTAL				$ 24.979.028,00			$ 5.519.734,00		$ 30.498.795,00
3	**CIMENTACIÓN**									
3,1	CONCRETO FC 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.316,00	$ 48.087.791,00	-14,60	1.105,000	$ 16.134.214,00	32,95	$ 36.453.706,00
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3756,00	$ 9.918,00	$ 37.206.830,00	-1070,05	-	$ 10.800.135,00	2683,95	$ 26.397.945,00
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,68	$ 1.011.316,00	$ 29.016.327,00	-1,34	1.342,000	$ 1.831.788,00	17,35	$ 17.273.946,00
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1828,41	$ 9.918,00	$ 18.133.630,00	2127,61	-	$ 21.186.198,00	4066,27	$ 40.286.736,00
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	28,93	$ 494.280,00	$ 14.541.470,00	-15,79	-	$ 13.780.179,00	5,73	$ 1.843.261,00
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.083.460,00	$ 61.809.558,00	-57,04	-	$ 61.809.558,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 285.768.816,00			$ 81.890.460,00		$ 152.425.636,00
4	**ESTRUCTURA**									
4,1	CONCRETO FC 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.305,00	-3,69	1.294,465	$ 3.751.111,00	16,54	$ 23.884.451,00
4,2	CONCRETO FC 21 MPA VIGAS	M3	32,01	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	-8,58	1.412,220	$ 13.494.862,00	23,15	$ 32.975.337,00
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA	M3	26,98	$ 1.039.365,00	$ 27.529.895,00	47,01	1.085,740	$ 51.061.147,00	73,99	$ 80.186.266,00
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5899,31	$ 9.918,00	$ 58.489.362,00	-672,52	-	$ 6.668.673,00	5026,79	$ 48.820.689,00
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2429,01	$ 9.918,00	$ 24.071.455,00	803,02	-	$ 7.957.862,00	3232,03	$ 32.029.317,00
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,00	$ 107.678,00	$ 19.005.107,00	301,72	-	$ 32.488.606,00	478,22	$ 51.493.713,00
4,7	CORREA METALICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ACERO A 572	KG	6904,70	$ 17.711,00	$ 122.285.061,00	-6904,70	-	$ 122.285.061,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 342.374.275,00			$ 91.690.802,00		$ 310.484.713,00
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**									
5,1	TEJA MASTERAL CALIA COLOR AZUL	M2	466,4802	$ 90.004,00	$ 36.612.336,00	-46,48	-	$ 4.180.368,00	360,00	$ 32.431.840,00
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.898,00	$ 22.376.694,00	11,33	-	$ 735.488,00	257,30	$ 23.171.763,00
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	365,60	$ 12.700,00	$ 4.643.620,00	-139,76	-	$ 1.774.152,00	236,84	$ 3.677.868,00
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 282.300,00	$ 6.959.633,00	-24,67	-	$ 6.959.633,00	0,00	$ -
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 127.344,00	$ 6.367.200,00	-50,00	-	$ 6.367.200,00	0,00	$ -
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,21	$ 322.170,00	$ 23.425.722,00	-72,21	-	$ 23.425.722,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 99.054.678,00			$ 41.609.457,00		$ 58.285.271,00
6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**									
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	712,84	$ 54.412,00	$ 38.787.694,00	28,38	-	$ 1.576.360,00	686,86	$ 37.991.674,00
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.288,00	$ 22.909.471,00	-136,68	-	$ 3.180.191,00	846,72	$ 19.764.722,00
6,3	PAÑETE 1:4 SALIDA PLACA	M2	176,00	$ 23.288,00	$ 4.099.229,00	-176,00	-	$ 4.196.229,00	0,00	$ -
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 15.903,00	$ 15.281.847,00	-342,44	-	$ 6.625.425,00	641,24	$ 8.656.422,00
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,00	$ 13.865,00	$ 2.468.353,00	-176,00	-	$ 2.468.353,00	0,00	$ -
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.868.090,00	-342,44	-	$ 4.131.536,00	641,24	$ 7.736.554,00
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA VACHAMA	M2	233,60	$ 42.118,00	$ 9.744.668,00	282,39	-	$ 10.942.746,00	988,19	$ 26.187.414,00
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	233,60	$ 14.745,00	$ 3.332.378,00	282,39	-	$ 3.971.692,00	988,19	$ 6.803.462,00
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORATA PLASTICA	M2	233,60	$ 14.136,00	$ 3.109.256,00	282,39	-	$ 3.928.442,00	988,19	$ 6.837.698,00
	SUBTOTAL				$ 118.363.520,00			$ 3.741.575,00		$ 187.438.955,00
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**									
7,1	PUNTO HIDRAULICO PVC DE 1/2" - 1 PSI = 2 M	PTO	30,00	$ 41.288,00	$ 925.790,00	-1,00	-	$ 123.867,00	17,00	$ 701.923,00
7,2	TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/2" RDE 21	ML	13,50	$ 17.451,00	$ 584.809,00	0,00	-	$ -	13,50	$ 584.809,00
7,3	TUBERIA PVC PRESION DE 1" RDE 21	ML	9,55	$ 13.635,00	$ 131.324,00	2,45	-	$ 28.568,00	12,00	$ 159.892,00

1899

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO			VALORES PRESUPUESTACION PRELIMINAR OBRA			OBRAS CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,4	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4" RDE 21	ML	34,30	$ 9.253,00	$ 315.492,00	0,00	-	$ -	34,10	$ 315.492,00
7,5	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,11	$ 7.257,00	$ 298.468,00	-7,11	-	$ 51.679,00	34,00	$ 246.736,00
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.309,00	$ 3.537.900,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 3.537.900,00
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.969.078,00	$ 2.969.078,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 2.969.078,00
	SUBTOTAL				$ 8.571.901,00			$ 147.229,00		$ 8.426.361,00
8	SANITARIOS Y AGUAS LLUVIAS									
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L.REDM x 1 M	PTO	14,00	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	0,00	-	$ -	14,00	$ 1.182.258,00
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (1 M)	PTO	3,00	$ 118.573,00	$ 355.719,00	3,00	-	$ 355.719,00	6,00	$ 711.432,00
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2". INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,03	$ 15.500,00	$ 581.768,00	-4,33	-	$ 84.216,00	25,70	$ 467.552,00
8,4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4". INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.567,00	-6,43	-	$ 203.477,00	42,00	$ 1.329.090,00
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,80	$ 35.425,00	$ 1.197.365,00	36,20	-	$ 928.135,00	68,00	$ 2.125.500,00
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	1,00	-	$ 34.817,00	4,00	$ 139.268,00
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	0,00	-	$ -	2,00	$ 1.361.252,00
8,8	POZO SEPTICO ENTERRADO	UND	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 10.858.760,00
	SUBTOTAL				$ 17.174.127,00			$ 1.606.364,00		$ 18.295.112,00
9	PISOS, ENCHAPES Y RESANES									
9,1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	464,00	$ 85.500,00	$ 41.384.430,00	-188,60	-	$ 8.271.348,00	274,40	$ 33.113.082,00
9,2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	93,00	$ 83.834,00	$ 3.478.188,00	121,39	-	$ 10.035.491,00	181,16	$ 13.513.580,00
9,3	CERAMICA COCINA	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	0,00	-	$ -	40,000	$ 3.249.080,00
9,4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 86.489,00	$ 19.892.470,00	-66,31	-	$ 5.738.530,00	163,69	$ 13.951.867,00
9,5	GUARDA ESCOBA	ML	210,00	$ 21.672,00	$ 4.551.120,00	38,01	-	$ 823.986,00	248,01	$ 5.375.089,00
9,6	PISON GRANITO	M2	12,50	$ 157.175,00	$ 1.964.688,00	-4,16	-	$ 653.946,00	8,34	$ 1.310.742,00
9,7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 446.300,00	$ 4.463.000,00	-10,00	-	$ 4.463.000,00	0,00	$ -
9,8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 446.300,00	$ 4.463.000,00	-10,00	-	$ 4.463.000,00	0,00	$ -
9,9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 2.699.500,00
9,10	MESCLADA EN MORTERO 1:3	ML	896,00	$ 11.937,00	$ 9.376.104,00	-786,60	-	$ 9.376.104,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 91.429.580,00			$ 17.438.181,00		$ 74.001.339,00
10	APARATOS SANITARIOS									
10,1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	-6,00	-	$ 16.872.000,00	0,00	$ -
10,2	PUNTO SANITARIO	UND	8,00	$ 1.008.048,00	$ 8.064.368,00	-2,00	-	$ 2.016.096,00	6,00	$ 6.048.272,00
10,3	LAVAMANOS	UND	5,00	$ 346.198,00	$ 1.731.782,00	-2,00	-	$ 692.396,00	7,00	$ 2.423.886,00
10,4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,50	$ 735.881,00	$ 6.884.469,00	9,23	-	$ 6.791.424,00	17,73	$ 12.977.894,00
10,5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	-20,00	-	$ 2.279.500,00	0,00	$ -
10,6	EXTRACTOR DE AIRE 20W	UND	3,00	$ 110.975,00	$ 332.925,00	-3,00	-	$ 332.925,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 32.150.575,00			$ 16.081.675,00		$ 21.449.906,00
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE									
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	-5,00	-	$ 6.357.250,00	0,00	$ -
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPO PH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	-2,00	-	$ 2.353.900,00	0,00	$ -
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.668.450,00	$ 2.668.450,00	-1,00	-	$ 2.668.450,00	0,00	$ -
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	-1,00	-	$ 2.329.410,00	0,00	$ -

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO			VALORES PROYECTADOS A PERIODO PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES E INVERSION ACTUALES	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. DE TOTAL
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	-2,00	-	-$ 6.373.700,00	0,00	$ -
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	-1,00	-	-$ 1.602.450,00	0,00	$ -
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.088,89	$ 1.745.088,89	-1,00	-	-$ 1.745.088,89	0,00	$ -
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	-2,00	-	-$ 5.365.776,00	0,00	$ -
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.850,00	$ 1.018.850,00	-1,00	-	-$ 1.018.850,00	0,00	$ -
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD. PARA COCINA	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	-1,00	-	-$ 2.370.288,00	0,00	$ -
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	-6,00	-	-$ 20.122.920,00	0,00	$ -
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA Y VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TEMPERADOS (NO PINTURA ELECTROESTATICA.)	UND	1,00	$ 13.686.900,00	$ 13.686.900,00	-1,00	-	-$ 13.686.900,00	0,00	$ -
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 468.230,00	$ 468.230,00	-1,00	-	-$ 468.230,00	0,00	$ -
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	-1,00	-	-$ 342.660,00	0,00	$ -
11,15	VENTANA TIPO 4,1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRONS, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 288.468,00	$ 775.404,00	-1,00	-	-$ 775.404,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO			ADICIONES MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.16	VENTANA TIPO 4.2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 300 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 215.880,00	$ 215.880,00	-1,00	$ -	-$ 215.880,00	0,00	$ -
11.17	VENTANA TIPO 4.2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 300 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	-1,00	$ -	-$ 342.660,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 67.536.307,00			$ 67.536.307,00		$ -
12	ELEMENTOS ESTRUCTURALES									
12.1	PLACA ANDEN CONCRETO FC 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,00	$ 1.121.640,00	$ 7.865.480,00	-1,44	-	-$ 1.618.342,00	5,56	$ 6.247.638,00
12.2	VIGA AMARRE MURO DE CERRAMIENTO	M1	4,40	$ 1.058.848,00	$ 4.663.667,00	-4,40	-	-$ 4.663.667,00	0,00	$ -
12.3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F´C 21 MPA	M2	4,30	$ 1.120.783,00	$ 4.819.367,00	-4,30	-	-$ 4.819.367,00	0,00	$ -
12.4	CORTILLO EN CONCRETO F´C 21 MPA	M2	1,30	$ 1.084.855,00	$ 1.400.190,00	-0,71	-	-$ 726.917,00	0,87	$ 673.253,00
12.5	CUNETA EN CONCRETO F´C 21 MPA	M2	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	-13,13	-	-$ 13.790.543,00	0,00	$ -
12.6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	38,00	$ 34.412,00	$ 1.308.832,00	-38,00	-	-$ 1.308.832,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 36.498.819,00			-$ 27.577.328,00		$ 6.920.891,00
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS									
13.1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 25 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.613,00	$ 2.077.264,00	0,00	-	$ -	8,00	$ 2.077.264,00
13.2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 25 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 236.373,00	$ 7.091.190,00	0,00	-	$ -	30,00	$ 7.091.190,00
13.3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico THHN/THWN 12 HEBEL15	UND	86,00	$ 243.087,00	$ 16.043.742,00	0,00	-	$ -	86,00	$ 16.043.742,00
13.4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencilla por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HEBEL15	UND	15,00	$ 357.460,00	$ 5.312.535,00	-5,00	-	-$ 1.037.445,00	10,00	$ 2.674.890,00
13.5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HEBEL15	UND	2,00	$ 337.570,00	$ 682.117,00	0,00	-	$ -	2,00	$ 682.117,00
13.6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HEBEL15	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	0,00	-	$ -	4,00	$ 1.064.556,00
13.7	Suministro e instalación de Salida Lampara de aplique o muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (THT)	UND	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.406.727,00
13.8	Suministro e instalacion de Panel Led de doble cara de tecnología de 65 W	UND	15,00	$ 432.919,00	$ 6.392.794,00	0,00	-	$ -	15,00	$ 6.392.794,00
13.9	Suministro e instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	-16,00	-	-$ 2.049.904,00	38,00	$ 4.868.522,00
13.10	Suministro e instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	0,00	-	$ -	12,00	$ 1.415.028,00
13.11	Suministro e instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble Spot	UND	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.251.691,00
13.12	Suministro e instalación de acometida general subterránea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Calibre Cu 3fase + 1Neut + 1tierra T 4WG por ducto PVC de 1 1/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	20,00	-	$ 3.245.600,00	60,00	$ 9.736.800,00
13.13	Suministro e instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto EMT de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 746.139,00

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO			VALORES PROYECTADOS EN PRESENTE ACTA			TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD ITEM +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,14	Suministro e instalación de caja de paso ext bajo tensión subterranea norma sistema CODI	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.253.320,00
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 831.863,00
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 184.225,00	$ 206.215,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 184.225,00
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 20.583,00	$ 214.413,00	0,00	-	$ -	11,00	$ 214.413,00
13,19	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 206.867,00	$ 206.867,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 206.867,00
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 986.100,00	$ 986.100,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 986.100,00
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 396.223,00	$ 396.223,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 396.223,00
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.412.953,00	$ 1.412.953,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.412.953,00
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.600,00	$ 3.813.600,00	-1,00	-	$ 3.813.600,00	0,00	$ -
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	0,00	-	$ -	5,00	$ 855.835,00
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	61,00	$ 8.523,00	$ 520.406,00	-61,00	-	$ 520.406,00	0,00	$ -
13,25	Suministro e Instalación de bandeja canalfil tipo ce, incluye cable de tierra en Cu 6 awg.	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	-2,00	-	$ 237.954,00	0,00	$ -
13,26	Suministro e Instalación de tuberia EMT de 3/4" subterranea en losa	MT	61,00	$ 36.743,00	$ 2.279.666,00	0,00	-	$ -	61,00	$ 2.279.666,00
	SUBTOTAL				**$ 68.410.524,00**			**$ 4.421.729,00**		**$ 62.988.795,00**
14	**OTROS ITEMS**									
14,1	SUMINISTRO DE ESTENTORES	UND	8,00	$ 610.125,00	$ 4.881.000,00	-8,00	-	$ 4.881.000,00	0,00	$ -
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,48	$ 175.857,00	$ 4.307.427,00	-24,48	-	$ 4.307.427,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 9.188.427,00**			**$ 9.188.427,00**		$ -
15	**ITEMS NO PREVISTOS**									
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE HERCO	M2			$ -	23,60	$ 799.699,00	$ 18.750.116,00	23,60	$ 18.750.116,00
15,2	SUMINISTRO Y INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO	M2			$ -	12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00	12,00	$ 8.473.140,00
15,3	CUNETA TIPO CANCANO, INCLUYE MALLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML			$ -	34,00	$ 638.140,00	$ 21.696.760,00	34,00	$ 21.696.760,00
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR KM	M3 KM			$ -	2947,79	$ 1.950,00	$ 54.486.101,00	2947,79	$ 54.486.101,00
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ -	163,30	$ 64.423,00	$ 10.520.276,00	163,30	$ 10.520.276,00
15,6	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	KG			$ -	2113,03	$ 17.705,00	$ 37.411.196,00	2113,03	$ 37.411.196,00
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2			$ -	37,50	$ 296.520,00	$ 11.119.500,00	37,50	$ 11.119.500,00
15,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND			$ -	1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00	1,00	$ 350.250,00
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DESARROLLO <20+=50 CM	ML			$ -	33,50	$ 155.650,00	$ 5.147.275,00	33,50	$ 5.147.275,00
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML			$ -	91,70	$ 20.306,00	$ 1.861.562,00	91,70	$ 1.861.562,00
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3			$ -	12,97	$ 699.000,00	$ 9.001.180,00	12,97	$ 9.001.180,00
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6"	ML			$ -	19,27	$ 72.854,00	$ 1.403.897,00	19,27	$ 1.403.897,00
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2			$ -	20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00	20,00	$ 16.640.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO CANTIDAD CONTRATO	CONTRATO V. UNITARIO	CONTRATO V. TOTAL	VALORES MODIFICATORIOS PRESENTES ACTA CANTIDAD TOTAL +/-	VALORES MODIFICATORIOS PRESENTES ACTA V. UNITARIO	VALORES MODIFICATORIOS PRESENTES ACTA V. TOTAL	TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS VALOR TOTAL
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE 2 NIVELES EN ACERO INOXIDABLE	ML			$ -	66,00	$ 299.595,00	$ 20.181.649,00	66,00	$ 20.181.649,00
15,15	TRANSPORTE Y ACOPIO DE OBRA DE MATERIALES PARA	VIAJE			$ -	12378,16	$ 3.905,00	$ 48.328.905,00	12378,16	$ 48.328.905,00
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA	UND			$ -	1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00	1,00	$ 13.624.500,00
15,17	CONCRETO F'C 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML			$ -	162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.062,00	162,00	$ 11.575.062,00
15,18	MORALES DE 1500 2+ 3 CM	M2			$ -	544,00	$ 50.850,00	$ 27.661.200,00	544,00	$ 27.661.200,00
	SUBTOTAL				$ -			$ 324.279.257,00		$ 324.279.257,00
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A)				$ 1.136.916.193,00			$ 33.255.452,00		$ 1.136.916.193,00
	ADMINISTRACION	25%			$ 284.729.548,00		ADMINISTRACION	25%		$ 284.729.241,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 11.369.162,00		IMPREVISTOS	1%		$ 11.369.131,00
	UTILIDAD	4%			$ 45.556.728,00		UTILIDAD	4%		$ 45.556.678,00
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 1.480.571.631,00		COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO			$ 1.480.592.053,00

ACTIVIDADES DE OBRA

5.5. Balance financiero del contrato (avance programado vs ejecutado)

El contratista de obra entrega el flujo grama de ejecución.



Cumplido el mes de marzo el contratista de obra lleva un avance ejecutado acumulado del 16,939% frente al programado que es de 15.267%.

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.610.513,33	0,40%	$ 3.021.078,67	0,265%	$ 4.610.513,33	0,405%	$ 3.021.078,67	0,266%
2	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 8.021.842,67	0,704%	$ 15.320.785,67	1,346%	$ 11.042.921,33	0,970%
3	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 22.432.305,17	1,970%	$ 26.031.058,00	2,286%	$ 33.475.226,50	2,939%
4	$ 64.437.745,63	5,66%	$ 19.411.226,50	1,704%	$ 90.468.803,63	7,943%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 23.902.836,50	2,10%	$ 34.473.189,17	3,027%	$ 114.371.642,13	10,042%	$ 87.359.642,17	7,670%
6	$ 23.902.836,50	2,10%	$ 43.011.089,17	3,776%	$ 138.274.480,63	12,141%	$ 130.370.731,33	11,447%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 32.506.890,17	2,854%	$ 156.077.560,13	13,704%	$ 162.877.621,50	14,301%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 30.046.773,50	2,638%	$ 173.880.639,63	15,267%	$ 192.924.395,00	16,939%

5.6. Control de calidad en el concreto

Se comprende el seguimiento, aseguramiento y control de calidad en la ejecución de la obra; con el fin de garantizar el correcto proceso constructivo teniendo en cuenta los criterios de calidad, los parámetros de calidad, las especificaciones técnicas y las normativas vigentes

Por ello se realiza ensayos de resistencia a la compresión a 7,14 y 28 días de las siguientes estructuras:

- Concreto para Zapata 21 MPA
- Concreto Vigas de Amarre 21 MPA
- Concreto columnas 21 MPA

Anexo 3. Soporte ensayos de laboratorios.

6. CONCLUSIONES

- Se solicita a la alcaldía de la Montañita, realizar un comité de obra con los profesionales de diseño, con el fin de dar solución a lo anteriormente mencionado.
- Las condiciones climáticas fueron óptimas para el desarrollo de todas las actividades logrando un avance considerable para el mes de marzo.
- El avance de obra ejecutado 16.939%

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO





2. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS

2.1. EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE





Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio
Porvenir E-mail:
sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

3. CIMENTACION

3.3. CONCRETO F'C 21 PARA VIGAS DE AMARRE





3.4. ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE





Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio
Porvenir E-mail:
sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

1885

3.5. CONCRETO DE LIMPIEZA e=5cm





4. ESTRUCTURA

4.4. ACERO 60000 PSI COLUMNAS





Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio
Porvenir E-mail:
sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1886

4,6. PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA





SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
Representante legal
CONSTRATISTA DE OBRA

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio
Porvenir E-mail:
sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

1889

N°. Certificado: 1513
Fecha: 21/03/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**20/09/2024**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2442**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(A) Ajuste **(R)** Reparación **(M)** Mantenimiento **(CP)** Cambio de piezas **(N/A)** No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5955	0,0005	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

1868

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	15/02/2024		
PROXIMA INSPECCION:	14/08/2024		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	14/08/2024
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	**MARCA**	SOUTH
MODELO :	W420-3	**SERIE**	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm	**GRADUACION MINIMA**	20"

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
inspeccion de cierres angulares de cada eje	lectura inicial	errores encontrados	lecturas después de ajuste
Angulo vertical tubo superior	60°00´12"	00°00´12"	00°00´00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00´15"	00°00´15"	00°00´00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59´50"	00°00´10"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00´07"	00°00´07"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00´00"	00°00´00"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00´12"	00°00´12"	00°00´00"

1869

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES				Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5			
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:			15/02/2024				
PROXIMA INSPECCION:			14/08/2024				
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			NIT :	901163978-5		
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO			CIUDAD:	MEDELLIN-		
TELEFONO :	5017426			PROXIMO CONTROL	14/08/2024		
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL			MARCA	TOPCON		
MODELO :	GPT7501L			SERIE	S/N		
ANGULO DE GRADUACION	1"			GRADUACION MINIMA	(2mm+2ppm*D)m.s.e		

Inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00'	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00'	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	10"

INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	MARCA	SOKKISHA
MODELO	B1C	SERIE	6906
AUMENTOS	32X	PRECISIÓN EN DISTANCIA	+/-0.8mm*2kmde nivelación

Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
sistema pendular automatico							x

A1	1.254	MM	B2	1.425	
A2	1.246	MM	B1	1.375	
A1-A2		MM	B1-B2		

Error detectado	0.000

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio

SINERGIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

ESTADO DEL TIEMPO

VERSIÓN 1 | PAG 1 DE 1

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATECUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

PERIODO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATO No: 312-LICP-2023
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Inicio: 1-mar-24 | Fin: 31-mar-24

MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

Clase de tiempo			Soleado		Nublado		Lluvias Moderadas		Lluvias Intensas		Observaciones
DÍA			Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
VIER	1	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde	1:00 p. m.	5:00 p. m.							
SAB	2	Mañana			8:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde									
DOM	3	Mañana									
		Tarde									
LUN	4	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde	1:00 p. m.	5:00 p. m.							
MAR	5	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
MIER	6	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
JUE	7	Mañana					7:00 a. m.	12:00 p. m.			
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
VIER	8	Mañana							10:00 a. m.	11:50 a. m.	
		Tarde			3:00 p. m.	5:00 p. m.			1:00 p. m.	3:00 p. m.	
SAB	9	Mañana							7:00 a. m.	12:00 p. m.	
		Tarde									
DOM	10	Mañana									
		Tarde									
LUN	11	Mañana					7:00 a. m.	12:00 p. m.			
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
MAR	12	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
MIER	13	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
JUE	14	Mañana							7:00 a. m.	12:00 p. m.	
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
VIER	15	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
SAB	16	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde									
DOM	17	Mañana									
		Tarde									
LUN	18	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde	1:00 p. m.	5:00 p. m.							
MAR	19	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde	1:00 p. m.	3:00 p. m.			4:00 p. m.	5:00 p. m.			
MIER	20	Mañana	7:00 a. m.	12:00 p. m.							
		Tarde	1:00 p. m.	5:00 p. m.							
JUE	21	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
VIER	22	Mañana					7:00 a. m.	12:00 p. m.			
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
SAB	23	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
DOM	24	Mañana									
		Tarde									
LUN	25	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
MAR	26	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
MIER	27	Mañana			7:00 a. m.	12:00 p. m.					
		Tarde			1:00 p. m.	5:00 p. m.					
JUE	28	Mañana					7:00 a. m.	12:00 p. m.			
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
VIER	29	Mañana					7:00 a. m.	12:00 p. m.			
		Tarde					1:00 p. m.	5:00 p. m.			
SAB	30	Mañana							7:00 a. m.	12:00 p. m.	
		Tarde									
DOM	31	Mañana									
		Tarde									
TOTAL			53,00		87,00		54,00		18,03		212,03
%			24,99%		40,85%		25,37%		8,85%		100,00%



Firma
Nombre: CARLOS MARIO CANO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Firma
Nombre: RICHARD E. CASTRILLON MENZA
REPRESENTANTE LEGAL
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1892

ANEXOS

NIT. 901.283.654 – 9
Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

FORMATO DE INFORME SEMANAL

CONTRATISTA:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
CONTRATO No.	212-UCP-2023
VALOR INICIAL:	$ 1.480.593.601
VALOR ACTUAL:	$ 1.480.593.601
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
SEMANA ANALIZADA:	5

OBJETO CONTRACTUAL

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

PLAZO :	6	MESES

FECHAS DE PERIODO ANALIZADO

DESDE: 4/03/2024 HASTA: 10/03/2024

INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

AVANCE EJECUTADO	3,03%	AVANCE PROGRAMADO	3,10%	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	4,64%	AVANCE FALTANTE A EJECUTAR	95,36%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
1,1	Localización y replanteo de redes
2,2	Excavación para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION)









OBSERVACIONES:

EN LA SEMANA SE REALIZA ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS, CONCRETO DE LIMPIEZAS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y DE ARANA ACERO PARA COLUMNAS.

ING. RICHARD EDINSON CASTRILLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1894

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

FORMATO DE INFORME SEMANAL

CONTRATISTA:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
CONTRATO No.	212-UCP-2023
VALOR INICIAL:	$ 1.480.593.601
VALOR ACTUAL:	$ 1.480.593.601
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
SEMANA ANALIZADA:	6

OBJETO CONTRACTUAL		
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".		
PLAZO :	6	MESES

FECHAS DE PERIODO ANALIZADO

DESDE: 11/03/2024 HASTA: 17/03/2024

INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

AVANCE EJECUTADO	3,78%	AVANCE PROGRAMADO	2,10%	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	11,45%	AVANCE FALTANTE A EJECUTAR	88,55%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE

REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION)









OBSERVACIONES:

EN LA SEMANA SE REALIZA ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS, CONCRETO DE LIMPIEZAS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y DE ARANA ACERO PARA VIGAS

ING. RICHARD EDINSON CASTRILLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1895

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

FORMATO DE INFORME SEMANAL

CONTRATISTA:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
CONTRATO No.	212-UCP-2023
VALOR INICIAL:	$ 1.480.593.601
VALOR ACTUAL:	$ 1.480.593.601
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
SEMANA ANALIZADA:	7

OBJETO CONTRACTUAL

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

PLAZO :	6	MESES

FECHAS DE PERIODO ANALIZADO

DESDE: 18/03/2024 HASTA: 24/03/2024

INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

AVANCE EJECUTADO	2,85%	AVANCE PROGRAMADO	1,56%	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	14,30%	AVANCE FALTANTE A EJECUTAR	85,70%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION)









OBSERVACIONES:

EN LA SEMANA SE REALIZA ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS, CONCRETO DE LIMPIEZAS, FUNDIDA DE ZAPATAS, SE ARMO ACERO PARA VIGAS Y SE ARMO ACERO PARA COLUMNAS, SE INICIA TAMBIEN CON LA EXCAVACION PARA VIGAS DE AMARRE.

ING. RICHARD EDINSON CASTRILLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1896

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

FORMATO DE INFORME SEMANAL

CONTRATISTA:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
CONTRATO No.	212-LICP-2023
VALOR INICIAL:	$ 1.480.593.601
VALOR ACTUAL:	$ 1.480.593.601
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
SEMANA ANALIZADA:	8

OBJETO CONTRACTUAL

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

PLAZO :	6	MESES

FECHAS DE PERIODO ANALIZADO

DESDE: 25/03/2024 HASTA: 31/03/2024

INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

AVANCE EJECUTADO	2,64%	AVANCE PROGRAMADO	1,58%	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	16,94%	AVANCE FALTANTE A EJECUTAR	83,06%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION)









OBSERVACIONES:

SE REALIZA RELLENO CON RECEBO EN LA ZAPATAS, CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE Y SE PROCEDE CON LA PLACA DE METAL DECK.

ING. RICHARD EDINSON CASTRILLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

	CRONOGRAMA -SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N. 1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ		FLUJOGRAMA DE OBRA													
ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	MES 1				MES 2				MES 3					
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
1	PRELIMINARES	$ 13.810.340	$ 3.452.585 $ 3.452.585	$ 3.452.585 $ 3.452.585	$ 3.452.585 $ 3.452.585	$ 3.452.585 $ 3.452.585	$ 1.969.788,99							
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS	$ 16.498.795		$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349	$ 2.062.349 $ 2.062.349				
3	CIMENTACION	$ 142.424.834				$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080 $ 17.803.080	$ 17.803.080
4	ESTRUCTURA	$ 259.484.733					$ 32.435.592,00	$ 32.435.592,00	$ 32.435.592,00	$ 32.435.592,00			$ 32.435.592 $ 32.435.592	$ 32.435.592 $ 32.435.592
5	CUBIERTA Y CIELO RASO	$ 98.285.271												
6	MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS	$ 167.424.913												
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 8.436.963												$ 8.436.963
8	SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 18.335.111												
9	VIDRIOS, CHAPAS Y CERRADURAS	$ 74.052.319												
10	APARATOS SANITARIOS	$ 11.168.846												
11	ADMINISTRACION (RETAILOS, ALUMBRADO Y ACCESO INSTALADO)	$ -												
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 8.335.681												
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS	$ 13.988.791												
14	OTROS ITEMS	$ -												
15	ITEMS NO PREVISTOS	$ 316.179.251				$ 48.534.557		$ 10.826.180,00						
	COSTO DIRECTO	$ 1.116.970.351,00												
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL		$ 6.452.585,00	$ 20.766.772,99	$ 26.766.772,99	$ 54.437.545,99	$ 23.985.938,99	$ 23.985.938,99	$ 37.803.676,99	$ 37.803.676,99	$ 37.803.676,99	$ 37.803.676,99	$ 48.731.353,80	$ 56.170.836,80
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL		$ 3.452.585,00	$ 6.915.170,67	$ 27.541.355,17	$ 55.421.226,58	$ 56.972.389,57	$ 83.021.389,57	$ 83.021.389,57	$ 83.044.713,58	$ -	$ -	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		$ 3.452.585,00	$ 10.367.755,67	$ 37.909.110,84	$ 93.330.337,42	$ 150.302.727,00	$ 233.324.116,57	$ 316.345.506,14	$ 399.390.219,72	$ 399.390.219,72	$ 399.390.219,72	$ 399.390.219,72	$ 399.390.219,72

FLUJOGRAMA DE OBRA



ING. RICARDO FERRON CASTRILLON M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

ING. CARLOS DARIOS CANO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICOAS S.A.S.

18

INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
NIT: 901283654-9

ELABORADO POR:
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA
Ingeniera industrial Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA

APROBADO POR:
Richard Edinson Castrillón
Representante legal

2024

1900

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene la información de las actividades desarrolladas de la obra que tiene por objeto " **"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"** de las actividades desarrolladas del sistema de seguridad y salud en el trabajo con respecto al periodo del 2 de marzo al 1 de abril del 2024 para la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** en pro de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que surgen y de los requisitos normativos como es el decreto 1072 del 2015 , la resolución 0312 del 2019 y la ley 1562 del 2012 entre otros aplicables al proyecto en cada de sus etapas.

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, por ello una de los objetivos principales de la empresa es prevenir, anticipar y controlar los riesgos latentes en los lugares de trabajo que puedan surgir de actos o condiciones inseguras que lleven a pérdidas de recursos humanos, económicos y de tiempo productivo.

A través de este enfoque el contratista ha creado estrategias de intervención en cada uno de las actividades desarrolladas encaminadas a fomentar sensibilización en todas las personas interesadas (Trabajadores, contratistas y/o comunidad), al generar una cultura de autocuidado y estilos de vida saludables que permitan desarrollar un trabajo seguro.

En búsqueda de garantizar la protección de la vida y la salud de los trabajadores, se hace la ejecución de todas las actividades alineadas al ciclo PHVA (planear. Hacer, verificar y actuar) con las cuales se detallan aquellas medidas enfocadas en la mejora continua de los procesos acuerdo a la política de gestión integral elaborada y diseñada para la empresa.

Por lo tanto se presenta las evidencias de las actividades ejecutadas en seguridad y salud en el trabajo partiendo del cronograma elaborada al inicio del mismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de otra índole, en pro de generar ambientes de trabajo seguro, en seguridad en el personal, prevención de la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo de las afectaciones a la salud del personal, prevención de los riesgos priorizados y las medidas preventivas, correctivas y de mejora en cada una de sus etapas.

2. OBJETIVOS GENERAL

Dar seguimiento y cumplimiento a los requisitos normativos y al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en materia de seguridad y salud en el trabajo como contratista en búsqueda de anticiparse, controlar y prevenir los peligros que sean de origen laboral y que puedan materializarse en accidentes de trabajo.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejecutar las actividades de seguridad y salud en el trabajo en búsqueda de minimizar y controlar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Cumplir con los requerimientos normativos aplicables referentes a la gestión de seguridad de salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS**
- Generar en todas las partes interesadas una cultura de sensibilización en la detección de los riesgos que conduzca a fomentar hábitos de autocuidado y estilo de vida saludables.

- Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la interventoría y proyecto, independientemente de su tipo de contratación.
- Generar estrategias que permitan una mejora continua de los procesos ejecutados, enfatizando en la mejora de la calidad de vida del personal, para generar espacios seguros y la satisfacción de las condiciones de trabajo.

3. ALCANCE

El informe de gestión incluye desde el diseño y ejecución del Cronograma de actividades, capacitaciones y documentos en materia de gestión de seguridad y salud desarrollados para la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS**, así como la gestión de las actividades ejecutadas del proyecto en cada una de sus etapas para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato y de los requerimientos normativos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS POR FRENTE EN SST

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en la obra respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el 2 de marzo al 1 de abril del 2024:

4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Como medida de prevención, promoción de la salud, de la seguridad y de control de los riesgos, para este periodo se generó una serie de documentos para la ejecución y seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según los requisitos normativos tanto del decreto 1072 del 2015 y la 0312 de 2019.

Documento elaborado	Observaciones
Presentación de la autoevaluación ante el ministerio de trabajo	Cumplimiento a la normatividad resolución No. 0015 del 21 de febrero de 2024, la cual amplio el plazo para registrar el reporte de la autoevaluación del SG-SST
Realización de perfil sociodemográfico	Realización sobre el link de one drive para poder validar el estado de las condiciones socioeconómicas del personal
Matriz de EPP SST-FR-06	Socializar los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desarrollada que debe ser ejecutada

5. ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PUBLICACIÓN DE LAS POLITICAS DEL SG-SST Y DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dando cumplimiento a los requisitos normativos Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1072 de 2015, entre otros aplicables, se proyectan documentos para la interventoria con los lineamientos básicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para ser socializados a los trabajadores durante su proceso de inducción en pro de que estos conozcan los compromisos, requisitos y acciones a realizar en búsqueda de no perjudicar los proceso, imagen de la empresa o causar daño a el trabajador, compañeros o comunidad, por ello a continuación se relacionan dichos documentos:

No.	REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACIÓN

1902

1	SST-DG-01 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	PARED DE CAMPAMENTO

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-DG-01
		Versión	2
	Política de seguridad y salud en el trabajo	Fecha	30/08/2023

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** preocupada por la protección integral de todos sus empleados, contratistas, subcontratistas y el medio ambiente, afirma su compromiso hacia la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a través de:

- La identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles.
- Involucrar en el SG-SST a todos los trabajadores directos, contratistas, subcontratistas, proveedores y terceros al servicio.
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
- Generar siempre una cultura orientada a la prevención, anticipación y control de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Sensibilizar, mantener, mejorar continuamente, buscando la seguridad y bienestar de los contratistas y proveedores que brindan bienes o servicios a nuestra organización.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.

Esta política estará a disposición de todas las personas que trabajan para la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** y en nombre de ella.

Publíquese y cúmplase, Dado en Florencia, 1 días del mes de septiembre del 2023


RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
GERENTE

SST-DG-02 Política de Control de Cigarrillo, Alcohol y Drogas

1903

	SINERGIA — SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-DC-01 — Versión: 2 — Política de no alcohol, drogas y tabaco — Fecha: 30/08/2023 **POLITICA DE NO ALCOHOL, DROGAS Y TABACO** La empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** tiene como prioridad que cada uno de nuestros trabajadores incluidos los contratistas, tenga la educación, sensibilización y prevención sobre la dependencia y efectos adversos que puede llegar a causar el alcohol, las drogas, las sustancias alucinógenas, psicoactivas, estimulantes, el consumo del tabaco y sus derivados, que afectan la capacidad para desempeñar en forma adecuada las labores asignadas. Por estos motivos nos comprometemos a tener un ambiente sano atendiendo a los siguientes: ➢ Está terminantemente prohibido la utilización, adquisición, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas (drogas), dentro de nuestras instalaciones y cuando se conduzca un vehículo, en la de los clientes y/o de los proveedores, durante la jornada de trabajo. ➢ Está explícitamente prohibido fumar en el interior de las instalaciones de la empresa y en la de nuestros clientes, así como en el interior de los vehículos o en aquellos lugares señalizados como áreas restringidas. ➢ Está prohibido llegar e ingresar a los sitios y lugares de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas. ➢ Prohibir el uso ilegal, consumo, posesión, distribución, venta o compra de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas en el sitio de trabajo, en las oficinas o al conducir algún vehículo a cargo alguna maquina perteneciente o al servicio de la empresa, o durante las horas de trabajo. **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** se reserva el derecho de realizar pruebas de alcoholemia y/o de consumo de drogas ilícitas (sustancias alucinógenas) a de convocar a terceros para que las hagan, en situaciones en que un trabajador, directamente comprometido o de terceros, presente características sospechosas. El rechazo del empleado a someterse a las mencionadas pruebas, así como su resultado positivo constituye causal para sanciones disciplinarias. Cuando por parte del trabajador, contratista o tercero se incumplan los lineamientos de esta política, la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** generara las sanciones estipuladas en el reglamento interno de trabajo y acorde a la legislación vigente. Esta política estará a disposición de todas las personas que trabajan para la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** y en nombre de ella. Publíquese y cumplase. Dado en Florencia, 01 días del mes de septiembre del 2023 **RICHARD FONSON CASTRILLON MENZA** **GERENTE**	
2	SST-DG-03 Reglamento de higiene y seguridad industrial SINERGIA — SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-DG-03 — Versión: 2 — Reglamento de higiene y seguridad industrial — Fecha: 30/08/2023 Nombre de la empresa: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS NIT: 901.664.814 Actividad: 7010 (1) - PROYECTOS INTEGRALES Turnos: UNICO (1) Capital: Privado Cerrado Mix: Publico Clase de riesgo: III Código de la Actividad económica No. 2511 (CIIU), Según Decreto 768 del 31 de 12 mayo de 2022 del Ministerio de Protección Social. Por lo cual se adopta la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos laborales. | Código RAP	Actividad Económica
---	---
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil, incluye la construcción, conservación y reparación de instalaciones industriales (excepto edificios) como refinerías, fábricas de productos químicos, obras de navegación, obras portuarias y de ríos, puertos deportivos, instalaciones deportivas y de esparcimiento, viaductos, túneles y tramos subterráneo de líneas con ingeniería.
4390	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Incluye actividades como: cimentación, incluida la hincadura de pilotes, obras de saneamiento contra el agua y la humedad, desmantelamiento de edificios, perforación de pozos, levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora (excepto de pozo). Colocación de hormigonado 3 +200 de acero y de pilote. Construcción de techos para edificios residenciales, instalación y desmontaje de andamios y plataformas de trabajo. Construcción de chimeneas y hornos industriales. Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras similares. | ARTICULO PRIMERO: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.** se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que integran una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 108, 205, 206, 220, 221, 348, 349, 350, 354, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9 de 1979, Resolución número 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 0389 de 1991 Ley 776 de 2002, Resolución 1346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, Resolución 1401 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y demas normas que con ella se relacionan. ARTICULO SEGUNDO: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.** Se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 0389 de 1991, Decreto 1295 de 1994 Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y Decreto 1072 de 2015. ARTICULO TERCERO: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.** Garantizará los servicios necesarios para desarrollar actividades preventivas de conformidad con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, que establece que el Programa de Salud Ocupacional, en la empresa o en cualquier otra en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019-0117. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, priorizando a través de dicho sistema, la ejecución de las medidas de seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento en el cumplimiento de sus trabajadores, las condiciones en el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios están basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Este Sistema contempla como mínimo, los siguientes aspectos, según el Decreto 1072 de 2015: Página 1 de 8	Pared de campamento
3	publicacion de politicas en general de las politicas de acohol, drogas y tabaco-politica de seguridad y salud en el trabajo/	

1904

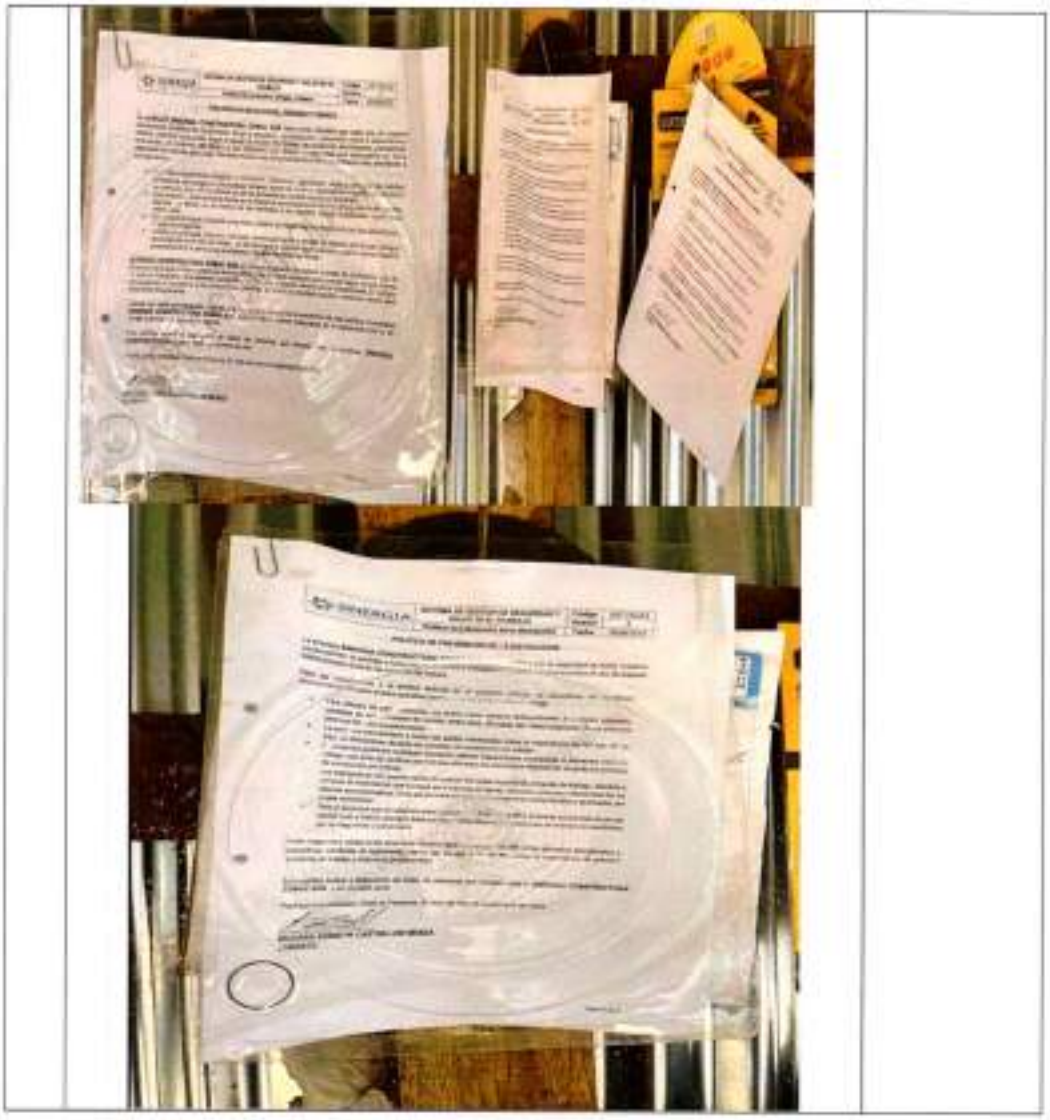

7. CONFORMACIÓN DE COMITES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Dando cumplimiento a los requisitos normativos Resolución 652 y 1356 de 2012, Ley 1010 de 2012, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, entre otros aplicables, se agrega en el plan de trabajo del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el funcionamiento del ***Comité de Convivencia Laboral*** para el mes de diciembre del 2022, se crea el 20-12-2023, conformación y capacitación de este comité, los siguientes integrantes:


Nombre	*Cedula*	*Cargo*
IVAN TRUJILLO	1007620298	Presidente
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1018435020	Suplente
JULIAN POVEDA	1010229477	Secretaria
DERLY XIMENA CASTRILLON	1117531194	Suplente

1		Registro carpeta de SST

- **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST**, capaz de brindar apoyo y controlar la identificación de peligros, valoraciones de riesgos y determinación de controles, junto a los accidentes de trabajo y enfermedad laboral, para el mes de diciembre 2024, con el equipo del COPASST, se programa capacitación de trabajo seguro en alturas

Nombre	*Cedula*	*Cargo*
RICHARD ENDINSON CASTRILLON	1117545232	Presidente
IVAN TRUJILLO	1007620298	Suplente
DERLY XIMENA TRUJILLO SAENZ	1117531194	Secretaria
FREDDY TRUJILLO CARDONA	1116203171	Suplente

REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO 2

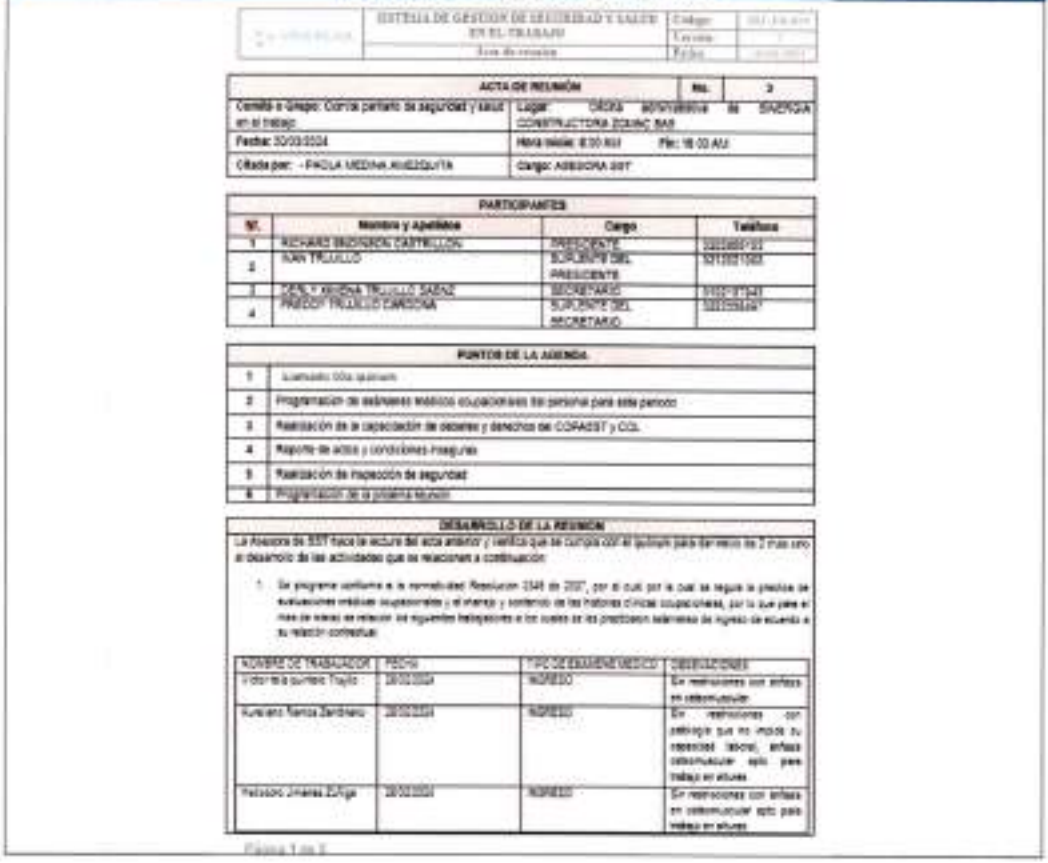

ACTA DE REUNIÓN	No.	3
Comité o Grupo: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Lugar: OFICINA ADMINISTRATIVA DE SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC SAS	
Fecha: 30/09/2024	Hora inicial: 8:00 AM	Fin: 10:00 AM
Citada por: - PAOLA MEDINA ANDERQUITA	Cargo: ASESORA SST	

PARTICIPANTES			
Nº.	Nombre y Apellidos	Cargo	Teléfono
1	RICHARD ENDINSON CASTRILLON	PRESIDENTE	[illegible]
2	IVAN TRUJILLO	SUPLENTE DEL PRESIDENTE	1007620298
3	DERLY XIMENA TRUJILLO SAENZ	SECRETARIO	[illegible]
4	FREDDY TRUJILLO CARDONA	SUPLENTE DEL SECRETARIO	[illegible]


PUNTOS DE LA AGENDA	
1	[illegible]
2	Programación de exámenes médicos ocupacionales de persona para este periodo
3	Realización de la capacitación de deberes y derechos del COPASST y COL
4	Reporte de actos y condiciones inseguras
5	Realización de inspección de seguridad
6	Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNION
La Asesora de SST hace la lectura del acta anterior y verifica que se cumplió con el quórum para dar inicio los 3 mas uno a desarrollo de las actividades que se relacionan a continuación:
1. Se programa conforme a la normatividad Resolución 2346 de 2007, por el cual por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, por la que para el mes de marzo se relacion los siguientes trabajadores a los cuales se les practicaron exámenes de ingreso de acuerdo a su relación contractual:

NOMBRE DE TRABAJADOR	FECHA	TIPO DE EXAMEN MEDICO	OBSERVACIONES
Victoria Quintero Trujillo	28/03/2024	NORMAL	Sin restricciones con enfasis en osteomuscular
Kuriakos Ramos Zambrano	28/03/2024	NORMAL	Sin restricciones con enfasis que no impida su especial labor, enfasis osteomuscular solo para trabajo en alturas
Yeferson Jimenez Zuñiga	28/03/2024	NORMAL	Sin restricciones con enfasis en osteomuscular solo para trabajo en alturas

Página 1 de 3

1906

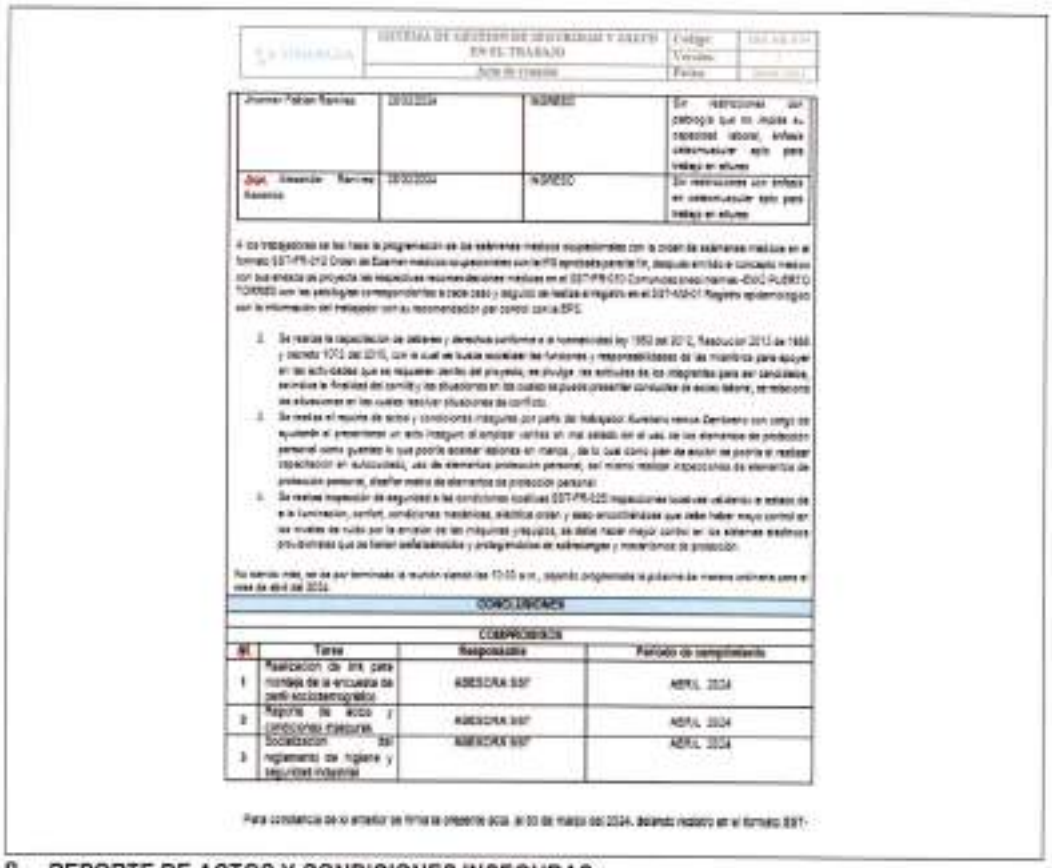

Jhonnier Fabian Ramirez	28/03/2024	ASINTIO	Sin restricciones por patología que no impida su capacidad laboral, apto para trabajo en alturas
Dipl. Gerencia Ramirez Ramirez	28/03/2024	ASINTIO	Sin restricciones con enfasis en osteomuscular apto para trabajo en alturas

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

Nº	Tarea	Responsable	Periodo de cumplimiento
1	Realizacion de link para reenvio de la encuesta de perfil sociodemografico	ASESORIA SST	ABRIL 2024
2	Reporte de actos y condiciones inseguras	ASESORIA SST	ABRIL 2024
3	Socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial	ASESORIA SST	ABRIL 2024

8. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, Articulo 2.2.4.6.15., se diseña e implementa el formato de "SST-FR-013 Reporte de actos y condiciones inseguras" en el que los todos los riesgos y/o peligros que se encuentran en su lugar de trabajo todos los trabajadores manifieste e informen de forma libre y espontánea, con total confidencialidad de la información, sobre actos y condiciones inseguras, con el fin de que los tipos de peligros y riesgos latentes dentro de cada puesto de trabajo, en pro de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad laboral.

Se enfatiza sobre la importancia de reportar de actos y condiciones subestándar, presentados en cada tarea o actividad, con el fin de minimizar el nivel de exposición, consecuencia y probabilidad de cada riesgo, por ende, se genera con ayudas digitales plantilla virtual de reporte de Actos y Condiciones inseguras
https://docs.google.com/forms/d/1o1KT6_wFvg95Avc43L_L5JmFettxwe_TdGZWYBfCMOo/edit

1907

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

Reporte de acto y condiciones inseguras

Describa de forma breve y clara, el peligro observado en su ambiente de trabajo, el cual requiera de la intervención y control.

ACTO INSEGURO: Son acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura
CONDICIÓN INSEGURA: Ambiente, elementos, herramientas o equipos que no tienen la mantención y el cuidado que requieren para ser seguros.

Reportado por:

Fecha de reporte

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-022
		Versión:	02
	Formato de reporte de actos y condiciones inseguras	Fecha:	30/08/2023

1. → DATOS DEL TRABAJADOR				
Nombre:.....		Cargo:		
2. → REPORTE DE ACTOS INSEGURAS		3. → REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS		
Marque con una equis (X) el comportamiento (acto visible) que ha detectado y de detalles al final del registro		Marque con una equis (X) la condición insegura que ha detectado y de detalles al final del registro		
1	No utilizar los elementos de protección personal	1	Agudo o cortante (superficie, borde o elemento)	
2	Usar elementos de protección personal en mal estado	2	Superficie de tránsito resbalosa	
3	Usar herramientas y/o equipos de manera incorrecta	3	Carencia del elemento de protección personal necesario para la labor	
4	Usar el mobiliario (sillas, escritorios) de manera incorrecta	4	Ruido excesivo	
5	Adoptar una posición insegura	5	Insuficiente espacio de trabajo	
6	Levantar objetos en forma incorrecta	6	Iluminación inadecuada	
7	Agarrar los objetos de forma insegura	7	Espacio inadecuado de los pasillos, salidas, entre otros	
8	Realizar tareas sin autorización	8	Máquinas, equipos o mobiliario en mal estado	
9	No señalizar y/o demarcar las áreas de trabajo	9	Almacenamiento inadecuado	
10	No cumplir con los estándares de seguridad laboral	10	Falta de señalización y/o demarcación	
11	Trabajar bajo la influencia del alcohol y de otras sustancias psicoactivas	11	Alarma de emergencia en mal estado	

Para el 25 de marzo del 2024 se realiza el reporte de caída de la herramienta en alturas cuando por parte del trabajador CARLOS ANDRES ROBAYO cuando este trabajaba sobre las vigas áreas se callo un martillo al suelo, aunque no hubo accidentados en consecuencia que el área estaba despejada

Como plan de acción se prevé en capacitar en condiciones locativas por caída a diferente nivel
Reporte de actos y condiciones inseguras

Como medida de prevención y protección se conforma Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, dejando claro las responsabilidades, alcances y objetivos conforme a la Resolución 2013 de 1987, así como la verificación, atención, investigación de estos eventos que se puedan reportar.

Anexo 3 Reporte de actos y condiciones inseguras

1908

9. ACCIDENTES DE TRABAJO

Dando cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007, durante el mes de agosto del 2023, se presentan reportes de accidente de trabajo. Sin embargo, se conforma el comité de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laboral el 08 de enero de 2024, a través SST-FR-010 Comunicaciones internas.

Dando cumplimiento a los requisitos normativo con la Gerencia y Lideres de proceso, se realiza sensibilización a los trabajadores, la importancia de detectar los riegos en pro de prevenirlo y minimizar su exposición o materialización en accidentes de trabajo.

En caso de generarse el COPASST y comité investigador deben hacer la debida investigación para determinar las causales y generar las medidas correctivas, preventivas y de mejora del caso.

Para este mes no se han presentados accidentes de trabajo en la obra por parte del personal, en caso de presentarse se hará el respectivo reporte a la ARL para la emisión del FURAT, con el comité investigador se hará la investigación pertinente y el seguimiento correspondiente para su cierre.

10. AUSENTISMOS DE TRABAJO

Para este periodo mes de abril no se ha presentado reporte de ausentismo laboral por parte del personal, por lo tanto, el comité de seguridad de salud en el trabajo está pendiente de verificar los casos que se presenten para darle seguimiento, medición y trazabilidad, con el fin de tomar decisiones y proponer lineamientos encaminados a implementar acciones y programas de intervención que busquen reducir la ausencia de los empleados al trabajo.

REPORTE CONSOLIDADO	No.	OBSERVACIONES/MOTIVOS DE AUSENCIA
AT: Accidente de trabajo	0	
EL: Enfermedad laboral	0	
EG: Enfermedad general	0	
LM: Licencia de maternidad	0	
LP: Licencia de paternidad	0	
PL: Permiso por luto	0	
PTR: Permiso de trabajo remunerado	0	
PTNR: Permiso de trabajo no remunerado	0	
OT: Otros	0	

AUSENTISMO POR SALUD

NOMBRE AUSENTISMO	INDICADOR	Datos	Observaciones
Ausentismo laboral	No. De días perdidos por ausencia por causa de salud /	2 de marzo al 1 de abril : 0	
	No. De días laborados en el mes * No. De trabajadores) * 100		
Índice de frecuencia de enfermedades laborales,	No. de eventos presentados por enfermedades laborales,	2 de marzo al 1 de abril : 0	

1909

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad	incidentes, accidentes de trabajo		
	No. de hora hombre trabajadas en el mes (Trabajadores*Semanas trabajadas*horas trabajadas por semanas)	2 de marzo al 1 de abril: 0	
Frecuencia de los accidentes laborales	números de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo "z"	2 de marzo al 1 de abril: 0	
	total de horas hombre trabajadas en el periodo "z"]*100	2 de marzo al 1 de abril: 0	

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cumpliendo con la Resolución 2400/1979 - Capitulo III, ley 9 de 1979 y el Decreto 1295 de 1994, se realiza entrega y reposición de elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores, en pro de proteger a los colaboradores, dejando el respectivo registro de entrega en el formato S SST-FR-02 Entrega de elementos de protección personal EPP. **ANEXO 4**

Durante el periodo entre el 2 de marzo al 1 de abril se ha realizado la dotación de los elementos de protección personal básicos para las actividades ejecutadas de la obra, en búsqueda de proteger y salvaguardar la seguridad del personal se relaciona la dotación entregada a cada trabajador:

Entrega 1

Nombre del trabajador	*Cedula*	*Fecha*	*EPP entregado*
CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO	1006521638	20/03/2024	Guantes, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción.
EDRAS BERNATE	1117544116	20/03/2024	
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	1119214582	20/03/2024	
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	1006596953	20/03/2024	
ALEXIS MENDEZ TIRADO	1006507466	20/03/2024	
JAROL ROJAS HERNANDEZ	1000123463	20/03/2024	

REGISTRO FOTOGRAFICO



12. INDUCCION O REINDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo al Decreto 1072 del 2015 título III capítulo VI en su artículo 2.2.4.2.4.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, establece que es necearía una inducción completa y permanente para la prevención del riesgo a los cuales se está expuesto en una empresa en el tema de seguridad y salud en el trabajo.

Por lo anterior se le realiza proceso inducciones al personal nuevo de la interventoria durante su proceso de vinculación, siendo socializado, junto a las políticas, reglamentos, deberes, derechos, entre otros, dejando el respectivo registro en el formato SST-FR-04 Inducción y reinducción en SST // SST-FR-016 Reporte de ingreso de condiciones de salud // SST-FR-06 Hoja de vida de brigadistas // SST-FR-09 Evaluación de conocimientos, con registro de inducción.

Para este mes no se presentó inducción al personal ya que se mantiene la misma cantidad de trabajadores contratados al inicio del proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO (Anexo 5)

1911



13. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de realizar sensibilizar y entrenar al personal de la interventoria sobre la importancia del autocuidado, medidas de prevención, protección, promoción de la salud, de la seguridad y de la generación de conductas asertivas que anticipen y ataquen los riesgos, se ha generado las siguientes jornadas de capacitación en pro de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.11 del capitulo 6, cumpliendo con el SST-FR-001 Plan de trabajo anual - SST (2023): **ANEXO 6**

#	CAPACITACIÓN	FECHA EJECUCIÓN	OBJETIVO	ASISTENTES
1	Taller de riesgos- matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles	26/03/2024	Se realiza la capacitación en taller de riesgos y e identificación de peligros en cumplimiento la normatividad resolución 0312 del 2019 y el decreto 1072 del 2015 se busca analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos para las actividades a desarrollar a fin de minimizar las actos y condiciones inseguras que conlleven a la presencia de accidentes de trabajo.	5
REGISTRO FOTOGRAFICO				

1922



14. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SST-FR-01

Con el fin de realizar sensibilizar y entrenar al personal de la interventoria sobre la importancia del autocuidado, medidas de prevención, protección, promoción de la salud, de la seguridad y de la generación de conductas asertivas que anticipen y ataquen los riesgos, se ha generado las siguientes jornadas de capacitación y actividades de en pro de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.11 del capítulo 6 título III, se realiza proyección del SST-FR-001Plan de trabajo y cronograma de capacitación,

15. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Según la normatividad Resolución 2346 de 2007 por el cual Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a los trabajadores a fin de identificar su situación epidemiológica y se remite la respectiva recomendación médica ocupacional para su control de EPS y autocuidado en el formato SST-FR-03 "Comunicaciones internas"

Para este periodo no se presenta exámenes al personal ya que no se da ingreso, se continua con el mismo personal

De los exámenes de ingreso del personal se realiza la recomendación médica en el SST-FR-010 comunicación interna con la retroalimentación de las observaciones /o recomendaciones que emite el medico laboral, se actualiza la SST-MZ-01 Registro epidemiológico el resultado de los exámenes médicos cuando se presentan patologías especificas para su seguimiento y control en la EPS por un periodo establecido. ANEXO 7

16. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Dando cumplimiento a los requisitos normativos Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, NTC 4114, Decreto 919 de 1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, entre otros aplicables, a la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS,

No.	ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
1	Se realiza las inspecciones de seguridad junto a los integrantes del COPASST con los cuales se verifica la inspección a los elementos químicos y de saneamiento en el formato SST-FR-027 el día 26/03/2024 con la cual verificar el estado químico y de saneamiento del área de trabajo de las que se concluye que hay que tener disponibles las fichas de seguridad en caso de accidente y/o derrame, se debe rotula y señalizar los recipientes destinados para el almacenamiento de sustancias químicas, se debe en el lugar definido para el almacenamiento de sustancias químicas que sea de acceso limitado, ventilado, con pisos lavables, lejos del sol y de agua para garantizar la seguridad al momento de manipularlos y almacenarlos. Por lo que se debe mejorar estas condiciones a fin de lograr una óptima manipulación de estas sustancias en el frente de obra. ANEXO 8- Inspeccion elementos quimicos y de saneniento

17. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

La contratación de mano de obra calificada se hace mediante la cantidad de solicitudes presentadas de la región, en donde se verifica las hojas de vida postuladas, así como los perfiles y estado de salud, que se requieren para el desarrollo de la labor. La contratación se hace de acuerdo con las necesidades de la interventoria.

Durante el mes de marzo se tiene aproximadamente un total de 23 personas activas, (Ver registro de seguridad social) **ANEXO 9**

18. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

Se elabora en el link de one drive un aproximado de 36 preguntas adoptadas a cada trabajador para poder consolidar la información sociodemográfica atributos como edad, genero, edad de residencia, etnia, nivel de educación, para poder proyectar el análisis del comportamiento sociodemográfico de la población trabajadora lo que nos refleja que en su gran mayoría todos conocen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y poder estar atentos a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales ya que en su gran mayoría se cuenta con personal no tan joven, con buenas condiciones de salud, con un nivel educativo intermedio que están en mejora continua y aportan desde su experiencia el desarrollo de practicas basadas en la seguridad y salud en el trabajo. **ANEXO 10**

Se monta en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/1ieYAYcrelwkCMZm7WWSUjZ2bwGWcsuihX0OiEJ3ciOs/edit cada una de las preguntas relacionadas con su condición socioeconómica la cual deben registrar para poder tabular los datos y poder proyectar el informe con la información consolidada, la cual se le hicieron a los siguientes trabajadores:

Nombre del trabajador	CC	CARGO
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	1119214582	Ayudante de obra
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	1006596953	Ayudante de obra
ALEXIS MENDEZ TIRADO	1006507466	Ayudante de obra
JAROL ROJAS HERNANDEZ	1000123463	Ayudante de obra

1924

19. AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL

Dando cumplimiento a la ley 1562 del 2012 sobre la obligación en la afiliación a riesgos laborales os los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles.

Se presenta la planilla de pago de ASOPAGOS a PS, AFP, ARL Y caja de compensación de cada uno de los colabores. **ANEXO 11**

Para el periodo entre trabajadores el 2 de marzo al 1 de abril del 2024 se encuentran afiliados en la planilla de los cuales 5 son parte del proyecto de puerto torres los cuales están afiliados a:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	AFILIACION A SSS		
	AFP	ARL	EPS
CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO	PORVENIR	POSITIVA	MEDISALUD
EDRAS BERNATE	NUEVA EPS	POSITIVA	NUEVA EPS
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	PORVENIR	POSITIVA	ASMETSALUD
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	PORVENIR	POSITIVA	ASMETSALUD
ALEXIS MENDEZ TIRADO	PORVENIR	POSITIVA	ASMETSALUD
	PROTECCION	POSITIVA	ASMETSALUD

20. DOCUMENTACION DE INGRESO DEL PERSONAL

Se realiza conforme a la contratación de personal de mano de obra calificado el personal que fue requerido para el desarrollo de las actividades operativas de tanto de mano de no calificada como calificada previamente su aprobación para el trabajo, se registró su información de acuerdo al formato SST-FR- 016 listado chequeo de hoja de vida teniendo en cuenta los documentos requeridos para su ingreso, los cuales después fueron archivados en la hoja de vida de cada uno de ellos, generándose una contratación por obra labor de los servicios durante el desarrollo del proyecto , para este periodo se presentaron el ingreso de los siguientes colaboradores ingresados: .

Para este periodo no se ha presentado ingreso de personal por lo que se mantiene con el mismo personal

NOMBRE Y APELLIDOS	CC	CARGO	RH	TELEFONO	FECHA INGRESO

CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO	1006521638	OFICIAL DE OBRA	A+	3238642326	29/01/2024
EDRAS BERNATE	1117544116	AYUDANTE DE OBRA	B+	3219614527	29/01/2024
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	1119214582	AYUDANTE DE OBRA	O+	3202222802	7/02/2024
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	1006596953	AYUDANTE DE OBRA	O+	3202620661	07/02/2024
ALEXIS MENDEZ TIRADO	1006507466	AYUDANTE DE OBRA	A+	3144831301	22/02/2024
JAROL ROJAS HERNANDEZ	1000123463	AYUDANTE DE OBRA	O+	3106038829	22/02/2024

Para este mes no se presenta el ingreso de personal por lo que no se hace el registro de la documentación.

21. REGISTRO MATERIZ PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

Se realiza la matriz de seguimiento epidemiológico SST-MZ-01 en la cual se relaciona los colaboradores que han ingresado a la empresa y al proyecto de con el registro de la información sociodemográfica, información laboral, contacto en caso de emergencia, planes de vigilancia, seguimiento epidemiológico y estado de vinculación laboral

22. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

Conforme al diseño del programa de promoción y prevención Programas de promoción y prevención (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.34) en la empresa se programa la realización de pausas activas en las que se busca estirar las partes del cuerpo y poder mejorar las posturas durante el desempeño de las funciones evitando lesiones osteomusculares futuras, por lo tanto el dia 26/03/2024 se realiza pausas activas en el frente de trabajo al personal con el siguiente registro fotográfico como evidencia:



1936

ANEXO 12 realización de pausa activa

23. Elaboración y aprobación

Elaborado Por:	Aprobado Por:
Paola Andrea Medina Amézquita Paola Medina	**Richard Edinson Castrillón**
Cargo	Cargo
Ingeniera ambiental - T.P.: 252238-269829CND **Licencia de prestación de Servicios en Salud Ocupacional:** No. 0149 del 2021. 09/05/2021	Representante legal
Firma	Firma

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-019
		Versión:	2
	Acta de reunión	Fecha:	30/08/2023

ACTA DE REUNIÓN		No.	2
Comité o Grupo: Comité paritario de convivencia laboral	**Lugar:** Oficina administrativa de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS		
Fecha: 28/03/2024	**Hora Inicio:** 09:00 AM	**Fin:** 10:00 AM	
Citada por: - MALORY DAYANA DIAZ	**Cargo:** ASESORA SST		

PARTICIPANTES			
N°	**Nombre y Apellidos**	**Cargo**	**Teléfono**
1	IVAN TRUJILLO CARDONA	PRESIDENTE	3212021088
2	PAOLA ANDREA MEDINA	SUPLENTE DEL PRESIDENTE	3227019406
3	NESTOR JULIAN POVEDA CECIRIS	SECRETARIO	3154915093
4	DERLY XIMENA CASTRILLON	SUPLENTE DEL SECRETARIO	3102137943

PUNTOS DE LA AGENDA	
1	Llamado a quórum
2	Socialización del plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo
3	Reconocimiento de las conductas de acoso laboral con capacitación
4	Socialización de la necesidad de la celebración del día de la familia
5	Conclusiones y varios
6	Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 28 del mes de marzo del año 2024 se reunieron en la oficina administrativa en las instalaciones de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS los integrantes del comité de convivencia laboral y la asesora del SST con el objetivo de brindar informe de las actividades realizadas en el trimestre y dar cumplimiento a la resolución 062 y 1365 del 2012.

- La asesora de SST realiza la socialización del plan de trabajo de SST para el año 2024 de las actividades establecidas de bienestar laboral como son:

-celebración del día de la mujer
Celebración del día de seguridad y salud en el trabajo
Celebración del día del hombre
Celebración del día de la familia en su primer semestre
Celebración del día de la familia en su segundo semestre
Celebración del amor y la amistad
Celebración de navidad
Celebración de cumpleaños
Partido de voleibol
Rumbaterapia

2. Se realiza la capacitación de deberes y derecho del CCL conforme a la normatividad ley 1010 de 2017 sobre las conductas de acoso laboral que se pueden presentar en la empresa la cual es ejecutada el día 20/03/2024 con la asistencia de 4 trabajadores con la cual se busca reconocer estas situaciones en el trabajo y poder dar resolución a conflictos, indicar los mecanismos para denunciar aquellas conductas constitutivas de acoso laboral y sexual al interior de la empresa; en pro de fomentar la creación y fortalecimiento

de un espacio de trabajo donde se prevenga y corrija cualquier acto de acoso, se relaciona de acuerdo a la Resolución 2404 de 2019 emitida por el ministerio de trabajo la necesidad de adoptar un protocolo de prevención y actuación de acoso laboral.

Se socializa a la gerencia la necesidad de ejecutar de acuerdo a la ley 1857 de 2017 que estipula el 'Dia Nacional de la Familia' como herramienta que provee por parte del estado a las familias y a sus integrantes el poder potenciar los recursos, en esta fecha se debe destinar espacios institucionales en los que se coordine la celebración del Día de la Familia forjando lasos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como instrumento protector por excelencia de sus integrantes (. Por lo tanto fue declarado como día de la familia el 15 de mayo de cada año), pero en las empresas su adopción debe hacerse de forma semestral, por lo tanto en mención de lo anterior requiero definir las fechas y actividades a ejecutar para dar con su complimiento, propongo como alternativas las siguientes actividades:

Administrativos primer semestre

- Ida al cine con un familiar
- Paseo de olla con la familia
- Cena con un integrante de la familia
- Asignación de un día para que el trabajador comparta con la familia puede ser el día de cumpleaños
- Partido de voleibol con un integrante la familia

Operativos

- Juego de tejo
- Paseo de olla con la familia
- Juego de billar
- Asado con un integrante de la familia

Administrativos segundo semestre

- Caminata ecológica
- Paseo por el ferri por el orteguaza

Operativos segundo semestre

- Partido de futbol
-

Se esta en espera de la su aprobación y ejecución por parte de la empresa.

FIRMA ALTA DIRECCIÓN



Nombre: RICHARD EDINSON CASTRILLON
Cargo: Representante Legal

ASESORA DEL SG-SST

Paola Medina

Nombre: PAOLA ANDREA MEDINA
ASESORA DE SST

No siendo más se dan por terminada la reunión a las 12: 00 pm y se programa la próxima reunión el día 26 de enero del 2024

CONCLUSIONES

Las reuniones del comité de convivencia laboral se deben ejecutar cada 3 meses con los integrantes para abordar las actividades de bienestar laboral y las situaciones de acoso laboral

COMPROMISOS

Nº	Tarea	Responsable	Periodo de cumplimiento
1	Celebración del primer semestre del día de la familia	ASESORA SST	Agosto 2024
2	Celebración del día de la en el segundo semestre	ASESORA SST	Agosto 2024
3	Celebración de	ASESORA SST	Agosto 2024

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, al 22 de diciembre del 2023, dejando registro en el formato SST-FR-011 Listado de asistencia de actividades.

IVAN tejmllo TC

Firma del Presidente

Paola Medina

Firma del Suplente

Firma del Representante

Firma del Suplente

Paola Medina

Firma Asesora en SST

1920

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-019
		Versión:	2
	Acta de reunión	Fecha:	30/08/2023

ACTA DE REUNIÓN		No.	3
Comité o Grupo: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	**Lugar:** Oficina administrativa de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS		
Fecha: 30/03/2024	**Hora Inicio:** 8:00 AM	**Fin:** 10 00 AM	
Citada por: - PAOLA MEDINA AMEZQUITA	**Cargo:** ASESORA SST		

PARTICIPANTES			
N°	**Nombre y Apellidos**	**Cargo**	**Teléfono**
1	RICHARD ENDINSON CASTRILLON	PRESIDENTE	3202855153
2	IVAN TRUJILLO	SUPLENTE DEL PRESIDENTE	3212021088
3	DERLY XIMENA TRUJILLO SAENZ	SECRETARIO	3102137943
4	FREDDY TRUJILLO CARDONA	SUPLENTE DEL SECRETARIO	3222338497

PUNTOS DE LA AGENDA	
1	Llamado a quórum
2	Programación de exámenes médicos ocupacionales del personal para este periodo
3	Realización de la capacitación de deberes y derechos del COPASST y CCL
4	Reporte de actos y condiciones inseguras
5	Realización de inspección de seguridad
6	Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Asesora de SST hace la lectura del acta anterior y verifica que se cumpla con el quórum para dar inicio de 2 más uno al desarrollo de las actividades que se relacionan a continuación:

1. Se programa conforme a la normatividad Resolución 2346 de 2007, por el cual por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, por lo que para el mes de marzo se relación los siguientes trabajadores a los cuales se les practicaron exámenes de ingreso de acuerdo a su relación contractual:

NOMBRE DE TRABAJADOR	FECHA	TIPO DE EXAMENE MEDICO	OBSEVACIONES
Victor feliz quintero Trujillo	26/02/2024	INGRESO	Sin restricciones con énfasis en osteomuscular
Aureliano Ramos Zambrano	26/02/2024	INGRESO	Sin restricciones con patología que no impide su capacidad laboral, énfasis osteomuscular apto para trabajo en alturas
Heliodoro Jiménez Zúñiga	26/02/2024	INGRESO	Sin restricciones con énfasis en osteomuscular apto para trabajo en alturas

Jhorman Fabian Ramirez	28/02/2024	INGRESO	Sin restricciones con patologia que no impide su capacidad laboral, énfasis osteomuscular apto para trabajo en alturas
Jhon Alexander Ramirez Ascencio	28/02/2024	INGRESO	Sin restricciones con énfasis en osteomuscular apto para trabajo en alturas

A los trabajadores se les hace la programación de los exámenes médicos ocupacionales con la orden de exámenes médicos en el formato SST-FR-012 Orden de Examen médicos ocupacionales con la IPS aprobada para tal fin, después emitido el concepto medico con sus anexos se proyecta las respectivas recomendaciones médicas en el SST-FR-010 Comunicaciones internas -EMO PUERTO TORRES con las patologías correspondientes a cada caso y seguido se realiza el registro en el SST-MZ-01 Registro epidemiológico con la información del trabajador con su recomendación par control con la EPS.

2. Se realiza la capacitación de deberes y derechos conforme a la normatividad ley 1562 del 2012, Resolución 2013 de 1986 y decreto 1072 del 2015, con la cual se busca socializar las funciones y responsabilidades de las miembros para apoyar en las actividades que se requieran dentro del proyecto, se divulga las actitudes de los integrantes para ser candidatos, se indica la finalidad del comité y las situaciones en las cuales se puede presentar conductas de acoso laboral, se relaciona las situaciones en las cuales resolver situaciones de conflicto.
3. Se realiza el reporte de actos y condiciones inseguras por parte del trabajador Aureliano ramos Zambrano con cargo de ayudante al presentarse un acto inseguro al emplear varillas en mal estado sin el uso de los elementos de protección personal como guantes lo que podría acarear lesiones en manos , de lo cual como plan de acción se podría el realizar capacitación en autocuidado, uso de elementos protección personal, así mismo realizar inspecciones de elementos de protección personal, diseñar matriz de elementos de protección personal
4. Se realiza inspección de seguridad a las condiciones locativas SST-FR-025 Inspecciones locativas validando el estado de a la iluminación, confort, condiciones mecánicas, eléctrica orden y aseo encontrándose que debe haber mayo control en los niveles de ruido por la emisión de las máquinas y/equipos, se debe hacer mayor control en los sistemas eléctricos provisionales que se tienen señalizándolos y protegiéndolos de sobrecargas y mecanismos de protección.

No siendo más, se da por terminado la reunión siendo las 10:00 a.m., dejando programada la próxima de manera ordinaria para el mes de abril del 2024.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

Nº	Tarea	Responsable	Periodo de cumplimiento
1	Realización de link para montaje de la encuesta de perfil sociodemográfico	ASESORA SST	ABRIL 2024
2	Reporte de actos y condiciones inseguras	ASESORA SST	ABRIL 2024
3	Socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial	ASESORA SST	ABRIL 2024

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, al 30 de marzo del 2024, dejando registro en el formato SST-FR-011 Listado de asistencia de actividades.

2022

IVAN Tejada Tc

Firma del Presidente

Paola Medina

Firma del Suplente

Firma del Representante

Firma del Suplente

Paola Medina

Firma Asesora en SST

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-022
		Versión:	2
	Formato de reporte de actos y condiciones inseguras	Fecha:	30/08/2023

1923

1. DATOS DEL TRABAJADOR				
Nombre: Carlos Andres Ribero **Cargo:** Auxiliar de Aseo				
Fecha del reporte: 25/07/2024				
2. REPORTE DE ACTOS INSEGURAS		**3. REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS**		
Marque con una equis (X) el comportamiento (acto visible) que ha detectado y de detalles al final del registro		Marque con una equis (X) la condición insegura que ha detectado y de detalles al final del registro		
1	No utilizar los elementos de protección personal	1	Agudo o cortante (superficie, borde o elemento)	
2	Usar elementos de protección personal en mal estado	2	Superficie de tránsito resbalosa	
3 X	Usar herramientas y/o equipos de manera incorrecta	3	Carencia del elemento de protección personal necesario para la labor	
4	Usar el mobiliario (sillas, escritorios) de manera incorrecta	4	Ruido excesivo	
5	Adoptar una posición insegura	5	Insuficiente espacio de trabajo	
6	Levantar objetos en forma incorrecta	6	Iluminación inadecuada	
7 X	Agarrar los objetos de forma insegura	7	Espacio inadecuado de los pasillos, salidas, entre otros	
8	Realizar tareas sin autorización	8	Máquinas, equipos o mobiliario en mal estado	
9	No señalizar y/o demarcar las áreas de trabajo	9	Almacenamiento inadecuado	
10	No cumplir con los estándares de seguridad laboral	10	Falta de señalización y/o demarcación	
11	Trabajar bajo la influencia del alcohol y de otras sustancias psicoactivas	11	Alarma de emergencia en mal estado	
12	Correr en áreas de trabajo, escaleras o pasillos	12	Cables sin canalizar o inadecuadamente protegidos	
13	Chatear, enviar mensajes, entre otros, mientras camina	13	Campamentos inadecuadamente dotados y organizados	
14	Realizar bromas o juegos pesados			
15	Falta de atención a las condiciones del piso			

4. Comentarios: anotar el numeral y describir el comportamiento identificado
Caida de una herramienta electrica, Cuando el trabajador se encontraba sobre los vigas utilizando el montacargas.
5. Propuestas de mejora, correctivas o preventivas
Capacitar en condiciones de seguridad Caida en altura de nivel Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-05
		Versión:	2
	Entrega de elementos de protección personal- EPP	Fecha	1/11/2023

Fecha de entrega	Funcionario	Cedula	Cargo	Elementos entregados														Observaciones	Firma recibido	Entregado por
				GT	GND	GTD	GMA	GP	TBd	TBt	CBP	GMM	CD	DD	DP	BP	OT			
28-03-24	Edras B.	1117549716	Aprendiz		X												X		Edras B.	
28-03-24	Carlos A. Betancur	1117541196	Aprendiz		X												X			
28-03-24	Erika [illegible]	1114245582	Aprendiz		X												X			
28-03-24	Sebastian Peraza	1006569153	Aprendiz		X												X			
28-03-24	Alex Jaramillo	1036501466	Aprendiz		X												X		Alex	

Convenciones:	
(GT)	Guantes de Tela
(GND)	Guantes nitrilo desechables
(GTD)	Guantes transparente desechable
(GMA)	Guantes de malla metal de acero
(GP)	Guantes plasticos calibre 30
(TBd)	Tapa bocas desechables
(TBt)	Tapa bocas de tela
(CBP)	Cubrebocas plasticos
(GMM)	Gorro malla para mujeres
(CD)	Cofia desechable
(DD)	Delantal desechable
(DP)	Delantal plastico
(BP)	Faja para manejo de cargas
(OT)	Otros elementos de protección

***** COMPROMISO PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL *****

En cumplimiento con la Legislación Colombiana en Seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a la identificación de peligros para cada uno de los cargos, se realiza entrega de los elementos de protección personal acorde a las actividades a desarrollar, alineado a los siguiente requisitos legales y demas aplicables:

- Resolución 2400/1979 - Capitulo III - Obligaciones de los trabajadores - Articulo 3, 6) Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos, y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Capitulo II, de los equipos y elementos de protección. Articulos 176, 177 y 178. LEY 9 DE 1979. Articulos 122, 123 y 124, Articulo 85: Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo. Decreto 1295 DE 1994. Articulo 91, modificado por el articulo 91 del Decreto Extraordinario 2150 de 1995

- Todos los trabajadores están obligados a: a. Cumplir las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de Medicina, Higiene, Seguridad industrial y del SG-SST que se establezca. b. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal, siendo conservados en orden y aseo.

Sanciones por incumplimiento: El grave incumplimiento por parte del trabajador a las instrucciones y determinaciones de prevención de riesgos adoptados y aquellos que se encuentran dentro del SG-SST de la empresa, facultan al empleador para aplicar las sanciones disciplinarias dispuestas en sus reglamentos de higiene y seguridad industrial, así como el Reglamento interno de trabajo, junto con los demas requisitos legales aplicables.

Por lo anterior, certifico a través de la firma de este documento que he leído, comprendido y recibido las instrucciones del uso y mantenimiento de los EPP, dadas por la empresa.

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

Nombre de quien recibe la inducción:	Alexis Manuel Tirado.
No de identificación:	1006507466.
Labor a desarrollar:	Auxiliar de obra.

Cada de los diferentes temas que deben ser conocidos, mostrando la responsabilidad, el entendimiento y el compromiso de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado.
Por favor marque con X, las casillas que se enseñen al personal nuevo, según corresponda.

Inducción [X] Re inducción [ ] **Fecha** 22 02 2024

INDUCCIÓN GENERAL (Marque con una X los temas que le fueron socializados)

TEMAS SOCIALIZADOS		TEMAS SOCIALIZADOS	
Condiciones laborales, contrato periodo de prueba y horario de trabajo Afiliaciones al sistema de gestión de seguridad social	X	Identificación de peligros y control de riesgos relacionados con el trabajo Factores de riesgo a los que está expuesto	X
Definiciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Deberes y derechos de los trabajadores en SST	X
Procedimientos y entrenamientos técnico al cargo	X	Prevención y definición de accidente, incidente de trabajo y enfermedad laboral	X
Política(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	Importancia de las inspecciones preoperacionales	X
Política de uso seguro de EPP (Importancia y uso de EPP) Política de no alcohol, sustancias alucinógenas, tabaco y porte de armas	X	Procedimiento para reportar y definiciones de un accidente de trabajo, actos y/o condiciones inseguras	X
Reglamento interno de trabajo	X	Manual de funciones y responsabilidades	X
Procedimientos seguros (Autocuidado, ATS, permisos de trabajo y laborales)	X	Plan de preparación y prevención a respuesta ante emergencias	X
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	Integrantes de comités, roles y responsabilidades	X
Exámenes médicos ocupacionales (Importancia y retroalimentación)		Otros _____	

Normas generales de seguridad:
*No se distraiga, este atento a lo que hace y como lo hace.
*Se debe contribuir con el orden y aseo del área donde labora
*Identifique los riesgos de su área de trabajo e informe a su jefe inmediato.

Compromiso del trabajador
Yo, Alexis Manuel Tirado identificado con C.C N° 1006507466 con el cargo de Auxiliar de obra siendo el día 22 de 02 del 2024, expreso por medio de este documento que conozco las directrices y objetivos estratégicos de la empresa, las funciones, nivel de autonomía y autoridad, las responsabilidades, la subordinación y la rendición de cuentas, los procedimientos, manuales, inducción al puesto, entrega de los elementos de trabajo, manual de funciones y responsabilidades, reglamento interno y otros documentos que hacen parte de la empresa y del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la distribución interna de los mismos, los cuales son de obligación aplicar, según sea el caso, para el efectivo desempeño del cargo, conocimiento, aplicación y cumplimiento además, me comprometo a conocer y aplicar las últimas versiones de los procedimientos manuales, instructivos y otros documentos inherentes al cargo desempeñado y a los que me asignen temporalmente.

El trabajador acepta:
1. Que ha recibido la inducción donde se informó los factores de riesgo a los cuales está expuesto y su participación para el control de los mismos.
2. Que es conocedor de las responsabilidades legales en seguridad y salud en el trabajo.
3. Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones

Persona que recibe la inducción / Re inducción	Persona responsable de la inducción / Re inducción
FIRMA Alexis Manuel	**FIRMA** Cindy Medina
CARGO Auxiliar de obra	**CARGO** Aprendiz SST
NOMBRE Alexis Manuel Tirado	**NOMBRE** Cindy Andrea Medina

Powered by CamScanner

1926

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

Nombre de quien recibe la inducción:	Elkin Geovanny Cobos.
No de identificación:	1.110.214.582.
Labor a desarrollar:	Ayudante de obra

Cada de los diferentes temas que deben ser conocidos, mostrando la responsabilidad, el entendimiento y el compromiso de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado.
Por favor marque con X, las casillas que se enseñen al personal nuevo, según corresponda.

Inducción ☒ Re inducción ☐ **Fecha** 07 02 2024

INDUCCIÓN GENERAL (Marque con una X los temas que le fueron socializados)

TEMAS SOCIALIZADOS		TEMAS SOCIALIZADOS	
Condiciones laborales, contrato periodo de prueba y horario de trabajo Afiliaciones al sistema de gestión de seguridad social	X	Identificación de peligros y control de riesgos relacionados con el trabajo Factores de riesgo a los que está expuesto	X
Definiciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Deberes y derechos de los trabajadores en SST	X
Procedimientos y entrenamientos técnico al cargo	X	Prevención y definición de accidente, Incidente de trabajo y enfermedad laboral	X
Política(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	importancia de las inspecciones preoperacionales	X
Política de uso seguro de EPP (Importancia y uso de EPP) Política de no alcohol, sustancias alucinógenas, tabaco y porte de armas	X	Procedimiento para reportar y definiciones de un accidente de trabajo, actos y/o condiciones inseguras	X
Reglamento interno de trabajo	X	Manual de funciones y responsabilidades	X
Procedimientos seguros (Autocuidado, ATS, permisos de trabajo y laborales)	X	Plan de preparación y prevención a respuesta ante emergencias	X
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	Integrantes de comités, roles y responsabilidades	X
Exámenes médicos ocupacionales (Importancia y retroalimentación)		Otros _____	

Normas generales de seguridad:
*No se distraiga, este atento a lo que hace y como lo hace.
*Se debe contribuir con el orden y aseo del área donde labora
*Identifique los riesgos de su área de trabajo e informe a su jefe inmediato.

Compromiso del trabajador

Yo, Elkin Geovanny Cobos identificado con C.C N° 1.110.214.582, con el cargo de Ayudante de obra siendo el día 07 de 02 del 2024, expreso por medio de este documento que conozco las directrices y objetivos estratégicos de la empresa, las funciones, nivel de autonomía y autoridad, las responsabilidades, la subordinación y la rendición de cuentas, los procedimientos, manuales, inducción al puesto, entrega de los elementos de trabajo, manual de funciones y responsabilidades, reglamento interno y otros documentos que hacen parte de la empresa y del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la distribución interna de los mismos, los cuales son de obligación aplicar, según sea el caso, para el efectivo desempeño del cargo, conocimiento, aplicación y cumplimiento además, me comprometo a conocer y aplicar las últimas versiones de los procedimientos manuales, instructivos y otros documentos inherentes al cargo desempeñado y a los que me asignen temporalmente.

Powered by CamScanner

1927

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

El trabajador acepta:

1. Que ha recibido la inducción donde se informó los factores de riesgo a los cuales está expuesto y su participación para el control de los mismos.
2. Que es conocedor de las responsabilidades legales en seguridad y salud en el trabajo.
3. Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones

Persona que recibe la Inducción / Re inducción	Persona responsable de la Inducción / Re inducción
FIRMA ELKIN	**FIRMA** Paola Medina.
CARGO Ayudante de obra	**CARGO** Asesora SST
NOMBRE Elkin Gaviria.	**NOMBRE** Paola Andrea Medina.

Powered by CamScanner

1028

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

Nombre de quien recibe la inducción:	Jonl Rojas Hernandez
No de identificación:	1.000 171 465.
Labor a desarrollar:	Auxiliar de obra.

Cada de los diferentes temas que deben ser conocidos, mostrando la responsabilidad, el entendimiento y el compromiso de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado.
Por favor marque con X, las casillas que se enseñen al personal nuevo, según corresponda.

Inducción [X] Re inducción [ ] **Fecha** 22 02 2024

INDUCCIÓN GENERAL (Marque con una X los temas que le fueron socializados)

TEMAS SOCIALIZADOS		TEMAS SOCIALIZADOS	
Condiciones laborales, contrato periodo de prueba y horario de trabajo Afiliaciones al sistema de gestión de seguridad social	X	Identificación de peligros y control de riesgos relacionados con el trabajo Factores de riesgo a los que está expuesto	X
Definiciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Deberes y derechos de los trabajadores en SST	X
Procedimientos y entrenamientos técnico al cargo	X	Prevención y definición de accidente, Incidente de trabajo y enfermedad laboral	X
Política(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	Importancia de las inspecciones preoperacionales	X
Política de uso seguro de EPP (Importancia y uso de EPP) Política de no alcohol, sustancias alucinógenas, tabaco y porte de armas	X	Procedimiento para reportar y definiciones de un accidente de trabajo, actos y/o condiciones inseguras	X
Reglamento interno de trabajo	X	Manual de funciones y responsabilidades	X
Procedimientos seguros (Autocuidado, ATS, permisos de trabajo y laborales)	X	Plan de preparación y prevención a respuesta ante emergencias	X
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	Integrantes de comités, roles y responsabilidades	X
Exámenes médicos ocupacionales (Importancia y retroalimentación)		Otros _____	

Normas generales de seguridad:
*No se distraiga, este atento a lo que hace y como lo hace.
*Se debe contribuir con el orden y aseo del área donde labora
*Identifique los riesgos de su área de trabajo e informe a su jefe inmediato.

Compromiso del trabajador
Yo, Jonl Rojas Hernandez identificado con C.C N° 1.000171465. con el cargo de Auxiliar de obra siendo el día 22 de 02 del 2024 expreso por medio de este documento que conozco las directrices y objetivos estratégicos de la empresa, las funciones, nivel de autonomía y autoridad, las responsabilidades, la subordinación y la rendición de cuentas, los procedimientos, manuales, inducción al puesto, entrega de los elementos de trabajo, manual de funciones y responsabilidades, reglamento interno y otros documentos que hacen parte de la empresa y del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la distribución interna de los mismos, los cuales son de obligación aplicar, según sea el caso, para el efectivo desempeño del cargo, conocimiento, aplicación y cumplimiento además, me comprometo a conocer y aplicar las últimas versiones de los procedimientos manuales, instructivos y otros documentos inherentes al cargo desempeñado y a los que me asignen temporalmente.

El trabajador acepta:
1. Que ha recibido la inducción donde se informó los factores de riesgo a los cuales está expuesto y su participación para el control de los mismos.
2. Que es conocedor de las responsabilidades legales en seguridad y salud en el trabajo.
3. Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones

Persona que recibe la inducción / Re inducción	Persona responsable de la inducción / Re inducción
FIRMA Jonl Rojas	**FIRMA**
CARGO Auxiliar de obra	**CARGO** Asesor SST
NOMBRE Jonl Rojas Hernandez	**NOMBRE** Paola Andrea Medina

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

Nombre de quien recibe la inducción:	Sebastian Perez Otoniel
No de identificación:	1.006 596 953
Labor a desarrollar:	Ayudante de obra

Cada de los diferentes temas que deben ser conocidos; mostrando la responsabilidad, el entendimiento y el compromiso de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado.
Por favor marque con X, las casillas que se enseñen al personal nuevo, según corresponda.

Inducción [X] Re inducción [ ] **Fecha** 07 02 2024

INDUCCIÓN GENERAL (Marque con una X los temas que le fueron socializados)

TEMAS SOCIALIZADOS		TEMAS SOCIALIZADOS	
Condiciones laborales, contrato periodo de prueba y horario de trabajo Afiliaciones al sistema de gestión de seguridad social	X	Identificación de peligros y control de riesgos relacionados con el trabajo Factores de riesgo a los que está expuesto	X
Definiciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Deberes y derechos de los trabajadores en SST	X
Procedimientos y entrenamientos técnico al cargo	X	Prevención y definición de accidente, Incidente de trabajo y enfermedad laboral	X
Política(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	Importancia de las inspecciones preoperacionales	X
Política de uso seguro de EPP (importancia y uso de EPP) Política de no alcohol, sustancias alucinógenas, tabaco y porte de armas	X	Procedimiento para reportar y definiciones de un accidente de trabajo, actos y/o condiciones inseguras	X
Reglamento interno de trabajo	X	Manual de funciones y responsabilidades	X
Procedimientos seguros (Autocuidado, ATS, permisos de trabajo y laborales)	X	Plan de preparación y prevención a respuesta ante emergencias	X
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	Integrantes de comités, roles y responsabilidades	X
Exámenes médicos ocupacionales (Importancia y retroalimentación)		Otros _____	

Normas generales de seguridad:
*No se distraiga, este atento a lo que hace y como lo hace.
*Se debe contribuir con el orden y aseo del área donde labora
*Identifique los riesgos de su área de trabajo e informe a su jefe inmediato.

Compromiso del trabajador

Yo, Sebastian Perez identificado con C.C N° 1006596953, con el cargo de Ayudante de obra siendo el día 02 de 02 del 2024, expreso por medio de este documento que conozco las directrices y objetivos estratégicos de la empresa, las funciones, nivel de autonomía y autoridad, las responsabilidades, la subordinación y la rendición de cuentas, los procedimientos, manuales, inducción al puesto, entrega de los elementos de trabajo, manual de funciones y responsabilidades, reglamento interno y otros documentos que hacen parte de la empresa y del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la distribución interna de los mismos, los cuales son de obligación aplicar, según sea el caso, para el efectivo desempeño del cargo, conocimiento, aplicación y cumplimiento además, me comprometo a conocer y aplicar las últimas versiones de los procedimientos manuales, instructivos y otros documentos inherentes al cargo desempeñado y a los que me asignen temporalmente.

Powered by CamScanner

1930

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-FR-04
		Versión	02
	Inducción y reinducción en SST	Fecha	01/11/2023

El trabajador acepta:

1. Que ha recibido la inducción donde se informó los factores de riesgo a los cuales está expuesto y su participación para el control de los mismos.
2. Que es conocedor de las responsabilidades legales en seguridad y salud en el trabajo.
3. Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones

Persona que recibe la Inducción / Re inducción	Persona responsable de la Inducción / Re inducción
FIRMA Sebastian Para	**FIRMA** Rocio medina.
CARGO Ayudante	**CARGO** Asesora SST
NOMBRE Sebastian Para	**NOMBRE** Rocio Andrea medina

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

1931

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	SST-FR-011
		Versión	2
	Listado de asistencia	Fecha	01/11/2023

FECHA	21-03-2024	RESPONSABLE	Paola Medina

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Capacitación en taller de riesgos-matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Reinducción		
Charla		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Armando [illegible]	1117523544	Auxiliar	Juan M
2	Alexis Mendez	1006507466	ayudante	[illegible]
3	Libardo Zapata	1147686876.	Oficial	Libardo A.
4	Efrain Sanchez S.	1117546378	ayudante	[illegible]
5	Carlos Rojas	1006521638	Oficial	[illegible]
6	Sebastian Pena Osorio	1006596653	ayudante	Sebastian
7	Juan pablo Sanchez	1117553746	ayudante	Juan pablo S.
8	Jhon Carlos Medina	1006505563	ayudante	Medina
9	Anton[illegible]escuerra	96331100.	oficial	[illegible]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Cargo	Firma
Asesora SST	Paola Medina

Powered by CamScanner

1932

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023

FECHA:	7/10/2024.	NOTA OBTENIDA:	5
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Juan Pablo Sanchez Solis		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**



NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	24/03/2024.	NOTA OBTENIDA:	
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Sebastian Rojas Osorio		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

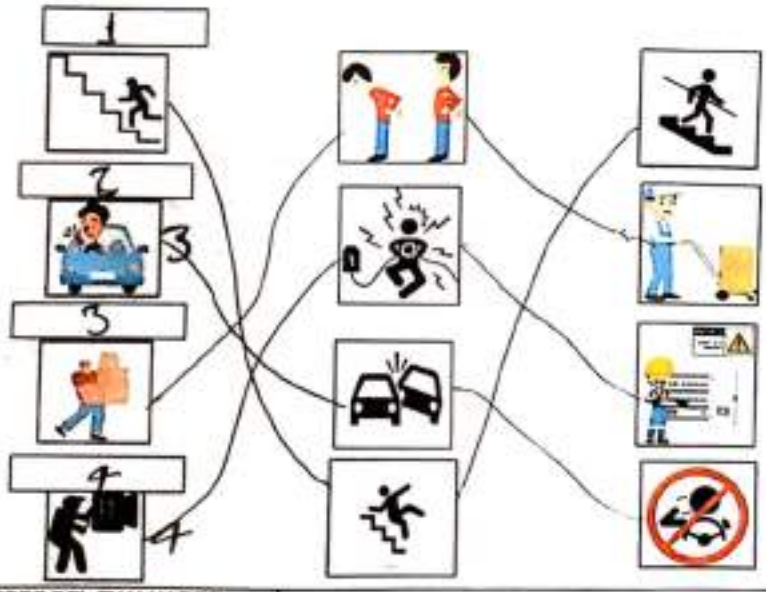

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

1934

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	19/03/2024	NOTA OBTENIDA:	5.
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Carlos Rabayo		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una linea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una linea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

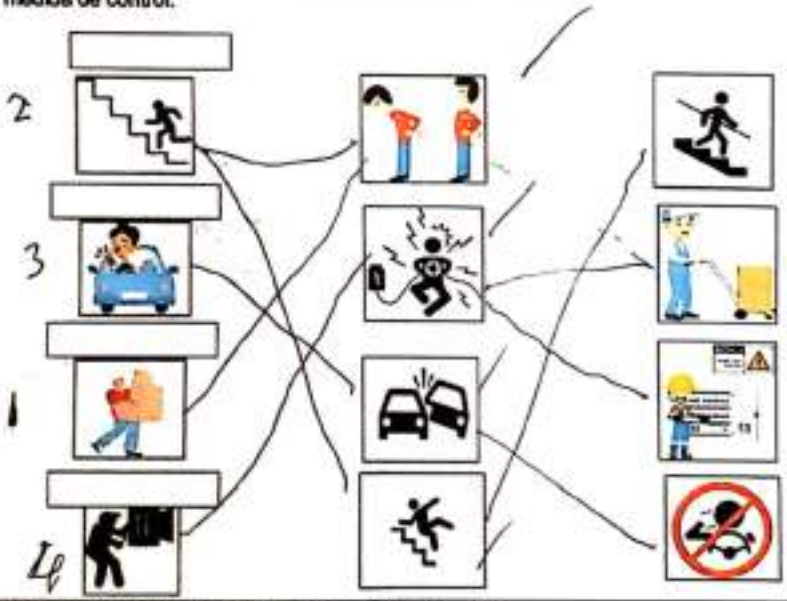

NOMBRE DEL EVALUADOR	Carlos Rabayo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

1935

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	29/03/2024	NOTA OBTENIDA:	
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Ihan Carlos Medina		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere**, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor **afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

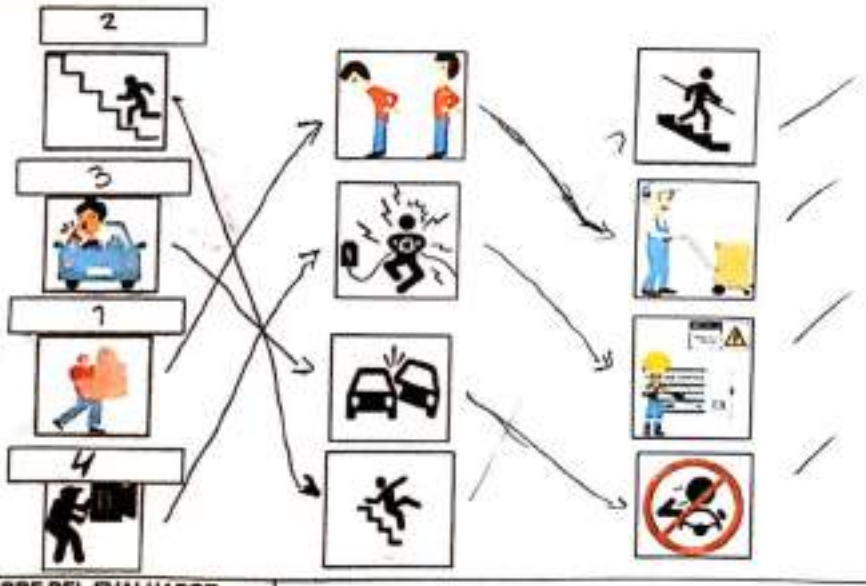

NOMBRE DEL EVALUADOR	5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

1936

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	21/03/2024	NOTA OBTENIDA:	5.
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Ubaldo A Zapata.		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

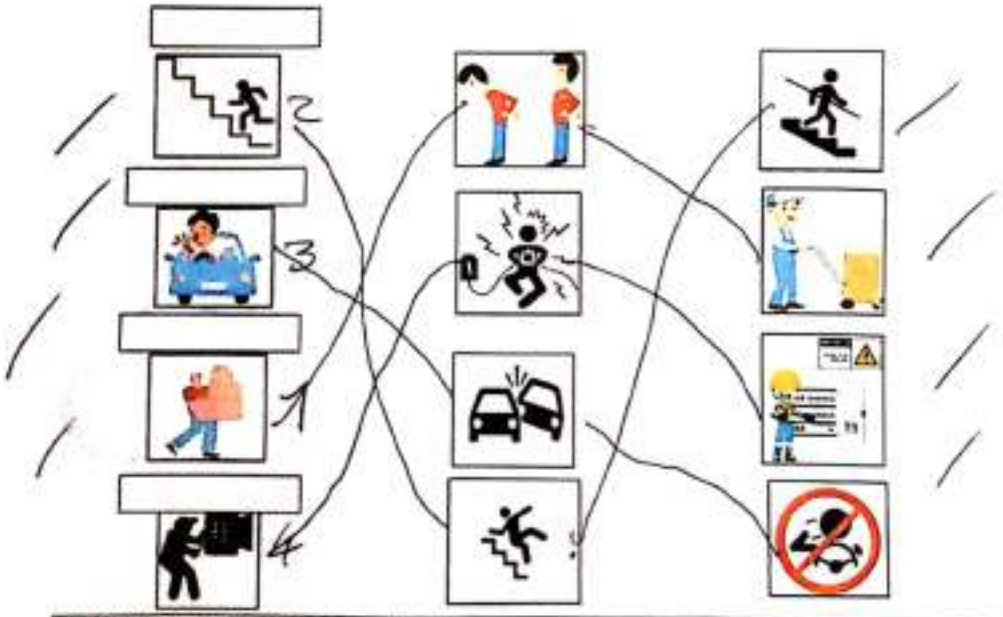

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____


Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	7/10/2023	NOTA OBTENIDA:	5
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Alexis Mendez		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.

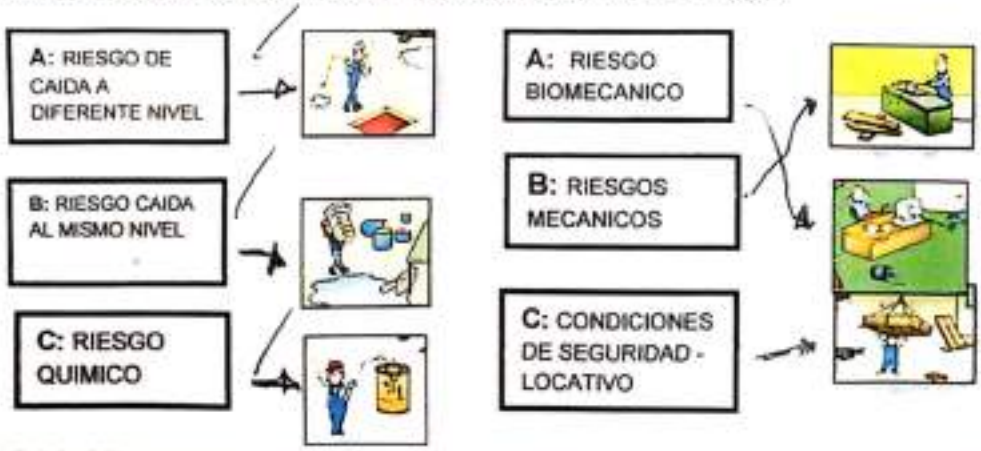

2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

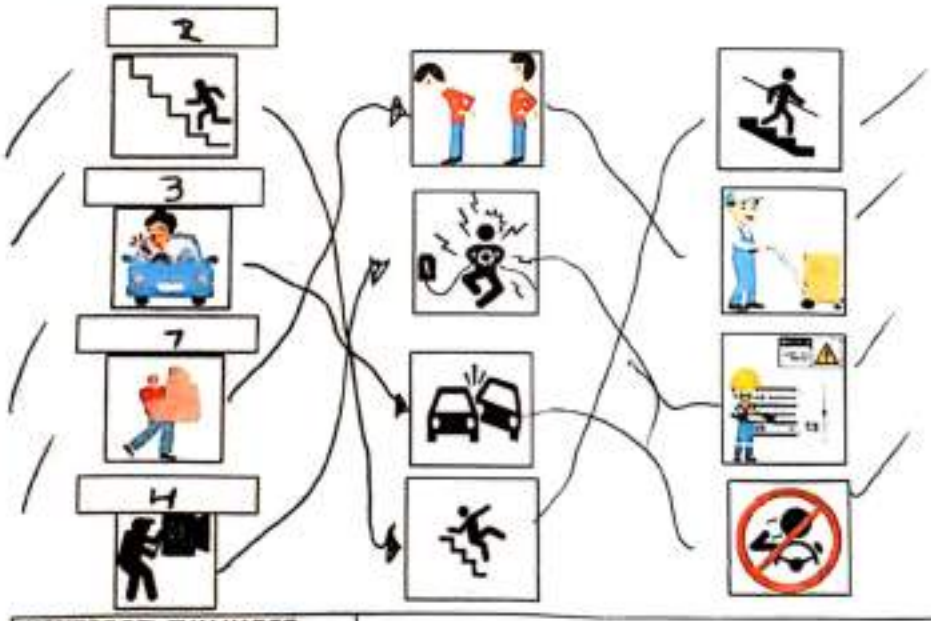

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	7/05/2024.	NOTA OBTENIDA:	5.
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Juan Armando Montealegre Rojas		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:			

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.



2. **Del 1 al 4 enumere**, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor **afectación, después** deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y **medida de control.**

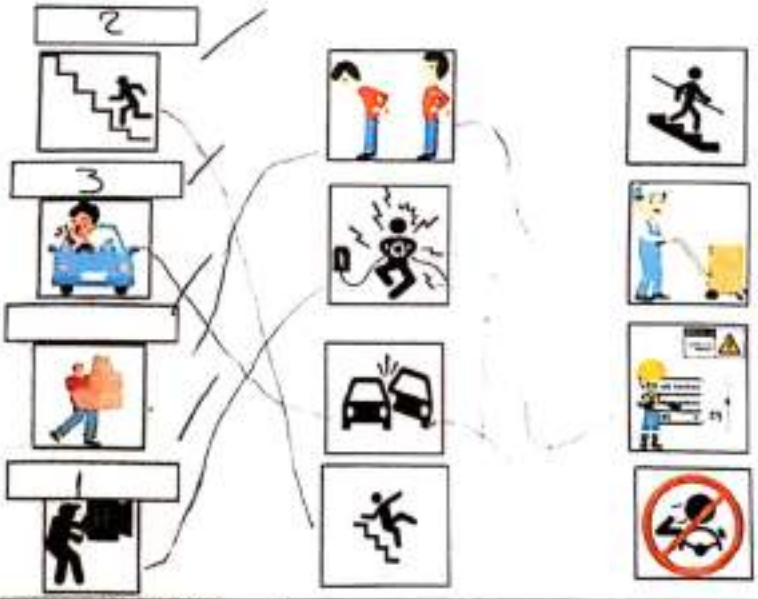

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner


1938

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	21/03/2024.	NOTA OBTENIDA:	5.
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	[illegible]		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:	[illegible]		

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.

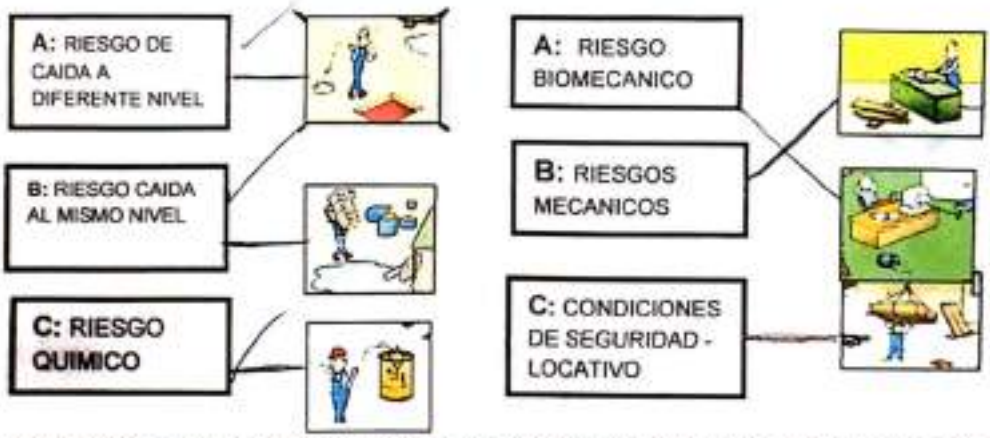

2. **Del 1 al 4** enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor **afectación, después** deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y **medida de control.**

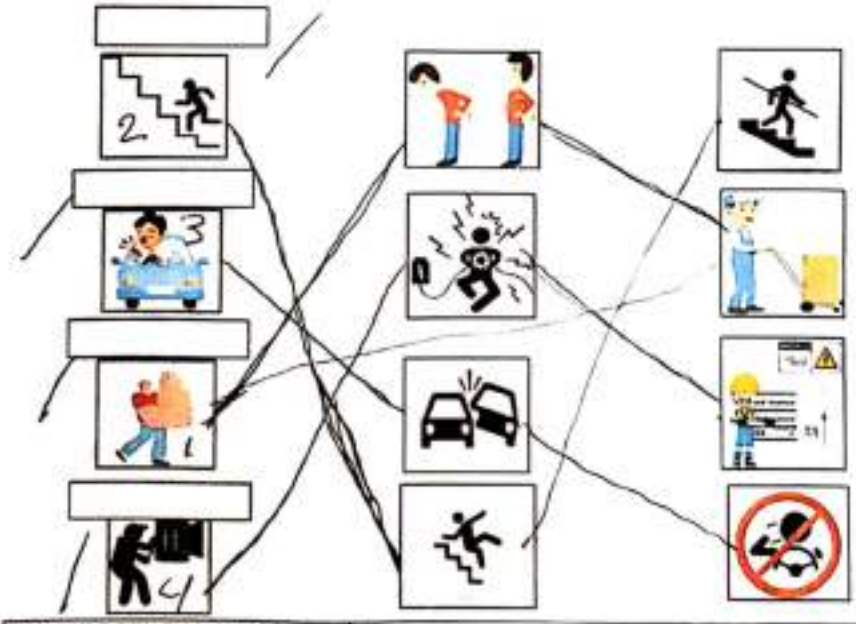

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner


1939

SINERGIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-09
	Evaluación de conocimiento	Versión:	02
		Fecha:	01/11/2023


FECHA:	21/03/2024	NOTA OBTENIDA:	5
TEMA DE LA CAPACITACION:	Taller de riesgos		
NOMBRES DEL EVALUADO:	Efrain Sanchez Sales		
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:	Aldo Medina		

Objetivo: Determinar y verificar el grado de conocimiento en la identificación de riesgos y peligros.

1. A continuación, une con una línea el tipo de riesgo al que pertenece la imagen.

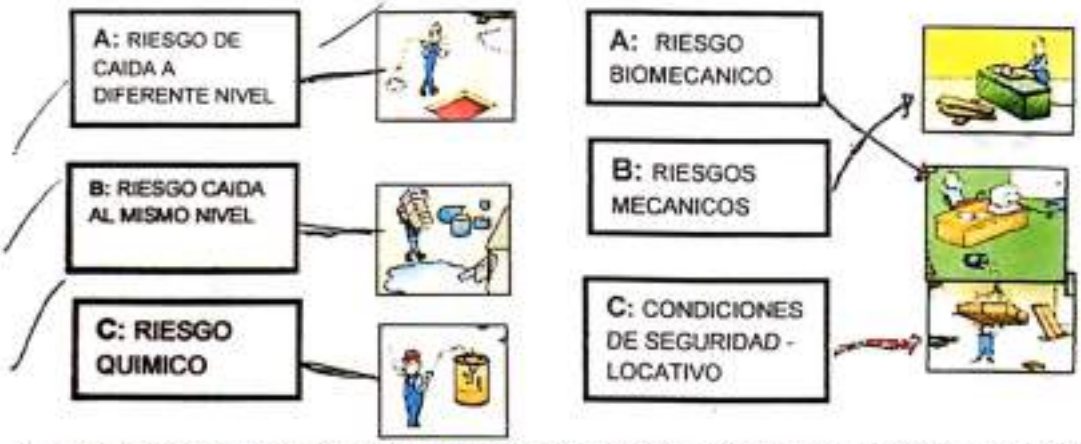

2. **Del 1 al 4 enumere, de mayor a menor el riesgo, siendo 4 el de mayor afectación y 1 el de menor afectación, después deberá unir las imágenes con una línea según corresponda: riesgo, consecuencia y medida de control.**

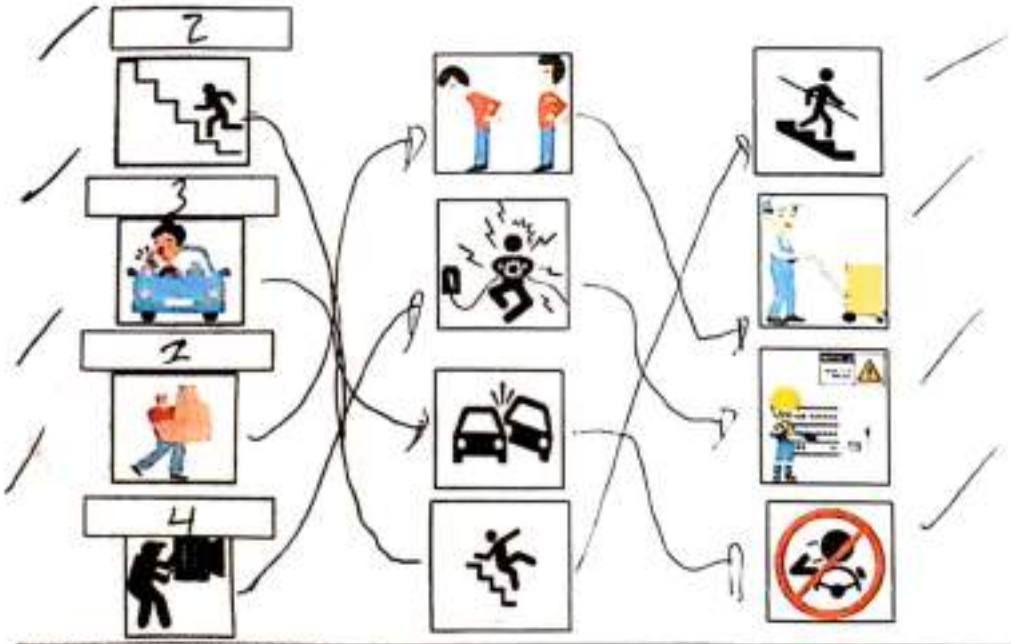

NOMBRE DEL EVALUADOR	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Powered by CamScanner

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso



Fecha: 20/Feb/2024, **Hora:** 09:48:08 a.m.
Apellido: MENDEZ TIRADO **Nombre:** ALEXIS
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1006507466
Empresa: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Direccion: MZ 8 CASA 38 B/ LA GLORIA
Telefono: **Celular:** 3144831301 **Email:** **Estado Civil:** Soltero
Ciudad: :: No Aplica ::
Peso: 64 Kg **Estatura:** 170 Cm **IMC:** 22.1 **Escolaridad:** Bachiller **Jornada Laboral:** DIURNA
EPS: Sin Definir **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Responsable: - **Parentesco:** - **Telefono:**

HC: # 45254
Edad: 22 años
Sexo: Masculino
Nacim: 31/Dic/2001
Rh: A+

Examenes Realizados

Audiometria Clinica, COLESTEROL TOTAL FOA, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Basico, GLICEMIA FOA, Osteomuscular, TRIGLICERIDOS FOA, Visiometria

Recomendaciones Especificas

Uso de Elementos de Proteccion Personal, Estilo De Vida Saludable, Osteomusculares: Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas

Concepto

Apto sin restricciones
Apto Para Trabajos En Alturas
Apto con énfasis osteomuscula

Recomendaciones Personalizadas

Se recomienda realizar actividad fisica como ejercicio cardiovascular (trotar, correr, nadar, montar bicicleta o asistir al gimnasio) 3 veces a la semana por espacio de 30 minutos como mínimo, realizar estiramiento y higiene postural en su lugar de trabajo al iniciar y terminar su labor

Observaciones

Se realiza encuesta previamente al paciente, valoración médica ocupacional con elementos de bioseguridad, acorde a protocolo de Covid 19 del ministerio de salud. No cursa con ninguna comorbilidad para Covid 19.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Jorge Andres Bolivar G.
Med. Especialista en Salud de Trabajo
Universidad del Rosario
Reg. Med. Esp. 123

Jorge Andres Bolivar Gomez Medico
Médico Esp. en Medicina del Trabajo
Registro #: Reg. Med. Esp. 123

Alexis Mendez

ALEXIS MENDEZ TIRADO
CC 1006507466

Huella Digital

MEDI-SALUD

NIT: 900617163-6

RESULTADOS

FECHA: 2024-01-26 HORA: 08:21:20

1006521638

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS

NOMBRE:	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO	**DOCUMENTO:**	1006521638	**EDAD:**	31.1 Años
DIRECCIÓN:	B/ANDES BAJOS Florencia	**TELÉFONO:**	32386422326	**F.Nacimiento:**	1992-12-25
EMPRESA:	SINERGIA COSNTRUCTORA ZOMAC S.A.S			**GENERO:**	M



CERTIFICACIÓN DE TAREA

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS

ANALISIS: La certificación de las condiciones de salud para realizar trabajos en alturas, está reglamentada por las Resoluciones 2346 de 2007 y 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo y establece que todo trabajador que vaya a realizar es tipo de tareas se debe realizar un Examen Médico Ocupacional para certificar la conformidad con los requisitos establecidos.

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS: **APTO**

OBSERVACIONES:

CONSIDERACIONES PARA LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS: Este tipo de trabajos están considerado como de alto riesgo para la seguridad y vida de los trabajadores que los realizan, por el riesgo de caídas. La evaluación médica se ciñe a lo establecido en las Resoluciones 4272 de 2021 del ministerio de trabajo, 2346 de 2007 y la 1918 del 2009 de los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social y al Protocolo Médico propuesto por Colmédicos, para definir la aptitud en aspirantes a realizar trabajos en alturas. Esta certificación establece que las condiciones de salud del trabajador son adecuadas, con relación a las exigencias psicofísicas de la tarea.

Para su realización se tuvieron en cuenta:

1. Las respuestas dadas en el cuestionario de declaratoria de estado de salud, la cual fue revisada y ampliada por el Médico evaluador para descartar patologías de alto riesgo, tal como es la epilepsia.

2. La Audiometría, para valorar el estado de salud auditiva y establecer la capacidad auditiva para escuchar órdenes y advertencias.

3. Los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico, para evaluar el estado del metabolismo y su asociación con alteraciones del peso y otras, que puedan generar recomendaciones médicas, con el objeto de minimizar riesgos a la salud.

4. Las demás pruebas complementarias realizadas, para perfilar su condición de salud, con relación a los riesgos de la ocupación.

5. Un completo examen médico, que incluye un énfasis osteomuscular para descartar alteraciones de los arcos de movimiento articular, la fuerza o patologías que limiten su capacidad física y un exhaustivo examen del equilibrio, el cual incluye pruebas clínicas de equilibrio dinámico y estático.

Se certifica entonces la conformidad del cumplimiento de los requisitos establecidos para poder desempeñar la tarea sin riesgo para su salud ni la de terceros. Los resultados de las pruebas clínicas y de Laboratorio Clínico realizadas, están consignadas en la Historia Clínica Ocupacional y el trabajador evaluado ha sido informado de los resultados de esta evaluación y de cualquier condición que requiera un plan de manejo.

Se certifica entonces la conformidad del cumplimiento de los requisitos establecidos para poder desempeñar la tarea sin riesgo para su salud ni la de terceros.





Firma para identificación de usuario
CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO

Responsable: CIRO ORLANDO IBARRA MUNOZ

Escanee el código si desea verificar datos

Calle 6 No.9B-10 Las Avenidas Florencia - Colombia PBX: 4358300
medisalud.rednacional.com.co noreply@rednacional.com.co

MEDI-SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-01-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	SINERGIA COSNTRUCTORA ZOMAC S.A.S	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	EDRAS BERNATE	Documento:	CC 1117544116
Fecha de nacimiento:	1996-04-07	Lugar de nacimiento:	CURILLO (Caqueta)
Edad:	27 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	B/JORGE ELIECER	Municipio:	FLORENCIA
Teléfono:	3219614527	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AUXILIAR OBRERO	EPS:	Nueva EPS
Responsable**:	EDRAS (PROPIO)	Teléfono:	3107627810
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



** *La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a EDRAS BERNATE con documento de identificación No. 1117544116 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR OBRERO del sector económico Servicios

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales; - Triglicéridos: Dentro de valores límites normales; - Colesterol total: Dentro de valores límites normales.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

1994



CIRO ORLANDO IBARRA MUNOZ
MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL
Lic Salud Ocupacional:Ni¿½ 1121 del 12/04/2006
RESOLUCION:Ni¿½01886-03-2016
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Firma para identificación de usuario
EDRAS BERNATE
Documento: 1117544116

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 6 No.9B-10 Las Avenidas Florencia - Colombia PBX: 4358300
medisalud.rednacional.com.co noreply@rednacional.com.co

Impreso por: cristian.carvajal
Fecha: 2024-01-29 Hora: 15:53

Laboremos
Seguridad, salud y ambiente

Medicina Laboral y Salud Ocupacional

1945

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso



Fecha: 03/Feb/2024, **Hora:** 04:29:14 p.m.
Apellido: CORDOBA VARGAS **Nombre:** ELKYN GEOVANNY
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1119214582
Empresa: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Direccion: INSPECCION DE MATEGUADUA
Telefono: **Celular:** 3202222802 **Email:** **Estado Civil:** Union Libre
Ciudad: :: No Aplica ::
Peso: 83 Kg **Estatura:** 162 Cm **IMC:** 31.6 **Escolaridad:** Bachiller **Jornada Laboral:** DIURNA
EPS: ASMET SALUD **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Responsable: - **Parentesco:** - **Telefono:**

HC: # 44428
Edad: 34 años
Sexo: Masculino ♂
Nacim: 23/Jul/1989
Rh: O+

Examenes Realizados
Audiometria Clinica, COLESTEROL TOTAL FOA, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Basico, GLICEMIA FOA, Osteomuscular, TRIGLICERIDOS FOA, Visiometria

Recomendaciones Especificas
Uso de Elementos de Proteccion Personal, Estilo De Vida Saludable, Osteomusculares: Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas., Incluir en el sistema de vigilancia Epidemiologico Riesgo Cardiovascular

Concepto
Apto sin restricciones
Apto con énfasis osteomuscula

Recomendaciones Personalizadas
Implementar ejercicio cardiovascular minimo 3 veces a la semana se recomienda control de peso corporal,seguimiento por nutrición, debe consumir con regularidad frutas en el desayuno, mejor diariamente verduras y abundante agua o liquidos, en lo posible no consumir bebidas gaseosas, fritos, realizar higiene postural en su lugar de trabajo.

Observaciones
Se realiza encuesta previamente al paciente, valoración médica ocupacional con elementos de bioseguridad, acorde a protocolo de Covid 19 del ministerio de salud. No cursa con ninguna comorbilidad para Covid 19

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador, cuyos datos firma y consten en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Jorge Andres Bolivar G.
Med. Especialista en Salud en el Trabajo
Universidad del Rosario
Reg. Med. Esp. 123

Jorge Andres Bolivar Gomez Medico
Médico Esp. en Medicina del Trabajo
Registro #: Reg. Med. Esp. 123

ELKIN

ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS
CC 1119214582

Huella Digital

Calle 16 A No. 6-55 Barrio 7 de Agosto
Teléfonos Celular 3114582632-3118891942
Email laboremos1431@yahoo.com Citas recepcionlaboremos@gmail.com

Laboremos
Seguridad, salud y ambiente

Medicina Laboral y Salud Ocupacional

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso



Fecha: 20/Feb/2024, **Hora:** 10:29:39 a.m.
Apellido: ROJAS HERNANDEZ **Nombre:** JAROL
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1000123463
Empresa: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Direccion: CRA 8 N 2A - 10 B/ TOVAR ZAMBRANO
Telefono: **Celular:** 3106038829 **Email:** **Estado Civil:** Soltero
Ciudad: ::: No Aplica :::
Peso: 72 Kg **Estatura:** 170 Cm **IMC:** 24.9 **Escolaridad:** Bachiller **Jornada Laboral:** DIURNA
EPS: ASMET SALUD **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Responsable: - Parentesco: - Telefono:

HC: # 45257
Edad: 22 años
Sexo: Masculino ♂
Nacim: 27/Dic/2001
Rh: O+

Examenes Realizados
Audiometria Clinica, COLESTEROL TOTAL FOA, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Basico, GLICEMIA FOA, Osteomuscular, TRIGLICERIDOS FOA, Visiometria

Recomendaciones Especificas
Uso de Elementos de Proteccion Personal, Estilo De Vida Saludable, Osteomusculares: Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas., Visual: Educación en higiene visual, Uso de protección visual según tipo de exposición,adecuada iluminación del puesto de trabajo, pausas visuales.

Concepto
Apto sin restricciones
Apto Para Trabajos En Alturas
Apto con énfasis osteomuscula

Recomendaciones Personalizadas
Implementar ejercicio cardiovascular mínimo 3 veces a la semana se recomienda consumir con regularidad frutas en el desayuno, incluir diariamente verduras y abundante agua o liquidos, en lo posible no consumir bebidas gaseosas, fritos, realizar higiene postural en su lugar de trabajo.

Observaciones
Se realiza encuesta previamente al paciente, valoración médica ocupacional con elementos de bioseguridad, acorde a protocolo de Covid 19 del ministerio de salud. No cursa con ninguna comorbilidad para Coval 19.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador, cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Jorge Andres Bolivar G.
Med. Especialista en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de Trabajo
Universidad del Rosario
Reg. Med. Esp. 123

Jorge Andres Bolivar Gomez Medico
Medico Esp. en Medicina del Trabajo
Registro #: Reg. Med. Esp. 123

JAROL ROJAS HERNANDEZ
CC 1000123463

Huella Digital

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso



Fecha: 03/Feb/2024. **Hora:** 04:15:55 p.m.
Apellido: PEREZ OSORIO **Nombre:** SEBASTIAN
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1006596953
Empresa: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Direccion: MONTAÑITA CAQUETA
Telefono: **Celular:** 3202620551 **Email:** **Estado Civil:** Union Libre
Ciudad: ::: No Aplica :::
Peso: 69 Kg **Estatura:** 174 Cm **IMC:** 22.7 **Escolaridad:** Bachiller **Jornada Laboral:** DIURNA
EPS: ASMET SALUD **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Responsable: - **Parentesco:** - **Telefono:**

HC: # 44426
Edad: 24 años
Sexo: Masculino ♂
Nacim: 20/Dic/1999
Rh: O+

Examenes Realizados
Audiometria Clinica, COLESTEROL TOTAL FOA, Examen Alturas, Examen Medico Ocupacional Basico, GLICEMIA FOA, Osteomuscular, TRIGLICERIDOS FOA, Visiometria

Recomendaciones Especificas
Uso de Elementos de Proteccion Personal, Control Epi, Estilo De Vida Saludable, Osteomusculares: Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas , Incluir en el sistema de vigilancia Epidemiologico Riesgo Cardiovascular

Cargos
Apto Con Patologia Que No Impide Su Capacidad Laboral
Apto Para Trabajos En Alturas
Apto con énfasis osteomuscula

Recomendaciones Personalizadas
Implementar ejercicio cardiovascular minimo 3 veces a la semana se recomienda control de peso corporal,seguimiento por nutrición, debe consumir con regularidad frutas en el desayuno, incluir diariamente verduras y abundante agua o liquidos, en lo posible no consumir bebidas gaseosas, fritos, realizar higiene postural en su lugar de trabajo

Observaciones
Se realiza encuesta previamente al paciente, valoración médica ocupacional con elementos de bioseguridad, acorde a protocolo de Covid 19 del ministerio de salud. No cursa con ninguna comorbilidad para Covid 19.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador, cuyos datos firma y consta en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Jorge Andres Bolivar G.
Med. Especialista en Salud en el Trabajo
Universidad del Rosario
Reg. Med. Esp. 123

Jorge Andres Bolivar Gomez Medico
Medico Esp. en Medicina del Trabajo
Registro #: Reg. Med. Esp. 123

Sebastian Perez Osorio

SEBASTIAN PEREZ OSORIO
CC 1006596953

Huella Digital

1948

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-027
		Versión:	2
	Inspección elementos químicos y saneamiento	Fecha:	30/08/2023

Fecha de inspeccón:	26/07/2024	Area:	Mategnadua.	Periodo:	

ASPECTOS A VERIFICAR	CLASIFICAR				OBSERVACIONES
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	N/A	
QUÍMICO					
El personal de aseo y cafeteria utilizan los elementos de protección personal: guantes, y zapatos antideslizantes (para la manipulación de sustancias de aseo).				X	
El personal de aseo y cafeteria conocen los riesgos y las acciones de primeros auxilios con cada sustancia.				X	
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.	X				
Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química.	X				
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas			X		
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.	X				
Existe un lugar para el almacenamiento de las sustancias químicas y este es adecuado a la cantidad y caracteristicas de la sustancia.		X			
El lugar en donde se encuentra almacenadas al sustancias químicas cuentan con circulación constante y ventilación		X			
Están almacenadas en un lugar seguro, lejos del sol o agua constante		X			

Powered by CamScanner

1949

ASPECTOS A VERIFICAR	CLASIFICAR				OBSERVACIONES
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	N/A	
SANEAMIENTO					
El número de sanitarios están en proporción de uno por cada 15 trabajadores.			X		
Los servicios sanitarios están discriminados por sexos.			X		
Se tiene un programa sistemático para el control de plagas. (Solicitar el último registro de mantenimiento y programa al area quien lo realice)	X				
El almacenamiento de basuras se hace en lugares con ventilación e iluminación adecuada.	X				
Se cuenta con un area adecuada para el almacenamiento de desechos (Solidos, liquidos o gaseosos)	X				
Los sitios de almacenamiento de basuras cuentan con un programa de orden y aseo.	X				
Las baterías sanitarias cuentan con plan sistemáticos de aseo y desinfección.	X				

QUIEN INSPECCIONA:	Paola Medina	**QUIEN VERIFICA:**	
CARGO:	Asesora SST	**CARGO:**	
FECHA:	26/02/2024.	**FECHA:**	
FIRMA:	Paola Medina	**FIRMA**	

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

3950

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerada SENA e ICBF
NIT 901183454	6	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAE S.A.S	6 - MAYOR DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	CRA 4 15-06	FLORENCIA-CAQUETA	3202855151	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	S10050570	96942851291	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ingreso	retiro	tarifa especial	cambio salario	variación permanente	variación transitoria	vacaciones	incapacidad general	licencia maternidad	licencia remunerada	suspensión	aporte voluntario	ausencia	ajuste	ERT			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBREROS SINERGIA 2022 (23 Afiliados)																						$21,623,336	$3,460,000			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$1,505,800			$0	$0		$6,696,300
Centro de Trabajo: OBRAS RIESGO V (23 Afiliados)																						$21,623,336	$3,460,000			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$1,505,800			$0	$0		$6,696,300
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)																						$21,623,336	$3,460,000			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$1,505,800			$0	$0		$6,696,300
1	CC	1123729699	BAEZ ENDHATAM																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
2	CC	1117941119	BERRATE ESPAI																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
3	CC	1118188478	CHACON JOSE		X																23003 1	1	$43,334	$7,000	PS029	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-13	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
4	CC	1119214583	CORDOBA RIVER	X																	23003 1	24	$1,040,000	$166,400	DS043	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-13	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
5	CC	1117548115	CUELLAR BRAYAN																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	DS043	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
6	CC	1765813	CUERVO ISRAEL																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
7	CC	1006569166	FERICO STIVEN																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	DS043	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
8	CC	1075211675	FRACICA JULIAN		X																23003 1	1	$43,334	$7,000	DS043	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-13	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
9	CC	1117552104	GOMEZ EDINSON																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	DS043	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
10	CC	1117510887	GONZALES GABRIEL																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
11	CC	1118150S4	GUZMAN ALEXANDER																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
12	CC	1117545138	HOLGUIN JULIAN																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
13	CC	1117519888	LLANOS DANIEL																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
14	CC	1006208514	MARTINEZ DARIO	X																	23-14	9	$390,000	$62,400	PS037	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-13	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
15	CC	1006407444	MENDEZ ULISES	X																	23003 1	9	$390,000	$62,400	DS043	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-13	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
16	CC	1006510839	OSPINA ALEXANDER		X																23003 1	1	$43,334	$7,000	PS037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-13	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
17	CC	1117887738	OYOLA JULIAN		X																23003 1	1	$43,334	$7,000	PS037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-13	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
18	CC	1006594951	PEREZ SEBASTIAN	X																	23003 1	24	$1,040,000	$166,400	DS043	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-13	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
19	CC	1006538869	QUIJANO HERNANDO																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
20	CC	1006529438	ROBAYO CARLOS																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	DP1005	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
21	CC	1006113463	ROJAS LUCAS	X																	23003 1	9	$390,000	$62,400	DS043	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-13	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
22	CC	1007433598	TRUJILLO IVAN																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	PS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
23	CC	1116303171	TRUJILLO JHON																		23003 1	30	$1,300,000	$208,000	DS043	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
Total	**Afiliados(23)**																					$21,623,336	$3,460,000			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$1,505,800			$0	$0		$6,696,300

aportes en línea

Planilla Resumen

2952

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901083594	9	SINERGIA CONSTRUCTORA 2024AC S.A.S	B - AEMOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	CRA 4 15-66	FLORENCIA-CAQUETA	3203855153	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	51090515	94648129?	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$3,460,000	$0	$0	$3,460,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,120,200	$0	$0	$3,120,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$277,400	$0	$0	$277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	23	$865,200	$0	$0	$865,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	$324,200	$0	$0	$324,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$209,800	$0	$0	$209,800
TOTAL				23	$6,696,200	$0	$0	$6,696,200

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-53
	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Versión:	1
		Fecha:	17/02/2024

Nombre y apellido: Carlos Andres Rosero	Identificación: 1.120.521.038	Fecha de nacimiento: 25-12-1992.
Tipo de persona: 15-02-2024.	Cargo: Auxiliar de aseo	
Datos personales	Obra/proyecto: EDS Montevideo.	Fecha registro:

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA	OBSERVACION
1	Nombres y apellidos	Carlos Andres Rosero	
2	Tipo de documento		
3	numero de CC	1.120.521.038	
4	Direccion de residencia	Calle 2 Nº 6-02 Alfonso	
5	correo electronico	Carlosrosero2002@gmail.com	
6	Edad	22.	
7	Telefono	321 804 2226	
8	Estado civil		
9	persona de contacto en caso de emergencia		
10	Numero de contacto en caso de emergencia		
11	cual es la situacion de su ultima formación academica	Bachiller	
12	Actualmente esta estudiando	NO	
13	Eres cabeza de familia	SI	
14	Numero de personas a cargo	2.	
15	Numero de hijos		
16	Fecha de nacimiento	25-12-1992	
17	Tipo de RH	O+	
18	Altura/talla	1.67	
19	Indice masa corporal		
20	peso KG	75 kg.	
21	EPS afiliado	Sanitas	
22	AFP afiliado	Porvenir	
23	cargo actual en la empresa	Auxiliar de aseo	
24	Sexo	Masculino	
25	Tipo de vivienda	Arrendado	
26	Tipo de relacion laboral		
27	Nivel de educacion	Bachillerato	
28	Antigüedad en la empresa	1 mes	
29	Eres alergico a algo	NO	
30	Realiza actividad fisica	NO	
31	Consumes licor	NO.	
32	Fuma	NO.	
33	Padece alguna Fobia o condición que limite la realización de sus ac	NO	
34	cual es su estatura	1.67.	
35	Le han diagnosticado alguna enfermedad SI la respuesta es SI (describa)	NO	
36	Que actividades les gustaria que implementáramos desde Seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones Pausas activas	

Calificacion:	
Firma Cds R.	

Powered by CamScanner

1953

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-53
	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Versión:	1
		Fecha:	17/02/2024

Nombre y apellido: ELKIN Casseres Cordoba	Identificación: 1.114.214.532	Fecha de nacimiento: 23-jul-1989
Tipo de persona:	Cargo: Auxiliar de obra	Fecha Registro: 15-07-2024
Datos personales	Obra/proyecto: Edificio Torre suelos	

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA	OBSERVACION
1	Nombres y apellidos	ELKIN Casseres Cordoba	
2	Tipo de documento	CC	
3	numero de CC	1.114.214.532	
4	Direccion de residencia	Corregimiento Malagueñas	
5	correo electronico	elkincasseres@hotmail.com	
6	Edad	35	
7	Telefono	3207772802.	
8	Estado civil	Union libre.	
9	persona de contacto en caso de emergencia		
10	Numero de contacto en caso de emergencia		
11	cual es la situacion de su ultima formación academica	Bachiller.	
12	Actualmente esta estudiando	NO	
13	Eres cabeza de familia	SI	
14	Numero de personas a cargo	3.	
15	Numero de hijos	3	
16	Fecha de nacimiento	23-jul-1989.	
17	Tipo de RH	O+	
18	Altura/talla	1,62.	
19	indice masa corporal	71,6.	
20	peso KG	83,5.	
21	EPS afiliado	Asmet Salud.	
22	AFP afiliado		
23	cargo actual en la empresa	Auxiliar de obra	
24	Sexo		
25	Tipo de vivienda	Propia	
26	Tipo de relacion laboral	Contratacion Libre	
27	Nivel de educacion	Bachiller	
28	Antigüedad en la empresa	1 mes	
29	Eres alergico a algo	NO	
30	Realiza actividad fisica	Si, futbol.	
31	Consumes licor	Ocasionalmente	
32	Fuma	NO	
33	Padece alguna Fobia o condición que limite la realización de sus ac	NO	
34	cual es su estatura	1,62	
35	Le han diagnosticado alguna enfermedad Si la respuesta es SI (describa)	NO	
36	Que actividades les gustaria que implementáramos desde * Seguridad y salud en el trabajo	NO	

Calificacion:

Firma ELKIN

Powered by CamScanner

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FR-53
	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Versión:	1
		Fecha:	17/02/2024

Nombre y apellido: Sebastian Rivel Urrego	Identificación: 1.006.546.453	Fecha de nacimiento:	
Tipo de persona:	Cargo: Practicante de obra	20-12-1999	
Datos personales	Obra/proyecto: Cra. Multifamiliar	Fecha registro: 11/12/2024	

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA	OBSERVACION
1	Nombres y apellidos	Sebastian Rivel Urrego	
2	Tipo de documento	CC	
3	numero de CC	1.006.546.453	
4	Direccion de residencia	Conjunto Residencial Mirandela	
5	correo electronico	urregosebastian0@hotmail.com	
6	Edad	25	
7	Telefono	320 262 0551	
8	Estado civil	Union Libre	
9	persona de contacto en caso de emergencia		
10	Numero de contacto en caso de emergencia		
11	cual es la situacion de su ultima formación academica	Bachiller	
12	Actualmente esta estudiando	NO	
13	Eres cabeza de familia	NO	
14	Numero de personas a cargo	0	
15	Numero de hijos	1	
16	Fecha de nacimiento	20-12-1999	
17	Tipo de RH	O+	
18	Altura/talla	1,74	
19	indice masa corporal	22.7	
20	peso KG	69 kg	
21	EPS afiliado	Asmet Salud	
22	AFP afiliado		
23	cargo actual en la empresa	Auxiliar de obra	
24	Sexo	Masculino	
25	Tipo de vivienda	Arrendado	
26	Tipo de relacion laboral	Definido	
27	Nivel de educacion	Bachiller	
28	Antigüedad en la empresa	1 mes	
29	Eres alergico a algo	NO	
30	Realiza actividad fisica	S, Futbol	
31	Consumes licor	NO	
32	Fuma	Si	
33	Padece alguna Fobia o condición que limite la realización de sus ac	NO	
34	cual es su estatura	1,74	
35	Le han diagnosticado alguna enfermedad Si la respuesta es SI (describa)	NO	
36	Que actividades les gustaría que implementáramos desde Seguridad y salud en el trabajo	Ruta Natural, Capacitaciones	

Calificacion:	

Firma Sebastian Rivel

Powered by CamScanner

Sede Administrativa Carrera 11 No. 10 - 34 – Fax: 114
Centro Multiple de Servicios Transv. 6a Calle 12 Av. Roberto Cleves – Fax: 223
e - mail Atención al usuario: atencionalusuario@comfaca.com
Teléfono: 4344300
www.comfaca.com

PM-PM-F102-V4

FORMULARIO DE AFILIACIÓN

IMPORTANTE: Marque con un X según el tipo de novedad	Inscripción del trabajador	X
	Adición personas a cargo	

TIPO DE AFILIADO														
Dependiente	X	Servicio Doméstico		Madre Comunitaria		Taxista		Facultativos						
Trab. Independiente 2%		Trab. Independiente 0.6%		Pensionados 0.6%		Pensionados 2%		Pensionado 0%		Fidelidad				

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social de la Empresa:			Nit.
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S			901283654
Sucursal: 001	Teléfono 3202855153	Ciudad: FLORENCIA	Correo Electrónico (Obligatorio) CONTABILIDADSINERGIAZOMAC@GMAIL.COM

2. DATOS DEL TRABAJADOR

No. Identificación	C.C.	C.E.	Celular:	Correo Electrónico
1006507466	PAS.	T.I.	3144831301	INGENIEROSOFI@HOTMAIL.COM

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
MENDEZ	TIRADO	ALEXIS

Fecha de Nacimiento			Sexo			Estado civil										Tipo de Contrato					
2001	12	31	M	M	I	U.L.		CAS.		DIV.		SEP.		VIU.		SOL.	X	ND		Fijo	X	Ind.		Parcial	

Fecha de Ingreso a la Empresa			Salario	Gana Comisión		Ocupación
2024	02	22	$ 1300000	SI	NO	OBREROS Y PEONES DE CARGA

Horas trabajadas diarias	Dirección lugar donde desarrolla su labor:	Barrio	Ciudad	U / R
240	VRD CENTRO VIDA		LA MONTANITA	

Usted labora en otra empresa	SI	NO	Cual?
		X	

Dirección del Trabajador	Barrio	Ciudad	U / R
ET 1 BRR LA GLORIA		FLORENCIA	

NIVEL DE ESCOLARIDAD		Básica Secundaria	X	Media		Secundaria Adultos		Técnico/Tecnológico		Posgrado/Maestría	
				Básica Adultos		Media Adultos		Profesional Univ.		Ninguno	No Disp.

Presenta Alguna Discapacidad? SI [ ] NO [X] Cual? / Tipo de Vivienda - Propia [X] Familiar [ ] Arrendada [ ] Hipoteca [ ]

3. FACTOR DE VULNERABILIDAD

Desmovilizado o Reinsertado		Victima conflicto armado (no desplazado)		Desplazado		Ejercicio del trabajo Sexual	
Hijo(as) de madres cabeza de familia		Cabeza de familia		Hijo (as) de desmovilizados o Reinsertados		Damnificado desastre natural	
Población Zonas Fronteras(nacionales)		Población Migrante		En condición de discapacidad		No Aplica	X

4. PERTENENCIA ETNICA

Afrocolombiano		Indígena		Raizal Del Archipiélago De San Andrés	
Comunidad Negra		Palenquero		Room/gitano	
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores				No Disponible	X

5. ORIENTACION SEXUAL

Heterosexual	X	Bisexual	
Homosexual		No Disponible	

6. DATOS DE LA CONYUGE O COMPAÑERO(A)

No. Identificación	C.C.	C.E.	Celular:	Correo Electrónico
	PAS.	T.I.		

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Fecha de Nacimiento			Sexo			Ocupación
			H	M	I	

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U / R

Nombre de la Empresa donde Trabaja	Ingresos Mensuales: $	Recibe Subsidio? SI [ ] NO [ ]

7. DATOS DEL PADRE O DE LA MADRE FUERA DE LA UNIÓN

No. Identificación	C.C.	C.E.	Celular:	Correo Electrónico
	PAS.	T.I.		

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U / R

8. DATOS DE LAS PERSONAS A CARGO

Tipo de Doc			Numero de Documento	Nombres Completos de los Hijos, Padres, o Hermanos (Que dependan económicamente del Trabajador)			Sexo		Fecha de Nacimiento			Parentesco				Discapacitados	Desplazado
RC	T.I.	C.C.		1er. Apellido	2do. Apellidos	Nombres	F	M	AÑO	MES	DIA	Hijo	Hijastro	Hermano/Hnstros	Padres		

9. OBSERVACIONES

DECLARACION JURADA
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada, así como los documentos anexos es verídica y se entiende presentada bajo la gravedad del juramento con su suscripción. Autorizo para que por todo aquel medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones correspondientes.

Alexis Mendez
FIRMA DEL TRABAJADOR

AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA INFORMACION
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, autorizo y acepto de manera voluntaria, previa y explícita, que la Caja de Compensación Familiar del Caquetá haga uso y tratamiento de mis datos personales que suministro en este formulario y aquellos catalogados como "datos sensibles" de acuerdo con la política de tratamiento de datos Personales que se encuentra en la página web de Comfaca www.comfaca.com

Alexis Mendez
FIRMA DEL TRABAJADOR

SI [X] NO [ ]

Richard Castellon
FIRMA EMPRESA

FUNCIONARIO COMFACA

Alexis Mendez
FIRMA TRABAJADOR

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3295138355418
Fecha de radicación 01/03/2024

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite	Tipo de afiliación:	Regimen
A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X]	A.Individual - Cotizante o Cabeza de familia [X]; Beneficiario o afiliado adicional [ ] B.Colectivo [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	A.Contributivo [X] B.Subsidiado [ ]

Tipo de afiliado:	Tipo de Cotizante	Código
A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ]	A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ]	registrar por la EPS: 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MENDEZ	TIRADO	ALEXIS	
Tipo de documento de identidad	**Número de documento de identidad**	**Sexo**	**Fecha de nacimiento**
CC	1006507466	Femenino [ ] Masculino [X]	31/12/2001

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Discapacidad	Condición	Puntaje SISBÉN	Grupo de población especial
06 - Otros	Ninguna			

Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC
14-23: Positiva Compania De Seguros S.A.	230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir	$ 1.300.000

Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
ETAPA 1 BRR LA GLORIA		3144831301	ingenieroscfi@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
FLORENCIA	Urbana [ ] Rural [X]		CAQUETÁ

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	Clínica Corpomédica - CARRERA 9 No. 8-77	1056

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social	Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	NI901283654	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CR 4 15 06 BRR PORVENIR	6084377092	sinergiazomac@gmail.com	FLORENCIA	CAQUETÁ

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficianos o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO 018000913876

VIGILADO Supersalud

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3295138355418
Fecha de radicación 01/03/2024

Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones
22/02/2024			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

Alexis Mendez
El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

Karena Trujillo Saenz
El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	
[X] 56. Anexo copia de documento de identidad									
Cantidad:				1					Total 1

- [ ] Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio
- [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación

Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario

Tipo de documento de identificación	Número de identificación

Observaciones
Observaciones:
Empresa:SANDRA MILENA SANCHEZ CHACON, Asesor:Gloria Arboleda, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:gloriaarboleda@asmetsalud.org.co
Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:
Url: https://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO
018000913876

VIGILADO Supersalud

ASMET SALUD EPS	CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO DE LA EPS	Versión	Edición
		Código	Hoja 1 de 1

A CONTINUACION SE PRESENTAN UNAS BREVES PREGUNTAS PARA CERTIFICAR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR ASMET SALUD EPS SAS EN EL MOMENTO DE SU AFILIACION, FAVOR MARCAR CON UNA "X" EN SI o NO, SEGÚN SEA EL CASO:

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de La Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	

CC1006507466 ALEXIS MENDEZ TIRADO

En constancia se firma a los 1 del mes de mar. de 2024

Nombre y documento de identidad del afiliado que certifica:

CC1006507466 ALEXIS MENDEZ TIRADO

Alexis Mendez

FIRMA AFILIADO

Si el afiliado no sabe o no puede firmar, el diligenciamiento y suscripción de este formato se efectuará por la persona a quien el ruegue, lo cual deberá ser ratificado por el afiliado a través de su huella.

FIRMA A RUEGO

Nombres y apellidos:

Documento de identidad: Edad:

Domicilio (Dirección y ciudad):

HUELLA AFILIADO

VIGILADO Supersalud

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALEXIS MENDEZ TIRADO, identificado(a) con cédula de ciudadania **1.006.507.466**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3284464355418
Fecha de radicación 09/02/2024

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite	Tipo de afiliación:	Regimen
A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X]	A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	A.Contributivo [X] B.Subsidiado [ ]

Tipo de afiliado:	Tipo de Cotizante	Código
A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ]	A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ]	registrar por la EPS: 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
PEREZ	OSORIO	SEBASTIAN	
Tipo de documento de identidad	**Número de documento de identidad**	**Sexo**	**Fecha de nacimiento**
CC	1006596953	Femenino [ ] Masculino [X]	20/12/1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Discapacidad	Condición	Puntaje SISBÉN	Grupo de población especial
06 - Otros	No aplica		0,00	

Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC
14-23: Positiva Compania De Seguros S.A.	230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir	$ 1.300.000

Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
CORREGIMIENTO MATEGUADUA		3202620551	ingenierosofi@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
LA MONTAÑITA	Urbana [ ] Rural [X]		CAQUETÁ

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	HOSPITAL DEPARTAMENTAL HOSPITAL MARIA INMACULADA ESE - CENTRO DE SALUD LA UNION PENEYA - CALLE 1 No. 1 - 05	26859

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social	Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	NI901283654	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CR 4 15 06 BRR PORVENIR	6084377092	sinergiazomac@gmail.com	FLORENCIA	CAQUETÁ

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO 018000913876

VIGILADO Supersalud

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3284464355418
Fecha de radicación 09/02/2024

Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones
07/02/2024			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

SEBASTIAN PEREZ

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [1] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [1]
- [ ] Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio
- [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación

Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario

Tipo de documento de identificación	Número de identificación

Observaciones
Observaciones:
Empresa:SANDRA MILENA SANCHEZ CHACON, Asesor:Gloria Arboleda, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:gloriaarboleda@asmetsalud.org.co
Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:
Url: https://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA
018000913876

VIGILADO Supersalud

COMFACA
Sede Administrativa Carrera 11 No. 10 - 34 -- Fax: 114
Correo Multiple de Servicios Florex. 6a Calle 12 Av. Roberto Cleros -- Fax: 323
e - mail Atención al usuario: atencionalusuario@comfaca.com
Teléfono: 4366300
www.comfaca.com

PM-FM-47-02 V4

1962

FORMULARIO DE AFILIACIÓN

IMPORTANTE: Marque con un X según el tipo de novedad | Inscripción del trabajador: X | Adicción personas a cargo:

TIPO DE AFILIADO								
Dependiente X	Servicio Domestico	Madre Comunitaria	Taxista	Facultativos				
Trab. Independiente 2%	Trab. Independiente 0.6%	Pensionados 0.6%	Pensionados 2%	Pensionado 0%	Fidelidad			

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social de la Empresa			Nit
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S			901283654
Sucursal	**Telefono**	**Ciudad**	**Correo Electrónico (Obligatorio)**
001	3202855153	FLORENCIA	CONTABILIDADSINERGIAZOMAC@GMAIL.COM

2. DATOS DEL TRABAJADOR

No. Identificación	CC / CE / PAS / TI	Celular	Correo Electrónico
1006596953		3202620551	INGENIEROSOFI@HOTMAIL.COM

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
PEREZ	OSORIO	SEBASTIAN

Fecha de Nacimiento			Sexo	Estado civil								Tipo de Contrato			
1999	12	20	M:	M:	I:	U.L:	CAS:	DIV:	SEP:	VIU:	SOL: X	ND:	Fijo: X	Ind:	Parcial:	

Fecha de Ingreso a la Empresa			Salario	Gana Comisión		Ocupación
2024	02	07	$ 1300000	SI:	NO:	OBREROS Y PEONES DE CARGA

Horas trabajadas diarias	Dirección lugar donde desarrolla su labor:	Barrio	Ciudad	U / R
240	C MATEGUADUA		FLORENCIA	

Usted labora en otra empresa	SI	NO X	Cual?	Barrio	Ciudad	U / R
					FLORENCIA	

Dirección del Trabajador	Barrio	Ciudad	U / R
C MATEGUADUA		FLORENCIA	

NIVEL DE ESCOLARIDAD		Básica Secundaria	X	Media Básica Adultos		Secundaria Adultos Media Adultos		Tecnico Tecnologico Profesional Univ		Posgrado Maestria		Ninguno		No Disp.	

Presenta Alguna Discapacidad? SI: NO: X Cual? Tipo de Vivienda Propia: Familiar: Arrendada: X Hipoteca:

3. FACTOR DE VULNERABILIDAD

Desmovilizado o Reinsertado		Victima conflicto armado (no desplazado)		Desplazado		Ejercicio del trabajo Sexual	
Hijo(as) de madres cabeza de familia		Cabeza de familia		Hijo (as) de desmovilizados o Reinsertados		Damnificado desastre natural	
Población Zonas Fronterasinacionales)		Población Migrante		En condicion de discapacidad		No Aplica	X

4. PERTENENCIA ÉTNICA

Afrocolombiano		Indigena		Raizal Del Archipielago De San Andres	
Comunidad Negra		Palenquero		Room gitano	
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores				No Disponible	X

5. ORIENTACION SEXUAL

Heterosexual	X	Bisexual	
Homosexual		No Disponible	

6. DATOS DE LA CONYUGE O COMPANERO(A)

No. Identificacion	CC / CE / PAS / TI	Celular	Correo Electrónico

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Fecha de Nacimiento			Sexo			Ocupación
			H:	M:	I:	

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U / R

Nombre de la Empresa donde Trabaja	Ingresos Mensuales $	Recibe Subsidio? SI: NO:

7. DATOS DEL PADRE O DE LA MADRE FUERA DE LA UNIÓN

No. Identificación	CC / CE / PAS / TI	Celular	Correo Electrónico

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U / R

8. DATOS DE LAS PERSONAS A CARGO

Tipo de Doc			Numero de Documento	Nombres Completos de los Hijos, Padres, o Hermanos (Que dependan económicamente del Trabajador)			Sexo		Fecha de Nacimiento			Parentesco				Discapacidad	Dependiente
RC	T.I.	C.C.		1er. Apellido	2do. Apellidos	Nombres	F	M	ANO	MES	DIA	Hijo	Hijastro	Hermano Huérfano	Padre		

9. OBSERVACIONES

DECLARACION JURADA

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada así como los documentos adjuntos es verídica y se entienden presentados bajo la gravedad del juramento con su suscripción. Autorizo para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí consignados y en caso de requerirse se amplíen las aclaraciones correspondientes.

Sebastian Osorio
FIRMA DEL TRABAJADOR

AUTORIZACION PARA USO DE LA INFORMACION

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, autorizo y acepto de manera voluntaria, previa y explícita, que la Caja de Compensación Familiar del Caquetá Haga uso y tratamiento de mis datos personales que contenidos en este formulario y aquellos calificados como "datos sensibles" de acuerdo con la política de tratamiento de datos Personales que se encuentra en la página web de Comfaca www.comfaca.com

Sebastian Osorio — X — SI: — NO:
FIRMA DEL TRABAJADOR

Richard (Castellon)
FIRMA EMPRESA

FUNCIONARIO COMFACA

Sebastian Osorio
FIRMA TRABAJADOR

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SEBASTIAN PEREZ OSORIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.596.953**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

2964

E.P.S. Sanitas
Operación Sanitas Internacional
NIT. 830.251.449-6
CÓDIGO 083, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

790740638

Fecha de Radicación: 09 02 2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ROBAYO	LOZANO	CARLOS	ANDRES
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CEDULA DE CIUDADANIA	1006521638	Femenino [ ] Masculino X	25 12 1992

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: Condición:		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA - CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS	PORVENIR	$ 1.300.000

18. Residencia - Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
CRR 4 N 15 06		3106875686	EDSINGENIEROS@GMAIL.COM

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
FLORENCIA	Urbana [X] Rural [ ]	PORVENIR	CAQUETA

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	M	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	UROCAQ EU IPS	
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	NIT [ ]	901283554	

39. Ubicación - Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CR 4 15 06 BRR PORVENIR	3202865153	CONTABILIDADSINERGIAZOMAC@GMAIL.COM	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

3965

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  - Código: [ ]
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ]	[ ]		2 9 0 1 2 0 2 4

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado (Código: [ ])	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la E.PS. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la E.PS. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la E.PS. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.PS. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Carlos Andres Robayo	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
001	18				0 9 0 2 2 0 2 4	

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	EPS SANITAS RECIBIDO PARA VERIFICACION POR LA EPS	Stiker procesamiento
ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LTDA C.C. No. 900.282.038		Recibido por: A.C.I. Fecha: 09-02-2024	

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

NIT. 830.031.643-6

1966

FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.

Nombre del Afiliado CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	[X] NO
Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	[X] NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	[X] NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	[X] NO
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?	[X] NO
¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?	[X] NO

Carlos Andres Robayo

Firma del Afiliado CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO
Documento de Identidad 1006521638

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella Índice

Nombres y Apellidos:
Documento de identidad:
Edad:
Dirección de domicilio:

Nombre de la persona que no sabe firmar

FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi estado de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: **www.epssanitas.com**. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma Carlos Andres Robayo

Nombre CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO

Identificación 1006521638

Fecha 09-02-2024

Sede Administrativa Carrera 11 No. 18 - 34 -- Fax: 114
Centro Multiple de Servicios Barrio 6a Calle 12 Av. Roberto Chams -- Fax: 223
e - mail Atención al usuario: atencionalusuario@comfaca.com
Telefono: 4366300
www.comfaca.com

FORMULARIO DE AFILIACIÓN

IMPORTANTE: Marque con un X según el tipo de novedad	Inscripcion del trabajador	X
	Adición personas a cargo	

TIPO DE AFILIADO												
	Dependiente	x	Servicio Domestico		Madre Comunitaria		Taxista		Facultativos			
	Trab. Independiente 2%		Trab. Independiente 0.6%		Pensionados 0.6%		Pensionados 2%		Pensionado 0%		Fidelidad	

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social de la Empresa				Nit
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S				901283654
Sucursal	Telefono	Ciudad		Correo Electrónico (Obligatorio)
001	3202855153	FLORENCIA		CONTABILIADSINERGIAZOMAC@GMAIL.COM

2. DATOS DEL TRABAJADOR

No. Identificación	CC	CE	Celular	Correo Electrónico
1006521638	PAS	TI	3108875686	INGENIEROSOFI@HOTMAIL.COM

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
ROBAYO	LOZANO	CARLOS ANDRES

Fecha de Nacimiento			Sexo			Estado civil								Tipo de Contrato				
1992	12	25	M		I	U.L.		CAS.		DIV.		SEP.		VIU.		SOL.	x	ND		Fijo		Ind.	X	Parcial	

Fecha de Ingreso a la Empresa			Salario	Gana Comision		Ocupación
2024	01	29	$ 1300000	SI	NO	OBREROS Y PEONES DE CARGA

Horas trabajadas diarias		Direccion lugar donde desarrolla su labor:	Barrio	Ciudad	
	240	C MATEGUADA		EL PAUJIL	U R

Usted labora en otra empresa	SI	NO	Cual?
		x	

Direccion del Trabajador	Barrio	Ciudad	
CL 2E 6 62 BRR ANDES		FLORENCIA	U R

NIVEL DE ESCOLARIDAD		Basica Secundaria	X	Media Basica Adultos		Secundaria Adultos Media Adultos		Tecnico Tecnologico Profesional Univ		Posgrado Maestria		Ninguno		No Disp	

Presenta Alguna Discapacidad? SI ___ NO X Cual? ___ Tipo de Vivienda Propia X Familiar ___ Arrendada ___ Hipoteca ___

3. FACTOR DE VULNERABILIDAD

Desmovilizado o Reinsertado		Victima conflicto armado (no desplazado)		Desplazado		Ejercicio del trabajo Sexual	
Hijo(as) de madres cabeza de familia		Cabeza de familia		Hijo (as) de desmovilizados o Reinsertados		Damnificado desastre natural	
Poblacion Zonas Fronteras(nacionales)		Población Migrante		En condición de discapacidad		No Aplica	x

4. PERTENENCIA ETNICA

Afrocolombiano		Indigena		Raizal Del Archipielago De San Andres	
Comunidad Negra		Palenquero		Room (gitano)	
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores				No Disponible	x

5. ORIENTACION SEXUAL

Heterosexual	x	Bisexual	
Homosexual		No Disponible	

6. DATOS DE LA CONYUGE O COMPAÑERO(A)

No. Identificacion	CC	CE	Celular:	Correo Electronico
	PAS	TI		

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Fecha de Nacimiento	Sexo			Ocupación
	H	M	I	

Direccion de Residencia	Barrio	Ciudad	
			U R

Nombre de la Empresa donde Trabaja	Ingresos Mensuales $	Recibe Subsidio? SI	NO

7. DATOS DEL PADRE O DE LA MADRE FUERA DE LA UNIÓN

No. Identificacion	CC	CE	Celular:	Correo Electronico
	PAS	TI		

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Direccion de Residencia	Barrio	Ciudad	
			U R

8. DATOS DE LAS PERSONAS A CARGO

Tipo de Doc			Numero de Documento	Nombres Completos de los Hijos, Padres, o Hermanos (Que dependan económicamente del Trabajador)			Sexo		Fecha de Nacimiento			Parentesco				Discapacitado	Desplazado
RC	TI	CC		1er. Apellido	2do. Apellido	Nombres	F	M	ANO	MES	DIA	Hijo	Hijastro	Hermano Huérfano	Padres		

9. OBSERVACIONES

DECLARACION JURADA

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada, así como los documentos aquí relacionados es verídica y se entienden presentados bajo la gravedad del juramento con las advertencias. Autorizo para que por cualquier medio se verifique los datos aquí suministrados y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones correspondientes.

Carlos Robayo
FIRMA DEL TRABAJADOR

AUTORIZACION PARA USO DE LA INFORMACION

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, autorizo y acepto de manera voluntaria, previa y explícita, que la Caja de Compensación Familiar del Caquetá Nogal vis y tratamiento de mis datos personales que suministro en este formulario y aquellos clasificados como "datos personales" de acuerdo con la política de tratamiento de datos Personales que se encuentra en la página web de Comfaca www.comfaca.com

Carlos Robayo
FIRMA DEL TRABAJADOR

SI X NO

Richard Castellon
FIRMA EMPRESA

FUNCIONARIO COMFACA

Carlos Robayo
FIRMA TRABAJADOR

1968

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.521.638**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

1969

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3284468355418
Fecha de radicación 09/02/2024

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite	Tipo de afiliación:	Regimen
A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X]	A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	A.Contributivo [X] B.Subsidiado [ ]

Tipo de afiliado:	Tipo de Cotizante	Código
A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ]	A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ]	registrar por la EPS

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CORDOBA	VARGAS	ELKYN	GEOVANNY
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
CC	1119214582	Femenino [ ] Masculino [X]	23/07/1989

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Discapacidad	Condición	Puntaje SISBÉN	Grupo de población especial
06 - Otros	Ninguna			

Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC
14-23: Positiva Compania De Seguros S.A.	230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir	$ 1.300.000

Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
MATEGUADUA		3202222802	ingenierosofi@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
LA MONTAÑITA	Urbana [ ] Rural [X]		CAQUETÁ

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	HOSPITAL DEPARTAMENTAL HOSPITAL MARIA INMACULADA ESE - CENTRO DE SALUD LA UNION PENEYA - CALLE 1 No. 1 - 05	26859

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social	Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	NI901283654	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CR 4 15 06 BRR PORVENIR	6084377092	sinergiazomac@gmail.com	FLORENCIA	CAQUETÁ

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad:
  - [X] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado:
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO
018000913876

VIGILADO Supersalud

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3284468355418
Fecha de radicación 09/02/2024

Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones
07/02/2024			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

ELKIN CORDOBA
El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	
[X] 56. Anexo copia de documento de identidad									
Cantidad:				1					Total 1

- [ ] Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio
- [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación

Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario

Tipo de documento de identificación	Numero de identificacion

Observaciones
Observaciones:
Empresa:SANDRA MILENA SANCHEZ CHACON, Asesor:Gloria Arboleda, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:gloriaarboleda@asmetsalud.org.co
Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:
Url: https://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO
018000913876

VIGILADO Supersalud

ASMET SALUD EPS	CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO DE LA EPS	Versión	Edición
		Código	Hoja 1 de 1

A CONTINUACION SE PRESENTAN UNAS BREVES PREGUNTAS PARA CERTIFICAR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR ASMET SALUD EPS SAS EN EL MOMENTO DE SU AFILIACION, FAVOR MARCAR CON UNA "X" EN SI o NO, SEGÚN SEA EL CASO:

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de La Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	

CC1119214582 ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS

En constancia se firma a los 9 del mes de feb. de 2024

Nombre y documento de identidad del afiliado que certifica:

CC1119214582 ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS

ELKIN CORDOBA

FIRMA AFILIADO

Si el afiliado no sabe o no puede firmar, el diligenciamiento y suscripción de este formato se efectuará por la persona a quien el ruegue, lo cual deberá ser ratificado por el afiliado a través de su huella.

FIRMA A RUEGO

Nombres y apellidos:

Documento de identidad: Edad:

Domicilio (Dirección y ciudad):

HUELLA AFILIADO

VIGILADO Supersalud

COMFACA
Sede Administrativa Carrera 11 No. 15 - 34 – Fax: 114
Centro Multiple de Servicios Tramo de Calle 12 Av. Roberto Charry – Fax: 225
e - mail Atención al usuario: atencionalusuario@comfaca.com
Teléfono: 4346300
www.comfaca.com

PR-PAF-FT-02 V4

FORMULARIO DE AFILIACIÓN

IMPORTANTE: Marque con un X según el tipo de novedad	Inscripción del trabajador	X
	Adición personas a cargo	

TIPO DE AFILIADO												
Dependiente	X	Servicio Domestico		Madre Comunitaria		Taxista		Facultativos				
Trab. Independiente 2%		Trab. Independiente 0.6%		Pensionados 0.6%		Pensionados 2%		Pensionado 2%		Fidelidad		

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social de la Empresa			Nit.
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S			901283684
Sucursal: 001	Teléfono: 3202855153	Ciudad: FLORENCIA	Correo Electrónico (Obligatorio): CONTABILIADSINERGIAZOMAC@GMAIL.COM

2. DATOS DEL TRABAJADOR

No. Identificación	CC. CE. PAS. TI.	Celular	Correo Electrónico
1119214582		3202222802	INGENIEROSOFI@HOTMAIL.COM

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
CORDOBA	VARGAS	ELKYN GEOVANNY

Fecha de Nacimiento			Sexo			Estado civil								Tipo de Contrato				
1989	07	23	M	M	I	U.L.		CAS		DIV		SEP		VIU.		SOL.	X	NO	Fijo	X	Ind		Parcial	

Fecha de Ingreso a la Empresa			Salario	Gana Comisión		Ocupación
2024	02	07	$ 1300000	SI	NO	OBREROS Y PEONES DE CARGA

Horas trabajadas diarias	Dirección lugar donde desarrolla su labor	Barrio	Ciudad	U R
240	C MATEGUADUA		FLORENCIA	

Usted labora en otra empresa	SI	NO X	Cual?	Barrio	Ciudad	U R
					FLORENCIA	

Dirección del Trabajador	Barrio	Ciudad	U R
C MATEGUADUA		FLORENCIA	

NIVEL DE ESCOLARIDAD		Básica Secundaria	X	Media Básica Adultos		Secundaria Adultos Media Adultos		Tecnico Tecnologico Profesional Univ		Posgrado Maestria		Ninguno		No Disp	

Presenta Alguna Discapacidad? SI ___ NO X Cual? ___ Tipo de Vivienda Propia ___ Familiar ___ Arrendada ___ Hipoteca ___

3. FACTOR DE VULNERABILIDAD

Desmovilizado o Reinsertado		Victima conflicto armado (no desplazado)		Desplazado		Ejercicio del trabajo Sexual	
Hijo(as) de madres cabeza de familia		Cabeza de familia		Hijo (as) de desmovilizados o Reinsertados		Damnificado desastre natural	
Población Zonas Fronteras(nacionales)		Población Migrante		En condición de discapacidad		No Aplica	X

4. PERTENENCIA ETNICA

Afrocolombiano		Indigena		Raizal Del Archipielago De San Andres	
Comunidad Negra		Palenquero		Room o gitano	
No se auto reconoce en ninguno de los anteriores				No Disponible	X

5. ORIENTACION SEXUAL

Heterosexual	X	Bisexual	
Homosexual		No Disponible	

6. DATOS DE LA CONYUGE O COMPANERO(A)

No. Identificación	CC. CE. PAS. TI.	Celular	Correo Electronico

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Fecha de Nacimiento			Sexo			Ocupación
			H	M	I	

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U R

Nombre de la Empresa donde Trabaja	Ingresos Mensuales $	Recibe Subsidio? SI ___ NO ___

7. DATOS DEL PADRE O DE LA MADRE FUERA DE LA UNIÓN

No. Identificación	CC. CE. PAS. TI.	Celular	Correo Electronico

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad	U R

8. DATOS DE LAS PERSONAS A CARGO

Tipo de Doc			Numero de Documento	Nombres Completos de los Hijos, Padres, o Hermanos (Que dependan económicamente del Trabajador)			Sexo		Fecha de Nacimiento			Parentesco				Discapacitado	Dependiente
RC	T.I.	C.C.		1er. Apellido	2do. Apellidos	Nombres	F	M	AÑO	MES	DÍA	Hijo	Padre	Hermano Hermana	Padre		

9. OBSERVACIONES

DECLARACION JURADA

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada, así como los documentos aportados, es verídica y se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento con su suscripción. Autorizo para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí referidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones correspondientes.

Elkyn Cordoba

FIRMA DEL TRABAJADOR

AUTORIZACION PARA USO DE LA INFORMACION

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 autorizo y acepto de manera voluntaria, previa y explícita, que la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, haga uso y tratamiento de mis datos personales que suministro en este formulario y anexos, clasificados como "datos sensibles" de acuerdo con la política de tratamiento de datos Personales que se encuentra en la página web de Comfaca www.comfaca.com

Elkyn Cordoba

FIRMA DEL TRABAJADOR

SI X NO ___

Richard Castellon

FIRMA EMPRESA

FUNCIONARIO COMFACA

Elkyn Cordoba

FIRMA TRABAJADOR

1913

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.119.214.582**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Elaborado por: Paola Medina-Asesora SST

SINERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	SST-FR-011
		Versión	2
	Listado de asistencia	Fecha	01/11/2023

FECHA	26/03/2024	RESPONSABLE	Paola Medina

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		Realización de Rumoterapia
Charla		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación		
Otra	X	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Armando [illegible]	1117523544	1117823544	Juan M
2	Alexis Mendez	100 650 7466	ayudante	Alex
3	Libardo A zapat	1147686876.	OFICIAL	[illegible]
4	Efran Sanchez S.	1117546778	ayudante	Efra S.
5	Cesar Rojano	1006921658	OF - -	Cesar
6	Sebastian Pava	1006596953	ayudante	Sebastian
7	Jon pablo sancha g	1117593776	ayudata	Jon pablo
8	Jhan Carlos Medina	1006505563	ayudante	Medina
9	Antoniosanchez	96331100..	oficial.	Antoniosanchez
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Cargo	Firma
Asesora SST	Paola Medina

Powered by CamScanner

CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL N.2

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL CONTRATO 212 –LICP DE 2023



CONTRATO DE OBRAN.: 212 –LICP DE 2023

02 de marzo del 2024 al 01 de Abril de 2024

	UNIDAD ORGANIZACIONAL	FIRMAS
Elaborado:	Paola Andrea Medina Amezquita	Paola Medina
Revisado:	Richard Édison Castrillón Menza	

CONTROL DE INFORMES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
V0	03-ABRIL -2024	Informe de cumplimiento del manejo Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
1. OBJETIVOS 3
1.3 LOCALIZACION 4
1.4 ALCANCE 6
3. GESTION AMBIENTAL 8
FICHAS AMBIENTALES 8
FICHA #1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, RECICLAJE Y BASURAS. 10
ORDEN Y ASEO 12
FICHA #2. MANEJO DE SUELOS, MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13
FICHA #3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTABILIDAD DE RELLENOS, TALUDES Y TERRAPLENES. 16
FICHA #5: MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN. 17
FICHA #6. : MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 19
FICHA #8. GESTIÓN SOCIAL 21
FICHA #9. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 23
FICHA #10. CAMPAMENTO 24
CONCLUSIONES 25

INTRODUCCIÓN

EL presente documento relaciona las evidencias de las actividades que se han ejecutado de gestión ambiental y las referenciadas en el plan de manejo ambiental del CONTRATO DE OBRA No. **212 – LICP DE 2023**, en el periodo comprendido entre el 02 de marzo del 2024 al 01 de abril de 2024 en la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"**, en búsqueda de dar cumplimiento que se establecen en los requerimientos de la normatividad existente.".

El trabajo desarrollado en Gestión socio ambiental es basado primordialmente en las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental PMA establecido para este contrato, en la legislación ambiental legal vigente y en las especificaciones del plan departamental de alcantarillado y aseo (PDA).

Por ende, a través de herramientas se ha enfocado estrategias de intervención a cada uno de las actividades desarrolladas encaminadas a fomentar, sensibilizar, mejorar en las partes interesadas (trabajadores, contratistas y/o comunidad) al generar una cultura de autocuidado y estilos de vida saludable, protección de los recursos naturales, que permitan desarrollar un trabajo seguro.

Por lo tanto, en la construcción del proyecto de **"CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA "**, proyecta las evidencias en SST y SGA partiendo del cronograma de los planes de trabajo elaborados para ser ejecutados, con el fin de garantizar el cumplimiento a los entes de control, y partes interesadas. En búsqueda de generar ambientes de trabajo seguro, seguridad del personal, la no ocurrencia de accidentes de trabajo e impactos ambientales con el análisis de los incidentes presentados en el desarrollo de las actividades.

Para este periodo se da cierre a cada una de las actividades ambientales validando los pendientes para evitar la configuración de pasivos ambientales y sociales en cada etapa de desarrollo del proyecto, con el desmantelamiento de las obras y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en cada una de las fichas de manejo ambiental de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento base PMA.

1. OBJETIVOS

El presente informe tiene como finalidad describir cada una de las actividades que se desarrollaron en materia ambiental comprendido entre el periodo del 02 de febrero del 2024 al 02 de marzo del 2024, durante la ejecución del **CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA**

1. OBJETIVOS

El presente informe tiene como finalidad describir cada una de las actividades que se desarrollaron en materia ambiental comprendido entre el periodo del 02 de febrero del 2024 al 02 de marzo del 2024, durante la ejecución del **CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"** con el fin de dar cumplimiento, prevenir y anticiparse, mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el municipio de la Montañita.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de obras para la puesta en marcha de la **"CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"**, cuya función básica es atender el grupo poblacional de Personas Mayores, representan la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad sociocultural, que atentan contra la estabilidad y la convivencia ciudadana; No obstante, también pueden representar la facilidad de influir en dinámicas sociales que pueden exponerlos a los actos de riesgos, vulnerabilidad y violencia que generan precariedad y la exclusión. El grupo poblacional de personas mayores, representa la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad social, que atentan contra la estabilidad integral de este grupo poblacional.

1.2 TIPO DE PROYECTO

Es un proyecto de infraestructura de 2500 metros cuadrados que se reflejan en los los siguientes capítulos del presupuesto contratado

- **REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**
- **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**
- **CIMENTACIÓN**
- **ESTRUCTURA**
- **CUBIERTA Y CIELO RASO**
- **MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**
- **INSTALACIONES HIDRAULICAS**
- **SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**
- **PISOS, ENCHAPES Y MESONES**
- **APARATOS SANITARIOS**
- **CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**
- **ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**
- **ELECTRICO, VOZ Y DATOS**
- **OTROS ITEMS**

1.3 LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en el municipio de la Montañita Caquetá, en el centro poblado de Mateguadua 1°13'24" N – 75°19'23" W. Este centro poblado se encuentra ubicado

sobre la vía que de La Montañita va a la población de San Antonio de Getuchá en el municipio de Milán. Con una distancia aproximada de 37,5 kilómetros de la cabecera municipal de La Montañita.



Ilustración 1. Localización general. Mapa del Municipio de La Montañita, Caquetá (Colombia)





Ilustración 2. Localización Vereda

LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO

DENTRO DEL MUNICIPIO

El municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur — oriente de Colombia, entre las coordenadas: Latitud: 1° 28' 53" N y Longitud: 75° 26' 23" W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar.

Su cabecera municipal está ubicada al norte del Departamento del Caquetá, a 27 kilómetros de la capital, Florencia, sobre la carretera denominada La Marginal de la Selva. Comprende

aproximadamente 43.850 hectáreas, principalmente por el clima las características están muy Bien definidas, que cambia desde cálido -húmedo en la base de la cordillera, hasta un frio muy húmedo en las partes altas y define las unidades geomorfoclimaticas, determinando los pisos térmicos. Su relieve montañoso va de quebrado a muy quebrado, con pendientes entre el 25% y 75%.

El Municipio de La Montañita está distribuido territorialmente en cuatro Inspecciones de Policía: Santuario, La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua (Ubicación especifica del proyecto). El área urbana de la cabecera municipal la conforman 5 barrios y el área rural 128 veredas, 11 caseríos en los cuales están las 4 Inspecciones de policía.

Vereda Mateguadua

Cerca de Mateguadua se encuentra la Vereda El Pato, El Porvenir, San Francisco, La Florida, El Líbano, La Esmeralda, Mateguadua, El Vergel, Vereda Reina Alta, Vereda La Esmeralda, Vereda El Pato, Vereda El Tembión, Vereda El Diamante, Vereda El Fono, Vereda El Diez, Vereda El Recreo, Vereda Yumal, Vereda Maticurucito. También se encuentraColegio Mateguadua dentro del poblado.

Afluentes: Quebrada El Pato, Quebrada La Danta, Quebrada La Chipa, Quebrada El Tigre, Quebrada El Danto, Quebrada La Vega, Quebrada El Tembión, Quebrada La Tigra

1.4 ALCANCE

El proyecto cuenta con una capacidad para atender a un promedio de 60 y 80 personas de la tercera edad, se plantea una edificación de un solo nivel, donde sus recorridos sean amplios y generosos, zonas llenas de vegetación y senderos al aire libre, también se implementan forman sustentables donde se tiene como prioridad el ahorro de agua, por medio de tanques recolectoras de aguas lluvias, eso para luego ser utilizada en el regado de jardinería y huertas con las el proyecto contará.

El proyecto se realiza en un lote ubicado en el centro poblado de Mateguadua que tiene como área 2.500 m2 (Área total del lote) y un total de metros cuadrado utilizables de 1.746,49 m2. Las zonas de la edificación se distribuyen en: Administrativa (59 m2), salud y atención integral (30 m2), servicios (255.97 m2), lúdica (583.21 m2) y servicios de uso general (818.31 m2).



Ilustración 3. Modelado en 3D de la infraestructura Centro Vida.

2. INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

INFORMACION BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	212-LICP-2023
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÀ".
Nombre del contratista:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($1.480.593.601) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS UN PESOS MCTE
Valor Anticipo (10%):	($148.059.360) MCTE. – CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
Fecha de iniciación del contrato de obra:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de iniciación del contrato de interventoría:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual Inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024

3. GESTION AMBIENTAL

FICHAS AMBIENTALES

En las fichas ambientales se consignan las medidas de control, prevención, mitigación, y compensación para los posibles efectos ambientales que pueda generar el desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA".**

Las fichas de manejo ambiental representan los lineamientos básicos de gestión y se constituyen en un instrumento operativo adecuado durante el desarrollo del proyecto, por lo cual se definen de acuerdo a las características del área y las actividades inherentes a este tipo de proyectos. Los impactos sociales identificados y sus estrategias se reflejan en las siguientes matrices, que se enfocan para los habitantes colonos que se encuentran dentro del área de influencia directa como indirecta.

A continuación, se presentan las fichas ambientales para el manejo del medio fisico:

- **Ficha #1:** Manejo integral de residuos sólidos, escombros, material reutilizable, reciclaje y basuras.
- **Ficha #2:** Manejo de suelos, manejo de obras en concreto y materiales de construcción.
- **Ficha #3:** Conservación y restauración de estabilidad de rellenos, taludes y terraplenes.
- **Ficha #4:** Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.
- **Ficha #5:** Manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido. mitigación y prevención.
- **Ficha #6:** Manejo de tránsito y señalización mitigación y prevención.
- **Ficha #7:** Manejo integral de aguas. obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.
- **Ficha #8:** Gestión social.
- **Ficha #9:** Manejo de maquinaria y equipo mitigación y prevención.
- **Ficha #10:** Campamento.
- **Ficha #11:** Programa de manejo y recuperación de la cobertura vegetal. mitigación y prevención

3.1 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Durante el proyecto contractual de la empresa **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS** encargada de la **"CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"** de la gestión socio ambiental:

En el periodo de ejecución del contrato de obra, se relacionan las personas que quedaron conformando el comité de gestión socio ambiental:

Tabla 2. Grupo de gestión socio ambiental

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ACREDITA
1	Residente de obra	Ingeniero Civil	Richard Edinson Castrillón Menza	70202-413883TLM	Si acredita
2	Arquitecto	Arquitecto	Alex Raimundo Moisés Romero	0870028245ATL	Si acredita

3	Sisoma	Especialista Salud Ocupacional	Paola Andrea Medina Amezquita	Resolución No.0149 (9 de mayo de 2021)	Si acredita

FICHA #1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, RECICLAJE Y BASURAS.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Los residuos sólidos generados en la obra se seleccionarán, entre domésticos y propios de la obra, con el fin de facilitar su destino final. Es así como los residuos sólidos domésticos como envolturas de comida de clasificación biodegradable no serán reciclados, y serán depositados en canecas ceñidas al código de colores, ubicada en el frente de obra en un tamaño aproximado de 120 litros, las cuales serán catalogadas como biodegradables "verde", peligrosos " rojo" y plástico " azul", las cuales serán trasladadas hasta el campamento de manera diaria en la camioneta de la empresa contratista, y de allí hasta sitio de disposición autorizado, estas se les registrara el pesaje cuando se generen y almacenen temporalmente.	SI	CUMPLE	OK
2	Se utilizará una brigada de aseo, la cual estará entrenada para cumplir las actividades que se consigna en el PMA relacionados con el manejo de residuos. La frecuencia de limpieza será diaria para que las obras conserven un buen estado de limpieza. Para lo cual se conformara una brigada de aseo y limpieza con la cual se delegara las responsabilidades al personal diariamente dentro de los frentes de trabajo al terminar la jornada.	SI	CUMPLE	OK
3	Los escombros que clasifiquen serán utilizados como relleno, los que no serán depositados en un sitio de disposición final acreditado el cual será autorizado por la secretaria de planeación del municipio de ejecución del proyecto, para su uso y aprovechamiento en otras actividades solicitadas por la comunidad cuando no se cuente con escombreras, la cual será aprobada mediante la solicitud del permiso para su disposición final.	SI	CUMPLE	OK
4	Para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de todos los residuos sólidos producidos durante las actividades de construcción de las obras, se tendrá en cuenta lo contemplado en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.	SI	CUMPLE	N.A
5	Adecuar los sitios de almacenamiento temporal de escombros con los elementos de señalización, protección como geo textiles, lonas o poli sombras que eviten accidentes, dispersión de materiales antes de su disposición final. Estos deben permanecer	SI	CUMPLE	OK

	máximo 24 horas con alturas menores de 5 m. Evitando la contaminación de fuentes hídricas, artificiales y naturales.			
6	El cargue se realizará de forma manual, y el vehículo se colocará de manera que no afecta las zonas de espacio público o zonas verdes. Los escombros no permanecerán más de 24 horas en las obras, las volquetas deben estar condiciones protegiendo el material y verificando el estado del volcó y demás partes del vehículo.	NO	N.A	N.A
7	Realizar inspecciones a los vehículos, para asegurar las condiciones óptimas en el transporte de los mismos, garantizando que no exceden la capacidad de carga, que estén cubiertos adecuadamente y que eviten el derrame de residuos, aceites y combustibles por las vías.	SI	CUMPLE	N.A
8	Se limpiarán las llantas de los vehículos antes de salir del campamento.	NO	N.A	N.A
9	Los sitios de almacenamiento temporal de material reutilizable se adecuarán y delimitarán, y se protegerán contra la acción erosiva del agua y aire para prevenir la contaminación.	SI	CUMPLE	N.A
10	Se colocará un plástico a las pilas de material con el fin de mitigar las emisiones de material particulado.	NO	N.A	N.A

FOTOGRAFIA 1 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL





Fotografía N°	1	**Fotografía N°**	2
Lugar	Frente de obra (tramo 2 al 5)	**Lugar**	PUNTO DE ACOPIO
Observaciones	ACOPIO MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y REUTILIZACION DEL MISMO	**Observaciones**	MATERIAL DE EXCAVACIÓN REUTILIZABLE PARA LLENO.

1986

FOTOGRAFIA 2 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL





Fotografia N°	5	**Fotografia N°**	6
Lugar	CAMPAMENTO	**Lugar**	PUNTOS DE ACOPIO
Observaciones	PUNTO ECOLOGICO (MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS)	**Observaciones**	ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL EN VOLQUETA

ORDEN Y ASEO

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	JORNADAS DE ASEO	SI	CUMPLE	OK
2	Separación de residuos sólidos según su naturaleza, PUNTO ECOLOGICO	SI	CUMPLE	OK

FOTOGRAFIA 3 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

			
Fotografía N°	7		
Lugar	OBRA		
Observaciones	JORNADA DE ASEO EN OBRA		

FICHA #2. MANEJO DE SUELOS, MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Se utilizará materiales de construcción provenientes de canteras autorizadas las cuales cuenten con licencia ambiental y título minero para su debida extracción dando así cumplimiento al artículo octavo de la Resolución 1506 del 2005. El concreto hidráulico se comprará a una cementera autorizada.	SI	CUMPLE	N.A
2	El material de construcción en cada frente de obra se acopiará temporalmente de acuerdo a la necesidad del día de trabajo, el resto de materiales deben estar en los patios de materiales debidamente señalizados con cinta reflectiva. En este frente se acumulará el material que será utilizado en los próximos dos días.	SI	CUMPLE	OK
3	Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente con un sitio adecuado para el depósito temporal de materiales, de manera excepcional se permitirá su acopio en zonas verdes, siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados y se restituyan sus condiciones originales.	NO	N.A	N.A
4	Para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de todos los materiales utilizados durante las actividades de construcción de las obras, se tendrá en cuenta lo contemplado en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. En el anexo 1 se consignan los	SI	CUMPLE	N.A

	aspectos más relevantes de esta norma, para el proyecto en estudio			
5	Los vehículos destinados para el transporte de material de construcción tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin que la carga depositada en ellos, quede contenida en su totalidad, evitando el derrame y el escurrimiento del material húmedo, deben ir carpados y no sobrepasar el volumen para el cual han sido diseñados.	SI	CUMPLE	OK
6	Cuando se requiere realizar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, esta debe realizarse sobre una plataforma de madera, metálica, geo textil para evitar el vertimiento de la obra sobre el suelo.	SI	CUMPLE	OK
7	Se restringe el uso de las formaletas de madera para la fundición de obras en concreto. Se recomienda utilizar formaletas metálicas.	NO	N.A	N.A
8	El cemento debe ser almacenado en lugares secos, como acopios de 7 m de altura, cuya manipulación por el personal deber ser con el uso de los elementos de protección personal correspondientes establecidos en el (panorama de riesgos).	SI	CUMPLE	OK
9	Las tuberías y prefabricados deben ser almacenados en acopios demarcados con cintas, avisos y mallas; de igual forma el hierro empleados será protegido de las condiciones climáticas que afecten su estructura.	SI	CUMPLE	OK
10	La estructura del contenedor será continua, sin roturas o perforaciones, ranuras o espacios. Las puertas estarán aseguradas y herméticamente cerradas. El volumen de la carga, estará a ras del contenedor. El diseño original de contenedores o platones no será modificado, para aumentar su capacidad.	NO	N.A	N.A
11	La carga será cubierta, para evitar la dispersión o emisiones fugitivas, con una cobertura de material resistente, que no se rasgue o se rompa. Esta cobertura será sujeta a las paredes exteriores del contenedor, hasta una altura de 0.30 metros.	SI	CUMPLE	OK

FOTOGRAFIA 4 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



Fotografía N°	1
Lugar	OBRA
Observaciones	RECEPCION DE MATERIAL DE CANTERA EN PUNTO DE ACOPIO



Fotografía N°	2
Lugar	OBRA
Observaciones	VOLQUETA CON ENCARPADO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR DISPERSION DE MATERIAL



Fotografía N°	3
Lugar	BODEGA - CAMPAMENTO
Observaciones	



Fotografía N°	4
Lugar	CAMPAMENTO
Observaciones	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

FICHA #3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTABILIDAD DE RELLENOS, TALUDES Y TERRAPLENES.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Los rellenos y terraplenes se realizarán teniendo en cuenta el ángulo de deslizamiento de material. La compactación será la referida en los pliegos.	NO	N.A	N.A
2	En búsqueda de estabilizar el terreno se debe construir muros, filtros, drenes, gaviones, cuya finalidad es contener el terreno y evitar su deslizamiento.	NO	N.A	N.A
3	El espacio público que deba utilizarse para almacenamiento temporal de material, será delimitado, señalizado y optimizado su uso con el fin de reducir las áreas utilizadas.	NO	N.A	N.A
4	No se almacenarán, ni siquiera temporalmente, materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas, parques, o cuerpo de agua. El cargue, descargue, almacenamiento temporal de los materiales de construcción se llevará a cabo en las zonas de trabajo, previa demarcación.	SI	CUMPLE	OK
5	Se debe realizar inspección periódica de las obras de estabilización, con el fin de verificar el funcionamiento de las mismas.	NO	N.A	N.A

FOTOGRAFIA 5- SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL





Fotografía N°	1	**Fotografía N°**	2
Lugar	OBRA	**Lugar**	OBRA
Observaciones	EXCAVACIONES NO PROFUNDAS CON IMPLEMENTACION DE LONA VERDE PARA DEMARCACION DE EXCAVACIONES.	**Observaciones**	EXCAVACIONES NO PROFUNDAS/ N.A ESTABILIZACION NI ENTIBADO.

FICHA #5: MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Se realizará humectación sobre las superficies que se requieran en concertación contratista - interventoría. El agua será comprada a carrotanques provenientes del acueducto municipal más cercano. Si se toma de una fuente de agua se deberá tramitar el respectivo permiso de concesión de agua.	NO	N.A	N.A
2	Se controlará el exceso de velocidad de volquetas y maquinaria en carreteras sin asfalto (vía secundaria y terciaria) y cercanas a cascos urbanos, con el fin de disminuir las emisiones en el área de influencia directa del proyecto. Se colocará la señalización al respecto.	NO	N.A	N.A
3	Los vehículos que se destinen para el transporte de material estarán conformados por platones apropiados y cubiertos, con el fin de evitar el derrame del material.	SI	CUMPLE	OK
4	A los vehículos destinados al traslado de materiales se debe exigir el mantenimiento y buen funcionamiento con el fin de controlar las emisiones generadas al ambiente, también se debe solicitar la revisión tecno mecánica con el certificado mecánico y de los gases expedido por un serviteca debidamente autorizada.	SI	CUMPLE	OK
5	En las vías en las cuales se emisiones de material particulado y polvo se debe hacer riego con agua debido a que se encuentran cerca asentamientos humanos, mediante el uso de carro tanques acondicionados con flautas de tal forma que la descarga se realice cerca del suelo y en chorros finos a baja presión.	NO	N.A	N.A
6	Los materiales que se generan en las actividades encuentran en la obra deben ser señalizados y se tomaran las medidas de aislamiento necesarias para evitar la dispersión de material particulado generado en las actividades así como a la afectación de la infraestructura.	SI	CUMPLE	OK
7	Dentro de la administración de la ejecución del proyecto se efectuarán las revisiones y mantenimiento periódicos a la maquinaria empleada en las actividades de construcción y operación del proyecto.	SI	CUMPLE	OK
8	La carga, dentro de los vehículos de transporte, estará acomodada de tal manera que su volumen esté a nivel del platón o contenedor. Se cubrirá la carga con lonas o cualquier otro material, con el fin de evitar la dispersión de la misma o emisiones de material particulado por acción del viento.	SI	CUMPLE	OK
9	No se realizarán quemas a cielo abierto bajo circunstancia alguna	SI	CUMPLE	OK
10	En caso de requerirse trabajos en horarios nocturnos en centros poblados, se actuará conforme a lo establecido en el decreto 0948/95	NO	N.A	N.A
11	Los vehículos tendrán al día la revisión técnica mecánica	SI	CUMPLE	ANEXO

Ilustración 4. Revisión técnico – mecánica y emisiones contaminantes de volqueta XIC918.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163822789

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. MAXITEC S.A.S

NIT: 900158425 **No. de Certificado de Acreditación:** 09 CRN 107 001

Fecha de expedición: 2023/01/05 **Fecha de vencimiento:** 2024/01/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XIC918	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1994
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5998	**NRO. MOTOR:**	28K48654
NRO. CHASIS:	CM94204204	**VIN:**	
LÍNEA:	KODIAK 209		
COLOR:	ROJO BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JESUS H. MUÑOZ R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIRO ENRIQUE PEÑA BERNAL

			
Fotografía N°	1	**Fotografía N°**	2
Lugar	PUNTO DE ACOPIO	**Lugar**	FRENTE DE OBRA
Observaciones	VOLQUETA	**Observaciones**	VOLQUETA MALLA PARA CUBRIR MATERIAL

FICHA #6. : MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Aislar la zona de obra, e instalar la información necesaria	SI	CUMPLE	OK
2	Señalizar las vías aferentes y las zonas de acceso de acuerdo con los principios del Manual de Señalización del INVIAS.	SI	CUMPLE	OK
3	Demarcación de los frentes de obra con franjas amarillas y negaras apoyadas en los señalizadores tabulares.	SI	CUMPLE	OK
4	Todo el personal vinculado a la obra estará distinguido con uniformes e implementos de protección personal (EPP); los bandereros, que pueden regular el tráfico y paso de estudiantes, tendrán además un chaleco reflectivo y elementos de señalización de acuerdo con las condiciones prevalecientes	SI	CUMPLE	OK
5	Se contará con todos los elementos de señalización, banderas, paletas, señales preventivas, restrictivas, informativas, durante el tiempo que dure la obra.	SI	CUMPLE	OK
6	Adecuación de señalización de tipo informativa, preventiva e informativa en los campamentos ajustados para las necesidades de la realización del proyecto.	SI	CUMPLE	OK
7	Demarcar los accesos temporales a viviendas y vías de accesos con la señalización, elementos de rotulación que garanticen la seguridad de las personas extrañas a las obras.	NO	N.A	N.A

FOTOGRAFIA 6 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

			
Fotografía N°	1	**Fotografía N°**	2
Lugar	OBRA	**Lugar**	OBRA
Observaciones	SEÑALIZACION TRANSITORIA INFORMATIVA Y PREVENTIVA	**Observaciones**	SEÑALIZACION TRANSITORIA INFORMATIVA Y PREVENTIVA

FOTOGRAFIA 7 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

			
Fotografía N°	3		
Lugar	OBRA		
Observaciones	Señalización informativa de inicio de obra, entrada y salida de volquetas y maquinaria pesada (externa)		

			
Fotografía N°	5	**Fotografía N°**	6
Lugar	OBRA	**Lugar**	OBRA
Observaciones	DEMARCACION CON TELA PROPIVIDA PARA EXAVACIONES	**Observaciones**	IMPLEMENTACION DE EPP EN EL PERSONAL DE OBRA.

FICHA #8. GESTIÓN SOCIAL

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Se dispondrá de un punto de atención a la comunidad para las peticiones, quejas y reclamos además para brindar información relacionada con el proyecto el cual puede ser acondicionado dentro del campamento de los frentes de trabajo.	SI	CUMPLE	OK
2	Realizar reuniones informativas presentando los permisos del proyecto, las actividades a ejecutar en el cronograma de obra, en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente tanto a las autoridades locales y como del área de influencia.	SI	CUMPLE	OK
3	Se capacitará al personal en cuanto al conocimiento del proyecto, y se dotará de implementos de seguridad.	SI	CUMPLE	OK
4	Revisión del proceso de contratación del personal, mediante la revisión de las hojas de vida recepcionada, en lo posible que la contratada sea del área de influencia directa del proyecto para el caso de la mano de obra no calificada, así como cartas de experiencia del personal que se piensa vincular a la obra. El personal de mano de obra no calificada será residente en la zona, ya que esta zona requiere de fuentes de trabajo.	SI	CUMPLE	N.A

5	Se seleccionan las hojas de vidas de los maestros de obra de cada frente, y este estudia al personal a contratar, dando prelación al personal de la zona donde se realicen los trabajos.	SI	CUMPLE	N.A
6	Solicitar los permisos de servidumbre con los propietarios de los predios que se tengan que intervenir por el desarrollo del proyecto.	NO	N.A	N.A
7	Se aportan los documentos del personal a trabajar, y se realizan los contratos y las afiliaciones a los sistemas de salud y seguridad social, y aseguradora de riesgos profesionales.	SI	CUMPLE	N.A
8	Se dota al personal de los equipos de seguridad necesarios para su labor con el respectivo registro a fin de cumplir con la normatividad legal vigente cada dos tres meses de acuerdo a la resolución 2400 de 1979.	SI	CUMPLE	N.A

FOTOGRAFIA 8 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



Fotografia N°	1	**Fotografia N°**	2
Lugar	CAMPAMENTO	**Lugar**	OBRA
Observaciones	BUZON DE SUGERENCIAS Y PUNTO DE ATENCION AL USUARIO.	**Observaciones**	PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FOTOGRAFIA 9 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL





Fotografia N°	3	**Fotografia N°**	4
Lugar	MONTAÑITA	**Lugar**	CAMPAMENTO

Observaciones	SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	**Observaciones**	SOCIALIZACION DE AVANCE CON LA COMUNIDAD

FICHA #9. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	Mantenimiento de filtros de aire en los exhostos de salida de equipos que estén en servicio (volquetas, camiones, maquinaria pesada, generadores de energia, entre otros).	SI	CUMPLE	OK
2	A los vehiculos de transporte de materiales debe ser cubierta con el fin de evitar la dispersión de emisiones a la atmosfera.	SI	CUMPLE	OK
3	En los cascos urbanos se realizarán ciclos de trabajo con el fin de mitigar la contaminación acústica. Los vehiculos estarán sincronizados, para mitigar contaminación, contarán con la Revisión Técnico - Mecánica, y se les realizará mantenimiento en sitios autorizados. Los vehiculos contarán con certificado técnico -mecánico vigente.	SI	CUMPLE	OK
4	El operador será el encargado de revisar el estado del equipo señalizado.	SI	CUMPLE	N.A
5	El contratista presentará un programa de mantenimiento preventivo donde se inspeccionen periódicamente los equipos, para descubrir condiciones que conduzcan a generación de mayores emisiones de gases o particulas.	SI	CUMPLE	N.A

FOTOGRAFIA 10 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL





Fotografia N°	3	Fotografia N°	4
Lugar	CAMPAMENTO	Lugar	CAMPAMENTO
Observaciones	MANTEMIENTO DE FILTROS Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO DE LA MAQUINARIA (RETROCARGADOR CAT 420E). Mantenimientos en centros autorizados	Observaciones	VEHICULO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y TRANPOSRTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

FICHA #10. CAMPAMENTO.

ITEM	ACTIVIDADES	APLICA	ESTADO	EVIDENCIA
1	El descapote se realizará sólo en el área estrictamente necesaria para la construcción de la infraestructura. El material retirado será utilizado para cubrir, en lo posible, zonas erosionadas aledañas al sitio.	SI	CUMPLE	OK
2	Para la elección de los sitios de parqueo se tiene en cuenta la disposición del propietario del lote, la cercanía a los frentes de trabajo y a los centros poblados, y la seguridad.	SI	CUMPLE	OK
3	El campamento se encontrará señalizado y las rutas de acceso y evacuación, identificadas.	SI	CUMPLE	OK
4	Las zonas verdes aledañas al campamento no serán intervenidas.	SI	CUMPLE	N.A
5	Se dotará al campamento con los equipos de control de incendios y material de primeros auxilios. Se instalarán cinco extintores	SI	CUMPLE	OK
6	El campamento debe estar dotado con los elementos de seguridad "botiquin, extintor y camilla".	SI	CUMPLE	OK
7	Los campamentos deben contar con baterías sanitarias por cada 15 trabajadores para cada o unisex dotados con los elementos de aseo	NO	N.A	N.A

FOTOGRAFIA 21 - SOPORTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



Fotografia N°	1		
Lugar	CAMPAMENTO		
Observaciones	VISTA EXTERNA DEL CAMPAMENTO (PARQUEADERO DE MOTOS Y PUNTO DE ATENCION).		

			
Fotografía N°	2	**Fotografía N°**	3
Lugar	CAMPAMENTO	**Lugar**	CAMPAMENTO
Observaciones	SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION, CAMILLA, BOTIQUIN Y EXTINTOR	**Observaciones**	RUTAS DE EVACACUACIÓN DEL CAMPAMENTO

CONCLUSIONES

- Se evidencia que durante la realización del proyecto se realizaron en total de dos (2) capacitaciones relacionadas con temas ambientales en referencia al cumplimiento programado de capacitaciones.
- Durante los meses febrero las cantidades de material de excavación ha sido reutilizado para las excavaciones del proyecto, y acopiado en zonas cercanas a las excavaciones realizadas.
- Se pueden observar que las señalizaciones están de acuerdo con los principios del Manual de Señalización del INVIAS y la normatividad ambiental Código Nacional de Tránsito - Ley 769 de 2002, NTC 947-1 Señalización Vertical De Calles Y Carreteras.
- No se registra riesgo en las excavaciones existentes del proyecto debido a que no superan la profundidad máxima para la utilización de entibado ni contención y estabilización de taludes. Se realizan excavaciones manuales y mecánicas para garantizar las profundidades requeridas.
- Debido a que no es necesario realizar movimientos grandes de tierra o afectación a capas forestales, las modificaciones en la flora ha sido mínimas casi nulas, por lo tanto, el área de trabajo ha sido el área de la obra ya intervenida, y no se esperan mayores impactos que los que se genera en la operación de las obras. De igual manera cada tramo intervenido ambientalmente de manera independiente se ha aplicado las mismas caracteristicas y valoración del impacto causado por las actividades del proyecto; de esta manera se garantiza la conservación del ambiente en los estados iniciales del proyecto sin causar afectaciones que traumaticen la fauna del área.

- Debido a que el proyecto está retirado aproximadamente 200 metros de la comunidad actual, esto no afecta en el deterioro en la calidad del Paisaje, emisiones atmosféricas, contaminación de recursos hídricos, ruido, molestias a peatones, pérdida de capa vegetal, problemas de orden y limpieza en el área, malos olores, generación de vectores y focos de infección.

- Se anexa la revisión tecnico-mecanica de la volqueta asignada para el transporte de material en el frente de obra, así como la revisión de emisiones contaminantes.

2002

ANEXO 16. SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DE INTERVENTORIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

2002

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA ANEXO 8 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	CODIGO	
		VERSION	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CONTRATO No. 062 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATESUAGUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORAZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICOAS SAS

PERIODO
Inicio: 3-mar-24 Fin: 1-abr-24

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	5 MESES	Inicio de contrato	2-feb-24
		Inicio de actividades	2-feb-24
Plazo ejecución contrato actualizado	150 días	Terminación inicial contractual	1-ago-24
Plazo ejecutado	60 días	Terminación final contractual	1-ago-24
Plazo faltante por ejecutar	120 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prórroga	Inicio susp. o prórroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de ratificación
			Total aprobados	0 d		N A
Observaciones		Sin comentarios				

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de ratificación	Fecha de aprobación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Total aprobados				N A
Sin comentarios				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	
Valor inicial del contrato de CONSULTORIA	
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoria + obra)	

ADICIONES

No	Estado	Fecha de ratificación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ #¡VALOR!

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo	N A
Valor del anticipo	$ -

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	HASTA	Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA INICIO	FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento	10%	15/12/2023	25/12/2024	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 16.253.520	19/12/2023	28/12/2024	
Anticipo								
Salarios y Prestaciones	5%	15/12/2023	15/06/2027	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 8.101.760	19/12/2023	19/06/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	15/12/2023	15/12/2028	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 32.407.040	19/12/2023	19/12/2028	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoria								

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	HASTA	Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA INICIO	FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento	10%	2/02/2024	12/02/2025	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 16.253.520	2/02/2024	12/02/2025	
Anticipo								
Salarios y Prestaciones	5%	2/02/2024	2/06/2027	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 8.101.760	2/02/2024	2/06/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	2/02/2024	2/02/2029	81-46-101034400 ANEXO 2	$ 32.407.040	2/02/2024	2/02/2029	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoria								

Firma:
Nombre: CARLOS CESAR CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoria
CONSTRUCTORA DICOAS SAS

2003

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

2004

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA ANEXO 4A INFORME FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

PERIODO Inicio: 2-mar-24 Fin: 1-abr-24

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

CONTRATO No: 225-CMAB-2023 — INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

INFORMACION FINANCIERA DEL INTERVENTOR

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
					$0	$0	$162.035.160	$0	$162.035.160	
TOTALES		$0	$0	$0	$0	$0	$162.035.160	$0	$0	

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS
Representante Legal de Interventoria

132

INFORME INTERVENTORÍA No. 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 225-CMAB-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 212-LICP-2023

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÀ".

PERIODO DE EJECUCION
02 DE MARZO DE 2024 – 01 DE ABRIL DE 2024

143

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
1. DESCRIPCION GENERAL 5
2. LOCALIZACION 6
3. ALCANCE 8
4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 9
5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9
5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 9
5.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
5.3. RELACIÓN DE PAGOS 10
5.4. BALANCE DEL ANTICIPO 10
5.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 11
5.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 11
5.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 13
5.8. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 13
6. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA 15
7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 17
8. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 18
11. INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO. 25
12. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS (ACTA MODIFICATORIA 1) 26
13. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO 30
13.1. RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES 31
14. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 31
15. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 31
16. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR 32
17. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR 33
18. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 33
18.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 34
18.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 34
18.3. INFORMACIÓN FINANCIERA 34
18.4. RELACIÓN DE PAGOS 35

18.5. BALANCE DEL ANTICIPO 35
18.6. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 35
18.7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 36
18.8. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 37
18.9. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 38

1255

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Líder 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No.225-CMAB-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

Número de Revisión	1
Elaboro:	Carlos Dario Cano Sánchez
Reviso:	Carlos Dario Cano Sánchez
Aprobó:	Carlos Dario Cano Sánchez

1266

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Lider 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No.225-CMAB-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión
	1
Elaboro:	Fabio Hernán Fiesco Gorrón
Reviso:	Carlos Darío Cano Sánchez
Aprobó:	Carlos Darío Cano Sánchez



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION GENERAL

El municipio de La Montañita Caquetá cuenta con tres centros vida denominados AÑOS DORADOS, ubicados en las inspecciones de policía de la unión Peneya, Santuario y la cabecera municipal, estipulados en el Acuerdo municipal No 005 de 25 febrero de 2016 con resolución de funcionamiento 00431 del 24 de diciembre de 2019 de la secretaría departamental de salud, con una atención global de 170 adultos mayores aproximadamente. Es así, que la Administración Municipal con aras de fomentar la atención a la población adulta mayor y así cubrir la necesidad en el municipio requiere la construcción de un centro vida en la inspección de Mateguada.

El grupo poblacional de Personas Mayores, representan la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad sociocultural, que atentan contra la estabilidad y la convivencia ciudadana; No obstante, también pueden representar la facilidad de influir en dinámicas sociales que pueden exponerlos a los actos de riesgos, vulnerabilidad y violencia que generan precariedad y la exclusión. El grupo poblacional de personas mayores, representa la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad social, que atentan contra la estabilidad integral de este grupo poblacional.

Con motivo de ofrecer unas instalaciones idóneas a los adultos mayores residentes del municipio se viene adelantando la construcción de la infraestructura centro vida en la inspección de Mateguadua, teniendo en cuenta las fases y etapas del proyecto (Pre construcción, construcción y postconstrucción).

Con estas adecuaciones se cumplirá con las especificaciones técnicas y los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el funcionamiento de los Centros Vida, pero lo más significativo, los adultos mayores gozaran de instalaciones cómodas y seguras.

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en el municipio de la Montañita Caquetá, en el centro poblado de Mateguadua 1°13´24" N – 75°19´23" W. Este centro poblado se encuentra ubicado sobre la vía que de La Montañita va a la población de San Antonio de Getuchá en el municipio de Milán. Con una distancia aproximada de 37,5 kilómetros de la cabecera municipal de La Montañita.

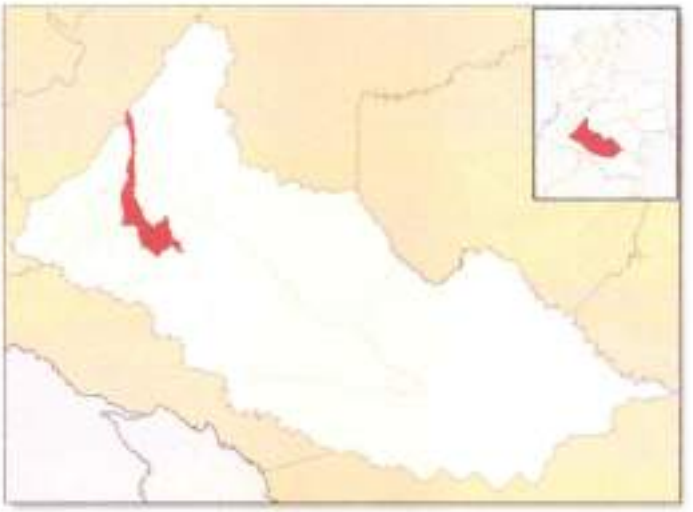


Ilustración 1. *Localización general. Mapa del Municipio de La Montañita, Caquetá (Colombia)*





Ilustración 2. *Localización Veredo Mateguadua.*

1259

LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MUNICIPIO

El municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur — oriente de Colombia, entre las coordenadas: Latitud: 1° 28' 53" N y Longitud: 75° 26' 23" W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar.

Su cabecera municipal está ubicada al norte del Departamento del Caquetá, a 27 kilómetros de la capital, Florencia, sobre la carretera denominada La Marginal de la Selva. Comprende aproximadamente 43.850 hectáreas, principalmente por el clima las características están muy Bien definidas, que cambia desde cálido -húmedo en la base de la cordillera, hasta un frio muy húmedo en las partes altas y define las unidades geomorfoclimaticas, determinando los pisos térmicos. Su relieve montañoso va de quebrado a muy quebrado, con pendientes entre el 25% y 75%.

El Municipio de La Montañita está distribuido territorialmente en cuatro Inspecciones de Policía: Santuario. La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua (Ubicación especifica del proyecto). El área urbana de la cabecera municipal la conforman 5 barrios y el área rural 128 veredas, 11 caseríos en los cuales están las 4 Inspecciones de policía.

Vereda Mateguadua

Cerca de Mateguadua se encuentra la Vereda El Pato, El Porvenir, San Francisco, La Florida, El Líbano, La Esmeralda, Mateguadua, El Vergel, Vereda Reina Alta, Vereda La Esmeralda, Vereda El Pato, Vereda El Temblón, Vereda El Diamante, Vereda El Fono, Vereda El Diez, Vereda El Recreo, Vereda Yumal, Vereda Maticurucito. También se encuentraColegio Mateguadua dentro del poblado.

Afluentes: Quebrada El Pato, Quebrada La Danta, Quebrada La Chipa, Quebrada El Tigre, Quebrada El Danto, Quebrada La Vega, Quebrada El Temblón, Quebrada La Tigra.

3. ALCANCE

El proyecto cuenta con una capacidad para atender a un promedio de 60 y 80 personas de la tercera edad, se plantea una edificación de un solo nivel, donde sus recorridos sean amplios y generosos, zonas llenas de vegetación y senderos al aire libre, también se implementan forman sustentables donde se tiene como prioridad el ahorro de agua, por medio de tanques recolectoras de aguas lluvias, eso para luego ser utilizada en el regado de jardinería y huertas con las que el proyecto contará.

El proyecto se realiza en un lote ubicado en el centro poblado de Mateguadua que tiene como área 2.500 m2 (Area total del lote) y un total de metros cuadrado utilizables de 1.746,49 m2. Las zonas de la edificación se distribuyen en: Administrativa (59 m2), salud y atención integral (30 m2), servicios (255.97 m2), lúdica (583.21 m2) y servicios de uso general (818.31 m2).



Ilustración 3. *Modelado en 3D de la infraestructura Centro Vida.*

4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	212-LICP-2023
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".
Nombre del contratista:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($1.480.593.601) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS UN PESOS MCTE
Valor Anticipo (10%):	($148.059.360) MCTE. – CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
Fecha de iniciación del contrato de obra:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de iniciación del contrato de interventoría:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024

5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 02 de febrero de 2024 al 01 de abril de 2024.

5.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5.2.INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1.	2.	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CDF	OTROS
ATENCION INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN						$ 1.480.734.968				
TOTALES						$ 1.480.734.968				

5.3.RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoria.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO DE OBRA
ANEXO 17. INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

5.4.BALANCE DEL ANTICIPO

El contratista renuncia al anticipo.

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$ -	$ -	$ -

	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

5.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	
Descripción	
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	
Descripción	

5.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía MUNIDAL DE SEGUROS S.A.

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00

Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 116.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 270.773,00
Patronal	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 10/11/2023 hasta el 10/06/2024.

Actualización de la póliza según acta de inicio

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	02/02/2024	02/02/2025	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	02/02/2024	02/08/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	02/08/2024	02/08/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 06 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/08/2029.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 116.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00	$ 270.773,00
Patronal	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
Vehiculos propios y no propios	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	$ 69.600.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

Fueron expedidas el 06 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/09/2024.

ANEXO 12. SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

5.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSTRUCTORA DICO&S SAS	02 DE FEBRERO DE 2024	01 E AGOSTO DE 2024

5.8. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- El personal de obra se compone de los siguientes cargos:

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ACREDITA
1	Director De Obra	Ingeniero Civil	Celso Rojas Cleves	25202-096642CND	Si acredita
2	Residente de obra	Ingeniero Civil	Richard Edinson Castrillón Menza	70202-413883TLM	Si acredita
3	Arquitecto	Arquitecto	Alex Raimundo Moisés Romero	0870028245ATL	Si acredita

4	Sisoma	Especialista Salud Ocupacional	Paola Andrea Medina Amezquita	Resolución No.0149 (9 de mayo de 2021)	Si acredita
5	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	Hoover Andrés Trujillo Ramirez	70202-348787 TLM	Si acredita
6	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil	Fabio Hernán Fiesco Gorrón	25202-347151CND	Si acredita

ANEXO 8. Control diario del personal de obra

5.9. EQUIPOS DE OBRA

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra fue la localización y replanteo, ajustes al diseño original con base al resultado de la modelación, cerramiento en lona verde, instalaciones provisionales, limpieza del terreno, y descapote de suelo para inicio de obra.

MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
ESTACION TOTAL	GOWIN	TKS-202	-
NIVEL	TOPCON	AT-B4	-
RETROCARGADOR	CAT	CAT 420F	101HP
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX		450 L

ANEXO 3. Control diario del equipo
ANEXO 1. Evaluación y cumplimiento ambiental de obra

5.10. HERRAMIENTA MENOR

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de marzo se tuvieron en obra la siguiente herramienta menor:

HERRAMIENTA	CANTIDAD
PALA REDONDA	4
PICA	3
CARRETILLA	4
BARRA	3
BARRETON	3
PALADRAGA	2
BALDES	10

El contratista de obra actualmente dentro de la bodega tiene los siguientes materiales de obra:

DESCRIPCION	CANTIDAD
LONA VERDE (50 MTS)	2,00
PLÁSTICO NEGRO	1
LISTONES 5X10	20,00

MADERA (TABLA 24 CM	
CEMENTO	200,00
FLEJES	3.200,00
VARILLAS DE ACERO 1/2"	157,00
VARILLAS DE ACERO 5/8"	500,00

CONCLUIR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Hasta el momento el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

6. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Planilla general de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

- Director de Obra: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
4557327472	CELSO ROJAS CLEVES	80.233.290	No acredita	No acredita	No acredita

- Residente de obra: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
9465546700	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita	No acredita	No acredita

- Arquitecto: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
N.A	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	No acredita	No acredita	No acredita

- Siso: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
9465546700	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita	No acredita	No acredita

- Especialista Estructural: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
N.A	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	No acredita	No acredita	No acredita

- Especialista Hidráulico: No se acreditó el pago se seguridad social en la fecha correspondiente al mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril.

Nº Planilla	Nombre	Documento	Periodo		
			Pensión	**Salud**	**Riesgos**
76142855	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1.018.410.974	No acredita	No acredita	No acredita


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	SUELDO MENSUAL BASICO	SUELDO MENSUAL (I.B.C.)
1	CELSO ROJAS CLEVES	80.233.290	No acredita	-	-
2	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita	$ 1.300.000	$1.300.000
3	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	No acredita	-	-
4	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita	$ 1.300.000	$1.300.000
5	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	No acredita	-	-
6	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1.018.410.974	No acredita	$ 6.500.000	$1.300.000

Nota: El contratista de obra presenta los soportes de pago de SS del mes de febrero, de manera parcial. A la fecha se encuentra pago de las planillas de seguridad social del personal mostrado en el anexo

ANEXO 4. Copia de las planillas de seguridad social del personal de obra

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

El contratista de obra entrega el flujo grama de Avance programado acumulado VS Avance ejecutado acumulado.

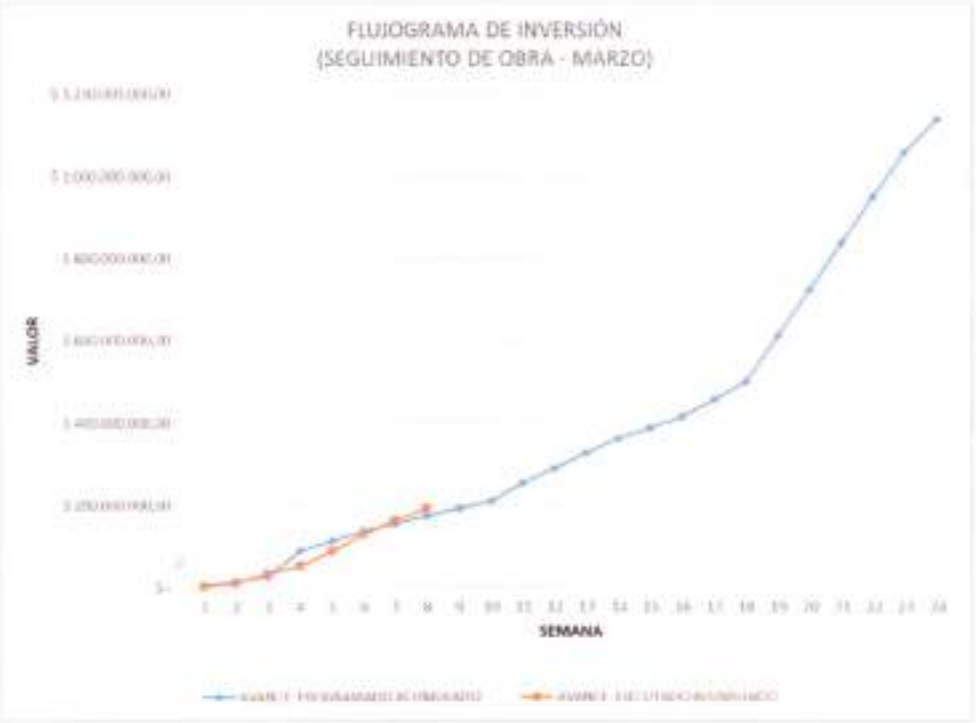

Cumplido un mes de marzo el contratista de obra lleva un avance ejecutado acumulado del 16,94 % frente al programado que es de 15,27 %.

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.610.513,33	0,40%	$ 3.021.078,67	0,265%	$ 4.610.513,33	0,405%	$ 3.021.078,67	0,265%
2	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 8.021.842,67	0,704%	$ 15.320.785,67	1,346%	$ 11.042.921,33	0,970%
3	$ 10.710.272,33	0,94%	$ 22.432.305,17	1,970%	$ 26.031.058,00	2,286%	$ 33.475.226,50	2,939%
4	$ 64.437.594,25	5,66%	$ 19.411.226,50	1,704%	$ 90.468.652,25	7,943%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 23.902.838,50	2,10%	$ 34.473.189,17	3,027%	$ 114.371.490,75	10,042%	$ 87.359.642,17	7,670%
6	$ 23.902.838,50	2,10%	$ 43.011.089,17	3,777%	$ 138.274.329,25	12,141%	$ 130.370.731,33	11,447%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 32.506.890,17	2,854%	$ 156.077.408,75	13,704%	$ 162.877.621,50	14,301%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 30.046.773,50	2,638%	$ 173.880.488,25	15,267%	$ 192.924.395,00	16,939%

ANEXO 5. *SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION*

8. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

Los componentes que miden el alcance de la obra según el contrato de obra se relacionan en la siguiente tabla, teniendo en cuenta las condiciones actualizadas del balance realizado en el Acta Modificatoria 1:

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES							
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.549,00	$ 6.372.500,00	1425,00		$ 3.632.325,00
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 13.965,00	$ 3.111.945,00	223,00		$ 3.111.945,00
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	1,00		$ 5.363.000,00
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.210,00	$ 3.025.000,00	1.425,00		$ 1.724.250,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS							
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1.352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1.425,00		$ 5.688.600,00
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.679,00	190,16		$ 8.908.996,00
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74		$ 15.901.199,00
3	CIMENTACIÓN							
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.310,00	$ 48.087.791,00	32,95	$ 1.105.090,00	$ 36.412.716,00
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3.754,60	$ 9.910,00	$ 37.208.070,00	2.683,95		$ 26.597.945,00
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,69	$ 1.011.310,00	$ 29.018.327,00	27,35	$ 1.362.856,00	$ 37.273.848,00
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1.926,42	$ 9.910,00	$ 19.100.830,00	4066,27		$ 40.296.736,00
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	29,43	$ 494.180,00	$ 14.543.470,00	3,73		$ 1.843.291,00
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,34	$ 1.083.460,00	$ 61.830.556,00	0,00		
4	ESTRUCTURA							
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	$ 1.394.468,00	$ 23.064.451,00
4,2	CONCRETO F'C 21 MPA VIGAS	M3	32,31	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	23,35	$ 1.412.226,00	$ 32.975.337,00
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.039.505,00	$ 27.520.895,00	73,78	$ 1.085.745,00	$ 80.106.266,00
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5.699,31	$ 9.910,00	$ 56.480.162,00	5026,79		$ 49.815.489,00
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2.429,01	$ 9.910,00	$ 24.071.455,00	3232,03		$ 32.029.417,00
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	478,22		$ 51.483.773,00
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8.994,70	$ 17.721,00	$ 159.385.061,00	0,00		
5	CUBIERTA Y CIELO RASO							
5,1	TEJA MASTERMIL CAL.28 COLOR AZUL	M2	406,5	$ 90.094,00	$ 36.622.236,00	360,00		$ 32.433.840,00
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.858,00	$ 22.374.064,00	357,36		$ 23.173.763,00
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	366,60	$ 12.700,00	$ 4.655.820,00	210,64		$ 2.677.668,00
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,97	$ 282.100,00	$ 5.999.533,00	0,00		
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00		
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
6	MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS							
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	719,84	$ 54.412,00	$ 39.167.934,00	690,86		$ 37.581.074,00
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.286,00	$ 22.905.972,00	848,72		$ 19.716.722,00
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.196.226,00	0,00		
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 13.502,00	$ 13.281.647,00	641,24		$ 8.658.022,00
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.985,00	$ 2.468.353,00	0,00		
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.866.099,00	641,24		$ 7.736.581,00
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 42.118,80	$ 9.744.998,00	468,19		$ 20.187.419,80
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.745,80	$ 3.332.370,00	468,19		$ 6.903.462,00
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	468,19		$ 6.627.996,00
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
7,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.289,00	$ 825.780,00	17,00		$ 701.913,00
7,2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	33,50		$ 584.609,00
7,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,59	$ 11.636,00	$ 111.124,00	12,00		$ 139.632,00
7,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10		$ 315.493,00
7,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,1	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00		$ 246.738,00
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00		$ 3.537.900,00
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	1,00		$ 2.900.078,00
8	SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS							
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,0	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00		$ 1.182.258,00
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 355.716,00	6,00		$ 711.432,00
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.360,00	$ 581.768,00	25,70		$ 497.552,00
8,4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.567,00	42,00		$ 1.329.090,00
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,8	$ 35.435,00	$ 1.197.365,00	60,00		$ 2.126.100,00
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00		$ 139.268,00
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00		$ 1.361.252,00
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	1,00		$ 10.858.760,00
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES							
9,1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 85.535,80	$ 41.394.420,00	374,48		$ 32.013.072,00
9,2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18		$ 13.513.589,00
9,3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00		$ 3.249.080,00
9,4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	169,89		$ 15.031.897,00
9,5	GUARDA ESCOBAS	ML	210,00	$ 21.672,30	$ 4.551.126,00	248,02		$ 5.375.089,00
9,6	MESÓN GRANITO	M2	12,50	$ 257.175,80	$ 3.214.698,00	8,24		$ 2.119.122,00
9,7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.380,80	$ 4.063.000,00	0,00		
9,8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.380,80	$ 4.063.000,00	0,00		
9,9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00		$ 2.699.500,00
9,10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,60	$ 11.837,30	$ 4.376.104,00	0,00		
10	APARATOS SANITARIOS							
10,1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00		
10,2	PUNTO SANITARIO	UND	6,00	$ 1.008.046,80	$ 6.064.368,00	6,00		$ 6.048.276,00
10,3	LAVAMANOS	UND	9,0	$ 346.198,00	$ 3.115.782,00	7,00		$ 2.423.386,00
10,4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 735.800,00	$ 5.886.400,00	17,23		$ 12.677.834,00
10,5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00		
10,6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,0	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE							
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00		
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPO P RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.550,00	$ 2.353.100,00	0,00		
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00		
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 3.326.410,00	$ 3.326.410,00	0,00		
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.890,00	$ 6.373.780,00	0,00		
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00		
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.746.089,89	$ 1.746.089,00	0,00		
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00		
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.550,00	$ 1.018.550,00	0,00		
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD PARA COCINA	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	0,00		
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00		
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA)	UND	3,00	$ 4.562.330,00	$ 13.686.990,00	0,00		
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00		
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00		
11,15	VENTANA TIPO 4,1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00		
11,16	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00		
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00		
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES							
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,80	$ 1.123.640,00	$ 7.860.480,00	5,58		$ 6.247.408,00
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.948,00	$ 4.653.637,00	0,00		
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	6,39	$ 1.120.782,00	$ 6.815.967,00	0,99		
12,4	CINTELES EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	1,28	$ 1.094.868,00	$ 1.400.166,00	0,87		$ 972.253,00
12,5	CUNETA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00		
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	34,80	$ 54.412,00	$ 1.659.852,00	0,00		

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS							
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00		$ 2.077.064,00
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 235.173,00	$ 7.055.190,00	30,00		$ 7.055.190,00
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.067,00	$ 16.043.742,00	66,00		$ 16.043.742,00
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 257.488,00	$ 3.112.320,00	10,00		$ 2.074.880,00
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.378,00	$ 682.137,00	3,00		$ 682.137,00
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 265.139,00	$ 1.064.556,00	4,00		$ 1.064.556,00
13,7	Suministro e instalación de Salida Lampara de aplique o riel en tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 208.961,00	$ 1.462.727,00	7,00		$ 1.462.727,00
13,8	Suministro e Instalación de Panel Led de 60x60 cm de empotrar de 40 W	UND	16,00	$ 423.810,00	$ 6.782.704,00	16,00		$ 6.782.704,00
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	36,00		$ 4.668.522,00
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.819,00	$ 1.413.828,00	12,00		$ 1.413.828,00
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencias LED Doble Spot	UND	7,00	$ 115.813,00	$ 1.251.891,00	7,00		$ 1.251.891,00
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 2No8+1No8+1No8 T. AWG por ducto PVC de 1 1/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00		$ 9.736.800,00
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto EMC de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.106,00	$ 746.106,00	1,00		$ 746.106,00
13,14	Suministro e instalación de caja de paso red baja tension subterranea norma codensa CS274	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00		$ 1.253.320,00
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00		$ 831.863,00
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00		$ 204.225,00
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 39.583,00	$ 314.413,00	11,00		$ 314.413,00
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 204.607,00	$ 204.607,00	1,00		$ 204.607,00
13,19	Suministro e Instalación de Arreglo de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 966.100,00	$ 966.100,00	1,00		$ 966.100,00
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección BPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 380.223,00	$ 380.223,00	1,00		$ 380.223,00
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	1,00		$ 1.422.953,00
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.606,00	$ 3.813.606,00	0,00		
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00		$ 855.835,00
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.523,00	$ 528.426,00	0,00		
13,25	Suministro e Instalación de bandeja ventilada 30x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.677,00	$ 237.354,00	0,00		
13,26	Suministro e Instalación de tubería EMT de 3/4" suspendido en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.366,00	62,00		$ 2.278.366,00
14	OTROS ITEMS							
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 610.325,00	$ 4.882.600,00	0,00		
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,40	$ 179.857,00	$ 4.387.427,00	0,00		
15	ITEMS NO PREVISTOS							
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+6MM, INCLUYE MARCO	M2				23,60	$ 783.648,00	$ 18.735.116,00
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+6MM, INCLUYE MARCO	M2				12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML				34,00	$ 636.140,00	$ 21.628.760,00
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3/KM				27947,76	$ 1.990,00	$ 55.606.161,00
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML				163,50	$ 64.423,00	$ 10.533.276,00
15,6	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	kg				2113,00	$ 17.755,00	$ 37.511.190,00
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2				37,50	$ 295.320,00	$ 11.187.000,00
15,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND				1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00
15,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO DESARROLLO =30<=50 CM	ML				33,50	$ 153.650,00	$ 5.147.275,00
15,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				91,70	$ 20.386,00	$ 1.867.562,00
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3				12,07	$ 808.000,00	$ 9.751.960,00
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6"	ML				19,37	$ 72.894,00	$ 1.412.097,00
15,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2				20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00
15,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML				66,30	$ 384.999,00	$ 25.181.849,00
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TN/KM				12378,16	$ 3.906,00	$ 48.328.805,00
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UND				1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00
15,17	CONCRETO F'C 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML				162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.662,00
15,18	APISONADO DE PISO E= 0 CM	M2				544,00	$ 50.850,00	$ 27.662.298,00

ACTIVIDADES DE OBRA

En el periodo comprendido entre el 02 de marzo de 2024 y el 01 de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

ITEMS	ACTIVIDADES MES 03	ANOTACIÓN
1	**PRELIMINARES**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Se realiza replanteo para vigas de amarre y pedestales
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**	
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	Se realizan excavaciones de vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	Relleno de zapatas
3	**CIMENTACIÓN**	
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	Zapatas centro vida
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	Acero para zapatas centro vida
3,3	CONCRETO F'C 21MPA PARA VIGAS DE AMARRE	Vigas que soportaran la placa de piso de la estructura
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	Se realiza armado de acero de las vigas de amarre
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	Concreto para acero de vigas de amarre
4	**ESTRUCTURA**	
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	Se realiza el armado de cardillos instalando el acero longitudinal de las columnas, teniendo en cuenta la pendiente del terreno se dejan aceros para pedestales en los ejes mencionados, por lo que las longitudes varian por cada tipo de columna (tipo columna 1,2,3 y 4)
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	Se inicia la instalación de laminas de Metaldeck para placa de piso.

15	ITEMS NO PREVISTOS	
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	instalación de perfil con platinas para placa de entrepiso

Anexo 7. *Prsacta de obra No.2*

Porcentajes de avance por actividad (Según cantidades actualizadas)

ITEMS	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	V. TOTAL		
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1425,00	771,40	$ 1.986.299,00	54,13%	100,00%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**						
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1425,00	771,40	$ 3.079.429,00	54,13%	100,00%
2,2	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	190,16	12,75	$ 897.338,00	6,70%	88,93%
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	61,74	14,38	$ 3.703.583,00	23,29%	56,33%
3	**CIMENTACIÓN**						
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	32,66	22,50	$ 24.864.525,00	68,29%	91,94%
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	2.693,96	166,98	$ 1.054.871,00	6,22%	93,55%
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	27,36	27,14	$ 38.987.749,00	99,23%	99,23%
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	4066,27	454,75	$ 4.509.573,00	11,18%	11,18%
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	3,73	1,49	$ 795.226,00	39,95%	72,12%
4	**ESTRUCTURA**						
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	16,54	4,61	$ 6.428.696,00	27,87%	27,87%
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5026,79	3.992,81	$ 38.260.627,00	79,40%	79,40%
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	3232,63	230,00	$ 2.279.300,00	7,12%	7,12%
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	478,22	41,50	$ 4.468.637,00	8,68%	8,68%
15	**ITEMS NO PREVISTOS**						
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	kg	2113,03	593,29	$ 10.504.199,00	28,08%	28,08%

9. AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución Inicial:	**Seis (6) meses**
Tiempo en Días:	180 días
Plazo de ejecución adicional	N.a
Plazo de ejecución final	N.a

En el siguiente cuadro se plasma los tiempos transcurridos a la fecha de corte del presente informe

INICIOS DE ACTIVIDAD	INICIO	SUSPENSIÓN	DÍAS ACTIVO
INICIO	02 de febrero de 2024		60
REINICIO 1	N.a	N.a	
REINICIO 2	N.a	N.a	
REINICIO 3	N.a	N.a	
DIAS TRANSCURRIDOS			60
% TOTAL DE AVANCE DE TIEMPO DEL CONTRATO			33.33%

10. AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada:	$1.480.593.651,00
Inversión Básica del Contrato:	$ 1.138.918.193,00
Modificatoria 1	$1.480.592.053,00
Inversión Básica ejecutada en el periodo:	$ 140.037.942,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	12,30%
Inversión total ejecutada en el periodo:	$ 182.049.325,00
Porcentaje total ejecutado:	16,94%
Inversión total ejecutada	$ 250.801.714,00
Porcentaje total por ejecutar, pendiente de la liquidación:	83,06%

11. INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

ANEXO 6. *Informes Semanales (Marzo)*

12. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS (ACTA MODIFICATORIA 1)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		JUSTIFICACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 3.548,00	$ 8.872.000,00	-1075,00	-	-$ 2.745.075,00	1425,00	$ 3.633.025,00	
1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	222,00	$ 13.955,00	$ 3.111.990,00	0,00	-	$ -	222,00	$ 3.111.990,00	
1.3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 5.363.000,00	
1.4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.219,00	$ 3.625.000,00	-1075,00	-	-$ 1.310.792,00	1425,00	$ 1.734.208,00	
				SUBTOTAL	$ 17.872.485,00			-$ 4.045.025,00		$ 13.831.540,00	
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS										
2.1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1252,00	$ 3.992,00	$ 5.797.303,00	72,92	-	$ 291.007,00	1425,00	$ 5.688.600,00	
2.2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.579,00	94,05	-	$ 4.405.317,00	190,16	$ 8.907.896,00	
2.3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	3,69	-	$ 822.960,00	62,24	$ 15.901.099,00	
				SUBTOTAL	$ 24.979.020,00			$ 5.519.774,00		$ 30.498.795,00	
3	CIMENTACIÓN										
3.1	CONCRETO PT. 2L MIN ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.710,00	$ 48.097.791,00	-19,60	1.203,096	$ 18.124.314,00	52,95	$ 36.412.716,00	
3.2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	9754,50	$ 9.510,00	$ 27.208.670,00	-1070,55	-	$ 10.810.126,50	2685,95	$ 26.397.945,00	
3.3	CONCRETO P. C. 2L MIN PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,60	$ 1.011.710,00	$ 28.918.331,00	-1,24	1.362,850	$ 1.833.398,00	27,35	$ 27.273.946,00	
3.4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1908,40	$ 9.510,00	$ 18.145.676,00	2237,85	-	$ 21.386.126,50	4066,27	$ 40.296.726,50	
3.5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M2	29,40	$ 494.000,00	$ 14.141.470,00	-25,70	-	$ 12.700.179,00	3,71	$ 1.843.291,00	
3.6	PLACA DE CONTRAPISO e= 10 cm	M2	52,04	$ 1.003.463,00	$ 51.800.598,00	-57,04	-	$ 57.250.598,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 209.760.846,00			$ 81.696.468,00		$ 142.424.626,00	
4	ESTRUCTURA										
4.1	CONCRETO PT. 2L MIN COLUMNAS	M3	13,23	$ 1.003.760,00	$ 20.416.351,00	-2,69	1.204,465	$ 3.791.211,00	10,54	$ 23.664.451,00	
4.2	CONCRETO PT. 2L MIN VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.335,00	$ 35.345.930,00	-9,56	1.412,338	$ 13.494.892,00	23,35	$ 32.975.337,00	
4.3	CONCRETO PT. 2L MIN PLACA NUBIDEA EN METALDECK	M3	28,48	$ 1.039.000,00	$ 27.520.999,00	47,31	1.080,540	$ 51.361.167,00	75,79	$ 80.306.366,00	
4.4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5000,31	$ 9.510,00	$ 50.480.951,00	-972,52	-	$ 9.864.673,00	5026,79	$ 48.615.489,00	
4.5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2420,00	$ 9.510,00	$ 24.071.451,00	803,02	-	$ 7.957.962,00	3223,02	$ 31.629.417,00	
4.6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	351,72	-	$ 37.480.686,00	528,22	$ 56.485.773,00	
4.7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ACERO A 572, INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8994,70	$ 17.722,00	$ 159.395.036,00	-8994,70	-	-$ 159.395.036,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 342.214.775,00			-$ 81.488.092,00		$ 260.484.733,00	
5	CUBIERTA Y CIELO RASO										
5.1	TEJA MACROMIC CAL.26 COLOR AZUL	M2	406,4892	$ 90.994,00	$ 36.422.729,00	-46,49	-	-$ 4.230.998,00	360,00	$ 32.433.846,00	
5.2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,50	$ 64.858,00	$ 22.379.064,00	0,00	-	$ 799.699,00	357,50	$ 23.178.763,00	
5.3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	388,60	$ 17.705,00	$ 6.880.429,00	-155,76	-	-$ 1.878.152,00	232,84	$ 5.077.668,00	
5.4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 382.355,00	$ 9.359.633,00	-24,67	-	-$ 9.359.633,00	0,00	$ -	
5.5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.344,00	$ 5.867.200,00	-50,00	-	-$ 5.867.200,00	0,00	$ -	
5.6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 303.578,00	$ 22.420.733,00	-72,71	-	-$ 22.420.733,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 99.894.676,00			-$ 41.669.467,00		$ 58.385.273,00	
6	MAMPOSTERIA, MUROS, MUÑETES Y PINTURA										
6.1	MAMPOSTERIA, LADRILLO Nº 4	M2	710,84	$ 54.412,00	$ 38.682.181,00	-28,88	-	-$ 1.570.868,00	680,96	$ 37.291.274,00	
6.2	MUÑETE 1:4 INTERIORES	M2	883,68	$ 22.286,00	$ 22.805.817,00	-138,96	-	-$ 3.096.252,00	744,72	$ 19.710.732,00	
6.3	MUÑETE 1:4 BALDE PLACA	M2	176,50	$ 23.709,00	$ 4.185.229,00	-176,50	-	-$ 4.185.229,00	0,00	$ -	
6.4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	883,68	$ 13.802,00	$ 12.201.647,00	-342,44	-	-$ 4.603.635,00	541,24	$ 8.058.031,00	
6.5	ESTUCO INTERIOR BALDE PLACA	M2	176,50	$ 13.265,00	$ 2.468.353,00	-176,50	-	-$ 2.468.353,00	0,00	$ -	
6.6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	883,68	$ 13.265,00	$ 11.868.999,00	-342,44	-	-$ 4.131.729,00	541,24	$ 7.736.561,00	
6.7	MURETE NORTE 2.3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.318,00	$ 9.744.668,00	282,19	-	$ 12.442.748,00	468,19	$ 20.187.416,00	
6.8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	229,00	$ 14.745,00	$ 3.322.210,00	240,19	-	$ 3.577.092,00	468,19	$ 6.903.462,00	
6.9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLASTICA	M2	226,00	$ 14.158,00	$ 3.199.256,00	242,19	-	$ 3.428.442,00	468,19	$ 6.627.698,00	
				SUBTOTAL	$ 113.163.528,00			-$ 3.741.575,00		$ 107.420.993,00	
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
7.1	PUNTO HIDRAULICO PVC 26 1/2" Y PASH + 3 R	PTO	20,00	$ 41.289,00	$ 825.780,00	-3,00	-	-$ 123.867,00	17,00	$ 701.913,00	
7.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	22,00	$ 17.913,00	$ 394.086,00	0,00	-	$ -	22,00	$ 394.086,00	
7.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,55	$ 11.036,00	$ 105.294,00	2,45	-	$ 38.088,00	12,00	$ 129.672,00	
7.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.253,00	$ 315.495,00	0,00	-	$ -	34,10	$ 315.495,00	
7.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,12	$ 7.257,00	$ 298.438,00	-7,12	-	$ 51.678,00	34,00	$ 246.760,00	
7.6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	1,00	$ 1.279.300,00	$ 1.127.900,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.127.900,00	
7.7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.370,00	$ 2.900.370,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 2.900.370,00	
				SUBTOTAL	$ 6.573.360,00			$ 147.035,00		$ 6.426.365,00	

INFORME DE INTERVENTORÍA N.° 2

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS MODIFICACIONES ACTA			TOTAL CANTIDADES Y VALORES		
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	1 CIMENTACIONES Y OBRAS CIVILES										
1.1	PUNTO SANITARIO PVC Ø 3" Y REDM x 1 M	PTO	14,00	$ 89.447,00	$ 1.252.258,00	0,00	-	$ -	14,00	$ 1.252.258,00	
1.2	PUNTO SANITARIO PVC Ø 4" (1 M)	PTO	5,00	$ 138.772,00	$ 693.716,00	3,00	-	$ 365.716,00	8,00	$ 711.432,00	
1.3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,00	$ 29.392,00	$ 881.760,00	-4,20	-	$ 94.318,80	25,80	$ 787.152,00	
1.4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	46,12	$ 23.845,00	$ 1.100.007,20	-6,40	-	$ 203.477,00	40,00	$ 1.700.000,00	
1.5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,00	$ 29.425,00	$ 1.197.369,20	-8,20	-	$ 308.130,00	80,00	$ 2.120.800,00	
1.6	TRANSITE PVC	UND	3,00	$ 24.017,00	$ 324.551,20	1,00	-	$ 24.017,00	4,00	$ 180.208,20	
1.7	CAJAS DE INSPECCION	UND	3,00	$ 666.418,00	$ 1.301.252,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 1.301.252,00	
1.8	POZO SEPTICO INTERNADO	UND	1,00	$ 10.898.760,00	$ 10.898.760,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 10.898.760,00	
				SUBTOTAL	**$ 17.174.137,00**			**$ 1.038.671,80**		**$ 18.301.212,20**	
	2 PISOS, ENCHAPES Y PEDIDOS										
2.1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 93.935,00	$ 45.461.420,00	-109,80	-	$ 9.371.748,00	374,40	$ 35.013.672,00	
2.2	CERAMICA AREAS ANTIDESLIZANTE	M2	44,00	$ 83.614,00	$ 3.679.016,00	-11,20	-	$ 10.039.401,00	343,20	$ 13.813.699,20	
2.3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 91.317,00	$ 3.652.680,00	9,60	-	$ -	49,60	$ 3.349.080,00	
2.4	CENTRO CERAMICA PISO	M2	136,00	$ 80.886,00	$ 10.999.896,00	-40,32	-	$ 3.316.313,00	106,88	$ 13.672.367,00	
2.5	GUARDA ESCOBAS	ML	240,00	$ 24.473,00	$ 4.553.133,00	36,32	-	$ 821.965,00	276,32	$ 5.375.098,20	
2.6	MESON GRANITO	M2	23,50	$ 267.178,00	$ 5.214.686,00	-4,26	-	$ 1.065.398,00	8,24	$ 5.115.112,00	
2.7	ENCHAPE COCINA SUPERIOR	ML	30,00	$ 406.300,00	$ 4.060.000,00	10,20	-	$ 4.062.000,00	0,00	$ -	
2.8	ENCHAPE COCINA INFERIOR	ML	30,00	$ 406.300,00	$ 4.060.000,00	-10,00	-	$ 4.062.000,00	0,00	$ -	
2.9	LAVAPLATOS COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 3.699.300,00	$ 3.699.300,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 3.699.300,00	
2.10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	386,80	$ 11.677,00	$ 4.376.134,00	-386,80	-	$ 4.376.134,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 99.429.599,00**			**$ 43.428.331,00**		**$ 79.901.319,00**	
	3 CARPINTERIA MADERA										
3.1	CABINA WC	UND	6,00	$ 2.612.000,00	$ 15.672.000,00	-4,00	-	$ 10.672.000,00	2,00	$ -	
3.2	PUNTO SANITARIO	UND	6,00	$ 1.008.046,00	$ 6.084.360,00	-3,00	-	$ 3.024.000,00	4,00	$ 6.048.720,00	
3.3	LAVAMANOS	UND	6,00	$ 346.188,00	$ 2.101.752,00	-3,00	-	$ 692.376,00	3,00	$ 2.422.596,00	
3.4	TUBE MANNES MIXER (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	6,00	$ 776.000,00	$ 4.656.000,00	8,23	-	$ 6.391.604,00	17,23	$ 11.677.604,00	
3.5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	30,00	$ 113.978,00	$ 3.279.000,00	-30,00	-	$ 3.279.000,00	0,00	$ -	
3.6	EXTRACTOR DE AIRE 20W	UND	3,00	$ 332.875,00	$ 932.025,00	-3,00	-	$ 932.025,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 37.330.975,00**			**$ 34.005.479,00**		**$ 31.149.496,00**	
	11 CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE										
11.1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.498,00	$ 6.357.290,00	0,00	-	$ 6.357.290,00	0,00	$ -	
11.2	PUERTA TIPO 1 MADERA MATAMBUALGA TERCER 04 COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.500,00	$ 2.353.000,00	-2,00	-	$ 2.353.000,00	0,00	$ -	
11.3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 3.088.440,00	$ 3.088.440,00	-1,00	-	$ 3.088.440,00	0,00	$ -	
11.4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.328.412,00	$ 2.328.412,00	-1,00	-	$ 2.328.412,00	0,00	$ -	
11.5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.188.500,00	$ 6.377.700,00	-2,00	-	$ 6.377.700,00	0,00	$ -	
11.6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.490,00	$ 1.602.490,00	-1,00	-	$ 1.602.490,00	0,00	$ -	
11.7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.740.088,00	$ 1.740.088,00	-1,00	-	$ 1.740.088,00	0,00	$ -	
11.8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.692.888,00	$ 5.385.776,00	-2,00	-	$ 5.385.776,00	0,00	$ -	
11.9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.880,00	$ 1.018.880,00	-1,00	-	$ 1.018.880,00	0,00	$ -	
11.10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD Doble Cocina	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	-1,00	-	$ 2.370.288,00	0,00	$ -	
11.11	VENTANA TIPO CORREDERA (METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 2.203.832,00	$ 13.222.932,00	-6,00	-	$ 13.222.932,00	0,00	$ -	
11.12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TEMPERADOS BLOMPINTURA ELECTROESTATICA)	UND	5,00	$ 1.562.500,00	$ 7.812.500,00	-5,00	-	$ 7.812.500,00	0,00	$ -	
11.13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 665.230,00	$ 665.230,00	-1,00	-	$ 665.230,00	0,00	$ -	
11.14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	-1,00	-	$ 342.660,00	0,00	$ -	
11.15	VENTANA TIPO 4.1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	-3,00	-	$ 775.494,00	0,00	$ -	
11.16	VENTANA TIPO 4.2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	-1,00	$ -	$ 213.180,00	0,00	$ -	
11.17	VENTANA TIPO 4.3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADHESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	-1,00	$ -	$ 342.660,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	**$ 61.536.387,00**			**$ 61.536.387,00**		**$ -**	

INFORME DE INTERVENTORÍA N.º 2

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD			VALORES MODIFICATORIOS PREVIOS ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		JUSTIFICACIÓN
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
12	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**										
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	-1,44	-	$ 1.618.042,00	5,56	$ 6.247.438,00	
12,2	VEGA ARMASTRE MURO DE CERRAMIENTO	KG	5,40	$ 1.208.566,00	$ 6.665.927,00	-1,40	-	$ 4.683.927,00	0,00	$ -	
12,3	RAMPA EXTERIOR VIA EN CONCRETO F' C 21 MPA	M2	4,30	$ 1.131.393,00	$ 4.865.367,00	-4,30	-	$ 4.865.367,00	0,00	$ -	
12,4	CORTINAS EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	1,20	$ 1.084.033,00	$ 1.400.198,00	-5,72	-	$ 726.037,00	5,47	$ 673.253,00	
12,5	CAMET A EN CONCRETO F' C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.059.306,00	$ 13.790.343,00	-13,13	-	$ 13.790.343,00	0,00	$ -	
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	36,00	$ 34.412,00	$ 1.958.832,00	-36,00	-	$ 1.958.832,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 34.488.016,00			$ 27.577.328,00		$ 6.920.691,00	
13	**ELECTRICO, VOZ Y DATOS**										
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 359.633,00	$ 2.877.064,00	0,00	-	$ -	8,00	$ 2.877.064,00	
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 239.173,00	$ 7.085.190,00	0,00	-	$ -	30,00	$ 7.085.190,00	
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 3No12+1No 12 HFR-(J)	UND	66,00	$ 243.067,00	$ 16.043.742,00	0,00	-	$ -	66,00	$ 16.043.742,00	
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFR-(J)	UND	10,00	$ 207.480,00	$ 2.074.800,00	-8,00	-	$ 1.037.440,00	10,00	$ 2.074.800,00	
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFR-(J)	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 682.137,00	
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFR-(J)	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	0,00	-	$ -	4,00	$ 1.064.556,00	
13,7	Suministro e Instalacion de Salida Lampara de aplique o muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 350.964,00	$ 2.456.727,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 2.456.727,00	
13,8	Suministro e instalacion de Panel Led de 60x60 con de incrustar de 40 W	UND	18,00	$ 433.999,00	$ 6.781.794,00	0,00	-	$ -	18,00	$ 6.781.794,00	
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	-16,00	-	$ 2.049.904,00	38,00	$ 4.868.522,00	
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.999,00	$ 1.415.928,00	0,00	-	$ -	12,00	$ 1.415.928,00	
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble Spot	UND	7,00	$ 176.813,00	$ 1.231.691,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.231.691,00	
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de alumbrado en Cable Cu 3No4+1No6+1No8 T (AWG) por ducto PVC de 1 1/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	48,00	$ 152.280,00	$ 6.491.200,00	30,00	-	$ 2.240.400,00	60,00	$ 8.736.800,00	
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto 3/4C de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 746.139,00	
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CS 274	UND	1,00	$ 1.253.330,00	$ 1.253.330,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.253.330,00	
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 30 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 831.863,00	
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 350x350 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 304.125,00	$ 304.125,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 304.125,00	
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 3x30 A	UND	11,00	$ 28.983,00	$ 318.813,00	0,00	-	$ -	11,00	$ 318.813,00	
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 306.607,00	$ 306.607,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 306.607,00	
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 996.100,00	
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 80x80x80 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 390.223,00	
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.422.953,00	
13,22	Suministro e instalación de red y equipo de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.817.600,00	$ 3.817.600,00	-1,00	-	$ 3.817.600,00	0,00	$ -	
13,23	Suministro e instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.107,00	$ 855.535,00	0,00	-	$ -	5,00	$ 855.535,00	
13,24	Suministro e instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 9.515,00	$ 589.930,00	-62,00	-	$ 589.930,00	0,00	$ -	
13,25	Suministro e instalación de bandeja canaleta 35x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	-2,00	-	$ 237.954,00	0,00	$ -	
13,26	Suministro e instalación de tuberia EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 35.743,00	$ 2.216.366,00	0,00	-	$ -	62,00	$ 2.216.366,00	
				SUBTOTAL	$ 68.410.534,00			$ 4.621.730,00		$ 63.888.756,00	
14	**OTROS ITEMS**										
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	6,00	$ 631.325,00	$ 4.882.609,00	6,00	-	$ 4.882.609,00	0,00	$ -	
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	25,48	$ 175.997,00	$ 4.307.427,00	-24,48	-	$ 4.307.427,00	0,00	$ -	
				SUBTOTAL	$ 9.190.037,00			$ 9.190.037,00		$ -	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO			VALORES INDEXADOS CORTE PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES INDEXADAS		ABREVIACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
15 OTROS NO PREVISTOS											
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	23,60	$ 783.645,00	$ 18.700.110,00	23,60	$ 18.700.110,00	
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	12,00	$ 708.095,00	$ 8.473.140,00	12,00	$ 8.473.140,00	
15,3	CUBIERTA TEJA CANGARIC, INCLUYE REDILLA PLASTICA, PAGADA POR M2	ML			$ -	34,00	$ 638.145,00	$ 21.696.760,00	34,00	$ 21.696.760,00	
15,4	TRASNPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE KON KO	M3/KM			$ -	27947,75	$ 1.950,00	$ 54.498.131,00	27947,75	$ 54.498.131,00	
15,5	VIGA CIMEN EN CONCRETO DE 3000 PSI 20X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ -	163,30	$ 99.420,00	$ 16.530.276,00	163,30	$ 16.530.276,00	
15,6	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	KG			$ -	2113,05	$ 17.700,00	$ 37.411.185,00	2113,05	$ 37.411.185,00	
15,7	PUNTA HIERRO EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUE ELEVADO	M3			$ -	37,50	$ 296.322,00	$ 11.187.000,00	37,50	$ 11.187.000,00	
15,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UNI			$ -	1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00	1,00	$ 350.250,00	
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICO DESARROLLO <20<=60 CM	ML			$ -	33,00	$ 171.660,00	$ 5.147.275,00	33,00	$ 5.147.275,00	
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML			$ -	91,70	$ 20.396,00	$ 1.867.582,00	91,70	$ 1.867.582,00	
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3			$ -	12,97	$ 694.000,00	$ 9.001.180,00	12,97	$ 9.001.180,00	
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 40 WAVPORT	ML			$ -	19,27	$ 72.839,00	$ 1.403.897,00	19,27	$ 1.403.897,00	
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL EN ACERO INOXIDABLE	M2			$ -	20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00	20,00	$ 16.640.000,00	
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSEGURIDAD DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML			$ -	66,30	$ 394.545,00	$ 26.161.648,00	66,30	$ 26.161.648,00	
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TONM			$ -	11376,15	$ 3.606,00	$ 48.338.955,00	11376,15	$ 48.338.955,00	
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UNI			$ -	1,00	##########	$ 13.424.500,00	1,00	$ 13.424.500,00	
15,17	CONCRETO PC 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML			$ -	183,00	$ 71.401,00	$ 13.070.062,00	183,00	$ 13.070.062,00	
15,18	CAPRICHO DE PISO E= 5 CM	M2			$ -	944,00	$ 98.650,00	$ 27.662.208,00	944,00	$ 27.662.208,00	
				SUBTOTAL	$ -			$ 324.379.207,00		$ 324.379.207,00	
	COSTO DIRECTO DE OBRA (a)				$ 1.138.018.103,00			$ 33.265.483,00		$ 1.138.018.103,00	
	ADMINISTRACION	25%			$ 284.729.348,00		ADMINISTRACION	25%		$ 284.729.348,00	
	IMPREVISTOS	1%			$ 11.380.182,00		IMPREVISTOS	1%		$ 11.380.182,00	
	UTILIDAD	4%			$ 45.536.728,00		UTILIDAD	4%		$ 45.536.728,00	
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 1.480.664.361,00		COSTO TOTAL DE LA OBRA INDEXADO			$ 1.480.664.361,00	

13. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas. Comité de obra

FECHA	LUGAR	TEMA	OBJETO DE LA REUNIÓN	COMPROMISOS
Comité N.4 08/03/2024	Montañita – Caquetá	Avance de obra y recomendaciones sobre métodos constructivos	• Recomendaciones sobre método constructivos • Lineamientos técnicos para la construcción de elementos estructurales.	• Entrega de resultados de resistencia a la compresión de cimentación (zapatas) • Realización de ensayos de resistencia para elementos estructurales (vigas y columnas)
Comité N.5 27/03/2024	Montañita – Caquetá	Avance de obra y lineamientos técnicos para rellenos y aspectos de seguridad en el trabajo	• Dar a conocer Avance de obra • Observaciones de la importancia de los rellenos y su debida compactación en la cimentación • Solicitar al contratista la debida implementación de sistema de prevención de accidentes y utilización de elementos de protección personal en obra.	• Verificar los rellenos y su debida compactación para proporcionar apoyo y estabilidad (aislamiento de cimientos) • Capacitaciones en campo sobre peligro, riesgos, acto, condición, incidente y accidentes • Verificación y supervisión constante sobre el uso de los elementos de protección personal

13.1.RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

comité n.	fecha del comité	Entidades asistentes al comité	Objetivo del comité
1	08/03/2024	• SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS • DICO&S SAS • ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTAÑITA	14. Recomendaciones sobre método constructivos 15. Lineamientos técnicos para la construcción de elementos estructurales.
2	27/03/2024	• SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS • DICO&S SAS • ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTAÑITA	16. Dar a conocer Avance de obra 17. Observaciones de la importancia de los rellenos y su debida compactación en la cimentación 18. Solicitar al contratista la debida implementación de sistema de prevención de accidentes y utilización de elementos de protección personal en obra.

14. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

El presente informe muestra la revisión de las actividades realizadas por el contratista en el periodo de tiempo del 02 de marzo al 01 de abril de 2024.

ANEXO 15. *Informe de obra*

15. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

15.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
05/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CUADRILLA ORDEN Y ASEO
08/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR-10

11/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
14/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS
29/03/2024	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	SOLICITUD DE SOPORTE DE PAGOS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

15.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
06/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	CONFORMACION DE CUADRILLA DE ORDEN Y ASEO
12/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR-10
13/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	ATENCION A RECOMENDACIONES SOBRE EPP
15/03/2024	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	CONSTRUCTORA DICO&S SAS	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

ANEXO 9. *Copia de la correspondencia enviada y recibida*

16. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista de interventoría realiza visitas de obra en donde se evidencia el avance de las actividades del proyecto. Se realiza la observación del personal de obra que NO se acredita el pago de seguridad social para el mes de marzo.

Se recuerda al contratista el debido cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes para la construcción de columnas según la norma sismo resistente NSR-10.

Se verifica que se cumpla con la calidad de las actividades ejecutadas. Se solicita la elaboración de ensayos de laboratorio, control de calidad de los materiales a partir de lo establecido en las especificaciones técnicas. A la fecha se han avanzado en actividades de cimentación de la estructura (concreto estructural y ciclópeo), acero de columnas, rellenos, y finalmente se da inicio a la instalación de lámina en metaldeck para la construcción de

1285

la placa en metaldeck con malla electrosoldada, para esta actividad es necesario instalar una perfilaria metálica (ítem no previsto). Se deben tener en cuenta los diseños de mezclas y según la topografía respetar las diferentes alturas de las columnas para así mismo realizar la fundición de estas.

17. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista de interventoría realiza el desarrollo de informes semanales en donde se muestra el avance obra. Se recomienda al contratista la elaboración de ensayos de resistencia a la compresión del concreto utilizado para zapatas, columnas y vigas (21 Mpa). Por otro lado, se hace énfasis en el control de la ejecución del proyecto, control de los métodos constructivos, controles topográficos de las secciones, localización y nivelación de los elementos estructurales. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir los elementos estructurales de las actividades desarrolladas.

Se recomienda subsanar los pagos de seguridad social del personal de obra que no se acredita para el periodo ejecutado (febrero-marzo).

Secuencia de los informes semanales

N. de informe semanal	Periodo de informe	N. de informe de interventoría
1	04/03/2024 - 10/03/2024	1
2	11/03/2024 - 17/03/2024	
3	18/03/2024 - 24/03/2024	
4	25/03/2024 - 31/03/2024	

ANEXO 6. *Informes Semanales (Marzo)*

18. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	225-CMAB-2023.
Objeto:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

Nombre del contratista:	CONSTRUCTORA DICO&S SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($162.035.160) – CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
Valor Anticipado:	N.A
Fecha de iniciación:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024
Prorroga	N. A
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha de Terminación Contractual Actual:	01 E AGOSTO DE 2024

18.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 02 de febrero de 2024 hasta el 01 de abril de 2024.

18.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

18.3. INFORMACIÓN FINANCIERA

CONSTRUCTORA DICO&S SAS

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1.	2.	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CDF	OTROS

ATENCION INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN						$ 1.480.734.968				
TOTALES						$ 1.480.734.968				

18.4. RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoria.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					

18.5. BALANCE DEL ANTICIPO

El contrato no tiene anticipo, el pago se realizará por medio de avance de obra.

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

18.6. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

Aclaratorio o Modificatorio No. 1	
Descripción	
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	
Descripción	

18.7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato de interventoría fueron expedidas por la compañía "SEGUROS DEL ESTADO S.A."

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA 61-46-101024405– ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	15/12/2023	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	15/12/2023	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725.31
Calidad del servicio	61-46-101024405	15/12/2023	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

Fueron expedidas el 16 de diciembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA 61-46-101024405 – ANEXO 1

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	15/12/2023	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	15/12/2023	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725.31
Calidad del servicio	61-46-101024405	15/12/2023	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL, ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

1289

Fueron expedidas el 12 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Con vigencia desde el 15/12/2023 al 15/12/2028.

Actualización de la póliza de garantía única de cumplimiento de interventoria

PÓLIZA 61-46-101024405 – ANEXO 2

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMA NETA
Cumplimiento del Contrato	61-46-101024405	02/02/2024	25/12/2024	$ 16,203,520.00	
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	61-46-101024405	02/02/2024	15/06/2027	$ 8,101,760.00	$ 476,725
Calidad del servicio	61-46-101024405	02/02/2024	15/122028	$ 32,407,040.00	
TOTAL, ASEGURADO				$ 56,712,320.00	

Fueron expedidas el 12 de febrero del 2024 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 02/02/2024 hasta el 02/08/2029.

ANEXO 16. *SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA*

18.8. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA	02 DE FEBRERO DE 2024	01 DE AGOTO DE 2024
CONSTRUCTORA DICO&S SAS	02 DE FEBRERO DE 2024	01 E AGOTO DE 2024

18.9. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Se relaciona en el siguiente cuadro el personal de interventoria:

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL
1	Director de Interventoria	Ingeniero Civil	Marla Alessandra Dávila	25202-175965 CND
2	Residente de Interventoria	Ingeniero Civil	Fabio Hernán Fiesco Gorrón	25202-347150 CND
3	Topógrafo	Topógrafo	Cristian Andrés Sendoya	01-19130

ANEXO 13. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 14. CONTROL DEL LLUVIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
ANEXO 11. INFORME DE OBRA
ANEXO 10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES-ENSAYOS DE RESISTENCIA

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal de CONSTRUCTORAS DICO&S SAS, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra N.º 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita Caquetá

CERTIFICO:

Que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S como CONTRATISTA de las referidas obras, no ha suministrado a la interventoría las planillas de pago del mes de marzo, teniendo en cuenta que el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo tiene un plazo para pago hasta el 10 de abril, se entrega de manera parcial las planillas de pago del mes de febrero.

- SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S – FEBRERO DE 2024.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	PENSION	SALUD	RIESGOS
2	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	9465546700	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500
3	ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO	12.552.581	9463815334	$ 416.000	$ 325.000	$ 13.600
6	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	1.110.535.942	29151922	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700
7	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUERIEL	1.018.410.974	75193758	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700

- SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S – MARZO DE 2024.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	No PLANILLA	PENSION	SALUD	RIESGOS
1	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA	1.117.545.232	No acredita			

1392

2	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	1.018.435.020	No acredita			
3	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUERIEL	1.018.410.974	No acredita			

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

1. CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Yo, CARLOS DARÍO CANO SANCHEZ, como representante Legal Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra N.º 225-CMAB-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente entre el 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante Pre acta No.02 (Corte de Obra 2) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

1044

1. CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Yo, CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, como representante Legal de Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra N.° 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

- Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante Preacta No.02 (Corte de Obra 2) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.
- Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS ha construido el campamento y/o adecuando instalaciones para almacenar los materiales, insumos en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, se puede asegurar la existencia de estos y que están de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones del contrato y las aplicables al proyecto.
- Se tiene EVIDENCIA que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS ha suministrado el equipo en el sitio de la obra en el periodo correspondiente del 02 de marzo de 2024 al 01 de abril de 2024, por lo tanto, se puede asegurar que son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (01) días del mes de abril de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

1295

LISTADO DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO 1- INFORME FINANCIERO DE OBRA
ANEXO 2- REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 3- CONTROL DIARIO DEL EQUIPO
ANEXO 4- COPIA DE LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 5- SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSIÓN
ANEXO 6- INFORMES SEMANALES
ANEXO 7- PRE ACTA DE OBRA No 002 (CORTE DE OBRA)
ANEXO 8- CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA
ANEXO 9- COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 10- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES – ENSAYOS DE RESISTENCIA
ANEXO 11-EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA
ANEXO 12 – FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DE OBRA
ANEXO 13 - CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 14 - CONTROL DE LLUVIAS EN EL AREA DEL PROYECTO
ANEXO 15- INFORME DE OBRA
ANEXO 16- SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DE INTERVENTORIA
ANEXO 17- INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

1096

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA ANEXO 4 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO

Inicio: 2-mar-24 Fin: 2-abr-24

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA

CONTRATO No: 212-LICP-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORAZOMAC SAS

INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
							$1.480.593.601		$1.480.593.601,00	No se ha registado cobros
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.480.593.601	$ -	$ 1.480.593.601	

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de Interventoria DICO&S SAS

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	INTERVENTORIA TÉCNICA VEREDA MATEGUADUA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ **ANEXO - REGISTRO FOTOGRAFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2
		PAGINA	1 DE 11

PERIODO 02/03/2024 A 31/04/2024

OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"**

FECHA: 31/03/2024

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

INTERVENTOR: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME No.2

3.3 CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE





3.4 ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE





3.5 CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm





4.1 CONCRETO FC 21 MPA COLUMNAS





4.2 CONCRETO FC 21 MPA VIGAS

2.3 PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA

1800




2.3	PERFILES METALICOS PARA PLACA DE CONTRAPISO







8.3 - 8.4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" y 4", INCLUYE ACCESORIOS




Firma
Nombre CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoria
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1882

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

ANEXO 8 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

CÓDIGO				
VERSIÓN	1			
PAGINA	1			DE

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA" CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

CONTRATO No.: 225-CMAB-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

PERIODO — Inicio: 2-mar-24 Fin: 1-abr-24

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

DIA / MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	SAB 1	DOM 2	LUN 3	MAR 4	MIE 5	JUE 6	VIE 7	SAB 8	DOM 9	LUN 10	MAR 11	MIE 12	JUE 13	VIE 14	SAB 15	DOM 16	LUN 17	MAR 18	MIE 19	JUE 20	VIE 21	SAB 22	DOM 23	LUN 24	MAR 25	MIE 26	JUE 27	VIE 28	SAB 29	DOM 30	LUN 31
ESTACION TOTAL	GOWIN	TKS-202	-	A		I	A	I	A	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I			
NIVEL TOPOGRÁFICO	TOPCON	AT-B4	-	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		
VOLQUETA	FORD SAAB51	1987	7.000 Kg/PSI	A		I	A	I	A	I	I		A	A	A	I	I	A		A	I	A	A	I	I		A	A	I	A	I	A	
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX	-	450 L	A		A	A	I	I	I	A		A	I	A	I	I	A		A	I	A	I	A	I		A	I	A	I	A	A	
								A							A							I							A				

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de Interventoria

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

ANEXO 4. COPIA DE LA PLANILLAS DE SS DEL PERSONAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

aportes en línea

Planilla Resumen

1804

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	Cra 4 15-06	FLORENCIA-CAQUETA	3038955153	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510905516	94643281191	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aportes	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBREROS SINERGIA 2022 (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
Centro de Trabajo: OBRAS RIESGO V (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200
1	CC	1122719699	BAEZ JHONATAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
1	CC	1117544116	BERNATE EDWIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
1	CC	1118884178	CHACON JESSE	23030 1	1	$43,334	$7,000	SP0085	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
4	CC	1118314582	CORDOBA ELKYN	X	24	$1,040,000	$166,400	SP0042	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
5	CC	1117548115	CUELLAR BRAYAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
6	CC	17683813	CURREO ISRAEL	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
7	CC	1006304546	FISCO STIVEN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
8	CC	1075210670	FRAOCA JUAN	X	1	$43,334	$7,000	SP0042	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
9	CC	1117562104	GOMEZ EDINSON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
10	CC	1117513887	GONZALES GUILLERMO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
11	CC	1118854454	GUZMAN ALEXANDER	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
12	CC	1117549138	HOLGUIN YULIAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
13	CC	1117510888	LLANOS ISMAEL	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
14	CC	1006208316	MARTINEZ DARIO	X	9	$390,000	$62,400	SP0037	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
15	CC	1006507486	MENDEZ ALEXIS	X	9	$390,000	$62,400	SP0042	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
16	CC	1006510839	OSPINA ALEXANDER	X	1	$43,334	$7,000	SP0037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
17	CC	1117005738	OYOLA JUAN	X	1	$43,334	$7,000	SP0037	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
18	CC	1006116951	PEREZ SEBASTIAN	X	24	$1,040,000	$166,400	SP0042	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$322,000
19	CC	1006108869	QUIACHA HERNANDO	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
20	CC	1006511638	ROMAYO CARLOS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0085	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
21	CC	1006113462	ROJAS JAROL	X	9	$390,000	$62,400	SP0042	9	$390,000	$15,600	CCF13	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	N	$120,800
22	CC	1007620298	TRUJILLO MAR	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
23	CC	1116203171	TRUJILLO JHON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	SP0042	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$400,500
Total Afiliados(23)						$21,623,336	$2,460,800			$21,623,336	$865,300			$21,623,336	$865,300			$21,623,336		$1,385,800		$0	$0		$4,696,200

2024/03/13 05:11 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901383654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS SINERGIA 2022	CRA 4 15-06	FLORENCIA-CAQUETA	3103853153	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510903515	84642812?1	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$6,696,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$3,460,000	$0	$0	$3,460,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,120,200	$0	$0	$3,120,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$277,400	$0	$0	$277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	23	$865,200	$0	$0	$865,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$865,200	$0	$0	$865,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	$324,200	$0	$0	$324,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$209,800	$0	$0	$209,800
TOTAL				23	$6,696,200	$0	$0	$6,696,200

aportes en línea

Planilla Resumen

1806

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901283654	9	SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	TV 76 Q 3 A 106 SUR BARRIO EL CHAMIZO	FLORENCIA-CAQUETA	3203859133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	45868851	9463513361	E	2024/03/13	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$999,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Vsp	vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	vct	Irl	Vip							Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1117543132	CASTRILLON RICHARD																	23160	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$650,500
2	CC	36180691	PEREZ CARLOS																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$194,500
3	CC	1117501194	TRUJILLO DERLY																	23160	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$390,500	30	$0	$0	S	$650,500
Total			Afiliados(3)																			$2,600,000	$416,000			$1,950,000	$156,000			$3,900,000	$234,000			$3,900,000	$1,171,500		$0	$0		$1,495,500

2024/03/04 11:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1807

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901280654	8	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	TV 16 G 3 A 106 SUR BARRIO EL CHAMIZO	FLORENCIA-CAQUETA	3102805153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	488688539	94635113[illegible]	E	2024/03/13	2024/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	999,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$0	$0	$271,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$271,500	$0	$0	$271,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				3	$999,500	$0	$0	$999,500

1808

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29151922
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1110535942	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRRSPONDENCIA	AVENIDA COLOMBIA 726	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	EL DONCELLO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	HANDTRU@GMAIL.COM	TELÉFONO	3185639021
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29151922

1809

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110535942	59	No	No	No	18	247	3711001	Salario	TRUJILLO RAMIREZ HOOVER ANDRES	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110535942	X	2024-06-21																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110535942	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut SG	Valor SG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110535942	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90065228 3	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110535942	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

1810

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$31.700	0	$0	$0	$31.700	0	$0	$31.700	0	$0	$0	$31.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$31.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$402.200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018410674	DIEGO ARMANDO GALLEGO MUÑOZ	TV 50 No 80B 44 SUR	7156430	gallego074@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CAQUETÁ	FLORENCIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75193758	$402.208	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1016410874	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL		TV 16 No 99B 44 SUR	7189430	gallegod74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	04/03/2024	75100758	$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario Integral	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Retiro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016410874	GALLEGO MURIEL DIEGO ARMANDO	39	X																	28/30	1.300.800	156.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.800	182.100	14-01	1.300.800	1	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

1824

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1255[illegible]		[illegible] ROMERO ALEX RAMUNDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 No. 11 - 14	FLORENCIA-CAQUETA	4352859	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	9463815334	9463815334	I	2024/03/19	2024/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1255[illegible]	[illegible] ALEX																		25-14	30	$2,400,000	$454,000	EPS037	30	$2,400,000	$325,800		0	50	10	14-23	30	$2,400,000	$13,600	0	50	50	No	$754,600
Total	Afiliados(1)																						$2,400,000	$454,000			$2,400,000	$325,800			50	10			$2,400,000	$13,600		50	50		$754,600

2024/07/08 09:02 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1825

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1225[illegible]81		MOISES ROMERO ALEX RAMUNDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 No. 12 - 14	FLORENCIA-CAQUETA	4352899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	946381[illegible]334	946381[illegible]334	I	2024/03/19	2024/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

2024/07/08 09:02 AM


ANEXO 5. SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

FECHA	CRONOGRAMA -SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N. 1	
FEBRERO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	

CR

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	MES 1 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	MES 2 SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
1	PRELIMINARES	$ 15.681.840	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67	$ 4.920.513 $ 3.021.078,67		$ 1.680.268,00					
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS	$ 93.488.795		$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 5.000.759 $ 5.000.764,00	$ 6.080.759 $ 3.460.116,67	$ 6.080.759 $ 3.460.116,67	$ 3.460.116,67			
3	CIMENTACIÓN	$ 142.424.698				$ 17.800.080 $ 14.410.462,50	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080 $ 17.197.811,00	$ 17.800.080	$ 17.800.080
4	ESTRUCTURA	$ 209.484.733					$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00	$ 12.859.362,00		
5	CUBIERTA Y CIELO RASO	$ 58.185.271										
6	MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS	$ 107.420.595										
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 8.426.363										
8	SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 18.355.113										
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES	$ 74.061.329										
10	APARATOS SANITARIOS	$ 23.149.486										
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABL	$ -										
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 6.930.681										
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS	$ 58.988.793										
14	OTROS ITEMS	$ -										
15	ITEMS NO PREVISTOS	$ 316.279.257				$ 46.514.907		$ 10.904.109,09				
	COSTO DIRECTO	$ 1.138.819.663,00										
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL		$ 4.618.513,33	$ 10.710.271,34	$ 10.710.271,33	$ 64.427.745,83	$ 29.900.838,50	$ 29.900.838,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50	$ 17.803.079,50
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL		$ 3.021.078,67	$ 8.431.843,67	$ 22.442.305,17	$ 59.411.206,50	$ 34.479.188,17	$ 40.011.065,17	$ 32.508.600,17	$ 30.644.715,50	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		$ 3.021.078,67	$ 11.542.921,34	$ 33.975.226,50	$ 93.886.433,00	$ 97.330.642,17	$ 137.370.731,33	$ 169.877.621,50	$ 200.534.395,00	$ 200.534.395,00	$ 200.534.395,00

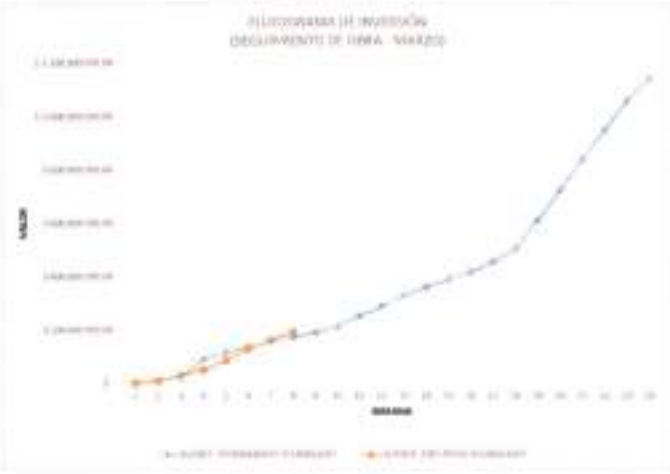

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.810.513,33	0,43%	$ 3.021.378,87	0,266%	$ 4.810.513,33	0,465%	$ 3.021.378,87	0,266%
2	$ 10.711.272,33	0,94%	$ 9.021.843,87	0,794%	$ 10.380.786,67	1,345%	$ 11.043.021,33	0,977%
3	$ 10.713.272,33	0,94%	$ 22.432.305,17	1,973%	$ 20.031.058,00	2,280%	$ 33.475.326,50	2,939%
4	$ 64.437.745,50	5,66%	$ 19.411.225,50	1,704%	$ 90.468.803,50	7,943%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 33.902.938,50	2,12%	$ 34.473.196,17	3,027%	$ 114.371.842,13	10,042%	$ 87.359.542,17	7,670%
6	$ 23.902.938,50	2,12%	$ 43.011.089,17	3,772%	$ 138.274.480,63	12,141%	$ 130.370.731,33	11,447%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 32.506.890,17	2,854%	$ 156.077.560,13	13,704%	$ 162.877.621,50	14,301%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 30.046.773,50	2,638%	$ 173.880.639,63	15,267%	$ 192.924.395,00	16,939%
9	$ 17.803.079,50	1,56%	$ -	0,000%	$ 191.683.719,13	16,830%	$ 192.924.395,00	16,939%
10	$ 17.803.079,50	1,56%	$ -	0,000%	$ 209.486.798,63	18,394%	$ 192.924.395,00	16,939%
11	$ 44.751.552,80	3,93%	$ -	0,000%	$ 254.238.351,43	22,323%	$ 192.924.395,00	16,939%
12	$ 35.374.836,30	3,11%	$ -	0,000%	$ 289.613.187,73	25,433%	$ 192.924.395,00	16,939%
13	$ 35.291.029,30	3,11%	$ -	0,000%	$ 325.004.217,03	28,544%	$ 192.924.395,00	16,939%
14	$ 56.291.028,20	3,11%	$ -	0,000%	$ 381.195.245,33	31,780%	$ 192.924.395,00	16,939%
15	$ 26.948.473,30	2,37%	$ -	0,000%	$ 388.683.719,63	34,125%	$ 192.924.395,00	16,939%
16	$ 26.948.473,30	2,37%	$ -	0,000%	$ 415.612.192,93	36,492%	$ 192.924.395,00	16,939%
17	$ 41.518.791,05	3,65%	$ -	0,000%	$ 457.131.483,98	40,157%	$ 192.924.395,00	16,939%
18	$ 45.826.888,05	3,85%	$ -	0,000%	$ 500.958.872,03	43,989%	$ 192.924.395,00	16,939%
19	$ 111.216.933,93	9,77%	$ -	0,000%	$ 612.175.805,95	53,751%	$ 192.924.395,00	16,939%
20	$ 111.216.933,93	9,77%	$ -	0,000%	$ 723.392.539,88	63,516%	$ 192.924.395,00	16,939%
21	$ 113.399.855,04	9,96%	$ -	0,000%	$ 836.779.140,42	73,471%	$ 192.924.395,00	16,939%
22	$ 113.399.855,04	9,96%	$ -	0,000%	$ 950.190.040,96	83,427%	$ 192.924.395,00	16,939%
23	$ 137.591.107,79	9,45%	$ -	0,000%	$ 1.087.847.148,75	92,882%	$ 192.924.395,00	16,939%
24	$ 81.359.814,25	7,12%	$ -	0,000%	$ 1.138.916.963,00	100,000%	$ 192.924.395,00	16,939%
	$ 1.138.916.963,00	100%						

1819

:ONOGRAMA DE OBRA

SINERGIA

MES 4						MES 5				MES 6				
SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25
$ 37.803.080														
$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473	$ 35.848.473					
						$ 14.571.318	$ 14.571.318	$ 14.571.318	$ 14.571.318					
								$ 26.955.239	$ 26.955.239	$ 26.955.239	$ 26.955.239			
	$ 9.429.303													
		$ 5.162.556	$ 5.162.556											
										$ 35.867.106	$ 35.867.106	$ 35.867.106		
												$ 31.245.496		
							$ 2.356.807	$ 2.356.807	$ 2.356.807					
										$ 21.329.349	$ 21.329.349	$ 21.329.349		
								$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 40.594.907	$ 51.269.815	$ 40.594.907
														$ 40.594.907,13
$ 44.791.552,80	$ 95.374.690,38	$ 36.051.029,80	$ 36.051.029,80	$ 35.848.473,30	$ 35.848.473,30	$ 43.525.791,05	$ 43.525.688,05	$ 111.210.883,69	$ 111.210.883,69	$ 119.986.890,54	$ 119.986.890,54	$ 107.681.187,79	$ 91.069.814,35	$ 65.594.907,13
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.831.096,29
$ 181.924.385,00	$ 181.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.995,00	$ 183.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 182.924.385,00	$ 182.924.995,00	$ 65.891.230,57

ING. RICHARD EDINSON CASTELLÓN M.
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

ING. CARLOS CAMILO CANO SÁNCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICOSS S.A.S.

1820

ANEXO 6. INFORMES SEMANALES

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1821

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 4/03/2024 AL: 10/03/2024 FECHA DEL INFORME: 11/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. 225-CMAB DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL:	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		3 PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	365 MESES (6)	
PLAZO ACTUAL:	365 MESES (6)	
CONTRAO DE OBRA	212-LICP	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:		1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL		0
FECHA DE PRORROGA:		
FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
FECHA DE REINICIO:	NA	NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:		1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	En ejecucion	7,67%

EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

- [x] CIMENTACION ____ m3
- [ ] ESTRUCTURA ____ m3
- [ ] CUBIERTA Y CIELO RASO ____ m2
- [ ] MAMPOSTERIA ____ m2
- [ ] RED HIDRAULICA ____ ml
- [ ] RED SANITARIA ____ ml
- [x] OTRO. CUAL? ____ UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN


INTERVENTORIA	OBRA
PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	POA CAQUETA
	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA
ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE	
ACTAS COBRADAS $ 0	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE
0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Reiasa de Suspension, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.992.063,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

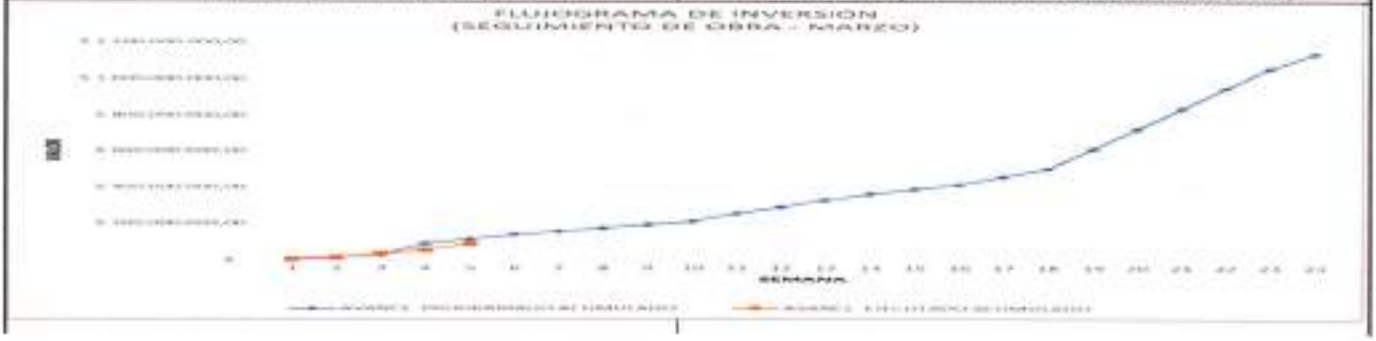

1822

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICON S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

GRAFICO DE AVANCE				GRAFICO DE AVANCE			
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REv POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**SOCIALIZACION**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VALLA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	20,83%	PLAZO FALTANTE:	79,17%	% PROGRAMACION OBRA	10,04%	% OBRA EJECUTADA	7,67%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	20,83%	PLAZO FALTANTE:	79,17%	% PROGRAMACION OBRA	10,04%	% OBRA EJECUTADA	7,67%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se recomienda uso adecuado de elementos de proteccion personal. Debido a las fuertes lluvias se dificultan accesos para entrada de material con volqueta.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE: SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHÍAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACION? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,1	Localizacion y replanteo de redes
2,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1823

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICOR S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 11/03/2024 AL 17/03/2024 FECHA DEL INFORME 18/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA):	No. 225-CMAB DE 2023				PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DICOR S.A.S				PLAZO ACTUAL:	SEIS MESES (6)	
REP. LEGAL:	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ				CONTRAO DE OBRA	212-UCP	FECHA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"				FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
					FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :		2/02/2024
					FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :		1/06/2024
					TIEMPO ADICIONAL		0
VALOR INICIAL :	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -	FECHA DE PRORROGA:		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -	FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -	FECHA DE REINICIO:	NA	NA
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -			
		3 PARCIALES	0%	$ -	FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :		1/06/2024
FORMA DE PAGO:	CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA				ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	En ejecucion	11,65%
						EN EJECUCION	

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA	OBRA
METAS FISICAS ACTUALIZADA:	PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"	PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
☑ ORIENTACION ____ m3		
ESTRUCTURA ____ m3		
☐ CUBIERTA Y CIELO RASO ____ m2		POA CAQUETA
☐ MAMPOSTERIA ____ m2		
☐ RED HIDRAULICA ____ ml	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA
☐ RED SANITARIA ____ ml		
☑ OTRO, CUAL? ____ UN	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE	ALCALDIA LA MONTAÑITA FUENTE
	ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN	0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACIÓN				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):



1824

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA RUDAS S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**VEEDURIA CIUDADANA**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	25,00%	PLAZO FALTANTE:	75,00%	% PROGRAMACION OBRA	12,14%	% OBRA EJECUTADA	22,45%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	25,00%	PLAZO FALTANTE:	75,00%	% PROGRAMACION OBRA	12,14%	% OBRA EJECUTADA	22,45%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se verifica que el acero de columnas (castillos) esten aplomados y alineados según los diseños definitivos y el levantamiento topografico resultado de la localizacion y replanteo del proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2,2	Excavación para zapatas y vigas de amarre
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE

FIRMA

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1825

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 18/03/2024 AL 24/03/2024 FECHA DEL INFORME 25/03/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. 225-CMA8 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL :	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$	-
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		3 PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: SEIS MESES (6)
PLAZO ACTUAL: SEIS MESES (6)
CONTRAT DE OBRA 212-UCP FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO: 1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL 0
FECHA DE PRORROGA:
FECHA DE SUSPENSION: NA NA
FECHA DE REINICIO: NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO: 1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: En ejecucion 14,80%
EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☑	CIMENTACION	m3
	ESTRUCTURA	m3
☑	CUBIERTA Y CIELO RASO	m2
☐	MAMPOSTERIA	m2
☐	RED HIDRAULICA	ml
☐	RED SANITARIA	ml
☑	OTRO. CUAL?	UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN

INTERVENTORIA

PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA

	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$ 0	

0

OBRA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

POA CAQUETA

RUBRO: FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA

	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$	0,00%

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)

CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA)



1826

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VEEDURIA CIUDADANA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	
				VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	29,17%	PLAZO FALTANTE:	70,83%	% PROGRAMACION OBRA	13,70%	% OBRA EJECUTADA	14,30%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	29,17%	PLAZO FALTANTE:	70,83%	% PROGRAMACION OBRA	13,70%	% OBRA EJECUTADA	14,30%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se realizan visitas tecnicas de obra por parte de la interventoria y el contratista. Se recomienda mejorar el acopio de materiales en obra y tener en cuenta los estados del clima para los diseños de mezclas

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE	SI ☑	NO ☐	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO?	SI ☑	NO ☐
CUALES? :			PORQUE?		
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS:	SI ☑	NO ☐	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑	VALOR?	$ 0
CAUSALES?: RELOCALIZACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES			EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN?	SI ☑	NO ☐
			PORQUE?		

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3,2	Excavacion para zapatas y vigas de amarre
3,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPa ZAPATAS
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL:

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1827

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA DIOD&S S.A.S	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 25/03/2024 AL 31/03/2024 FECHA DEL INFORME 1/04/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No 225-CMAB DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIOD&S SAS
REP. LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

VALOR INICIAL:	$ 162.035.160,00	ANTICIPO (%)	0%	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 162.035.160,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		# PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)	
PLAZO ACTUAL:	SEIS MESES (6)	
CONTRAT DE OBRA	212-UCP	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		15/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :		2/02/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :		1/08/2024
TIEMPO ADICIONAL		0
FECHA DE PRORROGA:		
FECHA DE SUSPENSION:	NA	NA
FECHA DE REINICIO:	NA	NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :		1/08/2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	En ejecucion	16,58%

EN EJECUCIÓN

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

	OMENTACION	ML
	ESTRUCTURA	m3
☑	CUBIERTA Y CIELO RASO	m2
☐	MAMPOSTERIA	m2
☐	RED HIDRAULICA	m2
☐	RED SANITARIA	ml
☑	OTRO. CUAL?	ml
		UN

META FISICA (VALOR/UN): $1.480.593.601,00 $/UN


INTERVENTORIA			OBRA		
PROGRAMA: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"			PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA		
RUBRO:	FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA		PDA CAQUETA		
			RUBRO:	FUENTE: ALCALDIA LA MONTAÑITA	
	ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE		ALCALDIA LA MONTAÑITA	FUENTE
ACTAS COBRADAS	$ 0		ACTAS COBRADAS	$	0,00%
	0				

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	15/12/2023		$1.480.593.601,00	
2 ACTA DE INICIO	2/02/2024			
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No.	15/02/2024		$ 1.480.592.053,00	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1	15/02/2024			
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

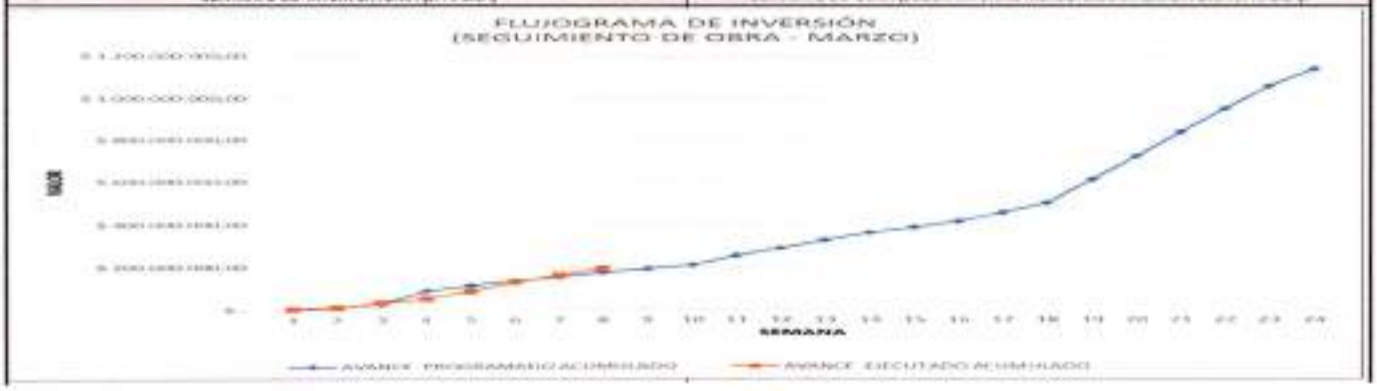

1828

	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-MATEGUADUA	F-GCT-01-V1
CONSTRUCTORA OCBA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	Vigencia: 30/07/2024
	FORMATO DE INFORME SEMANAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**SOCIALIZACION**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**VEEDURIA CIUDADANA**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		
			VALLA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE		

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA							
% AVANCE EN PLAZO:	33,33%	PLAZO FALTANTE:	66,67%	% PROGRAMACION OBRA	15,27%	% OBRA EJECUTADA	16,94%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	33,33%	PLAZO FALTANTE:	66,67%	% PROGRAMACION OBRA	15,27%	% OBRA EJECUTADA	16,94%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Se realizan recomendaciones para el amarre de acero longitudinal (traslapos) y transversal (separacion de flejes) para columnas y vigas de amarre. Por otro lado se realizan labores de compactacion de rellenos para nivelar el terreno. Tambien se recalca en los traslapos de malla electrosoldada para la placa

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐

CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐

PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS
3,2	ACERO 60 000 PSI ZAPATAS
3,3	CONCRETO F'C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE
3,4	ACERO 60 000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

1829

ANEXO 7. PREACTA DE OBRA No.02 (CORTE DE OBRA)

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1220

CONTROL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - MARZO

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**														
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.546,00	$ 6.372.900,00	1425,00		$ 3.632.325,00	853,60	$ 1.898.336,00	771,40	$ 1.966.299,00	1.625,00	54,13%	100,00%
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	220,00	$ 13.995,00	$ 3.111.965,00	223,00		$ 3.111.965,00	126,00	$ 1.758.330,00			126,00		56,50%
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.963.000,00	$ 5.963.000,00	1,00		$ 5.963.000,00	1,00	$ 5.963.000,00			1,00		100,00%
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.216,00	$ 3.025.000,00	1425,00		$ 1.734.200,30	226,00	$ 275.880,00			226,00		15,80%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**														
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1.352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1425,00		$ 5.686.800,00	853,60	$ 2.809.171,00	771,40	$ 3.079.425,00	1.425,00	54,13%	100,00%
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	99,11	$ 48.895,00	$ 4.802.679,00	190,15		$ 9.009.995,30	155,75	$ 7.298.762,00	12,75	$ 597.338,00	168,54	6,70%	88,83%
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	88,06	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74		$ 15.901.166,80	19,78	$ 5.094.359,00	14,36	$ 3.703.583,00	34,16	23,29%	55,33%
3	**CIMENTACIÓN**														
3,1	CONCRETO FC 21 MPA ZAPATAS	M3	47,05	$ 1.011.313,00	$ 48.087.761,00	32,95	$ 1.195.890,00	$ 39.412.716,30	4,50	$ 4.672.908,00	22,50	$ 24.084.525,00	27,00	68,29%	81,94%
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3.754,00	$ 9.913,00	$ 37.208.070,00	2.593,95		$ 35.587.845,00	2348,62	$ 23.255.004,00	166,99	$ 1.654.671,00	2.515,61	6,23%	93,60%
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,68	$ 1.011.315,00	$ 29.018.327,00	27,36	$ 1.362.890,00	$ 37.273.948,00			27,14	$ 36.987.749,00	27,14	99,23%	99,23%
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1.928,42	$ 9.913,00	$ 19.113.630,00	4086,27		$ 40.296.736,00			454,75	$ 4.506.573,00	454,75	11,18%	11,18%
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M2	39,43	$ 494.190,00	$ 14.543.479,00	3,73		$ 1.843.291,00	1,20	$ 593.010,00	1,68	$ 790.326,00	2,89	39,89%	72,12%
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.063.460,00	$ 61.800.000,00	0,00									
4	**ESTRUCTURA**														
4,1	CONCRETO FC 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	$ 1.394.465,00	$ 23.064.451,00			4,61	$ 6.429.464,00	4,61	27,87%	27,87%
4,2	CONCRETO FC 21 MPA VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.100,00	$ 35.345.930,00	23,35	$ 1.412.225,00	$ 32.975.337,00							0,00%
4,3	CONCRETO FC 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.036.505,00	$ 27.520.865,00	73,78	$ 1.085.745,00	$ 80.139.266,00							0,00%
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	8.699,31	$ 9.913,00	$ 86.480.162,00	5026,79		$ 49.815.469,00			3.662,81	$ 30.960.627,00	3.662,81	75,80%	75,80%
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2.429,07	$ 9.913,00	$ 24.071.465,00	3232,83		$ 32.025.417,00			230,00	$ 2.279.300,00	230,00	7,12%	7,12%
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,00	$ 107.079,00	$ 19.005.187,00	478,22		$ 51.493.773,00			41,50	$ 4.466.537,00	41,50	8,68%	8,68%
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572 INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8.984,79	$ 17.721,00	$ 159.365.081,00	0,00									
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**														
5,1	TEJA MASTERMIL CAL 26 COLOR AZUL	M2	406,5	$ 90.054,00	$ 36.622.239,00	360,00		$ 32.433.840,00							
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.868,00	$ 22.374.064,00	357,30		$ 23.173.763,00							
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	369,62	$ 12.700,00	$ 4.695.620,00	212,84		$ 2.677.668,00							
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	34,67	$ 262.100,00	$ 9.089.633,00	0,00									
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00									
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00									
6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**														
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	719,64	$ 54.412,00	$ 39.157.834,00	990,66		$ 37.391.074,00							
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	980,69	$ 23.286,00	$ 22.835.972,00	845,72		$ 19.716.722,00							
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.228,00	0,00									
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	980,69	$ 13.502,00	$ 13.291.547,00	641,24		$ 8.658.022,00							
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.965,00	$ 2.466.350,00	0,00									
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	980,69	$ 12.065,00	$ 11.866.594,00	641,24		$ 7.736.681,00							
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.116,00	$ 9.744.908,00	469,19		$ 20.187.416,00							
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.746,00	$ 3.332.370,00	469,19		$ 9.903.462,50							
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	469,19		$ 6.627.696,50							
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
7,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.299,00	$ 825.780,00	17,00		$ 701.913,00							
7,2	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	33,50		$ 584.609,00							
7,3	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,58	$ 11.636,00	$ 111.524,00	12,00		$ 139.632,00							
7,4	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10		$ 315.493,00							
7,5	TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,1	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00		$ 246.738,00							
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00		$ 3.537.900,00							
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	1,00		$ 2.900.078,00							
8	**SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**														
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,0	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00		$ 1.182.258,00							
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 356.716,00	6,00		$ 711.432,00							
8,3	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.860,00	$ 561.768,00	25,75		$ 497.562,00							
8,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.587,00	42,00		$ 1.329.090,00							
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,8	$ 35.425,00	$ 1.197.365,00	60,00		$ 2.125.500,00							
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00		$ 139.268,00							
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00		$ 1.361.252,00							
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.868.760,00	$ 10.868.760,00	1,00		$ 10.868.760,00							

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
9	PISOS, ENCHAPES Y MESONES														
9.1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 86.505,00	$ 41.384.420,00	374,40		$ 32.013.072,00							
9.2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18		$ 13.513.589,00							
9.3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00		$ 3.249.080,00							
9.4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	189,88		$ 15.031.887,00							
9.5	GUARDA ESCOBAS	ML	240,00	$ 21.672,00	$ 4.661.120,00	248,00		$ 5.375.089,00							
9.6	MESON GRANITO	M2	12,50	$ 267.175,00	$ 3.214.688,00	8,34		$ 2.119.122,00							
9.7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.300,00	0,00									
9.8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.300,00	0,00									
9.9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00		$ 2.699.500,00							
9.10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,80	$ 11.637,00	$ 4.268.104,00	0,00									
10	APARATOS SANITARIOS														
10.1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00									
10.2	PUNTO SANITARIO	UND	8,00	$ 1.008.046,00	$ 8.064.368,00	8,00		$ 8.048.276,00							
10.3	LAVAMANOS	UND	9,0	$ 340.198,00	$ 3.115.782,00	7,00		$ 2.403.386,00							
10.4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 725.800,00	$ 5.806.400,00	17,23		$ 12.677.834,00							
10.5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00									
10.6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,0	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00									
11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE														
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00									
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPOP RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	0,00									
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00									
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	0,00									
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	0,00									
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00									
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.086,80	$ 1.745.086,00	0,00									
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00									
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.950,00	$ 1.018.950,00	0,00									
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD PARA COCINA.	UND	1,00	$ 2.370.268,00	$ 2.370.268,00	0,00									
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00									
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA.)	UND	3,00	$ 4.562.300,00	$ 13.686.900,00	0,00									
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00									

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS [illegible]ERO		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 362.660,00	$ 362.660,00	0,00									
11,15	VENTANA TIPO 4.1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00									
11,16	VENTANA TIPO 4,3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00									
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 362.660,00	$ 362.660,00	0,00									
12	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO FC 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M3	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	5,56		$ 6.247.438,00							
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.946,00	$ 4.663.607,30	0,00									
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	4,36	$ 1.120.783,00	$ 4.910.367,00	0,00									
12,4	DINTELES EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	1,39	$ 1.004.655,00	$ 1.400.190,00	0,87		$ 873.253,00							
12,5	CUNETA EN CONCRETO F C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00									
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	98,00	$ 54.412,00	$ 1.596.802,00	0,00									
13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS														
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00		$ 2.077.064,00							
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 236.173,00	$ 7.085.190,00	30,00		$ 7.085.190,00							
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tubería EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.087,00	$ 16.043.742,00	66,00		$ 16.043.742,00							
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 207.488,00	$ 3.112.320,00	10,00		$ 2.074.880,00							
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	3,00		$ 682.137,00							
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tubería PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	4,00		$ 1.064.556,00							
13,7	Suministro e Instalación de Salida Lampara de aplique a muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	7,00		$ 1.406.727,00							
13,8	Suministro e Instalación de Panel Led de 60x60 cm de Incrustar de 40 W	UND	16,00	$ 423.019,00	$ 6.752.704,00	16,00		$ 6.752.704,00							
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 108.119,00	$ 5.918.426,00	38,00		$ 4.968.022,00							
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	12,00		$ 1.415.028,00							
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble tipo	UND	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	7,00		$ 1.251.691,00							
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 3No4+1No4+1No6 T AWG por ducto PVC de 11/2", incluye canalización y ducto de reserva de 1 1/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00		$ 9.736.800,00							
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto IMC de 1 1/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	1,00		$ 746.139,00							
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CB27-4	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00		$ 1.253.320,00							
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00		$ 831.863,00							
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00		$ 204.225,00							
13,17	Suministro e Instalación de Interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 28.583,00	$ 314.413,00	11,00		$ 314.413,00							
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 206.807,00	$ 206.807,00	1,00		$ 206.807,00							
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	1,00		$ 996.100,00							
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	1,00		$ 390.223,00							
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.853,00	$ 1.422.853,00	1,00		$ 1.422.853,00							
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.800,00	$ 3.813.800,00	0,00									
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00		$ 855.835,00							
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.923,00	$ 526.428,00	0,00									
13,25	Suministro e Instalación de bandeja cablofil 30x8 cm, Incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	0,00									

ITEMS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA EL MES ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTAS MES MARZO		TOTAL EJECUTADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD		
13,28	Suministro e Instalación de tubería EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.066,00	62,00		$ 2.278.066,00							
14	OTROS ITEMS														
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 670.325,00	$ 4.682.600,00	0,00									
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,48	$ 176.957,00	$ 4.307.427,00	0,00									
15	ITEMS NO PREVISTOS														
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2				23,80	$ 783.649,00	$ 18.730.116,00							
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2				12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00							
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO, INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML				34,00	$ 638.140,00	$ 21.696.760,00							
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3KM				27947,79	$ 1.952,00	$ 54.488.191,20							
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML				163,30	$ 84.423,00	$ 13.520.276,90							
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	Kg				2113,03	$ 17.705,00	$ 37.411.196,00			593,29	$ 10.504.199,00		28,08%	28,08%
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2				37,50	$ 296.320,00	$ 11.187.000,00							
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND				1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00							
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DESARROLLO =20+=80 CM	ML				30,50	$ 183.650,00	$ 5.147.276,00							
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML				91,70	$ 20.396,00	$ 1.887.892,00							
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3				13,97	$ 694.000,00	$ 9.001.162,00							
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 8"	ML				19,27	$ 72.854,00	$ 1.423.897,30							
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2				20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00							
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML				66,30	$ 364.696,00	$ 20.181.648,00							
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE)	TNKM				12376,16	$ 3.905,00	$ 48.328.905,00							
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UND				1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00							
15,17	CONCRETO FC 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML				162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.062,00							
15,18	AFINADO DE PISO E= 5 CM	M2				544,00	$ 50.890,00	$ 27.662.298,00							

SUBTOTAL		$ 1.138.918.183,00	$ 1.138.918.983,00	$ 92.886.453,00	$ 140.037.942,00
ADMINISTRACIÓN	25,00%	$ 284.729.546,00	$ 284.729.241,00	$ 13.221.813,00	$ 35.309.480,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 11.389.182,00	$ 11.389.170,00	$ 526.895,30	$ 1.405.379,00
UTILIDAD	4,00%	$ 45.566.726,00	$ 45.566.679,00	$ 2.115.458,30	$ 5.601.518,00
TOTAL		$ 1.480.603.651,00	$ 1.480.602.083,00	$ 88.752.398,00	$ 182.948.335,00

AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO (%)	4,64%	12,30%
CANTIDADES ACUMULADAS	$ 88.752.398,00	$ 350.801.714,00
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)	4,64%	15,94%

CONSTRUCTORA DIGNES S.A.S.
NIT No. 901028158-5
RL. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

SINERGIA CONSTRUCTORA ZONAC S.A.S.
NIT No. 901.283.034-9
RL. RICHARD EDIMSON CASTRILLÓN MENZA
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 8. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION		1	
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO 01/03/2024 AL 30/03/2024
OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE NATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATO No 212-LICP-2023 — CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado INICIO	Periodo laborado FIN	No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	mar-24 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PILA O PERIODO EPS Planilla	No. dias cotizados	Razón Social	OBSERVACIONES
						VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB				
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.119.214.582	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.006.596.953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
ALEXIS MENDEZ TIRADO	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		30	1.006.507.466	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
JAROL ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		30	1.000.123.483	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
EDWIS BERNATE	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1117544135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1122729695	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		30	1006521638	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
CELSO ROJAS CLEVES	DIRECTOR DE OBRA	2/02/2024		30	80.233.290	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
RICHAR EDINSON CASTELLON MENZA	RESIDENTE DE OBRA	2/02/2024		30	1.117.845.232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
ALEX RAIMUNDO MOISESE ROMERO	ARQUITECTO	2/02/2024		30	12.552.581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	SISO	2/02/2024		30	1.018.435.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2/02/2024		30	1.110.535.961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2/02/2024		30	1.018.410.974	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
																																						0		

NOTA: NO SE ACREDITA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR QUE CONTRATO TIENE FECHA DE CORTE AL 1 DE ABRIL Y LA EMPRESA TIENE FECHA LIMITE DE PAGO A LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DEL MES

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Original: Alcaldía de Montañita

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIO DE LA MONTAÑETA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑETA CAQUETA
CONTRATO No: 212-LICP-2023
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Ibc-24																															RES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	EPS Planilla	No. días cotizados	Razón Social	
						JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE						
ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2024		24	1.119.214.582							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	24		
SEBASTIAN PEREZ OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2024		24	1.006.596.953							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	24		
ALEXIS MENDEZ TRIADO	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		9	1.006.507.466																						1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	9		
JAROL ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024		9	1.000.123.463																						1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	9		
EDRAS BERNATE	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1117544116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1122726695	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2024		29	1006521639	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946428120	29		
CELSO ROJAS CLEVER	DIRECTOR DE OBRA	2/02/2024		29	80.233.290	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				29		
RICHAR EDINSON CASTRILLON MENZA	RESIDENTE DE OBRA	2/02/2024		29	1.117.545.232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			946857330	29		
ALEX RAIMUNDO MOSQUERA ROMERO	ARQUETECTO	2/02/2024		29	12.552.581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			945815334	29		
PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA	SISO	2/02/2024		29	1.018.435.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				29		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2/02/2024		29	1.110.535.942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			29/01/2024	29		
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2/02/2024		29	1.018.410.674	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			75/02/15	29		
																																					0		

NOTA

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICOMS SAS

Original Alcaldía de Montañita

ANEXO 9. COPIA DE LA COORESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1838

Florencia Caquetà 06 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: CUADRILLA DE ORDEN Y ASEO

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que se tendrá en cuenta la recomendación de la creación de la cuadrilla de orden y aseo para el contrato de referencia y se creara en el transcurso de la semana.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1839

Florencia Caquetà 12 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NORMA NSR 10

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que el contratista de obra tiene en cuenta la especificación técnica de la norma NSR 10 para llevar a cabo el método constructivo. se van a respetar los recubrimientos de concreto de la sección de columnas y vigas de amarre (columnas: 3cm y vigas: 4cm), la cuantia mínima requerida para cada sección y el diseño de mezclas.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1840

Florencia Caquetá 13 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: ATENCION A RECOMENDACIONES SOBRE EPP

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que se tomaran en cuenta las recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en el área de la obra, por parte de todos los trabajadores.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

1841

Florencia Caquetá 15 de marzo de 2024

Señor(es)
CARLOS DARIO CNAO SANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS MES DE MARZO.

Comedidamente me dirijo a usted como representante legal de la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, por medio de la presente me permito informar que los ensayos solicitados en el oficio enviado por la interventora el día 14 de marzo, se realizaron el día 11 de marzo para columnas y vigas de amarre.

Cordialmente

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
C.C. No. 1.117.545.232 de Florencia
M.P. No. 70202-413883 TLM
Representante Legal

Carrera 4 No. 15 – 06 Barrio Porvenir
E – mail: sinergiazomac@gmail.com
Teléfono: (8) 4377092
Florencia - Caquetá

1812

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia Caquetá 29 de marzo de 2024

Señores
Montañita – Caquetá
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caqueta

REF: 212 –LICP DE 2023

ASUNTO: Solicitud de soporte de pago de seguridad social "CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, con la intención de solicitar soporte de la planilla de seguridad social del personal de obra.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

1843

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia, 05 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es "'CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: cuadrilla de orden y aseo

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, para solicitar la creación de una cuadrilla de orden y aseo para el área de construcción del contrato de obra de referencia.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

1844

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.
NIT. 901.628.156-5

Florencia, 08 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NSR 10

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, con la intención de solicitar el cumplimiento de las especificaciones técnicas NSR 10 para el recubrimiento de concreto de la sección de columnas y vigas de amarre (columnas: 3cm y vigas: 4cm), también se deberá cumplir con la cuantía mínima de acero para cada tramo de cada elemento.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

Florencia, 11 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, se le solicita al contratista de obra que verifique el cumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo, respecto al uso de los elementos de protección personal a los trabajadores dentro de la obra, con la intención de evitar accidentes de trabajo.

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Florencia, 14 de marzo de 2024

Señores
SINERGIA CONSTRUTORA ZOMAC SAS
Florencia Caquetá

REF: CONTRATO DE OBRA No. 212 –LICP DE 2023 cuyo objeto es ""CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"

ASUNTO: ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS MES DE MARZO

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato N. 212 –LICP DE 2023, luego de culminar con la cimentación se solicita al contratista la entrega de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto utilizado (21Mpa) para los elementos:

- Columnas
- Vigas de amarre

Cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

1847

ANEXO 10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES -ENSAYOS DE RESISTENCIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1848

N°. Certificado: 1513
Fecha: 21/03/2024

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	**EDUARDO SALGUERO RIVEROS**	Nit/ C.C	**1110460707**
Dirección	**CRA 7 # 17-24**	Ciudad	**FLORENCIA-CAQUETA**
Telefono	**3135519571**	Fecha de Expiración	**20/09/2024**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2442**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5955	0,0005	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5950	0.0010	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

1849

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	15/02/2024		
PROXIMA INSPECCION:	14/08/2024		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	NIT :	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	CIUDAD:	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	PROXIMO CONTROL	14/08/2024
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	MARCA	SOUTH
MODELO :	W420-3	SERIE	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10'2mm	GRADUACION MINIMA	20''

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
Inspeccion de cierres angulares de cada eje	lectura inicial	errores encontrados	lecturas después de ajuste
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"	00°00'12"	00°00'00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"	00°00'15"	00°00'00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"	00°00'10"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"	00°00'07"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"	00°00'00"	00°00'00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"	00°00'12"	00°00'00"

1850

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	15/02/2024		
PROXIMA INSPECCION:	14/08/2024		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	NIT :	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	CIUDAD:	MEDELLIN-
TELEFONO :	5017426	PROXIMO CONTROL	14/08/2024
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	MARCA	TOPCON
MODELO :	GPT7501L	SERIE	S/N
ANGULO DE GRADUACION	1"	GRADUACION MINIMA	(2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

1851

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		**MARCA**			SOKKISHA
MODELO		B1C		**SERIE**			6906
AUMENTOS		32X		**PRECISIÓN EN DISTANCIA**			.+/-0.8mm*2kmde nivelación
Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1.254	MM	B2	1.425
A2	1.246	MM	B1	1.375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	0.000


HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

ANEXO 11. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	225-CMAB-2023.
	EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA - CONSOLIDADO	CONSTRUCTORA DICO&S SAS

Programa PAGA	Ficha Ambiental	Nombre del programa/ ficha ambiental	INFORME 1	INFORME 2
1	Ficha N° 1	Manejo integral de residuos sólidos, escombros, material reutilizable, reciclaje y basuras.	100%	95%
1	Ficha N°2	Manejo de suelos, manejo de obras en concreto y materiales de construcción.	82%	88%
	Ficha N°3	Conservación y restauración de estabilidad de rellenos, taludes y terraplenes.	95%	90%
2	Ficha N°4	Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.	96%	95%
3	Ficha N°5	Manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido. mitigación y prevención.	80%	82%
2	Ficha N°6	Manejo de tránsito y señalización mitigación y prevención.	95%	94%
2	Ficha N°7	Manejo integral de aguas. obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.	92%	94%
2	Ficha N°8	Gestión social.	90%	90%
3	Ficha N°9	Manejo de maquinaria y equipo mitigación y prevención.	92%	91%
3	Ficha N°10	Campamento.	75%	78%
2	Ficha N°11	Programa de manejo y recuperación de la cobertura vegetal. mitigación y prevención	82%	80%

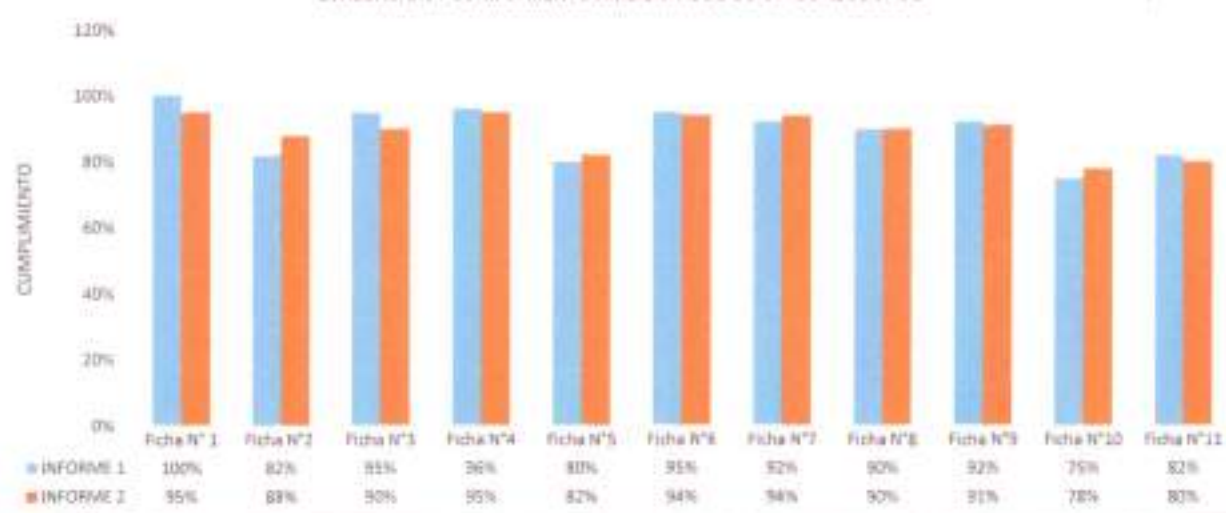

FECHA 1/04/2024

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA DICO&S SAS

CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

ANEXO 12. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS GARANTIAS DE LA OBRA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 8
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CONTRATO No: 212-UOP-2023
PERIODO: Inicio 2-mar-24 Fin 2-abr-24
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	6 MESES	Inicio del contrato	2-feb-24
		Inicio de actividades	2-feb-24
Plazo ejecución contrato adicionado	180 días	Terminación inicial contractual	2-ago-24
Plazo ejecutado	60 días	Terminación final contractual	31-mar-24
Plazo faltante por ejecutar	120 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prorroga	Valor susp. o prorroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de ratificación
			Total aprobado	0 d		N.A
Observaciones			Sin comentarios			

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de ratificación	Fecha de aprobación
1				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
Total aprobados				N.A
Sin comentarios				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$ 1.460.583.601,00
Valor inicial del contrato de CONSULTORÍA	
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)	$ 1.460.583.601,00

ADICIONES

No.	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.460.583.601,00

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo	N.A
Valor del anticipo	$ -

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA POLIZA INICIO	VIGENCIA POLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento (pago anticipo y contratos posteriores del anterior)	10%	10/11/2023	10/11/2024	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 60.981.030	10/11/2023	10/11/2024	
	100%	10/11/2023	10/11/2024	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 146.059.370	10/11/2023	10/11/2024	
Salarios y Prestaciones	5%	10/11/2023	10/05/2027	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 30.490.515	10/11/2024	10/05/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	10/05/2024	10/05/2029	CHU-10001356 ANEXO 0	$ 121.962.060	10/05/2024	10/05/2029	
Responsabilidad Civil	200 SMMLV%	10/11/2023	28/11/2023	CHU-10000280 ANEXO 0	$ 232.000.000	10/11/2023	28/11/2023	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre Vr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA POLIZA INICIO	VIGENCIA POLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento (pago anticipo y contratos posteriores del anterior)	10%	2/02/2024	2/02/2025	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 146.059.370	2/02/2024	2/02/2025	
	100%	2/02/2024	2/02/2025	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 146.059.370	2/02/2024	2/02/2025	
Salarios y Prestaciones	5%	2/02/2024	2/05/2027	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 74.029.685	2/02/2024	2/05/2027	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	2/05/2024	2/05/2029	CHU-10001356 ANEXO 2	$ 296.118.740	2/05/2024	2/05/2029	
Responsabilidad Civil	200 SMMLV%	2/02/2024	2/05/2029	CHU-10002280	$ 232.000.000	2/02/2024	2/05/2029	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

Firma:
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
CONSTRUCTORA DICO&S SAS

1856

ANEXO 13. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 9 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORresponde A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
CONTRATO No: 320-CMAM-2023 — CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICOMS SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días reales (Bases Liquidación)	C.C.	Feb-24																															MES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1 JUE	2 VIE	3 SAB	4 DOM	5 LUN	6 MAR	7 MIE	8 JUE	9 VIE	10 SAB	11 DOM	12 LUN	13 MAR	14 MIE	15 JUE	16 VIE	17 SAB	18 DOM	19 LUN	20 MAR	21 MIE	22 JUE	23 VIE	24 SAB	25 DOM	26 LUN	27 MAR	28 MIE	29 JUE	30	31	Planilla SS ue	No. días cotizados	Razón Social	
MARIA ALEJANDRA DAVILA RAMIREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2/02/2024		28	1.116.777.367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	28		
FABIO HERNAN FALSCO GUARNIZO	RESIDENTE D CINTERVENTORIA	2/02/2024		28	1.117.510.381	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	28		
CRISTIAN ANDRES ADVOCYA PEREZ	TOPOGRAFO	2/02/2024		28	1.076.246.493	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5485319742	28		
																																					0

1856

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ANEXO 5 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA — MUNICIPIO: LA MONTAÑITA — PERIODO: 01/03/2024 AL 30/03/2024
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE AL CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
CONTRATO No: 320-OBAB-2023 — CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DECIMA SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	mar-24																									MES O PERIODO			OBSERVACIONES
		INICIO	FIN			1 VIE	2 SAB	3 DOM	4 LUN	5 MAR	6 MIE	7 JUE	8 VIE	9 SAB	10 DOM	11 LUN	12 MAR	13 MIE	14 JUE	15 VIE	16 SAB	17 DOM	18 LUN	19 MAR	20 MIE	21 JUE	22 VIE	23 SAB	24 DOM	25 LUN	26 MAR	27 MIE	28 JUE	29 VIE	30 SAB	31 DOM	SBP en Planilla	No. días cotizados	Ibc mensual	
MARLA ALEXSANDRA DAVILA RAMIREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	01/03/2024		30	1,115,777,367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
FABIO HERNAN TIESCO GORRON	RESIDENTE D ENTERVENTORIA	01/03/2024		30	1,117,513,281	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
CRISTIAN ANDRES SENDOYA PEREZ	TOPOGRAFO	01/03/2024		30	1,078,246,643	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			30		
																																			0

1859

ANEXO 14. CONTROL DE LLUVIAS EN EL AREA DEL PROYECTO

Calle 14 #13-40 Barrio El Centro
dicoys.sas@gmail.com
3134629855
Florencia, Caquetá

1860

REGISTRO DE LLUVIAS

INSPECCIÓN MATEGUADUA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

VERSIÓN 1
PAG 1 DE 1

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA
CONTRATO No: 225-CMAB-2023
CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
INTERVENTORIA: CONSTRUCTORA DICOAS SAS

PERIODO
Inicio: 01-mar-24 Fin: 31-mar-24
MUNICIPIO: LA MONTAÑITA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

Clase de tiempo			Soleado		Nublado		Lluvias Moderadas		Lluvias Intensas		Observaciones
DIA			Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
VIER	1	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
SÁB	2	Mañana			8:00 AM	12:00 PM					
		Tarde									
DOM	3	Mañana									
		Tarde									
LUN	4	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
MAR	5	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	6	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
JUE	7	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	8	Mañana							10:00 AM	11:50 AM	
		Tarde			3:00 PM	5:00 PM			1:00 PM	3:00 PM	
SÁB	9	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde									
DOM	10	Mañana									
		Tarde									
LUN	11	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
MAR	12	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	13	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
JUE	14	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	15	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
SÁB	16	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde									
DOM	17	Mañana									
		Tarde									
LUN	18	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
MAR	19	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	3:00 PM			4:00 PM	5:00 PM			
MIER	20	Mañana	7:00 AM	12:00 PM							
		Tarde	1:00 PM	5:00 PM							
JUE	21	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
VIER	22	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
SÁB	23	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
DOM	24	Mañana									
		Tarde									
LUN	25	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MAR	26	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
MIER	27	Mañana			7:00 AM	12:00 PM					
		Tarde			1:00 PM	5:00 PM					
JUE	28	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
VIER	29	Mañana					7:00 AM	12:00 PM			
		Tarde					1:00 PM	5:00 PM			
SÁB	30	Mañana							7:00 AM	12:00 PM	
		Tarde									
DOM	31	Mañana									
		Tarde									
TOTAL			53,00		87,00		54,00		15,83		212,83
%			24,90%		40,88%		25,37%		8,85%		100,00%



Firma
Nombre: CARLOS SANTIAGO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DICOAS SAS

Firma
Nombre: RICHARD E. CASTRILLON MENZA
REPRESENTANTE LEGAL
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
