INFORME COBRO DE INTERVENTORÍA No. 1 – PAGO FINAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 225-CMAB-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DICO&S SAS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 212-LICP-2023

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

PERIODO DE EJECUCION
02 DE FEBRERO DE 2024 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
1.1 DESCRIPCION GENERAL 5
1.2 LOCALIZACION 6
1.3 ALCANCE 7
3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 8
4. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8
4.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 9
4.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 9
4.3. RELACIÓN DE PAGOS 9
4.4. BALANCE DEL ANTICIPO 10
4.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 10
4.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 10
4.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 14
4.8. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 14
4.9. ACTA MODIFICATORIA N. 2 15
4.10. CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE OBRA PARA COBRO FINAL 20

11	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**												
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00	$ 1.271.450,00	$ -	-	$ -	-	$
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPOP RH COLORES CLAROS TIPO MADERA	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	0,00	$ 1.176.950,00	$ -	-	$ -	-	$
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00	$ 2.068.450,00	$ -	-	$ -	-	$
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	0,00	$ 2.329.410,00	$ -	-	$ -	-	$
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	0,00	$ 3.186.850,00	$ -	-	$ -	-	$
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00	$ 1.602.450,00	$ -	-	$ -	-	$
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.088,89	$ 1.745.089,00	0,00	$ 1.745.088,89	$ -	-	$ -	-	$
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00	$ 2.682.888,00	$ -	-	$ -	-	$
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.950,00	$ 1.018.950,00	0,00	$ 1.018.950,00	$ -	-	$ -	-	$
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD. PARA COCINA	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	0,00	$ 2.370.288,00	$ -	-	$ -	-	$
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00	$ 3.353.820,00	$ -	-	$ -	-	$
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA).	UND	3,00	$ 4.562.300,00	$ 13.686.900,00	0,00	$ 4.562.300,00	$ -	-	$ -	-	$
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00	$ 469.230,00	$ -	-	$ -	-	$
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00	$ 342.660,00	$ -	-	$ -	-	$
11,15	VENTANA TIPO 4,1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00	$ 258.498,00	$ -	-	$ -	-	$
11,16	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00	$ 213.180,00	$ -	-	$ -	-	$
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00	$ 342.660,00	$ -	-	$ -	-	$
				SUBTOTAL	**$ 67.538.307,00**			$ -		$ -		$
12	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**												
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M3	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	5,56	$ 1.123.640,00	$ 6.247.438,00	-	$ -	5,56	$
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.948,00	$ 4.663.607,00	0,00	$ 1.058.948,00	$ -	-	$ -	-	$
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	4,30	$ 1.120.783,00	$ 4.819.367,00	0,00	$ 1.120.783,00	$ -	-	$ -	-	$
12,4	DINTELES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	1,39	$ 1.004.855,00	$ 1.400.190,00	0,67	$ 1.004.855,00	$ 673.253,00	-	$ -	0,67	$
12,5	CUNETA EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00	$ 1.050.708,00	$ -	-	$ -	-	$
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	36,00	$ 54.412,00	$ 1.958.832,00	0,00	$ 54.412,00	$ -	-	$ -	-	$
				SUBTOTAL	**$ 34.498.019,00**			**$ 6.920.691,00**		$ -		$

.....22

4.1. Verificación de personal, equipos y materiales 25

4.2. Equipos de obra 25

4.3. Herramienta menor 26

4.4. Estado del clima.....26

4.5. Balance financiero del contrato (avance programado vs ejecutado) 28

4.6. Balance presupuestal.....29

4.7. Control de calidad en el concreto.....29

5. REGISTRO FOTOGRAFICO 30

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo de la infraestructura para la atención integral del adulto mayor bajo la modalidad de centro vida del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ" que busca mejorar la asistencia y atención integral a las personas mayores del municipio de La Montañita. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Montañita – Caquetá, "Juntos por una Montañita Líder 2020 - 2023" dentro del pilar Gobierno Social y Participativo, en el sector inclusión social, se creó un programa denominado Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar; cuyo objetivo es desarrollar intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren.

En cumplimiento con la alcaldía municipal de la montañita Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra pública No.225-CMAB-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión		
	1		
Elaboro:	Fabio Hernán Fiesco Gorron		
Reviso:	Carlos Darío Cano Sánchez		
Aprobó:	Carlos Darío Cano Sánchez		

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCION GENERAL

El municipio de La Montañita Caquetá cuenta con tres centros vida denominados AÑOS DORADOS, ubicados en las inspecciones de policía de la unión Peneya, Santuario y la cabecera municipal, estipulados en el Acuerdo municipal No 005 de 25 febrero de 2016 con resolución de funcionamiento 00431 del 24 de diciembre de 2019 de la secretaría departamental de salud, con una atención global de 170 adultos mayores aproximadamente. Es así, que la Administración Municipal con aras de fomentar la atención a la población adulta mayor y así cubrir la necesidad en el municipio requiere la construcción de un centro vida en la inspección de Mateguada.

El grupo poblacional de Personas Mayores, representan la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad sociocultural, que atentan contra la estabilidad y la convivencia ciudadana; No obstante, también pueden representar la facilidad de influir en dinámicas sociales que pueden exponerlos a los actos de riesgos, vulnerabilidad y violencia que generan precariedad y la exclusión. El grupo poblacional de personas mayores, representa la diversidad y expresión ciudadana necesaria para mejorar la desigualdad social, que atentan contra la estabilidad integral de este grupo poblacional.

Con motivo de ofrecer unas instalaciones idóneas a los adultos mayores residentes del municipio se viene adelantando la construcción de la infraestructura centro vida en la inspección de Mateguadua, teniendo en cuenta las fases y etapas del proyecto (Pre construcción, construcción y postconstrucción).

Con estas adecuaciones se cumplirá con las especificaciones técnicas y los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el funcionamiento de los Centros Vida, pero lo más significativo, los adultos mayores gozaran de instalaciones cómodas y seguras.

1.2 LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en el municipio de la Montañita Caquetá, en el centro poblado de Mateguadua 1°13´24" N – 75°19´23" W. Este centro poblado se encuentra ubicado sobre la vía que de La Montañita va a la población de San Antonio de Getuchá en el municipio de Milán. Con una distancia aproximada de 37,5 kilómetros de la cabecera municipal de La Montañita.

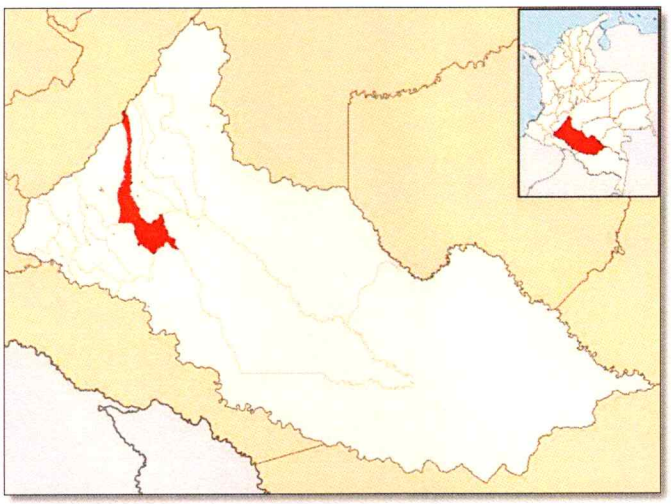
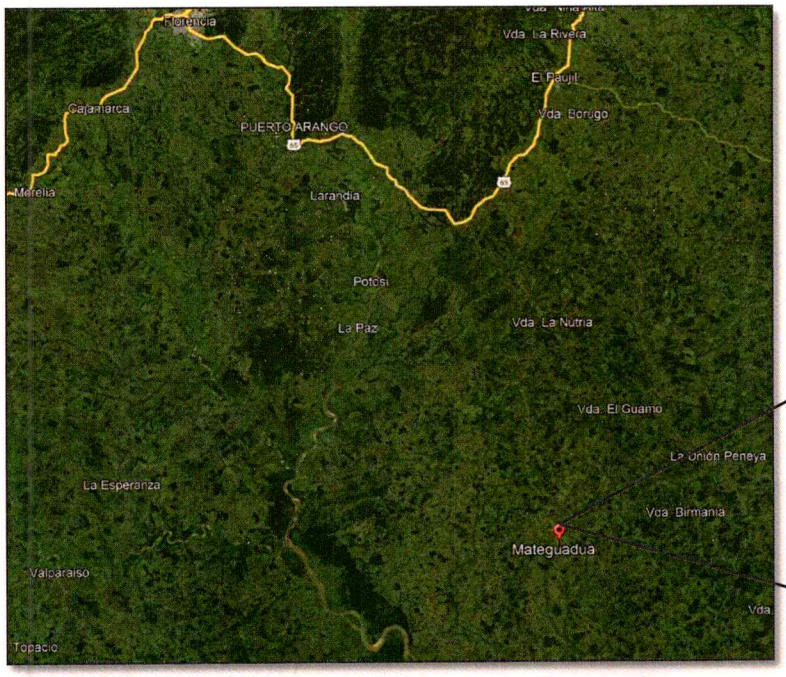


***Ilustración 1**. Localización general. Mapa del Municipio de La Montañita, Caquetá (Colombia)*



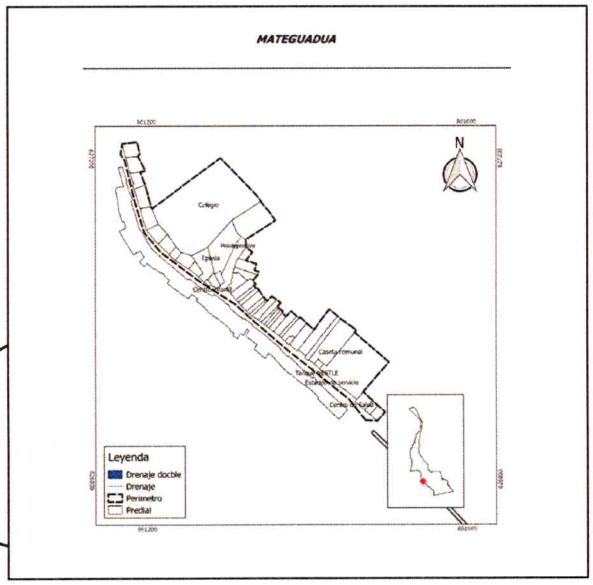


***Ilustración 2.** Localización Vereda Mateguadua.*

1.3 ALCANCE

El proyecto cuenta con una capacidad para atender a un promedio de 60 y 80 personas de la tercera edad, se plantea una edificación de un solo nivel, donde sus recorridos sean amplios y generosos, zonas llenas de vegetación y senderos al aire libre, también se iplementan forman sustentables donde se tiene como prioridad el ahorro de agua, por medio de tanques recolectoras de aguas lluvias, eso para luego ser utilizada en el regado de jardinería y huertas con las el proyecto contará.

El proyecto se realiza en un lote ubicado en el centro poblado de Mateguadua que tiene como área 2.500 m2 (Area total del lote) y un total de metros cuadrado utilizables de 1.746,49 m2. Las zonas de la edificación se distribuyen en: Administrativa (59 m2), salud y atención integral (30 m2), servicios (255.97 m2), lúdica (583.21 m2) y servicios de uso general (818.31 m2).

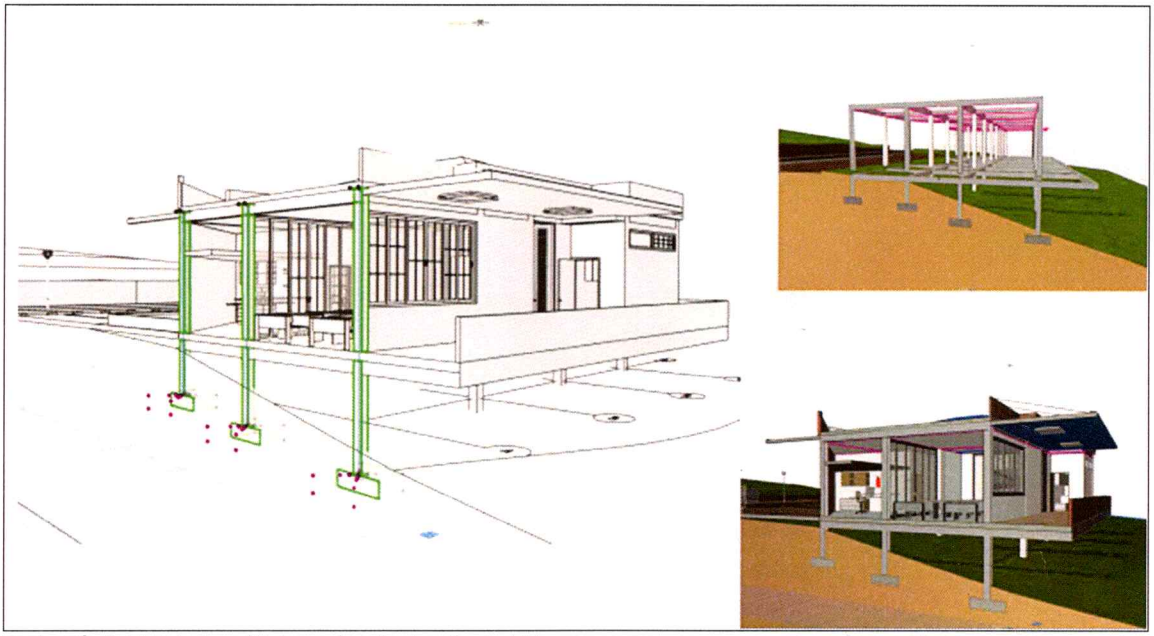


Ilustración 3. *Modelado en 3D de la infraestructura Centro Vida.*

3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
Número del contrato:	212-LICP-2023
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".
Nombre del contratista:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Fecha del contrato:	DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor Inicial:	($1.480.593.601) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS UN PESOS MCTE
Valor Anticipo (10%):	($148.059.360) MCTE. – CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
Acta Modificatoria 1:	($1.480.592.053,00) MCTE. – MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE
Fecha de iniciación del contrato de obra:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de iniciación del contrato de interventoría:	02 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación Contractual inicial:	01 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de suspensión N.1:	02 DE JULIO DE 2024
Fecha de reinicio N.1:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación final:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 02 de febrero de 2024 al 30 de de 2024.

El 02 de julio fue suspendido por dos meses, hasta el 02 de septiembre que fue reiniciado y estuvo activo hasta el 30 de septiembre de 2024

Acto administrativo	fecha	Días activos	Días inactivos
fecha de inicio	2/02/2024	151	
Suspensión n. 1	2/07/2024		62
Reinicio n. 1	2/09/2024	29	
Terminación	30/09/2024		
Total		180	62

4.1.MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Suspensión n. 1	Esperar la respuesta por parte de la entidad, sobre la solicitud de recursos adicional y tiempo de ejecución para poder terminar en su totalidad el proyecto	2/07/2024	62	30/09/2024

4.2.INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1.	2.	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CDF	OTROS
ATENCION INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN						$ 1.480.734.968				
TOTALES						$ 1.480.734.968				

4.3.RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoría.

El contratista de obra nunca quiso e hizo gestión para solicitar el anticipo de obra, siempre manifestó que no haría uso de este, pero nunca comunico o radico documento renunciando a este.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					
Pago final	02/02/2024	30/09/2024	$1480591981	n.a	$1480591981		Liquidación del contrato

4.4.BALANCE DEL ANTICIPO

El contratista de obra nunca quiso e hizo gestión para solicitar el anticipo de obra, siempre manifestó que no haría uso de este, pero nunca comunico o radico documento renunciando a este

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$	$	$
TOTAL	$	$	$

4.5.MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	
Descripción	

4.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZA CHU-100011356 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del Contrato	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Buen manejo del anticipo	CHU-100011356	10/11/2023	10/11/2024	$ 148.059.370,00	$ 267.237,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2027	$ 74.029.685,00	$ 388.504,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	CHU-100011356	10/11/2023	10/05/2029	$ 296.118.740,00	$ 2.666.529,00
TOTAL, ASEGURADO				$ 666.267.165,00	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante.

PÓLIZA CHU-100002290 – ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico – predios, labores y operaciones	**$ 116.000.000,00**	**$ 232.000.000,00**	**$ 232.000.000,00**	**$ 270.773,00**
Patronal	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**0,00**
Contratistas y subcontratistas	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**0,00**
Vehículos propios y no propios	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**	**0,00**
TOTAL, ASEGURADO			**$ 232.000.000,00**	

Fueron expedidas el 28 de noviembre del 2023 Las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. Vigencia desde el 10/11/2023 hasta el 10/06/2024.

Actualización de la póliza según acta de inicio

Póliza de recibo final

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XzeqmH+72jM+m4U+vkOIqw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU52000000059-D001

No. PÓLIZA	CHU-100011356	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	533066595	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/02/2024	24:00 Horas Del	06/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.283.654-9
DIRECCIÓN	CARRERA 4 # 15-06	TELÉFONO	3202855153
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA	No. DOC. IDENTIDAD	800.095.770-2
DIRECCIÓN	CR 5 ESQ BRR LAS BRISAS	TELÉFONO	6084300170
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA	No. DOC. IDENTIDAD	800.095.770-2
DIRECCIÓN	CR 5 ESQ BRR LAS BRISAS	TELÉFONO	6084300170

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE RECIBO FINAL CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.212-LICP-2023 , CUYO OBJETO ES : CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCION DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A
SATISFACCION DEL CONTRATANTE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/04/2025	148.059.370,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/04/2025	148.059.370,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/10/2027	74.029.685,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2029	296.118.740,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 666.267.165,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/12/2024

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/12/2024	

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100011356	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	533066595	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	09/12/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/02/2024	24:00 Horas Del	06/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

4.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSTRUCTORA DICO&S SAS	02 DE FEBRERO DE 2024	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4.8.VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- El contratista de obra hace entrega a la interventoría las hojas de vida debidamente certificadas y cumpliendo con los requisitos habilitantes en el proceso de selección, el personal de obra se compone de los siguientes cargos:

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	PROFFESION	NOMBRE	TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ACREDITA
1	Director De Obra	Ingeniero Civil	Celso Rojas Cleves	25202-096642CND	SI
2	Residente de obra	Ingeniero Civil	Richard Edinson Castrillón Menza	70202-413883TLM	SI
3	Arquitecto	Arquitecto	Alex Raimundo Moisés Romero	0870028245ATL	SI
4	Sisoma	Especialista Salud Ocupacional	Paola Andrea Medina Amezquita	Resolución No.0149 (9 de mayo de 2021)	SI
5	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	Hoover Andrés Trujillo Ramírez	70202-348787 TLM	SI
6	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil	Diego Armando Gallego Muriel	25202183589CND	SI

4.9.ACTA MODIFICATORIA N. 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA No. 01			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.549,00	$ 6.372.500,00	1425,00	-	$ 3.632.325,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 3.632.325,00
1,2	CERRRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 13.955,00	$ 3.111.965,00	223,00	-	$ 3.111.965,00	0,00	-	$ -	223,00	$ 3.111.965,00
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	1,00	-	$ 5.363.000,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 5.363.000,00
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.210,00	$ 3.025.000,00	1425,00	-	$ 1.724.250,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 1.724.250,00
	SUBTOTAL				**$ 17.872.465,00**			**$ 13.831.540,00**			**$ -**		**$ 13.831.540,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS**												
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1425,00	-	$ 5.688.600,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 5.688.600,00
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.679,00	190,16	-	$ 8.908.996,00	11,40	-	$ 534.090,00	201,56	$ 9.443.086,00
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74	-	$ 15.901.199,00	0,00	-	$ -	61,74	$ 15.901.199,00
	SUBTOTAL				**$ 24.979.020,00**			**$ 30.498.795,00**			**$ 534.090,00**		**$ 31.032.885,00**
3	**CIMENTACIÓN**												
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.310,00	$ 48.087.791,00	32,95	1.105.090	$ 36.412.716,00	0,00	-	$ -	32,95	$ 36.412.716,00
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3754,60	$ 9.910,00	$ 37.208.070,00	2683,95	-	$ 26.597.945,00	0,00	-	$ -	2683,95	$ 26.597.945,00
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,69	$ 1.011.310,00	$ 29.018.327,00	27,35	1.362.850	$ 37.273.948,00	0,00	-	$ -	27,35	$ 37.273.948,00
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1928,42	$ 9.910,00	$ 19.110.630,00	4066,27	-	$ 40.296.736,00	0,00	-	$ -	4066,27	$ 40.296.736,00
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	29,43	$ 494.180,00	$ 14.543.470,00	3,73	-	$ 1.843.291,00	0,00	-	$ -	3,73	$ 1.843.291,00
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.083.460,00	$ 61.800.558,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 209.768.846,00**			**$ 142.424.636,00**			**$ -**		**$ 142.424.636,00**
4	**ESTRUCTURA**												
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	1.394.465	$ 23.064.451,00	0,00	-	$ -	16,54	$ 23.064.451,00
4,2	CONCRETO F'C 21 MPA VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	23,35	1.412.220	$ 32.975.337,00	0,00	-	$ -	23,35	$ 32.975.337,00
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.039.505,00	$ 27.520.895,00	73,78	1.085.745	$ 80.106.266,00	0,00	-	$ -	73,78	$ 80.106.266,00
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5699,31	$ 9.910,00	$ 56.480.162,00	5026,79	-	$ 49.815.489,00	0,00	-	$ -	5026,79	$ 49.815.489,00
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2429,01	$ 9.910,00	$ 24.071.455,00	3232,03	-	$ 32.029.417,00	0,00	-	$ -	3232,03	$ 32.029.417,00
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	478,22	-	$ 51.493.773,00	0,00	-	$ -	478,22	$ 51.493.773,00
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8994,70	$ 17.721,00	$ 159.395.061,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 342.274.775,00**			**$ 269.484.733,00**			**$ -**		**$ 269.484.733,00**
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**												
5,1	TEJA MASTERMIL CAL.28 COLOR AZUL	M2	406,4892	$ 90.094,00	$ 36.622.238,00	360,00	-	$ 32.433.840,00	0,00	-	$ -	360,00	$ 32.433.840,00
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.858,00	$ 22.374.064,00	357,30	-	$ 23.173.763,00	0,00	-	$ -	357,30	$ 23.173.763,00
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	366,60	$ 12.700,00	$ 4.655.820,00	210,84	-	$ 2.677.668,00	0,00	-	$ -	210,84	$ 2.677.668,00
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 282.100,00	$ 6.959.633,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 99.894.678,00**			**$ 58.285.271,00**			**$ -**		**$ 58.285.271,00**
6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**												
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO Nº 4	M2	719,84	$ 54.412,00	$ 39.167.934,00	690,86	-	$ 37.591.074,00	0,00	-	$ -	690,86	$ 37.591.074,00
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.286,00	$ 22.905.972,00	846,72	-	$ 19.716.722,00	0,00	-	$ -	846,72	$ 19.716.722,00
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.229,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 13.502,00	$ 13.281.647,00	641,24	-	$ 8.658.022,00	0,00	-	$ -	641,24	$ 8.658.022,00
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.985,00	$ 2.468.353,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.868.099,00	641,24	-	$ 7.736.561,00	0,00	-	$ -	641,24	$ 7.736.561,00
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.118,00	$ 9.744.668,00	468,19	-	$ 20.187.416,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 20.187.416,00
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.745,00	$ 3.332.370,00	468,19	-	$ 6.903.462,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 6.903.462,00
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	468,19	-	$ 6.627.698,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 6.627.698,00
	SUBTOTAL				**$ 110.163.528,00**			**$ 107.420.955,00**			**$ -**		**$ 107.420.955,00**

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA No. 01			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.549,00	$ 6.372.500,00	1425,00	-	$ 3.632.325,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 3.632.325,00
1,2	CERRRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 13.955,00	$ 3.111.965,00	223,00	-	$ 3.111.965,00	0,00	-	$ -	223,00	$ 3.111.965,00
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	1,00	-	$ 5.363.000,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 5.363.000,00
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.210,00	$ 3.025.000,00	1425,00	-	$ 1.724.250,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 1.724.250,00
	SUBTOTAL				**$ 17.872.465,00**			**$ 13.831.540,00**			**$ -**		**$ 13.831.540,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS**												
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1425,00	-	$ 5.688.600,00	0,00	-	$ -	1425,00	$ 5.688.600,00
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.679,00	190,16	-	$ 8.908.996,00	11,40	-	$ 534.090,00	201,56	$ 9.443.086,00
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74	-	$ 15.901.199,00	0,00	-	$ -	61,74	$ 15.901.199,00
	SUBTOTAL				**$ 24.979.020,00**			**$ 30.498.795,00**			**$ 534.090,00**		**$ 31.032.885,00**
3	**CIMENTACIÓN**												
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.310,00	$ 48.087.791,00	32,95	1.105.090	$ 36.412.716,00	0,00	-	$ -	32,95	$ 36.412.716,00
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3754,60	$ 9.910,00	$ 37.208.070,00	2683,95	-	$ 26.597.945,00	0,00	-	$ -	2683,95	$ 26.597.945,00
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,69	$ 1.011.310,00	$ 29.018.327,00	27,35	1.362.850	$ 37.273.948,00	0,00	-	$ -	27,35	$ 37.273.948,00
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1928,42	$ 9.910,00	$ 19.110.630,00	4066,27	-	$ 40.296.736,00	0,00	-	$ -	4066,27	$ 40.296.736,00
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	29,43	$ 494.180,00	$ 14.543.470,00	3,73	-	$ 1.843.291,00	0,00	-	$ -	3,73	$ 1.843.291,00
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.083.460,00	$ 61.800.558,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 209.768.846,00**			**$ 142.424.636,00**			**$ -**		**$ 142.424.636,00**
4	**ESTRUCTURA**												
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	1.394.465	$ 23.064.451,00	0,00	-	$ -	16,54	$ 23.064.451,00
4,2	CONCRETO F'C 21 MPA VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	23,35	1.412.220	$ 32.975.337,00	0,00	-	$ -	23,35	$ 32.975.337,00
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.039.505,00	$ 27.520.895,00	73,78	1.085.745	$ 80.106.266,00	0,00	-	$ -	73,78	$ 80.106.266,00
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5699,31	$ 9.910,00	$ 56.480.162,00	5026,79	-	$ 49.815.489,00	0,00	-	$ -	5026,79	$ 49.815.489,00
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2429,01	$ 9.910,00	$ 24.071.455,00	3232,03	-	$ 32.029.417,00	0,00	-	$ -	3232,03	$ 32.029.417,00
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	478,22	-	$ 51.493.773,00	0,00	-	$ -	478,22	$ 51.493.773,00
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8994,70	$ 17.721,00	$ 159.395.061,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 342.274.775,00**			**$ 269.484.733,00**			**$ -**		**$ 269.484.733,00**
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**												
5,1	TEJA MASTERMIL CAL.28 COLOR AZUL	M2	406,4892	$ 90.094,00	$ 36.622.238,00	360,00	-	$ 32.433.840,00	0,00	-	$ -	360,00	$ 32.433.840,00
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.858,00	$ 22.374.064,00	357,30	-	$ 23.173.763,00	0,00	-	$ -	357,30	$ 23.173.763,00
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	366,60	$ 12.700,00	$ 4.655.820,00	210,84	-	$ 2.677.668,00	0,00	-	$ -	210,84	$ 2.677.668,00
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 282.100,00	$ 6.959.633,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 99.894.678,00**			**$ 58.285.271,00**			**$ -**		**$ 58.285.271,00**
6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**												
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO Nº 4	M2	719,84	$ 54.412,00	$ 39.167.934,00	690,86	-	$ 37.591.074,00	0,00	-	$ -	690,86	$ 37.591.074,00
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.286,00	$ 22.905.972,00	846,72	-	$ 19.716.722,00	0,00	-	$ -	846,72	$ 19.716.722,00
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.229,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 13.502,00	$ 13.281.647,00	641,24	-	$ 8.658.022,00	0,00	-	$ -	641,24	$ 8.658.022,00
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.985,00	$ 2.468.353,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.868.099,00	641,24	-	$ 7.736.561,00	0,00	-	$ -	641,24	$ 7.736.561,00
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.118,00	$ 9.744.668,00	468,19	-	$ 20.187.416,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 20.187.416,00
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.745,00	$ 3.332.370,00	468,19	-	$ 6.903.462,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 6.903.462,00
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	468,19	-	$ 6.627.698,00	0,00	-	$ -	468,19	$ 6.627.698,00
	SUBTOTAL				**$ 110.163.528,00**			**$ 107.420.955,00**			**$ -**		**$ 107.420.955,00**

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA No. 01			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**												
7,1	PUNTO HIDRAULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.289,00	$ 825.780,00	17,00	-	$ 701.913,00	0,00	-	$ -	17,00	$ 701.913,00
7,2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	33,50	-	$ 584.609,00	-33,50	-	-$ 584.609,00	0,00	$ -
7,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,55	$ 11.636,00	$ 111.124,00	12,00	-	$ 139.632,00	164,02	-	$ 1.908.537,00	176,02	$ 2.048.169,00
7,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10	-	$ 315.493,00	0,00	-	$ -	34,10	$ 315.493,00
7,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,12	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00	-	$ 246.738,00	0,00	-	$ -	34,00	$ 246.738,00
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00	-	$ 3.537.900,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 3.537.900,00
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	1,00	-	$ 2.900.078,00	-1,00	-	-$ 2.900.078,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 8.573.392,00**			**$ 8.426.363,00**			**-$ 1.576.150,00**		**$ 6.850.213,00**
8	**SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**												
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,00	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00	-	$ 1.182.258,00	0,00	-	$ -	14,00	$ 1.182.258,00
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 355.716,00	6,00	-	$ 711.432,00	0,00	-	$ -	6,00	$ 711.432,00
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.360,00	$ 581.768,00	25,70	-	$ 497.552,00	0,00	-	$ -	25,70	$ 497.552,00
8,4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.567,00	42,00	-	$ 1.329.090,00	0,00	-	$ -	42,00	$ 1.329.090,00
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,80	$ 35.425,00	$ 1.197.365,00	60,00	-	$ 2.125.500,00	0,00	-	$ -	60,00	$ 2.125.500,00
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00	-	$ 139.268,00	0,00	-	$ -	4,00	$ 139.268,00
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00	-	$ 1.361.252,00	0,00	-	$ -	2,00	$ 1.361.252,00
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	1,00	-	$ 10.858.760,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 10.858.760,00
	SUBTOTAL				**$ 17.174.137,00**			**$ 18.205.112,00**			**$ -**		**$ 18.205.112,00**
9	**PISOS, ENCHAPES Y MESONES**												
9,1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 85.505,00	$ 41.384.420,00	374,40	-	$ 32.013.072,00	0,00	-	$ -	374,40	$ 32.013.072,00
9,2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18	-	$ 13.513.589,00	0,00	-	$ -	163,18	$ 13.513.589,00
9,3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00	-	$ 3.249.080,00	0,00	-	$ -	40,000	$ 3.249.080,00
9,4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	169,89	-	$ 15.031.867,00	0,00	-	$ -	169,89	$ 15.031.867,00
9,5	GUARDA ESCOBAS	ML	210,00	$ 21.672,00	$ 4.551.120,00	248,02	-	$ 5.375.089,00	0,00	-	$ -	248,02	$ 5.375.089,00
9,6	MESON GRANITO	M2	12,50	$ 257.175,00	$ 3.214.688,00	8,24	-	$ 2.119.122,00	0,00	-	$ -	8,24	$ 2.119.122,00
9,7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.000,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
9,8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.000,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
9,9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00		$ 2.699.500,00	0,00		$ -	1,00	$ 2.699.500,00
9,10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,60	$ 11.937,00	$ 4.376.104,00	0,00		$ -	0,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 91.429.500,00**			**$ 74.001.319,00**			**$ -**		**$ 74.001.319,00**
10	**APARATOS SANITARIOS**												
10,1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
10,2	PUNTO SANITARIO	UND	8,00	$ 1.008.046,00	$ 8.064.368,00	6,00	-	$ 6.048.276,00	0,00	-	$ -	6,00	$ 6.048.276,00
10,3	LAVAMANOS	UND	9,00	$ 346.198,00	$ 3.115.782,00	7,00	-	$ 2.423.386,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 2.423.386,00
10,4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 735.800,00	$ 5.886.400,00	17,23	-	$ 12.677.834,00	-17,23	-	-$ 12.677.834,00	0,00	$ -
10,5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
10,6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,00	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 37.150.975,00**			**$ 21.149.496,00**			**-$ 12.677.834,00**		**$ 8.471.662,00**
11	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**												
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPOP RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.088,89	$ 1.745.089,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA No. 01			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13	**ELECTRICO, VOZ Y DATOS**												
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00	-	$ 2.077.064,00	0,00	-	$ -	8,00	$ 2.077.064,00
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 236.173,00	$ 7.085.190,00	30,00	-	$ 7.085.190,00	0,00	-	$ -	30,00	$ 7.085.190,00
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tuberia EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.087,00	$ 16.043.742,00	66,00	-	$ 16.043.742,00	0,00	-	$ -	66,00	$ 16.043.742,00
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 207.489,00	$ 3.112.335,00	10,00	-	$ 2.074.890,00	0,00	-	$ -	10,00	$ 2.074.890,00
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	3,00	-	$ 682.137,00	0,00	-	$ -	3,00	$ 682.137,00
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	4,00	-	$ 1.064.556,00	0,00	-	$ -	4,00	$ 1.064.556,00
13,7	Suministro e intalacion de Salida Lampara de aplique a muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	7,00	-	$ 1.406.727,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.406.727,00
13,8	Suministro e instalacion de Panel Led de 60x60 cm de incrustar de 40 W	UND	16,00	$ 423.919,00	$ 6.782.704,00	16,00	-	$ 6.782.704,00	0,00	-	$ -	16,00	$ 6.782.704,00
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	38,00	-	$ 4.868.522,00	0,00	-	$ -	38,00	$ 4.868.522,00
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	12,00	-	$ 1.415.028,00	0,00	-	$ -	12,00	$ 1.415.028,00
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble Spot	UND	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	7,00	-	$ 1.251.691,00	0,00	-	$ -	7,00	$ 1.251.691,00
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 3No4+1No4+1No8 T AWG por ducto PVC de 11/2", incluye canalización y ducto de reserva de 11/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00	-	$ 9.736.800,00	0,00	-	$ -	60,00	$ 9.736.800,00
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto IMC de 11/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	1,00	-	$ 746.139,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 746.139,00
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CS274	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00	-	$ 1.253.320,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.253.320,00
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00	-	$ 831.863,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 831.863,00
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00	-	$ 204.225,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 204.225,00
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 28.583,00	$ 314.413,00	11,00	-	$ 314.413,00	0,00	-	$ -	11,00	$ 314.413,00
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 206.607,00	$ 206.607,00	1,00	-	$ 206.607,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 206.607,00
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	1,00	-	$ 996.100,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 996.100,00
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	1,00	-	$ 390.223,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 390.223,00
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	1,00	-	$ 1.422.953,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.422.953,00
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.600,00	$ 3.813.600,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00	-	$ 855.835,00	0,00	-	$ -	5,00	$ 855.835,00
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.523,00	$ 528.426,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
13,25	Suministro e Instalación de bandeja cabofil 30x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
13,26	Suministro e Instalación de tuberia EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.066,00	62,00	-	$ 2.278.066,00	0,00	-	$ -	62,00	$ 2.278.066,00
	SUBTOTAL				**$ 68.410.524,00**			**$ 63.988.795,00**			**$ -**		**$ 63.988.795,00**
14	**OTROS ITEMS**												
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 610.325,00	$ 4.882.600,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,48	$ 175.957,00	$ 4.307.427,00	0,00	-	$ -	0,00	-	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 9.190.027,00**			**$ -**			**$ -**		**$ -**

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA No. 01			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15	ITEMS NO PREVISTOS												
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	23,60	$ 793.649,00	$ 18.730.116,00	2,00		$ 1.587.298,00	25,60	$ 20.317.414,00
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	12,00	$ 706.095,00	$ 8.473.140,00	77,80		$ 54.934.191,00	89,80	$ 63.407.331,00
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO, INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML			$ -	34,00	$ 638.140,00	$ 21.696.760,00	0,00		$ -	34,00	$ 21.696.760,00
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3/KM			$ -	27947,79	$ 1.950,00	$ 54.498.191,00	0,00		$ -	27947,79	$ 54.498.191,00
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ -	163,30	$ 64.423,00	$ 10.520.276,00	0,00		$ -	163,30	$ 10.520.276,00
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	KG			$ -	2113,03	$ 17.705,00	$ 37.411.196,00	0,00		$ -	2113,03	$ 37.411.196,00
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2			$ -	37,50	$ 298.320,00	$ 11.187.000,00	0,00		$ -	37,50	$ 11.187.000,00
15,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND			$ -	1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00	0,00		$ -	1,00	$ 350.250,00
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DESARROLLO <20<=60 CM	ML			$ -	33,50	$ 153.650,00	$ 5.147.275,00	0,00		$ -	33,50	$ 5.147.275,00
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML			$ -	91,70	$ 20.366,00	$ 1.867.562,00	0,00		$ -	91,70	$ 1.867.562,00
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3			$ -	12,97	$ 694.000,00	$ 9.001.180,00	0,00		$ -	12,97	$ 9.001.180,00
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6"	ML			$ -	19,27	$ 72.854,00	$ 1.403.897,00	0,00		$ -	19,27	$ 1.403.897,00
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2			$ -	20,00	$ 832.000,00	$ 16.640.000,00	-20,00		-$ 16.640.000,00	0,00	$ -
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML			$ -	66,30	$ 394.595,00	$ 26.161.649,00	-66,30		-$ 26.161.649,00	0,00	$ -
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE).	TN/KM			$ -	12376,16	$ 3.905,00	$ 48.328.905,00	0,00		$ -	12376,16	$ 48.328.905,00
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA	UND			$ -	1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00	0,00		$ -	1,00	$ 13.624.500,00
15,17	CONCRETO F'C 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML			$ -	162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.062,00	0,00		$ -	162,00	$ 11.575.062,00
15,18	AFINADO DE PISO E= 5 CM	M2			$ -	544,00	$ 50.850,00	$ 27.662.298,00	0,00		$ -	544,00	$ 27.662.298,00
	SUBTOTAL				**$ -**			**$ 324.279.257,00**			**$ 13.719.840,00**		**$ 337.999.097,00**
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A)				**$ 1.138.918.193,00**			**$ 1.138.916.963,00**			**-$ 54,00**		**$ 1.138.916.909,00**
	ADMINISTRACION	25%			$ 284.729.548,00	25%		$ 284.729.241,00			ADMINISTRACION	25%	$ 284.729.227,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 11.389.182,00	1%		$ 11.389.170,00			IMPREVISTOS	1%	$ 11.389.169,00
	UTILIDAD	4%			$ 45.556.728,00	4%		$ 45.556.679,00			UTILIDAD	4%	$ 45.556.676,00
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 1.480.593.651,00**			**$ 1.480.592.053,00**			**COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO**		**$ 1.480.591.981,00**

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

4.10. CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE OBRA PARA COBRO FINAL

Avancemos MONTAÑITA		OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".		ACTA RECIBO FINAL	FECHA DE INICIO:	2 DE FEBRERO DE 2024		
						FECHA DE SUSPENSIÓN:	2 DE JULIO DE 2024		
						FECHA DE REINICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
						ACTA DE PRORROGA:	-		
						FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	01 DE OCTUBRE DE 2024		
SINERGIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA	CONTRATANTE	ALCALDIA DE LA MONTAÑITA	CONTRATO N°:	212-LICP-2023	VALOR CONTRATO	$		1.480.593.651,00
						VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.480.591.981,00	AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	CONTRATISTA	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S	PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES	VALOR TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO	$		1.480.591.981,00
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.		INTERVENTORÍA	CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.			VALOR ANTICIPO	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	$ 0,00
	MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR	JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ	PLAZO ADICIONAL:		VALOR A PAGAR	$		1.480.591.981,00
				PLAZO FINAL:		FECHA PRESENTE ACTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			ACTA MODIFICATORIA 2			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO POR EJCUJTAR	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**															
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2500,00	$ 2.549,00	$ 6.372.500,00	1425,00	$ 2.549,00	$ 3.632.325,00	-	$ -	1.425,00	$ 3.632.325,00	1.425,00	$ 3.632.325,00	-	$ -
1,2	CERRRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	223,00	$ 13.955,00	$ 3.111.965,00	223,00	$ 13.955,00	$ 3.111.965,00	-	$ -	223,00	$ 3.111.965,00	223,00	$ 3.111.965,00	-	$ -
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES	UND	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	1,00	$ 5.363.000,00	$ 5.363.000,00	-	$ -	1,00	$ 5.363.000,00	1,00	$ 5.363.000,00	-	$ -
1,4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	2500,00	$ 1.210,00	$ 3.025.000,00	1425,00	$ 1.210,00	$ 1.724.250,00	-	$ -	1.425,00	$ 1.724.250,00	1.425,00	$ 1.724.250,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 17.872.465,00**			**$ 13.831.540,00**	-	**$ -**		**$ 13.831.540,00**		**$ 13.831.540,00**		**$ -**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS**															
2,1	DESCAPOTE DE SUELO PARA INICIO DE OBRA	M2	1352,08	$ 3.992,00	$ 5.397.503,00	1425,00	$ 3.992,00	$ 5.688.600,00	-	$ -	1.425,00	$ 5.688.600,00	1.425,00	$ 5.688.600,00	-	$ -
2,2	EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	96,11	$ 46.850,00	$ 4.502.679,00	201,56	$ 46.850,00	$ 9.443.086,00	-	$ -	201,56	$ 9.443.086,00	201,56	$ 9.443.086,00	-	$ -
2,3	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	58,55	$ 257.551,00	$ 15.078.838,00	61,74	$ 257.551,00	$ 15.901.199,00	-	$ -	61,74	$ 15.901.199,00	61,74	$ 15.901.199,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 24.979.020,00**			**$ 31.032.885,00**	-	**$ -**		**$ 31.032.885,00**		**$ 31.032.885,00**		**$ -**
3	**CIMENTACIÓN**															
3,1	CONCRETO F'C 21 MPA ZAPATAS	M3	47,55	$ 1.011.310,00	$ 48.087.791,00	32,95	$ 1.105.090,00	$ 36.412.716,00	-	$ -	32,95	$ 36.412.716,00	32,95	$ 36.412.716,00	-	$ -
3,2	ACERO 60.000 PSI ZAPATAS	KG	3754,60	$ 9.910,00	$ 37.208.070,00	2683,95	$ 9.910,00	$ 26.597.945,00	-	$ -	2.683,95	$ 26.597.945,00	2.683,95	$ 26.597.945,00	-	$ -
3,3	CONCRETO F´C 21 MPA PARA VIGAS DE AMARRE	M3	28,69	$ 1.011.310,00	$ 29.018.327,00	27,35	$ 1.362.850,00	$ 37.273.948,00	-	$ -	27,35	$ 37.273.948,00	27,35	$ 37.273.948,00	-	$ -
3,4	ACERO 60.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	KG	1928,42	$ 9.910,00	$ 19.110.630,00	4066,27	$ 9.910,00	$ 40.296.736,00	-	$ -	4.066,27	$ 40.296.736,00	4.066,27	$ 40.296.736,00	-	$ -
3,5	CONCRETO DE LIMPIEZA e=5 cm	M3	29,43	$ 494.180,00	$ 14.543.470,00	3,73	$ 494.180,00	$ 1.843.291,00	-	$ -	3,73	$ 1.843.291,00	3,73	$ 1.843.291,00	-	$ -
3,6	PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm	M3	57,04	$ 1.083.460,00	$ 61.800.558,00	0,00	$ 1.083.460,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.768.846,00**			**$ 142.424.636,00**	-	**$ -**		**$ 142.424.636,00**		**$ 142.424.636,00**		**$ -**
4	**ESTRUCTURA**															
4,1	CONCRETO F'C 21 MPA COLUMNAS	M3	19,23	$ 1.063.760,00	$ 20.456.105,00	16,54	$ 1.394.465,00	$ 23.064.451,00	-	$ -	16,54	$ 23.064.451,00	16,54	$ 23.064.451,00	-	$ -
4,2	CONCRETO F'C 21 MPA VIGAS	M3	32,91	$ 1.074.155,00	$ 35.345.930,00	23,35	$ 1.412.220,00	$ 32.975.337,00	-	$ -	23,35	$ 32.975.337,00	23,35	$ 32.975.337,00	-	$ -
4,3	CONCRETO F'C 21 MPA PLACA FUNDIDA EN METALDECK	M3	26,48	$ 1.039.505,00	$ 27.520.895,00	73,78	$ 1.085.745,00	$ 80.106.266,00	-	$ -	73,78	$ 80.106.266,00	73,78	$ 80.106.266,00	-	$ -
4,4	ACERO 60000 PSI COLUMNAS	KG	5699,31	$ 9.910,00	$ 56.480.162,00	5026,79	$ 9.910,00	$ 49.815.489,00	-	$ -	5.026,79	$ 49.815.489,00	5.026,79	$ 49.815.489,00	-	$ -
4,5	ACERO 60000 PSI VIGAS	KG	2429,01	$ 9.910,00	$ 24.071.455,00	3232,03	$ 9.910,00	$ 32.029.417,00	-	$ -	3.232,03	$ 32.029.417,00	3.232,03	$ 32.029.417,00	-	$ -
4,6	PLACA EN METALDECK CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	176,50	$ 107.678,00	$ 19.005.167,00	478,22	$ 107.678,00	$ 51.493.773,00	-	$ -	478,22	$ 51.493.773,00	478,22	$ 51.493.773,00	-	$ -
4,7	CORREA METÁLICA EN TUBERIA PERFIL "C" PARA CUBIERTA - ASTM A 572. INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PARA INSTALACION	KG	8994,70	$ 17.721,00	$ 159.395.061,00	0,00	$ 17.721,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 342.274.775,00**			**$ 269.484.733,00**	-	**$ -**		**$ 269.484.733,00**		**$ 269.484.733,00**		**$ -**
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**															
5,1	TEJA MASTERMIL CAL.28 COLOR AZUL	M2	406,4892	$ 90.094,00	$ 36.622.238,00	360,00	$ 90.094,00	$ 32.433.840,00	-	$ -	360,00	$ 32.433.840,00	360,00	$ 32.433.840,00	-	$ -
5,2	CIELO RASO EN LAMINA PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA	M2	344,97	$ 64.858,00	$ 22.374.064,00	357,30	$ 64.858,00	$ 23.173.763,00	-	$ -	357,30	$ 23.173.763,00	357,30	$ 23.173.763,00	-	$ -
5,3	MEDIACAÑA EN LAMINA PVC	ML	366,60	$ 12.700,00	$ 4.655.820,00	210,84	$ 12.700,00	$ 2.677.668,00	-	$ -	210,84	$ 2.677.668,00	210,84	$ 2.677.668,00	-	$ -
5,4	FACHADA FLOTANTE VERTICAL	M2	24,67	$ 282.100,00	$ 6.959.633,00	0,00	$ 282.100,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	FACHADA FLOTANTE HORIZONTAL	ML	50,00	$ 117.144,00	$ 5.857.200,00	0,00	$ 117.144,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,6	PARASOL EN ESTRUCTURA METALICA AZUL COBALTO, INCLUYE MATERIAL PARA INSTALACION	M2	72,71	$ 322.178,00	$ 23.425.723,00	0,00	$ 322.178,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

6	**MAMPOSTERIA, MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**																		
6,1	MAMPOSTERIA, LADRILLO N° 4	M2	719,84	$ 54.412,00	$ 39.167.934,00	690,86	$ 54.412,00	$ 37.591.074,00	-	$ -	690,86	$ 37.591.074,00	690,86	$ 37.591.074,00	-	$ -
6,2	PAÑETE 1:4 INTERIORES	M2	983,68	$ 23.286,00	$ 22.905.972,00	846,72	$ 23.286,00	$ 19.716.722,00	-	$ -	846,72	$ 19.716.722,00	846,72	$ 19.716.722,00	-	$ -
6,3	PAÑETE 1:4 BAJO PLACA	M2	176,50	$ 23.769,00	$ 4.195.229,00	0,00	$ 23.769,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,4	ESTUCO PARA MURO INTERIORES	M2	983,68	$ 13.502,00	$ 13.281.647,00	641,24	$ 13.502,00	$ 8.658.022,00	-	$ -	641,24	$ 8.658.022,00	641,24	$ 8.658.022,00	-	$ -
6,5	ESTUCO INTERIOR BAJO PLACA	M2	176,50	$ 13.985,00	$ 2.468.353,00	0,00	$ 13.985,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,6	PINTURA, MUROS INTERIORES TIPO 1, A 3 MANOS	M2	983,68	$ 12.065,00	$ 11.868.099,00	641,24	$ 12.065,00	$ 7.736.561,00	-	$ -	641,24	$ 7.736.561,00	641,24	$ 7.736.561,00	-	$ -
6,7	PAÑETE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA	M2	226,00	$ 43.118,00	$ 9.744.668,00	468,19	$ 43.118,00	$ 20.187.416,00	-	$ -	468,19	$ 20.187.416,00	468,19	$ 20.187.416,00	-	$ -
6,8	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	226,00	$ 14.745,00	$ 3.332.370,00	468,19	$ 14.745,00	$ 6.903.462,00	-	$ -	468,19	$ 6.903.462,00	468,19	$ 6.903.462,00	-	$ -
6,9	PINTURA, MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA PLÁSTICA	M2	226,00	$ 14.156,00	$ 3.199.256,00	468,19	$ 14.156,00	$ 6.627.698,00	-	$ -	468,19	$ 6.627.698,00	468,19	$ 6.627.698,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 110.163.528,00**			**$ 107.420.955,00**		**$ -**		**$ 107.420.955,00**		**$ 107.420.955,00**		**$ -**
7	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**															
7,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	PTO	20,00	$ 41.289,00	$ 825.780,00	17,00	$ 41.289,00	$ 701.913,00	-	$ -	17,00	$ 701.913,00	17,00	$ 701.913,00	-	$ -
7,2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21	ML	33,50	$ 17.451,00	$ 584.609,00	0,00	$ 17.451,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21	ML	9,55	$ 11.636,00	$ 111.124,00	176,02	$ 11.636,00	$ 2.048.169,00	-	$ -	176,02	$ 2.048.169,00	176,02	$ 2.048.169,00	-	$ -
7,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	ML	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	34,10	$ 9.252,00	$ 315.493,00	-	$ -	34,10	$ 315.493,00	34,10	$ 315.493,00	-	$ -
7,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13,5	ML	41,12	$ 7.257,00	$ 298.408,00	34,00	$ 7.257,00	$ 246.738,00	-	$ -	34,00	$ 246.738,00	34,00	$ 246.738,00	-	$ -
7,6	TANQUE 1000 lts incluye accesorios	UND	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	3,00	$ 1.179.300,00	$ 3.537.900,00	-	$ -	3,00	$ 3.537.900,00	3,00	$ 3.537.900,00	-	$ -
7,7	MEDIDOR	UND	1,00	$ 2.900.078,00	$ 2.900.078,00	0,00	$ 2.900.078,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 8.573.392,00**			**$ 6.850.213,00**		**$ -**		**$ 6.850.213,00**		**$ 6.850.213,00**		**$ -**
8	**SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**															
8,1	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	PTO	14,00	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	14,00	$ 84.447,00	$ 1.182.258,00	-	$ -	14,00	$ 1.182.258,00	14,00	$ 1.182.258,00	-	$ -
8,2	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	PTO	3,00	$ 118.572,00	$ 355.716,00	6,00	$ 118.572,00	$ 711.432,00	-	$ -	6,00	$ 711.432,00	6,00	$ 711.432,00	-	$ -
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,05	$ 19.360,00	$ 581.768,00	25,70	$ 19.360,00	$ 497.552,00	-	$ -	25,70	$ 497.552,00	25,70	$ 497.552,00	-	$ -
8,4	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,43	$ 31.645,00	$ 1.532.567,00	42,00	$ 31.645,00	$ 1.329.090,00	-	$ -	42,00	$ 1.329.090,00	42,00	$ 1.329.090,00	-	$ -
8,5	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	ML	33,80	$ 35.425,00	$ 1.197.365,00	60,00	$ 35.425,00	$ 2.125.500,00	-	$ -	60,00	$ 2.125.500,00	60,00	$ 2.125.500,00	-	$ -
8,6	TRAGANTE PVC	UND	3,00	$ 34.817,00	$ 104.451,00	4,00	$ 34.817,00	$ 139.268,00	-	$ -	4,00	$ 139.268,00	4,00	$ 139.268,00	-	$ -
8,7	CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	2,00	$ 680.626,00	$ 1.361.252,00	-	$ -	2,00	$ 1.361.252,00	2,00	$ 1.361.252,00	-	$ -
8,8	POZO SEPTICO INTEGRADO	UND	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	1,00	$ 10.858.760,00	$ 10.858.760,00	-	$ -	1,00	$ 10.858.760,00	1,00	$ 10.858.760,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 17.174.137,00**			**$ 18.205.112,00**		**$ -**		**$ 18.205.112,00**		**$ 18.205.112,00**		**$ -**
9	**PISOS, ENCHAPES Y MESONES**															
9,1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	484,00	$ 85.505,00	$ 41.384.420,00	374,40	$ 85.505,00	$ 32.013.072,00	-	$ -	374,40	$ 32.013.072,00	374,40	$ 32.013.072,00	-	$ -
9,2	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	42,00	$ 82.814,00	$ 3.478.188,00	163,18	$ 82.814,00	$ 13.513.589,00	-	$ -	163,18	$ 13.513.589,00	163,18	$ 13.513.589,00	-	$ -
9,3	CERAMICA COCINA ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	40,00	$ 81.227,00	$ 3.249.080,00	-	$ -	40,00	$ 3.249.080,00	40,00	$ 3.249.080,00	-	$ -
9,4	EXTERIOR CERAMICA PISO	M2	230,00	$ 88.480,00	$ 20.350.400,00	169,89	$ 88.480,00	$ 15.031.867,00	-	$ -	169,89	$ 15.031.867,00	169,89	$ 15.031.867,00	-	$ -
9,5	GUARDA ESCOBAS	ML	210,00	$ 21.672,00	$ 4.551.120,00	248,02	$ 21.672,00	$ 5.375.089,00	-	$ -	248,02	$ 5.375.089,00	248,02	$ 5.375.089,00	-	$ -
9,6	MESON GRANITO	M2	12,50	$ 257.175,00	$ 3.214.688,00	8,24	$ 257.175,00	$ 2.119.122,00	-	$ -	8,24	$ 2.119.122,00	8,24	$ 2.119.122,00	-	$ -
9,7	MUEBLE COCINA SUPERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.000,00	0,00	$ 406.300,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,8	MUEBLE COCINA INFERIOR	ML	10,00	$ 406.300,00	$ 4.063.000,00	0,00	$ 406.300,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,9	CAMPANA COCINA (ACERO INOXIDABLE)	UND	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	1,00	$ 2.699.500,00	$ 2.699.500,00	-	$ -	1,00	$ 2.699.500,00	1,00	$ 2.699.500,00	-	$ -
9,10	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3	ML	366,60	$ 11.937,00	$ 4.376.104,00	0,00	$ 11.937,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 91.429.500,00**			**$ 74.001.319,00**		**$ -**		**$ 74.001.319,00**		**$ 74.001.319,00**		**$ -**
10	**APARATOS SANITARIOS**															
10,1	CABINA BAÑO	UND	6,00	$ 2.812.000,00	$ 16.872.000,00	0,00	$ 2.812.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10,2	PUNTO SANITARIO	UND	8,00	$ 1.008.046,00	$ 8.064.368,00	6,00	$ 1.008.046,00	$ 6.048.276,00	-	$ -	6,00	$ 6.048.276,00	6,00	$ 6.048.276,00	-	$ -
10,3	LAVAMANOS	UND	9,00	$ 346.198,00	$ 3.115.782,00	7,00	$ 346.198,00	$ 2.423.386,00	-	$ -	7,00	$ 2.423.386,00	7,00	$ 2.423.386,00	-	$ -
10,4	TUBO BARANDA BAÑOS (TUBO DE ACERO INOXIDABLE)	ML	8,00	$ 735.800,00	$ 5.886.400,00	0,00	$ 735.800,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10,5	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH	UND	20,00	$ 113.975,00	$ 2.279.500,00	0,00	$ 113.975,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10,6	EXTRACTOR DE AIRE 28W	UND	3,00	$ 310.975,00	$ 932.925,00	0,00	$ 310.975,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 37.150.975,00**			**$ 8.471.662,00**		**$ -**		**$ 8.471.662,00**		**$ 8.471.662,00**		**$ -**

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

11	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**																	
11,1	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	5,00	$ 1.271.450,00	$ 6.357.250,00	0,00	$ 1.271.450,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,2	PUERTA TIPO 2 MADERA ENTAMBORADA TIPOP RH COLORES CLAROS TIPO MADERA.	UND	2,00	$ 1.176.950,00	$ 2.353.900,00	0,00	$ 1.176.950,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,3	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.068.450,00	$ 2.068.450,00	0,00	$ 2.068.450,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,4	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 2.329.410,00	$ 2.329.410,00	0,00	$ 2.329.410,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,5	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 3.186.850,00	$ 6.373.700,00	0,00	$ 3.186.850,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,6	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.602.450,00	$ 1.602.450,00	0,00	$ 1.602.450,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,7	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.745.088,89	$ 1.745.089,00	0,00	$ 1.745.088,89	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,8	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	2,00	$ 2.682.888,00	$ 5.365.776,00	0,00	$ 2.682.888,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,9	PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 1.018.950,00	$ 1.018.950,00	0,00	$ 1.018.950,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,10	VENTANA TIPO CORREDERA METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD. PARA COCINA	UND	1,00	$ 2.370.288,00	$ 2.370.288,00	0,00	$ 2.370.288,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,11	VENTANA TIPO CORREDERA 1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	6,00	$ 3.353.820,00	$ 20.122.920,00	0,00	$ 3.353.820,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,12	VENTANA TIPO 2 CORREDERA (VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD TERMINADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA)	UND	3,00	$ 4.562.300,00	$ 13.686.900,00	0,00	$ 4.562.300,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,13	VENTANA TIPO 3 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 469.230,00	$ 469.230,00	0,00	$ 469.230,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,14	VENTANA TIPO 4 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00	$ 342.660,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,15	VENTANA TIPO 4,1 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	3,00	$ 258.498,00	$ 775.494,00	0,00	$ 258.498,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,16	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 213.180,00	$ 213.180,00	0,00	$ 213.180,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
11,17	VENTANA TIPO 4,2 METALICA LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROESTATICA CON PELICULA DE SEGURIDAD PET POLIESTER ESPESOR DE 100 MICRON, ADESIVA, PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD.	UND	1,00	$ 342.660,00	$ 342.660,00	0,00	$ 342.660,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
				SUBTOTAL	**$ 67.538.307,00**			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		
12	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**																	
12,1	PLACA ANDEN CONCRETO F'C 21 MPA Y MALLA ELECTROSOLDADA	M3	7,00	$ 1.123.640,00	$ 7.865.480,00	5,56	$ 1.123.640,00	$ 6.247.438,00	-	$ -	5,56	$ 6.247.438,00	5,56	$ 6.247.438,00	-	$ -		
12,2	VIGA ARRASTRE MURO DE CERRAMIENTO	M3	4,40	$ 1.058.948,00	$ 4.663.607,00	0,00	$ 1.058.948,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
12,3	ANDEN EXTERIOR VIA EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	4,30	$ 1.120.783,00	$ 4.819.367,00	0,00	$ 1.120.783,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
12,4	DINTELES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	1,39	$ 1.004.855,00	$ 1.400.190,00	0,67	$ 1.004.855,00	$ 673.253,00	-	$ -	0,67	$ 673.253,00	0,67	$ 673.253,00	-	$ -		
12,5	CUNETA EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	13,13	$ 1.050.708,00	$ 13.790.543,00	0,00	$ 1.050.708,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
12,6	MURO PERIMETRAL EN LADRILLO A LA VISTA	M2	36,00	$ 54.412,00	$ 1.958.832,00	0,00	$ 54.412,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
				SUBTOTAL	**$ 34.498.019,00**			**$ 6.920.691,00**		$ -		**$ 6.920.691,00**		**$ 6.920.691,00**		$ -		

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

13	ELECTRICO, VOZ Y DATOS																	
13,1	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente GFCI de 15 amperios en Tubo PVC	UND	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	8,00	$ 259.633,00	$ 2.077.064,00	-	$ -	8,00	$ 2.077.064,00	8,00	$ 2.077.064,00	-	$ -
13,2	Suministro e Instalación de Salida Tomacorriente doble de 15 amperios en Tubo PVC	UND	30,00	$ 236.173,00	$ 7.085.190,00	30,00	$ 236.173,00	$ 7.085.190,00	-	$ -	30,00	$ 7.085.190,00	30,00	$ 7.085.190,00	-	$ -
13,3	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria en Techo por Tuberia EMT de 3/4 + Cableado Eléctrico 2No12+1No 12 HFFR-LS	UND	66,00	$ 243.087,00	$ 16.043.742,00	66,00	$ 243.087,00	$ 16.043.742,00	-	$ -	66,00	$ 16.043.742,00	66,00	$ 16.043.742,00	-	$ -
13,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Sencillo por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No 12 HFFR-LS	UND	15,00	$ 207.489,00	$ 3.112.335,00	10,00	$ 207.489,00	$ 2.074.890,00	-	$ -	10,00	$ 2.074.890,00	10,00	$ 2.074.890,00	-	$ -
13,5	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	3,00	$ 227.379,00	$ 682.137,00	-	$ -	3,00	$ 682.137,00	3,00	$ 682.137,00	-	$ -
13,6	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor doble conmutable por Tuberia PVC de 1/2 + Cableado Eléctrico No12 HFFR-LS	UND	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	4,00	$ 266.139,00	$ 1.064.556,00	-	$ -	4,00	$ 1.064.556,00	4,00	$ 1.064.556,00	-	$ -
13,7	Suministro e intalacion de Salida Lampara de aplique a muro tubo PVC de 1/2" y cable No 12 (FNT)	UND	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	7,00	$ 200.961,00	$ 1.406.727,00	-	$ -	7,00	$ 1.406.727,00	7,00	$ 1.406.727,00	-	$ -
13,8	Suministro e instalacion de Panel Led de 60x60 cm de incrustar de 40 W	UND	16,00	$ 423.919,00	$ 6.782.704,00	16,00	$ 423.919,00	$ 6.782.704,00	-	$ -	16,00	$ 6.782.704,00	16,00	$ 6.782.704,00	-	$ -
13,9	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 24 W	UND	54,00	$ 128.119,00	$ 6.918.426,00	38,00	$ 128.119,00	$ 4.868.522,00	-	$ -	38,00	$ 4.868.522,00	38,00	$ 4.868.522,00	-	$ -
13,10	Suministro e Instalación de Luminaria Led circular de sobreponer de 18 W	UND	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	12,00	$ 117.919,00	$ 1.415.028,00	-	$ -	12,00	$ 1.415.028,00	12,00	$ 1.415.028,00	-	$ -
13,11	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia LED Doble Spot	UND	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	7,00	$ 178.813,00	$ 1.251.691,00	-	$ -	7,00	$ 1.251.691,00	7,00	$ 1.251.691,00	-	$ -
13,12	Suministro e Instalación de Acometida general subterranea desde estructura existente en baja tensión hasta Tablero de distribución de circuitos de Laboratorio en Cable Cu 3No4+1No4+1No8 T AWG por ducto PVC de 11/2", incluye canalización y ducto de reserva de 11/2"	m	40,00	$ 162.280,00	$ 6.491.200,00	60,00	$ 162.280,00	$ 9.736.800,00	-	$ -	60,00	$ 9.736.800,00	60,00	$ 9.736.800,00	-	$ -
13,13	Suministro e Instalación de subterranización de red de baja tensión en ducto IMC de 11/2"	UND	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	1,00	$ 746.139,00	$ 746.139,00	-	$ -	1,00	$ 746.139,00	1,00	$ 746.139,00	-	$ -
13,14	Suministro e Instalación de caja de paso red baja tensión subterranea norma codensa CS274	UND	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	1,00	$ 1.253.320,00	$ 1.253.320,00	-	$ -	1,00	$ 1.253.320,00	1,00	$ 1.253.320,00	-	$ -
13,15	Suministro e Instalación de Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa	UND	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	1,00	$ 831.863,00	$ 831.863,00	-	$ -	1,00	$ 831.863,00	1,00	$ 831.863,00	-	$ -
13,16	Suministro e Instalación de Caja de paso de 30x30x15 cm para servicio de Internet - TV	UND	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	1,00	$ 204.225,00	$ 204.225,00	-	$ -	1,00	$ 204.225,00	1,00	$ 204.225,00	-	$ -
13,17	Suministro e Instalación de interruptor automatico de 1x20 A	UND	11,00	$ 28.583,00	$ 314.413,00	11,00	$ 28.583,00	$ 314.413,00	-	$ -	11,00	$ 314.413,00	11,00	$ 314.413,00	-	$ -
13,18	Suministro e Instalación de Breaker Industrial de 3x70 A	UND	1,00	$ 206.607,00	$ 206.607,00	1,00	$ 206.607,00	$ 206.607,00	-	$ -	1,00	$ 206.607,00	1,00	$ 206.607,00	-	$ -
13,19	Suministro e Instalación de Armario de equipo de medida directa	UND	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	1,00	$ 996.100,00	$ 996.100,00	-	$ -	1,00	$ 996.100,00	1,00	$ 996.100,00	-	$ -
13,20	Suministro e Instalación de caja de inspección SPT de 30x30x30 cm	UND	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	1,00	$ 390.223,00	$ 390.223,00	-	$ -	1,00	$ 390.223,00	1,00	$ 390.223,00	-	$ -
13,21	Construcción Sistema de puesta a tierra del Tablero de Distribución	UND	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	1,00	$ 1.422.953,00	$ 1.422.953,00	-	$ -	1,00	$ 1.422.953,00	1,00	$ 1.422.953,00	-	$ -
13,22	Suministro e Instalación de rack y equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 3.813.600,00	$ 3.813.600,00	0,00	$ 3.813.600,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13,23	Suministro e Instalación de salida de voz y datos	UND	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	5,00	$ 171.167,00	$ 855.835,00	-	$ -	5,00	$ 855.835,00	5,00	$ 855.835,00	-	$ -
13,24	Suministro e Instalación de cable UTP cat 6	MT	62,00	$ 8.523,00	$ 528.426,00	0,00	$ 8.523,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13,25	Suministro e Instalación de bandeja cabofil 30x8 cm, incluye cable de tierra en Cu 6 AWG	MT	2,00	$ 118.977,00	$ 237.954,00	0,00	$ 118.977,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13,26	Suministro e Instalación de tuberia EMT de 3/4" suspendida en techo	MT	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.066,00	62,00	$ 36.743,00	$ 2.278.066,00	-	$ -	62,00	$ 2.278.066,00	62,00	$ 2.278.066,00	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 68.410.524,00			$ 63.988.795,00		$ -		$ 63.988.795,00		$ 63.988.795,00		$ -
14	OTROS ITEMS															
14,1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	UND	8,00	$ 610.325,00	$ 4.882.600,00	0,00	$ 610.325,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,2	BARANDAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	24,48	$ 175.957,00	$ 4.307.427,00	0,00	$ 175.957,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 9.190.027,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CONSTRUCTORA DICOYS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ

INFORME PARA PAGO N. 1 – FINAL

16	ITEM NO PREVISTOS																
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	25,60	$ 793.649,00	$ 20.317.414,00	-	$ -	25,60	$ 20.317.414,00	25,60	$ 20.317.414,00	-	$ -
15,2	EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO, CRISTAL INCOLORO 3+3MM, INCLUYE MARCO	M2			$ -	89,80	$ 706.095,00	$ 63.407.331,00	-	$ -	89,80	$ 63.407.331,00	89,80	$ 63.407.331,00	-	$ -
15,3	CUNETA TIPO CARCAMO, INCLUYE REJILLA PLASTICA, PAGADA POR ML	ML			$ -	34,00	$ 638.140,00	$ 21.696.760,00	-	$ -	34,00	$ 21.696.760,00	34,00	$ 21.696.760,00	-	$ -
15,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE POR M3	M3/KM			$ -	27947,79	$ 1.950,00	$ 54.498.191,00	-	$ -	27.947,79	$ 54.498.191,00	27.947,79	$ 54.498.191,00	-	$ -
15,5	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10X12 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ -	163,30	$ 64.423,00	$ 10.520.276,00	-	$ -	163,30	$ 10.520.276,00	163,30	$ 10.520.276,00	-	$ -
15,6	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, PAGADO EN KG	KG			$ -	2113,03	$ 17.705,00	$ 37.411.196,00	-	$ -	2.113,03	$ 37.411.196,00	2.113,03	$ 37.411.196,00	-	$ -
15,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI TANQUES ELEVADOS	M2			$ -	37,50	$ 298.320,00	$ 11.187.000,00	-	$ -	37,50	$ 11.187.000,00	37,50	$ 11.187.000,00	-	$ -
15,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND			$ -	1,00	$ 350.250,00	$ 350.250,00	-	$ -	1,00	$ 350.250,00	1,00	$ 350.250,00	-	$ -
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DESARROLLO <20<=60 CM	ML			$ -	33,50	$ 153.650,00	$ 5.147.275,00	-	$ -	33,50	$ 5.147.275,00	33,50	$ 5.147.275,00	-	$ -
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML			$ -	91,70	$ 20.366,00	$ 1.867.562,00	-	$ -	91,70	$ 1.867.562,00	91,70	$ 1.867.562,00	-	$ -
15,11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3			$ -	12,97	$ 694.000,00	$ 9.001.180,00	-	$ -	12,97	$ 9.001.180,00	12,97	$ 9.001.180,00	-	$ -
15,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6"	ML			$ -	19,27	$ 72.854,00	$ 1.403.897,00	-	$ -	19,27	$ 1.403.897,00	19,27	$ 1.403.897,00	-	$ -
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2			$ -	0,00	$ 832.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,14	PASAMANOS DE 3 HILOS EN ACERO INOXIDABLE	ML			$ -	0,00	$ 394.595,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,15	TRANSPORTE A SITIO DE OBRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (INCL. CARGUE Y DESCARGUE).	TN/KM			$ -	12376,16	$ 3.905,00	$ 48.328.905,00	-	$ -	12.376,16	$ 48.328.905,00	12.376,16	$ 48.328.905,00	-	$ -
15,16	TRASLADO DE TRANSFORMADOR Y LINEA VIVA	UND			$ -	1,00	$ 13.624.500,00	$ 13.624.500,00	-	$ -	1,00	$ 13.624.500,00	1,00	$ 13.624.500,00	-	$ -
15,17	CONCRETO F'C 21 MPA PARA COLUMNETAS	ML			$ -	162,00	$ 71.451,00	$ 11.575.062,00	-	$ -	162,00	$ 11.575.062,00	162,00	$ 11.575.062,00	-	$ -
15,18	AFINADO DE PISO E= 5 CM	M2			$ -	544,00	$ 50.850,00	$ 27.662.298,00	-	$ -	544,00	$ 27.662.298,00	544,00	$ 27.662.298,00	-	$ -
				SUBTOTAL	$ -			$ 337.999.097,00		$ -		$ 337.999.097,00		$ 337.999.097,00		$ -
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A)				$ 1.138.918.193,00			$ 1.138.916.909,00		$ -		$ 1.138.916.909,00		$ 1.138.916.909,00		$ -
	ADMINISTRACION	25%			$ 284.729.548,00		25%	$ 284.729.227,00		$ -	25%	$ 284.729.227,00		$ 284.729.227,00		$ -
	IMPREVISTOS	1%			$ 11.389.182,00		1%	$ 11.389.169,00		$ -	1%	$ 11.389.169,00		$ 11.389.169,00		$ -
	UTILIDAD	4%			$ 45.556.728,00		4%	$ 45.556.676,00		$ -	4%	$ 45.556.676,00		$ 45.556.676,00		$ -
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 1.480.593.651,00			$ 1.480.591.981,00		$ -		$ 1.480.591.981,00		$ 1.480.591.981,00		$ -

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

4.1. Verificación de personal, equipos y materiales

Durante la ejecución de las actividades se ha contado con la participación del equipo profesional dispuesto para este proceso, así como, personal no calificado para realizar las actividades físicas de obra. Debido a la dinámica en el desarrollo de las actividades, se ha presentado una rotación en el personal obrero durante este periodo, a pesar de esto, todo el personal ha sido capacitado, afiliado a sistema de seguridad social y riesgos profesionales como es demandado en los procesos de este tipo. A continuación de relacionan los profesionales del proyecto con las seguridades sociales del mes de septiembre, y se adjuntan en los anexos las planillas desde el 02 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2024.

ITEM	CARGO DESEMPEÑADO	CEDULA	NOMBRE	No. PLANILLA	SUELDO MENSUAL (I.B.C)
1	Director De Obra	80.233.290	Celso Rojas Cleves	4572091973	$ 1.300.000
2	Residente de obra	1.117.545.232	Richard Edinson Castrillón Menza	9474369317	$ 1.300.000
3	Arquitecto	12.552.581	Alex Raimundo Moisés Romero	9474396608	$ 1.300.000
4	Sisoma	1.018.435.020	Paola Andrea Medina Amezquita	9474369317	$ 1.300.000
5	Especialista Estructural	1.110.535.942	Hoover Andrés Trujillo Ramírez	9474466796	$ 1.520.000
6	Especialista Hidráulico	1.018.410.974	Diego Armando Gallego Muriel	80712153	$ 1.300.000

4.2. Equipos de obra

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra estuvieron relacionadas con: preliminares, movimientos de tierras, cimentación, estructura, cubierta y cielo raso, mampostería, muros, pañetes y pinturas, instalaciones hidráulicas, sanitarias y aguas lluvias, pisos, enchapes y mesones, aparatos sanitarios, elementos no estructurales, eléctrico, voz y datos, ítems no previstos. El equipo utilizado para llevar a cabo las actividades mencionadas fue el siguiente:

MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
ESTACION TOTAL	GOWIN	TKS-202	-
NIVEL TOPOGRAFICO	TOPCON	AT-B4	-
RETROCARGADOR	CAT	CAT 420F	101HP
VOLQUETA	FORD	1967	7 TON
MEZCLADORA DE CONCRETO	KOMAX		450 L
ANDAMIOS	GENERICO	GX160R	-
CAMIONETA 4X4	TOYOTA	HILUX	1TON

4.3. Herramienta menor


Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante periodo del mes de febrero a junio se tuvieron en obra la siguiente herramienta menor:

HERRAMIENTA	CANTIDAD
PALA REDONDA	4
PICA	3
CARRETILLA	4
BARRA	3
BARRETON	3
PALADRAGA	2
BALDES	10
Herramienta menor enchape, pañetes, instalación de aparatos sanitarios	2

4.4. Estado del clima

Durante el mes de junio, el clima se caracterizó por condiciones nubladas, abarcando un 42% del tiempo, lo que indica un período con épocas de lloviznas y lluvias moderadas que afectaron considerablemente los tiempos de ejecución de las actividades programadas. Hubo un 23% de días soleados, sugiriendo momentos intermitentes de calor y radiaciones altas. Las lluvias moderadas se experimentaron en un 29% del tiempo, siendo eventos que, para trabajos al aire libre provocaron un retraso en las actividades de excavaciones, rellenos, fundidas en concreto, instalaciones de pañetes y pega de ladrillos, entre otras. Por otro lado, las lluvias moderadas tuvieron un porcentaje alto comparado con los dos meses anteriores (marzo y abril), provocando que ocasionalmente se detuvieran las labores de todo el proyecto.

En el periodo del mes de junio, se presentaron fuertes precipitaciones que también afecto considerablemente el avance de obra, con un porcentaje del 6% de lluvias intensas. Por otro lado, las condiciones soleadas en el periodo de febrero a junio fueron del 15% al 65% al, fueron favorables para el avance de actividades a la intemperie, con un porcentaje de condiciones soleadas del 60%, en donde había momentos de nubosidad del 20% y lluvias ocasionales que no afectaron al desarrollo de las actividades. En el mes de mayo prevalecieron los días con nubosidad del 54%, donde había ambientes frescos para desarrollar las actividades programadas. El estado general del tiempo para el mes de abril tubo un porcentaje del 43% para condiciones nubladas, y un 37% de clima soleado, sin embargo, las lloviznas y precipitaciones moderadas estuvieron presentes en un 18% y un 9% para lluvias intensas en donde se organizaron frentes de trabajo que desarrollaban actividades bajo la placa de entrepiso (amarre de acero, corte de madera, pega de ladrillos, entre otras.

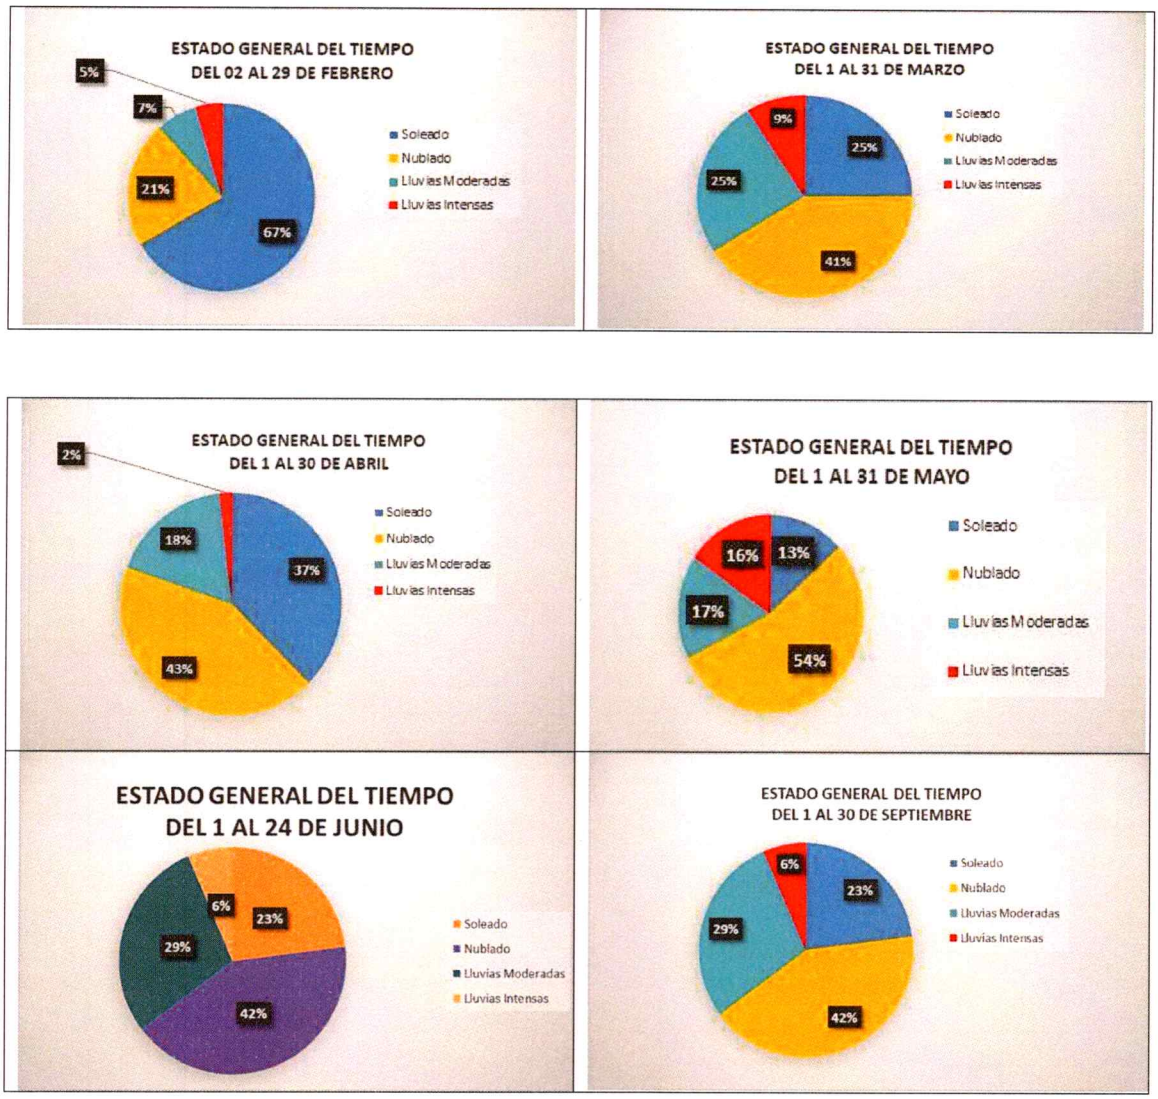


Durante el mes de septiembre prevalece en la zona los cielos nublados y frescos con algunos días de intensidad solar (23% de tiempo soleado), por lo que el avance de las actividades al aire libre es considerable, permitiendo que las cuadrillas que se encuentran en el frente de obra puedan culminar sus labores y actividades con satisfacción y sin retrasos. En general las condiciones benefician los avances de actividades, con porcentajes muy mínimos de luvias intensas y solo el 29% de lluvias moderadas, en donde el personal de obra se podía distribuir al interior de la estructura ya que se contaba con la cubierta desde el mes de mayo y junio donde se ejecutaron estas actividades, permitiendo el avance de actividades como enchapes, pintura, instalaciones eléctricas y estructuras

metálicas. Cabe resaltar que no se anexa el estado general del clima de los meses de julio y agosto debido a que en este periodo de tiempo el contrato presento una suspensión (Suspensión No.1).

4.5. Balance financiero del contrato (avance programado vs ejecutado)

El contratista de obra entrega el flujo grama de ejecución desde el 02 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024.

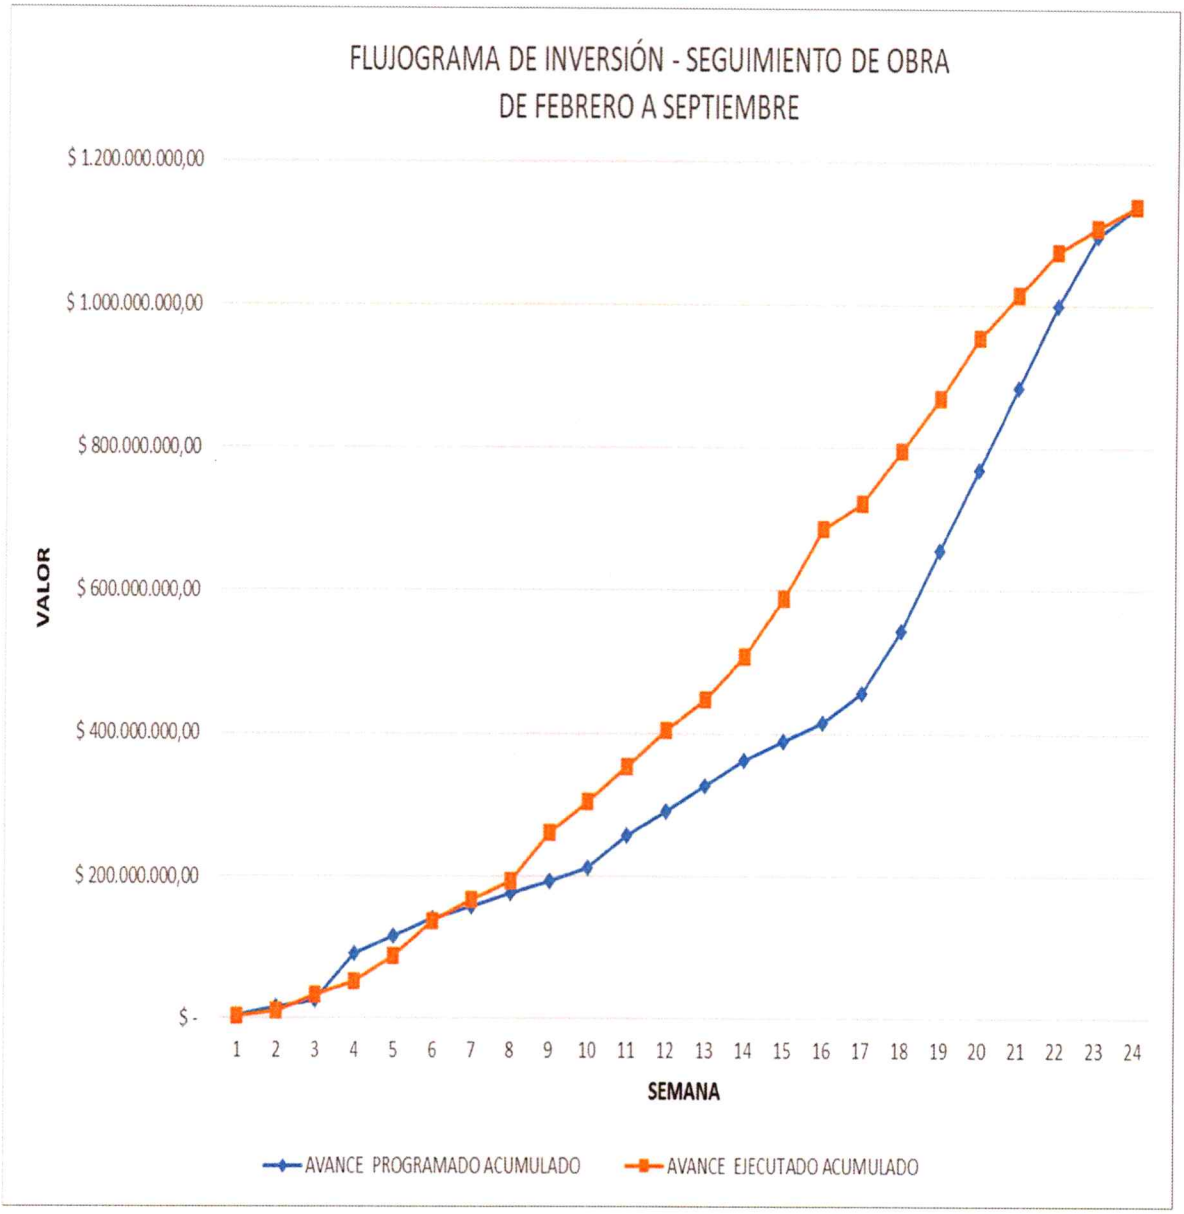

Cumplido el mes de septiembre el contratista de obra culmina el avance ejecutado de obra con el 100%

N. DE SEMANA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL	% AVANCE SEMANAL EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 4.610.513,33	0,40%	$ 3.021.078,67	0,265%	$ 4.610.513,33	0,405%	$ 3.021.078,67	0,265%
2	$ 10.817.090,33	0,95%	$ 8.021.842,67	0,704%	$ 15.427.603,67	1,355%	$ 11.042.921,33	0,970%
3	$ 10.817.090,33	0,95%	$ 22.432.305,17	1,970%	$ 26.244.694,00	2,304%	$ 33.475.226,50	2,939%
4	$ 66.259.543,63	5,82%	$ 19.411.226,50	1,704%	$ 92.504.237,63	8,122%	$ 52.886.453,00	4,644%
5	$ 24.009.656,50	2,11%	$ 34.790.348,17	3,055%	$ 116.513.894,13	10,230%	$ 87.676.801,17	7,698%
6	$ 24.009.656,50	2,11%	$ 49.282.140,50	4,327%	$ 140.523.550,63	12,338%	$ 136.958.941,67	12,025%
7	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 29.777.940,83	2,615%	$ 158.326.630,13	13,902%	$ 166.736.882,50	14,640%
8	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 26.187.511,50	2,299%	$ 176.129.709,63	15,465%	$ 192.924.394,00	16,939%
9	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 67.457.911,50	5,923%	$ 193.932.789,13	17,028%	$ 260.382.305,50	22,862%
10	$ 17.803.079,50	1,56%	$ 44.704.089,50	3,925%	$ 211.735.868,63	18,591%	$ 305.086.395,00	26,787%
11	$ 44.751.552,80	3,93%	$ 49.072.223,50	4,309%	$ 256.487.421,43	22,520%	$ 354.158.618,50	31,096%
12	$ 33.798.686,30	2,97%	$ 49.072.224,00	4,309%	$ 290.286.107,73	25,488%	$ 403.230.842,50	35,405%
13	$ 36.051.029,30	3,17%	$ 43.852.383,50	3,850%	$ 326.337.137,03	28,653%	$ 447.083.226,00	39,255%
14	$ 36.051.029,30	3,17%	$ 60.307.786,50	5,295%	$ 362.388.166,33	31,819%	$ 507.391.012,50	44,550%
15	$ 26.948.473,30	2,37%	$ 81.813.437,50	7,183%	$ 389.336.639,63	34,185%	$ 589.204.450,00	51,734%
16	$ 26.948.473,30	2,37%	$ 98.170.003,50	8,620%	$ 416.285.112,93	36,551%	$ 687.374.453,50	60,353%
17	$ 41.519.791,05	3,65%	$ 35.787.400,25	3,142%	$ 457.804.903,98	40,197%	$ 723.161.853,75	63,496%
18	$ 86.076.575,18	7,56%	$ 71.912.194,25	6,314%	$ 543.881.479,15	47,754%	$ 795.074.048,00	69,810%
19	$ 112.931.813,93	9,92%	$ 74.383.032,25	6,531%	$ 656.813.293,08	57,670%	$ 869.457.080,25	76,341%
20	$ 112.931.813,93	9,92%	$ 83.527.844,25	7,334%	$ 769.745.107,00	67,586%	$ 952.984.924,50	83,7%
21	$ 115.101.830,54	10,11%	$ 61.421.546,00	5,393%	$ 884.846.937,54	77,692%	$ 1.014.406.470,50	89,068%
22	$ 115.101.830,54	10,11%	$ 59.366.743,33	5,213%	$ 999.948.768,08	87,798%	$ 1.073.773.213,83	94,280%
23	$ 96.718.253,79	8,49%	$ 34.535.946,33	3,032%	$ 1.096.667.021,88	96,290%	$ 1.108.309.160,17	97,313%
24	$ 42.249.887,13	3,71%	$ 30.607.748,33	2,687%	$ 1.138.916.909,00	100,000%	$ 1.138.916.908,50	100%
	$ 1.138.916.909,00	100%						

4.6. Balance presupuestal

VALOR CONTRATO INICIAL	$	1.480.593.651,00
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO	$	1.480.591.981,00
VALOR FACTURADO	$	1.480.591.981,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.480.591.981,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	1.670,00

4.7. Control de calidad en el concreto

Se comprende el seguimiento, aseguramiento y control de calidad en la ejecución de la obra; con el fin de garantizar el correcto proceso constructivo teniendo en cuenta los criterios de calidad, los parámetros de calidad, las especificaciones técnicas y las normativas vigentes para el periodo comprendido entre febrero y junio de 2024. Para el mes de septiembre

Por ello se realiza ensayos de resistencia a la compresión a 7,14 y 28 días de las siguientes estructuras:

- Concreto Zapatas 21 MPA
- Concreto Columnas 21 MPA
- Concreto Vigas 21 MPA
- Concreto de Placa en fundida de Metaldeck

Para el mes de septiembre se realiza fundida de concreto de 21 MPA mezclado en campo con malla electrosoldada para los andenes de Centro Vida, las demás actividades que se desarrollan durante el mes fueron las de acabados (pintura interior y exterior), tubería sanitarias y aguas lluvias, pisos, enchapes, campana cocina, eléctrico, voz y datos, suministro de puertas y ventanas en aluminio, lavaplatos de la cocina e instalación de tubería Novafort de 6". Se tiene un control de calidad de materiales consultado con el proveedor de cada material y verificando el trabajo de la mano de obra calificada.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DICOS SAS

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal de CONSTRUCTORAS DICO&S SAS, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra N.º 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita Caquetá

CERTIFICO:

Que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S como CONTRATISTA de las referidas obras, ha suministrado a la interventoría las siguientes planillas de pago del mes de febrero 2024, marzo 2024, abril 2024 mayo 2024, junio 2024, julio 2024 y septiembre 2024, ajustadas a los requerimientos del contrato de obra

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (10) días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Yo, CARLOS DARÍO CANO SANCHEZ, como representante Legal Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra No. 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente entre el 02 de febrero de 2024 al 30 de septiembre de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante acta de recibo final obra No.1, el cual en mi calidad de interventor certifico y apruebo el pago del acta n. 1- final por un valor $ 1.480.591.981,00, Mil cuatrocientos ochenta millones quinientos noventa y un mil novecientos ochenta y un peso MTCE.

(Acta de recibo final) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (10) días del mes de diciembre de 2024

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS

Carrera CR 4 N 13-40 – Barrio Centro
E – mail:dicoys sas@gmail.com
Teléfono: 3134629855
Florencia - Caquetá

CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Yo, CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, como representante Legal de Constructora DICO&S SAS, que a su cargo tiene la Interventoría sobre el contrato de obra No. 212-LICP-2023 de la Alcaldía Municipal de La Montañita.

CERTIFICO:

- Que SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS como contratista de la referida obra, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente del 02 de febrero de 2024 al 30 de septiembre de 2024, por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante acta de recibo final obra No.1 (Acta de recibo final) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones; sin embargo; se está evaluando la estabilidad y control de calidad de las obras ejecutadas con el fin de recibir a SATISFACCIÓN del que suscribe.

- Se tiene EVIDENCIA que la empresa SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS ha suministrado el equipo en el sitio de la obra en el periodo correspondiente del 02 de febrero de 2024 al 30 de septiembre de 2024, por lo tanto, se puede asegurar que son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los (10) días del mes de diciembre de 2024

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
Constructora DICO&S SAS
