

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
1		**ICBF_ESPACIO 1 (Piso 1)**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 2.062.621.017,40**	
2		ACTA DE INICIO	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
3		**LOGISTICA**	**6 días**	**mié 23/10/24**	**lun 28/10/24**		**$ 0,00**	
4		Visita tecnica	3 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2FC+1 día	$ 0,00	
5		ENTREGA DE INFORME VISITA	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	4FC+2 días	$ 0,00	
6		AFILIACIONES Y EXAMENES DE INGRESO	6 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	2FC+1 día	$ 0,00	
7		**PISO 1**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 812.654.472,59**	
8		**OBRAS PRELIMINARES**	**21 días**	**mié 30/10/24**	**jue 21/11/24**		**$ 11.400.827,78**	
9		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**21 días**	**mié 30/10/24**	**jue 21/11/24**		**$ 11.400.827,78**	
20		**RESANE ESTUCO Y PINTURA**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 35.592.220,79**	
21		**RESANE ESTUCO Y PINTURA**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 35.592.220,79**	
22		RESANE DE MUROS	8 días	jue 26/12/24	jue 2/01/25	221	$ 2.665.188,30	
23		ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	8 días	dom 5/01/25	dom 12/01/25	25	$ 6.830.163,90	
24		PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	6 días	lun 13/01/25	sáb 18/01/25	27CC	$ 3.936.970,99	
25		PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	10 días	jue 26/12/24	sáb 4/01/25	22CC	$ 14.916.508,78	
26		ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
27		VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	8 días	lun 13/01/25	lun 20/01/25	23	$ 7.243.388,82	
28		**INSTALACIONES ELÈCTRICAS Y RED DE DATOS**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 327.888.408,16**	
29		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 214.023.018,99**	
30		Retiro de instalaciones eléctricas y de cableado existentes	2 días	sáb 9/11/24	dom 10/11/24	15FC+1 día	$ 2.699.670,46	
31		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de sobreponer con marco 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, IP20 (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para c	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
32		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria led lineal de sobreponer 120x7.5cm con difusor opalizado 32w, 85/265v, IP20, 6500k (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para cone	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
33		Suministro e instalación a todo costo de luminaria tipo panel led redondo de 12w Luz Blanca 6500k 120/277V IP20 de sobreponer (Garantía mínima 1 año) certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, conectores de resorte y todos	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
34		Suministro e instalación a todo costo de interruptor sencillo con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye caja metálica tipo rawelt 5800, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plas	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	38	$ 1.111.586,90	
35		Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V con tierra, blanca, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	34	$ 4.096.321,04	
36		Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja Tierra Aislada, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectore	3 días	sáb 18/01/25	lun 20/01/25	35CC	$ 5.236.352,35	
37		Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #12awg certificado libre de halógenos 1fase #12awg + 1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas y de i	33 días	jue 12/12/24	lun 13/01/25	41CC+30 días	$ 84.766.089,18	
38		Suministro e instalación de cable en cobre #12awg certificado libre de halógenos (amarillo), para devuelto de interruptores en sistema de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	33 días	sáb 14/12/24	mié 15/01/25	37CC+2 días	$ 7.329.877,57	
39		Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	33 días	dom 15/12/24	jue 16/01/25	38CC+1 día	$ 1.925.073,66	
40		Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x20A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución normales, regulados)	2 días	dom 19/01/25	lun 20/01/25	50FC+1 día	$ 1.629.961,83	
41		Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	62 días	mar 12/11/24	dom 12/01/25	30	$ 17.839.788,40	
42		Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	14 días	lun 2/12/24	dom 15/12/24	41CC+20 días	$ 13.718.445,51	
43		Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	12 días	mié 1/01/25	dom 12/01/25	42FC+16 días	$ 16.791.473,38	
44		Suministro e instalación de tubería EMT de 1 1/2". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	4 días	dom 22/12/24	mié 25/12/24	41CC+40 días	$ 2.850.230,62	

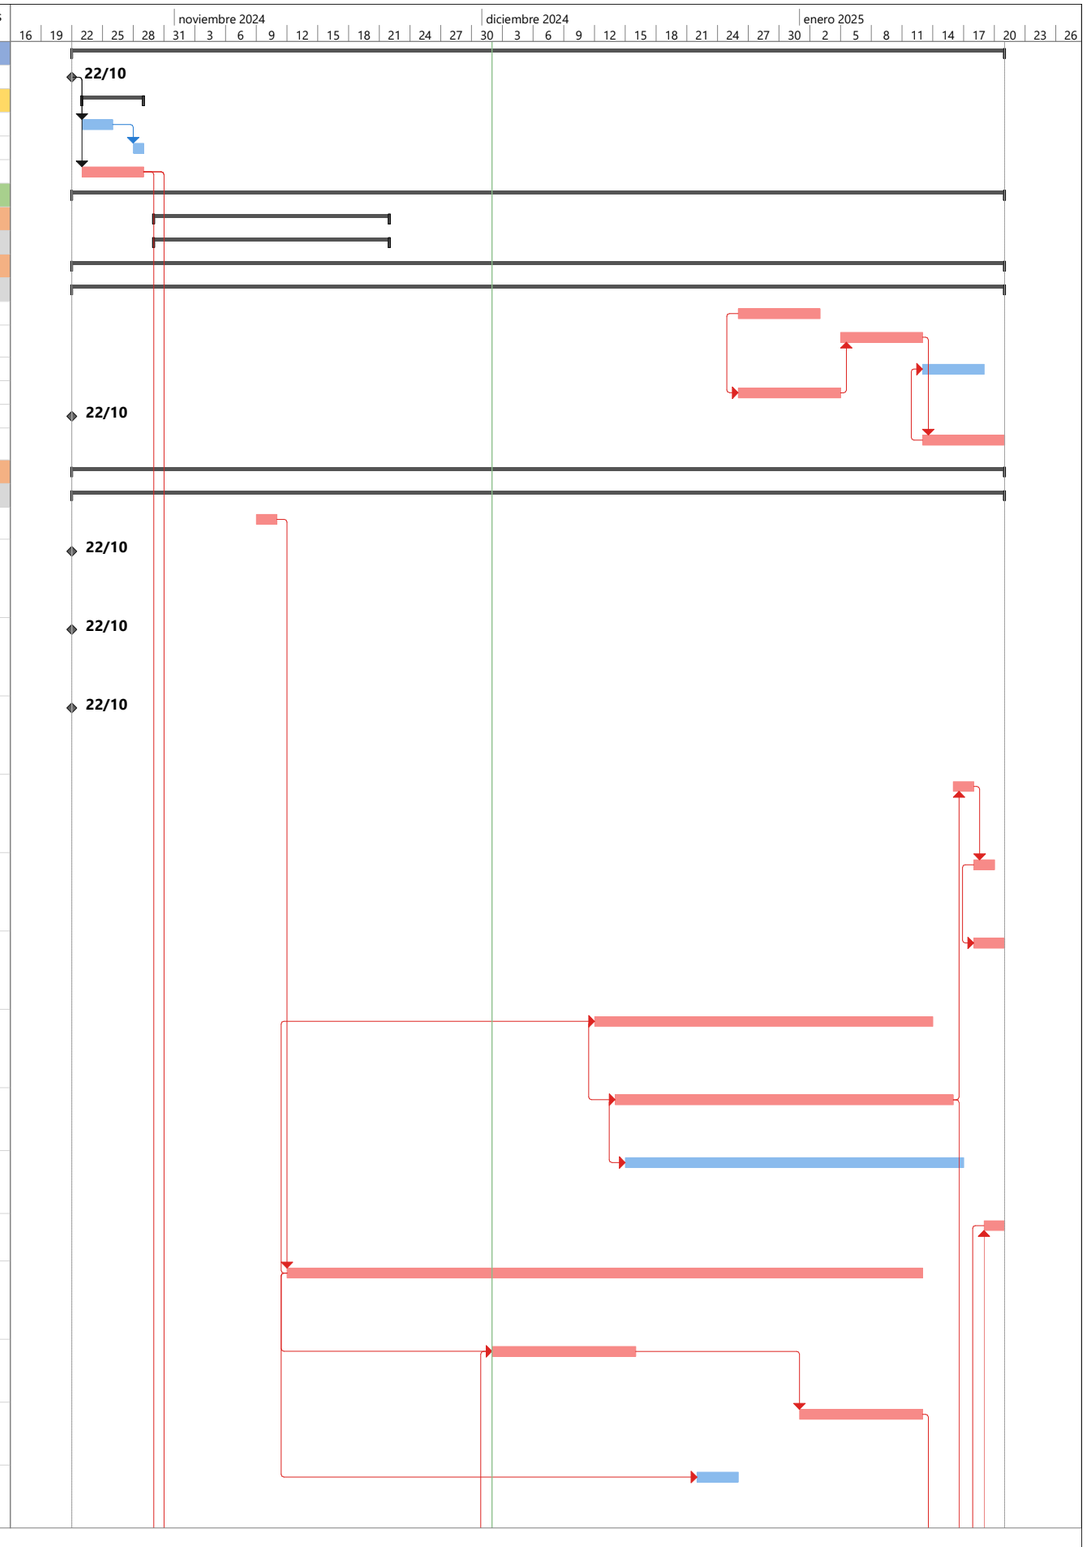

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
45		Suministro e instalación a todo costo de tubería PVC de 3/4". Incluye canalización por piso, resanes, terminales, uniones y demás accesorios para la instalación.	3 días	lun 2/12/24	mié 4/12/24	42CC	$ 1.380.301,96	
46		Suministro e instalación a todo costo de tubería PVC de 1". Incluye canalización por piso, resanes, terminales, uniones y demás accesorios para la instalación.	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	43	$ 448.412,79	
47		Suministro e instalación a todo costo de tubería PVC de 1 1/2". Incluye canalización por piso, resanes, terminales, uniones y demás accesorios para la instalación.	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
48		Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200 x 54mm certificada. Incluye soportería, acoples y accesorios.	55 días	sáb 23/11/24	jue 16/01/25	216CC-40 días	$ 31.853.651,94	
49		Suministro e instalación de troquel triple piramidal metálico blanco para canaleta 12 X 5cm.	4 días	mar 14/01/25	vie 17/01/25	58CC+1 día	$ 3.052.406,11	
50		Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 30 circuitos trifásico certificado con puerta y espacio para totalizador, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación.	3 días	mié 15/01/25	vie 17/01/25	46	$ 2.805.752,42	
51		Reubicación a todo costo de tablero eléctrico metálico de distribucion de 24 circuitos trifásico. Incluye traslado de protecciones y conexión a circuitos de iluminación, accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución iluminación	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	50	$ 1.174.071,69	
52		Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #4awg certificado libre de halógenos 3fases #4awg + 1neutro #4awg + 1tierra #6awg. Incluye bornas en cobre para cable #4 - 6awg, marcación, amarres y demás accesorios para la instal	4 días	jue 16/01/25	dom 19/01/25	38	$ 6.794.744,85	
53		Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #8awg certificado libre de halógenos 3fases #8awg + 1neutro #8awg + 1tierra #8awg. Incluye bornas en cobre para cable #8awg, marcación, amarres, y demás accesorios para la instalaci	3 días	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	52CC	$ 5.663.493,40	
54		Suministro e instalación de breaker totalizador industrial fijo 3 x 63 A 42KA para tablero regulado y tablero normal	1 día	dom 19/01/25	dom 19/01/25	40CC	$ 855.312,93	
55		**INSTALACION RED DE DATOS**	**88 días**	**mar 22/10/24**	**dom 19/01/25**		**$ 113.865.389,17**	
56		CANALETA METALICA DE 12X5 CM CON PINTURA ELECTROESTATICA - TRAMOS DE 2,4 M-ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO,LONGITUD DEL TRAMO 2.40 CM,ANCHO 4CM,PESO APROXIMADO 2 KG,DIVISION INTERNA,COLOR BLANCO.	6 días	sáb 11/01/25	jue 16/01/25	48FC-6 días	$ 7.168.993,45	
57		TROQUEL PARA TOMA DE DATOS FACEPLATE-ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	58	$ 2.779.697,20	
58		CABLE UTP CATEGORIA 6A - ROLLO DE 305 M CERTIFICADO-CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO LSZH, MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE.	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/25	56CC+2 días	$ 22.140.080,00	
59		HERRAJE DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A-HERRAJE DE 48 PUERTOS PARA JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	62	$ 4.095.165,80	
60		JACK RJ-45 METALICO CATEGORIA 6A CERTIFICADO BLINDADO PARA HERRAJE-JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	63CC	$ 4.329.929,35	
61		ORGANIZAOR HORIZONTAL DE 2U DE RACK-ORGANIZADOR HORIZONTAL DE DOS UNIDADES DE RACK	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	59CC	$ 400.280,97	
62		RACK ABIERTO DE 42U-RACK ABIERTO PISO 2 PARALES CAL. 14 COLD ROLLED, 1 BASE CALIBRE 14 COL ROLLED PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO O EQUIVALENTE- RACK ABIERTO DE 42U-RACK ABIERTO PISO 2 PARALES CAL. 14 COLD ROLLED, 1 BASE CALIBRE 14 COL ROLLED PINTURA E	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	216FC+2 días	$ 3.231.197,41	
63		TOMA DE DATOS - FACEPLATE SENCILLO-FACEPLATE RJ-45 CATEGORIA 6 COLOR BLANCO	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	57	$ 1.690.283,39	
64		TOMA DE DATOS - FACEPLATE DOBLE-FACEPLATE RJ-45 CATEGORIA 6 COLOR BLANCO	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	63CC	$ 1.984.604,27	
65		JACK RJ-45 METALICO CATEGORIA 6A CERTIFICADO BLINDADO PARA TOMA DE DATOS FACEPLATE-JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	60CC	$ 5.947.983,27	
66		PATCH CORD DE 2 METROS AZUL CATEGORIA 6A CERTIFICADO PARA RACK-PATCH CORD DE 1.5 M, COLOR AZUL, GRIS, ROJO PARA VOZ Y/O DATOS, CATEGORIA 6A BLINDADO, INCLUYE PROTECTOR, HECHOS EN FABRICA (MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE.).	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	65CC	$ 7.334.561,64	

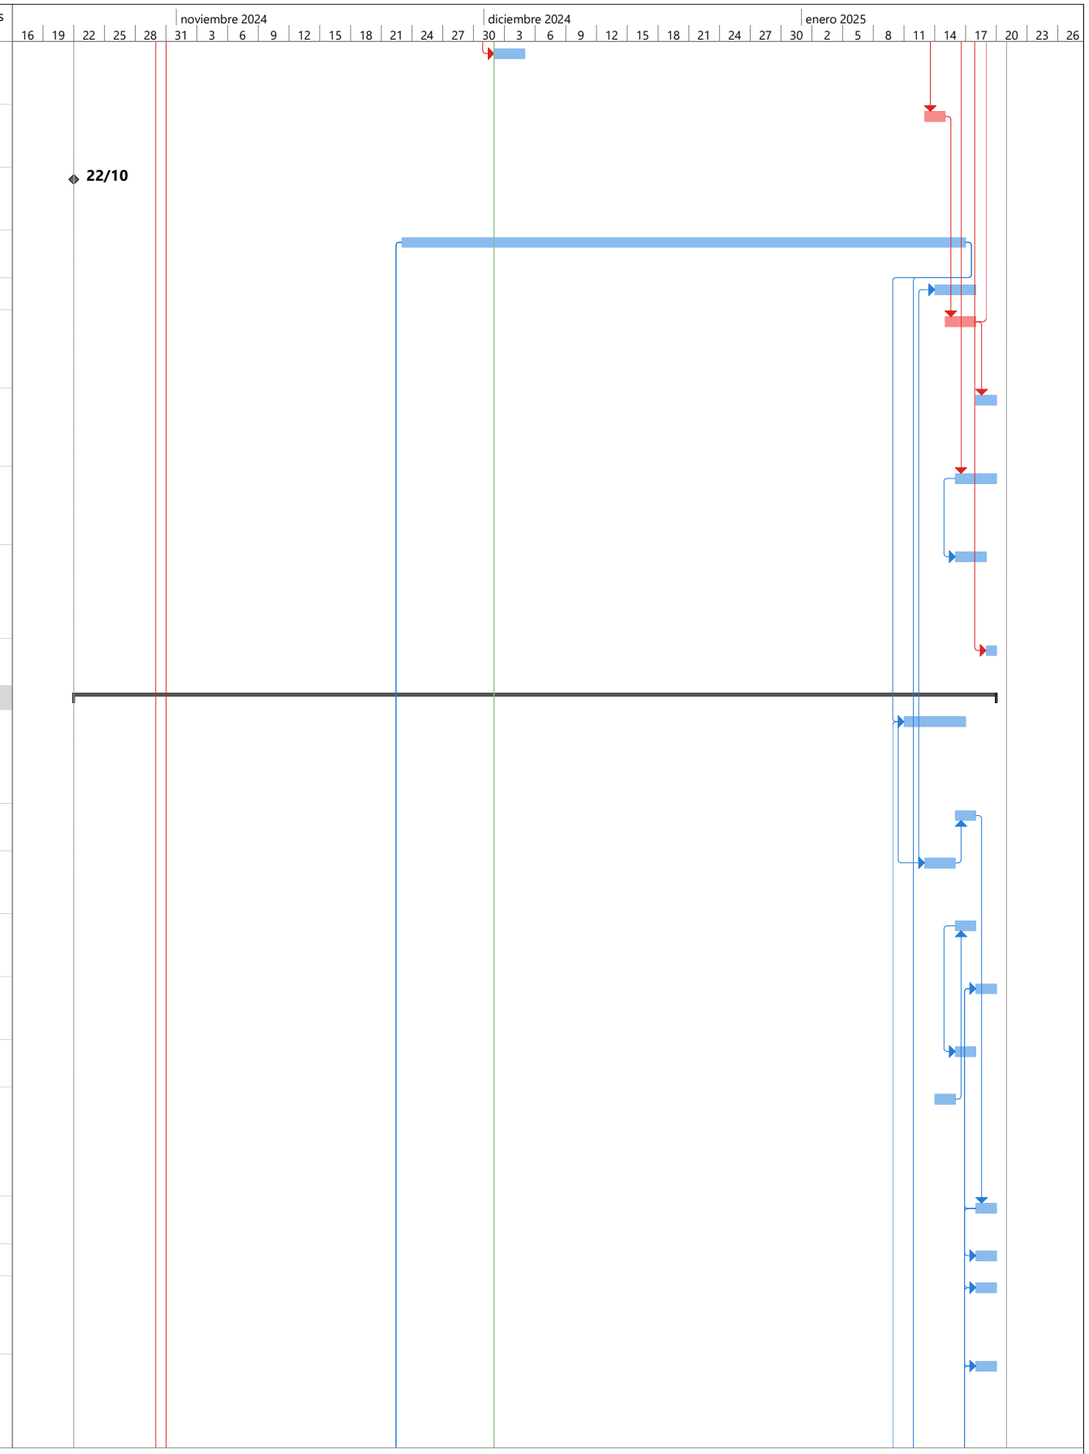

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea, Resumen, Hito inactivo, solo duración, solo el comienzo, Hito externo, División crítica
División, Resumen del proyecto, Resumen inactivo, Informe de resumen manual, solo fin, Fecha límite, Progreso
Hito, Tarea inactiva, Tarea manual, Resumen manual, Tareas externas, Tareas críticas, Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
67		PATCH CORD DE 3 METROS AZUL CATEGORIA 6A CERTIFICADO PARA PUESTOS DE TRABAJO- PATCH CORD DE 3 M, COLOR AZUL, GRIS, ROJO PARA VOZ Y/O DATOS, CATEGORIA 6A BLINDADO, INCLUYE PROTECTOR, HECHOS EN FABRICA (MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENT	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	66CC	$ 8.285.061,68	
68		MANO DE OBRA INSTALACION CANALETA, TENDIDO DE CABLE, ADECUACION DE PUNTOS DE RED CERTIFICADOS Y MARQUILLADOS- PONCHADO	9 días	sáb 11/01/25	dom 19/01/25	56CC	$ 34.611.993,30	
69		UPS trifásica 40 kVA 40 kW Alta Frecuencia	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
70		RACK 7' X 24"	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
71		SWITH 48 PUERTOS • 48 PUERTOS RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000BASE-T, FULL • DUPLEX, NON-BLOCKING, AUTO-MDIX, POE+ (IEEE 802.3AT) • 4 PUERTOS SFP+ LIBRES Y LICENCIADOS PARA INSTALAR MÓDULOS • SFP+ DE 1/10GB (SE DEBEN SUMINISTRAR 2 TRANSCEIVERS • SFP+ LC MUL	1 día	sáb 18/01/25	sáb 18/01/25	63CC	$ 9.865.557,44	
72		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 62.981.984,02**	
73		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**78 días**	**mar 22/10/24**	**jue 9/01/25**		**$ 6.477.436,27**	
83		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**18 días**	**jue 2/01/25**	**dom 19/01/25**		**$ 36.956.743,30**	
92		**ESPEJOS Y ACABADOS DE MUROS**	**89 días**	**mar 22/10/24**	**lun 20/01/25**		**$ 19.547.804,45**	
100		**ACABADOS**	**85 días**	**mar 22/10/24**	**jue 16/01/25**		**$ 368.884.468,80**	
101		**PISOS**	**23 días**	**mié 25/12/24**	**jue 16/01/25**		**$ 120.707.270,85**	
102		AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	20 días	mié 25/12/24	lun 13/01/25	127FC+15 días	$ 43.910.044,18	
103		PISO VINILO EN ROLLO E= 3MM - ADHESIVO PARA PISO VINILO	10 días	mar 7/01/25	jue 16/01/25	102CC+13 días	$ 59.395.851,00	
104		GUARDA ESCOBA EN VINILO	6 días	sáb 11/01/25	jue 16/01/25	103FF	$ 11.894.217,43	
105		GUARDAESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE PEGACOR Y BOQUILLA)	2 días	mié 1/01/25	jue 2/01/25	106FC-2 días	$ 1.123.628,72	
106		TABLETA ANTIDESLIZANTE (COLOR NEGRO) INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA PAR BAÑOS	6 días	sáb 28/12/24	jue 2/01/25	102CC+3 días	$ 4.383.529,52	
107		**CIELOS RASOS**	**39 días**	**lun 9/12/24**	**jue 16/01/25**		**$ 74.054.776,71**	
108		CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	15 días	jue 2/01/25	jue 16/01/25	48CC+40 días	$ 56.631.033,27	
109		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	30 días	lun 9/12/24	mar 7/01/25	108CC-24 días	$ 14.410.998,54	
110		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	15 días	mar 24/12/24	mar 7/01/25	109CC+15 días	$ 3.012.744,90	
111		**CARPINTERÍA**	**85 días**	**mar 22/10/24**	**jue 16/01/25**		**$ 174.122.421,24**	
112		SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
113		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/25	180FC-2 días	$ 19.749.268,74	
114		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE SANBLASTING Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y RIELES ACCESORIOS PARA USO DE PUERTA CORREDIZA	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/25	113FF	$ 151.612.759,31	
115		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	113CC+1 día	$ 2.570.390,93	
116		HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
117		CERRADURA DE POMO	1 día	jue 16/01/25	jue 16/01/25	115CC+2 días	$ 190.002,26	
118		BARANDAYPASAMANOSENTUBO2 " GALVANIZADO PARACIRCULACIONES EXTERIORES	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
119		**ASEO**	**1 día**	**lun 20/01/25**	**lun 20/01/25**		**$ 5.906.563,04**	
120		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**lun 20/01/25**	**lun 20/01/25**		**$ 5.906.563,04**	
121		ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	104FC+3 días	$ 5.906.563,04	
122		**PISO 4**	**88 días**	**mar 22/10/24**	**dom 19/01/25**		**$ 1.034.077.936,10**	
123		**OBRAS PRELIMINARES**	**74 días**	**mar 22/10/24**	**dom 5/01/25**		**$ 59.917.644,15**	
124		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**74 días**	**mar 22/10/24**	**dom 5/01/25**		**$ 59.917.644,15**	
125		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	3 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	6FC+1 día	$ 2.414.374,07	
126		DESMONTE DIVISIÓN CUALQUIER MATERIAL	10 días	jue 31/10/24	dom 10/11/24	6FC+2 días	$ 5.851.671,39	
127		DEMILICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	8 días	lun 2/12/24	lun 9/12/24	131FC+21 días	$ 13.043.604,70	
128		DEMILICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	

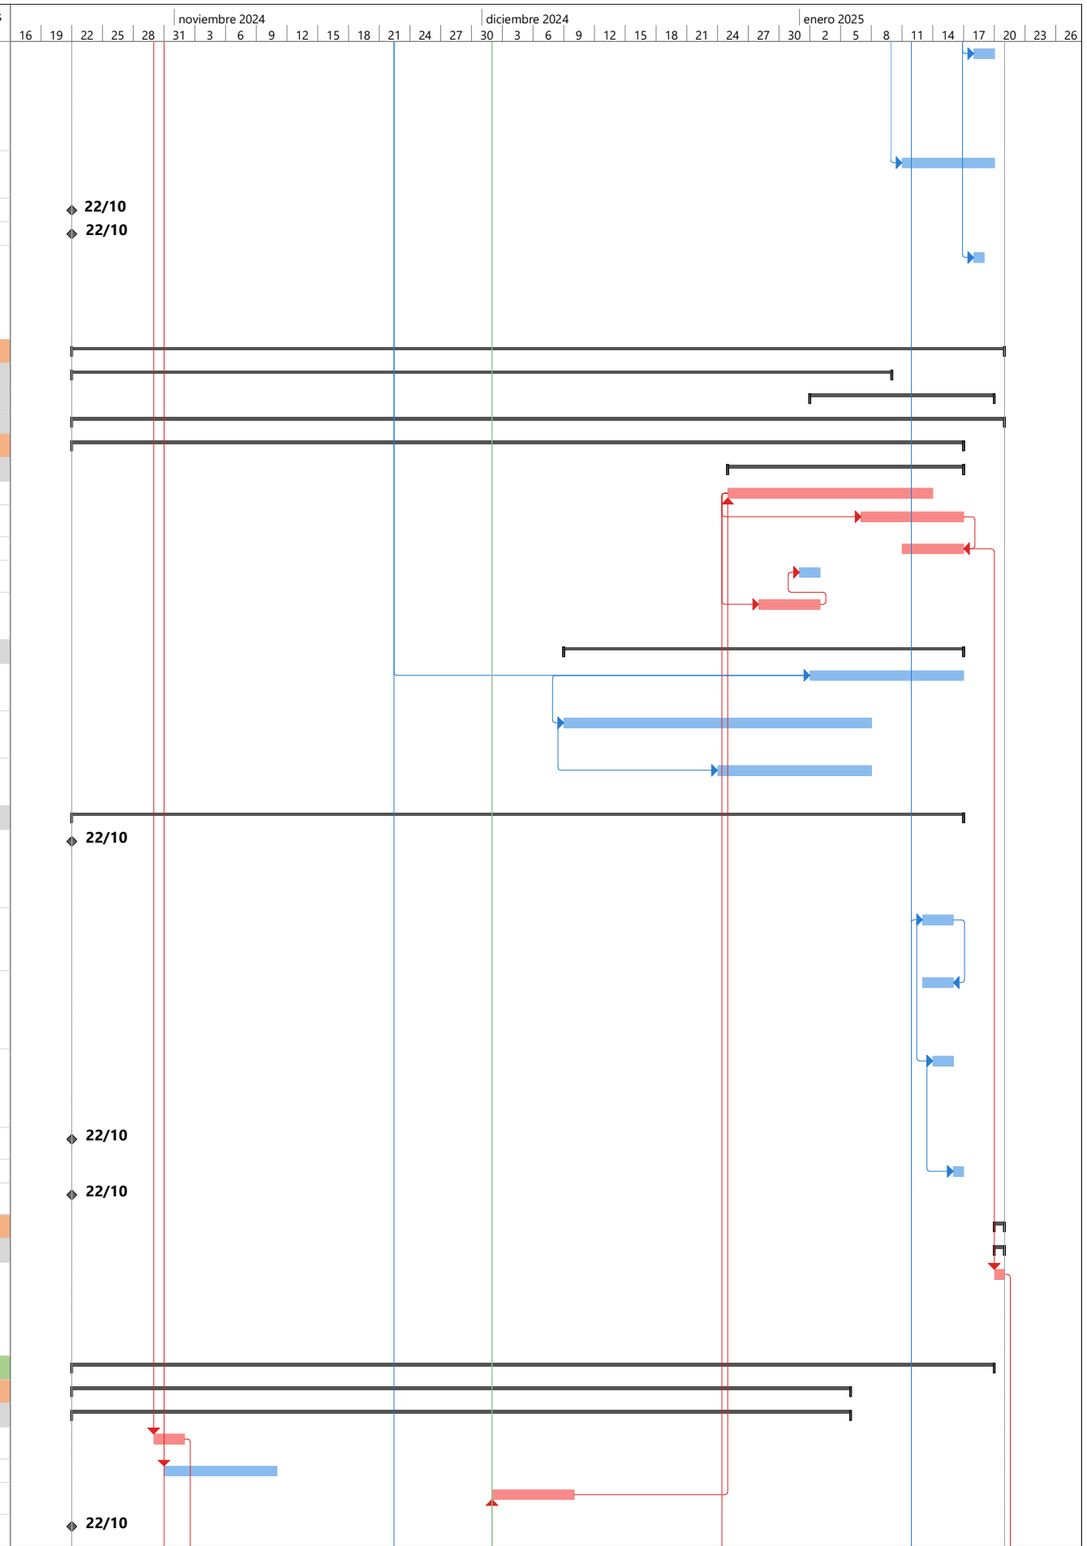

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
129		DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO	4 días	sáb 2/11/24	mié 6/11/24	125	$ 485.619,30	
130		DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
131		DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÌA	4 días	mié 6/11/24	sáb 9/11/24	129FC-1 día	$ 10.265.567,80	
132		DEMOLICION EN MURO FALSO	2 días	sáb 2/11/24	dom 3/11/24	129CC	$ 1.857.256,28	
133		DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	6 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24	129	$ 4.077.601,18	
134		DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	3 días	jue 7/11/24	sáb 9/11/24	129	$ 2.208.564,38	
135		DESMONTE DE CIELO FALSO EN CUALQUIE MATERIAL	5 días	sáb 9/11/24	jue 14/11/24	134FC-1 día	$ 219.998,00	
136		DESMONTE E INTALACION DE REPISAS Y ESTANTERIA	4 días	jue 31/10/24	dom 3/11/24	6FC+2 días	$ 889.440,90	
137		DESMONTE DE ESTACION DE TRABAJO	7 días	mar 5/11/24	mar 12/11/24	136	$ 5.057.586,44	
138		DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	2 días	dom 10/11/24	mar 12/11/24	134	$ 6.112.420,34	
139		RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	60 días	mié 6/11/24	dom 5/01/25	131CC	$ 6.617.954,28	
140		DESMONTE DE PUNTO HIDRAULICO	1 día	mar 19/11/24	mar 19/11/24	131FC+8 días	$ 166.812,30	
141		DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	2 días	lun 25/11/24	mar 26/11/24	140FC+5 días	$ 265.041,13	
142		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	2 días	lun 2/12/24	mar 3/12/24	141FC+5 días	$ 290.664,72	
143		DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	142FC+5 días	$ 93.466,94	
144		**RESANE ESTUCO Y PINTURA**	**40 días**	**mié 11/12/24**	**dom 19/01/25**		**$ 36.602.884,39**	
145		**RESANE ESTUCO Y PINTURA**	**40 días**	**mié 11/12/24**	**dom 19/01/25**		**$ 36.602.884,39**	
146		RESANE DE MUROS	10 días	mié 11/12/24	vie 20/12/24	131FC+30 días	$ 8.350.923,34	
147		ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	20 días	lun 23/12/24	sáb 11/01/25	146FC+2 días	$ 9.790.891,80	
148		VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	18 días	jue 2/01/25	dom 19/01/25	147CC+10 días	$ 18.461.069,25	
149		**INSTALACIONES ELÈCTRICAS Y RED DE DATOS**	**88 días**	**mar 22/10/24**	**dom 19/01/25**		**$ 576.018.537,57**	
150		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**87 días**	**mar 22/10/24**	**sáb 18/01/25**		**$ 369.311.546,25**	
151		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de sobreponer con marco 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, IP20 (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para c	4 días	mar 14/01/25	vie 17/01/25	148CC+12 días	$ 46.100.247,23	
152		Suministro e instalación a todo costo de interruptor sencillo con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye caja metálica tipo rawelt 5800, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plas	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	151CC+1 día	$ 411.698,85	
153		Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V con tierra, blanca, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	152FC-2 días	$ 7.680.601,95	
154		Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja Tierra Aislada, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectore	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	153FC-4 días	$ 9.818.160,66	
155		Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 1fase #12awg + 1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salid	20 días	mié 25/12/24	lun 13/01/25	152FC-25 días	$ 88.516.303,90	
156		Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil, bandeja portacable y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	20 días	mié 25/12/24	lun 13/01/25	155CC	$ 3.642.906,42	
157		Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x20A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución normales, regulados y de iluminación)	3 días	dom 12/01/25	mar 14/01/25	168CC-5 días	$ 3.221.115,05	
158		Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	30 días	vie 6/12/24	sáb 4/01/25	134FC+25 días	$ 86.321.556,75	
159		Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	30 días	sáb 14/12/24	dom 12/01/25	158CC+8 días	$ 74.827.884,60	
160		Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye cajas de paso tipo rawelt con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación, y demás accesorios para la instalación.	10 días	sáb 14/12/24	lun 23/12/24	159CC	$ 9.158.985,48	
161		Suministro e instalación a todo costo de canaleta metálica de 12 X 5cm blanca con tapa, en lámina Cold Rolled calibre 24 con división, certificada. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	16 días	mar 31/12/24	mié 15/01/25	158CC+25 días	$ 24.261.084,43	
162		Suministro e instalación a todo costo de bandeja portacable 400mm X 100mm galvanizado - pesado 16-18 peldaños certificada con tapa galvanizada. Incluye soportería, acoples y accesorios.	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
163		Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 400 x 54mm certificada. Incluye soportería, acoples y accesorios.	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	

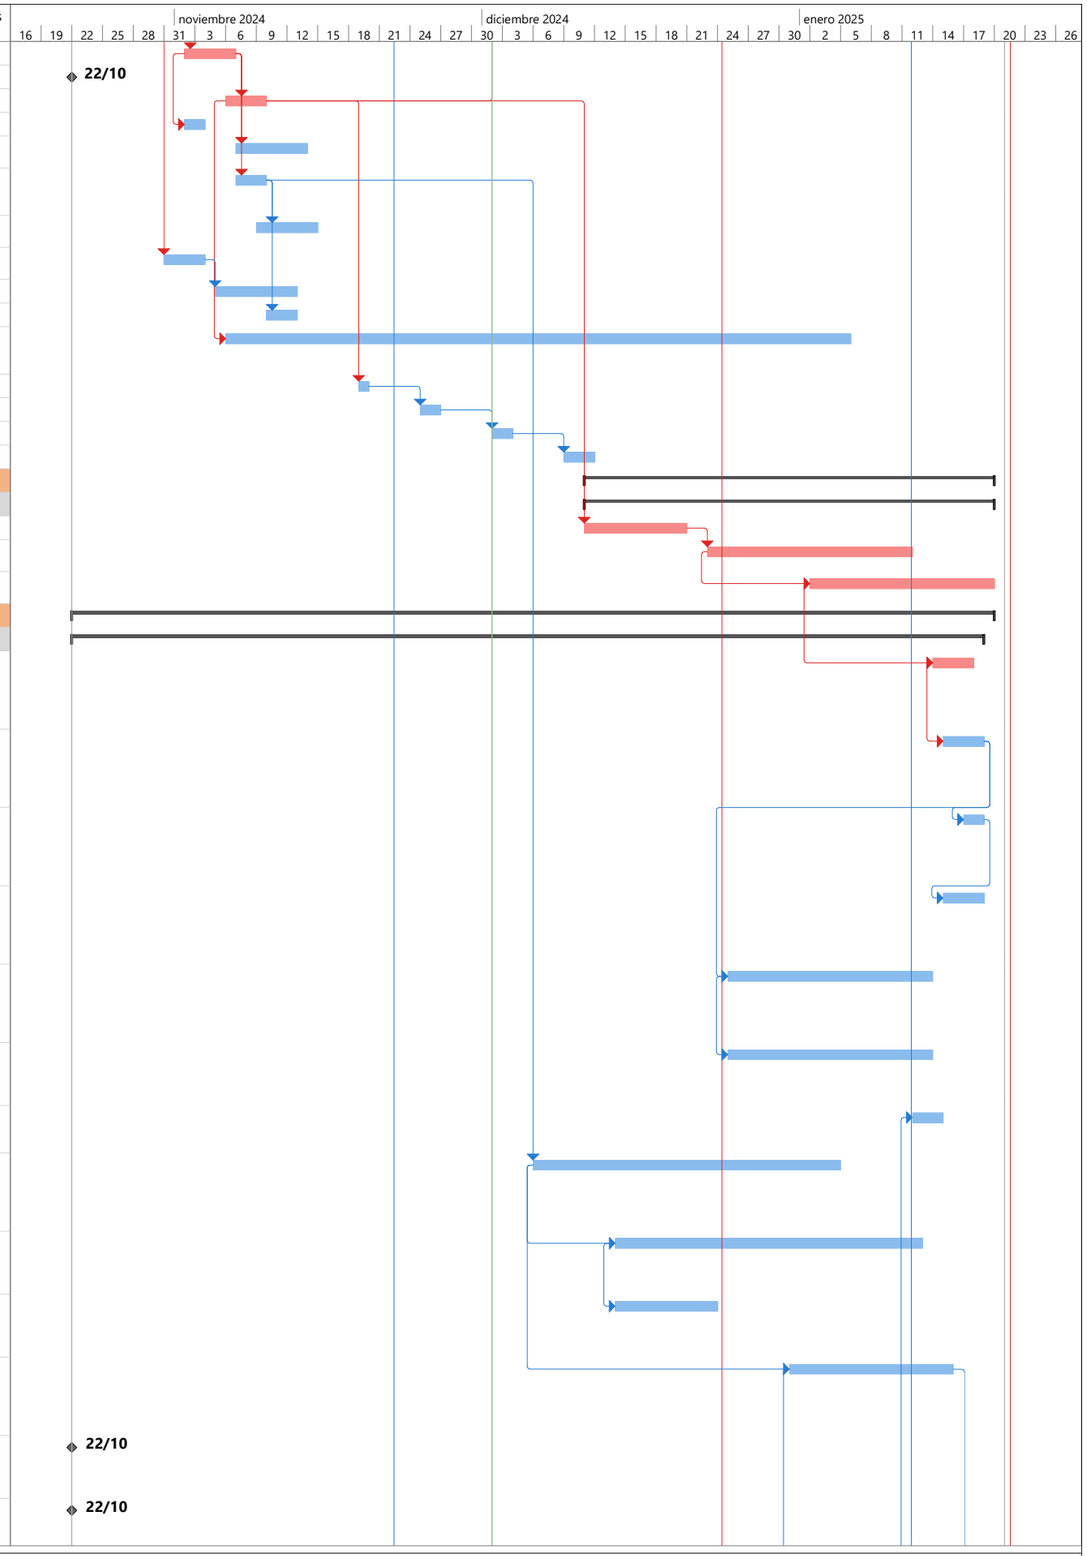

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
164		Suministro e instalación de troquel triple piramidal metálico blanco para canaleta 12 X 5cm.	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	161FF	$ 5.723.261,46	
165		Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 36 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribuci	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	168FF	$ 1.169.279,32	
166		Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 12 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribuci	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
167		Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #6awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #6awg + 1neutro #6awg + 1tierra #8awg, con tubería EMT de 1". Incluye bornas en cobre para cable #6 - 8awg,	4 días	lun 13/01/25	jue 16/01/25	48FC-4 días	$ 8.231.920,41	
168		Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #8awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #8awg + 1neutro #8awg + 1tierra #8awg, con tubería EMT de 1". Incluye bornas en cobre para cable #8awg, marc	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	167	$ 226.539,74	
169		**INSTALACION RED DE DATOS**	**64 días**	**dom 17/11/24**	**dom 19/01/25**		**$ 206.706.991,32**	
170		CANALETA METALICA DE 12X5 CM CON PINTURA ELECTROESTATICA - TRAMOS DE 2,4 M-ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO,LONGITUD DEL TRAMO 2.40 CM,ANCHO 4CM,PESO APROXIMADO 2 KG,DIVISION INTERNA,COLOR BLANCO.	15 días	jue 2/01/25	jue 16/01/25	161CC+2 días	$ 14.194.607,03	
171		TROQUEL PARA TOMA DE DATOS FACEPLATE-ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO	5 días	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	164FF	$ 5.211.932,25	
172		CABLE UTP CATEGORIA 6A - ROLLO DE 305 M CERTIFICADO-CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO LSZH, MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE.	3 días	vie 17/01/25	dom 19/01/25	170	$ 39.788.465,88	
173		HERRAJE DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A-HERRAJE DE 48 PUERTOS PARA JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	172CC	$ 6.825.276,33	
174		JACK RJ-45 METALICO CATEGORIA 6A CERTIFICADO BLINDADO PARA HERRAJE-JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	173CC	$ 8.118.617,54	
175		ORGANIZAOR HORIZONTAL DE 2U DE RACK-ORGANIZADOR HORIZONTAL DE DOS UNIDADES DE RACK	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	174CC	$ 667.134,95	
176		RACK ABIERTO DE 42U-RACK ABIERTO PISO 2 PARALES CAL. 14 COLD ROLLED, 1 BASE CALIBRE 14 COL ROLLED PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO O EQUIVALENTE	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	175CC	$ 3.231.197,41	
177		TOMA DE DATOS - FACEPLATE SENCILLO-FACEPLATE RJ-45 CATEGORIA 6 COLOR BLANCO	2 días	sáb 11/01/25	dom 12/01/25	171CC	$ 3.169.281,36	
178		TOMA DE DATOS - FACEPLATE DOBLE-FACEPLATE RJ-45 CATEGORIA 6 COLOR BLANCO	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	177CC+2 días	$ 3.721.133,01	
179		JACK RJ-45 METALICO CATEGORIA 6A CERTIFICADO BLINDADO PARA TOMA DE DATOS FACEPLATE-JACK RJ45 DE INCRUSTAR CATEGORIA 6A MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	178CC	$ 11.152.468,64	
180		PATCH CORD DE 2 METROS AZUL CATEGORIA 6A CERTIFICADO PARA RACK-PATCH CORD DE 1.5 M, COLOR AZUL, GRIS, ROJO PARA VOZ Y/O DATOS, CATEGORIA 6A BLINDADO, INCLUYE PROTECTOR, HECHOS EN FABRICA (MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENTE.).	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	179CC	$ 13.752.303,08	
181		PATCH CORD DE 3 METROS AZUL CATEGORIA 6A CERTIFICADO PARA PUESTOS DE TRABAJO- PATCH CORD DE 3 M, COLOR AZUL, GRIS, ROJO PARA VOZ Y/O DATOS, CATEGORIA 6A BLINDADO, INCLUYE PROTECTOR, HECHOS EN FABRICA (MARCA PANDUIT, COMMSCOPE, SIEMON, LEVITON O EQUIVALENT	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	180CC	$ 15.534.490,65	
182		MANO DE OBRA INSTALACION CANALETA, TENDIDO DE CABLE, ADECUACION DE PUNTOS DE RED CERTIFICADOS Y MARQUILLADOS- PONCHADO	27 días	dom 17/11/24	vie 13/12/24		$ 64.897.487,45	
183		SWITH 48 PUERTOS • 48 PUERTOS RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000BASE-T, FULL • DUPLEX, NON-BLOCKING, AUTO-MDIX, POE+ (IEEE 802.3AT) • 4 PUERTOS SFP+ LIBRES Y LICENCIADOS PARA INSTALAR MÓDULOS • SFP+ DE 1/10GB (SE DEBEN SUMINISTRAR 2 TRANSCEIVERS • SFP+ LC MUL	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/25	181CC	$ 16.442.595,74	
184		**PISOS**	**10 días**	**mar 7/01/25**	**jue 16/01/25**		**$ 108.125.576,77**	
185		PISO VINILO EN ROLLO E= 3MM - ADHESIVO PARA PISO VINILO	10 días	mar 7/01/25	jue 16/01/25	102CC+13 días	$ 91.963.138,58	
186		GUARDA ESCOBA EN VINILO	6 días	sáb 11/01/25	jue 16/01/25	185CC+4 días	$ 16.162.438,19	
187		**CIELOS RASOS**	**4 días**	**dom 12/01/25**	**mié 15/01/25**		**$ 803.918,49**	
188		CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	4 días	dom 12/01/25	mié 15/01/25	48CC+50 días	$ 803.918,49	

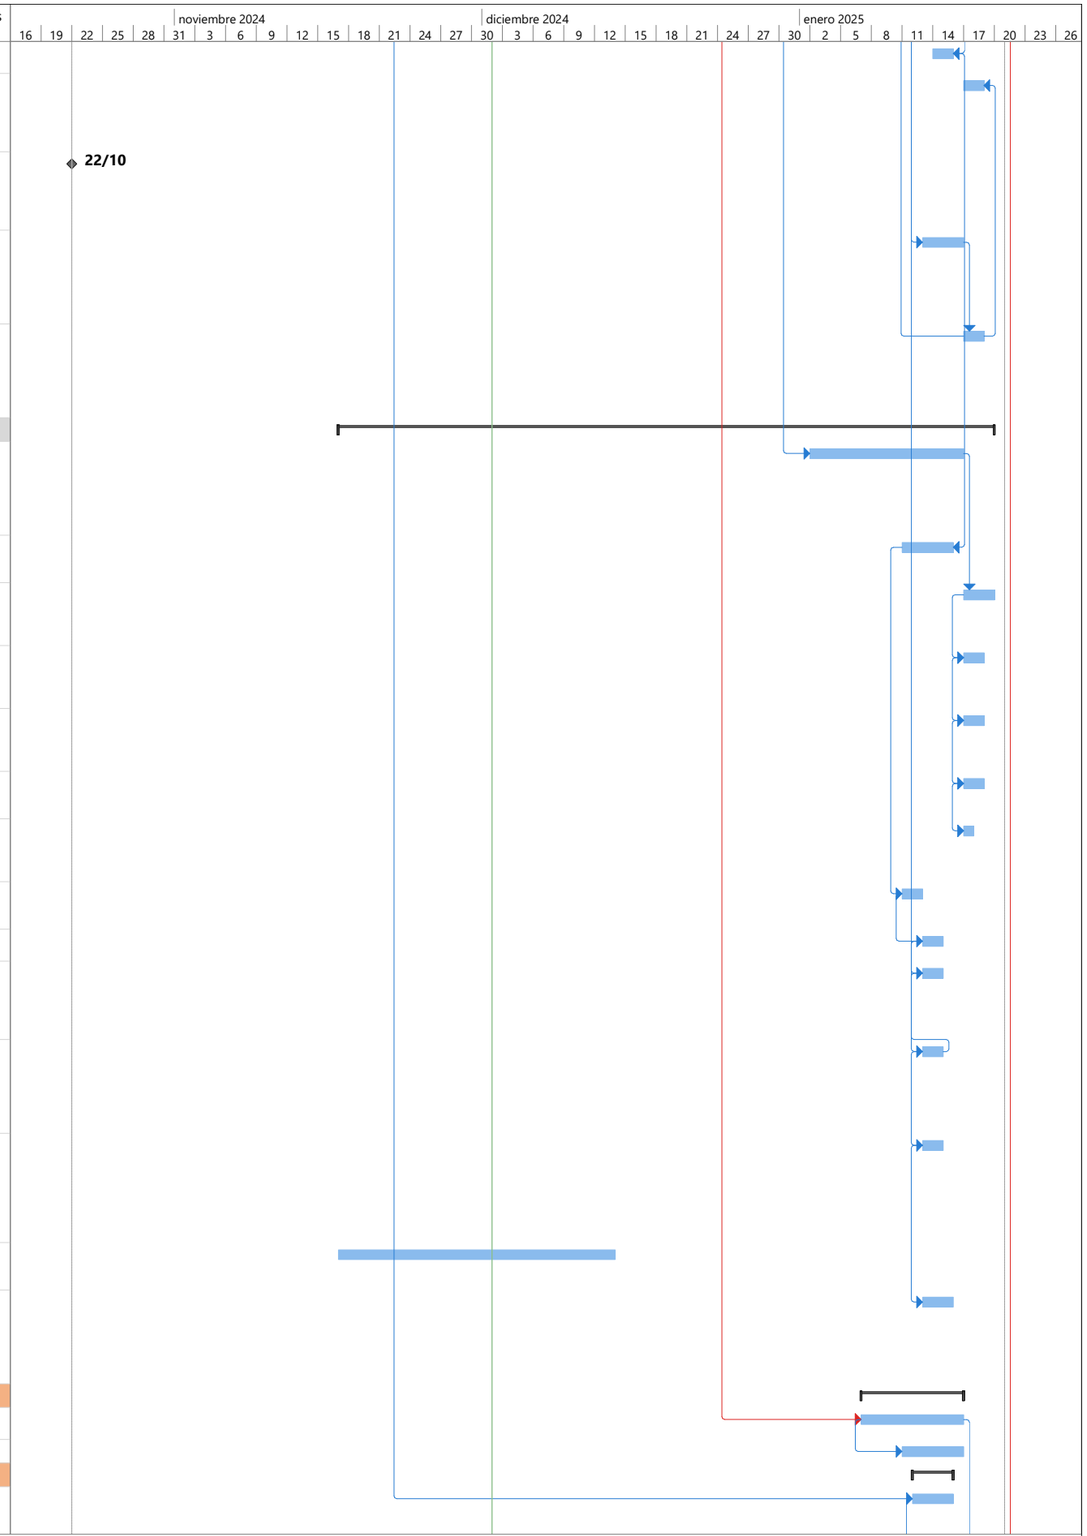

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nombres de los recursos
189			**CARPINTERÍA**	**88 días**	**mar 22/10/24**	**dom 19/01/25**		**$ 244.014.961,29**	
190			VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24		$ 0,00	
191			VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM	3 días	vie 17/01/25	dom 19/01/25	192CC+2 días	$ 119.592.336,63	
192			SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	188CC+3 días	$ 22.006.328,02	
193			ACCESORIOS EN ACERADO PARA INSTALCIONES EN VIDRIO TEMPLADO	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	192CC	$ 2.420.834,94	
194			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E=10MM	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	193CC	$ 99.995.461,70	
195			**ASEO**	**2 días**	**vie 17/01/25**	**sáb 18/01/25**		**$ 8.594.413,44**	
196			**ASEO GENERAL**	**2 días**	**vie 17/01/25**	**sáb 18/01/25**		**$ 8.594.413,44**	
197			ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA	2 días	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	185	$ 8.594.413,44	
198			**ITEMS NO PREVISTO**	**76 días**	**mar 5/11/24**	**lun 20/01/25**		**$ 215.888.608,71**	
226			FINDE OBRA	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	121;197	$ 0,00	

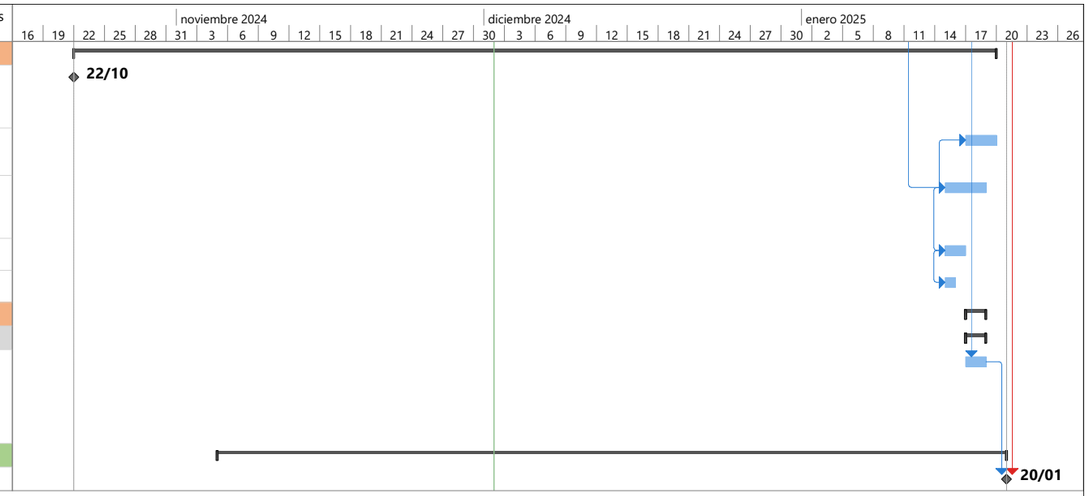

Proyecto: Esp1_ICBF_10102024
Fecha: lun 2/12/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
