	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	6
		Vigencia	29/07/24

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	8/12/24	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/11/24	**AL:**	30/11/24
CONTRATO Nº	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	**CONTRATISTA**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.				
FECHA DE INICIO	29/07/24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/12/24		
VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024. EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 3968280-1 DE SURAMERICANA Y LA DE RCE ES 0971121-9 DE SURAMERICANA, EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024. EL DÍA 02/08/2024 SE REALIZA OTROSÍ ACLARATORIO, POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA ENCABEZADO, VIGENCIA FISCAL Y FECHA EN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL. EL DÍA 27/08/2024 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER CORTE DE FACTURACIÓN Y SE AJUSTA LOS PAC DE ACUERDO A DIRECTRICES DE DIFIN EN PRIMER Y SEGUNDO CORTE DE EJECUCIÓN, EL DÍA 14/11/2024 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN EN LOS CORTES DE OBRA PARA EL SEGUNDO Y TERCER CORTE. EL DÍA 20/11/2024 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA SESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS PARA LA CANCELACIÓN DEL SEGUNDO CORTE PAC DICIEMBRE Y/O CXP A FAVOR DE UN TERCERO (ENDOSO)

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Porcelanato	900 m2	Cortadora enchape		MAESTRO	1	100	100	NO	El contratista no cumplió con el personal minimo requerido, tambien este incumplimiento esta registrado en la bitacora de obra.
		Pintura	6 cuñetes	Pulidora		Auxiliar Ingenieria	1	100	100	NO	
		Masilla	4 cuñetes	Herramienta menor		Enchapador	2	100	100	NO	
		Enchape piso	100			Ayudantes	1	100	100	NO	
		Enchape pared	200			Residente de obra	1	100	100	SI	
		Rodillos , brochas, espatulas, cintas	8			SISO	1	100	100	SI	
						TOTAL	**7**				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	56,34%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 14	6,60%	**56,34%**	**82,03%**	**-25,69%**
Semana 15	6,30%			
Semana 16	5,00%			
Semana 17	5,13%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA








AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**82,03%**
EJECUTADO		**56,34%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**93,28%**
	EJECUTADO		**8,70%**
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**60,00%**
	EJECUTADO		**0,15%**
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**85,51%**
	EJECUTADO		**0,32%**
5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6. CIELO RASO	PROGRAMADO		**86,54%**
	EJECUTADO		**3,70%**
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**87,01%**
	EJECUTADO		**15,65%**

8. PINTURA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	80,00%
	EJECUTADO		7,20%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	86,11%
	EJECUTADO		6,33%
10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	88,71%
	EJECUTADO		3,54%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	90,63%
	EJECUTADO		6,82%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	30,76%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		3,46%
14. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	86,49%
	EJECUTADO		0,47%


5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	135	125	10
Proyección	170	125	45

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
125	-35	14/01/25

6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

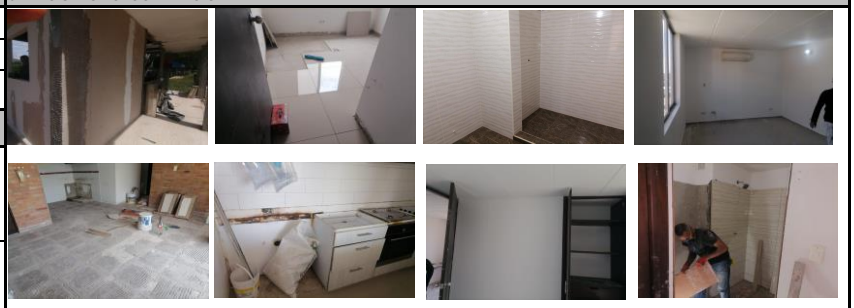

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas en el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre fueron:
1. Demolición de enchapes
2. Enchape piso en porcelanato
3.Instalacion vinilo en muros.
4. Instalación cielo raso.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	SI	X		Realizar un plan de contingencia para disminuir el atraso
ESTRUCTURA	SI	X		
MAMPOSTERIA	SI	X		
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	X		
CIELO RASO	SI	X		
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	SI	X		
PINTURA	SI	X		
CAROINTERIA EN MADERA	SI	X		
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	SI	X		
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	SI	X		
CARPINTERIA METALICA	SI	X		
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	SI	X		

OBSERVACIONES: Se le recomienda al contratista realizar un plan de contingencia y aumentar los frentes de trabajo para disminuir el atraso, de lo contrario el contratista no cumplirá con el plazo del contrato.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 966.599.939,40	$ 966.599.939,40	$ 544.553.407,86	56,34%	$ 422.046.531,54	43,66%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 966.599.939,40	$ 966.599.939,40				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 0,00	El pago se realizó el día 07-11-2024, según Orden de Pago No. 414801824 del 05-11-2024
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 0,00	Se tramitó segundo pago por valor de $151.829.069,15.
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 0,00**	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA PEERSONAL VINCULADO AL CONTRATO	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACIONESTUDIOS DE SEGURIDAD	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato está en un porcentaje de avance efectivo en obra del 56,34% y un programa del 82,03% según reprogramación y flujo de inversión presentado el día 26 de noviembre de 2024.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el periodo se reportaron lluvias prologadas, los trabajos a la interperie como fue cubierta de bomberos y garitas se vieron afedctados por las lluvias y os vientos para los trabajos en alturas.

ELABORO:	Vo. Bo.:
MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	**TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ** Gerente Proyecto (E) Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO








	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-092363-AG	Lugar y Fecha	ESALO - ESINS,08-11-2024

Asunto	Comité de obra 11		
Oficina Productora	ESALO - ESINS		
Hora Inicio	11:00	**Hora Finalización**	12:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:
Verificación de novedades principales del contrato

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, el señorTOMAS CABRERA Residente, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- La Gerencia del Proyecto hace un breve resumen del contrato, objeto MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, valor $966.599.939,40, fecha d einicio 29 de julio de 2024, plazo de ejecución 10 de diciembre.
- Porcentaje en tiempo de jecucion, han transcurrido 102 dias de los 135, reflejado en un 75%.
- Porcentaje de avance en ejecución de 33%
- Actividades ejecutadas se van a intervenir una totalidad de 17 apartamentos externos 08 en Torres de Leticia, 07 en Flor Amarillo y 02 en Edificio Luna.
- Se entregaron los siguientes apartamentos: Flor amarrillo Torre 2-208 y Torre 2-405
- Se terminaron las oficinas del ESDEB.
- Se están interviniendo los siguientes apartamentos:
- Torres de Leticia Torre 3-503, se entregó el inmueble el 16 de septiembre y a la fecha no lo han entregado, se cambió enchape de piso, cielo raso.
- Torres de Leticia Torre 2-502, se entregó el inmueble el 23 de septiembre y a la fecha no lo han entregado, se cambió enchape de piso, cielo raso.

FAC-S-2024-092363-AG

- Flor amarillo Torre 2-204, se entregó el inmueble el 01 de octubre y a la fecha no lo han entregado, se cambiaron los pisos y los enchapes de baños
- Flor amarillo Torre 2-708, se entregó el inmueble el 19 de septiembre y a la fecha no lo han entregado, se cambiaron los pisos y los enchapes de baños.

0 **ACTIVIDADES FALTANTES EN APARTAMENTOS:**

- En los apartamentos que se están interviniendo faltan las siguientes actividades:
- Torres de Leticia Torre 3-503, Enchapes de baños, aparatos sanitarios, cocinas, divisiones de baño, pintura 01 mano.
- Torres de Leticia Torre 2-502, Enchapes de baños, aparatos sanitarios, cocinas, divisiones de baño, pintura 01 mano.
- Flor amarillo Torre 2-204, Cocinas, divisiones de baño, pintura 01 mano.
- Flor amarillo Torre 2-708, Cocinas, divisiones de baño, pintura 01 mano.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL TERCER MODIFICATORIO:

- Mínimo 4 cuadrillas
- material para inicio de ejecución
- plan choque de trabajo
- 65% de cumplimiento al 12 de noviembre.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITE DE OBRA SEMANAL:

- Estudios de seguridad del nuevo personal.
- entrega de mesones cocina, miércoles 6 de noviembre 2024
- Entrega de los 4 apartamentos en obra
- inicio de labores frente de obra bomberos, ,miercoles 6 de octubre de 2024.

NOTA: A la fecha no ha cumlido con estos compromisos adquiridos.

El contratista manifiesta que no ha podido entregar el tema de los apartamentos, ya que ha tenido problema con el tema de las cocinas, en especial del mármol por tiempos de fabricación.

- La Gerencia del proyecto manifiesta que los compromisos reales que tenia el contratista era: el jueves pasado entregar los estudios de seguridad del personal nuevo y los entrego apenas el lunes, incumpliendo también con la entrega de los apartamentos, ya que a la fecha no ha sido posible la entrega, el contratista siempre manifiesta lo mismo, pero no se ve la evolución en la ejecución contractual, el día miércoles el contratista nos pidió que le entregaramos las

FAC-S-2024-092363-AG

instalaciones de bomberos para empezar actividades allí, razón por la cual no cumplió al no ingresar personal a trabajar en esta área, también incumplió al informar que la teja llegaba el día de hoy y no ha sido así, se le reitera que de todos los compromisos que el contratista ha hecho no ha cumplido ninguno, la preocupación es alta ya que nos queda un mes para la ejecución del contrato y apenas lleva el 33% de ejecución, también se le recuerda la solicitud formal para la cesión de derechos económicos del contrato y a la fecha no ha sido allegada.

- El contratista no cuenta con el personal , con el material para realizar las actividades, evidienciando así un incumplimiento por un aparente falta de músculo financiero, todos los registros estan en la bitácora de la obra .
- La Entidad no ha podido satisfacer la necesidad por los incumplimientos del contratista, ya que las familias no han podido hacer usos de las viviendas.
- El contratista manifiesta que la cubierta el fin de seman junto a las laminas de cielo raso,las divisiones no las han instalado por que se estan haciendo actividades de aso y las pueden dañar.
- La gerencia de proyecto informa que lleva mas de 50 días y no nos han entreqado los apartamentos y lo mas seguro es que el contratista nos pida mas apartamentos y la gerencia del proyecto tiene que se responsable cuando lo único que se ha evidenciado es un incumplimiento, se le entrega los apartamentos cuando el contratista nos entregue los que estan en mantenimiento, porque a la entidad nadie le garantiza que el contratista haga las actividades de demolición y el contratista se declare en "banca rota" y los apartamentos a la entidad nos queden inhabitables.
- El contratista manifiesta que la cesión de derechos no va a retrasar a la entidad, sino al contrario le va a dar mas oxigeno económico, adicional ayer le llego el pago del primer corte, con la cual se pagaron todos los materiales, por eso da la tanquilidad de que ya todo esta pago, el contratista ha invertido un 70% de los recursos que se necesitan para terminar.
- El contratista manifiesta que el nuevo personal, es un personal de contratistas de bogotá que tienen amplia experiencia en estas obras y sus rendimientos son mayores.
- El contratista manifiesta que solicita la entrega la guardia para iniciar trabajos, como entidad le solicitamos que nos demuestre que cuentan con el material y el personal para realizar estas actividades y asi poder entregarle estas áreas.
- El contratista que los apartamentos los entrega el próximo miércoles por que el tema del mármol ya está en final corta, espera no quedar mal con la entidad.
- El contratista manifiesta que ya estan pagos los demas muebles de los demas apartamentos.

FAC-S-2024-092363-AG

- La gerencia informa que tampoco cumplió el compromiso de hacer presencia en las obra el representante legal.
- En comité pasado una de las propuestas era que el contratista a 12 de noviembre tendría que tener un avance del 65% y el contratista informa que avance físico no, pero en compras de material y eso si mas del 65%, pero nosotros como entidad el avance se mide en actividades ejecutadas; la gerencia manifiesta que nuevamente el contratista nos va a incumplir con este porcentaje.
- La supervisión manifiesta que el contratista no está cumpliendo con el personal mínimo requerido, apenas tiene una cuadrilla, se han tramitado últimamente 11 estudios de seguridad.
- La supervisión le recomienda realizar un plan choque aterrizado, donde incremente el número de cuadrillas mínimo requeridos y así poder disminuir el atraso.
- El contratista informa que estan alistando 4 estudios de seguridad mas, para entregar a mas tardar el día miércoles.
- La supervisión informa que con 4 personas adicionales no va a ser suficiente para cumplir con el plazo contractual, se le recomienda incrementar en como mínimo 01 cuadrillas mas.
- El contratista informa que para el día martes 12 de noviembre entregaría el plan de contingencia.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-092363-AG



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comite de obra 11

OFICINA PRODUCTORA: ESALO - ESINS

LUGAR Y FECHA: Gacas, 08 Noviembre 2024

HORA: 11:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Mosquera D.	Sijon 6.P.	GACAS	71507	Felix.mosquera@fac.mil.co	
2	MY	Mr Jennifer Garcia Acosta	COMANDANTE ESALO 306	ESALO	3107602205	Mr.garcia@fac.mil.co	
3	MY	Jorge Sánchez Rojas	Supervisor	ESALO	3125193699	jorge.sanchez@fac.mil.co	
4		Tomas Cobrera	Ing. de obra	AMCS	3017853921	tetco21@hotmail.com	
5	PD4	Jenifer A. Camacho A.	Prof. Planeación	ESMAY	71311	Jeniffer.camacho@fac.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-093643-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,14-11-2024

Asunto	Comité de obra No. 12		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	14:00 horas	**Hora Finalización**	14:30 horas
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:
Novedades y avance contrato

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, el señorTOMAS CABRERA Residente, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- La supervisión del contrato informa que a la fecha el porcentaje de ejecución es del 37.6% y porcentaje programado del 65%, refeljando un atraso del 27.4%.
- Se encuentran actividades atrasadas en los apartamentos, estación de bomberos y guardia.
- No ha cumplido con los compromisos del comité pasado de entregar los 4 apartamentos que están en mantenimiento.
- El contratista informa que los entregará el día viernes 15 de noviembre.
- A la fecha tiene 16 personas trabajando en las actividades del contrato.
- La supervisión informa que se les va a entregar 06 apartamentos, 02 en Flor Amarillo, 03 en Torres de Leticia y 01 en Luna, siempre y cuando se reciban a satisfacción los que están en mantenimiento.
- La supervisión recomienda aumentar el número de personal para así cumplir a satisfacción con el contrato.
- La gerencia del proyecto le informa al contratista que los muebles en madera mandarlos a fabricar de una vez para no tener retrasos en los tiempos de entrega.
- La unica forma de avanzar es contar con el material suficiente y el material suficiente para la ejecución de los trabajos.

FAC-S-2024-093643-AG

- El contratista solicita trabajar hasta las 23:00 horas, para lo cual la gerencia autoriza este requerimiento.
- El contratista manifiesta que sería un respiro que le dieran una prórroga de 10 días para cumplir con el plazo.
- La supervisión informa que no cumplió con el compromiso del acta pasado de meter 4 personas mas.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de obra #12
OFICINA PRODUCTORA: ESAIO - ESNS
LUGAR Y FECHA: Garcia, 14-11-2024
HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Marquez D.	SHOM	Garay	71507	Felix.marquez@esnc.co	
2	MY	Jorge Roberto Sanchez Reyes	Supervisor	ESAIO	3125193689	jorge.sanchez@esnc.mil.co	
3							
4		Christian Fabian Barrera Daza	RL Amcis Ingenieria y Asesorias		3132471470	christian.barrera@amcis.com.co	
5		Tomas Cabrera	Ing. Amcis		3107353921	etcontratos.1.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-096597-AG	Lugar y Fecha	ESALO - ESINS,25-11-2024

Asunto	Comité de obra 13		
Oficina Productora	ESALO - ESINS		
Hora Inicio	14:30	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:
Verificación novedades contrato

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, el señorTOMAS CABRERA Residente, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- La supervisión del contrato informa que a la fecha el porcentaje de ejecución es del 48.15% y porcentaje programado del 68.59%, refeljando un atraso del 20.44%.
- La empresa contratista informa que esta semana terminan los trabajos de la guardia.
- La Gerencia del proyecto manifiesta el completo incumplimiento por parte del contratista, lo cual nos está generando bastantes afectaciones.
- Se les recuerda a los contratistas que los trabajos si no están con la calidad adecuada, no se les va a recibir.
- La supervisión manifiesta que no va a recibir los enchapes de los baños del apartamento Torre 2-502 de Torres de Leticia, debido a la mala calidad de la instalación, ya que algunas cerámicas se encuentran partidas, así mismo, se evidencia que no recibe los aparatos sanitarios en estos edificios ya que se encuentran con un hueco en la tapa del mismo, además, la griferia de lavamanos no es tipo push.
- La supervisión manifiesta la preocupación, en cuanto a que el contratista no va a cumplir con el plazo estipulado.
- La gerencia le manifiesta al contratista el cumplir con lo que se les ha exigido.
- La supervisión informa las afectaciones que se han generado por no poder pagar las administraciones de esos edificios, debido al incumplimiento del contrato.

FAC-S-2024-096597-AG

- La supervisión le recomienda al contratista meter mas personal y reforzar frentes de trabajo para poder cumplir con el plazo contractual.
- La supervisión informa el incumplimeto del plan de contingencia presentado por el contratista.
- La gerencia del proyecto informa que no van a cumplir así se les de la prorroga al contrato.
- El contratista manifiesta que el próximo viernes entregan los apartamentos últimos que se le entregaron.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Comité de obra 14		por definir

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de obra # 13
OFICINA PRODUCTORA: ESALO - ESIDS
LUGAR Y FECHA: Gacas 25-11-2024
HORA: 14:30.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC.	Rafael Eduardo Rubio Reyes	Secom Gacas	GACAS	3142941886	rafael.rubio@fac.mil.co	
2	TC	Felix A. Mosquera D	DEPLA	Gacas	71507	Felix.mosq@fac.mil.co	
3	MY	Jorge Roberto Sánchez Reyes	Supervisor	ESALO	3125193669	jorge.sanchez@fac.mil.co	
4		Tomas Cabrera	Ancj Ing.	Ancj	3107855521	etc21@hotmail.com	
5	TI	Arias Molina Fernando	Tecnico Esp. Servicios Publicos	ESALO	3104280553	fernando.arias@fac.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-098121-AG	Lugar y Fecha	ESALO - ESINS,02-12-2024

Asunto	Comité de obra No. 14		
Oficina Productora	ESALO - ESINS		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	09:30
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:
Verificación contrato

Desarrollo:

Se reúnen en la Oficina del señor TC RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES Segundo Comandante de la Unidad, el señor TC PABLO DIAZ MORA Ordenador del Gasto, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S, el señor TOMAS CABRERA Residente, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- La supervisión del contrato informa que a la fecha el porcentaje de ejecución es del 55.20% y porcentaje programado del 82.10%, refeljando un atraso del 26.9%, practicamente quedan 8 días de ejecución del contrato y con este atraso el contratista no va a cumplir con el plazo de ejecución.

- Existen actividades atrasadas en los frentes de trabajo de la guardia, faltan dos garitas por el mantenimiento de la estructura metálica, apartamentos externos (enchapes, cocinas, divisiones de baño y pintura) y garitas.

- La Supervisión del contrato informa que el contratista no cumplió con el compromiso del comité pasado de entregar los apartametos que estan en mantenimiento el día 29 de noviembre de 2024, así mismo, no entrego la fachada en vidrio de la guardia.
  El señor Ordenador del Gasto manifiesta que el plazo de ejecución del contrato es 10 de diciembre

- La supervisión manifiesta que la estación de bomberos no se recibió por novedades de calidad y de y terminados.

- El ordenador del gasto pregunta cual es la justificación de la prórroga que el contratista esta solicitando.

- El contratista manifiesta que tuvieron una temporada de lluvias que les atraso unos días, sobre todo en el frente de bomberos cuando se estaba ejecutando el cambio de cubierta

- El ordenador manifiesta que la realidad es que le quedan 10 dias para ejecución del contrato y no va a terminar con este contrato, desde la ultima reunión que el ordenador del gasto estuvo, la posición era de no mas prórrogas, este fue de los primero contratos que se lograron adjudicar, el contratista no puede trasladar sus problemas a la administración, se va a otorgar la prórroga solicitada por el contratista pero si ese dia no se recibe al 100% y bien hecho, se realizar los debidos procesos de incumplimiento
- La supervisión reitera que el contratista no ha cumplido con el plan de contingencia y se le recomienda meter mas personal para cumplir con el plazo del contrato.
- Se le recuerda al contratista todo lo que le puede acacrrear un incumplimiento
- El contratista manifiesta que el tema d eingreso y salida del personal no es tan sencillo , debido a las condiciones de seguridad que se deben cumplir, cuando llueve no es tan fácil enviar al personal a realizar actividades bajo techo porque ya se tiene una programación y se tiene que realizar el traslado de herramientas, material, además en los apartamentos externos, se restringen los horarios de trabajos.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Comité de obra 15		Por definir

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

FAC-S-2024-098121-AG

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Comité de obra 14

OFICINA PRODUCTORA: ESAIO - ESMS

LUGAR Y FECHA: Cacas, 02 - Dic - 2024

HORA: 09:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC.	Rafael Rubio Reyes	Secom	Cacas	3142947876	rafael.rubio@fac.mil.co	
2	My	Jorge Roberto Sánchez Reyes	Supervisor	ESAIO	71583	jorge.sanchez@fac.mil.co	
3		Tomas Cabrera	Ing.	ATICS	3107853721	etec21@hotmail.com	
4	B-4	Jenifer A. Camacho A.	Prof. Planeación	ESMA4	71510	Jenifer.camacho@fac.mil.co	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Viernes 01-NOV-2024

Actividad.
Se continuo instalando enchapa de baños en los Aptos 708 y 204 Tz de flor amarillo y se continuo pintando y resanando muros del Apto 204 Tz de flor Amarillo.

Talento humano
1 Ing. B.
1 Ing. Aux
1 SSO
1 Maestro
2 Enchapadores
1 Ayudante

Estado del tiempo
Soleado

Ing. Sánchez

Ing. B.

Sabado 02-NOV-2024


Actividad.
Se continuo enchapando los baños del Apto 204 Tz de flor amarillo y se continuo instalando pintura muros de los Aptos 204 de flor Amarillo.

líder

Escaneado con CamScanner

Talento Humano
1 Ing R.
1 Aux
2 Enchapadores
1 Maestro gral
1 Ayudante.

Estado del Tiempo
soleado.



Ing. Sánchez

Domingo 3 NOV 2024
Lunes 4 NOV 2024.

Martes 05 NOV 2024

Actividad.

SE ENCUENTRAN TRABAJANDO 4 PERSONAS EN APT 204 DE FLOR AMARILLO, EN LOS OTROS APTS NO HAY PERSONAL TRABAJANDO

* Se pasa revista y no se encuentra el personal mínimo requerido, solo se encuentran trabajando en el apartamento Flor amarillo T2-204, de los 04 apartamentos libres, solo están 04 trabajadores fuera de los administrativos, el porcentaje de ejecución no ha avanzado en gran medida, se prevé por parte de la supervisión un probable incumplimiento en la ejecución del contrato.

Ing. Sánchez

líder

Escaneado con CamScanner

Miercoles 06 Nov 2024

Se para costa evidenciando los mismos resultados falta de personal, se cuenta con 03 trabajadores para de los administrativos, se evidencia un posible incumplimiento, enchape baños Flor amarillo

Ing. Sanchez

Jueves 07 Nov 2024

Se para revista, evidenciando falta de personal, atraso cada vez es más elevado, se pronostica un posible incumplimiento, deben dumentar el personal de cuadrillas para disminuir el atraso, Enchape baños Apto 204 Flor amarillo y pintura muros

Ing. Sánchez

VIERNES 08 Nov 2024
Actividad
Se termino de instalar enchape baño Social del Apto 204 de Flor Amarillo, y se inicia a enboquillar baños de los Aptos 708 y 704 Tr de Flor Amarillo.

Ing R.

Sabado 09 NOV 2024
Actividad.
Se termina de enboquillar Aptos 204 y 708 y se instalan sanitarios y se

líder

Escaneado con CamScanner

instalon accesorios de baños 204 y 702 de flor Amarillo.

- Talento humano
1 ing
1 SSOO
1 Aux ing.
2 enchapadores
1 Maestro gral
1 Ayudante

- Estado del tiempo
Soleado

Ing. R.

Ing. Sánchez

Sabado 09 Nov. 2024

Actividad:
Se continua con la instalacion inicia a enchapobar baños Apto 502 T2 cocina y se terminan detalles de pintura del Apto 204 de flor Amarillo.

- Talento humano
1 ing.
1 SSOO
1 Aux ing.
1 Maestro gral
2 Enchapadores
1 Ayudante

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo
Soleado

Ing. R.

Ing. Sánchez

Domingo 10 Nov 2024
(Festivo)
Lunes 11 Nov 2024
(Festivo no dejan trabajar en los apartamentos).

Ing. R.

Ing. Sánchez

Martes 12 Nov 2024

Actividad
Se termino de enchapar baños del Apto 502 Tr de Leticia y se instala vinilo mudo. Apto 503 T3 de Leticia.

Talento humano
1 Ing. R.
1 SISO
1 Aux Ing.
1 Maestro gral
1 Enchapador
1 Ayudante

Estado del tiempo
Soleado.

Escaneado con CamScanner

Mc enchape

Ing. R

Miercoles 13 NOV 2024
Actividad.
Se termino de instalar enchape en baño social del Apto 503 T3 de letrida y se instalo enchape en muro de patio y cocina, se inicio a desmontar cubierta en bomberos y se inicio a realizar mantenimiento a las garitas. (se trabajaron horas nocturnas) pintura muros Apto 503 y 502
Talento humano
1 Ing.
1 Sso
1 Aux ing.
3 Maestro gral
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado

Ing. R.

Mc. soldadas

Jueves 14 NOV 2024

Se instalo segunda mano de pintura en los muros de los aptos 503 T3 y 502 T2 de color Amarillo, se instalaron baños y Accesorios del baño social del Apto 502 T2


líder

Escaneado con CamScanner

de leticia, se continuo desmontando cubierta de Bomberos.

Talento humano
1 Ing
1 Aux Ing.
1 SSO
2 Maestro
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado



Ing. R.

M.C. Sanchez

Viernes 15 2024

Actividad.

Se emboguillaron baños del Apto 502 T2 de leticia se instalaron Accesorios Sanitarios y duchas del Apt 502 T2 de leticia se monto cubierta de bomberos y se continuo haciendo mantenimiento a la garita #3.


Talento humano
1 Ing.
1 Aux Ing.
1 SSO
2 Maestros
4 Ayudantes

líder

Escaneado con CamScanner

1 Enchapador

Estado del tiempo
soleado



Ing. B.

Sabado 16 2024


M.H. Sánchez

Se termino de instalor sanitarios en el Apto 503 Tb de Leticia y se continuo instalando teja en Bomberos.

Talento humano

1 Ing. B.
1 Aux ing.
1 Sisa
2 Maestros
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado



Ing B.

M.H. Sánchez

Domingo 17 2024

líder


Escaneado con CamScanner

Lunes 18 2024

Actividad.
Se inicio a demoler baños del Apto 401 T. de leticia Se continuo instalando teja en torres de leticia. Se instalaron muebles de labamanos en los Aptos 502 T3 y 502 T2 de leticia y se continuo desmontando y montando teja de ~~los~~ ~~Apt~~ Bomberos.

Talento humano
1 Ing.
1 Aux Ing
1 SISO
2 Maestros
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado - lluvias



Ing B.

HH Sinchar

Martes 19 2024
Actividad
Se inicio a enchapar baños social del Apto 401 T. leticia, y se continuo desmontando e instalando teja de Bomberos.

Escaneado con CamScanner

Talento humano
1 Ing.
1 Aux Ing.
1 SSO
2 Maestros
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado

Ing Res.

Mg. Sánchez

Morales 20 de 2024

Se continuo desmontando y montando pitecho de Bomberos y se continuo enchapando Baños del Apto 401 T1 de ladrillo y se inicio a demoler baños del Apto 401 del edificio Luna.

Talento humano

1 Ing R
1 Aux Ing
1 SSO
2 Maestros
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado

Escaneado con CamScanner

Ing. B.

M.Q Sánchez

Jueves 21 de 2024 Noviembre

Actividad
Se continuo enchapando baños del Apto 401 de Letra A y se continuo desmontando y montando techo de Bomberos y se continuo demoliendo enchape del edificio Luna Apto 401T

Talento humano
1 Ing.
1 Aux Ing.
1 SSO
2 Maestros
4 Ayudantes
1 Enchapador

Estado del tiempo
Soleado

Ing. B.

22-Nov-24 Se para revisión de los apartamentos que se estan entregando, recalcando que en Torres de Ladrico T3-503 y T2 502, existen muchas novedades de acabados, y limpieza el enchape en baños tiene varias ceramicas partidas el contratista tiene que cambiarlas, por lo tanto no se recibe

M.Q. Sánchez

líder

Escaneado con CamScanner

23-Nov-24 La cobertura de bomberos no ha avanzado significativamente por las lluvias en la zona, deben corregir los traslapes y los cortes realizados en la misma.

MM Sánchez.

Domingo 24-NOV-2024

LUNES 25-NOV-2024

Actividad
Se continuo enchapando Apto 401 T1 LETICIA y se inicio a demoler Apto 402 T2 con LETICIA y Apto 402 T3 LETICIA., se continuo instalando cubierta en Bomberos de la Fuerza Aerea, y se continuo estructurando para muro en la guardia.

Talento humano

1 ing
1 Aux ing
1 SISO
2 Maestros
4 enchapadores
4 Ayudantes

Estado del tiempo
Soleado

Ing R. +
líder

MM Sánchez

Escaneado con CamScanner

Martes 26 - NOV - 2024
Actividad
Se continuo demoliendo enchape de baños en el edificio LUNA, y se continuo demoliendo el enchape de los Aptos 402 T2 y 402 T3 de LETICIA y se continuo desmontando y montando de cubierta en Bomberos, Se ~~en~~ termina de estructurar y se inicia a instalar superboard en la guardia.

- Talento humano
1 Ing.
1 Aux Ing.
2 Maestro
1 Enchapador
4 Ayudantes.

- Estado del tiempo
soleado

Ing. R.

H&S Sandra

Miercoles 26 NOV - 2024
Actividad
Se continuo instalando cubierta de Bomberos, Se continuo instalando muro en superboard en la guardia. Se continuo instalando enchape en los baños del Apto Luna y instalando pintura en los muros del Apto 401 LUNA,


líder


Escaneado con CamScanner

Se inicio en enchapar Apto 402 Tz de LETICIA.

- Talento humano
1 Ing
1 Aux Ing
1 SSO
2 Maestro
2 Enchapador
4 Ayudantes

- Estado del tiempo
Soleado





Jueves 27-NOV-2024
Actividad.

Se continuo instalando y desinstalando cobierta de Bomberos y se continuo instalando muro en Superboard en la guardia, Se continuo instalando enchape en el Apto 402 Tz de leticia y se inicia a instalar primer mano de pintura en el Apto 402 Tz de LETICIA, Se continuo instalando pintura en los muros de LUNA se instalan baños y Accesorios en el Apto 401 Tz de LETICIA

Escaneado con CamScanner

Talento humano
1 Ing
1 Aux Ing
1 SSO
2 Maestros
2 enchapadores
4 Ayudantes

Estado del tiempo
Soleado

Ing R.

Viern. 29 - NOV - 2024
Actividad
Se continuo instalando y desinstalando cubierta de Bomberos, y se continuo instalando muro en superboard en la guardia, se continuo instalando porcelanato en el apto 402 T3 de LETICIA Se continuo instalando pintura en el EDIFICIO LUNA, y se continuo instalando enchape en los baños del Apto 401 de LUNA.

Talento humano


1 Ing
1 Aux Ing
1 SSO
2 Maestros
2 Enchapadores

líder

Escaneado con CamScanner

4 Ayudantes

- Estado del tiempo
Soleado



Sabado 30-NOV-2024
Actividad
Se termino de instalar cubierta en Bomberos, Se continuo instalando superboard para muros en la guardia y se inicio a enmasillar los muros de superboad, Se continuo instalando porcelanato en el Apto 402 T3 de LETICIA y se continuo instalando enchape en los baños del Apto 402 T2 de letida y Se continuo instalando enchape en baños en el Apto 401 en el edificio LUNA.

- Talento humano
1 Ing
1 Aux ing
1 SISO
2 Fierreros
2 Enchapadores
4 Ayudantes

- Estado del tiempo
Soleado


líder

Escaneado con CamScanner

INFORME DE OBRA N° 04

PERIODO: 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

CONTRATO DE OBRA N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024.

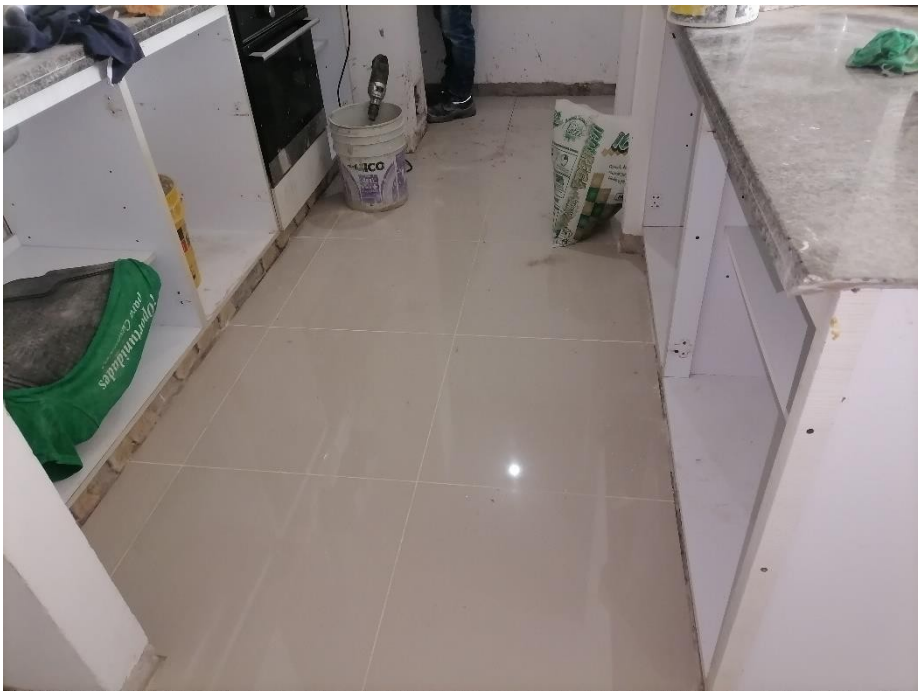

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

CONTRATISTA: AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S

R/L: CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL

YOPAL, NOVIEMBRE 2024

ORIGINAL

Correo: administrativo@amcis.com.co
Página web: www.amcis.com.co

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. LOCALIZACION 7
3.1 LOCALIZACION GENERAL 7
3.2 Localización Exacta 8
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 8
045-00-B-COFAC-BACOF-2024 8
5. COMPONENTE JURIDICO 9
5.1 4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA 9
GARANTIAS 9
6. COMPONENTE TECNICO. 9
6.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO 9
6.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS DEL PERIODO 12
7. CURVA “S” PROGRAMA AVANCE: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. RECURSOS DEL CONTRATISTA. 17
8.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 17
8.2 HERRAMIENTA Y EQUIPO 17
9. CONCLUSIONES 18

1. INTRODUCCION.

El presente documento, compila la información referente a las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2024 en el desarrollo del contrato de obra N° **045-00-B-COFAC-BACOF-2024**, que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE**

Dentro del periodo del 01 de noviembre al día 30 de noviembre de 2024, la empresa contratista realizo actividades de enchapes de piso en porcelanato y enchapes de baños, alistados de pisos, instalación de vinilos dos manos en muros, de los apartamentos 503 T3, 502 T2, de torres de leticia y los apartamentos 708 – 204 T2 de Flor Amarillo, Apto 401 del edificio Luna, el proyecto de obra comprende las adecuaciones y mejoras de los bienes muebles del Grupo Aéreo del Casanare, contemplando las siguientes capítulos y actividades:

PRELIMINARES:
DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA
DEMOLICIÓN MUROS
DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES
DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA
DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS m 32,00 1.1.8 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.
DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS

ESTRUCTURA
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA

MAMPOSTERIA
MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR
MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG

HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS
LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO

COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS
PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS

CIELO RASO
CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO
PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS
CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM

PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL
CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA

CARPINTERIA EN MADERA
PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON

CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA
MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).

MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
SANITARIO MANANTIAL BLANCO
MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI
ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))
PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.
VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CARPINTERIA METALICA

FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX

RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO) POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.

CUBIERTA

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

2. LOCALIZACION.

2.1 LOCALIZACION GENERAL

El proyecto está localizado dentro de la **ciudad de Yopal**, es uno de los 19 municipios del departamento de Casanare, en el oriente de Colombia.

Yopal es la Ciudad capital del departamento de Casanare el cual lo baña el rio Cravo sur, en el Piedemonte de la cordillera oriental, por su topografía el Municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1906 Km2, Medio 106 Km2, Frio 25 Km2.

Su jurisdicción tiene una extensión de 2.595 km², equivalente a un 5,79% de la superficie total de Casanare, y su población es de 181.548 habitantes y Así mismo se caracteriza por ser el municipio capital de departamento más joven con tan solo 77 años de vida jurídico-administrativa, conformado en: siete comunas las cuales se dividen en 124 barrios que conforman el área urbana en su parte rural por 11 corregimientos (El Charte, Mata de Limón, La Chaparrera, El Morro, El Taladro, Punto Nuevo, Quebrada seca, Morichal, Tacarimena, Tilodirán, Alcaraván la Niata) y 96 veredas.

La ganadería y la agricultura es la actividad principal que se desarrolla; sin embargo, el municipio también ve reflejado su potencial en el sector minero energético dada la explotación de hidrocarburos que allí se realiza.



Ilustración 1 Localización General
(fuente google)

2.2 Localización Exacta

El proyecto se encuentra localizado más exactamente en la zona urbana del municipio de Yopal Casanare, Instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare Yopal – Casanare. Dirección: Cl. 40 #19-45, Yopal, Casanare

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

Contrato Número	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
Fecha de suscripción	17 de julio de 2024
Objeto	"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."
Entidad contratante	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Contratista	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
Valor total inicial	$ 966.599.939.40,00
Valor Total del Contrato	$ 966.599.939.40,00
Primera acta parcial	20 de septiembre de 2024
Valor	$ 147.507.264,41
% ejecutado	15,26%
Plazo	cuatro (04) meses y trece (13) días
Segunda acta parcial	20 de octubre de 2024
Valor	$ 151.829.069,15
% ejecutado	15,71 %
Fecha de inicio	29 de julio de 2024
Nueva fecha de terminación	10 de diciembre de 2024
Teléfono	**3132471470**
E-mail	contrato.cofac.yopal@outlookl.com

4. COMPONENTE JURIDICO

4.1 4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS

ASEGURADORA: SURAMERICANA			**PÓLIZA NO: 3968280–1**	
TIPO DE AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**	**% Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	30/05/2025	$ 289.979.982	30%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/07/2024	30/11/2027	$ 48.329.997	5%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 50	30/11/2024	30/11/2027	$ 483.299.970	50%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	16/10/2024	10/12/2024	$260,000,000.00	

5. COMPONENTE TECNICO.

5.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO.

A continuación, se presenta cuadro anexo cantidades programadas vs ejecutadas para el mes de noviembre de 2024

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PESO ACT	PROGRAMA MENSUAL				TABLA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACUMULADAS VS AVANCE MES 3			
					mes1	mes2	mes3	mes4	CANTIDAD PROGRAMAD AACUMULADA	CANTIDAD EJECUTAD A	% PROGRAMADO ACUMULADO	%ejecutado
1	**PRELIMINARES**											
1,1												
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	200,00	0,21%	55	55	55	35	200	24,13	0,21%	0,025%
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	23,00	0,02%	7	7	7	2	23	12,00	0,02%	0,010%
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	36,00	0,02%	0	36	0	0	36	38,6	0,02%	0,03%
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2.932,00	14,43%	0	900	900	750	2550	1250,00	12,55%	6,151%
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTUR	m²	199,00	0,27%	0	199	0		199	273,20	0,27%	0,372%
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	352,00	0,64%	0	0	0	352	352	352,0	0,64%	0,64%
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m	32,00	0,05%	0	0	0	32	32	32	0,05%	0,05%
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	1.405,00	0,52%	0	400	400	350	1150	660,00	0,42%	0,243%
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34,00	0,06%	0	8	9	10	27	16	0,05%	0,028%
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²	36,34	0,24%	0	0	0	4	4	0	0,03%	0,000%
2	**ESTRUCTURA**											
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	8,00	0,11%	0,00	0	0	8	8	0	0,11%	0,000%
3	**MAMPOSTERIA**											
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²	19,00	0,39%	0,00	0	0	19	19,00	1,58	0,39%	0,032%
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	11,1499977936421	0,09%	0,00	0	0	11,1500	11,15	14,00	0,09%	0,114%
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	Un	24,00	0,31%	0,00	0	0	24,00	24,00	19,00	0,31%	0,244%
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	10,00	0,14%	0,00	0	0	10,00	10,00	0,00	0,14%	0,000%
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un	8,00	0,16%	0,00	0	0	8,00	8,00	0,00	0,16%	0,000%
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2,00	0,03%	0,00	0	2	0,00	2,00	2,00	0,03%	0,03%
5	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**											
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS	un	4,00	0,73%	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	**CIELO RASO**											
6.1.1	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	199,000006563902	1,83%	0,00	0	149,00	50,00	199,00	267,20	1,83%	2,46%
7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**											
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	900,00	3,68%	0,00	220,00	250,00	250,00	720,00	680,00	2,95%	2,78%
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	900,00	9,89%	0,00	220,00	250,00	250,00	720,00	650,00	7,91%	7,14%
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1.552,00001424966	4,73%	0,00	550,00	550,00	452,00	1552,00	385,00	4,73%	1,17%
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	131,00	1,23%	0,00	30,00	50,00	30,00	110,00	72,00	1,03%	0,68%
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	623,00	4,25%	0,00	150,00	300,00	100,00	550,00	360,00	3,76%	2,46%
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1.205,00	3,07%	0,00	300,00	600,00	150,00	1050,00	710,00	2,68%	1,81%
8	**PINTURA**											
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3.199,00	9,81%	0,00	800,00	1200,00	700,00	2700,00	1403,00	8,28%	4,30%
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	21,00	0,13%	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,13%	0,13%
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	96,7641186486263	0,11%	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	600,00	0,08%	0,71%
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un	6,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
9	**CARPINTERIA EN MADERA**											
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6,00	1,1%	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	7,00	0,56%	1,30%

9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50,00	10,0%	0,00	10,00	20,00	11,00	41,00	15,54	8,21%	3,11%
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26,00	2,2%	0,00	3,00	18,00	2,00	23,00	10,76	1,92%	0,90%
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90,00	6,4%	0,00	10,00	22,00	30,00	62,00	14,40	4,41%	1,02%
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**											
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34,00	1,43%	0,00	8,00	10,00	8,00	26,00	20,00	1,09%	0,84%
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34,00	3,63%	0,00	8,00	10,00	8,00	26,00	20,00	2,78%	2,13%
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34,00	0,60%	0,00	8,00	10,00	8,00	26,00	20,00	0,46%	0,36%
11	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**											
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²	48,00	9,08%	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	7,76%	0,00%
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²	3,70	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	11,5000014673413	0,46%	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	10,00	0,46%	0,40%
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41,2999999878905	1,92%	0,00	8,00	12,00	13,00	33,00	22,00	1,53%	1,02%
12	**CARPINTERIA METALICA**											
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	10,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	66,00	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	76,68	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²	4,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	**CUBIERTA**											
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	359,999996786537	3,46%	0,00	0,00	0,00	359,99	359,99	359,99	3,46%	3,46%
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	50,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
14	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**											
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	679,482667014446	0,34%	0,00	150,00	150,00	150,00	450,00	573,85	0,22%	0,29%
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	60,00	0,36%	0,00	30,00	10,00	10,00	50,00	30	0,30%	0,18%
				100,00%							**82,03%**	**55,10%**

5.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS DEL PERIODO

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

1.1.1 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES: Esta actividad correspondió a la demolición de pisos y paredes de baños de los Aptos 405 T2, 204 T2, 708 T2 y 208 T2 de Flor Amarillo.

1.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA: Esta actividad correspondió al desmonte del cielo raso existente en las oficinas de Bomberos.

1.1.3 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES: Esta actividad correspondió al desmiente y retiro de la cubierta existente en Bomberos.

1.1.4 DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA: Esta partida de trabajo correspondió a la demolición del guarda escoba en los apartamentos.

1.1.5 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS: Esta partida de trabajo correspondió al desmonte de los accesorios de los baños (cepillero, toallero, jabonera, duchas) y las divisiones de los baños.

3. MANPOSTERIA:

3.1.2. MURO DRYWALL DOBLE CARA e=12 CM: Esta actividad correspondió a la construcción de muros en láminas de Drywall, para la oficina de la guardia.

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1.1 60X60 LED: Esta partida de trabajo correspondió a la instalación y puesta en funcionamiento de luminarias LED cuadrada de 60x60, en las oficinas y los baños de bomberos.

6. CIELO RASO

6.1.1 CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: Esta actividad correspondió al suministro e instalación de cielo raso PVC a las oficinas del ESDEC, y los Aptos 503 T3 y 502 T2 de torres de leticia.

7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

7.1.1 ALISTADO DE PISO 4CM – IMPERMEABILIZADO: Este item correspondió a la nivelación de la placa piso de los apartamentos.

7.1.2 PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM: Esta actividad correspondió a la instalación de enchape piso en porcelanato en los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo.

7.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3: Esta actividad corresponde a la instalación de pañete en los muros de los baños y los guarda escoba, Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo.

7.1.4 CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Esta actividad correspondió a la instalación de cerámica piso a los baños d ellos Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEC.

7.1.5 CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

Este item consistió en en el suministro e instalación de cerámica estructurada en los muros de los baños de los apartamentos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEC.
.

7.1.6 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM:

Este item comprendido en el suministro e instalación de porcelanato para guarda escoba en los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEC.

8. PINTURA

8.1.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES): Esta partida de trabajo correspondió a la instalación de estuco y pintura en los muros de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEC.

9. CARPINTERIA EN MADERA

9.1.1 PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

Esta actividad correspondió al mantenimiento y remplazo de partes dañadas de las puertas de los apartamentos.

9.1.2. MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA:

Esta actividad correspondio al suministro y cambio de los muebles y los meson existente por meson en granito con lavaplatos de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo.

9.1.3 MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).

En esta actividad se realizo mantenimiento y cambio de partes dañadas al mueble de extractor de olores, (cambio de visagras, cremalleras, y piezas dañads) de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Leticia, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo.

9.1.4 MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Esta actividad correspondió al mantenimiento y cambio de piezas en madera dañadas, bisagras, carreteros de los muebles de closet.

10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

10.1.1 SANITARIO MANANTIAL BLANCO.

Esta actividad consistio en el suministro e instalacion de sanitario en los apartamentos de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la Fuerza Aerea.

10.1.2 MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI:

Esta partida de trabajo correpondio al suministro e instalacion y puesta en fiuncionamiento de lavamanos con mueble y griferia en los baños de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo

10.1.3 ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN):

Esta partida d etrabajo correspondio al suministro e instalacion de accesorios de baño (taolleras, cepillera, javoneras, papelera) en los baños de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo

11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

11.1.4 DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Esta actividad correspondió al suministro e instalación de divisiones en vidrio en los baños de los Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo

13. CUBIERTA

13.1.1. TEJA STEEL STANDING SEAN TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRANSPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMINETO:

Esta actividad correspondió a la instalación de la cubierta en teja STEEL ESTANDING TIPO PANEL, en la cubierta de Bomberos.

14. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

14.1.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

Esta actividad correspondió al aseo interior a los apartamentos después de ser intervenidos con el mantenimiento Aptos 503 T3 y 502 T2 de Torres de Latica, y los Aptos 405, 708, 208, 204 T2 de Flor Amarillo y las oficinas del ESDEB de la Fuerza Aerea.

6. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

6.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
1	Edgar Tomas Cabrera Otalora	74861357	Ing. Residente
2	Edwin Orlando Paez Roncancio	11447178	Ing. Residente
3	Sandra Jimena Mesa Cristancho	46383731	Residente SST
4	William Fabian Jacome	1693879	Maestro de obra
5	Cristian Andres Pulido	1024529685	Maestro de obra
6	Jorman Jair Peinado Herrera	1066725528	Enchapador
7	Juan Andres Montaño	1007598924	Ayudante de obra

6.2 HERRAMIENTA Y EQUIPO

HERRAMIENTA Y EQUIPO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
11	Herramineta menor (mangyeras niveles, nivel de mano, chapulin, martillos, masetas, pulidora manual, taladro manual, metros, brochas, rodillos, lijas, valdes)	Gl

7. CONCLUSIONES

1. la programación real es del 82,03 % y el avance real es de 56,34 %.

1. Podemos concluir que a la fecha del presente informe se presenta un atraso del 25,69 % sobre el total programado.


2. El mantenimiento realizado asegura que las instalaciones se mantengan en condiciones óptimas, lo que contribuye a un ambiente más seguro y eficiente para el personal.

3. El mantenimiento corrigió problemas menores antes de volverse fallas peligrosas, complicadas y costosas.


4. Las actividades se han venido desarrollando de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

Anexo: Bitácora de obra.

Atentamente,



Christian Fabián Barrera Doncel.
CC 1.018.417.359
Cargo: Representante legal
Celular: 3132471470
Correo: administrativo@amcis.com.co
Página web: www.amcis.com.co

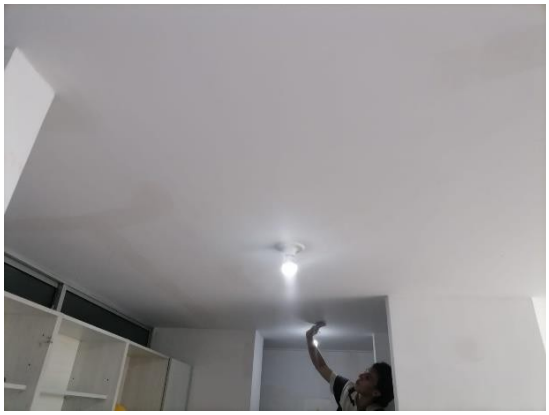	
INSTALACION ENCHAPE BAÑO	ENCHAPE PISO BAÑO
	
Resane techo Apto 204 Flor Amarillo	Muro pintado PTO 708 Flor Amarillo
	
Emboquillada Apto 708 Flor Amarillo	Demolicion Enchape

	
Desmonte aparatos sanitarios	Instalación de enchape piso Flor Amarillo
	
Desmonte muebles de cocina	Enchape piso Apto 503 T3 torres de leticia
	
Demolición enchape baños Apto 502 T2 torres de leticia	Instalación cielo raso Apto 503 T3 torres de leticia

	
Enchape piso sal Apto 503 T3 torres de leticia	Demolición enchape baños Torres Leticia
	
Cielo raso Apto T2 torres de Leticia	Demolición enchape baños Apto 502 T2
	
Instalación pintura muros	Desmonte de puertas Apto 503 T3

INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
AMCIS
INGENIEROS Y ASOCIADOS

Periodo:
01 al 30 de noviembre de 2024

Elaborado:

SST

CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS

2024

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control en cumplimiento a lo establecido a los aspectos de Seguridad y salud en el Trabajo, en el Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Describir actividades de SST que se realizaron durante el periodo estimado, las cuales ya se encuentran establecidas en el programa SST de la organización.

2. Generar registros de evidencias en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las actividades correspondientes al SST.

3. Verificar y validar de todas las actividades SST, establecidas cumplan según el contrato y normatividad legal vigente a la seguridad y salud en el trabajo.

4. Verificar el cumplimiento de los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal que se encuentre vinculado al contrato.

2. ALCANCE

El alcance de este documento es para el personal involucrado en el contrato, para evidencia y seguimiento, de esta manera garantizar la implementación y el cumplimiento del SST en pro de la seguridad y salud de los trabajadores y el entorno.

3. INTRODUCCIONES

En el presente informe evidencia la gestión, seguimiento e implementación, divulgación, gestión y seguimiento del SG SST con el fin de preservar la seguridad integral de cada colaborador, así como su salubridad, las actividades están siendo divulgadas, implementadas y ejecutadas para el contrato. Durante la gestión, se han efectuado acciones de implementación, acciones de divulgación y acciones de seguimiento de las actividades desarrolladas, y han sido verificadas las herramientas de control, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones previstas y determinadas, para el contrato de obra mencionado y el del SG-SST; para esto, se efectúa la supervisión diaria de estas actividades, con el personal profesional idóneo de la Firma Contratista y se evidencia en

registros físicos u anexos digitales, comprobando las acciones de ejecución, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 ASPECTOS BASICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores

4.1.1 Proceso de Planificación y Liderazgo de Alta Dirección

AMCIS diseño y estructuro el SG SST, para el contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estad de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.
Realiza la verificación e implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de la obra en el periodo presente informe.

4.1.2 Relación del Personal

Durante la ejecución del presente contrato se registra el siguiente personal, el cual cuenta con afiliación y pago de seguridad social del personal activo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
1	Edgar Tomas Cabrera Otálora	74861357	Ing. Residente
2	Sandra Jimena Mesa Cristancho	46383731	Residente SST
3	Edwin Orlando Páez Roncancio	11447178	Aux Ing. Residente
4	Cristian Andrés Pulido	1024529685	Maestro de obra
5	Juan Andrés Montaño Camacho	1113515872	Ayudante de obra
6	Jorman Jair Peinado Herrera	1066725528	Enchapador
7	William Fabián Jácome	1693879	Maestro de obra

4.1.3 Soportes Parafiscales

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361547-9	PYP BUILDING SAS	KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81868207	$1.553.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.800	0		0		0	7	100	0	1.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	53.800	0		0		0	7	300	0	54.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	53.800	0		0		0	7	300	0	54.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	7	1.100	0	209.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	631.000	0	0	0	0	7	3.200	0	634.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.000	0	0	0	0	7	100	0	7.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	287.600				287.600	7	1.500	289.100			2.875	289.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	197.800	7	1.000	198.800	7

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901381547-9	PYP BUILDING SAS		KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81868207	$1.553.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	213.400	214.700
Pensión	3	845.000	850.400
Riesgos Laborales	1	287.600	289.100
CCF	1	197.800	198.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.544.800	1.553.000

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361547-9	PYP BUILDING SAS	KR 78B 58P SUR 21	3118952840	cristian.pulido13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81868207	$1.553.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN AFP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007869029	FORERO GONZALEZ JULIANA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024529885	PULIDO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1066725528	PEINADO HERRERA JORMAN JAIR	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	17667128	MATIZ ROMERO ELISEO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
5	CC	17669150	MATIZ ROMERO MAUCEDONIO	1	0			S	X																25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
6	CC	1113515872	MONTAÑO CAMACHO JUAN ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1693879	JACOME JAIME WILLIAN FABIAN	1	0			S		X														230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900379839-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS	Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	08/11/2024	81641220	$1.209.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	2	200	0	104.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23202	Protección (ING + Protección)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	2	300	0	208.300	1
23301	Porvenir	800224808-5	416.000	0	0	0	0	2	600	0	416.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860039790-5	271.500				271.500	2	400	271.900			2.715	271.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	156.000	2	300	156.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	156.000	156.300
Pensión	2	624.000	624.900
Riesgos Laborales	1	271.500	271.900
CCF	1	156.000	156.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.207.500	1.209.400

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900979809-8	AMCIS Ingenieros y Asociados SAS		Calle 72 10 07 OF 1107	3008586756	christian.barrera@amcis.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	08/11/2024	81641220	$1.209.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Horas	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11447178	PAEZ RONCANCIO EDWIN ORLANDO	1	0			0																30	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	46383731	MESA CRISTANCHO SANDRA JIMENA	1	0			0																30	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	74861357	CABRERA OTALORA EDGAR TOMAS	1	0			0																30	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

5. MATRIZ

Se cuenta con una matriz de riesgos aplicada a la industria, los procesos y labores de acuerdo a las obras q se van a ejecutar.

Riesgos:
1. Biológico
2. Físico
3. Químico
4. Biomecánico
5. Condiciones de seguridad
6. Psicosocial
7. Fenómenos naturales

Para estos se busca controlar y mitigar los riesgos a los que nos encontramos expuestos en las labores realizadas.

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Dando cumplimiento al cronograma de inspecciones planeadas de acuerdo a los requerimientos.

1. Inducción
2. Inspecciones de Seguridad
3. Inspección de EPP
4. Locativa y puestos de trabajo
5. Entrega de EPP

7. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST

Se programan capacitaciones acordes a las labores a ejecutar, se dejan evidencia física y fotográfica.

INSPECCIONES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	PLANEADA	EJECUTADA
Inducción y/o reunión	Residente SST	Ocasional	1	2
Charlas de Seguridad	Residente SST	Diaria	24	24
Locativa	Residente SST	Semanal	4	4
EPP´s	Residente SST	Mensual	1	1
Orden y Aseo	Residente SST	Semanal	4	4
Herramientas	Residente SST	Semanal	4	4

CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS DE SST				
ACTIVIDAD		CHARLA 5 MIN		
N°	TEMA	Nov-24 REALIZADA		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
		SI	NO	
1	Trabajo en equipo	✓		Sandra Jimena Mesa C
2	Calistenia	✓		Sandra Jimena Mesa C
3	Prevención de accidentes	✓		Sandra Jimena Mesa C
4	Los riesgos del ruido	✓		Sandra Jimena Mesa C
5	Actitudes que causan accidentes	✓		Sandra Jimena Mesa C
6	Reunión	✓		Sandra Jimena Mesa C
7	Protección de la piel	✓		Sandra Jimena Mesa C
8	Conexiones eléctricas	✓		Sandra Jimena Mesa C
9	Charla motivacional	✓		Sandra Jimena Mesa C
10	Estilo de vida saludable	✓		Sandra Jimena Mesa C
11	Cuidado de ojos	✓		Sandra Jimena Mesa C
12	Inducción	✓		Sandra Jimena Mesa C
13	Trabajo seguro en alturas	✓		Sandra Jimena Mesa C
14	Uso adecuado de andamios	✓		Sandra Jimena Mesa C
15	Inspección de equipo para TA	✓		Sandra Jimena Mesa C
16	Líneas de vida	✓		Sandra Jimena Mesa C
17	Golpes de calor	✓		Sandra Jimena Mesa C
18	Riesgo biológico	✓		Sandra Jimena Mesa C
19	Uso adecuado de EPP´s	✓		Sandra Jimena Mesa C
20	Uso adecuado de escaleras	✓		Sandra Jimena Mesa C
21	Calistenia	✓		Sandra Jimena Mesa C
22	Uso adecuado de compresores	✓		Sandra Jimena Mesa C
23	Riesgo Quimico	✓		Sandra Jimena Mesa C
24	Reunión	✓		Sandra Jimena Mesa C

8. REPORTES DE ACIDENTES, INCIDENTES, ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS

REGRISTRO DE LABORES						
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ACTOS INSEGUROS**	**CONDICIONES INSEGURAS**	**INCIDENTES**	**ACCIDENTES**
1	Edgar Tomas Cabrera Otálora	Ing. Residente	0	0	0	0
2	Sandra Jimena Mesa Cristancho	Residente SST	0	0	0	0
3	Edwin Orlando Páez Roncancio	Aux Ing. Residente	0	0	0	0
4	Cristian Andrés Pulido	Maestro de obra	0	0	0	0
5	Juan Andrés Montaño Camacho	Ayudante de obra	0	0	0	0
6	Jorman Jair Peinado Herrera	Ayudante de obra	0	0	0	0
7	William Fabián Jácome	Maestro de obra	0	0	0	0
TOTAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES			**0**	**0**	**0**	**0**
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS			**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE COLABORADORES		**7**	**DIAS LABORADOS**			**24**

8.1 INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD Y SOPORTES

Durante el mes de noviembre no se reporta ningún tipo de accidente y/o incidente laboral

TOTAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL COLABORADORES	**7**	**DIAS LABORADOS**			**24**

$$TA = \frac{0\ TA}{7\ colaboradores} 0 * 100$$

TA = 0%

8.2 REPORTE RUAF

No se realiza el reporte respectivo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

8.3 INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES

Para el periodo correspondiente al mes de noviembre no se reporta accidentes por lo que no se realiza investigación de accidentes.

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE
RESULTADO	Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período	TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES * 100

FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	DIVULGACION
SG-SST	Residente SST	Mensual	Porcentaje	Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan X accidentes en el período.	0%	100%

8.4 INCAPACIDAD MEDICAS

Para el periodo correspondiente al mes de noviembre no se presentan incapacidades médicas.

8.5 LECCIONES APRENDIDAS

Para el periodo correspondiente al mes de noviembre no aplica.

8.6 REGISTRO DE FORMATOS DE CASI INCIDENTES

Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre no se presentan casi incidentes.

9. ENTREGA DE DOTACION

En cumplimiento a lo establecido en los reglamentos, se realiza entrega, cambio e inspección de dotación y EPP´s a los colaboradores.

10. PERMISOS DE TRABAJO

Se realizan los permisos de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollan.

10.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS

1. Se realiza programación de personal según las actividades y sitios de trabajo.
2. Se cumplen con las normas establecidas por la empresa AMCIS y sus políticas.
3. El personal cumple con el adecuado uso y cuidados de los EPP´s

11. GESTION AMBIENTAL

En cumplimiento a la gestión ambiental, el personal durante la inducción, charlas y actividades se les da a conocer lo correspondiente al manejo y separación de los residuos y materiales que se presentan durante los trabajos realizados en obra, esto con el fin de promover buenas acciones sobre el medio ambiente, como lo son: clasificación de residuos, actividades de orden y aseo, almacenamiento de materiales, recolección, transporte y disposición final de los desechos y escombros generados. Estas tareas son esenciales para evitar contaminación y garantizar el manejo de los recursos naturales.

Durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente a noviembre se realizan las siguientes acciones:

1. Recepción de materiales
2. Charlas e indicaciones referentes al tema ambiental
3. Puntos de acopio temporales de material
4. Manejo y disposición de residuos
5. Actividades de orden y aseo

12. CONCLUCIONES

AMCIS en cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas y ratificando su responsabilidad en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, hacen cumplir la normatividad legal vigente establecidas y practicas adecuadas en pro de mejorar en materia de SST y la de sus colaboradores, presentamos el siguiente informe, en efecto de analizar las practicas que se vienen realizando en cuanto a SST, donde se pueden identificar el compromiso por parte de la organización para su verificación

Elaboro:



Sandra Jimena Mesa Cristancho
Residente SST
AMCIS
