CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 11
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 11
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000971_H1 vigencia 2024
Nombre del Contratista:	**RADIOCOM S.A.S.**
Periodo informe:	**AGOSTO-DICIEMBRE DE 2024**
Nombre de Supervisor:	**JUAN GABRIEL TORO MOREIRA**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NOROCCIDENTE**

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E INSTALAR SISTEMA COMUNICACIÓN DE GESTION DE LAS RADIO AYUDAS DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE QUIBDO.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Con el fin de dejar constancia durante los meses de agosto-diciembre de 2024, se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **$412.369.474,50**, incluido el iva, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001	1, CABLE ARMADO DE FIBRA MONOMODO	2,500	Und.	8,346	19%	1,586	20.865.000
2	1001	2. PortServer	5	Und.	4.550.000	19%	864,500	22.750.000
3	1001	3. SWITCH 8 PTOS MINIMO CON DOS PUERTOS FIBRA FO SM	6	Und.	2.230.000	19%	423,700	13.380.000
4	1001	4. Conversor ethernet a fibra.	3	Und.	348,000	19%	66,120	1.044.000
5	1001	5. Bandeja de fibra completa	6	Und.	538,300	19%	102,277	3.229.800
6	1001	6. PATCH CORD DUPLEX SM LC APC 1.5 MTS	24	Und.	44,130	19%	8,385	1.059.120
7	1001	7. MODULO SFP FIBRA MONOMODO PARA SWITCH	12	Und.	525,000	19%	99,750	6.300.000
8	1001	8.GABINETE DE PARED 60 CMS	3	Und.	1.550.000	19%	294,500	4.650.000
9	1001	9. GABINETE EXTERNO INTERPERIE NEMA IP66 DKC	2	Und.	6.150.000	19%	1.168.500	12.300.000
10	1001	10. CAJAS DE PASO	13	Und.	1.350.000	19%	256,500	17.550.000
11	1001	11. Tuberia PVC 2"	750	Und.	27,650	19%	5,254	20.737.500
12	1001	12. Tuberia PVC 3"	750	Und.	43,850	19%	8,332	32.887.500
Total líneas o ítems: 16					**SUBTOTAL**			**249.271.720**
					IVA			**47.361.627**
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			**296.633.347**
					TOTAL MENOS RETENCIONES			**296.633.347**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	**1001**	**13. Cinta señalización de peligro de 25 cm de ancho x 100 mts.**	**8**	**Und.**	**135.250**	**19%**	**25.698**	**1.082.000**
14	**1001**	**14. Arena**	**76**	**Und.**	**126.800**	**19%**	**24.092**	**9.636.800**
15	**1001**	**15. Excavacion terrero pegregoso**	**750**	**Und.**	**92.000**	**19%**	**17.480**	**69.000.000**
16	**1001**	**16. Intslacion, y conformacion de la zanja según**	**1**	**Und.**	**12.800.000**	**19%**	**2.432.000**	**12.800.000**

		especificaciones tecnicas						

Total líneas o ítems: 16	**SUBTOTAL**	**249.271.720**
	IVA	**47.361.627**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**296.633.347**
	RETEFUENTE	**0**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	ANTICIPOS	**0,00**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**296.633.347**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001	Cajas de paso	15	Und.	1.350.000	19%	256.500	20.250.000
2	1001	Tuberia PVC 2"	400	Und.	27.650	19%	5.254	11.060.000
3	1001	Tuberia PVC 3"	400	Und.	43.850	19%	8.332	17.540.000
4	1001	Cinta señalizacion de	1	Und.	135.250	19%	25.698	135.250
5	1001	peligro de 25 cm de	40	Und.	126.800	19%	24.092	5.072.000
6	1001	ancho x 100 mts	400	Und.	92.000	19%	17.480	36.800.000
7	1001	Arena	1	Und.	6.400.000	19%	1.216.000	6.400.000
		Excavacion terreno pegregoso						
		Instalacion y conformacion de la zanja según especificaciones tecnicas						

Total líneas o ítems: 7	**SUBTOTAL**	**97.257.250**
	IVA	**18.478.878**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**115.736.128**
	RETEFUENTE	**0**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	ANTICIPOS	**0,00**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**115.736.127,50**








11/14/2024 11:36:17
REDMI NOTE 13 PRO
23mm f/1.6 1/637s ISO50






11/14/2024 11:35:59
REDMI NOTE 13 PRO
23mm f/1.6 1/1110s ISO50


11/14/2024 15:48:46
REDMI NOTE 13 PRO
23mm f/1.6 1/193s ISO50


11/14/2024 15:47:21
REDMI NOTE 13 PRO
23mm f/1.6 1/230s ISO50


11/14/2024 11:35:59
REDMI NOTE 13 PRO
23mm f/1.6 1/1110s ISO50



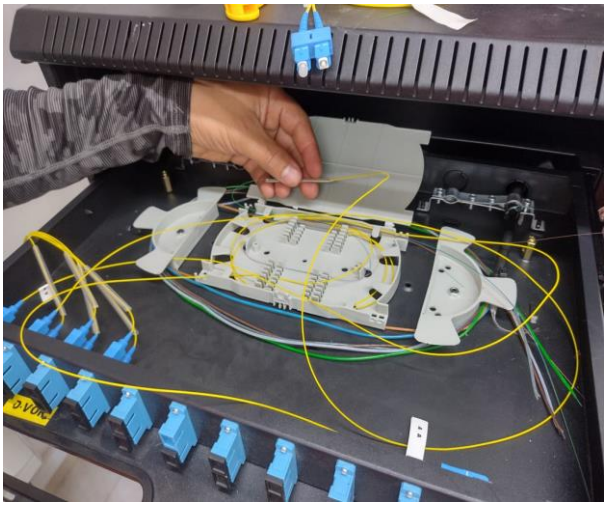






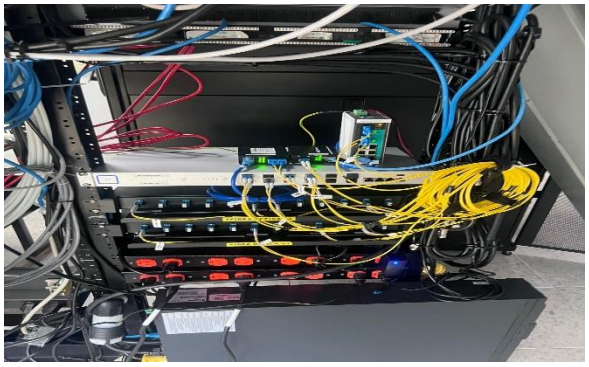


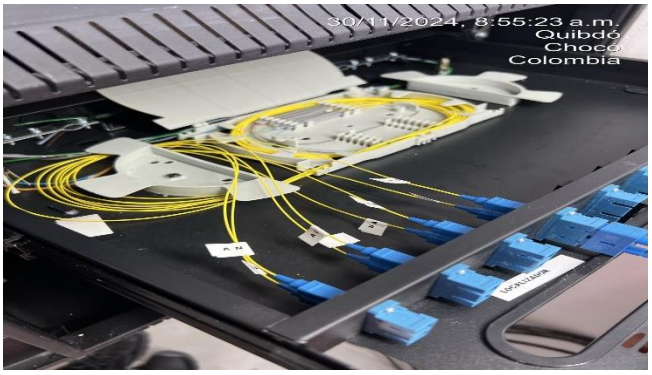


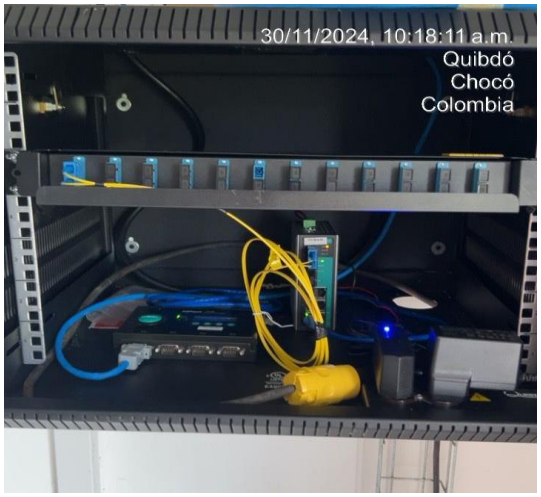



1 nov. 2024 11:22:13 a. m.
Quibdó
Chocó


1 nov. 2024 11:23:28 a. m.
Quibdó
Chocó

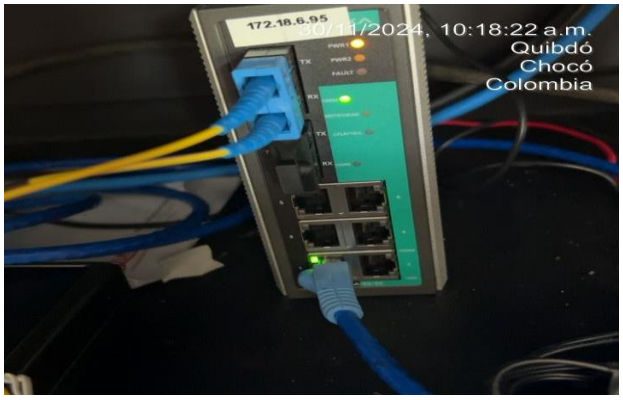



30/11/2024, 8:55:23 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia


30/11/2024, 10:18:11 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia

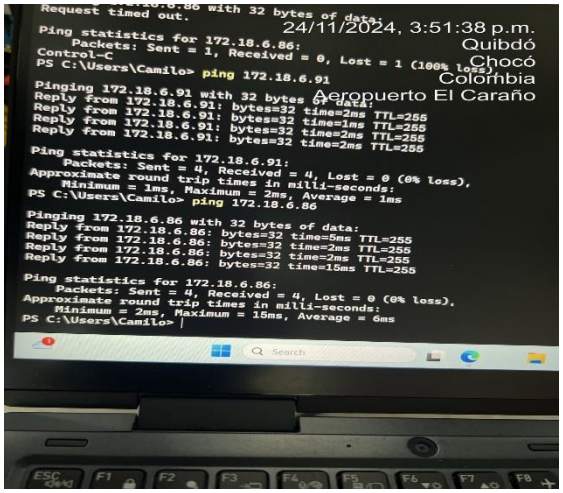

30/11/2024, 9:38:13 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Aeropuerto El Caraño


30/11/2024, 9:24:07 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Aeropuerto El Caraño

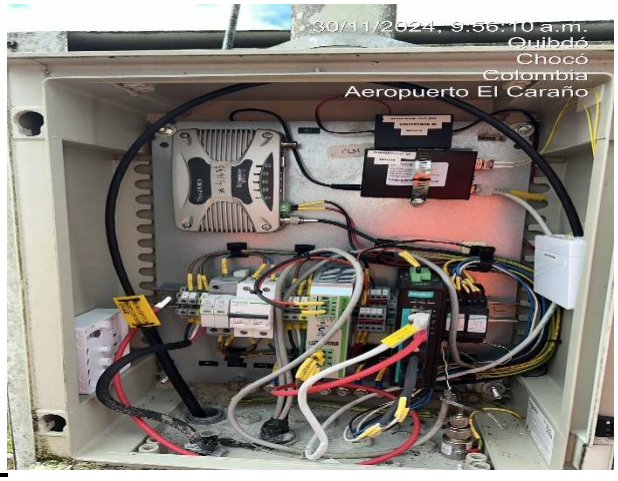

30/11/2024, 10:18:22 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia


30/11/2024, 8:55:52 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Aeropuerto El Caraño


30/11/2024, 8:55:36 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Fiber Ethernet
Media Converter


24/11/2024, 3:51:38 p.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Aeropuerto El Caraño
Request timed out.
Ping statistics for 172.18.6.86:
Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
Control-C
PS C:\Users\Camilo> ping 172.18.6.91
Pinging 172.18.6.91 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.6.91: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.18.6.91: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.18.6.91: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.18.6.91: bytes=32 time=2ms TTL=255
Ping statistics for 172.18.6.91:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
PS C:\Users\Camilo> ping 172.18.6.86
Pinging 172.18.6.86 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.6.86: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 172.18.6.86: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.18.6.86: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.18.6.86: bytes=32 time=15ms TTL=255
Ping statistics for 172.18.6.86:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms
PS C:\Users\Camilo>


30/11/2024, 9:24:10 a.m.
Quibdó
Chocó
Colombia
Aeropuerto El Caraño
REGULADOR
CONVERTIDOR DE
MEDIOS
10/100/1000Base-Tx to







b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Adquirir e instalar sistema comunicación de las radioayudas aeropuerto El Caraño de Quibdo	Varios		X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
É	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	PAGO REALIZADO	V/R PENDIENTE POR PAGAR
$296.633.347,00, INCLUIDO IVA		**$412.369.474,50, INCLUIDO IVA**
$115.736.127,00, INCLUIDO IVA		

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% al 13 de diciembre de 2024.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JUAN GABRIEL TORO MOREIRA
C.C. 1.036.928.566
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
