INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.1633726

Objeto: Contratar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo de maquinaria y equipos del Centro Agropecuario del SENA Regional Cauca–Alto Cauca, acorde a la ficha técnica o alcance del objeto.

Valor Total Contrato: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($43.485.200) M/cte. incluido IVA

Forma de Pago: Por la naturaleza del contrato de suministro al ser de tracto sucesivo, EL SENA pagará el valor del contrato al CONTRATISTA por el servicio contratado acorde a la facturación del suministro causado o entregado, una vez cumplidas las obligaciones contractuales previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. En ningún caso el contratista podrá facturar un valor superior al establecido en el presente estudio previo.
Nota aclaratoria: Sin embargo, si el servicio se requiere con antelación al plazo de ejecución del contrato por razones de urgencia o necesidad, el pago se supedita a esta circunstancia, lo que consecuencialmente reduciría el plazo total de ejecución pactado sin ningún problema y por ende, igualmente la forma de pago acaecería en menor tiempo. Igualmente, es procedente la aceptación de que, si el presupuesto atinente al valor de la oferta consagrada en la cláusula de valor total del contrato se agota antes del plazo del contrato, el número de pagos, por lógica o natural conclusión, se reduce.
Lo anterior, de acuerdo con la disponibilidad de PAC correspondiente y con el cumplimiento de los requisitos legales de facturación. Este hecho deberá realizarlo el contratista en la Tesorería del Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros ubicada en la Carrera 9N Número 71N-60.
Para efectos de realizar los pagos, **EL CONTRATISTA** debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución: registro presupuestal y aprobación de la garantía única.

CLÁUSULA
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.1. Generales: El contratista se obliga para con la entidad a ejecutar el objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas descritas y la propuesta que presente dentro del proceso. Además de las propias de la naturaleza del contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:
1) Cumplir con el objeto contractual durante el plazo de ejecución del contrato, en la forma establecida, de conformidad con los estudios previos, invitación pública y sus adendas, propuesta presentada y aceptada y lo establecido en las cláusulas del contrato que se suscriba.
2) Realizar las actividades necesarias para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas descritas en la invitación pública y sus adendas.
3) Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales) y pago de parafiscales de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y en tal sentido realizar oportunamente los pagos al personal que se contrate para la ejecución del contrato.
4) Cumplir con los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación en las cantidades, calidades específicas y descritas en la ficha técnica.
5) Mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa y con ocasión del contrato y la ejecución del mismo.
6) Atender las sugerencias y recomendaciones que haga la supervisión de contrato para el buen cumplimiento del objeto contractual.
7) Constituir en debida forma la suscripción del contrato, la garantía única, el Acta de Inicio y demás documentos que se requieran, según las condiciones establecidas por el Centro Agropecuario – SENA Regional Cauca y fijadas en el contrato.
8) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.
9) Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse y responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

10) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. En tal sentido, será obligación del contratista mantenerlas indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
11) Las establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
12) Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato designado para el control de la ejecución y cumplimiento del mismo.
13) El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe acogerse a la siguiente consideración contractual: "El contratista se compromete a tener una consideración especial a la protección de la salud y conservación del medio ambiente en cumplimiento de

Valor Parcial: Veinte Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil PESOS ($20.795.000) M/cte. incluido IVA.

Cordialmente,



Firma
VICTORIA EUGENIA CORDOBA LASSO
Contratista
C.C. No. 34.570.575 de Popayán

ANEXO: RELACION DE MANTENIMIENTOS CONTRATADOS

Obligaciones	
MATENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE PISO MAKITA, CAMBIO DE Bandejas de conduccion, cambio de diafragma, cambio de laser, cambio de base de fotocopiado, reinstalacion d e software actualizado, cambio de fuente de poder, cambio de toner y sujetador del mismo, reemplazo de computadora magnetica y de retorno	MATENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE PISO MAKITA, CAMBIO DE Bandejas de conduccion, cambio de diafragma, cambio de laser, cambio de base de fotocopiado, reinstalacion d e software actualizado, cambio de fuente de poder, cambio de toner y sujetador del mismo, reemplazo de computadora magnetica y de retorno
Mantenimiento correctivo Calentador de paso 20 litros	Mantenimiento correctivo del equipo Calentador de paso 20 litros del establo, arme y desarme para corrección de defectos, se entrega en condiciones de funcionamiento con garantía de 30 días por el buen uso del mismo al igual que estéticas, reeubicacion y mantenimiento full sistema diafragmatico.

	Mantenimiento correctivo Nevera de congelación de piso.	Mantenimiento correctivo del equipo nevera de congelación y refrigeracion, desarme para corrección de defectos, sustitución de piezas defectuosas como motor y refdrigerante los cuales estan presentando fallas por conexiones , instalación de cableado, instalación de gas , limpieza general, limpieza con productos acordes a las partes eléctricas y mecánicas el equipo se entrega en condiciones de funcionamiento con garantía de 30 días por el buen uso del mismo al igual que estéticas.
	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones electricas permanentes de Neveras de refrigeración.	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones electricas de cuatro neveras resultado de altibajos electricos en la granja, reemplazo de ocho (8) clavijas en los tomacorriente.
	Mantenimiento de Aires Acondicionados	Mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores de invernadero, arme y desarme para corrección de defectos, sustitución de piezas defectuosas, instalación de cableado, instalación de baterías nuevas si lo requiere, limpieza general, limpieza con productos acordes a las partes eléctricas y mecánicas el equipo se entrega en condiciones de funcionamiento con garantía de 30 días por el buen uso del mismo al igual que estéticas, reeubicacion de algunos.

AUTOCLAVE 20 Lt biotecnologia Animal	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Suminsitro e instalacion de cableado, mangueras y tuberia, reparacion del sistema eléctrico.Mantenimiento preventivo. Limpieza
Mantenimiento preventivo de container de biotecnologia Animal	Mantenimiento preventivo para corrección de defectos fisicos con pintura , sustitución de piezas defectuosas, instalación de cableado, instalación de clavijas y tomacorrientes, limpieza general, limpieza con productos acordes a las partes eléctricas y mecánicas el equipo se entrega en condiciones de funcionamiento con garantía de 30 días por el buen uso del mismo al igual que estéticas.
Mantenimiento correctivo de guadañas	Mantenimiento correctivo de motor de guadaña, reemplazo de motor, biela, piston, anillado, cambio de caña de dos (2) guadañas repuestos originanes certificados
Mantenimiento Correctivo de ierra Sin fin Para Alimentos Con Molino container	Mantenimiento Correctivo de ierra Sinfin Para Alimentos Con Molino, reemplazo de motor, sierra sin fin,reemplazop de molino, repuestos originanes certificados

Mantenimiento correctivo Motosierra sthill Original	Mantenimiento correctivo de Motosierra sthill Original al sistema electrico, ajuste y ampliacion de potencia,ajuste sustema de seguridad, reemplazo de espada corta y larga, reemplazo de cadena larga y corta; cambio de piston, cambio de carburador, cambio de biela y reemplazo de anillos, cambio de bujia, reemplazo de tarro de combustible, reemplazo de filtro de combustible el confort durante el trabajo, cilindrada 72.2 cc.**repuestos originanes certificados**
Mantenimiento motor maquina de ordeño ganaderia Bovina	Mantenimiento motor, maquina vacio, poleas, pezoneras, mangueras, calibracion de maquina de ordeño ganaderia Bovina cambio de todo el sistema de conduccion, pezoneras, calibracion de pulsadores, mangueras, reparacion de motor de vacio y electrico, cambio de polea, full service in situ.dos (2) mantenimientos al año
Mantenimiento motor maquina de ordeño ganaderia caprina, Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Reparación del motor, Instalación del equipo a todo costo. Mantenimiento preventivo. Limpieza	Mantenimiento motor maquina de ordeño ganaderia Bovina cambio de todo el sistema de conduccion, pezoneras, calibracion de pulsadores, mangueras, reparacion de motor de vacio y electrico, cambio de polea, full service in situ.dos (2) mantenimientos al año, ajuste e instalacion de lineas de electricidad, guarda motor, cableado electroico, tablero

Mantenimiento correctivo Molino de Carnes marca CITALSA.	Mantenimiento correctivo a todo costo Molino de Carnes marca CITALSA.reemplazo de piezas deterioradas full
COMPRESOR DE AIRE	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Suministro e instalacion de presostato, filtros, banda, llave de paso. Mantenimiento preventivo motor y pulmon. Limpieza
BOMBA DE AGUA	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Suminsitro e instalación de sellos y rodamientos, rebobinado. Mantenimiento preventivo. Limpieza
PLANTA ELECTRICA DISEL	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Eliminacion de residuos de combustible gasolina (El equipo funciona con Disel). Mantenimiento preventivo y limpieza
MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUADANA GENERICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUADANA GENERICA, CAMBIO DE REPUESTOS FULL
PICA PASTO	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Reparacion del motor a todo costo.Mantenimiento preventivo. Limpieza
ENSILADORA	Mantenimiento correctivo - preventivo. Incluye: Reparacion del motor a todo costo. Mantenimiento preventivo. Limpieza

Servicio de mantenimiento correctivo del sistema electrico de los tractores Masey Ferguson modelo 290 Y 296 existentes en el hangar de maquinaria agricola del Centro Agropecuario, el mantenimeinto va orientado a la revison y mantenimeinto de las partes del sistema electrico de acuerdo a lo referido en el manual de partes de los tractores ademas cambio de la bateria de los dos tractores masey Ferguson antes referenciados, cambio del alternador del tractor Massey Ferguson modelo 296	Servicio de mantenimiento correctivo del sistema electrico de los tractores Masey Ferguson modelo 290 Y 296 existentes en el hangar de maquinaria agricola del Centro Agropecuario, el mantenimeinto va orientado a la revison y mantenimeinto de las partes del sistema electrico de acuerdo a lo referido en el manual de partes de los tractores ademas cambio de la bateria de los dos tractores masey Ferguson antes referenciados, cambio del alternador del tractor Massey Ferguson modelo 296
Mantenimiento para reemplazo de Bateria Referencia 6-QW-120(850)-T-12 VOLTIOS 120Ah CCA 850 A	Mantenimiento para reemplazo de Bateria Referencia 6-QW-120(850)-T-12 VOLTIOS 120Ah CCA 850 A
Manteniumiento Para reemplaO de alternador BOSCH IND BRASILERA 9 120 080 091 K1-14V 35A20	Manteniumiento Para reemplaO de alternador BOSCH IND BRASILERA 9 120 080 091 K1-14V 35A20
PLANTA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo, verificacion de encendido y funcionamiento. Limpieza

MANTENIMIENTO CORRECTiVO DE MOTOPROPULSOR Y SUS COMPONENTES IDENTIFICADOR DE RAYOS RGB	Mantenimiento preventivo, verificacion de encendido y funcionamiento, Reemplazo delas siguientes partes: motopropulsor, Chasis, marco, fuselaje, Baterías (3) de cadmio , sistema helicoidal por cuatro unidades y sus repuestos, Placa controladora, giroscopio, Sensores de altitud, sensor de vibracion, brujula, sensor de velocidad y posicion, estacion de control,Emisor/receptor de señal, Elementos de visualización y gestión de datos, Reguladores de velocidad o ESC, Gimbal o cardán, Cámara, control de mando inalambrico, el reemplazo de estos elementos debe garantizar un año de garantia , reemplazo maaletin de transporte, reemplaso baterias (3) litio, reemplazo HJElice (4).
PLANTA ELECTRICA	Mantenimiento preventivo, verificacion de encendido y funcionamiento. Limpieza

EVIDENCIAS

































PHOGAS
TURBO


KIT ANALISIS
DE AGUAS

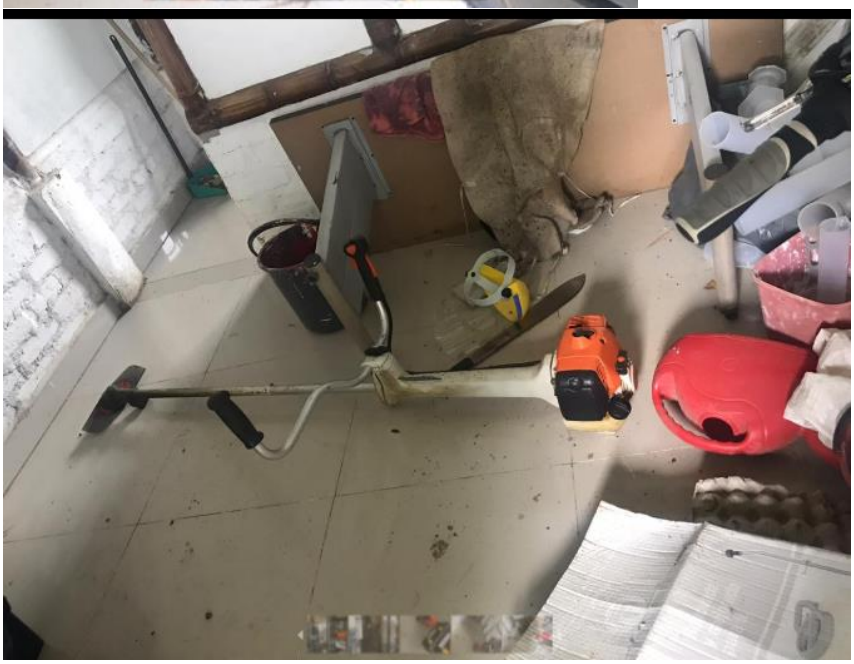


Eternit





