
INFORME No. 06

FINAL

PERIODO: 12 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 16 DE ENERO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. **1262-2024** DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

829000757-4

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 3
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA 6
4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 7
5. LOCALIZACIÓN 7
6. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO: 7
7. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 8
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES PARA EL ACTA PARCIAL 02. 10
9. REGISTO FOTOGRAFICO 10
10. OTROSÍ MODIFICATORIO DE CANTIDADES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
11. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 13
11.1 Avance físico 13
11.2 Avance en tiempo 13
11.3 Avance financiero: 14
12. REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO: 14
13. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 16
13.1 GESTION SST DEL MES: 16
14. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 21
14.1. COMPONENTE AMBIENTAL 21
14.2. REGISTRO FOTOGRAFICO 22
15. SEGUIMIENTO SOCIAL 23
16. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 23
17. ACTAS DE LA INTERVENTORIA 25
18. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 25
19. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 25
20. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 26
21. ACTAS DE COMITÉ O REUNION 27
22. CORRESPONDENCIA ENVIADA 27
23. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 27
24. RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 27

25. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 27
26.1. FORMA DE PAGO 28
26. RESUMEN BALANCE FINANCIERO 28
27. CURVA DE AVANCE FISICO 29
28. CONCLUSIONES 30
29. ANEXOS 30

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El Distrito de Barrancabermeja Santander mediante la adjudicación del **contrato de obra pública No. 1261-24** a la empresa contratista **UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA**. Se procede a la ejecución del proyecto cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."**, por un valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)**, con un plazo de ejecución de **SEIS (06) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La realización del proyecto se lleva a cabo a través de la construcción de la línea de conducción de agua potable en diámetros 3" y 4" desde la línea de conducción de 10" en material PVC del acueducto La Fortuna hasta la vereda la Cascajera del corregimiento La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, con el fin de garantizar el servicio de agua potable, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

Dentro del objeto contractual se Incluyen las siguientes actividades principales:

Preliminares: Comprende las actividades de Localización y replanteo acueducto, retiro de material sobrante forma manual, bombeo y manejo de agua, excavación y descapote manual.

Movimiento de Tierra: Comprende las actividades de excavación manual y relleno. Concretos, pavimentos y andenes: comprende la actividad de concreto para atraque. Suministro e instalación tubería de acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de tubería.

Suministro e instalación accesorios acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de TEE, reducción, codo, tapón, uniones de reparación y adaptador brida.

Elementos hidráulico acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de válvulas y collarines.

Actividades Complementarias: Comprende las actividades de empalme de tubería, instalación de acometida domiciliaria incluye medidor, caja plástica y tapa de seguridad, y kit de contra bridas, tornillos, tuercas, arandelas y empaque.

En el siguiente informe correspondiente al se detalla a manera descriptiva las actividades establecidas mediante ítems de pago realizadas en el periodo comprendido entre el día **DOCE (12) de DICIEMBRE de 2024 al DIECISEIS (16) de ENERO de 2025** y se exponen los lineamientos de tipo administrativo, ambiental y financiero, con el fin de presentar el **Acta de recibo final** del contrato de obra en mención.

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	1261–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA
NIT	901819149-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
IDENTIFICACION	C. C. 63.507.675 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPO-009-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-09556 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098); Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 5523 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091, Fuente: Nación, por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098).
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02970 DEL 3 DE MAYO DE 2024 SGR - 324 del 2024-05-03
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14452851 CO1.WRT.14452698 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 CO1.WRT.144824497 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPPA No.	8784 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Se adjuntan pólizas iniciales, pólizas del adicional N.1 en plazo y pólizas después de suspensión y reinicio. (VER ANEXOS)

Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2025	$193,140,807.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/01/2028	$96,570,403.80
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2030	$193,140,807.60
Predios, labores y operaciones	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Vehículos propios y no propios	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Responsabilidad civil cruzada	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00


Gastos médicos	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00

4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en la vereda La Cascajera situada en el corregimiento de la Fortuna, zona rural de Barrancabermeja.

5. LOCALIZACIÓN

Corregimiento La Fortuna noreste del Distrito de Barrancabermeja, Santander.



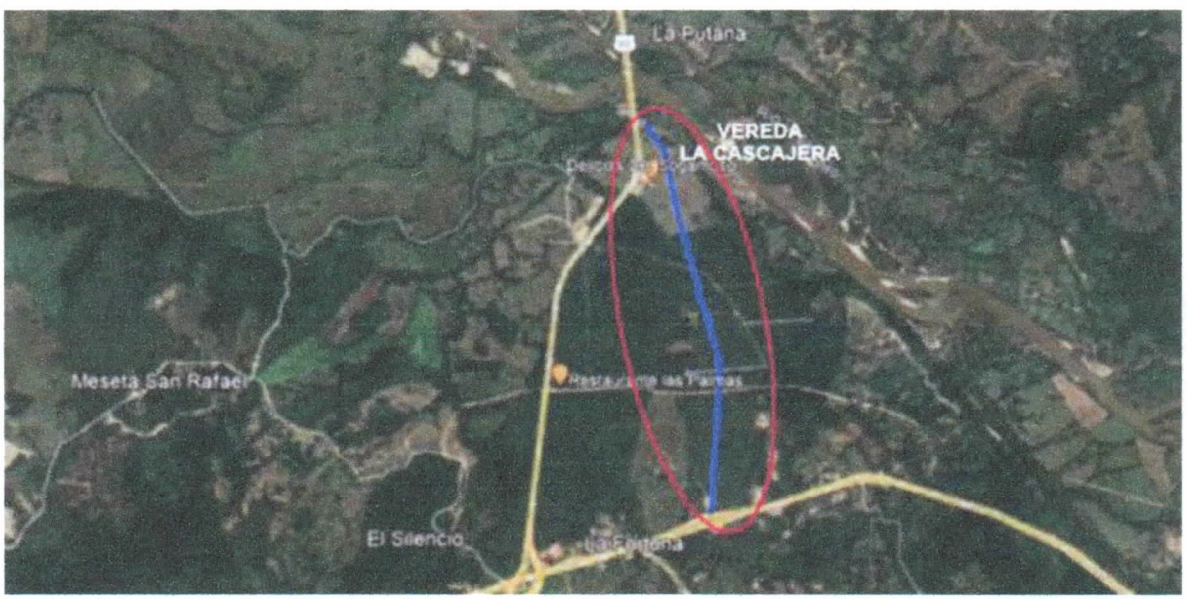


MATERIALES

Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

6. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se localizará el Corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja.

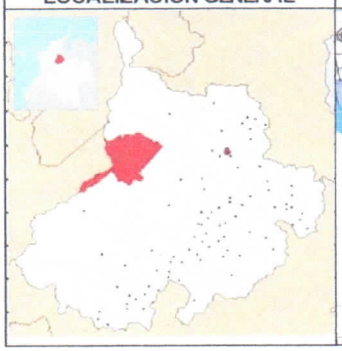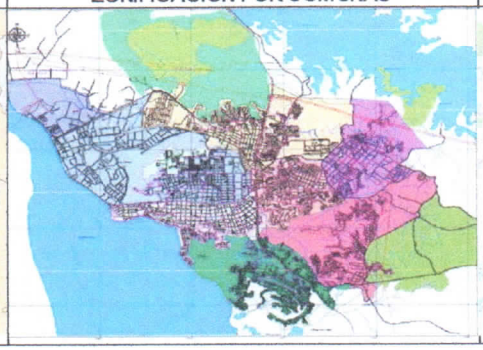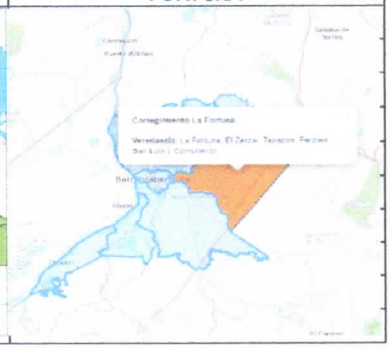LOCALIZACIÓN GENERAL	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA ZONIFICACIÓN POR COMUNAS	LOCALIZACIÓN CORREGIMIENTO LA FORTUNA
		

7. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante el último período de ejecución, se realizaron trabajos correspondientes a la construcción de cajas de inspección, que según el diseño de ingeniería se dividen en dos tipos. Una de ellas es de concreto reforzado con dimensiones de 1 m x 1 m, y la otra tiene dimensiones de 1,2 m x 1,2 m. Posteriormente, se completará la instalación de las acometidas domiciliarias, cada una con su respectivo micromedidor y caja plástica.

Las cantidades ejecutadas se respaldan en las memorias de cantidades anexas a este informe, así como en el acta final del contrato de obra pública 1261-24.

Anexo 01. Acta final.
Anexo 02. Memorias de cantidades.


Las actividades realizadas se detallan a continuación:

- **Acometidas domiciliarias nuevas tipo flexible:**

Esta actividad corresponde a el suministro, colocación e instalación de acometida domiciliaria tipo flexible de 3x1/2". Incluyendo micromedidor y caja con tapa de seguridad. Así mismo el suministro e instalación de los accesorios, uniones, (collares de derivación 3x1/2".), tubería de polietileno PEAD 20 mm, válvulas y otros elementos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad, también comprende la unión, limpieza interior y cualquier otra operación necesaria para la correcta instalación de los elementos.

Las tuberías desde el collarín de derivación hasta el micromedidor se instalan en material polietileno PEAD de 20mm de alta densidad con alto esfuerzo para conducción de fluidos a presión con base en el diámetro exterior controlado.

A continuación, se ilustra esquema de instalación para acometida domiciliara descrita:

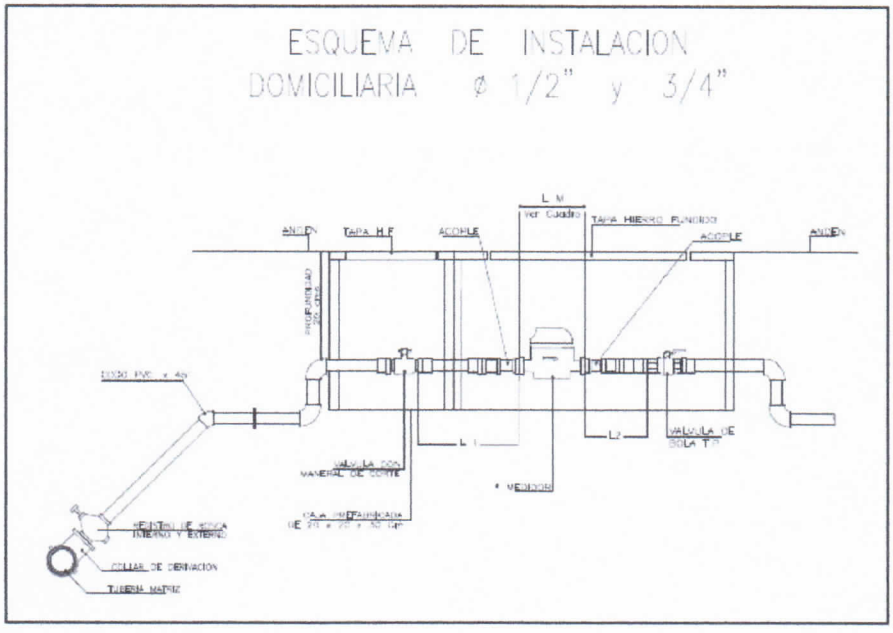

- **Construcción de cajas de inspección.**

Este ítem contractual de cajas de inspección abarca las actividades de construcción relacionadas con el suministro y corte de acero, la colocación de concreto para la caja de inspección tipo, y la fabricación de la tapa de la caja, incluyendo la tapa de acceso, según el diseño de ingeniería.

Dentro del alcance se contempla dos tipos de caja según funcionabilidad:

- CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS (Incluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado)

- CAJA EN CONCRETO REFORZADO 1.2X1.2 E=0.20 m PARA VALVULAS VENTOSAS (INCLUYE TAPA HD CB D400 24" - ARO 10C)

En este sentido, se procedió a la construcción de estas cajas de acuerdo al diseño hidráulico correspondiente a una funcionabilidad para sistemas de purgas, válvulas de control y/o colocación de válvulas ventosas.

- **Actividades Seguridad y salud en el trabajo:**


De acuerdo con el cumplimiento SST del proyecto, se contempló la gestión y desarrollo de diferentes actividades buscando las buenas prácticas enfocadas a la seguridad y salud en el trabajo mediante diferentes actividades durante la ejecución del contrato.


8. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES PARA EL ACTA PARCIAL 02.

A continuación, se relacionan cantidades parciales a cobrar en el acta parcial 02.

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
7000	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO**		
7042	ACOMETIDA DOMICILIARIA NUEVA TIPO FLEXIBLE 3" x 3/4" (Incluye Micromedidor Clase C, Caja Plástica y Tapa de Seguridad)	UND	35,00
9000	**ESTRUCTURAS ACUEDUCTO**		
9001	CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS (Incluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado)	UND	10,00
9016	CAJA EN CONCRETO REFORZADO 1.2X1.2 E=0.20 m PARA VALVULAS VENTOSAS (INCLUYE TAPA HD CB D400 24" - ARO 10C)	UND	9,00
	PRESUPUESTO SST & AMBIENTAL		
1	BARRERA CON CINTA PLASTICA (Incluye base en madera)	MTS	39,29
3	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MES	2,00
6	SUMINISTROS DE HIGIENE PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA.	MES	2,00

9. REGISTO FOTOGRAFICO

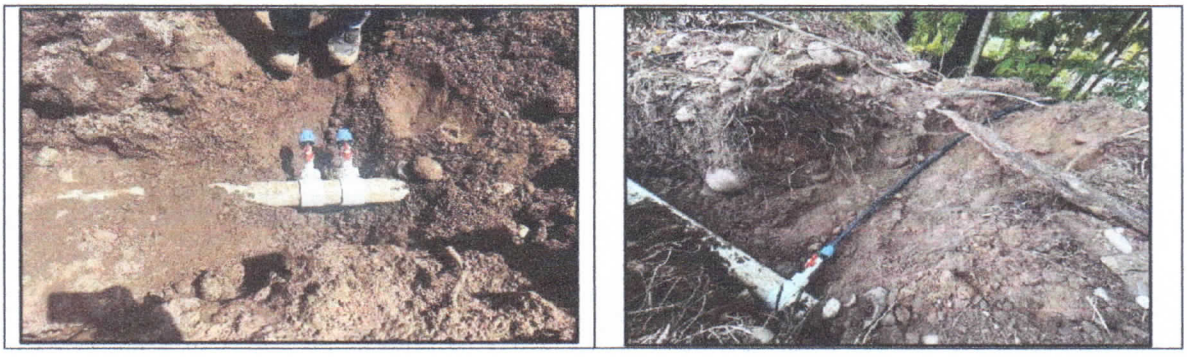

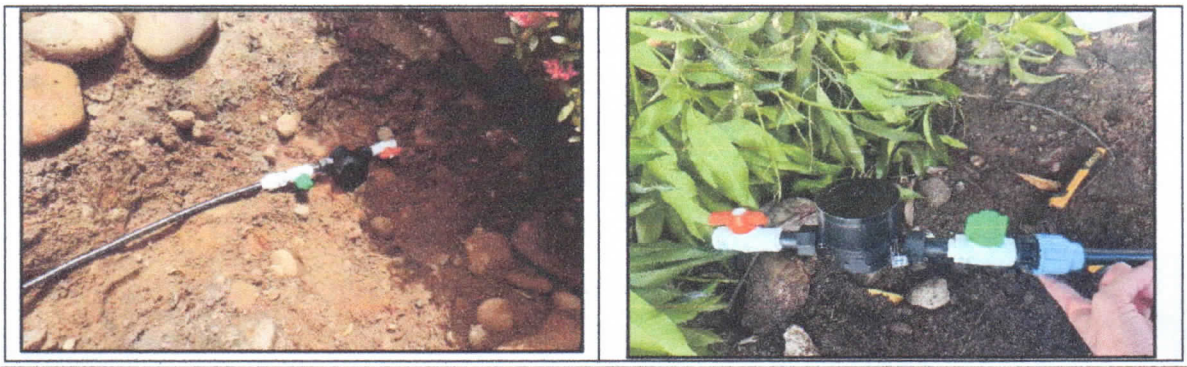




- **Acometidas domiciliarias nuevas tipo flexible:**





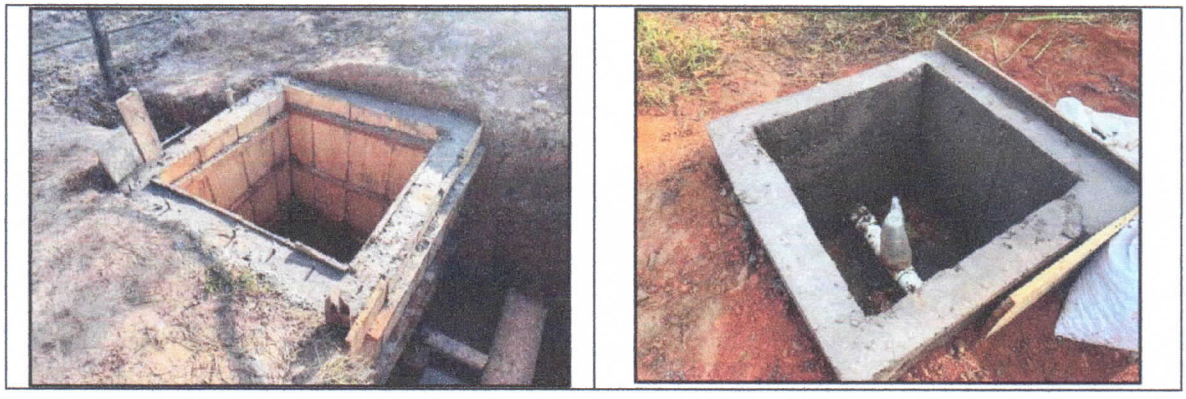



- **Construcción de cajas de inspección**







- **Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo**

10. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

10.1 Avance físico

El Contrato tiene ha culminado con un avance total del 100,00 %, según lo programado.

PROGRAMADO VS EJECUTADO



10.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES	6 MESES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL TIEMPO DEL CONTRATO	100,00 %

10.3 Avance financiero:

Durante el periodo, se presenta ACTA PARCIAL 03, por tanto, se presentan los siguientes avances financieros para los contratos en relación.

CONTRATO DE OBRA 1261-24 (CONTRATISTA):

CONCEPTO	FECHA (DD/MM/AA)	VALORES	PORCENTAJE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR
Anticipo					N/A
Acta pago parcial No. 1	02/09/2024	$ 210.897.926,00	21,84 %	$ 00,00	$ 00,00
Acta de Pago Parcial No. 2	11/12/2024	$ 654.108.014,00	67.73 %	$ 00,00	$ 00,00
Acta de Pago Parcial No. 3	16/01/2025	$ 100,698.098,00	10,43 %	$ 00,00	$ 100,698.098,00
TOTALES		$ 865.005.940,00	**89.57 %**	**$ 00,00**	$ 654.108.014,00


CONTRATO DE CONSULTORÍA 1262-24 (INTERVENTORIA):


CONCEPTO	FECHA (DD/MM/AA)	VALORES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR
Anticipo					N/A
Acta pago parcial No. 01	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84 %	$ 0,00	$ 0.00
Acta pago parcial No. 02	11/12/2024	$ 47.416.215,00	67.73 %	$ 0.00	$ 0,00
Acta de Pago Parcial No. 03	16/01/2025	$ 7.301.803,32	10,43 %	$ 0,00	$ 7.301.803,32
TOTALES		$ 70.007.700,00	**100,00 %**	**0,00**	$ 7.301.803.32

11. REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO:

A continuación, se relaciona reporte del tiempo correspondiente al periodo comprendido entre diciembre del 2024 y enero del 2025

DICIEMBRE

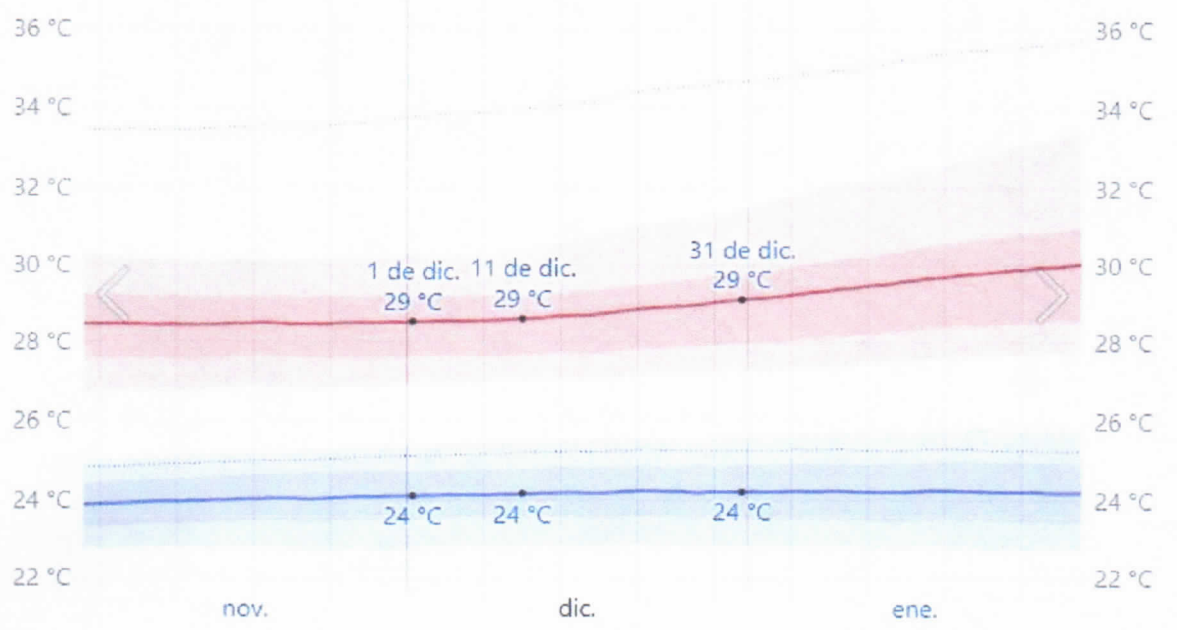
36 °C
34 °C
32 °C
30 °C
28 °C
26 °C
24 °C
22 °C
1 de dic.
29 °C
11 de dic.
29 °C
31 de dic.
29 °C
24 °C
24 °C
24 °C
nov.
dic.
ene.

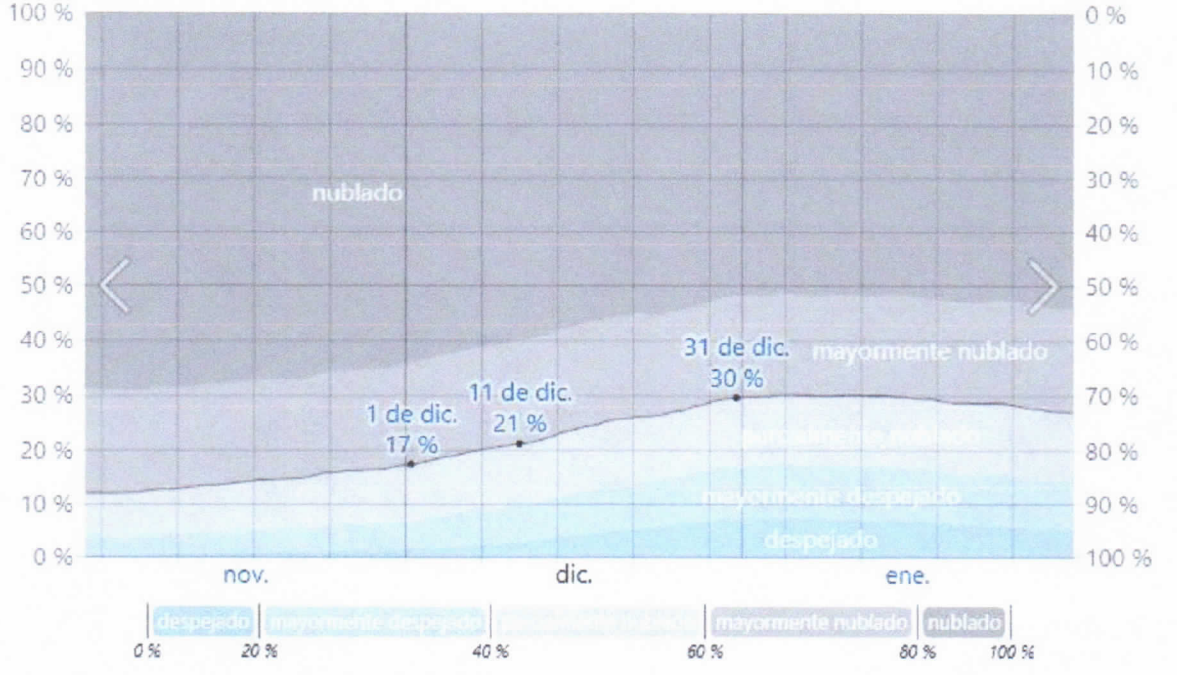
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
nublado
1 de dic.
17 %
11 de dic.
21 %
31 de dic.
30 %
mayormente nublado
despejado
nov.
dic.
ene.
despejado
mayormente despejado
mayormente nublado
nublado
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

ENERO

Fecha	Temperatura del aire, °C				Precipitación mm
	Mínimo	Medio	Máximo	Desviación de la norma	
1	23.7	26.5	30.7	-1.8	0.0
2	23.0	27.4	32.8	-0.9	8.0
3	23.0	25.0	28.6	-3.4	0.4
4	24.0	27.5	32.3	-0.9	6.0
5	23.2	25.7	29.0	-2.7	1.0
6	23.1	27.2	32.2	-1.2	0.0
7	24.0	28.9	33.3	+0.5	0.5
8	24.0	28.7	34.8	+0.3	0.0
9	24.3	28.5	32.8	0.0	0.0
10	24.4	28.5	34.2	0.0	0.4
11	25.2	28.0	33.6	-0.5	0.0
12	24.5	28.8	33.4	+0.3	0.0
13	23.9	28.8	33.5	+0.3	0.0
14	24.6	28.7	32.7	+0.1	0.0
15	19.2	25.7	33.6	-2.9	0.0
16	23.5	28.9	33.0	+0.3	0.0

En este sentido, que diciembre fue un mes donde las temperaturas maximas llegaron a 34c y hubo un maximo de 30% de lluvia, y para enero se ha registrado un maximo de 34c siendo un mes de sequia, lluvias solo los primeros dias del mes de eneo del 2025.

12. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

12.1 GESTION SST DEL MES:

- ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

Durante este mes la interventoría ha realizado seguimiento al contratista para velar por el cumplimiento del uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 5 (*reposición de epp)*

- CHARLAS DIARIAS HSE

La interventoría hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y SST operativo.

ANEXO 6 (Charlas *de seguridad*)

- INSPECCION DE HERRAMIENTAS

También se hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.

ANEXO 1 (Inspección de herramientas)

- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado

ANEXO 8 (Pago de planillas)

- RELACION PERSONAL DE OBRA

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ESTADO
1	JAIME HERNAN	MARTINEZ PLATA	Directora de Obra	ACTIVO
2	ELKIN FABIANO	VERGEL PEREZ	Residente de Obra	ACTIVO
3	JULIETH MARCELA	OLIVEROS FRANCO	HSE	ACTIVO
4	JHON HENRY	VALDERRAMA ALARCON	Ingeniero Ambiental	ACTIVO
5	MARBIE ROSSNA	VEGA RUIZ	Trabajadora social	ACTIVO
6	FABIAN MAURICIO	ROJAS VARGAS	Supervisor	ACTIVO
7	JULIETH NATALIA	BONILLA HERNANDEZ	Auxiliar HSE	ACTIVO
8	RAUL	JAIMES	Obrero	RETIRADO
9	CAMILO	VALDIVIESO MUÑOZ	Obrero	RETIRADO
10	ONOFRE	PEREZ CARRASCAL	Obrero	RETIRADO
11	JAIDER ENRRIQUE	SEGURA LUNA	Obrero	RETIRADO
12	JHON FREDDY	SISA JAIMES	Obrero	RETIRADO
13	BENUR	GONZALEZ RAMIREZ	Obrero	RETIRADO
14	EUDY	ARENIS DURAN	Obrero	RETIRADO
15	ESNEIDER JESUS	VEGA ANGARITA	Obrero	ACTIVO
16	ELKIN MANUEL	LOBO GUERRA	Obrero	RETIRADO
17	SERGIO ANDRES	VEGA MUÑOZ	Obrero	RETIRADO
18	JHON JAIRO	SUAREZ GARCIA	Obrero	RETIRADO
19	ELIBERTO	ARDILA BENAVIDES	Obrero	RETIRADO
20	LUIS MIGUEL	PINTO GONZALEZ	Obrero	RETIRADO
21	EDUIN ENRIQUE	ANGARITA SANCHEZ	Obrero	RETIRADO

- **AUSENTISMO LABORAL**

Durante este período no se presentó ausentismo laboral

- **ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES**

Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales

- **REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS**

Durante este periodo se generaron 1880 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

- **REPORTE DE HORAS CAPACITACION**

Durante este periodo se generaron 6,4 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

H.H. CAPACITACIÓN	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	6,4
AUDITORIAS Y VISITAS DE SEGURIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSPECCIONES	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ACCIDENTES E INCIDENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACCIDENTES/ INCIDENTES AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SOCIALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD X EFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD CON OCASIÓN AL TRABAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES**

CHARLAS ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES





SEÑALIZACION





REPOSICION EPP



13. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

14.1. COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista realiza las actividades de la obra, cumpliendo con el cuido del medio ambiente.

Se realizó continuo seguimiento para este periodo la reposición de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores del proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 5** (Inspección y entrega de EPP) del ítem de SST al inicio de este informe.

- **INSPECCIÓN Y ENTREGA DE EPP**

Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín

de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

- **EXCAVACIÓN**

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

- **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS**

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido$ = $NOquejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido$ = 0

14.2. REGISTRO FOTOGRAFICO





PUNTO ECOLOGICO





Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

14. SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento de todas las actividades sociales, reuniones con la comunidad.

OJO: TODO ESTO LE CORRESPONDE A USTED

15. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	1262–24
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	ICI LTDA
NIT.	:	829000757-4
REP LEGAL	:	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	:	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	:	calle 42 21-79.
TELÉFONO	:	311 4226323

CORREO ELECTRÓNICO	:	interventoriaici.ltda@gmail.com
LOCALIZACIÓN	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FETCHER
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	:	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	17 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SEIS (6) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023
CEPAA	:	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	:	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	:	16 DE ENERO DEL 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	100,00 %
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	12 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 16 DE ENERO DEL 2025
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°3	:	**$ 7.301.803,32**
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	:	**$ 7.301.803,32**

16. ACTAS DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO INICIAL + ADICIONAL				
Concepto	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valores**	**Porcentaje**	**Porcentaje acumulado**
Pago parcial No. 1	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84%	21,84%
Pago parcial No. 2	11/12/2024	$ 47.409.214,44	67,72%	89,56%
Acta de Recibo final	16/01/2025	$7.308.803,88	10,44%	**PENDIENTE POR PAGAR**
ACUMULADO		**$ 70.007.700,00**		

17. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)	VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)
Cumplimiento	$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2025
Salarios y Prestaciones sociales	$ 7.000.770,00	17/07/2024	17/01/2028
Calidad del servicio	$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2030

18. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.1261-2024.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente a calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

Se presenta en conjunto con el contratista el Acta Parcial de Obra No. 3 y se prepara el Acta de Liquidación del Contrato.

19. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

El día 03 de diciembre se aprueba OTROSÍ modificatorio No. 3 al contrato de Obra 1261-24, correspondiente a la modificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, en el mismo sentido se firma Acta de pactación de precios de ítems no previstos.

El día 16 de enero de 2025, se presenta el Acta final y se inicia la preparación del acta de liquidación del contrato.

20. ACTAS DE COMITÉ O REUNION

Durante este periodo no se realizaron acta de seguimiento del contrato, las cuales se encuentran en los anexos.

21. CORRESPONDENCIA ENVIADA

3/01/2025: solicitud planilla de seguridad social mes de diciembre del 2024
13/01/2025: solicitud informe final.

22. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

18/12/2024: entrega informe técnico, informe hse y anexos.
06/01/2025: entrega pago planilla de seguridad social
16/01/2025: entrega informe mes de enero 2025

23. RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JESSICA PAOLA FORERO AVILA	1.096.226.065	ING RESIDENTE

24. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de SETENTA MILLONES SIETE MIL SETESCIENTOS PESOS CON M/CTE ($ 70.007.700,00) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

26.1. FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

   El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b. Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

   El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del distrito.


   Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

   En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

25. RESUMEN BALANCE FINANCIERO

ACTAS PARCIALES				
Concepto	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valores**	**Porcentaje**	**Porcentaje acumulado**
Pago parcial No. 1	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84%	21,84%
Pago parcial No. 2	11/12/2024	$ 47.409.214,44	67,72%	89,56%
Acta de Recibo final	16/01/2025	$7.308.803,88	10,44%	**PENDIENTE POR PAGAR**
ACUMULADO		**$ 70.007.700,00**		

26. CURVA DE AVANCE FISICO

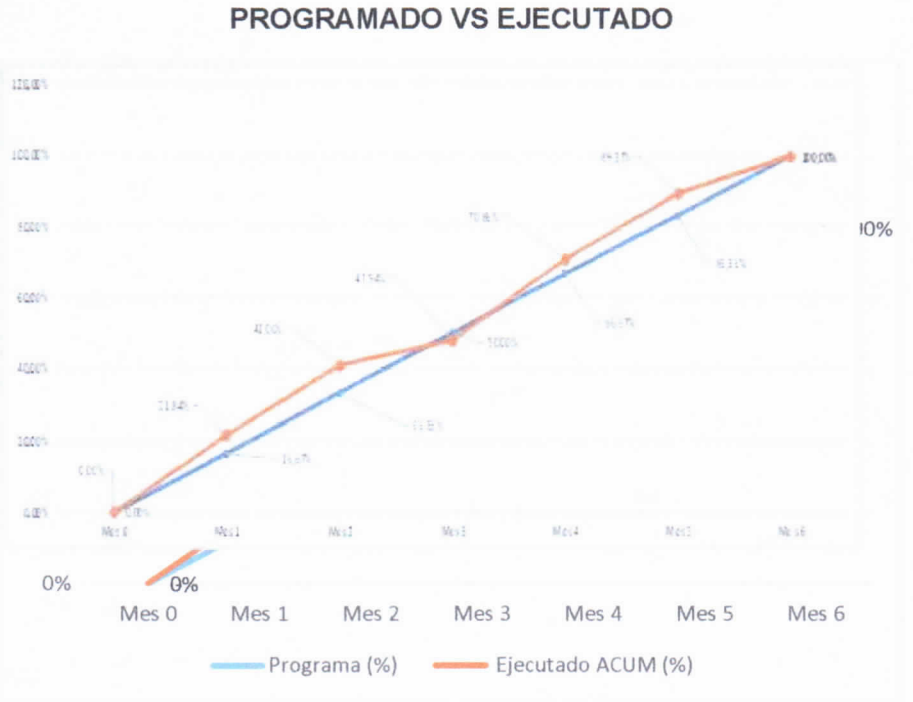

27. CONCLUSIONES

- Durante este sexto mes se presenta un avance físico del 100,00 % vs un programado del 100,00 %.

- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría.

JUAN PABLO CASTELLANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

28. ANEXOS

- Anexo 1: Pago seguridad social interventoría
- Anexo 2: Pago seguridad social contratista
- Anexo 3: Bitácora de obra
- Anexo 4: Oficios enviados y recibidos
- Anexo 5: Actas finales de obra e interventoría
- Anexo 6: Anexos HSE contratista

- Anexo 1: pago de seguridad social interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096226065
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000757
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 42 21 79 BARRIO LA VICTORIA	TELÉFONO:	6009251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096226065
APELLLIDOS:	FORERO AVILA	NOMBRES:	JESSICA PAOLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7954166060	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2025	FECHA DE PAGO:	30/12/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN										SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.300.000																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 402.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

22

- Anexo 2: pago de seguridad social contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901819149	3	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	E MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 68 28 43	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3175094534	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1-12	2025-01	177976427	9479999585	E	2025/01/14	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$5,375,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$12,100,000	$1,936,000			$12,100,000	$1,512,500			$12,100,000	$484,000			$12,100,000	$842,300		12,100,000	$605,000
tro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)						$12,100,000	$1,936,000			$12,100,000	$1,512,500			$12,100,000	$484,000			$12,100,000	$842,300		$12,100,000	$605,000
ad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (8 dos)						$12,100,000	$1,936,000			$12,100,000	$1,512,500			$12,100,000	$484,000			$12,100,000	$842,300		$12,100,000	$605,000
	CC	63507675	CAMARGO CAMACHO ZULMA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	1098712774	MARTINEZ PLATA JAIME HERNAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF38	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000
	CC	1096207694	OLIVEROS FRANCO JULIETH MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	91489847	ROJAS VARGAS FABIAN MAURICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	13850736	VALDERRAMA ALARCON JHON HENRY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	1118826262	VEGA ANGARITA ESNEIDER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	1096205115	VEGA RUIZ MARBIE ROSANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
	CC	88282070	VERGEL PEREZ ELKIN FABIANO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
tal	Afiliados(8)					$12,100,000	$1,936,000			$12,100,000	$1,512,500			$12,100,000	$484,000			$12,100,000	$842,300		$12,100,000	$605,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

'OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01819149	3	JNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 68 28 43	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3175094534	No

'OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-12	2025-01	177976427	9479999585	E	2025/01/14	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$5,379,800

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,936,000	$0	$0	$1,936,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,312,000	$0	$0	$1,312,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				8	$842,300	$0	$0	$842,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$842,300	$0	$0	$842,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				8	$484,000	$0	$0	$484,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	$484,000	$0	$0	$484,000
(ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,512,500	$0	$0	$1,512,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$700,000	$0	$0	$700,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$0	$325,000
F (ADMINISTRADORAS 1)				8	$363,000	$0	$0	$363,000
NSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR ILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$363,000	$0	$0	$363,000
A (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$242,000	$0	$0	$242,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$242,000	$0	$0	$242,000
TAL					$5,379,800	$0	$0	$5,379,800

2025/01/20 09:23 AM

- Anexo 3: bitácora de obra

13 Diciembre 2024
Se continua instalación de mecanodrenes y capas plasticas
Jaime M.

16 Diciembre 2024
Se inicia excavación manual para construcción caja Ventosa #8. Se funde Placa Piso Caja Ventosa #8.
Jaime M.

17 Diciembre 2024
Se formaletea, arma acero de refuerzo y se funde muros de Caja para Ventosa # 8.
Jaime M.

18 Diciembre 2024
Se figura y arma acero de refuerzo para tapa de caja de Ventosa #8
Jaime M.

19 Diciembre 2024
Se coloca concreto para construcción de tapa de caja de ventosa #8.
Jaime M.

20 Diciembre 2024.
Se inicia excavación manual para construcción de caja purga #4. Dn = 2"
Jaime M.

23 Diciembre 2024
Se figura acero de refuerzo y se coloca concreto para construcción de caja purga #4 Dn = 2"
Jaime M.

24 Diciembre 2024.
Se figura acero de refuerzo y re construye caja tapa

para caja Valvula Purga #4 Dn=2
Jaime M.

26 Diciembre 2024.
Se inicia excavación manual para construcción Caja Valvula Dn=3" #1. Valvula de Control
Jaime M.

27 Diciembre 2024
Se instala acero de refuerzo figurado y se funde paredes de Caja Valvula Control Dn 3 #1.
Jaime M.

30 Diciembre 2024
Se inicia construcción de tapa de Valvula Control Dn3#1.
Figurado de acero y construcción de tapa Valvula en concreto reforzado
Jaime M.

31 Diciembre 2024
Se realiza jornada de orden y aseo
Jaime M.

07 Enero 2025
Se inicia excavación de caja valvula Control Dn 3" #2
Se inicia figurado de acero de refuerzo para Caja.
Se funde placa de piso para Caja
Jaime M

08 Enero 2025
Se funden muros de caja valvula Control Dn 3" #2
Se inicia figurado de acero para tapa de la caja
Jaime M.

09 enero 2025
Se continua con labores de construcción para la caja valvula Control

Dn 2" #1. Local se ubica sobre derivación de red de distribución 2" hacia restaurantes.
Se realiza excavación manual e inician figurado de acero de refuerzo y fundida placa piso.
Jaime M.

10 Enero 2024
Se continua con construcción caja Valvula Dn 2" #1. Se figura acero de refuerzo y fundido de placas
Jaime M.

13 Enero 2024
Se construye tapa en concreto reforzado de la Caja valvula Dn 2 #1.
Se realiza excavación manual, figurado de acero y fundida de placa de piso de caja Ventosa #9.
Jaime M.

14 Enero 2024
Se construye muros de caja Ventosa #9 y se figura acero de tapa.
Jaime M.

15 Enero 2024
Se coloca concreto para construcción de tapa de la caja valvula Ventosa #9.
Jaime M.

16 Enero 2025
Se realiza limpieza, aseo general en area de trabajo
Se procede con la desmovilización de herramientas y en general logistica utilizada durante la ejecución de COP 1261-24
Se da culminación a la obra.
Jaime M.

- Anexo 4: oficios enviados y recibidos

41

UT Línea Cascajera

Barrancabermeja 18 de diciembre de 2024

UT-CAS-12-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja

REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega informe técnico, informe HSE y anexos Mes diciembre.

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No.1261-24 se permite realizar entrega informe técnico y HSE junto a sus anexos.

Atentamente,

ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO

UT Línea Cascajera

Barrancabermeja 08 de enero de 2025

UT-CAS-13-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja

REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega pago planilla seguridad social mes diciembre.

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No.1261-24 se permite realizar entrega de copia de planilla del pago de seguridad social correspondiente al mes de diciembre.

Atentamente,

ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO

A3

UT Línea Cascajera

Barrancabermeja 16 de enero de 2025

UT-CAS-12-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja

REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega informe técnico Mes enero 2025

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No.1261-24 se permite realizar entrega del informe técnico mensual correspondiente al periodo de ejecución.

Atentamente,

ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO

INGENIO CUMPLIMIENTO Y CALIDAD
INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA.

Barrancabermeja, 3 de enero del 2025.

Señores

UT LINEA CASCAJERA.
ZULMA MILENA CAMARGO
CAPACHO
Ciudad,

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

Asunto: solicitud seguridad social

Cordialmente,

Se solicita el pago de la seguridad social de los trabajadores, y personal mínimo del contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, del mes de diciembre del 2024.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN
Representante legal.

INGENIO CUMPLIMIENTO Y CALIDAD
INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA.

Barrancabermeja, 13 de enero del 2025

Señores

UT LINEA CASCAJERA.
ZULMA MILENA CAMARGO
CAPACHO
Ciudad,

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

Asunto: INFORME FINAL

Cordialmente,

Se solicita informe técnico final de obra, igualmente el informe de actividades ejecutadas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental junto con sus anexos.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN
Representante legal.

- Anexo 5: actas finales interventoría, y contratista.

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de **Infraestructura**

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890201900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT.	829000757-4
REP LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	calle 42 21-79.
TELÉFONO	311 4226323
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriaici.ltda@gmail.com
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700,00), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	29 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
DURACIÓN	SEIS (6) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024

	CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Homologado por la Secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPAA	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DEL 2025

En el Distrito de Barrancabermeja, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2025, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja, el Ingeniero MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER, profesional universitario Grado II – supervisor del contrato de interventoría No. 1262-24 y por la otra parte ICI LTDA, Nit. 829000757-4, en calidad de interventoría representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación; con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1262-2024, en los siguientes términos:

1. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo de la interventoría con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de interventoría.

2. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte de la interventoría, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y el Supervisor.

4. Que a la Interventoría se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

CONTRATO INICIAL				
Concepto	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valores**	**Porcentaje parcial**	**Porcentaje acumulado**

Pago parcial No. 1	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84%	21,84%
Pago parcial No. 2	11/12/2024	$ 47.409.214,44	67,72%	89,56%
Acta de Recibo final	16/01/2025	$ 7.308.803,88	10,44%	100.00%
ACUMULADO		**$ 70.007.700,00**		

Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.308.803,88) M/CTE**, a la ICI LTDA con NIT 829.000.757-4

Siguiendo las directrices de la circular en la cual se informe el rubro presupuestal de los cuales se descargará dicha partida, se informa:

REGISTRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR COMPROMISO	VALOR DISPONIBLE COMPROMISO	VALOR A PAGAR
24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 70.007.700,00	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88
	TOTAL			$ 70.007.700,00	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88

CONSTANCIAS

A) En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo final, dejamos constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual atendiendo las necesidades de la secretaria de infraestructura por el valor de $ 70.007.700,00

B) Que el contratista garantiza la calidad del trabajo realizado.

C) Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldo, jornales, honorarios, prestaciones e indemnizaciones.

D) Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al municipio.

E) Que el contratista otorgará la ampliación y modificación a la garantía de la calidad del servicio.

F) Que las partes realizaran la liquidación final del contrato dentro de los SEIS (06) meses siguientes a la firma de la presente acta.

G) Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: copia de la presente Acta, copia del certificado de aprobación de la garantía única con los amparos de calidad del servicio, laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal), vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad , paz y salvo de los pagos de

aportes parafiscales y de la seguridad social del personal utilizado (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar).

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja los dieciséis (16) días del mes de enero del 2025.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ICI LTDA
R.L./ JUAN PABLO CASTELLANOS S.
Interventor

MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
Supervisor del contrato No. 1262–24
Profesional Universitario Grado II

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA N 1262–24

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA
LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER

CONTRATISTA: ICI LTDA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 70.007.700,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1	$ 15.289.631,68	ACTA DE RECIBO PARCIAL N.2	$ 47.409.214,44	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 7.308.803,68	ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	VALOR ANTICIPO (0%):	0,00	Valor acta N.1:	$ 15.289.631,68	Valor acta N.2:	$ 47.409.214,44	Valor acta Recibo final	$ 7.308.803,68	Valor actas:	$ 70.007.700,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	PLAZO:	6 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo	$ 0,00	Amortización de Anticipo	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JOHANNA PAOLA SANTOS REY	FECHA DE INICIO:	17/07/2024	Neto a Pagar:	$ 15.289.631,68	Neto a Pagar:	$ 47.409.214,44	Neto a Pagar:	$ 7.308.803,68	VALOR NETO EJECUTADO	$ 70.007.700,00
SUPERVISOR: ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/01/2025	PERIODO A FACTURAR	DEL 17 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024	PERIODO A FACTURAR	DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	PERIODO A FACTURAR	DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 16 ENERO 2025	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA PRESENTE ACTA	11/12/2024	% EJECUTADO	21,84%	% EJECUTADO	67,72%	% EJECUTADO	10,44%	% EJECUTADO	100,00%

	CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1		ACTA 2				ACUMULADO	
N°	ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN	% AVANCE	COSTO DIRECTO	TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL			% AVANCE	VALOR TOTAL
1	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. SANTANDER*	100,00%	$ 58.830.000,00	$ 58.830.000,00	21,84%	$ 12.848.472,00	67,72%	$ 39.839.678,00	10,44%	$ 6.141.852,00	100,00%	$ 58.830.000,00
			SUBTOTAL	$ 58.830.000,00	SUBTOTAL	$ 12.848.472,00	SUBTOTAL	$ 39.839.678,00	SUBTOTAL	$ 6.141.852,00	SUBTOTAL	$ 58.830.000,00
			IVA 19%	$ 11.177.700,00	IVA 19%	$ 2.441.209,68	IVA 19%	$ 7.569.538,44	IVA 19%	$ 1.166.951,68	IVA 19%	$ 11.177.700,00
			VALOR TOTAL	$ 70.007.700,00	VR ACTA N°1	$ 15.289.681,68	VR ACTA No. 02	$ 47.409.214,44	VR ACTA FINAL	$ 7.308.803,68	ACUMULADO GENERAL	$ 70.007.700,00

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
JEFE DE LA DEPENDENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
REP. LEGAL ICI LTDA INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
INTERVENTOR

MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA 1262-24
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SEC DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 1261-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	1261–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA
NIT	901819149-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
IDENTIFICACION	C. C. 63.507.675 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPO-009-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-09556 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098); Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 5523 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091, Fuente: Nación, por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098).
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02970 DEL 3 DE MAYO DE 2024

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

	SGR - 324 del 2024-05-03
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14452851 CO1.WRT.14452698 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 CO1.WRT.144824497 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPPA No.	8784 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INCIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA FINALIZACIÓN	16 DE ENERO DEL 2025

En el Distrito de Barrancabermeja, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2025, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja, el Ingeniero MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER, profesional universitario Grado II – supervisor del contrato de interventoría No. 1262-24 y por la otra parte la unión temporal UT. LINEA CASCAJERA, cuyo NIT es 901819149-3 representado legalmente por ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO identificada con cédula de ciudadanía No. 63.507.675 de Bucaramanga, Contratista e ICI LTDA, Nit. 829000757-4 representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación, en calidad de interventor; con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1261-2024**, en los siguientes términos:

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo en la obra con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de obra.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra, con base en los soportes presentados por éste.

3. El Interventor certifica que las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

4. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la Interventoría, quien consideró viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, lo anterior acorde a sus funciones según contrato de Interventoría No. 1262-2024.

5. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje Parcial	Porcentaje Acumulado

Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago parcial No. 1	02/09/2024	$ 210.897.926,00	21,84%	**21.84**
Pago parcial No. 2	11/12/2024	$ 654.108.014,00	67.73%	**89.57%**
Acta de Recibo final	16/01/2025	$ 100.698.098,00	10.43%	**100.00%**
ACUMULADO		**$ 965.704.038,00**		

Que la presente acta final se considera procedente autorizar el pago por valor de **CIEN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 100.698.098,00) M/CTE**, a la UNIÓN TEMPORAL LINEA CASCAJERA identificado con NIT 901819149-3.

Siguiendo las directrices de la circular en la cual se informe el rubro presupuestal de los cuales se descargará dicha partida, se informa:

REGISTRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR COMPROMISO	VALOR DISPONIBLE COMPROMISO	VALOR A PAGAR
24-02970 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 324 del 2024-05-03	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01	"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 965.704.038	$ 100.698.098	$ 100.698.098
	TOTAL			$ 965.704.038	$ 100.698.098	$ 100.698.098

CONSTANCIAS

A) El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo en la obra con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de obra.

B) El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra, con base en los soportes presentados por éste.

C) Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría

D) la presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la interventoría, quien consideró viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entra valores unitarios y cantidades contractuales, lo anterior acorde a sus funciones según contrato de interventoría No. 1262–24.

E) En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo final, dejamos constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual atendiendo las necesidades de la secretaria de infraestructura por el valor arriba referido.

F) Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados en la construcción, a partir de la fecha.

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de **Infraestructura**

G) Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por salarios, jornales, honorarios, prestaciones e indemnizaciones.

H) Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al Distrito.

I) Que el contratista otorgará la ampliación y modificación a la garantía estabilidad de la obra y la calidad de los elementos empleados en la obra, así como la póliza anexa de responsabilidad civil frente a terceros.

J) Que, a partir de la fecha, cesa la responsabilidad del contratista por los daños que le sean ocasionados por terceros a la obra.

K) Que, a partir de la fecha, la vigilancia de la obra es por cuenta del Distrito.

L) Que las partes realizaran la liquidación final del contrato dentro de los SEIS (06) meses siguientes a la firma de la presente acta.

M) Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente Acta, Copia del Certificado de Aprobación de la Garantía Única con los amparos de estabilidad y calidad de obra, Laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal) y Amparo de Responsabilidad Civil frente a terceros (Responsabilidad Civil Extracontractual), vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad, Paz y Salvo de los pagos de aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) y de la seguridad social del personal utilizado.

En constancia se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los dieciséis (16) días del mes de enero del 2025.

ICI LTDA
R. L/ JUAN PABLO CASTELLANOS S.
Interventor

UT. LINEA CASCAJERA
R.L/ ZULMA MILENA CAMARGO C.
Contratista

MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER
Profesional Universitario Grado II
Supervisor del Contrato No. 1262-24

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 1261-2024	VALOR PRESENTE ACTA	$ 100 693 020,00	VALOR ACUMULADO	$ 965 704 038,00
	PORCENTAJE DEL ACTA PARCIAL	10,43%	PORCENTAJE ACUMULADO	100,00%
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	PLAZO ACTUAL	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO: $965.704.038,00 M/CTE (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO)	FECHA INICIO	17/07/2023	FECHA TERMINACIÓN	16/01/2025

CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA	NIT	890.201.900-5	SUPERVISOR	MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	NIT	901.819.149-3	REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
INTERVENTORIA	INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	NIT	829.000.757-4	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ

A los (16) DIECISEIS días del mes de ENERO del año 2025 se reunieron: ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO, representante legal del contratista, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES SOCIALES				CONDICIONES VIGENTES SEGUN OTROSI MODIFICATORIA No. 03 DEL 02 DICIEMBRE 2024				ACTA PARCIAL 01		ACTA ANTERIOR PARCIAL 02		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1000	PRELIMINARES																		
	1001	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO	MTS	2725,00	$ 3 610,00	$ 11 442 350,00	MTS	4 124,70	$ 3 610,00	$ 14 890 167,00	653,70	$ 3 071 927,00	3274,00	$ 11 819 140,00	0,00	$ -	4124,70	$ 14 890 167,00	0,00	$ -
	1002	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MANUAL	M3	906,00	$ 63 524,00	$ 57 573 864,00	M3	1 034,38	$ 60 521,00	$ 65 605 674,00	252,80	$ 15 579 663,00	921,58	$ 55 706 411,00	0,00	$ -	1094,38	$ 65 606 074,00	0,00	$ -
	1009	BOMBEO Y MANEJO DE AGUA	DIA	5,00	$ 141 653,00	$ 708 343,00	DIA	8,00	$ 141 653,00	$ 950 009,00	0,00	$ -	8,00	$ 950 009,00	0,00	$ -	8,00	$ 950 009,00	0,00	$ -
	1010	EXCAVACION MECANICA H= 2,1 A H= 6 1 7	UND	20,00	$ 168 932,00	$ 3 378 640,00	UND	23,00	$ 168 932,00	$ 3 885 436,00	9,00	$ 1 351 456,00	15,00	$ 2 533 980,00	0,00	$ -	23,00	$ 3 885 436,00	0,00	$ -
	1019	DESCAPOTE MANUAL	M2	6859,00	$ 7 118,00	$ 48 822 362,00	M2	8 252,33	$ 7 118,00	$ 58 811 051,00	1715,10	$ 12 209 092,00	6537,23	$ 46 602 969,00	0,00	$ -	8252,33	$ 58 811 051,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 119.365.199,00				$ 144.842.736,00		$ 32.530.228,00		$ 111.512.508,00		$ -		$ 144.842.736,00		$ -
	2000	MOVIMIENTO DE TIERRA																		
	2001	EXCAVACION MANUAL	M3	1635,00	$ 91 939,00	$ 150 374 265,00	M3	1 533,45	$ 81 833,00	$ 125 496 615,00	345,45	$ 28 271 283,00	1188,00	$ 97 224 732,00	0,00	$ -	1533,45	$ 125 496 015,00	0,00	$ -
	2015	RELLENO TIPO 1 (ARENA DE RIO)	M3	725,00	$ 133 300,00	$ 96 642 500,00	M3	813,69	$ 133 300,00	$ 108 491 537,00	193,64	$ 25 812 212,00	620,25	$ 82 678 725,00	0,00	$ -	813,89	$ 108 491 537,00	0,00	$ -
	2017	RELLENO TIPO 3 (MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACION)	M3	1100,00	$ 59 976,00	$ 65 227 155,00	M3	537,63	$ 59 976,00	$ 41 143 427,00	145,28	$ 8 558 837,00	532,35	$ 32 575 324,00	0,00	$ -	537,63	$ 41 143 427,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 312.244.527,00				$ 275.130.979,00		$ 62.661.529,00		$ 212.478.451,00		$ -		$ 275.130.979,00		$ -
	3000	CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ANDENES																		
	3028	CONCRETO C3000 PSI PARA ATRAQUE DE ACCESORIOS 3" Y 4" Y VALVULAS CON EXASETIL Y PLASTIGRETE CM	UND	53,00	$ 318 399,00	$ 16 878 147,00	UND	93,00	$ 319 399,00	$ 29 715 918,00	19,00	$ 6 058 581,00	71,00	$ 22 677 329,00	0,00	$ -	93,00	$ 28 715 910,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 16.878.147,00				$ 29.715.918,00		$ 6.058.581,00		$ 22.677.329,00		$ -		$ 28.715.910,00		$ -
	4000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACUEDUCTO																		
	4001	SUM. E INST. TUBERIA PVC UM PDE 3 0 3"	MTS	5,00	$ 36 557,00	$ 182 935,00	MTS	495,70	$ 36 557,00	$ 18 115 077,00	1,70	$ 62 164,00	493,00	$ 18 052 913,00	0,00	$ -	443,70	$ 18 115 077,00	0,00	$ -
	4002	SUM. E INST. TUBERIA PVC UM. PDE 3 0 3"	MTS	1128,00	$ 72 351,00	$ 81 611 928,00	MTS	1 177,00	$ 72 351,00	$ 85 157 127,00	12,00	$ 823 212,00	1165,00	$ 84 333 915,00	0,00	$ -	1177,00	$ 85 157 127,00	0,00	$ -
	4004	SUM. E INST. TUBERIA PVC UM. PDE 3 0 4"	MTS	2032,00	$ 95 778,00	$ 200 367 576,00	MTS	2 033,00	$ 95 778,00	$ 193 505 574,00	634,00	$ 78 921 072,00	1253,00	$ 120 584 502,00	0,00	$ -	2039,00	$ 199 506 574,00	0,00	$ -
	4007	SUM. E INST. TUBERIAS PEAD DIAMETRO 20 mm PN10	MTS	195,00	$ 16 874,00	$ 2 171 130,00	MTS	424,00	$ 16 134,00	$ 4 720 818,00	0,00	$ -	424,00	$ 4 720 818,00	0,00	$ -	424,00	$ 4 720 818,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 284.333.669,00				$ 305.498.564,00		$ 79.851.448,00		$ 225.647.116,00		$ -		$ 305.498.564,00		$ -
	5000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACUEDUCTO																		
	5002	SUM. E INST. TEE 3"X3" PVC	UND	7,00	$ 439 009,00	$ 3 317 027,00	UND	4,00	$ 439 009,00	$ 1 756 036,00	0,00	$ -	4,00	$ 1 756 036,00	0,00	$ -	4,00	$ 1 756 036,00	0,00	$ -
	5004	SUM. E INST. TEE 4"X3" PVC	UND	5,00	$ 876 229,00	$ 4 381 153,00	UND	5,00	$ 876 229,00	$ 4 381 153,00	3,00	$ 2 628 690,00	2,00	$ 1 752 450,00	0,00	$ -	5,00	$ 4 381 150,00	0,00	$ -
	5005	SUM. E INST. TEE 4"X3" PVC	UND	3,00	$ 673 937,00	$ 2 021 551,00	UND	3,00	$ 673 937,00	$ 2 021 551,00	2,00	$ 1 347 974,00	1,00	$ 673 937,00	0,00	$ -	3,00	$ 2 021 551,00	0,00	$ -
	5014	SUM. E INST. TEE HD 12"X4" JVL	UND	1,00	$ 2 347 221,00	$ 2 347 221,00	UND	1,00	$ 2 347 221,00	$ 2 347 221,00	0,00	$ -	1,00	$ 2 347 221,00	0,00	$ -	1,00	$ 2 347 221,00	0,00	$ -
	5090	SUM. E INST. PEDUCCION HD 6" X 3" JH	UND	1,00	$ 314 998,00	$ 314 998,00	UND	1,00	$ 314 998,00	$ 314 998,00	0,00	$ -	1,00	$ 314 998,00	0,00	$ -	1,00	$ 314 998,00	0,00	$ -
	5152	SUM. E INST. DE CODO PVC 11 25 X 3"	UND	6,00	$ 229 548,00	$ 1 373 688,00	UND	6,00	$ 229 548,00	$ 1 373 688,00	3,00	$ 688 644,00	3,00	$ 688 644,00	0,00	$ -	6,00	$ 1 373 288,00	0,00	$ -
	5154	SUM. E INST. DE CODO PVC 22,5 X 3"	UND	6,00	$ 171 039,00	$ 1 025 534,00	UND	9,00	$ 171 099,00	$ 1 539 891,00	0,00	$ -	9,00	$ 1 539 891,00	0,00	$ -	9,00	$ 1 539 891,00	0,00	$ -
	5155	SUM. E INST. DE CODO PVC 22,5 X 4"	UND	8,00	$ 235 920,00	$ 1 415 520,00	UND	8,00	$ 235 920,00	$ 1 887 360,00	4,00	$ 943 680,00	4,00	$ 943 680,00	0,00	$ -	8,00	$ 1 887 360,00	0,00	$ -
	5157	SUM. E INST. DE CODO PVC 45 X 3"	UND	8,00	$ 237 459,00	$ 1 783 243,00	UND	12,00	$ 237 459,00	$ 2 844 872,00	0,00	$ -	12,00	$ 2 844 872,00	0,00	$ -	12,00	$ 2 844 872,00	0,00	$ -
	5158	SUM. E INST. DE CODO PVC 45 X 4"	UND	8,00	$ 273 538,00	$ 2 183 229,00	UND	12,00	$ 273 615,00	$ 3 282 312,00	7,00	$ 1 916 692,00	5,00	$ 1 397 630,00	0,00	$ -	12,00	$ 3 282 312,00	0,00	$ -
	5159	SUM. E INST. DE CODO PVC 90 X 3"	UND	5,00	$ 225 979,00	$ 1 129 895,00	UND	8,00	$ 225 619,00	$ 1 355 514,00	0,00	$ -	8,00	$ 1 355 514,00	0,00	$ -	8,00	$ 1 355 514,00	0,00	$ -
	5209	SUM. E INST. TAPON HD 3" JH	UND	2,00	$ 225 615,00	$ 451 212,00	UND	2,00	$ 225 615,00	$ 451 212,00	0,00	$ -	2,00	$ 451 212,00	0,00	$ -	2,00	$ 451 212,00	0,00	$ -
	5248	SUM. E INST. UNION DE REPARACION HD 3"	UND	8,00	$ 165 569,00	$ 1 324 472,00	UND	10,00	$ 165 519,00	$ 1 655 520,00	0,00	$ -	10,00	$ 1 655 520,00	0,00	$ -	10,00	$ 1 655 520,00	0,00	$ -
	5249	SUM. E INST. UNION DE REPARACION HD 4"	UND	14,00	$ 235 693,00	$ 3 299 702,00	UND	18,00	$ 235 693,00	$ 3 771 088,00	8,00	$ 1 414 153,00	10,00	$ 2 356 935,00	0,00	$ -	18,00	$ 3 771 088,00	0,00	$ -
	5343	SUM. E INST. Adaptador Brida x Union HD 3"	UND	8,00	$ 249 839,00	$ 1 999 678,00	UND	9,00	$ 249 839,00	$ 2 248 524,00	3,00	$ 749 508,00	6,00	$ 1 499 016,00	0,00	$ -	9,00	$ 2 248 524,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 26.353.882,00				$ 31.851.895,00		$ 6.686.534,00		$ 21.346.356,00		$ -		$ 31.851.895,00		$ -
	6000	ELEMENTOS HIDRÁULICOS ACUEDUCTO																		
	6001	SUM. E INST. VALVULA CE HD 3" JWDEL	UND	2,00	$ 739 335,00	$ 1 478 790,00	UND	2,00	$ 739 335,00	$ 1 478 790,00	0,00	$ -	2,00	$ 1 478 790,00	0,00	$ -	2,00	$ 1 478 790,00	0,00	$ -
	6002	SUM. E INST. VALVULA CE 3" JWDEL	UND	4,00	$ 1 035 313,00	$ 4 141 252,00	UND	5,00	$ 1 035 313,00	$ 5 176 565,00	2,00	$ 2 070 626,00	3,00	$ 3 105 939,00	0,00	$ -	5,00	$ 5 176 565,00	0,00	$ -

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 1261-2024	VALOR PRESENTE ACTA	$ 109 633 050,00	VALOR ACUMULADO	$ 965 704 038,00
	PORCENTAJE DEL ACTA PARCIAL	10,45%	PORCENTAJE ACUMULADO	100,00%
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	PLAZO ACTUAL	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO: $965.704.038,00 M/CTE (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO)	FECHA INICIO	17/07/2023	FECHA TERMINACIÓN	16/01/2024

CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA	NIT 890.201.980-5	SUPERVISOR	MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	NIT 901.819.149-3	REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
INTERVENTORIA	INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	NIT 829.000.757-4	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ

A los (16) DIECISEIS días del mes de ENERO del año 2025 se reunieron ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO, representante legal del contratista, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, de las siguiente actividades bajo las condiciones que se detallan a continuación

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES SEGUN OTROSI MODIFICATORIA No. 02 DEL 02 DICIEMBRE 2024				ACTA PARCIAL 01		ACTA ANTERIOR PARCIAL 02		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	5003	SUM E INST VALVULA C.E. 4" FINDEL	UND	2,00	$ 1 370 193,00	$ 2 740 386,00	UND	2,00	$ 1 370 193,00	$ 2 740 386,00	1,00	$ 1 370 193,00	1,00	$ 1 370 193,00	0,00	$ -	2,00	$ 2 740 386,00	0,00	$ -
	5008	SUM E INST VALVULA C.E. 2" RB	UND	8,00	$ 859 530,00	$ 6 876 240,00	UND	9,00	$ 859 530,00	$ 7 735 770,00	3,00	$ 2 578 590,00	6,00	$ 5 157 180,00	0,00	$ -	9,00	$ 7 735 770,00	0,00	$ -
	5009	SUM E INST VALVULA C.E. 3" RB	UND	1,00	$ 1 250 770,00	$ 1 250 770,00	UND	0,00	$ 1 250 770,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5017	SUM E INST HERRANTE TIPO MILLAN F.FINDEL	UND	1,00	$ 5 478 970,00	$ 5 478 970,00	UND	1,00	$ 5 478 970,00	$ 5 478 970,00	0,00	$ -	1,00	$ 5 478 970,00	0,00	$ -	1,00	$ 5 478 970,00	0,00	$ -
	5027	SUM E INST VALVULA DE VENTOSA 3" BRIA	UND	9,00	$ 931 956,00	$ 7 455 648,00	UND	9,00	$ 931 956,00	$ 8 387 604,00	3,00	$ 2 795 868,00	6,00	$ 5 591 736,00	0,00	$ -	9,00	$ 8 387 604,00	0,00	$ -
	5056	Valvula Reductora de Presión Electrónica, con pilot electrónico para controlar presión y datos colectados por sim-control y para cambio a remoto hidráulico - DN 6"	UND	1,00	$ 11 071 732,00	$ 11 071 732,00	UND	0,00	$ 11 071 732,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5127	COLLARIN 12"SILLA 2" CON VÁLVULA DE COMPUERTA RB 2" Y VALVULA VENTOSA DOBLE ACCIÓN RB 4 DN 2"	UND	1,00	$ 4 178 659,00	$ 4 178 659,00	UND	1,00	$ 4 178 659,00	$ 4 178 659,00	0,00	$ -	1,00	$ 4 178 659,00	0,00	$ -	1,00	$ 4 178 659,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 61 782 454,00				$ 76 178 751,00		$ 8 615 277,00		$ 28 361 471,00		$ -		$ 36 976 751,00		$ -
	7000	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO																		
	7006	EMPALME A TUBERIA PVC 15"	UND	2,00	$ 2 609 107,00	$ 5 218 214,00	UND	2,00	$ 2 609 107,00	$ 5 218 214,00	0,00	$ -	2,00	$ 5 218 214,00	0,00	$ -	2,00	$ 5 218 214,00	0,00	$ -
	7042	ACOMETIDA DOMICILIARIA NUEVA TIPO FLEXIBLE 3" x 3/4" (Incluye Manguera de Clase C, Cajo Plástica y Tapa de Seguridad)	UND	35,00	$ 915 314,00	$ 32 035 990,00	UND	35,00	$ 915 314,00	$ 32 035 990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 32 035 990,00	35,00	$ 32 035 990,00	0,00	$ -
	7057	KIT DE CONTRAPESAS, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y EMPAQUE DE DN en 4"	UND	18,00	$ 223 903,00	$ 3 830 548,00	UND	18,00	$ 223 903,00	$ 4 030 362,00	6,00	$ 1 331 454,00	12,00	$ 2 722 908,00	0,00	$ -	18,00	$ 4 054 362,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 40 984 748,00				$ 41 338 566,00		$ 1 341 454,00		$ 7 941 122,00		$ 32 035 990,00		$ 41 338 566,00		$ -
	9000	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO																		
	9001	CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS (Incluye Tapa Valvula NO Tipo Pesado)	UND	8,00	$ 2 142 559,00	$ 17 195 472,00	UND	10,00	$ 2 142 559,00	$ 21 435 590,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 21 435 590,00	10,00	$ 21 435 590,00	0,00	$ -
	9015	CAJA EN CONCRETO REFORZADO 1.2x1.2 E=0.20 A PARA VALVULAS VENTOSAS (INCLUYE TAMAÑO DE CADA UN - AÑO 100)	UND	15,00	$ 4 035 843,00	$ 60 637 845,00	UND	9,00	$ 4 035 843,00	$ 35 322 597,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 35 322 597,00	9,00	$ 35 322 597,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 77 731 317,00				$ 57 818 187,00		$ -		$ -		$ 57 818 187,00		$ 57 818 187,00		$ -
		VALOR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA (1)	##########							$ 919 780 808,00		$ 200 964 092,00		$ 627 966 080,00		$ 90 854 167,00		$ 919 780 808,00		$ -
	2	PRESUPUESTO SST Y AMBIENTAL																		
	1	BARRERA CON CINTA PLASTICA (incluye base en madera)	MTS	2633,00	$ 3 173,00	$ 8 357 128,00	MTS	2 633,00	$ 3 173,00	$ 8 357 128,00	597,73	$ 1 781 172,00	2035,50	$ 6 521 065,00	29,23	$ 124 963,00	2632,50	$ 8 357 128,00	0,00	$ -
	2	VALLA PORTATIL 1.1 - 1,20 MT * 0,80 Vt	UND	5,00	$ 966 630,00	$ 2 833 150,00	UND	5,00	$ 566 630,00	$ 2 833 150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 2 833 150,00	5,00	$ 2 833 150,00	0,00	$ -
	3	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MES	6,00	$ 4 674 856,00	$ 28 049 136,00	MES	6,00	$ 4 674 856,00	$ 28 049 136,00	1,00	$ 1 674 856,00	3,00	$ 14 024 568,00	2,00	$ 9 349 712,00	6,00	$ 28 049 136,00	0,00	$ -
	6	SUMINISTROS DE MADERA PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE ENTREGA FINAL DE OBRA	MES	6,00	$ 694 653,00	$ 4 167 918,00	MES	6,00	$ 694 653,00	$ 4 167 918,00	1,00	$ 694 653,00	3,00	$ 2 083 371,00	2,00	$ 1 389 314,00	6,00	$ 4 167 918,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ 43 357 402,00				$ 43 357 402,00		$ 3 933 874,00		$ 22 679 397,00		$ 16 843 934,00		$ 43 357 402,00		$ -
		PRESUPUESTO SST Y AMBIENTAL (2)	$ 43 357 402,00							$ 43 357 402,00		$ 3 933 874,00		$ 22 679 397,00		$ 16 843 934,00		$ 43 357 402,00		$ -
	3	ITEMS NO PREVISTOS																		
	5001	SUM E INST TEE 2"X2" PVC				$ -	UND	2,00	$ 208 928,00	$ 417 856,00			2,00	$ 417 856,00	0,00	$ -	2,00	$ 417 856,00	0,00	$ -
	5003	SUM E INST TEE 3"X3" PVC				$ -	UND	1,00	$ 251 404,00	$ 251 404,00			1,00	$ 251 404,00	0,00	$ -	1,00	$ 251 404,00	0,00	$ -
	5105	SUM E INST CE CODO PVC 45 X 3"				$ -	UND	4,00	$ 165 481,00	$ 663 924,00			4,00	$ 663 924,00	0,00	$ -	4,00	$ 663 924,00	0,00	$ -
	5153	SUM E INST CE CODO PVC 90 X 3"				$ -	UND	2,00	$ 170 226,00	$ 340 452,00			2,00	$ 340 452,00	0,00	$ -	2,00	$ 340 452,00	0,00	$ -
	5230	SUM E INST TAPON 3" RF				$ -	UND	2,00	$ 177 362,00	$ 354 724,00			2,00	$ 354 724,00	0,00	$ -	2,00	$ 354 724,00	0,00	$ -
	5247	SUM E INST UNION DE REPARACION 3"				$ -	UND	3,00	$ 137 536,00	$ 412 608,00			3,00	$ 412 608,00	0,00	$ -	3,00	$ 412 608,00	0,00	$ -
	7003	EMPALME A TUBERIA PVC 3"				$ -	UND	2,00	$ 563 072,00	$ 1 126 144,00			2,00	$ 1 126 144,00	0,00	$ -	2,00	$ 1 126 144,00	0,00	$ -
					SUBTOTAL	$ -				$ 3 563 028,00				$ 3 563 028,00		$ -		$ 3 563 028,00		$ -
		VALOR COSTOS TOTALES DE ITEMS NO PREVISTOS (3)	$ -							$ 3 563 028,00				$ 3 563 028,00		$ -		$ 3 563 028,00		$ -

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 1261-2024	VALOR PRESENTE ACTA	$ 100 653 039,00	VALOR ACUMULADO	$ 965 704 033,00
	PORCENTAJE DEL ACTA PARCIAL	10,43%	PORCENTAJE ACUMULADO	100,00%
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	PLAZO ACTUAL	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO: $965.704.038,00 M/CTE (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO)	FECHA INICIO	17/07/2023	FECHA TERMINACIÓN	16/01/2025

CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA	NIT	890.261.900-5	SUPERVISOR	MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	NIT	901.819.149-3	REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
INTERVENTORIA	INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	NIT	829.000.757-4	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ

A los (16) DIECISEIS días del mes de ENERO del año 2025 se reunieron ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO, representante legal del contratista, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES SEGUN OTROSI MODIFICATORIA No. 03 DEL 30 DICIEMBRE 2024				ACTA PARCIAL 01		ACTA ANTERIOR PARCIAL 02		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		VALOR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA (1)	#####	##########						$ 918.783.808,00		$ 200.864.082,00		$ 627.966.389,00		$ 89.954.167,00		$ 918.783.808,00		$ -
		PRESUPUESTO SST Y AMBIENTAL (2)		$ 43.267.402,00						$ 43.267.402,00		$ 9.933.974,00		$ 22.879.997,00		$ 10.843.931,00		$ 43.267.402,00		$ -
		VALOR COSTOS ITEMS NO PREVISTOS (3)		$ -						$ 3.653.828,00		$ -		$ 3.653.828,00		$ -		$ 3.653.828,00		$ -
		VALOR TOTAL (4) =(1)+(2)+(3)	#####	##########						$ 965.704.038,00		$ 210.797.956,00		$ 654.100.014,00		$ 100.806.098,00		$ 965.704.038,00		$ -

SON: CIEN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE

Firma

Nombre: ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA

Firma

Nombre: JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

Firma

Nombre: MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1261-24
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Firma

Nombre: JOHANNA PAOLA LOZADA REY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

- Anexo 6: anexos HSE contratista

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____16_____ AL _____22_____DE ____DIC_____2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: ACUEDUCTO CASCAJERA

CONTRATO: 1261-24

PERIODO : DEL 23 AL 29 DE DIC 2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X						X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X						X		X		X			
Barras	Estado general	1	X						X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X						X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X						X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____30_____ AL _____05_____DE ____DIC-ENE_____2024-2025

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X								X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X								X		X			
Barras	Estado general	1	X								X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X								X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X								X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____06_____ AL _____12_____DE ___ENE_____2025

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3			X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3			X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1			X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1			X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1			X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Linea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____13_____ AL _____17_____DE ____ENE_____2025

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 2. INSPECCIONES DE OBRA E HIGIENE Y SEGURIDAD

UT Linea Cascajera	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CODIGO:	HSE-F-17
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: OBRA CASCAJERA

ENCARGADO DE INSPECCIÓN: JULIETH OLIVEROS

FECHA: 07/01/2025

CONDICIONES A EVALUAR	CRITERIO		LUGAR	TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES
	C	NC			
Están limpias y ordenadas todas las áreas de trabajo?	X				
Hay basura o liquidos derramados en el suelo?		X			
Están los pasillos o ruta de evacuacion libres de cajas, canastas de basura, sillas u otros obstáculos que puedan impedir el tráfico?	X				
Están los cables en lugar seguro para evitar que alguien se pueda tropezar o enredar?	X				
Se encuentran los contenedores oficina y almacenes limpios y ordenados?	X				
Están todas las herramientas y equipo siendo utilizados por los empleados en sus áreas de trabajo en buenas condiciones?	X				
Se encuentra el termo con agua y los vasos desechables en un lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores?	X				
Hay disposición alguna de recipientes para los desechos?	X				
Se encuentran en buen estado higiénico los sanitarios, baños, comedores y fuentes de agua potable disponibles para los empleados?	X				
En bodega los elementos esta ordenados, debidamente rotulados, ubicados en estantes fijos/estables?	X				
Se tiene adecuada señalizacion en las diferentes areas, la papeleria nueva y de reciclaje esta bien organizada?	X				
Se Observa o se siente la presencia de polvos en el sitio (recintos cerrados-oficina)?	X				

TIPO DE ACCIÓN: **(A)** INMEDIATA (3Dias), **(B)** PRONTA (15 Dias), **(C)** POSTERIOR (30 Dias)

OBSERVACIONES GENERALES:

No	SEGUIMIENTO	FECHA	RESPONSABLES	ESTADO	OBSERVACIONES

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

UT Línea Cascajera	INSPECCIONES DE OBRA	CODIGO:	HSE-F-31
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

Fecha de inspección ____07/01/2025_____ ***Inspección No.***___9___

proyecto:___ACUEDUCTO CASCAJERA_____

Zona y/o cuadrilla a inspeccionar____OBRA ACUEDUCTO_____

Nombre inspector___JULIETH OLIVEROS_____

CONDICIONES A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
1. SEGURIDAD				
Disponibilidad de espacio	X			
Estado de los pisos es buen estado	X			
Almacenamiento de productos correcamente	X			
Orden y aseo en el sitio de trabajo	X			
Extintores suficientes y adecuados	X			
Utilización de E.P.P de acuerdo con el factor de riesgo	X			
Botiquín de primeros auxilios	X			
Salidas de emergencia	X			
Existe procedimientos para el desempeño de las labores	X			
Se expiden permisos de trabajo	X			
El trabajador posee la capacitación idónea.	X			
2. QUÍMICAS				
Productos químicos con etiquetas y rotulos adecuados	X			
Vehiculos con rotulacion adecuada	X			
Gases comprimidos asegurados			X	
Fichas técnicas de seguridad	X			
3. FÍSICAS				
Exposición a ruido con proteccion	X			
Exposición a temperaturas extremas (frio o calor)	X			
Iluminación en el puesto de trabajo adecuada			X	
4. MEDIO AMBIENTE				
Servicios sanitarios	X			
kit para control de derrames	X			
Recipientes para disposición de residuos industriales	X			
Comportamiento seguro frente ha hse	X			

Observaciones:

Realizó: _____

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 3. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

UT Linea Cascajera	INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO:	HSE-F-15
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Obra: ACUEDUCTO CASCAJERA	FECHA: 07/01/2025

1. INSPECCIÓN BOTIQUIN

ID	DESCRIPCIÓN	CRITERIO		TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
		C	NC			
1	El botiquin se encuentra en un lugar seco y seguro?	X				
2	El botiquin contiene los productos basicos para la atención de una emergencia?.	X				
3	Los productos estan dentro de la fecha de uso?	X				
4	Estan todos los medicamentos en el recipiente original?	X				
5	Se encuentran rotulados todos los medicamentos?	X				
6	Los medicamentos se encuentran en envases plasticos?	X				
7	Se encuentra el instrumental del botiquin limpio y desinfectado?	X				
8	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	X				
9	Vendajes Triangulares	X				
10	Compresas	X				
11	Gasa	X				
12	Vendaje elástico	X				
13	Guantes Desechables	X				
14	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	X				
15	Esparadrapo de tela rollo grande	X				
16	Tijeras	X				
17	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	X				
	OTROS					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

TIPO DE ACCIÓN: (A) INMEDIATA (3Días), (B) PRONTA (15 Días), (C) POSTERIOR (30 Días)

Obra: ACUEDUCTO CASCAJERA	FECHA: 09/11/2024

2. CAMILLA

ID	DESCRIPCIÓN	CRITERIO		TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
		C	NC			
1	Correa de Amarre	X				
2	Fisura en la tabla	X				
3	Manija de agarre	X				
4	Se encuentra en un lugar Visible	X				
5	Se encuentra en un lugar Accesible	X				
6	Se encuentra protegida de condiciones ambientales que puedan deteriorar su estructura	X				
6	Se encuentra rotulada					

TIPO DE ACCIÓN: (A) INMEDIATA (3Días), (B) PRONTA (15 Días), (C) POSTERIOR (30 Días)

No	SEGUIMIENTO	FECHA	RESPONSABLE	STAD	OBSERVACIONES

Nombre de Inspector	JULIETH OLIVEROS
Firma	

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE EXTINTORES	CODIGO:	HSE-F-18
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

CONTRATO: 1261/24 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CASCAJERA

Nombre Inspector JULIETH OLIVEROS

ITEM	UBICACIÓN	CODIGO INTERNO	FECHA DE INSPECCION	CLASE DE EXTINTOR	COLOR	FECHA DE RECARGA	ASA	SEG	MANO	MANG	BOQU	CILI	INST	RECA
1	OBRA CASCAJERA	NA	7/01/2025	ABC	AMARILLO	2/02/2024	BN	BN	BN	BN	BN	BN	BN	BN
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

ASA: Asa manual
SEG: Seguro
MANO: Manómetro
MAG: Mangera

BOQUI: Boquilla
CILI:Cilindro
INST: Etiqueta de Instrucciones de uso
RECA: Etiqueta de fecha de recarga

OBSERVACIONES :

Realizó:

Revisó:

UT Línea Cascajera

ANEXO 4. INSPECCIÓN DE EPP

UT Línea Cascajera

INSPECCION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO	HSE-F-19
VERSION	1
PAGINA	1

PROYECTO: 1261/24 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CASCAJERA

No.	NOMBRE	CARGO	FECHA	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGUIRIDAD CORTA	BOTAS DE SEGUIRIDAD CAÑA LARGA	CAMISA	PANTALON	PETO DE CARNASA	ARNES	TRAJE TYVEK	TAPA BOCA	MASCARILLA MEDIA CARA	FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS	FILTROS HUMOS METALICOS	ESCAFANDRA	VISERAS	PETO DE VAQUETA	MANGAS DE CARNASA	MANGAS DE VAQUETA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES LARGOS SOLDADOR	GUANTES DE CARNASA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE CAUCHO	PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION	PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA	GAFAS OSCURAS	GAFAS TRANSPARENTES	MONO GAFAS PARA CORTAR	OBSERVACIONES
1	ESNEIDER JESUS VEGA A.	OBRERO	7/01/2025	B	B		B	B				B									B							B			
2	FABIAN ROJAS VARGAS	SUPERVISOR	7/01/2025	B	B		B	B				B									B							B			
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															

Escribe (B) si el estado es bueno y (M) si es maalo

OBSERVACIONES: _____

REALIZÓ: _____ CARGO: _____

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP

UT Línea Cascajera	REPOSICION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO:	HSE-F-32
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

PROYECTO: *"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"*

No.	NOMBRE	CARGO	FECHA	CANTIDAD																														FIRMA
				CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGUIRIDAD CORTA	BOTAS DE SEGUIRIDAD CAÑA LARGA	CAMISA	PANTALON	PETO DE CARNASA	ARNES	TRAJE TIBET	TAPA BOCA	TRAJE FONTANERO	MASCARIMEDIA CARAILLA	FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS	FILTROS HUMOS METALICOS	ESCAFANDRA	VISERAS	PETO DE VAQUETA	CANILLERA	MANGAS DE VAQUETA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES PARA LARGOS PARA SOLDAR	GUANTES DE CARNASA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE CAUCHO	PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION	PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA	GAFAS OSCURAS	GAFAS TRANSPARENTES	BABUQUEJO	GUANTES DE ALTURAS	MONO GAFAS PARA CORTAR		
1	ESNEIDER JESUS VEGA ANGARITA	OBRERO	7/1/2025																			X												Esneider J. Vega
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 6. CHARLAS DIARIAS

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 16/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Divulgación Riesgo y Peligros	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 18/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Actos y condiciones inseguras o subestándar	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 24/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 30 am
Temas: Importancia del cuidado del medio ambiente, Ahorro de energía y recurso no renovables	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 23/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am — **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: clasificación y disposición de residuos solidos	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 — **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se elige el representa para vigía del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo se realizan preguntas con respecto al tema y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 26/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Capacitación de riesgo psicosocial	**Obra: Ninguna**

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Número Total de Participantes: 3

Firma del Expositor (es):

Conclusiones: Se realizan preguntas respecto al tema de capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	X
Otro		Cual?			

Fecha: 30/12/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Riesgo mecánico y uso adecuado de herramientas	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):**
Conclusiones:	

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	X	
Otro		Cual?				

Fecha: 06/01/2025	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 30 am
Temas: Señalización y demarcación de áreas de trabajo	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	X
Otro		Cual?			

Fecha: 10/01/2025	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:30 am	**Hora Final**: 7: 45 am
Temas: Socialización de la actualización del procedimiento PE-P-01 PLANEACION, EJECUCION Y ENTREGA FINAL	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 | **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	X
Otro		Cual?			

Fecha: 14/01/2025	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 45 am
Temas: Buen uso de elementos de protección personal	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):**
Conclusiones:	

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	X
Otro		Cual?			

Fecha: 16/01/2025	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 45 am
Temas: Socialización Procedimientos de trabajo a realizar	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):**
Conclusiones:	

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
