

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PRELIMINARES**			
2		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	1 día	mar 12/24/24	mar 12/24/24
3		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	1 día	mar 12/24/24	mar 12/24/24
4		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	1 día	mar 12/24/24	mar 12/24/24
5		DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	2 días	mar 12/24/24	jue 12/26/24
6		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	1 día	jue 12/26/24	jue 12/26/24
7		DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 día	mar 12/24/24	mar 12/24/24
8		DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	1 día	jue 12/26/24	jue 12/26/24
9		RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 12/26/24	jue 12/26/24
10		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV DE EX LA NACION,CANALES,PRESTAMOS SOBREACARREO Y DERRUMBES.	1 día	vie 12/27/24	vie 12/27/24
11		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
12		PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	1 día	sáb 12/28/24	sáb 12/28/24
13		SALIDA SANITARIA PVC-S 2"	1 día	sáb 12/28/24	sáb 12/28/24
14		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
15		ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	1 día	lun 12/30/24	lun 12/30/24
16		ANCLAJE DE 1/2" L= ,50	1 día	lun 12/30/24	lun 12/30/24
17		CELOSIA TUBULAR POLIDEPORTEVO ASTM A500 GRADO C INCLUYE PLATINA Y PERNOS	2 días	mar 12/31/24	mié 1/1/25
18		**MAMPOSTERIA**			
19		MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	4 días	jue 1/2/25	mar 1/7/25
20		MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	1 día	jue 1/2/25	jue 1/2/25
21		LAVADA DE FACHADA	10 días	lun 1/6/25	vie 1/17/25

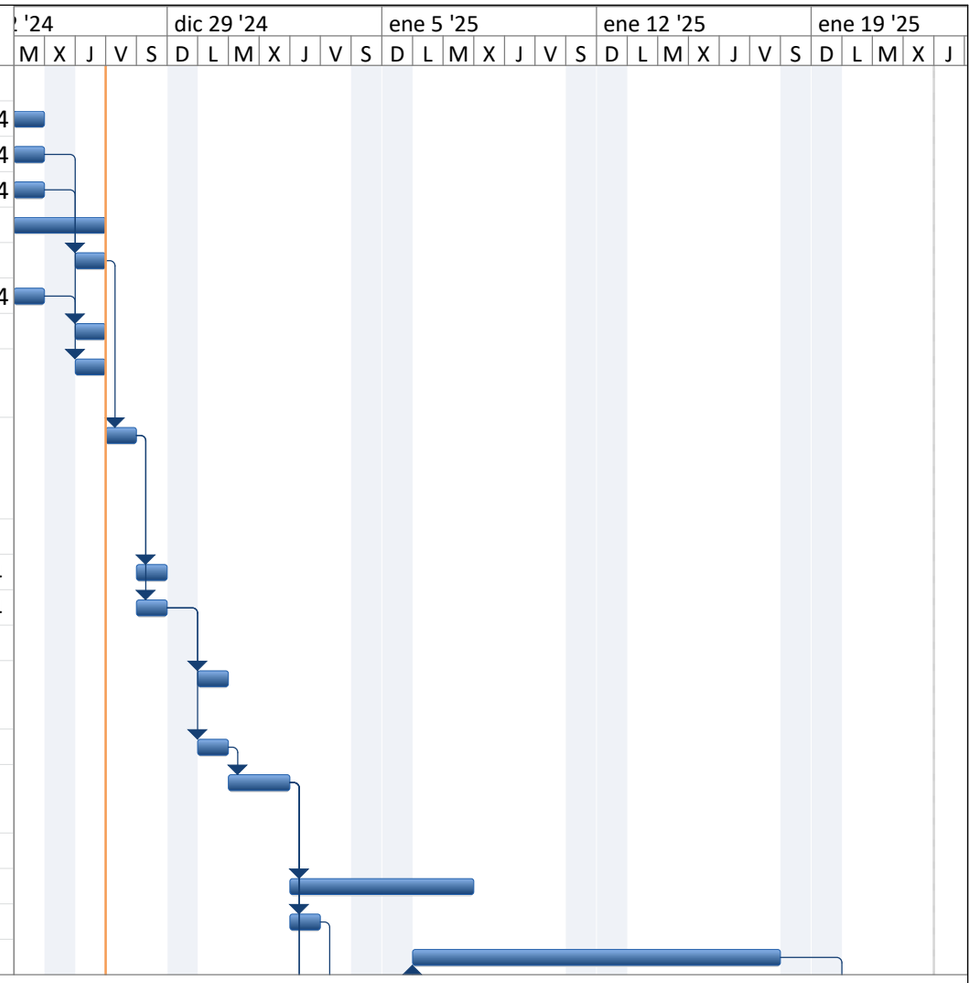

Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: vie 12/27/24

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		**PAÑETE - REVOQUES- REPELLOS**			
23		PAÑETE 1:4, E=2 CM	1 día	vie 1/3/25	vie 1/3/25
24		**CUBIERTAS**			
25		CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	1 día	lun 1/6/25	lun 1/6/25
26		TEJA FIBROCEMENTO No 4	2 días	jue 1/2/25	vie 1/3/25
27		**CONCRETOS Y MORTEROS**			
28		MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	1 día	jue 1/2/25	jue 1/2/25
29		**CARPINTERIA EN MADERA**			
30		VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	3 días	vie 1/10/25	mar 1/14/25
31		SUMINISTRO E INT DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	1 día	vie 1/10/25	vie 1/10/25
32		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
33		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	1 día	mié 1/15/25	mié 1/15/25
34		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	1 día	mié 1/15/25	mié 1/15/25
35		LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	1 día	jue 1/16/25	jue 1/16/25
36		REFLECTOR 250 W CON CAMPANA EN ALUMINIO	1 día	jue 1/16/25	jue 1/16/25
37		**PISOS BASES**			
38		ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3, E = 0.04	1 día	vie 1/3/25	vie 1/3/25
39		**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**			
40		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	1 día	lun 1/6/25	lun 1/6/25
41		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	1 día	lun 1/6/25	lun 1/6/25
42		TABLETA DE GRES 25*25	1 día	mar 1/7/25	mar 1/7/25
43		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	1 día	mar 1/7/25	mar 1/7/25
44		**CIELO RASO**			
45		CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	2 días	lun 1/13/25	mar 1/14/25
46		**PINTURAS**			

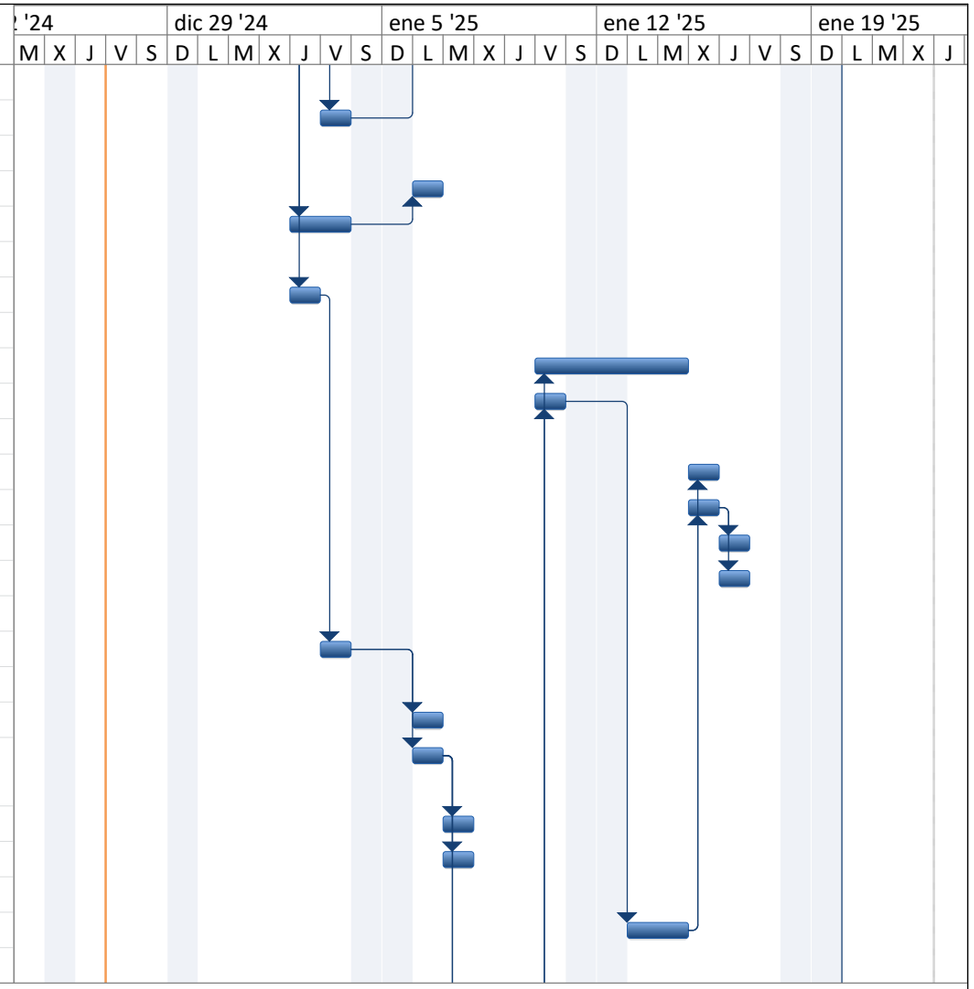

Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: vie 12/27/24

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
47		IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	3 días	lun 1/20/25	mié 1/22/25
48		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	2 días	mar 1/7/25	mié 1/8/25
49		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	2 días	mar 1/7/25	mié 1/8/25
50		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	1 día	jue 1/9/25	jue 1/9/25
51		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	1 día	jue 1/9/25	jue 1/9/25

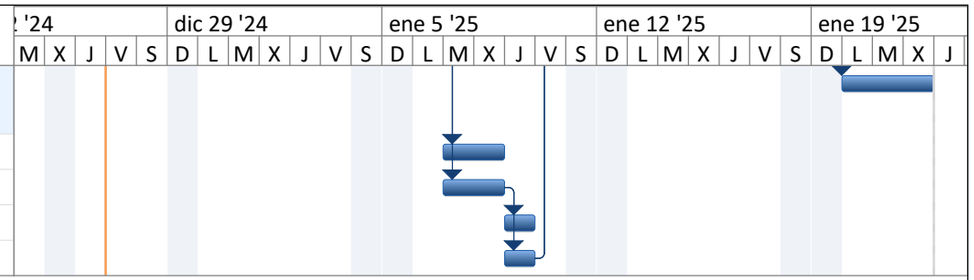

Proyecto: PROGRAMACION MC-0
Fecha: vie 12/27/24

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual
División	Tarea inactiva	Resumen manual
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
Tareas externas	Sólo duración	Progreso
