27-04-2020

Se dio Inicio a la obra, realizando el replanteo, instalando los Elementos de Seguridad necesarios para la correcta afectuación-Verificacion de el personal de empleados.

Se realizo el replanteo con el apoyo a la Supervision, Se dio inicio a la demolicion de la placa de piso para instalar los perfiles.

a las 5:00 pm, la comunidad nos dijo continuar con las demoliciones, pues Supuestamente afectan las Ventas de los Fines de Semana, Se procede

27-04-2020

Se dio Inicio a la obra, realizando el replanteo, instalando los Elementos de Seguridad necesarios para la correcta afectuación Verificacion de el personal de empleados.

Se realizo el replanteo con el apoyo a la Supervision, Se dio inicio a la demolicion de la placa de piso para instalar los perales.

a las 5:00 pm, la comunidad nos dijo continuar con las demoliciones, pues supuestamente afectan las Ventas de los Fines de Semana, Se procede

a llamar al apoyo ala Supervisora, que dice que al oto día Vendra.

28-04-2020

A les 8:00 am Se da inicio a las labors del dia, llega el Sr. Supervisor que llega en común acuerdo con la comunidad, para replantear la obra al oto lado (occidente) del polideportivo, por lo tanto se llega claridad que ya Se habia realizado 7 huecos que debia Ser tapados, Se debe replantear de Nuevo.

10:00 am Se inicia replanteo en la parte occidental, esta actividad dura hasta les 3:00 pm hora en la cual, Se inicia a dividir los puntos en la placa de piso.

29-04-2020.

Se da inicio a las labors del dia, continuando con la actividad de demolicion.

11:00 am llega 1 viaje de camion con perfileria para la estructura delas aulas.

1:00 pm. empieza la labor de Soldadura de columnas y vigas para luego Ser instaladas.

Se terminan labors del día.

30-04-2020.

Se inicia labors del día, continuando con el corte de perfiles y soldada de los cartones, esta actividad dura todo el día para los columnas.

02-05-2020

Se procede a instalar los tornos para columnas, aplomandolos e instalandolos, pasando le tacos y procediendo a Fundir, siendo encofrado 50 cuns, se realizo durante el día hoy instalaron el 50% de ellos.

- Llega la profesional SISO, la cual nos revisa y nos aplica, cada 2 horas, pausa para el lavado de manos.
- Se termina labors del día y se procede a tomar temperatura del personal.

4-05-2020.

Se da inicio de obra tomando temperatura al personal, dar la charla de 5 min. de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante el día se continua con la instalacion del resto de columnas lo cual se termina las actuales en un 100%.

Se deja constancia que cada 2 horas se procede a suspender actividades para realizar desinfección de elementos de protección personal, lavado de manos.

7-05-2020

Se da inicio a la obra, con la instalación de vigas perimetrales metálicas, la actividad dura el día, pero en el transcurso del día, se hace pausa cada 2 horas para el lavado de manos, cambio de tapabocas.

La veedora se acerca a realizar los procesos constructivos y el Ing Residente Edwin Mauricio Rojas Alarcon, procede de manera Formal a darles EPP y hacer visita a los procesos.

Se da Tour a la actividad del día, donde se termina la instalacion de las vigas.

4:00 pm llega un carro en camión de laminas de Superboard, Perfiles y canales, con materiales para su correcta instalacion, se descargan en la bodega que se consigue, no llega la totalidad del Material por el peso max. permitido y por la carretera en mal estado.

06-05-2020.

Se da inicio a la obra, procede con la instalacion de la estructura metalica para la instalacion de los muros, cada 2 horas se procede a realizar el lavado de manos, y desinfección de EPP, cambio de tapabocas.

2:00 Se dicta charla Sobre estado actual de covid-19 en el Departamento de Huila

5:00 pm llega otro viaje de lamina de superboard, y cargas de arena, pintura.

07-05-2020.

Se procede a ordenar labores del dia, continuado con la instalacion de Estructura y tapado de muros con lamina de Superboard.

11:00 Am. Visita del Señor Ing de apoyo a la Supervision Vladimir, realiza la verificacion de los elementos instalados y se le da claridad de un problema que aparecio, que dentro de la estructura del polideportivo la gran parte del dia alberga pajaros en los techos que cagan toda la placa y a los trabajadores.

5:00 Se termina la instalacion de


la estructura metalica y se
dejan instalados 30x. de Yeso
instalado

08-05-2020

Se inician labores del dia, con
la toma de temperatura a los
trabajadores, el promedio es de
35.8° Se continua con la
instalacion de placas de Superboard,
Se Sobrata a Nueva, otro viaje
con 30 laminas para terminar.

2:00 pm llega un viaje de carga
con 30 laminas de Superboard Gran.
Se trabaja hasta las 10:00pm
para terminar de instalar la totalidad
de las laminas y dejar listo para
masillar al siguiente dia

09-05-2020.
Se inician labores del dia tomando
temperatura y verificando que no
hay problemas alguno con el covid-19,
Se procede a masillar y encintar
las juntas de las laminas y luego
a masillar la totalidad del dia.
El trabajo dura todo el dia,
pero se ha manchado las laminas
con la cagada de los pajaros,
- Se acercan los vecinos (el
rector del colegio) donde analiza
que hace falta cerrar las entradas
de los muros a las aulas y se
analiza la colocación de una parte,

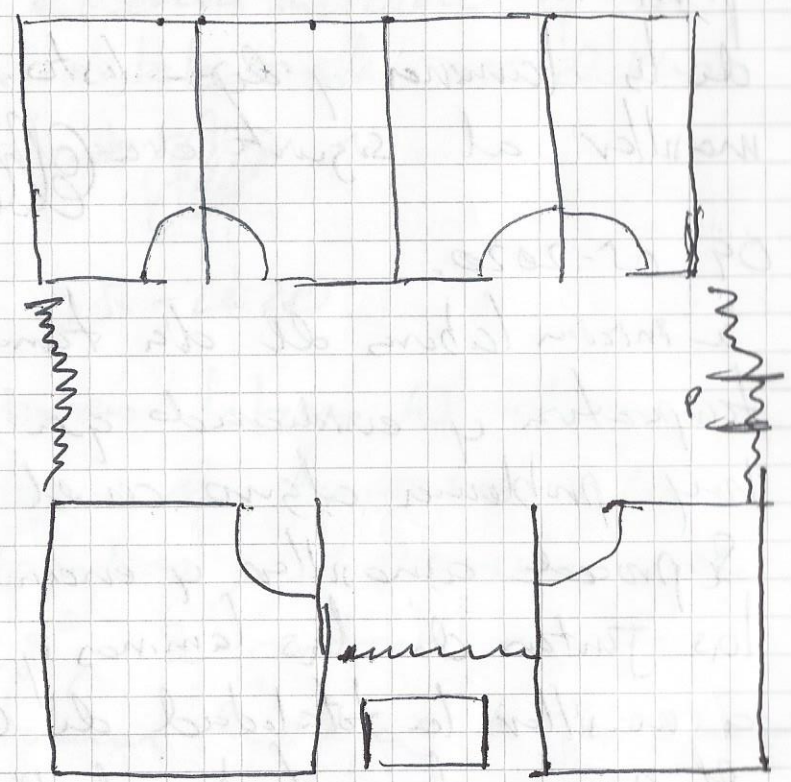

Faltante
1 Puerta.

Se Terminan labores del día a las 6:00 pm, se ordena trabajar el día domingo

para realizar la fijada de muros, y postear pintada de ellos.

10-05-2020.

Se da inicio a la obra, lijando los muros.

10:00 Am llega a la obra 6 puertas en aluminio, la cual procede a instalarlas.

4:00 pm se termina de instalar de las puertas, se fondean los muros de color blanco, esta labor se termina a las 4:50 pm.

Se terminan labores del día

1-05-2020
Se da inicio a las labores del día, se pinta toda la obra, llega orden del Supervisor de Suspender la obra, para enviar los Soldados del Rector.

SUSPENSION DE OBRA.

Se toman Medidas y se realiza un presupuesto de las obras adicionales que son necesarios para la corrección de las obras adicionales, se evidencia que los pajaros estan cagando todas las meses, no hay como parar ese daño, la pintura ya aplicada, se esta dañando, se deja evidencia de eso

REINICIO DE OBRA.

08-06-2020
Se da reinicio a la obra, cuando ya se Soluciono el problema de obras adicionales, se procede a lijar las muros en un 100%. Para repintar.
10:00 Am llega un viaje con material para las obras adicionales, se procede a descargar en la bodega.

9-06-2020

Se da inicio a las labores del día tomando temperatura, instalando columnas metálicas y vigas, lijando todo los muros.

:00 pm llego un rollo de polisombra para instalar. en la parte superior como abierta, con una pendiente a 2 aguas.

:-00 pm se terminan labores del día, dejado Estructurado los muros faltantes.

0. 06-2020.

Se da inicio a la labor del día, tomando la temperatura y dictado charla de estado actual del covid-19.

Se instala el polisombra, utilizado andamios y alambre dulce, esta actividad dura todo el día, cada 2 horas se procede a lavado de manos (Cuidado protocolo Covid-19).

11-06-2020.

Se da inicio a las labores del día. realizado la instalacion de laminas de Superboard.

4:00 pm llega una puerta de aluminio de 2 x 1.10 en lamina, procede a instalarla.

12-06-2020

Se da inicio a las labores del día, continuado con la instalación de lonas.

1:00 pm


Se procede a realizar charla en la tarde sobre manejo covid-19 en Familia.



13-06-2020

Se da inicio a la labor del día, masillado y encintado los muros adyacentes.

2:00 m. terminan labores del día




16-06-2020

Se inician labores del día lijado los muros adyacentes.

Se aplica de nuevo a toda la obra masilla de nuevo durante todo el día.

No seca por estar todo el día Frío



17-06-2020

Se inician labores del día, con toma de temperatura y con charla sobre estado del covid-19 en el Aula, se ventila y la masilla aun no ha secado por encontrarse el clima muy Frío, con lluvias por lo cual no se labora

en el día.

18-06-2020

Se da inicio a las labores del día, con toma de temperatura y luego se procede a lijar los muros, actividad que se ejecuta durante todo el día.

19-06-2020

Durante todo el día se realiza la actividad de pintada de muro con color Blanco Camelot esta actividad dura todo el día

20-06-2020

Se terminan de pintar los muros y se realiza la pintada con el esmalte negro de los guardaescobas.

12:00m se envía los andamios para la ciudad de Neiva, en transporte.

22-06-2020.

Se realiza acto final a la obra, se procede a entregar a la supervisión y los Veedores, los cuales reciben a entera Satisfacción dejando Firmados los recibos de recibido

FIN DE OBRA
