INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 26 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 21

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 23

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 24

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 26

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 30

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 56

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 62

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 63

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 63

3.1.1.1. Actividades Administrativas 64

3.1.1.2. Actividades Técnicas 65

3.1.1.3. Actividades ambientales 66

3.1.1.4. Actividades sociales 67

3.1.1.5. Actividades SST 67

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 67

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 69

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 69

3.2.1.1. Actividades Administrativas 69

3.2.1.2. Actividades ambientales 72

3.2.1.3. Actividades Sociales..... 72

3.2.1.4. Actividades SST 72

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños..... 72

3.2.1.6. Etapa de Construcción 73

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 74

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 74

3.3.1.1. Actividades Administrativas 74

3.3.1.2. Actividades ambientales 76

3.3.1.3. Actividades Sociales..... 76

3.3.1.4. Actividades SST 76

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños..... 77

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA..... 79

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas..... 79

3.4.1.1. Actividades Administrativas 80

3.4.1.2. Actividades Técnicas..... 81

3.4.1.3. Actividades ambientales 82

3.4.1.4. Actividades Sociales..... 82

3.4.1.5. Actividades SST 82
3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 82
3.4.3. Estado de avance del proyecto 82
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 84
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 85
3.5.1.1. Actividades Administrativas 85
3.5.1.2. Actividades ambientales 87
3.5.1.3. Actividades Sociales 102
3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 123
3.5.3. Estado de avance del proyecto 123
3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 124
4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 127
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 128
3.6.1.1 Actividades Administrativas 128
3.6.1.2. Actividades Técnicas 128
3.6.1.3. Actividades ambientales 130
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 131
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 132
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 132
3.6.3.3. Etapa de Construcción 132

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 134
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 134
3.7.1.1. Actividades Administrativas 135
3.7.1.2. Actividades Técnicas 136
3.7.1.3. Actividades ambientales 137
3.7.1.4. Actividades sociales 137
3.7.1.5. Actividades SST 137
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 137
3.7.1.7. Etapa de Construcción 138
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 140
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 140
3.8.1.1. Actividades Administrativas 141
3.8.1.2. Actividades Técnicas 142
3.8.1.3. Actividades Ambientales 153
3.8.1.4. Actividades Sociales 165
3.8.1.5. Actividades SST 178
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 190
3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 191
3.8.2.2. Etapa de Construcción 208
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 211

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 211
3.9.1.1. Actividades Administrativas 211
3.9.1.2. Actividades Técnicas 212
3.9.1.3. Actividades ambientales 213
3.9.1.4. Actividades Sociales 214
3.9.1.5. Actividades SST 214
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 214
3.9.3. Estado de avance del proyecto 214
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 214
3.9.3.2. Etapa de Construcción 215
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 217
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 218
3.10.1.1. Actividades Administrativa 218
3.10.1.2. Actividades Técnicas 219
3.10.1.3. Actividades ambientales 220
3.10.1.4. Actividades Sociales 220
3.10.1.5. Actividades SST 220
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 220
3.10.3. Estado de avance del proyecto 220
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 221

3.10.3.2. Etapa de Construcción 221

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S..... 223

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 223

3.11.1.1. Actividades Administrativas 223

3.11.1.2. Actividades Técnicas..... 266

3.7.1.1. Actividades ambientales 278

3.7.1.2. Actividades Sociales..... 283

3.7.1.3. Actividades SST 292

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños...... 295

3.7.1.2. Etapa de Construcción 337

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 354

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:..... 356

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 357

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 358

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 360

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA..... 362

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 362

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 363

4.4.1. Reporte Informe Semanal 363

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 367
4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 367
4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 368
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 379
4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 380
4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 381
4.10.1. Reporte Informe Semanal 383
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 384
4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 386
4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo 386
4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 386
4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 386
4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 389
4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones 389
4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 389
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 391
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 391
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 391
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 391
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 393

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 394

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 395

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 396

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 398

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 400

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 401

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 405

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 407

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 408

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 418

5.2.10. Actividades administrativas 421

5.2.11. Actividades técnicas 421

5.2.12. Actividades financieras 422

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 424

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 425

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 425

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 425

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 427

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 428

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 429
6.6. Bitácora de Obra 429
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 431
8. ANEXOS 436

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 25
Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 28
Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 29
Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 61
Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 62
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 63
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 64
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 66
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 68
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 69
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 69
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 71
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 72
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 74

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 75
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 76
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 79
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 80
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 81
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 83
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 83
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 84
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 85
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 86
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 126
Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 126
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 127
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 128
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 129
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 132
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 134
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita 135
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 136
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 138

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943 140

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 141

Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales 168

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 208

Tabla 39 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943 209

Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052 211

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 212

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052 213

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo 216

Tabla 44 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814 217

Tabla 45 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814 218

Tabla 46 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 219

Tabla 47 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 221

Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033 223

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 228

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 230

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 232

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 234

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 237

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 239

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 242

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 244

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 247

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 249

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 252

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 253

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 257

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 260

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 264

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 264

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 265

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023..... 297

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023..... 300

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 303
Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 306
Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 312
Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 315
Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 318
Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023 321
Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 325
Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 327
Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023 328
Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023 329
Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 331
Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023 333
Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023 335
Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 336
Tabla 82 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023 337
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 338
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia 339
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 341
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos 342
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 343

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 344
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 345
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 346
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 347
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 348
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 349
Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 350
Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 351
Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 352
Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 353
Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago 358
Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán 360
Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña 361
Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira 362
Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 363
Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 363
Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 364
Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego 366
Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 367
Tabla 107 Garantías Municipio de La Playa 367

Tabla 108 Garantías Municipio de Pamplonita 368
Tabla 109 Reporte informes semanales Gobernación 1943 369
Tabla 110 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 369
Tabla 111 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 376
Tabla 112 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 377
Tabla 113 Garantías Gobernación 1943 378
Tabla 114 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 379
Tabla 115 Garantías Gobernación 2052 380
Tabla 116 Garantías Municipio de Ocaña 1814 380
Tabla 117 Reporte informes semanales Gobernación 2033 384
Tabla 118 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 385
Tabla 119 Garantías Gobernación 2033 388
Tabla 120 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 390
Tabla 121 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022 391
Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago 392
Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán 393
Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758 ... 395
Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira 395
Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 397
Tabla 127 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa 399

Tabla 128 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita 400

Tabla 129 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 404

Tabla 130 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052 406

Tabla 131 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814... 407

Tabla 132 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033..... 417

Tabla 133 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 420

Tabla 134 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 424

Tabla 135 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 425

Tabla 136 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 427

Tabla 137 Seguimiento Financiero Interventoría..... 428

Tabla 138 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 429

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 26

Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 152

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 31

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 31

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 33

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 34

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 35

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 36

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 37

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 37

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 39

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 40

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 41

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 42

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 43

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 44

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 45

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 46

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 47

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 48

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 49

Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano 50

Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes50

Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago 51

Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua 51

Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán. 52

Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita..... 52

Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte 53

Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander 53

Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira 54

Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote 54

Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro 55

Fotografía 30 Entregas de EPP - Abrego..... 121

Fotografía 31 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 122

Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 123

Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943 187

Fotografía 35 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 188

Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 189

Fotografía 37 Implementación protocolo de bioseguridad 190

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 68

Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 73

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 78

Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 83

Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 126

Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 133

Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 139

Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 209

Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 216

Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 222

Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 338

Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 340

Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 341
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 342
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos..... 343
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario..... 344
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano..... 345
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 346
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 347
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander..... 348
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 349
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita..... 350
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 351
Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán 352
Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago 353
Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 354

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por

valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el gobierno nacional y en consecuencia para la gestión del instituto nacional de vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella.
Pavimentos Convencionales.
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
Construcción de Filtros y/o cunetas.
Bases Estabilizadas.

Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente.
Mejoramiento de la subrasante con adición de material.
Suministro e instalación de afirmado.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Rocería.
Reparación de baches.
Limpieza de alcantarillas y descoles.
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.
Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

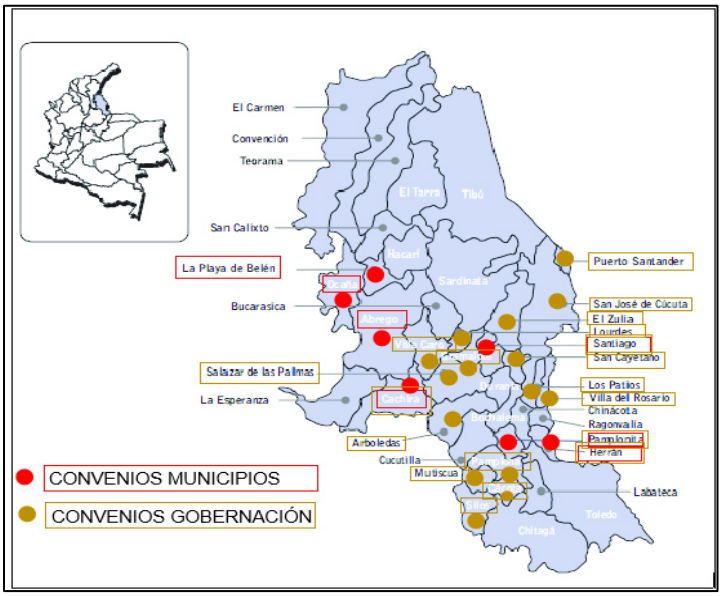


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa "COLOMBIA RURAL", los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a

necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 3 correspondientes al municipio de ABREGO, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACION 2033. A la fecha se encuentran terminados 7 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758, HERRAN, PAMPLONITA, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA Y GOBERNACION 2052 los cuales se encuentran en proceso de liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados. Se encuentra finalizado el tiempo contractual el municipio de CACHIRA.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto





Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.









2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.









Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.





	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.



Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.







Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.



Corredor Corral Viejo – Llano Grande



Corredor 2 - Clavelinas

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avicola	Tramo 2 Plak Huella Extt

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tramo 3 Alto Grande</td><td>Tramo 4 Buenavista</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tramo 5 Bosquecito</td><td>Tramo 7 Curvon</td></tr>
</table>

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.






Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.









Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.







Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.









Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.





Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.





Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.





Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.



Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.



Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.



Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.



Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.





Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira


A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.





Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa Caro.

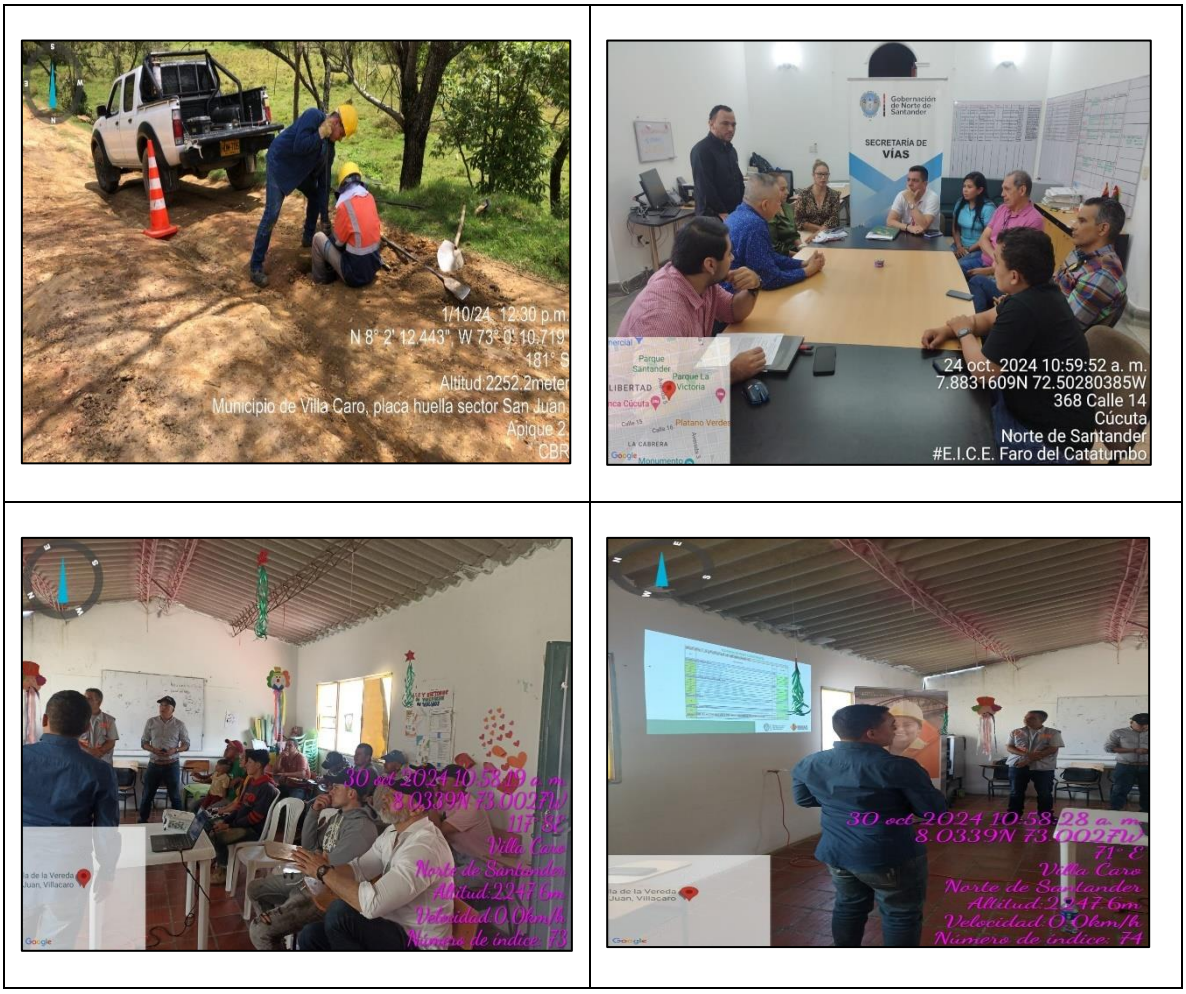

Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 3 correspondientes a los municipios de, ABREGO, GOBERNACIÓN 1943 y 2033 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758, HERRAN, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA, PAMPLONITA y GOBERNACIÓN 2052. CACHIRA su plazo contractual finalizo. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En liquidación	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado Tiempo contractual finalizado	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Liquidado	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En liquidación	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En liquidación	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En liquidación	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago



3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$ 10,222,576.00	276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$ 434,817,303.00**	$	312,666,414.80
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00		
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00	5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO							**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

Las actividades finalizaron el 15 junio del presente año.

El documento de la guía ambiental – PAGA, fue APROBADO por el INVIAS, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563. Se espera documentación final de las actividades realizadas.

Se espera documentación final de las actividades realizadas.

3.1.1.4. Actividades sociales

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

El 11 de octubre de 2023 se dio aprobación por parte de la interventoría con oficio GIC-INVIAS-NTS-1172-22 al Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA).

El contratista envió el 21 de octubre envió informes mensuales, informe trimestral y anexos para revisión y concepto por parte de la interventoría, tan pronto sea revisada la información se realizan algunas observaciones (si es necesario) al contratista para hacer las debidas correcciones y luego proceder a enviar a Invias.

3.1.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTIA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

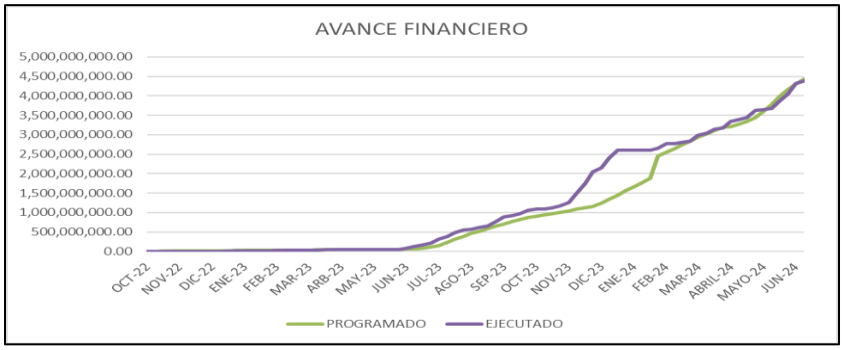


Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A corte del presente informe se ejecuta la terminación de la obra física.

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15/10/2024.


3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23



Proyecto finalizado

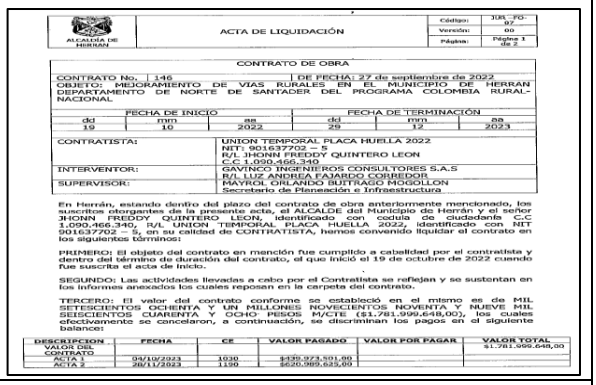

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. | 146 | DE FECHA: 27 de septiembre de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN		
dd	mm	aa	dd	mm	aa
19	10	2022	29	12	2023

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA 2022
NIT: 901637702 – 5
R/L JHONN FREDDY QUINTERO LEON
C.C 1.090.466.340

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
R/L LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

SUPERVISOR: MAYROL ORLANDO BUITRAGO HOGOLLON
Secretario de Planeación e Infraestructura

En Herrán, estando dentro del plazo del contrato de obra anteriormente mencionado, los suscritos otorgantes de la presente acta, el ALCALDE del Municipio de Herrán y el señor JHONN FREDDY QUINTERO LEON, identificado con cedula de ciudadanía C.C 1.090.466.340, R/L UNION TEMPORAL PLACA HUELLA 2022, identificado con NIT 901637702 – 5, en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato en los siguientes términos:

PRIMERO: El objeto del contrato en mención fue cumplido a cabalidad por el contratista y dentro del término de duración del contrato, el que inició el 19 de octubre de 2022 cuando fue suscrita el acta de inicio.

SEGUNDO: Las actividades llevadas a cabo por el Contratista se reflejan y se sustentan en los informes anexados los cuales reposan en la carpeta del contrato.

TERCERO: El valor del contrato conforme se estableció en el mismo es de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.781.999.648,00), los cuales efectivamente se cancelaron, a continuación, se discriminan los pagos en el siguiente balance:

DESCRIPCION	FECHA	CE	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO					$1.781.999.648,00
ACTA 1	04/10/2023	1030	$439.971.501,60		
ACTA 2	26/11/2023	1150	$620.969.625,00		

Acta de liquidación

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$	85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$	644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$	368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$	251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$	135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$**	**1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$	10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$	26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$	8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$	2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$	19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$	16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$**	**84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m). MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$	22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL		**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$	8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$	96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$	28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL		**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO								**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15/10/2024.

3.2.1.3. Actividades Sociales

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15/10/2024.

3.2.1.4. Actividades SST

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15/10/2024.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A fecha del 31 de enero, el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

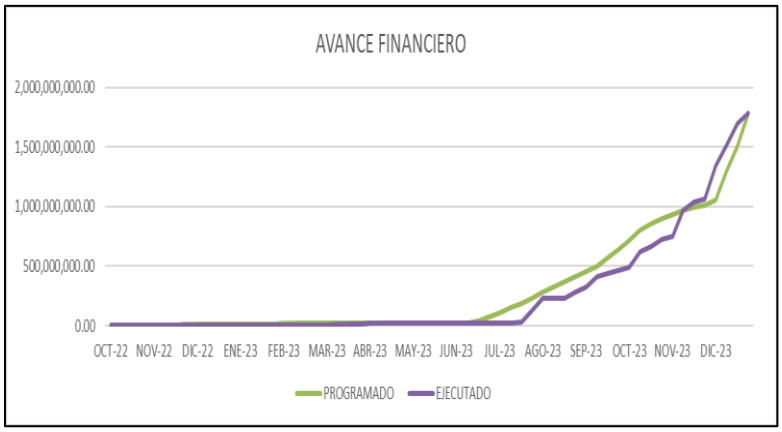


Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

El proyecto ejecuto el 100% de las actividades contractuales.

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15/10/2024.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.2. Actividades ambientales

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

3.3.1.3. Actividades Sociales

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

3.3.1.4. Actividades SST

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RECORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RECORD) - GIC-INVIAS-NTS-1152-24 del 16-Ago-2024 - **APROBACIÓN DE PLANOS RECORD**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Se mantiene al contratista que se mantiene las observaciones de la cuneta Samaritana.

Etapa de Construcción

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

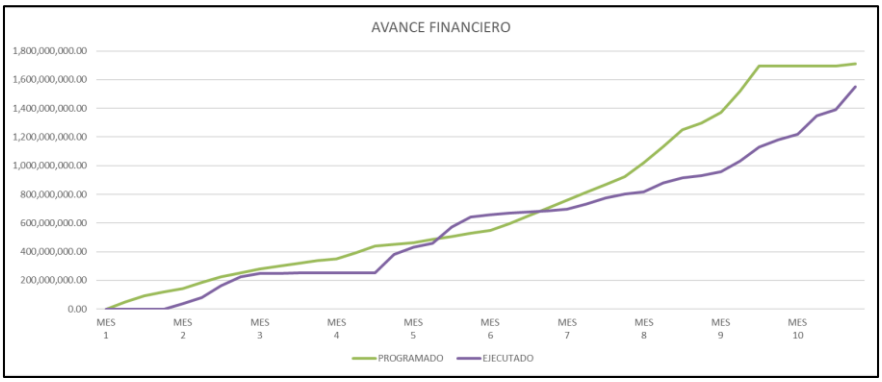


Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

Se ejecuto el 100% de las actividades contractuales.

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06/09/2024.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra su tiempo contractual finalizo.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Solicitud	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"									
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024		
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS									
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00	
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45	
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96	
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12	
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28	
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-	
					SUB TOTAL	**$ 929,150,702.00**	$	182,724,870.81	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND									
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72	
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85	
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12	
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00	
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04	
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40	
					SUB TOTAL	**$ 153,477,996.00**	$	63,030,683.13	
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS									
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74	
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25	
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23	
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00	
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12	
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-	
					SUB TOTAL	**$ 347,681,393.00**	$	390,239,804.34	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND									
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12	
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33	
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00	
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00	
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52	
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62	
					SUB TOTAL	**$ 46,366,624.00**	$	33,970,578.59	
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS									
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54	
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80	
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40	
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00	
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32	
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-	
					SUB TOTAL	**$ 949,833,499.00**	$	438,984,190.06	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND									
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72	
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84	
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42	
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00	
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80	
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60	
					SUB TOTAL	**$ 189,941,468.00**	$	98,488,528.38	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-	
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-	
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-	
					SUB TOTAL	**6,421,903.00**	$	-	
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31	

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	1.3 meses hasta el 20 de diciembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	20 de diciembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de octubre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de octubre por parte del contratista se tiene:

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					EJECUTADO A 31/OCTUBRE/2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,752,862,691.064
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,763.00
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,285.00
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632.06
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,004.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,940.00
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,067.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	134,540,680
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,150,694,560
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	2,126.48	$ 107,119,304
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	440.84	$ 330,474,383
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	33,257.20	$ 270,314,522
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,409.63	$ 265,866,085
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	151.91	$ 67,019,046
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	7,407.24	$ 109,901,220
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	107,486,146
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	249.20	$ 12,553,201
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	46.21	$ 36,068,245
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	78.76	$ 2,808,030
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro ir	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	32.00	$ 29,619,296
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	5.65	$ 3,335,647
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	2,842.24	$ 23,101,727
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					$	2,266,554
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					$	270,261,977
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 270,261,977
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	3,418,112,608

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

Corredor 2 Brisas del Tarra - La Arenosa

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Proconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se realiza en el tramo de San Juan actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 205.6 m paño completo.

- Se realiza en el tramo la Vega del Tigre actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 76 m paño completo.

- Se inicio en el tramo San Luis actividad de corte y figurado de acero para vigas riostras y bordillos.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.5.1.2. Actividades ambientales

El contratista no envió informe mensual del componente ambiental.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas:

1. El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.
2. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuenta con la participación de los profesionales relacionados en materia ambiental y social, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando Lopez Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Claudia Liliana Rangel	Directora De Obra	321 3257189

Fuente: Contratista

3. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.
4. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.
5. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.
6. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua.

- Predio para la disposición de residuos sólidos.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	**Anexo 1**

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del San Vicente, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	01/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Manejo de materiales de construcción	03/10//2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Manejo de equipos y materiales	22/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Capacitación sobre la Señalización de los frentes de obra	15/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Protección de Ecosistemas sensibles o de manejo especial	08/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Ahorro y uso eficiente de agua y energía	12/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
Protección de fauna y flora	10/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**
PAGA y medidas de manejo ambiental	18/10/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 3. No 1**



Fuente: Contratista

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Taller Inducción	$\left(\frac{7}{7}\right) * 100$	100%	**Anexo 4**
Capacitaciones	$\left(\frac{7}{7}\right) * 100$	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

1. Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

2. Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Proveedor	Permiso - Licencia	Observaciones
Concretos & Triturados Algodonal	Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería.	Vigentes

3. Se estableció con una vivienda cerca de la zona de trabajo una autorización para el uso del baño y bodega para el personal de trabajo.

Clase de permiso	Permiso - Licencia	Observaciones
Baño fijo	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Mary Lucia Pacheco	Vigente **Anexo 5**
Bodega	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso bodega: Sra. Sra. Mary Lucia Pacheco	Vigente **Anexo 6**

4. Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado, a principio del mes de octubre se entregarán a la Unidad se Servicios Públicos de Abrego.

5. El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Unidad de Servicios Públicos de Abrego, en el periodo reportado se realizó un consumo de once (10) metros cúbicos (ver anexo 7), la certificación se presentará una vez se realice la facturación y su respectivo pago.

6. Aun no se ha recibido respuesta por parte de la secretaria de planeación en la certificación del predio para la disposición de RCD, se reiteró nuevamente un oficio realizando la solicitud de certificación del uso del suelo del predio privado. (Ver anexo 9).

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Autorizaciones y/o permisos para el proyecto	$\left(\frac{4}{5}\right) * 100$	80%	**Anexo 5, 6, 8**
Observaciones			
Los certificados de agua y entrega de residuos sólidos se entregan a principio del mes de octubre una vez se realice la facturación y pago.			

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas:

En el periodo reportado se realizó suministro de materiales de construcción, el cual fue dispuesto a un costado de la vía extendido en forma de cordón con la finalidad de no realizar obstrucción del paso.

El material de construcción fue cubierto con plástico para evitar el aporte de este a las fuentes hídricas o escorrentías.

- Vereda San Juan:



Registro fotográfico 3. Material de construcción San Juan

Fuente Contratista

- Vereda El Tigre:



Fuente: Contratista

No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

Se cuenta con un kit antiderrame en el frente de obra de San Juan y la Vega del Tigre.

El concreto se realiza en la mezcladora y el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras



Fuente: Contratista

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	$\left(\frac{2}{2}\right) * 100$	100%	**Anexo 3**
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	$\left(\frac{2}{2}\right) * 100$	100%	**Anexo 3**
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100$	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
Ninguno			

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: - Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 6).

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Lugar de Ejecución			
San Juan - la Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Señalización y demarcación propuesta	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	**Anexo 12**
Observaciones			
Ninguna			

Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 924.995 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	15	Frente de obra
Donado	0	Vereda del Chorro, Sr Miguel.
Disposición final	0	
TOTAL	15	



Fuente contratista

Se está a la espera de la respuesta de la secretaria de planeación para la certificación del uso del suelo del predio privado para poder depositar el material de excavación que no se requiera en el proyecto. (ver anexo 8)

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD)	$\left(\frac{0}{0}\right) * 100$	-	En el periodo no se requirió
Observaciones			
En el periodo reportado se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el mejoramiento del estado de la vía, debido al proceso de erosión y lluvias.			

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto.



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

Se realizará la entrega de los residuos una vez la cantidad sea la necesaria para la entrega a la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego.

A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (Anexo 11), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como especiales, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Esperancita	No aprovechables	0,1	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Aprovechables	9,5	Rojo

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM)	1	100%	**Anexo 6**
Implementación de programas de separación, reutilización – reducción de residuos (PRRR))	1	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Unidad de Servicios Públicos, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.
2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID).

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo.



Fuente: Contratista

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Uso de baños	$\frac{1}{1} * 100$	100%	**Anexo 3 y 5**
Derrames	$\frac{0}{0} * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

Subprograma 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Actividades:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros.

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 4, Anexo 3 Registro No. 8)





Fuente: Contratista

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo (Anexo 12)

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Uso de baños	$\left(\frac{2}{2}\right) * 100$	100%	**Anexo 3, 5 y 12**
Derrames	$\left(\frac{2}{2}\right) * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA)	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100$	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas:

1. En el mes reportado se utilizó la mezcladora, vibro compactador y retroexcavadora

2. Se realizaron los correspondientes preoperacionales a l maquinaria y equipos utilizados en obra.





Fuente: Contratista

3. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.
4. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.
5. El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.





Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Mantenimientos	$(\frac{0}{0}) * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

3.5.1.3. Actividades Sociales

PROGRAMA 6: GESTION SOCIAL

Sub- Programa 1: Mano de obra Contratada con enfoque de género, de derechos y deferencial.

Objetivo: El proyecto de contratación de mano de obra propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto.

Adicionalmente la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Implementación: A continuación, se relaciona el personal contratado en el periodo del presente informe.

Personal contratado de manera directa con el consorcio ad vias a la fecha del presente informe es el siguiente:

ITEM	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CONTRATISTA
1	37.334.004	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	CONSORCIO AD VÍAS
2	1.094.322.102	CAICEDO LOPEZ ALBET	RESIDENTE	CONSORCIO AD VÍAS
3	1.979.240	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
4	1.007.436.412	ANGARITA PACHECO DANIELFERNANDO	OFICIAL	CONSORCIO AD VÍAS
5	88.283.204	ANGARITA LUIS FERNANDO	MAESTRO	CONSORCIO AD VÍAS
6	1.091.596.583	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
7	1.090.962.198	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
8	88.283.519	DURAN EVELIO	OFICIAL	CONSORCIO AD VÍAS
9	13.195.759	ARDILA ROBLES NUMAEL	MAESTRO	CONSORCIO AD VÍAS
10	1.094.574.999	CONTRERAS GAONA ANDELFO	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS

11	1.091.592.239	BECERRA VACA DINAEL	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
12	1.091.805.856	LAZARO GAONA FABIO	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
13	1.093.061.064	QUINTERO QUINTERO JEFERSON JOSE	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
14	1.004.860.945	QUINTERO GAONA EUDER	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
15	1.004.861.018	GAONA CONTRERAS JOHN JAIDER	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
16	1.978.758	QUINTERO QUINTERO ARTURO	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
17	88.283.556	CONTRERAS BACCA JAIRO	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
18	1.091.593.599	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS
19	1.126.249.231	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	OBRERO	CONSORCIO AD VÍAS

Número de personal contratada del Área de Influencia Directa = 17

Número de Personal contratado Foráneos (Del Área de Influencia Indirecta) =2

Total, de trabajadores Vinculados al proyecto =19

Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) * 100

Vinculación = (17/19) *100 Vinculación= 89.5 %

PROGRAMA 7: COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Sub- Programa 4: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

Objetivo: Verificar el cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de consulta previa, en caso que se determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto.

Implementación: El CONSORCIO AD VIAS realizo radicación ante el ministerio del interior de la consulta previa, mediante los siguientes oficios:

- OFC-CADV-GIC-043-2023 de fecha 27 de marzo del 2023.
- Oficio OFC-CADV-GIC-089-2023 de fecha 09 de junio del 2023 observaciones enviadas por el ministerio del interior.
- Oficio OFC-CADV-GIC-132-2023 de fecha 31 de agosto del 2023.

Se cuenta a la fecha del presente informe con la resolución emitida por parte del Ministerio del Interior RESOLUCIÓN NÚMERO ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Se anexa la Resolución emitida por el Ministerio Ver ANEXO No 1 RESOLUCION No ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Sub- Programa 5: Gobernanza

Implementación: se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto incluye a miembros de la Junta de acción comunal de la zona del proyecto para realizar las actividades constructivas del proyecto.

Indicadores:

Vinculación=(número de organizaciones convocadas desde etapas tempranas del proyecto/ número de organizaciones existentes en el área de influencia del proyecto de la región)*100

Vinculación = (1/1) *100 Vinculación= 100%

PROGRAMA 10: PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUISION SOCIAL

Sub- Programa 1: Atención a la comunidad

Objetivo: Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Implementación: se estableció en la Oficina del CONSORCIO AD VIAS (edificio primavera imperial apto 101, Ocaña, Norte de Santander.) un punto de atención al usuario, así mismo en el Campamento (Obra frente San Vicente – Corredor 2) .

En dichos puntos de información se dispone la siguiente información:


Contrato: 252 de 2022

Objeto: “Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Ábrego departamento de Norte de Santander del programa Colombia rural-nacional”

Contratista: consorcio AD VÍAS


Correo electrónico: internoadvias@gmail.com Teléfono: 3102150679

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

	**Punto de atención** OFICINA CONSORCIO AD VIAS, **Dirección:** edificio primavera imperial apto101, Br. Buenos Aires, Ocaña, Norte de Santander. **Horario de atención:** lunes a viernes de 8:00 a 12:00p.m. 2:00 – 5:00 p.m.

Se cuenta con formatos para realizar el seguimiento de cualquier queja o reclamo y así llevar el seguimiento a las posibles soluciones o pasos a seguir. A continuación, se relaciona dicho formato: (se anexa el los presentes formatos que hacen parte de este programa). Así mismo se instaló un buzón de sugerencia y cartelera informativa en el frente de obra San Vicente.

Ver ANEXO 2. FORMATOS PROGRAMA – BUZON DE SUGERENCIA QUEJAS O RECLAMOS.

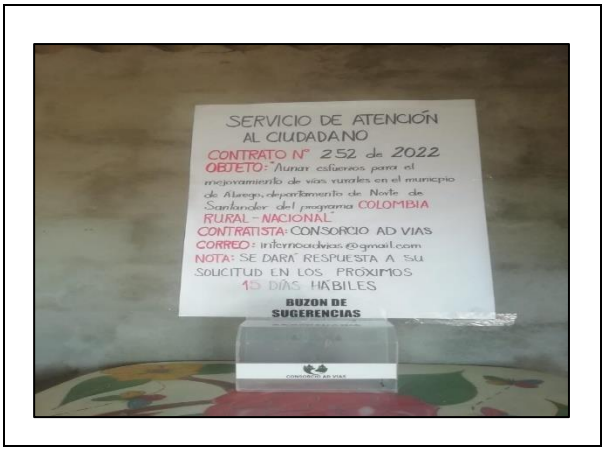


CONSORCIO AD VÍAS

PETICIONES /QUEJAS /RECLAMOS

Contrato No.:
Objeto:
Corredor No.:
Tramo:

CONTROL DE BUZON (PETICIONES/QUEJAS/RECLAMOS)

No. DE ATENCIÓN	NOMBRE	VEREDA/ENTIDAD ORGANIZACIÓN	DIRECCION	TELÉFONO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					


CONSORCIO AD VÍAS

CONSORCIO AD VIAS
NIT. 901643989-6
ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSION 1
Fecha Elaboración: 02/01/2023

Ciudadano/Ciudadanos
Nombre | Teléfono
Dirección | fecha
Municipio | Atención N°

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Área
Ambiental | Social | Tráfico | Seg. Ind. / Salud Ocupacional | Construcción | Otra | CUAL

ACCIONES A TOMAR

DATOS	RESIDENTE	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE			
CEDULA			

Indicadores:

En el presente periodo no se presentaron quejas en el buzón de sugerencia Cierres PQRS=(PQRS cerradas/ PQRS presentadas) *100

Cierres PQRS = 100 (No se presentaron durante el periodo)

Sub programa 2: información y divulgación

Objetivo: El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia, a partir del cual, se diseñan e implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del Proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Implementación: el CONSORCIO AD VIAS instalo unas carteleras informativas ubicadas en la alcaldía y en el frente de obra con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder cualquier tipo de solicitud. ANEXO 3- PIEZAS INFORMATIVAS (CARTELERA – VOLANTES), REGISTRO FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo la información y divulgación mediante volantes informativos:

SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA LA VEGA DEL TIGRE Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE PLACA HUELLA POR LO CUAL SE ENCUENTRA CERRADA EN SU TOTALIDAD SE AGRADECE SU COMPRENSION Y TOMAR LOS DESVIOS DISPUESTOS PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS.


Cartelera informativa

CONSORCIO AD VÍAS

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No 252

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.".

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS

CORREO: internoadvias@gmail.com

TELEFONO: 3102150679

NOTA: SE DARÁ RESPUESTA A SU SOLICITUD EN 15 DÍAS HÁBILES




CONSORCIO AD VÍAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


TRAMO LA VEGA DEL TIGRE

SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA LA VEGA DEL TIGRE Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, SE ESTÀ LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE PLACA HUELLA POR LO CUAL LA VIA SE ENCUENTRA CERRADA EN SU TOTALIDAD SE AGRADECE SU COMPRENSION Y TOMAR LOS DESVIOS DISPUESTOS PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS



Fuente: Contratista

Registro de información y divulgación

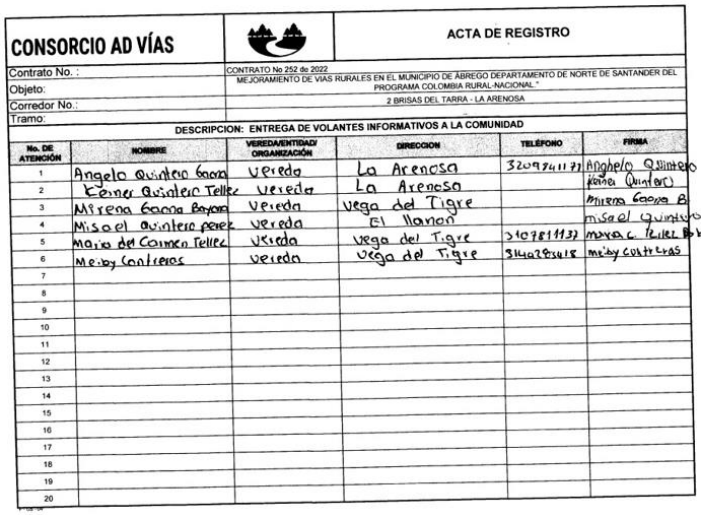

CONSORCIO AD VÍAS		ACTA DE REGISTRO
Contrato No. :	CONTRATO No 252 de 2022	
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL "	
Corredor No.:	2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA	
Tramo:		

DESCRIPCION: ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD

No. DE ATENCIÓN	NOMBRE	VEREDA/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	DIRECCION	TELÉFONO	FIRMA
1	Angelo Quintero Gama	Vereda	La Arenosa	3209741177	Angelo Quintero
2	Edmer Quintero Tellez	Vereda	La Arenosa		Edmer Quintero
3	Mirena Gama Bayona	Vereda	Vega del Tigre		Mirena Gama B.
4	Misael quintero perez	vereda	El llanon		misael quintero
5	Maria del Carmen Tellez	Vereda	Vega del Tigre	3107811137	maria c. Tellez B.
6	Meiby Contreras	vereda	Vega del Tigre	3146295418	meiby contreras
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUB-PROGRAMA 3: Cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

En este periodo se realizó una capacitación con los trabajadores en el tema de tipos de señales de tránsito para recalcar en la importancia de este tema en la buena ejecución de las actividades, lo anterior es con el fin de generar una mayor comprensión en el tema vial en los nuevos frentes de trabajo.

SEÑALES UBICADAS EN OBRA






Fuente: Contratista

Indicador:

Acercamiento= (reuniones realizadas / reuniones convocadas) *100
Acercamiento= (1/1)*100
Acercamiento= 100%

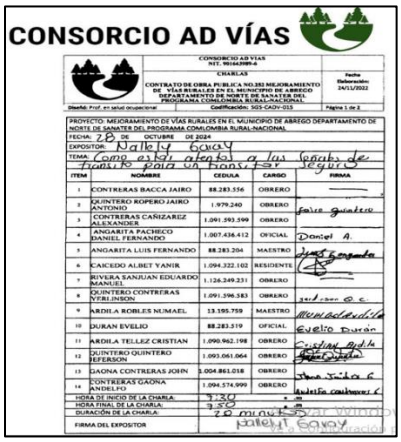
CONSORCIO AD VÍAS

CONSORCIO AD VIAS NIT: 901442009-6

CHARLAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.1053 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

Fecha Elaboración: 24/11/2022

Codificación: SGS-CADV-015 Página 1 de 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2024

EXPOSITOR: Nalley Gaona

TEMA: Como estar atentos a las señales de transito para un transito seguro

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS BACCA JAIRO	88.283.356	OBRERO	
2	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	1.979.240	OBRERO	
3	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	1.091.593.399	OBRERO	
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	1.007.436.412	OFICIAL	
5	ANGARITA LUIS FERNANDO	88.283.204	MAESTRO	
6	CAICEDO ALBET YANIR	1.094.322.102	RESIDENTE	
7	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	1.126.249.231	OBRERO	
8	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	1.091.396.583	OBRERO	
9	ARDILA ROBLES NUMAEL	13.595.759	MAESTRO	
10	DURAN EVELIO	88.283.519	OFICIAL	
11	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	1.090.962.198	OBRERO	
12	QUINTERO QUINTERO JEFERSON	1.093.061.064	OBRERO	
13	GAONA CONTRERAS JOHN	1.004.861.018	OBRERO	
14	CONTRERAS GAONA ANDELFO	1.094.574.999	OBRERO	
	HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	7:30	a. m.	
	HORA FINAL DE LA CHARLA:	7:50	a. m.	
	DURACIÓN DE LA CHARLA:	20 minutos		
	FIRMA DEL EXPOSITOR	Nalley Gaona		


CONSORCIO AD VÍAS

CONSORCIO AD VIAS NIT: 901442009-6

CHARLAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.1053 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

Fecha Elaboración: 24/11/2022

Codificación: SGS-CADV-015 Página 2 de 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2024

EXPOSITOR: Nalley Garcia

TEMA: Como estar atentos a las señales de transito para un transito seguro

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
15	QUINTERO GAONA EUDER	1.004.860.943	OBRERO	
16	BECERRA VACA DINAEL	1.091.592.239	OBRERO	
17	LAZARO GAONA FABIO	1.091.805.856	OBRERO	
18	QUINTERO QUINTERO ARTURO	1.978.758	OBRERO	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
	HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	7:30	a. m.	
	HORA FINAL DE LA CHARLA:	7:50	a. m.	
	DURACIÓN DE LA CHARLA:	20 minutos		
	FIRMA DEL EXPOSITOR	Nalley Gaona		



CONSORCIO AD VÍAS

SUB-PROGRAMA 4: Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización.

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Implementación:


Verificación de alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención de violencias contra las poblaciones diversas, personas con discapacidad y sobre nuevas masculinidades, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

Indicadores:

Capacitaciones= (número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso/ número total de trabajadores de proyecto) *100

Capacitaciones= (16/19)

*100Capacitaciones=84 %

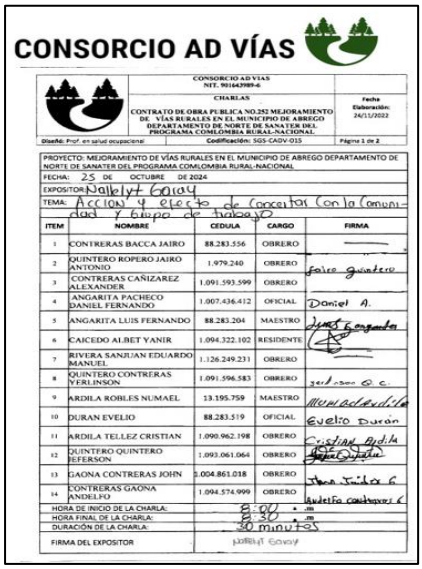

CONSORCIO AD VÍAS

CONSORCIO AD VIAS
NIT. 901642989-6

CHARLAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.252 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

Fecha Elaboración: 24/11/2022

Diseñó: Prof. en salud ocupacional | Codificación: SGS-CADV-015 | Página 1 de 2


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

EXPOSITOR: Nallelyt Gaona

TEMA: Accion y efecto de Concertar Con la Comunidad y Grupo de trabajo

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS BACCA JAIRO	88.283.556	OBRERO	
2	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	1.979.240	OBRERO	Jairo Quintero
3	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	1.091.593.599	OBRERO	
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	1.007.436.412	OFICIAL	Daniel A.
5	ANGARITA LUIS FERNANDO	88.283.204	MAESTRO	
6	CAICEDO ALBET YANIR	1.094.322.102	RESIDENTE	
7	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	1.126.249.231	OBRERO	
8	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	1.091.596.583	OBRERO	
9	ARDILA ROBLES NUMAEL	13.195.759	MAESTRO	
10	DURAN EVELIO	88.283.519	OFICIAL	Evelio Durán
11	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	1.090.962.198	OBRERO	Cristian Ardila
12	QUINTERO QUINTERO JEFERSON	1.093.061.064	OBRERO	
13	GAONA CONTRERAS JOHN	1.004.861.018	OBRERO	
14	CONTRERAS GAONA ANDELFO	1.094.574.999	OBRERO	
	HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	8:00 a.m		
	HORA FINAL DE LA CHARLA:	8:30 a.m		
	DURACIÓN DE LA CHARLA:	30 minutos		
	FIRMA DEL EXPOSITOR			

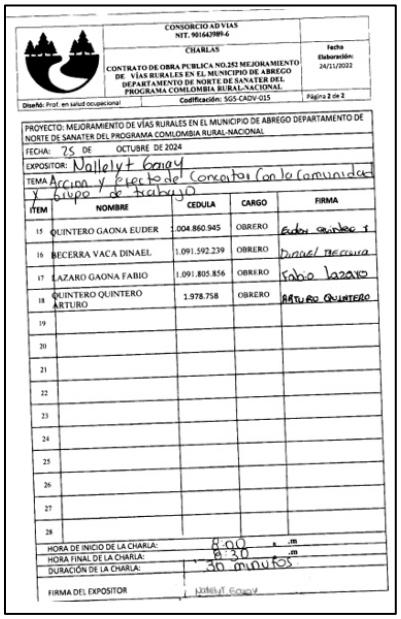

CONSORCIO AD VIAS
NIT. 901642989-6

CHARLAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.252 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

Fecha Elaboración: 24/11/2022

Diseñó: Prof. en salud ocupacional | Codificación: SGS-CADV-015 | Página 2 de 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

EXPOSITOR: Nallelyt Gaona

TEMA Accion y efecto de Concertar Con la Comunidad y Grupo de trabajo

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
15	QUINTERO GAONA EUDER	1.004.860.945	OBRERO	Euder Quintero G
16	BECERRA VACA DINAEL	1.091.592.239	OBRERO	Dinael becerra
17	LAZARO GAONA FABIO	1.091.805.856	OBRERO	Fabio Lazaro
18	QUINTERO QUINTERO ARTURO	1.978.758	OBRERO	ARTURO QUINTERO
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
	HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	8:00 a.m		
	HORA FINAL DE LA CHARLA:	8:30 a.m		
	DURACIÓN DE LA CHARLA:	30 minutos		
	FIRMA DEL EXPOSITOR			

CONCLUSIONES

Durante el periodo se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."

Socializar con la comunidad la importancia del buzón de sugerencias y promover su uso como mecanismo de participación ciudadana. Así mismo generar espacios que promuevan la información activa durante la ejecución de la obra para que la comunidad participe activamente de los espacios dispuestos para este fin.

Promover entre la comunidad el ánimo de partición ciudadana, haciendo uso activo de los mecanismos directamente relacionados para este fin, como el tema de los buzones, atención de PQRS, reuniones extraordinarias y demás, ya que esto nos permite conocer de manera directa sus conformidades e inconformidades para brindar un acompañamiento oportuno en cada situación.

Se cuenta por parte del l Ministerio del Interior con la resolución No ST – 0281 del 14 de marzo del 2024 acerca de la consulta previa donde se puede verificar:

Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado 2024-1-002421-006797 ID 274387 del 01 de febrero de 2024, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SUB-PROGRAMA 4: Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización.

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Implementación:


Verificación de alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención de violencias contra las poblaciones diversas, personas con discapacidad y sobre nuevas masculinidades, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

Indicadores:

Capacitaciones= (número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso/ número total de trabajadores de proyecto) *100

Capacitaciones= (7/7) *100 Capacitaciones=100%

Nota: la capacitación realizada corresponde al frente de obra del tramo San Juan.

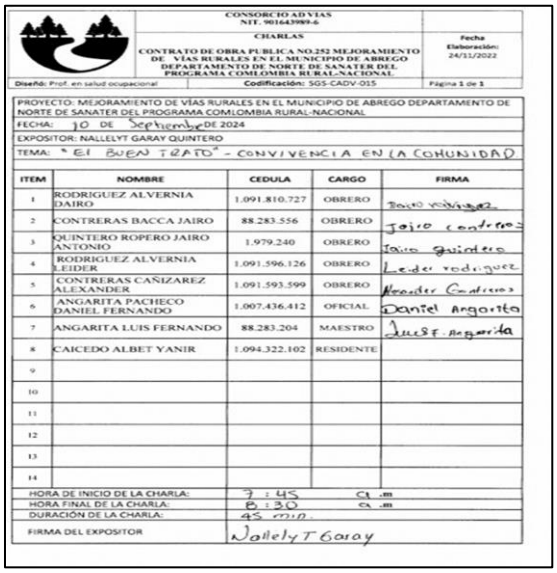

CONSORCIO AD VIAS
NIT. 901643989-6

CHARLAS

Fecha Elaboración: 24/11/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.252 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

Diseño: Prof. en salud ocupacional | Codificación: SGS-CADV-015 | Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANATER DEL PROGRAMA COMLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA: 30 DE Septiembre DE 2024

EXPOSITOR: NALLELYT GARAY QUINTERO

TEMA: "El BUEN TRATO" - CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	RODRIGUEZ ALVERNIA DAIRO	1.091.810.727	OBRERO	
2	CONTRERAS BACCA JAIRO	88.283.556	OBRERO	
3	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	1.979.240	OBRERO	
4	RODRIGUEZ ALVERNIA LEIDER	1.091.596.126	OBRERO	
5	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	1.091.593.599	OBRERO	
6	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	1.007.436.412	OFICIAL	
7	ANGARITA LUIS FERNANDO	88.283.204	MAESTRO	
8	CAICEDO ALBET YANIR	1.094.322.102	RESIDENTE	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

HORA DE INICIO DE LA CHARLA: 7:45 a.m
HORA FINAL DE LA CHARLA: 8:30 a.m
DURACIÓN DE LA CHARLA: 45 min.
FIRMA DEL EXPOSITOR: Nallely T Garay

- Durante el periodo se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."

- Socializar con la comunidad la importancia del buzón de sugerencias y promover su uso como mecanismo de participación ciudadana. Así mismo generar espacios que promuevan la información activa durante la ejecución de la obra para que la comunidad participe activamente de los espacios dispuestos para este fin.

- Promover entre la comunidad el ánimo de partición ciudadana, haciendo uso activo de los mecanismos directamente relacionados para este fin, como el tema de los buzones, atención de PQR, reuniones extraordinarias y demás, ya que esto nos permite conocer de manera directa sus conformidades e inconformidades para brindar un acompañamiento oportuno en cada situación.

- Se cuenta por parte del I Ministerio del Interior con la resolución No ST – 0281 del 14 de marzo del 2024 acerca de la consulta previa donde se puede verificar:

Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA

RURALNACIONAL”, localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL”, localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA

RURALNACIONAL”, localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado 2024-1-002421-006797

274387 del 01 de febrero de 2024, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL”, localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V3, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032474, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

1. La documentación inicial

2. Diligenciar los formatos y enviar el documento PAGA.

3.. Las actas de vecindad (Inicio y cierre de obra) y levantamiento de veedurías.

4. Las evidencias fotográficas.

5. Los informes mensuales durante la ejecución de la obra.

6. Informes Trimestrales con sus debidos anexos,

7. Anexos

La interventoría recibe el informe mensual del mes de septiembre por parte del contratista

Actividades SST

El presente contrato está suspendido, por lo tanto, las actividades de obra no se están ejecutando:

1. Contratación del personal

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37.334.004	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
2	CAICEDO LOPEZ ALBET YANIR	RESIDENTE	1.094.322.102	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	ANGARITA LUIS FERNANDO	MAESTRO	88.283.204		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OFICIAL	1.007.436.412		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	OBRERO	1.979.240		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	OBRERO	1.091.593.599	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
7	CONTRERAS BACCA JAIRO	OBRERO	88.283.556	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
8	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	OBRERO	1.126.249.231	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
9	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	OBRERO	1.090.962.198	04/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
10	DURAN EVELIO	OFICIAL	1.091.596.126	04/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
11	ARDILA ROBLES NUMAEL	MAESTRO	13.195.759	04/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
12	CONTRERAS GAONA ANDELFO	OBRERO	1.094.574.999	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
13	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	OBRERO	1.091.596.583	18/09/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
14	BECERRA VACA DINAEL	OBRERO	1.091.592.239	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
15	LAZARO GAONA FABIO	OBRERO	1.091.805.856	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
16	QUINTERO QUINTERO JEFERSON JOSE	OBRERO	1.093.061.064	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
17	QUINTERO GAONA EUDER	OBRERO	1.004.860.945	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
18	GAONA CONTRERAS JOHN JAIDER	OBRERO	1.004.861.018	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
19	QUINTERO QUINTERO ARTURO	OBRERO	1.978.758	14/10/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Exámenes de ingreso

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	CONTRERAS GAONA ANDELFO	1.094.574.999	OBRERO	X	CAPELLA I.P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
2	BECERRA VACA DINAEL	1.091.592.239	OBRERO	X	CAPELLA I.P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
3	LAZARO GAONA FABIO	1.091.805.856	OBRERO	X	CAPELLA I. P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
4	QUINTERO QUINTERO JEFERSON JOSE	1.093.061.064	OBRERO	X	CAPELLA I. P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
5	QUINTERO GAONA EUDER	1.004.860.945	OBRERO	X	CAPELLA I. P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
6	GAONA CONTRERAS JOHN JAIDER	1.004.861.018	OBRERO	X	CAPELLA I. P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS
7	QUINTERO QUINTERO ARTURO	1.978.758	OBRERO	X	CAPELLA I. P.S.S.A.S	VALVUENA VENCE MIGUEL	LIC.S O/SST 11351/20	CONSORCIO AD VIAS

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

5. Dotación elementos de Protección Personal

Para el periodo del presente informe no se registran entregas de elementos de protección personal.

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fotografía 31 Entregas de EPP - Abrego

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

1. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de octubre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

2. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de octubre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	10	15

3. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	octubre	0



Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(…) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los ríos aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como única alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hídrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raíz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en límites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, así como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(…)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA para la construcción de dos alcantarillas en el Tramo de San Juan, en el tramo de San Vicente seguirá con la ejecución de la placa huella.

A continuación, se relacionan las cantidades de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	1847	544.35
		CORREDOR 2 VEREDA	697		

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

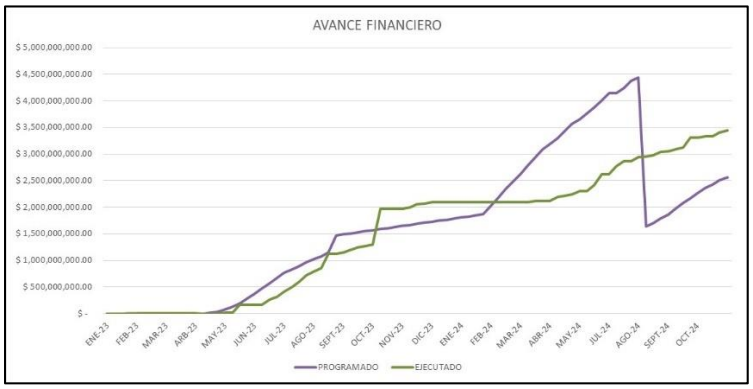


Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

A fecha del presente informe se tiene un avance ejecutado de obra de $3.437.501.140,06 frente a un avance programado de $2.558.676.783,58.

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, una vez se ejecutó a cabalidad el 100% del proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 31/07/2024
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CORREDOR 1: LLANO GRANDE - SAN PEDRO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 800 MTS				**$ 1,076,212,491.85**				
1	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1601.64	$ 71,112,816
2	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	491.70	$ 381,067,500
3	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	41842.52	$ 335,577,010
4	320.3	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	1003.73	$ 201,749,730
5	630.7	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	67.37	$ 28,295,400
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	4560.94	$ 60,204,408
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND				**$ 40,260,415.12**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	99.68	$ 4,425,792
8	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	18.49	$ 14,329,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	31.51	$ 945,300
10	661.2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	12.00	$ 10,200,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	2.26	$ 1,243,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	1137.12	$ 9,119,702
CORREDOR 2: ESPERANZA - ESPERANCITA - CLAVELLINOS								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS				**$ 954,963,397.86**				
1	600.1.1-2	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1376.63	$ 61,122,372
2	630.4 - 2	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	446.65	$ 346,153,750
3	640.1-2	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	36584.20	$ 293,405,284
4	320.3-2	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	922.69	$ 185,460,690
5	630.7-2	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	49.44	$ 20,764,800
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	3647.24	$ 48,143,568
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND				**$ 71,550,425.99**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	164.17	$ 7,289,148
8	630.4 - 3	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	32.17	$ 24,931,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	63.70	$ 1,911,000
10	661.2-2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	18.00	$ 15,300,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	3.64	$ 2,002,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	2180.61	$ 17,488,492
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 4,550,000**				
13	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor1	und	$ 350,000	7.00	$ 2,450,000
14	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor 2	und	$ 350,000	6.00	$ 2,100,000
ITEMS NO PREVISTO:				**$ 94,850,758**			0.00	$ -
	900.2.8	Transporte a distancia adicional a la contractual			gl	$ 57,577,010	0.85	$ 48,940,459
	N.P 1	Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro			ML	$ 46,361	115.66	$ 5,362,113
	N.P 2	Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invías, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000			ML	$ 275,909	115.66	$ 31,911,635
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 2,242,387,489**		**$**	**2,233,007,469**

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

Para este periodo No aplican informe Las actividades constructivas, el proyecto termino el 26 de agosto, se recibe información documental, con anexo del balance de terminación del proyecto de la gestión ambiental del Consorcio La Playa 2022, con sus respectivos soportes.

Considerando lo mencionado, el CONTRATO No. MP- LP-004 DE 2022 “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría realizo el monitoreo adecuado de la documentación requerida para la ejecución de las obras hasta la terminación de la obra el día 26 de agosto del año en curso. Asimismo, se inspeccionaron y evaluaron las acciones realizadas en el PAGA, culminar el proyecto, es de resaltar que el contratista entrego los informes mensuales de los programas en los tiempos requeridos, se esperan algunos anexos del programa por entregar, los cuales están siendo consolidados por el contratista ante autoridad ambiental y terceros proveedores.

Actividades Sociales

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Las actividades que se han realizados en el componente social fueron las siguientes:

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032475, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

Se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Durante el periodo de ejecución del 01 al 26 de agosto el contrato estuvo suspendido por un término de 20 días por lo cual no se llevaron a cabo en su totalidad los programas de la gestión social.

La fecha de terminación actual de obra fue el 26 de agosto del 2024

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

1. La documentación inicial

2. Diligenciar los formatos y enviar el documento PAGA.

3.. Las actas de vecindad (Inicio y cierre de obra) y levantamiento de veedurías.

4. Las evidencias fotográficas.

5. Los informes mensuales durante la ejecución de la obra.

6. Informes Trimestrales con sus debidos anexos,

7. Anexos

Actividades SST

Para este periodo No aplican informe de actividades constructivas, el proyecto termino el 26 de agosto, se recibe información documental. El contrato de obra inicia el proceso de liquidación.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto, como el sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del informe, el contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la

construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Esperancita y en el Corredor uno en el tramo de San Pedro y llano grande Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

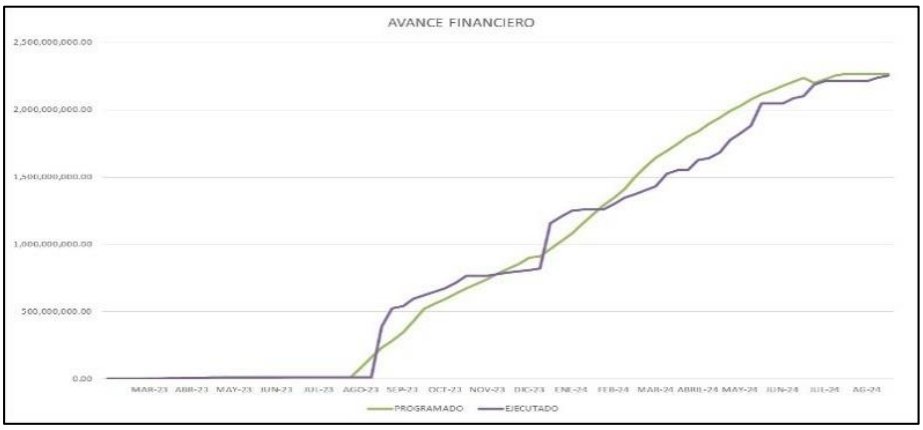


Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	Hace entrega documentación – PHP-026-2022 del 01-Ago-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entra en fase de liquidación.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.



A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MAYO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	317.12	114,163,200.00
					SUB TOTAL	$ 1,573,583,000.00	$	1,580,266,822.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00
					SUB TOTAL	$ 65,820,300.00	$	63,622,464.00
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-
					SUB TOTAL	16,454,000.00		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00	7.00	4,200,000.00
					SUB TOTAL	4,200,000.00		
						TOTAL EJECUTADO	$	1,643,889,286.00

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.4. Actividades sociales

El proyecto de obra finalizo el 30 de mayo del 2024, a la fecha actual se realizó entrega de los 4 informes trimestrales que se les solicito por medio oficios en reiteradas ocasiones para revisión y concepto por parte de la interventoría; la documentación fue enviada fuera de la fecha indicada (extemporánea), se le hace la observación y se le vuelve a solicitar los anexos que hacen falta para agregar a los informes y enviar a Invias.

El 24 de octubre de 2024 por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1433-24 y GIC-INVIAS-NTS-1434-24 se da aprobación por parte de la interventoría a INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO 2023-2024.

En Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-106443 el Invias hace OBSERVACIONES TRIMESTRAL SOCIAL CTO 1053 2023 PAMPLONITA, N. SANTANDER.

Donde se allega informe trimestral con corte al 30 de septiembre de 2024, está subdirección acusa recibido y señala lo siguiente: Se reciben debidamente y sin observaciones los siguientes documentos formatos: • ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS -MASPSMN1-IN-3-FR-1- • MATRIZ DE CUMPLIMIENTO SOCIAL - MASPS-MN1-IN-3-FR-3- • PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL MASPS-MN1-IN-3-FR-5- • PRE-ACTAS MASPS-MN1-IN-3-FR-6- no. 39 • BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO - MASPS-MN1-IN-3-FR-2

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

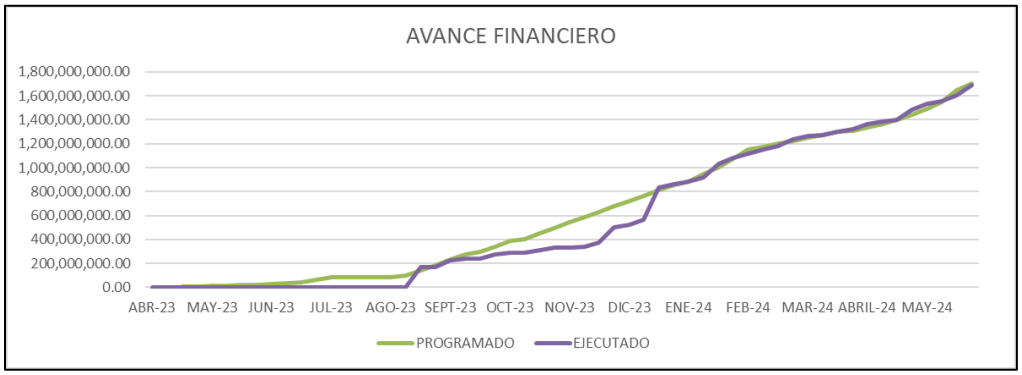


Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha reinicio 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de diciembre de 2024

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de octubre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	Entrega documento con comunicado UTET-02590-269 del 14-Feb-2024
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1321-24 – Observaciones 17/09/2024 Atiende observaciones 02-Oct-2024
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024 Atiende observaciones 02-Oct-2024
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-Sep-23 – Falta Gramalote y Los Patios
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1256-22 27/Oct/23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 29-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de octubre, el contratista ha desarrollado actividades técnicas de campo en los tres municipios involucrados en el proyecto: Los Patios, Arboledas y Gramalote. En el Municipio de Los Patios, los trabajos se concentran en la Vereda Corozal – California; en Arboledas, en las Veredas Volcán, Chicagua Bajo, Juan Bueno, Potreros, Helechar, Santo Domingo y Cinera; y en Gramalote, en las Veredas San Isidro y Santa Anita.

Las actividades realizadas incluyen la construcción de placa huella y obras de drenaje que comprenden la instalación de alcantarillas y estructuras de tipo box culvert, las cuales están diseñadas para garantizar un adecuado manejo de aguas en el entorno.

Municipio de los Patios

- **Vereda Corozal – California**

Durante el mes de octubre, el contratista continúa con la ejecución de placa huella en los tramos No. 1 y No. 5, además de dar inicio a las intervenciones en el tramo No. 4. De manera simultánea, se realizan obras de drenaje estructuras tipo box culvert en las siguientes localizaciones: Pr1+177 (dimensiones 1.5x1.5 m), Pr3+903 (2.0x2.0 m), Pr3+530 (2.0x2.0 m) y Pr3+435 (2.0x2.0 m), Donde se realizan las siguientes actividades:

- Se realiza excavaciones sin clasificar para cajeo estructura de placa huella a lo largo de los tramos No5, No1 y No4 espesor de 30 cm de acuerdo a diseños.

- Se realiza extendido, humectación y compactación de subbase granular a lo largo de los tramos que se intervienen dando continuidad a la ejecución de placa huella.

- Se realiza la instalación de geotextil 2400N para estabilización de la subrasante de acuerdo a las especificaciones y diseños.

- Durante este periodo, dando continuidad a los tramos en ejecución Tramo 1(Ancho de placa huella 7 m) y tramo 5 (Ancho de placa huella 5 m) se realiza armado de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos estructurales como (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) de acuerdo a las dimensiones de los mismos.

- Durante todo el mes de octubre se realiza actividades de vaciado de concreto de 21 MPa en los tramos de placa huella en ejecución No5, No1 y se da inicio en el tramo No4.

- Se finaliza vaciado de losa superior en concreto de 21 MPa elaborado en obra para Box culvert de 1,5x1,5 ubicado en el tramo No1 Pr1+177.

- Durante todo el periodo, se realizan excavaciones sin clasificar para obras de drenaje tipo Box culvert ubicados en Pr3+903, Pr3+530 y Pr3+450.

- Una vez concluidas las excavaciones y tras realizar el perfilado y replanteos correspondientes, se procede al vaciado de concreto de 14 MPa, destinado a conformar el solado y/o el concreto de limpieza. Este vaciado tiene como propósito preparar adecuadamente la base de la excavación, proporcionando una superficie uniforme y limpia sobre la cual se podrán ejecutar las siguientes etapas de construcción.

- Durante el mes, se realizó el armado del acero de refuerzo conforme a los diseños estructurales, utilizando barras #3, #4 y #5 según el despiece especificado para la estructura hidráulica del box culvert en los puntos Pr3+903, Pr3+530 y Pr3+450, todos con dimensiones de 2.0x2.0 metros. Este trabajo incluyó la disposición precisa de las barras de refuerzo, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para soportar las cargas de la estructura y brindar estabilidad y durabilidad a los elementos hidráulicos del proyecto.

- Una vez se verifica la correcta disposición y especificación del acero de refuerzo en los diferentes elementos del box culvert, se continúa con el armado de la formaleta para el encofrado de los principales componentes estructurales. Este proceso incluye la preparación de la formaleta para la losa de piso, los muros laterales y la losa superior, siguiendo estrictamente el proceso constructivo determinado para el proyecto. La instalación de la formaleta se realiza con especial atención a las dimensiones y alineación requeridas, asegurando que cada elemento esté listo para el vaciado de concreto, lo cual permitirá dar forma a los componentes estructurales del box culvert.

- Durante el periodo se realiza vaciado de elementos de box culvert Pr3+903 (2.0x2.0 m), Pr3+530 (2.0x2.0 m) de acuerdo a las dimensiones de los mismos y se realiza vaciado de losa de fondo box culvert Pr3+450 (2.0x2.0 m).

Durante este período, se llevaron a cabo reuniones con las comunidades de las veredas Corozal y California para abordar temas relacionados con el progreso del contrato. Asimismo, se definieron ciertos compromisos con las comunidades para mejorar el avance actual del proyecto, considerando que en esta vereda se realizarán intervenciones en 12 tramos de placa huella y se ejecutarán obras de drenaje en dichos tramos.

De acuerdo con las solicitudes planteadas por las comunidades respecto al manejo de aguas lluvias en el tramo No. 1, el contratista de obra presentó nuevos diseños hidráulicos el 18 de octubre. La interventoría llevó a cabo una visita técnica a cargo del especialista en hidráulica para verificar las obras proyectadas y comunicar los resultados a la comunidad. Hasta la fecha, se han emitido observaciones, siendo el último informe el 29 de octubre.

Municipio de Arboledas

Durante el mes de octubre, el contratista ha estado llevando a cabo la ejecución de placa huella en los corredores viales de varias veredas, específicamente en Cinera, Juan Bueno, Santo Domingo, Volcán, Helechar y Chicagua Bajo.

Hasta la fecha, las veredas Rinconada y Potreros no han tenido actividades programadas. Esto ha permitido al equipo concentrar sus esfuerzos en las veredas mencionadas anteriormente, donde se han desarrollado diversas tareas en los diferentes frentes de trabajo. A continuación, se describen las actividades específicas realizadas en cada uno de estos frentes.

Vereda Chicagua

Durante el periodo se continúan actividades en el tramo No. 4 de placa huella en donde se realizan las siguientes actividades:

- Dando continuidad en los elementos se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo.

- Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de sobreancho y la franja central, actuando como modulación para los elementos estructurales de la placa huella, incluyendo la viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

- Considerando la continuidad de los elementos, se lleva a cabo el traslape del acero de refuerzo #3 (3/8) y su extensión a lo largo del tramo en ejecución, tanto en dirección longitudinal como transversal, para cada uno de los elementos que se están construyendo.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para elementos de placa huella en ejecución (losas de transición, huellas, cuneta y bordillo).

- Asimismo, el contratista continúa avanzando en las actividades relacionadas con obras de drenaje (alcantarillas) en el punto Pr2+765, donde, hasta la fecha, se ha finalizado por completo, incluyendo la fundición de los elementos de encole (Poceta) y descole (cabezote).

Vereda Cinera

- En el transcurso de este periodo, el contratista de obra ha continuado desarrollando las actividades de ejecución de placa huella en el tramo No. 3 y ha comenzado con las labores en el tramo No. 1. A continuación, se detallan dichas actividades para cada tramo, con el fin de proporcionar un seguimiento claro del avance y de las acciones específicas realizadas en cada sector.

- Teniendo en cuenta la estructura de diseño de la placa huella se ejecutan actividades de escarificación, mezclado y compactación de la subrasante para estabilización de la misma de acuerdo a diseños.

- Se realizan excavaciones sin clasificar para viga riostras de acuerdo a diseños profundidad de 10 cm a lo largo de los tramos en ejecución No3 y No1.

- Según el proceso constructivo implementado, se procede con la instalación de formaletas de madera, permitiendo dar continuidad a los tramos y facilitar la modulación de los elementos de placa huella.

- Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreancho a lo largo de los tramos intervenidos.

- Se realiza corte, figurado e instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8” longitudinal y transversal para cada uno de los elementos de la placa huella.

- Durante todo el mes el contratista realiza labores de vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para cada uno de los elementos de la placa huella.

Vereda Juan Bueno

A lo largo de todo el periodo, el contratista ha concentrado sus actividades exclusivamente en el tramo No. 1, manteniendo una ejecución continua de las obras hasta completarlas en su totalidad, Cabe resaltar que teniendo en cuenta que para el presente tramo se ha tenido negación por parte de la comunidad en la ejecución de obras de drenaje (Alcantarillas) debido a que no permiten la ubicación de descoles en sus predios, se viene trabajando junto con el contratista de obra en un balance de obra para que las obras no ejecutadas sean llevadas a mayor alcance de placa huella.

- Se finaliza actividades de escarificación, mezclado y compactación de suelo-cemento para la estabilización de la subrasante dando cumplimiento a la estructura de diseño.

- Se procede con la instalación de formaletas de madera en la franja central del tramo No. 1, con el propósito de modular los elementos de placa huella a lo largo de toda la sección.

- Durante todo el período, el contratista llevó a cabo el corte e instalación acero de refuerzo de 3/8 y/o #3 longitudinal y transversal, para los diferentes elementos de la placa huella, incluyendo la curva de transición y la placa huella tradicional de acuerdo a diseños.

- A lo largo de todo el mes, el contratista llevó a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para completar los elementos de cunetas y bordillos que faltaban. Asimismo, se realizó el vaciado para la sección completa de placa huella, asegurando la continuidad del tramo completo.

Vereda Potreros

Durante el mes, el contratista de obra no ejecuto actividades de obra en el presente corredor vial teniendo en cuenta que debido a la localización de las placas huellas ejecutadas y a los tiempos de fraguado de los concretos es imposible el acceso a los tramos faltantes se tiene proyectado el inicio a principios del mes siguiente.

Vereda el Volcán

Durante el mes, el contratista ha llevado a cabo actividades relacionadas con la ejecución de la placa huella en el tramo No. 4 y ha comenzado a trabajar en el tramo No. 3, asegurando así la continuidad de los diferentes elementos de placa huella. Este avance permite mantener un flujo de trabajo constante y progresar en la finalización

- Se lleva a cabo un replanteo general de la subrasante en los tramos intervenidos con el objetivo de asegurar una adecuada compactación del terreno.

- Se continúan actividades de excavación para elementos de viga riostra a lo largo de los tramos que se intervienen durante el periodo.

- Continuando con el proceso constructivo, se procede al armado de formaletas de madera para modular los elementos de la placa huella tradicional y las secciones de curvas de transición.

- Se realiza instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 – 3/8” para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).

- A lo largo de todo el periodo, el contratista ha realizado el vaciado de concreto de 21 Mpa, elaborado en obra, para los diferentes elementos de la placa huella, incluyendo la viga riostra, las huellas, las cunetas y los bordillos.

Vereda Santo Domingo

Durante todo el periodo el contratista ejecuta actividades en el tramo No4 dando continuidad al mismo hasta finalizar, de igual manera se da inicia a la continuidad en el tramo No1B teniendo en cuenta que el mismo se tenía sin actividades a la fecha.

- Considerando la estructura de la placa huella según los diseños establecidos, se llevan a cabo las actividades de escarificación, mezclado y compactación de suelo-cemento a lo largo de los tramos No. 4 y 1B. Estas acciones son fundamentales para preparar una base adecuada que garantice la estabilidad y durabilidad de la placa huella.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para elementos faltantes de cuneta y bordillo a lo largo del tramo No4 con el fin de completar la sección completa de la placa huella.

- Se lleva a cabo la instalación de formaletas de madera para la modulación de los elementos de la placa huella tradicional, así como de las losas en las curvas de transición.

- Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo #3-3/8, tanto en dirección longitudinal como transversal, para los diferentes elementos de las placas huellas. Esta instalación asegura que la separación entre las barras sea la adecuada en cada elemento de placa huella.

- Se procede al vaciado de los elementos de la placa huella utilizando concreto de 21 MPa, elaborado en obra, para las losas de curva de transición, las huellas, la viga riostra, las cunetas y los bordillos.

- Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa para elementos de franja central y sobreanchos a lo largo de los tramos ejecutados en el periodo y de acuerdo a la sección de placa huella ejecutado.

Vereda Helechar

Durante todo el periodo, el contratista concentro sus actividades de obra en el tramo No. 3, realizando trabajos en las secciones de placa huella tradicional, sobreancho y losas de transición. Lo cual permitió el avance continuo y la finalización del mismo.

- Se continúan las actividades de estabilización de la subrasante con suelo-cemento, mediante escarificación, mezclado y compactación. Este proceso es fundamental para garantizar la resistencia y estabilidad de la subrasante.

- Se realiza excavación sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo en intervención.

- De acuerdo al proceso constructivo que se realiza se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella de acuerdo a especificaciones y diseño.

- Se lleva a cabo la instalación y el armado del acero de refuerzo #3 - 3/8 para los distintos elementos de la placa huella, incluyendo vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obras para viga riostra y huellas de acuerdo a especificaciones y de igual manera de 14 MPa para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo en ejecución.

Vereda Chicagua Bajo

Durante el periodo, el contratista continua actividades en el tramo de placa huella No4 ejecutando a lo largo del mismo placa huella tradicional y losa de transición, asi mismo se ejecutan actividades de obras de drenaje (Alcantarillas).

- Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 MPa para los elementos de la franja central y el sobreancho a lo largo del tramo No. 4, considerando la sección del tramo en ejecución.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8” para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo No4 (viga riostra, huellas, losa de transición, cuneta y bordillo).
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra de acuerdo a diseño de mezclas para los elementos estructurales de placa huella (viga riostra, huellas, losa transición, cuneta y bordillo).
- Se realiza armado de acero de refuerzo #4 y #3 para los elementos de alcantarilla poceta de encole, cabezote descole, aletas y guardarruedas.
- Se realiza encofrado de formaleta de madera para los diferentes elementos de alcantarilla de acuerdo a las dimensiones de los mismos.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa para elementos de alcantarilla poceta de encole, elementos de descole de acuerdo a especificaciones y diseños.

Municipio de Gramalote

En el presente mes, el contratista ha estado ejecutando la placa huella en el corredor vial de la Vereda Santa Anita y en la Vereda San Isidro, donde se están realizando obras de drenaje (alcantarillas) en el Pr5+960 y Box Culvert 2x2. Hasta el momento, no se han programado actividades en la Vereda Boyacá, lo que ha permitido concentrar las labores en estas dos veredas.

Vereda San isidro

Durante este período, el contratista está realizando actividades en las obras de drenaje pendientes, específicamente en la alcantarilla y en el box culvert de 2x2, donde se llevan a cabo los siguientes trabajos:

- Se procede al armado de acero de refuerzo #4 y #3, conforme al diseño de alcantarillas, para los elementos de encole (poceta) y descole (cabezal, aletas y guardarruedas).
- Se realiza encofrado en formaleta de madera para los diferentes elementos de encole de alcantarillas.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para los diferentes elementos de la alcantarilla Pr5+960.
- Se realizan excavación sin clasificar para Box culvert 2x2 Pr6+970 de acuerdo a dimensiones de diseño.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa elaborado en obra para solado y/o concreto de limpieza en el fondo del elemento y/o obra de drenaje Box Culvert.
- Se realiza armado de formaleta para fondo de Box culvert de acuerdo a dimensiones de los elementos fondo.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para elementos de Box culvert (losa fondo, muros laterales).

Vereda Santa Anita

Durante el período, se continúan actividades de la placa huella en el tramo No. 2, realizando hasta la fecha de corte del presente período las siguientes actividades:

- Se realiza la estabilización de la subrasante con cal a lo largo del tramo intervenido, conforme a las especificaciones y al diseño del presente tramo de la placa huella
- Se continua con la instalación de subbase granular a lo largo del tramo No2 de acuerdo a especificaciones de diseños de la estructura de placa huella.
- Se continua con el armado del acero de refuerzo de placa huella #3 – 3/8” para los diferentes elementos de placa huella conforme a los diseños.
- Se realiza el vaciado de concreto de 14 Mpa, producido en la obra, para los elementos de la franja central y el sobreancho, siguiendo los diseños establecidos.
- Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para los elementos estructurales de la placa huella, incluyendo la viga riostra, las huellas, la cuneta y el bordillo, de acuerdo con las especificaciones de cada elemento y sección de la misma.

A lo largo del mes, se llevaron a cabo diversas reuniones y comités de seguimiento y supervisión con el fin de evaluar exhaustivamente todas las actividades realizadas en los proyectos ubicados en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios. Estas reuniones contaron con la participación de la entidad contratante, la Gobernación de Norte de Santander, así como de las comunidades y la interventoría.

El propósito principal de estos encuentros fue analizar el avance de las obras y los compromisos asumidos por el contratista. Se buscó asegurar que todas las tareas en los distintos frentes se desarrollaran adecuadamente, con el objetivo de mejorar y tomar decisiones estratégicas que optimicen los procesos, garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos.

En el ámbito administrativo, se llevaron a cabo mesas de trabajo en colaboración con el contratista para verificar las actividades en el campo, las cantidades de obra hasta la fecha y los alcances de cada frente. También se procedió a la aprobación de un ítem no previsto, en función de las necesidades del proyecto, como el Dren Frances (1.0X0,8) para los tres municipios: Los Patios, Arboledas y Gramalote. Tras verificar las actividades ejecutadas, se elaboró un acta de modificación de cantidades No. 3 para incluir estos elementos y ajustar las actividades correspondientes.



Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

Al finalizar este mes de Octubre No se recibe información del contratista de las actividades realizadas durante el mes terminado, el mes anterior (septiembre) entrego informe extemporáneamente el día 4 octubre con radicado según oficio UTET-02590-376 de las actividades realizadas del seguimiento al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 12, quedando 1 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

Las actividades realizadas en el transcurso del proyecto, en el componente ambiental fueron las siguientes:

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Debido al egreso de la Ingeniera residentes de obra en el municipio de Los Patios, el día 22 de Abril del 2024 se realiza actualización del grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar Social Esther Saray, la profesional social Beltrán Ortega, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, de quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo previo al inicio de actividades labores en el Proyecto, durante el mes mayo ingresaron nuevos trabajadores para los frentes de obra del municipio de Gramalote.

Durante el mes de junio se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA.

1. Adecuada separación de residuos sólidos.

2. Cuidado de la flora y la fauna.

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Arboledas



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Todos los frentes de obra cuentan con sus materiales de construcción.

- Municipio de Arboledas:




Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios




Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tabla 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344 de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de junio del año 2024.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	196,1515
Arena	125,3872
Piedra	37,778
Subbase	498,036

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	81,178
Arena	51,538
Piedra	7,207
Subbase	74,415

Tabla 5. Materiales utilizados en obra municipio de Gramalote

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	213,010
Arena	136,209
Piedra	42,103
Subbase	0

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Gramalote:



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.
Los municipios de Los Patios y Gramalote se encuentran a la espera de la autorización del sitio de disposición por parte de la alcaldía.

El municipio de Arboledas cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante este periodo se entregan los residuos peligrosos almacenados en el municipio de Los Patios a la empresa NORSIDE quien se encarga de recolección transporte y su adecuada disposición final, se almacenan los residuos peligrosos en los frentes de obra de Gramalote y Arboledas, se inicia la gestión para realizar la recolección de residuos peligrosos en los frentes obra.

Durante el mes de junio se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Los Patios – Vereda California	No aprovechables	1,4	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		12,2 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Gramalote – Vereda Boyacá	No aprovechables	2,0	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	8,0	Rojo
TOTAL		19 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Arboledas – Vereda Santa Anita	No aprovechables	1,5	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		14,5 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de junio se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

3.8.1.4. Actividades Sociales

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL

Descripción actividades por programa


SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD


Objetivo: Se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de

contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Seguimiento de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad

En el mes de octubre la comunidad del municipio de patios, con acompañamiento del personero municipal y la veedora se reunieron para dejar estipulados compromisos por parte del contratista, se anexa acta de veeduría con la información de la reunión (Anexo 2).

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
Patios		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de arboledas, con ubicación en castro y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

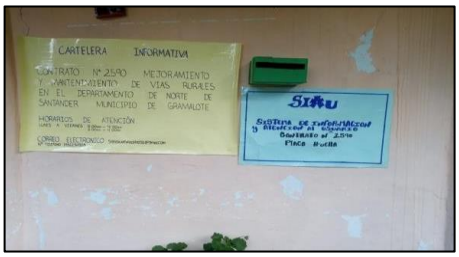Gramalote		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

4.1.2 Seguimiento a los Buzones Satelitales

En el presente mes contamos con tres medios de atención en funcionamiento y establecidos en los tres municipios que son: Correo electrónico y buzón de sugerencias.

Patios		En el buzón instalado enla Vereda California del municipio de los patios no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad.
Arboledas		En el buzón instalado en el corregimiento de castro del municipio de arboledas no se presentóninguna sugerencia por parte de la comunidad.

Gramalote		En el buzón instalado en la urbanización Miraflores del municipio de gramalote no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad

Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales

Fórmula: $\boldsymbol{N° \, medios \, de \, medios \, de \, atención \, en \, funcionamiento \, establecidos * 100}$

Fórmula: $\frac{3}{3} * 100 =$ 100%

Subprograma de apoyo a la comunidad en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad

Objetivo: Brindar apoyo en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Acciones de información

Durante el periodo actual se requirieron reuniones en el municipio de patios con el acompañamiento de la comunidad el presidente de la junta de acción comunal y la veeduría para hablar sobre las alcantarillas y box culvers del proyecto. de acción comunal de cada vereda.

Fórmula: $\frac{\boldsymbol{N° \, de \, reuniones \, realizadas * 100}}{\boldsymbol{N° \, de \, reuniones \, programadas}}$

Fórmula: (1/1) *100 = 100%

No se planearon reuniones para la socialización y, por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna.

Acciones de divulgación

- Se realizaron oficios los cuales se radicaron a través de los presidentes de juntas de acción comunal en las respectivas veredas enlos cuales se ejecuta el respectivo proyecto.

- Se realizar avisos los cuales se colocaron en sitios visitados o transitados de manera frecuente por los miembros de la comunidad

Fórmula: (5/5) *100 =100%

Gramalote		Se realizó reunión con interventoría y la comunidad para tratar temas relacionados con el proyecto y aclarar dudas que se presentaron.

Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.







Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	**LISTADO DE ASISTENCIA**	**CODIGO: FT-CS-01** **Versión: 01**
	COMPONENTE GESTIONSOCIAL - UT EDIVIALTROJA 2590	**Fecha: 11/12/2023**

TEMA O NOMBRE DEL EVENTO			**EVENTO ORGANIZADO POR:**		
CIUDAD/ MUNICIPIO			**Presencial**	**Virtual**	**Lugar:**
PROGRAMA / ESTRATEGIA		**FECHA:**	**Hora Inicio:**		**Hora fin:**

Objetivo: Realización Taller participativo de seguridad viaf

RELACION DE PARTICIPANTES- LISTADO DE ASISTENCIA

#	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO		ORIENTACION SEXUAL					PERTENENCIA ETNICA							DISCAPACIDAD							EDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	ENTIDAD / CARGO	TELEFONO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
		Mujer	Hombre					Asexual	Indígena	Negro	Afrocolom.	Raizal	Palenquer	Arom	Ninguna	Psicosocia	Física	Cognitiva	Auditiva	Visual	Múltiplo	Ninguna						
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

	ACTA DE REUNION	***AR-FAR-001***
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	**Versión 001**
		Fecha: 23/11/2023

ASISTENTES		
NOMBRE	**EMPRESA**	**FIRMA**

ASUNTO

COMPROMISOS

CONCLUSIÓN	
ACCIONES POR VENIR	**RESPONSABLE**
ELABORADA POR	

VEEDURIA CIUDADANA CALIFORNIA
Aprobada por Resolución N° 028 del 20 de septiembre de 2024

ACTA DE COMPROMISO

LUGAR Y FECHA: Escuela California, octubre 7 de 2024

PARTICIPANTES:
Personería municipal de los patios
Doctor Raúl E. Jabba

Constructora Edivial troja
Ingeniero Director de obra, William Quintero Ingeniero Residente, Cesar Cárdenas

Interventoría Gavinco
Director de Interventoría, Ing. Jairo Andrés Quintero Interventor Residente, José Torres
Inspector de Interventoría, Ing. David Álvarez Ortiz

Secretaría de Vías Gobernación Ingeniera Asesora, Joselyn Gutiérrez

Presidentes JAC
Mario Otero, Vereda corozal
Carlos Alfredo Gélvez, Vereda California Veeduría Ciudadana California Yasmind Rolón Ascencio, presidente Jonathan Hernández, Secretario Rodolfo Manrique, Fiscal Jhoel Rangel, Veedor Miguel Delgado, Veedor, Comunidad General Vereda California

ORDEN DEL DÍA.

La presidente de la Veeduría Ciudadana California, Carmen Yasmind Rolón dio inicio a la reunión agradeciendo la asistencia y presentó los saludos de rigor. El secretario, Jonathan Hernández puso a consideración el siguiente orden del día:

1. ORACIÓN
2. PRESENTACIÓN
3. SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LA VEEDURÍA CIUDADANA CALIFORNIA
4. INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA
5. INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORÍA GAVINCO

6. INTERVENCIÓN ASESOR DE LA GOBERNACIÓN
7. INTERVENCIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA
8. PRESIDENTE JAC COROZAL
9. PRESIDENTE JAC CALIFORNIA
10. DECISIONES Y COMPROMISOS

Siendo las 9:45 AM se inició la reunión. La presidente de la Veeduría Ciudadana, Yasmin Rolon tomó la palabra y procedió a dar una explicación general, en un recuento de lo que ha sucedido desde el inicio del CONTRATO 2590 DE 2022, indicando que tendría un alcance de 4.5 kilómetros. Teniendo en cuenta que se inició un año después, en el 2023 se hizo la salvedad de que el contratista pidió reformulación de precios y por tanto quedó reducido a 2.6 Kilómetros, distribuidos de la siguiente manera: 1.954 metros para Corozal y 627 para California; que el ancho de la placa huella quedaría de 5 metros con unos sobreanchos. El Tramo 5 que se está ejecutando en este momento en California, tiene una subbase de 30 cm., 15 cm. de loza y geo textil. También se indica que son 7 alcantarillas, 4 box culvert y 50 metros cúbicos de Gaviones. Todo ello con la partida inicial.

Se mostró evidencia fotográfica, que da cuenta de los daños ocasionados a la comunidad por la demora en la construcción de la placa huella; retrasos en la obra con múltiples interrupciones, lo que en efecto ha generado incertidumbre sobre la fecha de finalización, la falta de transparencia por no contar con la comunidad ni ofrecer información clara y detallada sobre el contrato, plazos de entrega y motivos de los retrasos. La comunidad expresa que por los retrasos en la obra sin explicación lógica alguna no hay confianza en el constructor.

La comunidad exige una pronta finalización de la obra y una explicación detallada de los motivos de los retrasos. Se pide así mismo a la Interventoría que desempeñe un papel más activo en la resolución del conflicto y en defensa de los intereses de la comunidad; dejando claro que la comunidad

Joselyn Gutiérrez tomó la palabra y aseguró que no se afectará ningún tramo por reajuste de precios, pues estos solo se aplican una vez al contrato y ya se hizo; que si se da la prórroga que solicita la contratista, las pólizas de cumplimiento también se renovarán. Solicita crear un grupo de WhatsApp para estar al día en la información sobre alcances y desarrollo de la obra.

Seguido tomó la palabra el Arquitecto Melvin Hurtado quien exigió se dé respuesta del por qué.

El Ingeniero William Quintero tomó la palabra indicando que en California se avanzó en lo que se pudo en el tramo 5, explicando de manera reiterada que los diseños inicialmente no estaban contemplados, los estudios de suelos, los estudios hidráulicos; además por la demora en la ampliación de los siete metros para Corozal se afectó la obra en California agregando que se tiene en cuenta las lluvias que vendrán en adelante. Explicó que se hará todo lo socializado, indicó que se hizo un recorrido con la Comunidad y con la veeduría, tomando en cuenta los avances a aplicar con el adicional, ya que, por motivos de la obra en Arboledas, que se fue la banca es que están pidiendo una prórroga.

El Interventor, Ingeniero Jairo Andrés Quintero tomó la palabra y reconoció los problemas que ha planteado la comunidad y llamó la atención a los ingenieros por los retrasos y la falta de información clara. A pesar de que se prometieron cuadrillas para el día siguiente, el ingeniero no tiene información precisa. El contratista considera que esta información debería estar disponible y ser clara, incluyendo un número exacto de obreros por cuadrilla. Da los siguientes compromisos que se pactan con la comunidad:

A. Indica que el contrato 2590 de 2022, en sus montos se llevará a término como está estipulado en el contrato y por lo tanto no habrá recortes ni mermas en la obra de ninguna naturaleza.

- Durante la semana la interventoría recibe informe mensual de septiembre para revisión, concepto y aprobación.

- Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de septiembre ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA. Sin embargo, durante el mes la interventoría hace recorrido durante la obra, evidenciando que en los frentes no se visualiza las actividades que se relacionan al componente social, aplicando los subprogramas del documento PAGA: como la cartelera informativa, buzón de sugerencias, valla publicitaria, entre otras. Por tanto, el contratista manifiesta que esas actividades aún están en el campamento o vivienda alquilada, sin embargo, la interventoría le reitera al contratista reubicar o realizar los puntos informativos para mantener informada a toda la comunidad de lo que se está realizando y así ellos tengan la oportunidad de participar y opinar frente a sus inquietudes o sugerencias que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.

- La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

- La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

B. Para continuar la obra se intervendrá el Tramo 6 y se avanzará de manera ininterrumpida; de manera que a 31 de diciembre sea entregada la obra en su totalidad. En caso de faltar alguna parte; habrá de ser un tramo mínimo, que se ejecutaría en enero de 2025, sin altibajos ni contratiempos.

C. Para garantizar avances y rendimientos en la obra se implementarán dos cuadrillas de 10 a 15 personas cada una, a partir del día martes 8 de octubre de 2024; medida que permitirá un avance de 12 a 15 metros diarios por cada frente.

D. El día 8 de octubre habrá salida a terreno para determinar diseños y ajustes de bateas, alcantarillas, Box culvert y Gaviones; esto con el fin de coordinar con los dueños de predio para evitar contratiempos.

E. Se acordó solucionar la situación del señor Manuel Antonio Delgado quien se ha visto afectado, a raíz de que perdió el acceso a su vivienda e incluso en este momento paga parqueadero para su vehículo donde el vecino.

F. Se acordó el cierre total de la vía por la parte superior de California, lo cual indica la disponibilidad de la comunidad, para que en efecto el desarrollo de la obra fluya sin contratiempos.

G. El día 18 de octubre, una vez culminado el proceso de fraguado se pondrá a disposición de la comunidad el Tramo 1 entre la Y y los Guichos; una vez cumplidos los protocolos de ley en lo concerniente a revisión, pruebas técnicas y entrega, tanto a Interventoría como a la Junta de Acción Comunal de Corozal; previa reunión el día anterior, octubre 17, sobre la vía en la alcantarilla después de Paola.

H. Se acordó hacer reuniones en terreno, una vez por semana para evaluar cumplimiento de compromisos, acuerdos pactados y avances efectivos en obra; desde luego con elaboración y firma de actas.

I. Se creará un grupo de WhatsApp con el fin de abrir un canal de comunicación, en el cual participarán:


CONTRATISTA INTERVENTORIA
DELEGADA DE LA GOBERNACION PERSONERIA
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALIFORNIA Y COROZAL VEEDURIA CIUDADANA CALIFORNIA

J. De sobrar un remanente por el ajuste y replanteo de alcantarillas y Box culvert en el sector de California, se hará el empalme entre corozal y la vía principal a la altura de la tienda “Donde Jaime y Sonia”, en una longitud aproximada de 30 metros.

Siendo la 1:30 de la tarde se dio por terminada la reunión. En constancia firman,

CARMEN YASMIND ROLÓN A.
Presidente Veeduría Ciudadana

JONATHAN DAVID HERNÁNDEZ
secretario

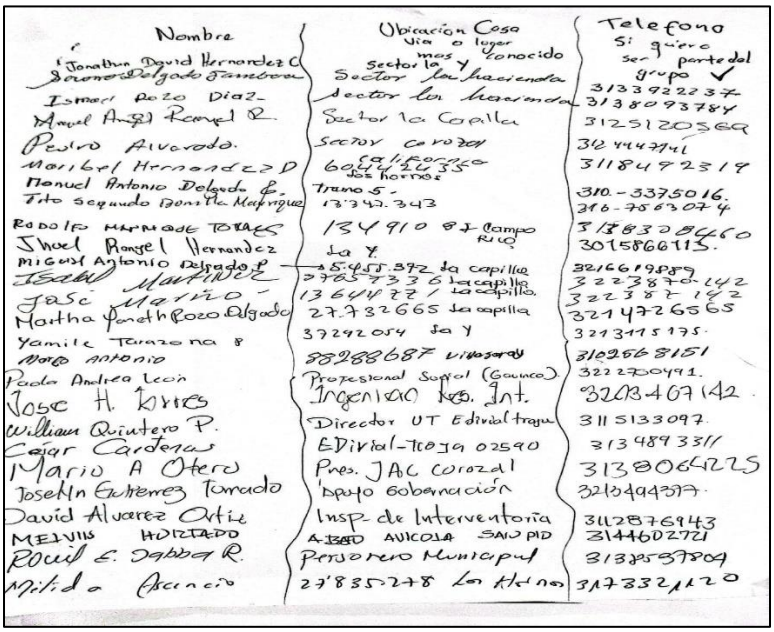

- Durante la semana la interventoría recibe informe mensual de octubre para revisión, concepto y aprobación, por tanto, se le comenta al contratista ajustar el informe, para que se vea más completo y agregue los nombres de las veredas o tramos que se están laborando.

- Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de octubre ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA. Sin embargo, durante el mes la interventoría hace recorrido durante la obra, evidenciando que en los frentes no se visualiza las actividades que se relacionan al componente social, aplicando los subprogramas del documento PAGA: como la cartelera informativa, buzón de sugerencias, valla publicitaria, entre otras. Por tanto, el contratista manifiesta que esas actividades aún están en el campamento o vivienda alquilada, sin embargo, la interventoría le reitera al contratista reubicar o realizar los puntos informativos para mantener informada a toda la comunidad de lo que se está realizando y así ellos tengan la oportunidad de participar y opinar frente a sus inquietudes o sugerencias que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.

- La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

- La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	DAYANA MELINA SALAZAR	NG AMBIENTAL	88261502	23/08/2024		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
17	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINAR	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
20	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

21	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
22	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
26	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
27	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
28	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
29	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	05/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
31	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERIA	1090515100	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
32	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	DIEGO JESUS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
4	FABIO URIBE	AYDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

7	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	07/09/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645020	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	CARLOS ANDRES BAUTISTA DELGADO	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412578	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
13	DOUGLAS URIBE	AYUDANDE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
14	RONALD SALCEDO	AYUDANDE DE OBRA	1092644428	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	JHON EDER MEDINA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1092646133	10/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
16	RUBEN ALEJANDRO BAUTISTA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	1093889719	17/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
18	EUGENIO MARTINEZ MACHADO	AYUDANDE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
19	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	11/09/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
20	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
21	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
22	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
23	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

24	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
25	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
28	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
29	JESUS ADRIAN CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	1092647112	RETIRADO	20/09/2024	SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
30	ALGEMIRO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13412968	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
31	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
32	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
34	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	JHON JAIRO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
38	JUAN CALDERON MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	1004941521	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
39	ESNEIDER RODRIGUEZ LAGUADO	AYUDANDE DE OBRA	1092644157	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
40	EDWIN RODRUIGUEZ LAGUADO	AYUDANDE DE OBRA	1092644009	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
41	JORGE RODRIGUEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644019	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
42	JESUS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
43	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
44	JOSE RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS

45	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS
46	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABON	AYUDANTE DE OBRA	1004941319	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS
47	JOSE NICASIO VILLAMIRAZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS
48	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS
49	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS
50	ERINSON FABIAN GARCIA PARADA	AYUDANTE DE OBRA	1093884815	ACTIVO		SUB GARCIA ERIKSON	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUICIPIO
1	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
2	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
3	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
4	JOSE BELEÑO GUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
5	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
6	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
7	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
8	YULIS PAOLA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS

9	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
10	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
11	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
12	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
13	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
14	ARLEY CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007381932	ACTIVO		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
15	SERNA MATURANA ALIPIO	AYUDANTE DE OBRA	11830608	18/09/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
16	MORA BELEÑO MIGUEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	1085042716	18/09/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
2	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
3	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	17/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
4	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	24/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
5	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
6	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
7	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

8	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
9	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
10	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
11	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
12	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
13	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
14	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
15	CARLOS FERNANDO LLANES	AYUDANTE DE OBRA	1092154198	03/09/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
16	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	RETIRADO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
17	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
18	BRENDA ROCIO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
19	LUIS ANDELFO VEGA SALAZAR	AYUDANTE DE OBRA	1004896992	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
20	PEDRO ALEXIS SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156588			SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
21	LUIS ALFREDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092154860	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE

2. Exámenes de ingreso

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	JORGE ALBERTO SANDOVAL	1092646544	AYUDANTE DE OBRA	02/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
2	JEFERSON DAVID ORTEGA	1092644120	AYUDANTE	02/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
3	YOAN ARTURO LOPEZ	1092084556	AYUDANTE	02/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
4	HERNAN JOSE LOPEZ	1091532303	AYUDANTE	02/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
5	JESUS ENRIQUE LOPEZ	1092645869	AYUDANTE	03/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
6	LUIS ENRIQUE PAEZ	1092644020	AYUDANTE	03/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
7	ANTONIO AUGUSTO MEDINA	16535558	AYUDANTE	03/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
8	ALEJANDRO PARADA VEGA	1092645269	AYUDANTE	02/10/2024	PROGRESAR	JOSE JAVIER VILLAMIZAR RUIZ	8967	VICTOR HUGO
9	WILLIAM FERNANDO LUNA RODRIGUEZ	1127044960	AYUDANTE	02/10/2024	ERGOMEDIC	DIANA OCHOA	2764	BRENDA CACERES

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de octubre de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.


ARBOLEDAS	PATIOS	GRAMALOTE
		

Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

ARBOLEDAS – LOS PATIOS – GRAMALOTE

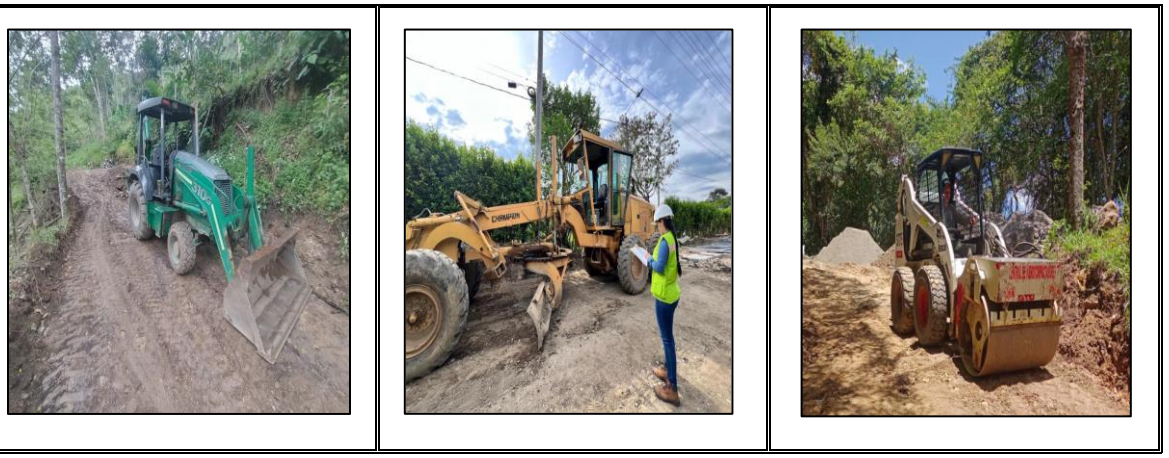

Fotografía 35 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de octubre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de octubre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	10	23
	Gramalote		14
	Patios		25

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	octubre	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo CODVID y lavado de manos.



Arboledas



Los Patios



Gramalote

Fotografía 37 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante este periodo, la interventoría aprobó los ítems no previstos luego de su verificación y, a su vez, en función de la necesidad de mitigar el impacto de las aguas de escorrentía.

Esto permitió evitar la erosión y generar estabilidad en la estructura de la placa huella. Los elementos validados fueron los siguientes:NP12. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Arboledas)

NP12. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Arboledas)

NP13. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Gramalote)

NP14. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Los Patios).

Estado de avance del proyecto.

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO

Convenciones

46		APROBADO FINAL
5		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcan - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - **APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACION** - UTET-02590-379 Estructural tramo 1 Corozal - GIC-INVIAS-NTS-1417-24 del 18-Oct-2024 - OBSERVACIONES
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACION POTRETOS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACION CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO - Diseño hidráulico vereda Cinera, municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-1326-24 – 17/09/2024 – APROBACION - UTET-02590-381 -18-10-2024 - DISEÑO HIDRAULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- UTET-02590-385 - 28/10/2024 - DISEÑO HIDRAULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1458-24 - 29/10/2024 - OBSERVACIONES

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.2.2. Etapa de Construcción

Según el seguimiento de la interventoría y el informe semanal No. 74, el contrato de obra ha alcanzado un 57,89% de avance, teniendo en cuenta la proyección que se tiene a la fecha y los plazos contractuales la interventoría durante las reuniones realizadas en el mes de octubre, ha venido solicitado al contratista incrementar más cuadrillas para agilizar las obras de drenaje, y en Los Patios, asignar más personal para trabajar en tramos simultáneos de placa huella de acuerdo a lo concertado con las comunidades.

En este periodo, las obras de placa huellan y drenaje (alcantarillas y box culverts) se ejecutaron en 9 de las 12 veredas del proyecto. En Arboledas, se trabajó en seis veredas; (Santo Domingo, Helechar, Volcán, Chicagua bajo, Cinera, Juan Bueno), en Gramalote, en dos; (San isidro y Santa Anita) y en Los Patios, Vereda corozal - california, avanzando así en parte de las áreas planificadas.

El contratista logró un avance del 9,75% en el periodo, pese a algunos retrasos causados por lluvias. A continuación, se desglosan las cantidades de placa huella completadas para evaluar el progreso alcanzado en el proyecto.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	6841	VEREDA SANTA DOMINGO	1048	4703,8	2137,2
		VEREDA RINCONADA	307		
		VEREDA HELECHAR	359		
		VEREDA VOLCAN	435,4		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	626		
		VEREDA JUAN BUENO	704		
		VEREDA CINERA	876,2		

		VEREDA PORTREROS	348,2		
GRAMALOTE	2793	VEREDA BOYACA	1138	2523,8	269,2
		VEREDA SAN ISIDRO	1017		
		VEREDA SANTA ANITA	368,8		
LOS PATIOS	4547	COROZAL - CALIFORNIA	2360,9	2360,9	2186,1
TOTAL	14181		**TOTAL**	9588,5	4592,5

Tabla 39 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

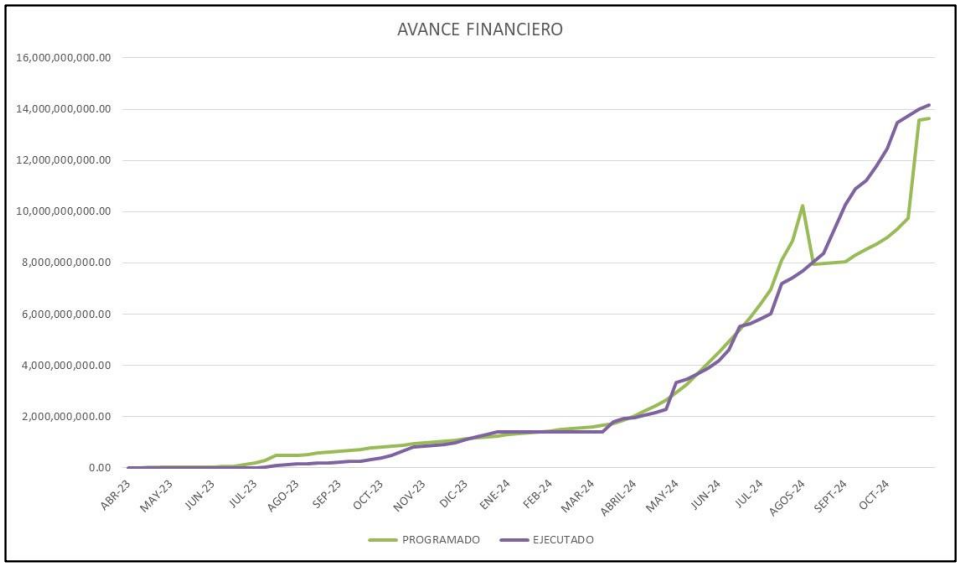


Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 31 de octubre de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $14.161.239.904,27 vs un programado equivalente en pesos a $13.628.352.523,31.

Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952-22 del 28-Ago-23 – Reiteración
Caracterización Material Granular	Observado	PHM-044-2022 del 19-Oct-23

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

La obra se ejecutó al 100% de su programación, entrando al proceso de liquidación, la interventoría y el contratista de obra se encuentran gestionando comunicación y documentación pertinente.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30-AGOSTO-2024		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						CANTIDAD	VALOR TOTAL	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	3,438.00	$	160,764,318.00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	2,902.50	$	1,955,028,217.50
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	186,218.19	$	1,492,166,356.47
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	6390.62	$	789,254,351.24
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	720.78	$	239,495,012.16
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**		**4,636,708,255.37**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	893.00	$	41,757,573.00
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	171.90	$	115,786,167.30
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	27.80	$	12,680,052.60
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	345.70	$	11,170,604.10
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	129.00	$	98,678,679.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	12,589.20	$	100,877,259.60
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**		**380,950,335.60**
TRANSPORTES								
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	0	$	-
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**		**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00	-	$	-
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**		**-**
PERFILADO Y CUNETEO								
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE.	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$	47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**		**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES								
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00	40.98		9,299,673.36
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**		**9,299,673.36**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=			**5,074,684,022.47**

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

Para el mes de octubre no aplica informe mensual puesto que las actividades constructivas terminaron en agosto.

La profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, envía documentación para la liquidación del contrato el 24 de septiembre, el documento está en revisión y a la espera de unos anexos que debe conseguir el contratista por parte de la autoridad Ambiental.

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra, se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista no está ejecutando ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se han ejecutado hasta la fecha. Este resumen ofrece una visión clara del progreso del proyecto y ha sido actualizado según las medidas realizadas en campo:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411
TRAMO 3A	518,3	0	518,3

TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

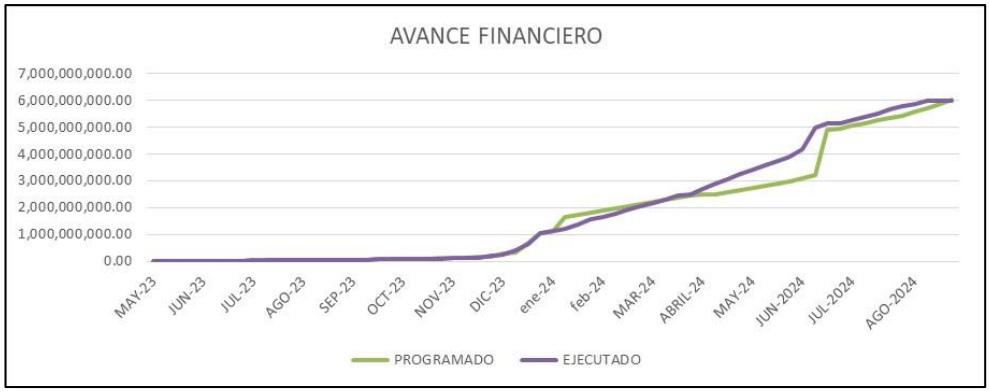


Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 44 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1322-24 del 17-Sept-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 45 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 22-AGOSTO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,776.65	$ 191,247,512.70
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,179.38	$ 768,994,679.54
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	102,295.80	$ 768,548,345.40
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,668.08	$ 392,295,806.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	392.06	$ 133,549,750.16
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	14,196.82	$ 194,879,748.14
SUB TOTAL					$ 2,275,884,754.00	$	2,449,515,842.58
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$ 9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$ 62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$ 15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$ 29,953,654.83
SUB TOTAL					$ 172,645,113.00	$	161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLA	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					$ 21,920,020.00	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00	8.00	$ 2,796,016.00
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
SUB TOTAL							
TOTAL						$	2,681,351,026.37

Tabla 46 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Las actividades Finalizadas el día 24 de agosto del presente año, se recibe información final el 15 de septiembre del componente ambiental.

La interventoría requiere al contratista una serie de anexos y formatos que se describen según oficio radicado GIC-INVIAS-NTS-1328-24, aún se espera Información del mismo.

Para el mes que termina se mantiene contacto con el Ing. Ambiental Fabián Gallardo residente de la obra y manifiesta que se encuentra en vacaciones, por lo que aún se espera la información requerida.

3.10.1.4. Actividades Sociales

Fecha terminación actual de la obra fue el 24/08/2024.
El contratista de obra durante el mes realizo él envió del último trimestral y balance de estado social de los meses mayo, julio y agosto, mencionando que en el mes de junio la obra estaba suspendida. Por tanto, la interventoría, se encuentra en revisión y concepto para dar aprobación y proceder.

Durante el mes la interventoría recibe Acta de entrega y recibo de satisfacción que se dio a conocer a la comunidad la entrega formal de la obra que fue terminada, donde se manifiesta que se da fe del trabajo realizado y se recibe a satisfacción la ejecución de dicho contrato en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

3.10.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** -
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 47 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de la placa huella.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

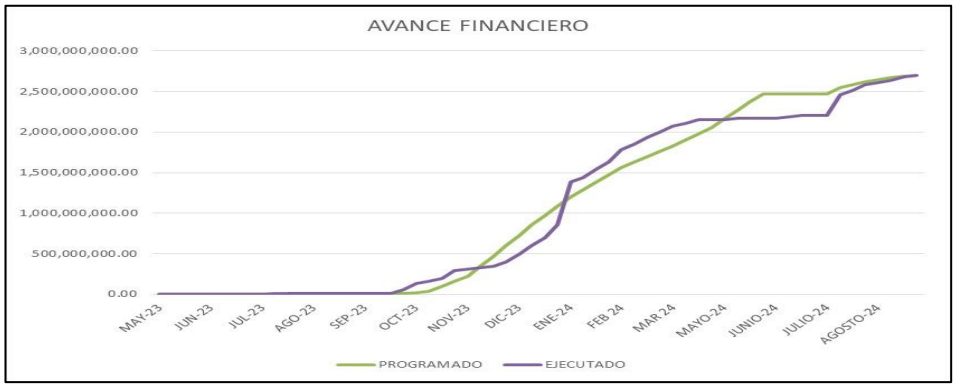


Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 24 de agosto de 2024, el contrato de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COEMRCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 48 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER,	CD-FC-060-2023	22/01/2024

CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022		
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023

		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con observaciones	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISION A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**

Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr–2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**

Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar–2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISION AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se envió mediante correo electrónico el 15-Agost-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISION INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N°020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N°021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N°028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-736-24 del 14-May-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISION AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-870-24 del 11-Jul-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N°026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 - REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1361-24 del 02-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA – NO SE CUENTA CON EL RUBRO**
Hojas de vida	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-1418-24 del 21-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **- APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Observado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Abr-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1405 del 15-Oct-2024 - APROBADO
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISION INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Ago-2024 **- SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observación	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 13-Agost-2024 – **SOLICITUD** El contratista mediante SSVN-028-2024 – del 05-Sept-2024 Entrega documento PAGA y anexos GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09-Sept-2024 - **OBSERVACIONES**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1419-24 del 21-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Enviado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACION RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACION DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACION**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1468-24 del 29-Oct-2024 - **APROBACION**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACION**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015- CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1391-24 del 26-Ago-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1465-24 del 29-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024 Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06- CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACION**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 – **APROBACION** Reprogramación No. 1 por prórroga y Modificación de cantidades No.01 - WRGR-CD-FC-058-2023-013

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1321-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1377-24 del 08-Oct-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 del 30-Sep-2024 - REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	Mediante oficio SCCY-071-009 del 22-Oct-2024 se envía documento para su revisión
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.1.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad		
Protocolo De Bioseguridad		
Hojas de vida		
Programa De Obra		
Flujo De Caja		
Programa De Generación De Empleo		
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio		
Análisis de Precios Unitarios		
Instalaciones Provisionales		
Plan De Manejo De Transito - PMT		
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo		
Fuente De Materiales		
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio		
Diseño de Mezcla		

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de mayo de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 02/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros lineales de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de julio, ejecutándose 270 metros lineales de placa huella y 12350.14 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron el 30 de septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 280 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron en septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 295 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 390 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 360 metros lineales de placa huella, 15460.91 m^2 de mantenimiento periódico y 04 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.17 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se firmo acta de inicio el 18 de octubre de 2024, a lo cual se a realizado las siguientes actividades:

- El día 02/10/2024 el contratista envía registro fotográfico de los ensayos in situ, en el corredor vial.
- El día 24/10/2024 se realiza reunión en la gobernación, para tratar temas varios a la ejecución del contrato de obra.
- El día 30/10/2024 se realiza socialización en el municipio de Villa Caro, con la presencia del Ing. Wilmar Rangel – Gestor del Proyecto

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1189-24) ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1122-24; RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-
VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1183-24) donde se subsana RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-039300 – ENTREGAN REQUERIMIENTOS.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

se entrega oficio GIC-INVIAS-NTS-1196-24 El día 26 agosto del presente año ASUNTO: ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-737-24; RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-047971.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de abril 2024.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

2024S-VBOG-047967, al finalizar este mes de julio no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de octubre. No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

da respuesta al oficio OBR-CACH-033 por parte del contratista consorcio MATICCES P&B LTDA en el componente ambiental, mediante oficio, al cual se le da respuesta por parte de la Interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1453-24. Manejo de residuos de excavación.

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de octubre no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de octubre se recibe documentación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) según oficio SCCVN-028-2024, el cual está en revisión y a la espera de unos documentos anexos.

Se envía oficio haciendo requerimientos mediante oficio del 13 agosto GIC-INVIAS-NTS 1150-24, ASUNTO: SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.

.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de octubre No aplica información, el proyecto finalizo el 30 de septiembre 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

Se radica oficio el día 27 de agosto asunto: solicitud del documento PAGA según radicado GIC-INVIAS-NTS-1205-24

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de agosto No aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

Se radica oficio el día 27 de agosto asunto: solicitud del documento PAGA según radicado GIC-INVIAS-NTS-1204-24.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se recibe oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 entrega de subsanación de documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) el cual están revisión y a la espera de unos anexos. Se envía del 17 octubre oficio solicitando Informe mensual GIC-INVIAS-NTS-1412-24.

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El 22 de octubre se recibe oficio SCCY-071-009 de entrega PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) Versión 2, el cual está en revisión y a la espera de documentos anexos. De se envía del 17 octubre oficio solicitando Informe mensual GIC-INVIAS-NTS-1413-24

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Subprograma 1.1: Conformación del grupo de gestión ambiental y Social código sm-daga- 1.1-01

OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, PAGA, a través de la gestión de los profesionales responsables de la actualización e implementación del documento.

Identificación de aplicabilidad de la ficha por la Complejidad del proyecto
Baja media-alta media-baja x alta
Actividades para el seguimiento y monitoreo

La formulación del documento PAGA es la esencia de la gestión socioambiental del proyecto, por lo cual los profesionales deben realizar la gestión necesaria (formulación, ajuste, aprobación y radicación del documento) para obtener la aprobación del documento por parte de la interventoría, previo al inicio de las actividades constructivas.

Se requiere contar con el equipo mínimo de profesionales que puedan realizar la supervisión e implementación de las medidas de manejo durante el desarrollo del proyecto, atendiendo las obligaciones y/o recomendaciones que sean suscitas por las autoridades ambientales y propiciar ante la dirección del proyecto, el suministro de elementos necesarios para el desarrollo de cada uno de los subprogramas. Evidenciar mediante la formulación de informes de gestión, la implementación de cada una de las medidas de manejo del documento PAGA y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante las autoridades ambientales de forma general o específicamente en cada uno de los actos administrativos que se hayan generado para la autorización del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Periodicidad en la implementación
Actividad momento

Seguimiento a la formulación del documento PAGA, aprobación de la interventoría y radicación del documento ante la entidad contratante.

Antes de inicio de las actividades constructivas.
Validación de los insumos y elementos necesarios para implementar las medidas de manejo
Durante el desarrollo
Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.

Identificación de aplicabilidad de la ficha por la
Complejidad del proyecto
Baja media-alta
Media-baja x alta
Actividades para el seguimiento y monitoreo

El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto. Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:

• Talleres de inducción al personal programados.
• Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
• Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En espera que el contratista de obra haga envió de la documentación pertinente.

3.7.1.2. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-742-24 - APROBACION PARCIAL PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) – CACOTA

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-1122-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría realiza oficio GIC-INVIAS-NTS-842-24 de la ENTREGA INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE AMBIENTAL, ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO CACOTA – FARO CATATUMBO.

Durante la semana la interventoría revisa y aprueba el informe trimestral y balance de estado social del proyecto ya subsanado con oficio GIC-INVIAS-NTS-1355-24 para la supervisión de Invias y proceder al cierre de la obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-653-24.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-732-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, para enviar las correcciones a Invias y subsanar lo que está pendiente por medio de oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-1309-24.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-24.

ENTREGA DOCUMENTO PAGA con oficio GIC-INVIAS-NTS-748-24 (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE PAMPLONA – CONVENIO 2033

RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047962 con oficio GIC-INVIAS-NTS-1094-24- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL COMPONENTE SOCIAL

RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-048851 se da aprobación con oficio GIC-INVIAS-NTS-1353-24 a la - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL No. 1, MUNICIPIO DE PAMPLONA, COMPONENTE SOCIAL.

La interventoría durante el mes recibe el certificado que ratifica la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.” Por tanto, se subsana la observación por parte de la interventoría.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-736-24 – se da APROBACION PARCIAL PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) – SALAZAR DE LAS PALMAS

La interventoría por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-737-24 radica la ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS – CONVENIO 2033

Por medio de radicado GIC-INVIAS-NTS-1346-24 se ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.

En RESPUESTA al COMUNICADO No. 2024E-VUVRAZ-042973 la interventoría hace oficio de GIC-INVIAS-NTS-1340-24 - ENTREGA DE TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.

La interventoría recibe informe trimestral y balance de estado social del proyecto para revisión y concepto. Dando aprobación, se envía toda la documentación pertinente para Invias y se está a la espera de posibles correcciones para subsanar.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2024.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

La interventoría emite la APROBACIÓN PARCIAL mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-755-24 del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

El contratista realiza la ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO DE SILOS con numero de oficio GIC-INVIAS-NTS-1265-24

La interventoría recibe, revisa y realiza sugerencias de correcciones o ajustes en la documentación del informe trimestral y balance de estado social del proyecto. Por tanto, el contratista acata las recomendaciones y subsana lo indicado para enviar la información documental al invias. La interventoría está a la espera de posibles correcciones por parte de invias, para ajustar y subsanar la documentación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1271-24 la interventoría emite la APROBACIÓN PARCIAL del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

La interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-841-24 - ENTREGA INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE AMBIENTAL, ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL. La interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1318-24 ENTREGA INFORME SUBSANADO DEL TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DE VILLA DEL ROSARIO

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-741-24 - ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-1121-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral con oficio GIC-INVIAS-NTS-1315-24, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL: 28 DE FEBRERO DE 2024

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

La interventoría da APROBACIÓN a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-733-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046554 con oficio GIC-INVIAS-NTS-1065-24 se hace la - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE LOURDES, COMPONENTE SOCIAL

La interventoría solicito algunos informes mensuales y anexos que hacen parte del trimestral que fue enviado, por tanto, se encuentra a la espera de la información para revisión, concepto y aprobación.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

- **EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL**

  1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
  2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
  3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
  4. Actas de vecindad (Formato Invias).
  5. Plan de Inversión social.
  6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

La interventoría se encuentra en revisión y concepto para dar aprobación a la documentación que llego de manera extemporánea.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales**.**

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).

Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contratista da cumplimiento con el envió del trimestral de abril hasta agosto para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría. El contratista da cumplimiento con él envió del trimestral de abril hasta agosto para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría.

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría dio aprobación:

El día 29 de octubre de 2024 la interventoría dio APROBACIÓN DOCUMENTO Y FORMATOS PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL con oficio GIC-INVIAS-NTS-1465-24.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-014 se recibe Informe junio, julio y agosto de 2024 fuera de la fecha estipulada por parte del contratista, por tanto, la interventoría revisa y aprueba con oficio GIC-INVIAS-NTS-1348-24 los documentos enviados. Asimismo, la interventoría se encontró a la espera del informe mensual de septiembre que no fue enviada a la fecha solicitada.

Durante el mes el contratista no envió el informe mensual de octubre para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría.

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1.Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

Durante el mes la interventoría recibe el documento PAGA para revisión y concepto por parte de la interventoría.

En respuesta a oficio SCCY-071-003 el contratista entrega el informe mensual de agosto con aprobación de la interventoría con oficio GIC-INVIAS-NTS-1349-24.

Durante el mes el contratista no envió el informe mensual de octubre para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En espera que el contratista de obra haga entrega de la documentación pertinente.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista sigue gestionando documentación del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente

3.7.1.3.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En espera que el contratista de obra haga entrega de la documentación pertinente.

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACION**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACION de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RECORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 – **APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RECORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente del diseño geométrico y diseño estructural que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista Especialista envía observaciones el 29-08-2024 se envían por WP al contratista.

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION al componente geotécnico, topografía y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-031 el 06-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1312-24 del 16/09/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-032 el 06-Sept-2024 Ing. JAIRO solicita reunión 30/09/2023 - Tramo 1: K0+000 – K0+136.06 – **OBSERVACIONES**. Tramo 2: K3+695.92 – K3+825.92 – **OBSERVACIONES**. Tramo 3: K5+269.35 – K5+399.35 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**. Entrega planos de OBR-CACH-045 - 3/10/2024 OBR-CACH-048 ATIENDE OBSERVACIONES - 08/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1424-24 - 22/10/2024 **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** OBRA-CACH-035 del 10/09/2024 - Hace entrega de observaciones GIC-INVIAS-NTS-1319-24 - 17/09/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **–** **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-043 el 18-09-2024

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES topografía y el informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES El contratista hace entrega de subsanaciones con comunicado MATICCES – LOURDES – 028 - 2024 del 18/09/2024 Atiene observaciones MATICCES – LOURDES – 031 - 2024 - 09/10/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1415-24 - 17/10/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES el componente estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía e hidrología.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1223-24 - 29/08/204 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1259-24 del 04/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016- CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 **APROBACION** – 17-Sep-2024

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1173-24ª del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.13. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 **- APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1167-24 del 22-Agost-2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

3.7.1.1.14. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1142-24 - 14/08/2024 - **OBSERVACIONES** Correo 27/08/2024 - REMITE CORRECCIÓN A OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1302-24- 10/09/2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACION CONTRATISTA HACE ENVIO CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACION**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACION CONTRATISTA ENVIA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1222-24 del 28/08/2024 - **APROBACION**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1190-24 del 26/08/2024 **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** WRGR-CD-FC-058-2023-015 DEL 23/09/2024 - SUBSANACION INFORME

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION solo los componentes de geotecnia y pavimento. El resto de componentes se encuentran en observación.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-002 contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1363-24 del 03/10/2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.16. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta realizando los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Entregado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Entregado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)		
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO PARA TRAFICO LIVIANO**
INFORME HIDRÁULICO		

Tabla 82 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023

3.7.1.2. Etapa de Construcción

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

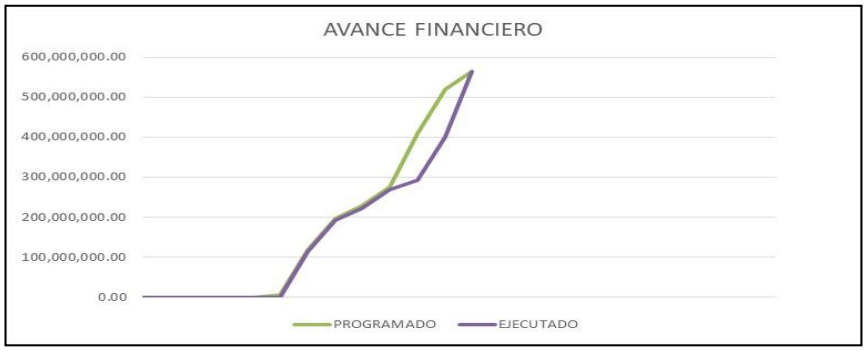


Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	320.00	EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$ 26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$ 207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$ 121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$ 91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$ 44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$ 492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$ 4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$ 13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$ 1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$ 1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$ 11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$ 11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$ 44,096,105.34
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$ 30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00	30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$ 34,656,912.54
						SUB TOTAL		34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS								
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$ 26,109,118.80
						SUB TOTAL		26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		627,778,223.78

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	CANT	VALOR TOTAL
						EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

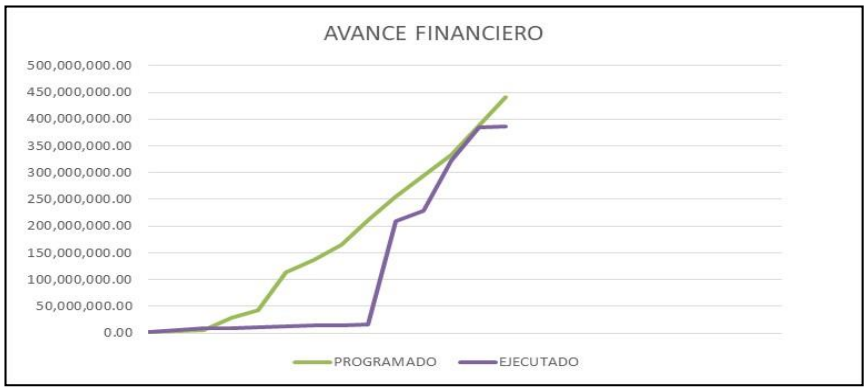


Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600.1.1P		600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIAL REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

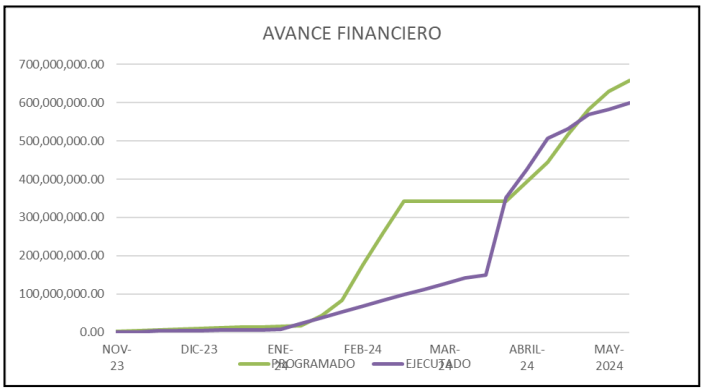


Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

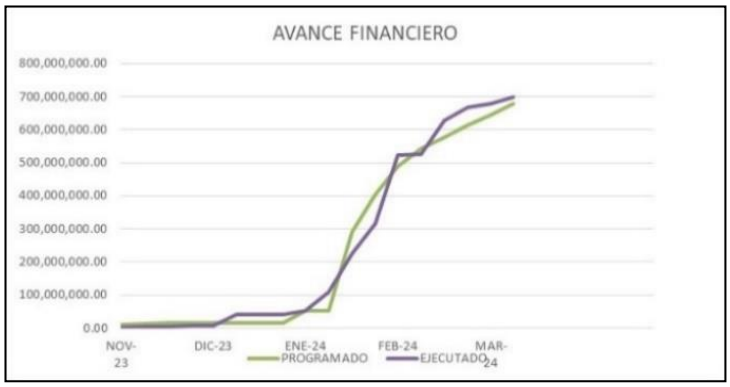


Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**155.00**	**EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70	862.70	$ 29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65	90.65	$ 77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13	4,405.13	$ 44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00	620.00	$ 110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57	40.57	$ 17,893,560.78
						SUB TOTAL	$ 6,019.05	$ 281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**1**		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28	45.28	$ 2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78	5.78	$ 4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	1.61	$ 992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 22.15	22.15	$ 891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00	6.00	$ 5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70	782.69	$ 7,979,524.55
						SUB TOTAL	$ 863.51	$ 22,852,783.32
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81	5,650.81	$ 15,002,900.55
						SUB TOTAL	5,650.81	15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	unid	5.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50	11,381.50	$ 22,011,821.00
						SUB TOTAL	11,382.00	22,011,821.00
NO PREVISTO								
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50	237.50	$ 37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00	190.00	$ 31,462,670.00
								69,299,507.50
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00	410,535,693.00

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

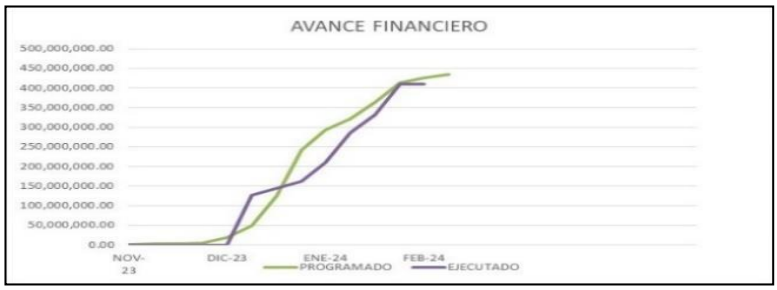


Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								30 DE JUNIO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		570,594,671.72

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

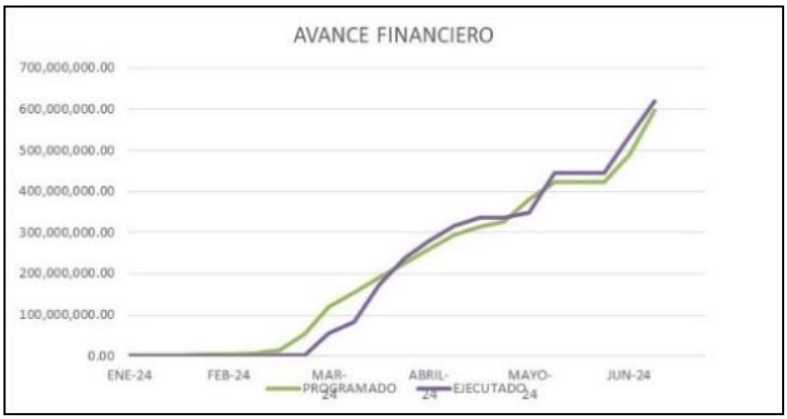


Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.					
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	316.07	$ 38,121.00	$ 11,688,661.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	234.96	$ 1,138,016.00	$ 250,727,685.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11032.81	$ 10,242.00	$ 123,211,158.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	299.39	$ 428,491.00	$ 130,316,968.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	119.10	$ 677,827.00	$ 71,117,609.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:				
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	103.54	$ 49,585.00	$ 2,567,015.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	15.70	$ 1,138,016.00	$ 8,899,285.00
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.60	$ 890,664.00	$ 712,531.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	23.76	$ 64,380.00	$ 764,834.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	12.00	$ 1,090,746.00	$ 6,544,476.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1157.36	$ 10,242.00	$ 5,590,698.00
	TRANSPORTES				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	5454.95000	$ 3,397.00	$ 18,530,465.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	7.00	$ 719,407.00	$ 5,035,849.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17393.5200	$ 2,181.00	$ 37,936,314.00
	VALOR BÁSICO OBRA				**$ 673,643,548.00**

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

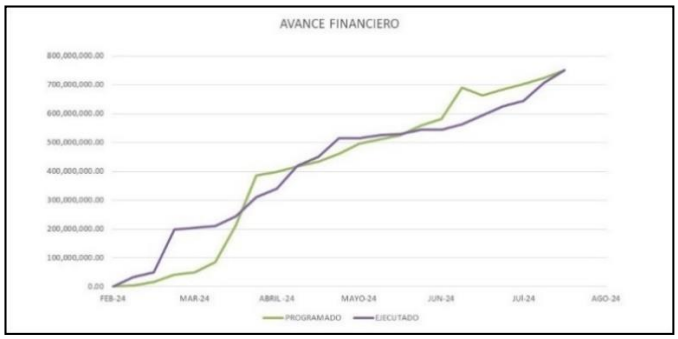


Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34,691.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985,280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10,234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	343.30	$ 288,254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551,760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49,585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985,450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748,239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40,248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1,016,330.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10,234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS	M3/KM	4209.50	$ 2,655.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-09 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	UND	7.00	$ 705,224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13803.10	$ 1,934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

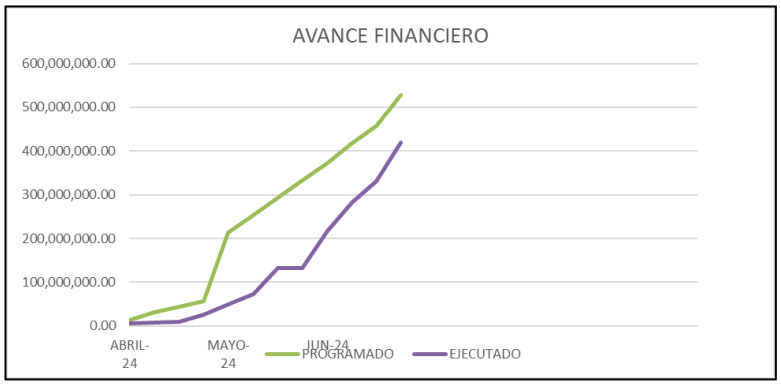


Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$ 1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$ 190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$ 103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$ 50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$ 22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	$ 369,086,459.00		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	15.60	890,706.00	$ 13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$ 1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$ 1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$ 11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$ 11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	$ 44,602,051.00		$ -
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,215.29	2,655.00	$ 3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL	3,226,605.00		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$ 8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL	8,462,688.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$ 23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL	23,885,167.00		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	449,262,970.00		$ 341,074,887.81

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

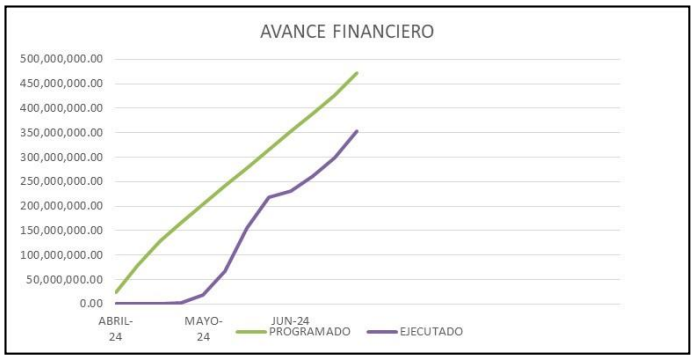


Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.45	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.68	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.5	$ 5,792,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,960.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.8	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,060.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

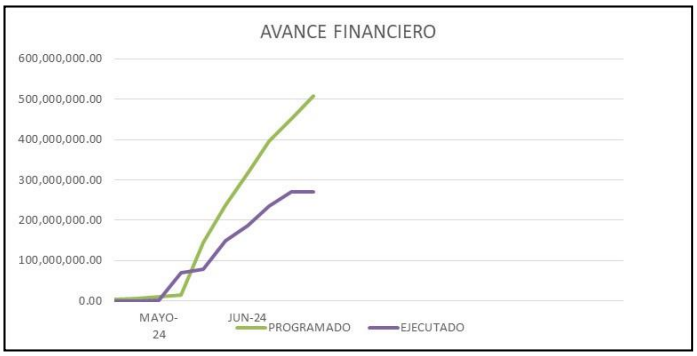


Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-SEP-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-SEP-2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	58	$	2,007,206.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	243	$	241,623,162.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	11529	$	117,468,981.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	278	$	86,360,978.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	55.5	$	31,094,930.00
				SUB TOTAL	**$ 478,555,256.50**		$	478,555,257.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	88	$	4,521,704.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	15.6	$	15,511,610.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SI	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	1.6	$	1,248,674.00
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVAC	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	44	$	1,735,888.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm D	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	12	$	13,617,528.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	1158	$	11,798,862.00
				SUB TOTAL	**$ 48,434,266.00**		$	48,434,266.00
	TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	1375.20323	$	4,069,226.00
				SUB TOTAL	**4,069,226.36**		$	4,069,226.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00	16	$	11,333,040.00
				SUB TOTAL	**11,333,040.00**		$	11,333,040.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	16201.11	$	30,441,885.69
				SUB TOTAL	**30,441,880.00**		$	30,441,885.69
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	**572,833,669.00**		$	572,833,674.69

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

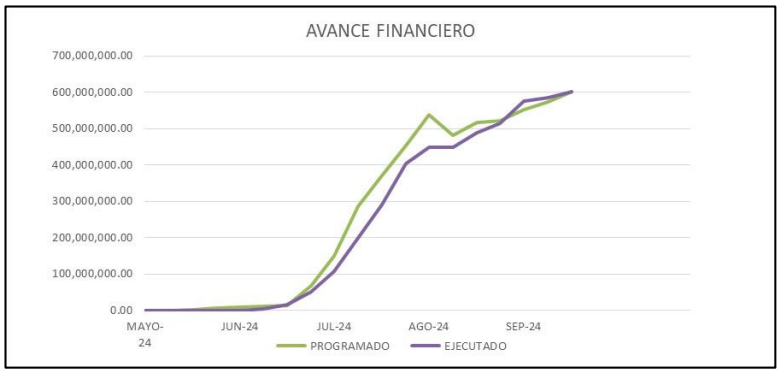


Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO A AGOSTO-2024	
No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN								
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.00	35,953.00	$	1,761,697.00	48.12	1,730,058.36
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	208.00	1,025,581.00	$	213,320,848.00	99.00	101,532,519.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,855.00	10,194.00	$	100,461,870.00	8654.38	88,222,749.72
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	237.00	327,669.00	$	77,657,553.00	321.12	105,219,430.94
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	47.50	571,437.00	$	27,143,258.00	44.45	25,400,374.65
				SUB TOTAL	$	420,345,226.00	$	322,105,132.67
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$	4,363,480.00	86.20	4,274,227.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	12.00	1,025,581.00	$	12,306,972.00	11.51	11,804,437.31
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.60	788,692.00	$	1,261,907.00	1.54	1,214,585.68
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	44.00	41,886.00	$	1,842,984.00	43.00	1,801,098.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12.00	1,023,650.00	$	12,283,800.00	12.00	12,283,800.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,194.00	$	11,804,652.00	1105.54	11,269,874.76
				SUB TOTAL	$	43,863,795.00	$	42,648,022.75
TRANSPORTES								
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,118.14	3,271.00	$	3,657,436.00	876.83	2,868,110.93
				SUB TOTAL		3,657,436.00	$	2,868,110.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	11.00	705,522.00	$	7,760,742.00	0.00	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$	-
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13,441.68	1,986.00	$	26,695,176.48	13441.69	26,695,196.34
				SUB TOTAL		502,322,375.48	$	26,695,196.34
TOTAL EJECUTADO							$	394,316,462.69

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

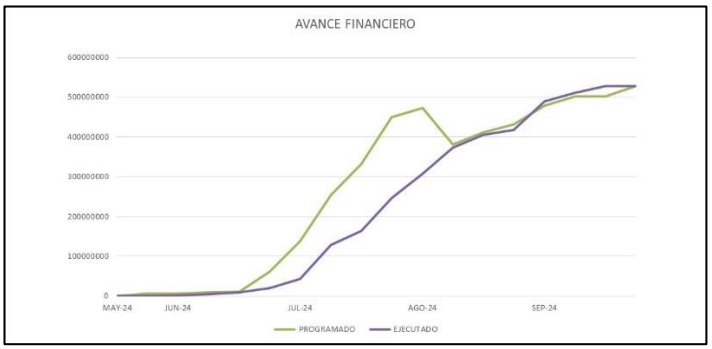


Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.								
	ITEMS DE PAGO	INFORMACIÓN INICIAL				AVANCE 25/10/2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	ACUMULADO	Valor total
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.00	$ 39,920.00	$ 2,914,160.00	744.48	$ 29,719,641.60
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	306.00	$ 920,653.00	$ 281,719,818.00	299.25	$ 275,505,410.25
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14499.00	$ 10,181.00	$ 147,614,319.00	14458.91	$ 147,206,162.71
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	349.00	$ 250,131.00	$ 87,295,719.00	408.96	$ 102,293,573.76
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	69.80	$ 511,663.00	$ 35,714,077.00	35.01	$ 17,913,321.63
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	131.84	$ 6,774,334.72
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 920,653.00	$ 28,724,374.00	23.52	$ 21,653,758.56
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.20	$ 700,995.00	$ 2,243,184.00	2.40	$ 1,682,388.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	65.92	$ 2,779,516.80
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,007,990.00	$ 24,191,760.00	18.00	$ 18,143,820.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,181.00	$ 23,579,196.00	1743.33	$ 17,748,842.73
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1167.07770	$ 3,397.00	$ 3,964,562.95	4641.72000	$ 15,767,922.84
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	12.00	$ 712,462.00	$ 8,549,544.00	12.00	$ 8,549,544.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16964.0500	$ 2,173.00	$ 36,862,880.65	16964.0500	$ 36,862,880.65
	TOTAL OBRA				$ 696,127,523.00	$	702,601,118

Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

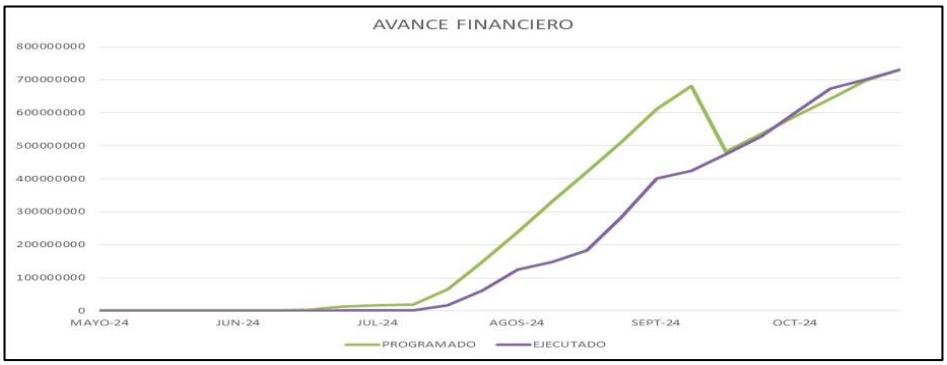


Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.. GOBERNACIÓN 2033					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39,920.00	400	$ 15,968,000.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	145.12	$ 142,758,172.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10,197.00	9700	$ 98,910,900.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 304,574.00	270	$ 82,234,980.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 567,016.00	72	$ 40,825,152.00
SUB TOTAL					**$ 380,697,204.00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51,383.00	162.000	$ 8,324,046.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	31.000	$ 30,495,475.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 766,866.00	3.400	$ 2,607,344.00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42,165.00	84.000	$ 3,541,860.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 1,034,686.00	24.000	$ 24,832,464.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10,197.00	2308.000	$ 23,534,676.00
SUB TOTAL					**$ 93,335,865.00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3,397.00		$ -
SUB TOTAL					**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 714,568.00		$ -
SUB TOTAL					**$ -**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2,181.00	15460.91	$ 33,720,236.00
SUB TOTAL					**$ 33,720,236.00**
TOTAL EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**507,753,305.00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**507,753,305.00**
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**5,076,552.00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**964,545.00**
AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**VALOR TOTAL= C+D+E 513,794,402.00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**14,386,243.26**
TOTAL EJECUTADO					**528,180,645.26**

Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

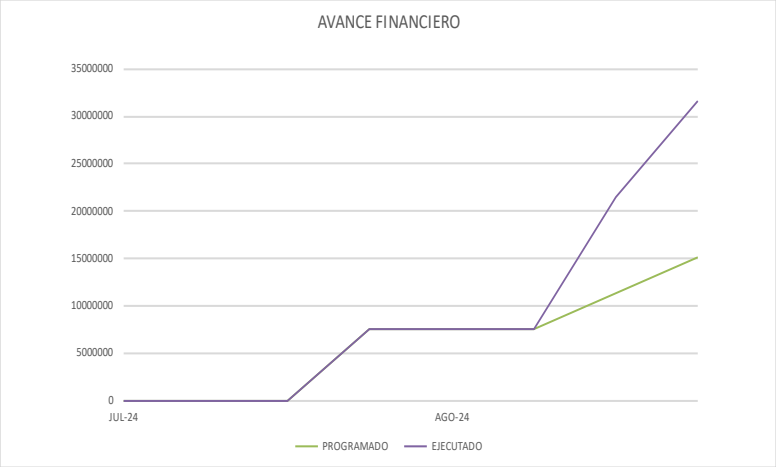


Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

7. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

8. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 11 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, el convenio de Gobernación 1943 se encuentra en etapa de ejecución de actividades de obra y el municipio de Abrego se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de construcción de placa huella y alcantarillas.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se fimo el acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmo acta de liquidación el 15 de octubre de 2024.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Gobernación 2052, su ejecución termino el 30 de agosto de 2024, por lo cual el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Cáchira 1859, finalizo su tiempo contractual el 30 de julio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Herrán, Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos del municipio de Abrego, Gobernación-1943, Gobernación 2033 (Santiago, Gramalote y Villa Caro).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	

Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El contrato entra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.
Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024. Se firmo acta de liquidación el día 06 de septiembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	

Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato está suspendido desde el 30 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 (INDEFINIDO).

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

4.4.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
77	20/09/2024 al 26/09/2024
78	27/09/2024 al 03/10/2024
79	04/10/2024 al 10/10/2024
80	11/10/2024 al 17/10/2024
81	18/10/2024 al 24/10/2024

Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347		$ 865,403,347	$ 690,291,848.64		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262,829,510		$ 262,829,510	$ 172,572,962	$ 90,256,548	$ 517,718,886.64		$ 2,396,467,941	$ 2,396,467,941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530,799,834		$ 530,799,834	$ 172,572,962	$ 358,226,872	$ 345,145,924.32		$ 1,865,668,107	$ 1,865,668,107				
TOTALES			$2,628,344,516.41	$0.00	$ 6,596,491,237					$ 2,659,297,450.6	$ 2,659,297,450.6				

Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de octubre de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
04	17/04/2024

Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. El contrato de obra finalizo el 26 de agosto de 2024 y esta en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 107 Garantías Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. El contrato de obra finalizo el 30 de mayo de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 108 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. Se encuentran activos todos los frentes de obra.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
69	20/09/2024 al 26/09/2024
70	27/09/2024 al 03/10/2024
71	04/10/2024 al 10/10/2024
72	11/10/2024 al 17/10/2024
73	18/10/2024 al 24/10/2024

Tabla 109 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 110 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
13	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
17	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS, GRAMALOTE
18	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
26	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
27	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
28	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
30	JESUS SIERRA CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
31	PABO VALDERRAMA BARERA	AYUDANTE DE OBRA	PT 5887690	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
32	RONALDO GELVES SALCEDO	AYDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
33	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
34	ALVARO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13413038	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
35	JHON CARLOS BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	10926444525	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
36	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412587	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
38	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
40	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
41	ALCIDES MOGOLLON CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	6663632	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
42	REYNEL BAUTISTA ACEVEDO	AYUDANDE DE OBRA	1007929750	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
43	URIEL LASSO GALVAN	AYUDANDE DE OBRA	1092647060	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
44	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
45	JOSE ANDELFO GARCEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644904	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
46	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
47	EDGAR ELIECER CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	1004941363	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
48	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
49	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
50	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
51	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
52	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
53	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
54	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
55	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
56	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
57	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
58	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
59	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
60	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
61	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
62	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
63	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
64	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
65	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
66	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
67	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
68	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
69	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
70	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
71	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
72	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
73	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
75	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
76	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
77	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	BRAYAN OROZTEGUI	OPERADOR	1116810907		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
83	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
84	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
85	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
86	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
88	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
89	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
90	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
91	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
92	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
93	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
94	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
95	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
96	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
97	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
98	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACRES	GRAMALOTE
99	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
100	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
101	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
102	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
103	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
104	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

Tabla 111 Reporte afiliaciones a seguridad social
Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			$7,193,600,734.00	$30,400,000.00	$ 7,224,000,734					$ -	$ 9,674,026,592.00				

Tabla 112 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 113 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
62	01/10/2024
63	03/10/2024
64	04/10/2024
65	08/10/2024
66	17/10/2024
67	23/10/2024
68	24/10/2024
69	31/10/2024

Tabla 114 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 115 Garantías Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. El contrato finalizo el 24 de agosto de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026

Tabla 116 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

4.10.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
13	09/02/2024 al 15/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
12	26/01/2024 al 01/02/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONA	
15	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
17	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
21	03/05/2024 al 09/05/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
12	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
23	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
20	31/05/2024 al 06/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
18	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
19	13/09/2024 al 19/09/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	

No. De Informe Semanal	Periodo
14	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
15	20/09/2024 al 26/09/2024
16	27/09/2024 al 03/10/2024
17	04/10/2024 al 10/10/2024
18	11/10/2024 al 17/10/2024
19	18/10/2024 al 24/10/2024
CD-FC-071-2023 - MUNICIPIO DE GRAMALOTE	
7	20/09/2024 al 26/09/2024
8	27/09/2024 al 03/10/2024
9	04/10/2024 al 10/10/2024
10	11/10/2024 al 17/10/2024
11	18/10/2024 al 24/10/2024

Tabla 117 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 118 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024

Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024

Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 119 Garantías Gobernación 2033

4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
5	20/02/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
8	22/01/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
1	20/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
8	08/08/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	

Comité de Obra No.	Fecha
9	05/03/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
6	24/05/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
2	21/06/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
1	14/05/2024
2	17/05/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
1	28/05/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
1	03/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
1	24/06/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
4	21/08/2027

Tabla 120 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 121 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado

de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1438-24	25-oct-24	REITERACIÓN COMUNICADO NO. GIC-INVIAS-NTS-1232-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.,

Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1396-24	10-oct-24	RESPUESTA CORREO "CORRECCIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS (TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO)" – APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1402-24	15-oct-24	APROBACION DE SUBSANACIONES IMFORME FINAL PARA PROCESO DE LIQUIDACION
GIC-INVIAS-NTS-1414-24	17-oct-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERRAN 1861 DE 2021

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1435-24	25-oct-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1376-24	8-oct-24	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
GIC-INVIAS-NTS-1401-24	15-oct-24	PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SUSPENSIÓN APROBADA POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE LOS OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1221-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1100-24.
GIC-INVIAS-NTS-1445-24	25-oct-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1376-24 CON ASUNTO “SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS.”

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado

de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1366-24	3-oct-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-073-2024 - APROBACIÓN INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE DEL COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1388-24	10-oct-24	APROBACIÓN INFORME SST – MES SEPTIEMBRE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1400-24	11-oct-24	APROBACION ACTA PARCIAL No. 6 ABREGO CTO 252 DE 2022
GIC-INVIAS-NTS-1410-24	17-oct-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1423-24	22-oct-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-ABO-077-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA - APROBADO
GIC-INVIAS-NTS-1436-24	25-oct-24	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-1448-24	28-oct-24	RESPUESTA OFICIO CADV-GIC-058-2024 - INFORME MENSUAL DE JULIO DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - APROBACIÓN

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con

observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1362-24	2-oct-24	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-068-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RÉCORDS" - OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1439-24	25-oct-24	SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN.
GIC-INVIAS-NTS-1460-24	29-oct-24	ENTREGA COMUNICADO PARA BANCOLOMBIA

Tabla 127 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1433-24	24-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO "ENTREGA PARCIAL DOCUMENTACION PLACA HUELLA PAMPLONITA, COMPONENTE SOCIAL - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1440-24	25-oct-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.

Tabla 128 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1360-24	1-oct-24	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CONTRATO DE REFERENCIA.

GIC-INVIAS-NTS-1364-24	3-oct-24	UTET-02590-369 y UTET-02590-372 - TRASLADO SOLICITUD COMUNIDAD VEREDA SAN ISIDRO
GIC-INVIAS-NTS-1365-24	3-oct-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN UTET-02590-373 – APROBACION REPROGRAMACIÓN DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1375-24	7-oct-24	SOLICITUD ADECUACIÓN PUNTO DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1384-24	9-oct-24	ACUERDOS Y COMPROMISOS PACADOS CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CALIFORNIA EN REUNIÓN REALIZADA EL 07 DE OCTUBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1385-24	10-oct-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-340 CON ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIAL - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1389-24	10-oct-24	APROBACIÓN INFORME SST – MES SEPTIEMBRE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1390-24	10-oct-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-379 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA TRAMO 1 ANCHO DE 7.00 m VEREDA COROZAL. – APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1392-24	10-oct-24	AVAL ITEM NO PREVISTOS DREN TIPO FRANCES (SECCION 1X0,6)
GIC-INVIAS-NTS-1393-24	10-oct-24	OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1308-24 - TRASLADO OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-061264, CON ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO ANTE COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1227-24
GIC-INVIAS-NTS-1395-24	10-oct-24	SOLICITUD ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA DE ACUERDO CON MODIFICACION No. 3
GIC-INVIAS-NTS-1397-24	10-oct-24	ENTREGA DE ACTAS DE CONFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE VEEDURÍA
GIC-INVIAS-NTS-1398-24	11-oct-24	SOLICITUD PUNTOS INFORMATIVOS DEL COMPONENTE SOCIAL EN LOS FRENTES DE OBRA

GIC-INVIAS-NTS-1399-24	11-oct-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 6 GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-1407-24	16-oct-24	SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE OBRA DE ACUERDO A MODIFICACION No. 3.
GIC-INVIAS-NTS-1408-24	16-oct-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-1384-24; ACUERDOS Y COMPROMISOS PACTADOS CON LA COMUNIDAD VEREDA CALIFORNIA - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1411-24	17-oct-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1417-24	18-oct-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-379 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA TRAMO 1 ANCHO DE 7.00 m VEREDA COROZAL. – OBSERVACIONES ESTRUCTURAL
GIC-INVIAS-NTS-1427-24	24-oct-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES FINAL SST
GIC-INVIAS-NTS-1429-24	24-oct-24	RESPUESTA UTET-02590-371 CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N° 03 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.
GIC-INVIAS-NTS-1441-24	25-oct-24	REITERACIÓN COMUNICADO NO. GIC-INVIAS-NTS-1237-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
GIC-INVIAS-NTS-1443-24	25-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO OF-074 - REVISION E INCORPORACIÓN TRAMO CORTO ENTRADA VIA COROZAL – CALIFORNIA.
GIC-INVIAS-NTS-1444-24	25-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO OF-073 - ACUERDOS PARA LA RECUPERACIÓN E INSTALACIÓN DE RED PUBLICA DE AGUA.
GIC-INVIAS-NTS-1446-24	25-oct-24	TRASLADO OFICIO 009 - SOLICITUD ÍTEM CONTRATO 2590 VEEDURÍA CIUDADANA CALIFORNIA.
GIC-INVIAS-NTS-1447-24	28-oct-24	SOLICITUD PUNTOS DEL COMPONENTE SOCIAL EN LOS FRENTES DE OBRA

GIC-INVIAS-NTS-1449-24	28-oct-24	RESPUESTA RADICADO OFICIO UTET-02590-312 INFORME DEL MES DE ABRIL - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1450-24	28-oct-24	RESPUESTA RADICADO OFICIO UTET-02590-320 - APROBACIÓN AMBIENTAL
GIC-INVIAS-NTS-1451-24	28-oct-24	EN RESPUESTA AL OFICIO CADV-GIC-062-2024- SE DA APROBACIÓN INFORME SEXTO TRIMESTRAL DE DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
GIC-INVIAS-NTS-1452-24	28-oct-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-347 INFORME DEL MES DE JULIO - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1458-24	29-oct-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-385 CUYO ASUNTO ES “DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, OBSERVACIONES SUBSANADAS.” – OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1462-24	29-oct-24	OBSERVACIONES REALIZADAS VISITA TECNICA A LOS FRENTES DE TRABAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
GIC-INVIAS-NTS-1463-24	29-oct-24	RESPUESTA AL OFICIO UTET-02590-353 CON ASUNTO INFORME TRIMESTRAL JUNIO-JULIO-AGOSTO COMPONENTE SOCIAL. - OBSERVACIONES

Tabla 129 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo

Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1294-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla 130 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1442-24	25-oct-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. IC-INVIAS-NTS-1238-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
GIC-INVIAS-NTS-1466-24	29-oct-24	SOLICITUD CIERRE SOCIAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Tabla 131 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes

de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1361-24	2-oct-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-034 CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024, CON ASUNTO: ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-431-24 OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD - APROBACIÓN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1363-24	3-oct-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-002 CON ASUNTO: DISEÑO HIRAULICO, SUELOS Y PAVIMENTOS – OBSERVACIONES DISEÑO HIDRÁULICO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1367-24	4-oct-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL. - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1368-24	4-oct-24	CERTIFICACIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1369-24	4-oct-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (FINAL). - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1370-24	4-oct-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL. - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1371-24	4-oct-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 FINAL. - PAMPLONITA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1373-24	4-oct-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-006 CON ASUNTO: REMISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO CORREGIDO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1374-24	7-oct-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-006 CON ASUNTO: REMISIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO CORREGIDO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA	GOBERNACIÓN 2033

			S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1377-24	8-oct-24	RESPUESTA OFICIO WRGD-CD-FC-058-2023-013, PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA AJUSTADA AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 - APROBACIÓN. - SANTIAGO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1378-24	8-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 026 – 2024 CON ASUNTO “SUBSANACIONES COMPONENTE HIDRÁULICO Y TOPOGRAFÍA” REVISIÓN No.2 HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO MUNICIPIO LOURDES FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1379-24	8-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OBR-CACH-043 CON ASUNTO “ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-740-24 COMPONENTE HIDRÁULICO” MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1380-24	8-oct-24	APROBACION AL PLAN DE MEJORA. - SALAZAR DE LAS PALMAS	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1381-24	8-oct-24	RESPUESTA OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-018 - DEFINICIÓN PR	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA	GOBERNACIÓN 2033

		PARA SEÑALES DE TRANSITO. - SANTIAGO	FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Director de Obra Contratista Cacota – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1386-24	10-oct-24	APROBACION INFORME FINAL SST CACHIRA FARO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1387-24	10-oct-24	APROBACIÓN AL INFORME FINAL SST SEPTIEMBRE 2024 - HERRAN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1391-24	10-oct-24	ALCANCE OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-009, APROBACIÓN CTO. CD-FC-081-2023. - MUTISCUA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista - Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1394-24	10-oct-24	RESPUESTA INSTALACIONES PROVISIONALES CONTRATO No. CD-FC-082-2023 - APROBACIÓN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1403-24	15-oct-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-046 CON FECHA 03 DE OCTUBRE 2024, CON ASUNTO: "ALCANCE ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1312-24 – TOPOGRAFÍA" - CACHIRA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1404-24	15-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO OBR-CACH-036 APROBACIÓN DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - CACHIRA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1409-24	16-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO OBR-CACH-041 CON ASUNTO "ANEXO 3. GESTIONES ANTE EL MININTERIOR" - APROBACIÓN - CACHIRA	Señores CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1412-24	17-oct-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2024 - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1413-24	17-oct-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2024 - GRAMALOTE	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO	GOBERNACIÓN 2033

			Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1415-24	17-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 028 – 2024 CON ASUNTO "SUBSANACIONES COMPONENTE HIDRÁULICO LOURDES TRAMO 1– APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1416-24	17-oct-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – PAMPLONITA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1418-24	21-oct-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-016 CON ASUNTO: ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-548-24 – DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN, EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO-APROBACIÓN - CACHIRA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1422-24	22-oct-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1150-24, GIC-INVIAS-NTS-1254-24, SOLICITUD ENTREGA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL - PUERTO SANTANDER	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1424-24	22-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OBR-CACH-048 CON ASUNTO "RESPUESTAS DISEÑO GEOMÉTRICO" MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – APROBACIÓN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1425-24	23-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 030 – 2024 CON ASUNTO "entrega de carteras y planos record topografía" – OBSERVACIONES - LOURDES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1428-24	24-oct-24	SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME FINAL SST - LOURDES	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Lourdes – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1431-24	24-oct-24	RESPUESTA COMUNICADOS CON ASUNTOS - "Entrega de información de gestión social trimestral" y Entrega informe sociales contrato No. CD-FC-054-2023 - Pamplonita - APROBACION	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Pamplonita– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1453-24	28-oct-24	RESPUESTA OFICIO OBR - CACH - 033 - MANEJO DE RESIDÚOS DE EXCAVACIÓN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P&B	GOBERNACIÓN 2033

			LTDA Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1454-24	28-oct-24	RESPUESTA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA CONTRATO No. CD-FC-081-2023 - APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-081-2023, Contratista Cúcuta-Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1455-24	29-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-002 con asunto "ENTREGA ESTUDIO GEOTÉCNICO, DISEÑO GEOMÉTRICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y TOPOGRAFÍA. "– DISEÑO ESTRUCTURAL – APROBACIÓN. - VILLA CARO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1456-24	29-oct-24	Solicitud entrega información y documentación legal e inicio de actividades de obra, para el contrato CTO. CD-FC-049-2024, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1457-24	29-oct-24	SOLICITUD INFORMACIÓN DE VALLA DEL CONTRATO – VILLA CARO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1459-24	29-oct-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-002 con asunto "ENTREGA ESTUDIO GEOTÉCNICO, DISEÑO GEOMÉTRICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y TOPOGRAFÍA. "– TOPOGRAFÍA – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES. - VILLA CARO	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1465-24	29-oct-24	RESPUESTA AL COMUNICADO SCCVN-CD-FC-081-2023-0013 CON ASUNTO PRESENTACIÓN AJUSTES AL COMPONENTE SOCIAL- APROBACIÓN DOCUMENTO Y FORMATOS PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL. - MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1468-24	29-oct-24	RESPUESTA AL COMUNICADO N°019- CD-FC-082-2023 CON ASUNTO PRESENTACIÓN AJUSTES AL COMPONENTE SOCIAL- APROBACIÓN DOCUMENTO Y FORMATOS PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL. - HERRAN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

Tabla 132 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes

de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1354-24	4-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1355-24	30-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-048947- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL 1, MUNICIPIO DEL CACOTA, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1372-24	4-oct-24	ACTA DE COSTOS NO. 25 E INFORME MENSUAL NO. 24 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1383-24	9-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1405-24	15-oct-24	ENTREGA APROBACIÓN DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL) COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - CACHIRA FARO	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1406-24	16-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1419-24	21-oct-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-075819 - SE REMITE NUEVAMENTE ARCHIVO ZIP OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL 1, MUNICIPIO DEL ZULIA, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1420-24	21-oct-24	ENTREGA DOCUMENTO PAGA CONTRATO DE OBRA CD-FC-054-2023 - PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - APROBACIÓN - PAMPLONITA	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1426-24	23-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1430-24	29-oct-24	REMISIÓN SALDO CONTRATO INTERVENTORÍA – AÑO 2024. (Modificación No.5)	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1432-24	24-oct-24	DOCUMENTO DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PLACA HUELLA PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER- APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO CD-FC-054-2023, Objeto “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER”.	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1434-24	24-oct-24	ENTREGA INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES PLACA HUELLA MUNICIPIO DE PAMPLONITA, APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 202 – 2022, Objeto “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1461-24	29-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1464-24	29-oct-24	REMISIÓN SALDO CONTRATO INTERVENTORÍA – AÑO 2024. (Modificación No.5)	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Director de Vías Territorial Norte de Santander INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Cúcuta N.S	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1467-24	29-oct-24	APROBACION DOCUMENTO Y FORMATOS PAGA DEL CONTRATO CD-FC-081-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – MINAS DE CAL- LA ARADITA – LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA NORTE DE SANTANDER”.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1469-24	29-oct-24	APROBACION DOCUMENTO Y FORMATOS PAGA- SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CD- FC-082-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER” - HERRAN FARO	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

Tabla 133 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cáchira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cáchira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (nota crédito)-24/05/2023 FE516 (RADICADA)-26/05/2023	21/07/2023

7	mar-23	$	188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$	143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$	127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$	152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$	163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$	165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$	179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$	198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$	173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$	268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$	271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM712 24/04/2024	
18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM738 26/06/2024	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM749 24/07/2024	
23	jul-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-075481	10236 el 04/09/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM764 02/09/2024	
24	Ago-24	$	234.430.238,00	5 septiembre de 2024	13096 el 16/10/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM775 16/09/2024	

25	Sep-24	$ 226.761.640,00	2024E-VUVRAZ-098214 05-10-24	14397 el 05/11/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM809 05/11/2024	
	TOTAL	$ 4 .330.542.795,68					

Tabla 134 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 135 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jhon Jairo Galvis	Residente Interventoría	97%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Juan Alex Díaz Riveros	Profesional Ambiental	100%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	50%
Felipe Stand Villarreal	Especialista en Estructuras	20%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	20%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	15%
Jairo Alonso Zorro Roa	Especialista Hidráulico	20%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	15%
Diana Patricia Aponte	Especialista de Pavimentos	20%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jhon Wilmer Rodríguez	Conductor	100%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andrés Parra Chacón	Inspector de Intv. La Playa	100%
Nicolas Mazo Rodríguez	Inspector de Intv. Abrego	100%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	100%
Santos Eduardo Maldonado Murillo	Inspector Gramalote	100%
David Alexander Álvarez Ortiz	Inspector Los Patios	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%

Tabla 136 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20

5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
24	ago-24	$ 197.000.200,00	$ 37.430.038,00	$ 234.430.238,00	218724 - 2024/03/15	$ 452.920.189,52	$ 952.920.189,52
25	sep-24	$ 190.556.000,00	$ 36.205.640,00	$ 226.761.640,00	218724 - 2024/03/15	$ 226.158.549,52	$ 726.158.549,52
26	oct-24	$ 173.029.960,00	$ 32.875.692,40	$ 205.905.652,40	218724 - 2024/03/15	$ 20.252.897,12	$ 520.252.897,12
TOTALES		$ 3.812.141.553,02	$ 724.306.895,07	$ 4.536.448.448,08		$ 20.252.897,12	$ 520.252.897,12

Tabla 137 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICION No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 138 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Abrego, Gobernación 1943 y Gobernación 2033.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 25 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033.

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla, 520 metros lineales de Placa Huella y el parcheo de 572.69 m2. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. El acta de liquidación se firmó el día 06 de septiembre de 2024.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 15 de octubre de 2024.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril y a la fecha del presente informe, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato finalizo su tiempo contractual el día 30 de julio de 2024.

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 4641.80 metros lineales, 60451.44 m2 de mejoramiento periódico y 15 alcantarillas.

Municipio de Gramalote: 2508.80 metros lineales, 39276.66 m2 de mejoramiento periódico y 14 alcantarillas.

Municipio de Los Patios: 2319.30 metros lineales, 15236.68 m2 de mejoramiento periódico y 4 alcantarillas.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023 y a la fecha del presente informe se ha construido en el tramo de Santa Lucia – Canoas 1150 metros de placa huella y en el tramo 2 658 metros de placa huella, 11 alcantarillas en el proyecto. La terminación del contrato está proyectada para el 20 de diciembre de 2024.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio los 17 contratos a ejecutar.

En proceso de liquidación se encuentran los siguientes contratos de obra: Herrán, Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Cúcuta, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia.

En proceso de ejecución se encuentran los siguientes contratos de obra: Villa Caro, Santiago y Gramalote.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 m de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 03 de septiembre de 2024.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, se presenta un atraso del 3.25%, dándose un avance de 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico. Se firmo acta de liquidación el 31 de julio de 20240}.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 02 de septiembre de 2024.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 282 m de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 m de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a

320 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 m de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 280 m de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69m2 de mejoramiento periódico. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 390m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presente un avance de 310m de placa huella, 4 alcantarillas y 15460.91 m2 de mejoramiento. Existe un avance de 91.82%.

En Villa Caro, donde se firmó acta de inicio el 18 de octubre de 2024, a la fecha el contratista de obra se encuentra en verificación de estudio y diseños de todos los componentes, igualmente a iniciado el acopio de material pétreo en la zona de intervención. Se realizo socialización con la comunidad de la zona de influencia del proyecto el día 28 de octubre de 2024.

8. ANEXOS
