
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Agrupar Por: Hitos Ver: Todas las Tareas Exportado El: 26/12/2024 12:21 PM

ID	Nombre De Tarea	Duración	Fecha De I...	% Comple...
	OFICINA 20FT		05/12/2024	Produccion John Rubio T
	2. RESTAURACIÓN (4)		05/12/2024	%
UA1-T96	2.1. Latonería	1 día	05/12/2024 0(	0%
UA1-T97	2.2. Grateado	1 día	06/12/2024 0	0%
UA1-T98	2.3. Aplicación hueso duro	2 días	07/12/2024 0(	0%
UA1-T99	2.4. Lijado hueso duro	1 día	10/12/2024 0(	0%
	3. DETALLADO (3)		11/12/2024	%
UA1-T93	3.1. Fondeo con anticorrosivo	1 día	11/12/2024 08	0%
UA1-T94	3.2. Aplicación masilla roja	2 días	12/12/2024 08	0%
UA1-T95	3.3 Lijado masilla roja	2 días	14/12/2024 0(	0%
	4. ESTRUCTRUACIÓN PUERTAS Y VE... (8)		13/12/2024	%
UA1-T85	4.1. Cimbrado y cortes de vanos puertas y v...	2 días	13/12/2024 08	0%
UA1-T86	4.2. Fabricación de marcos	3 días	16/12/2024 0(	0%
UA1-T87	4.3. Instalación marcos	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T88	4.4. Resoldado de marcos	2 días	20/12/2024 0(	0%
UA1-T89	4.5. Fabricación puerta	1 día	17/12/2024 08	0%
UA1-T90	4.6. Instalación puerta	1 día	18/12/2024 0(	0%
UA1-T91	4.7. Instalación ventanas	1 día	30/12/2024 0(	0%
UA1-T92	4.8. Revisión	1 día	30/12/2024 0(	0%
	5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS (6)		19/12/2024	%
UA1-T79	5.1. Instalación de cajas y soportes	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T80	5.2. Instalación tubería	2 días	20/12/2024 0(	0%
UA1-T81	5.3. Cableado	1 día	23/12/2024 0(	0%
UA1-T82	5.4. Instalación caja de circuitos	1 día	25/12/2024 0(	0%
UA1-T83	5.5. Instalación apartaos y luminarias	1 día	29/12/2024 0(	0%
UA1-T84	5.6. Instalación red voz y datos	1 día	29/12/2024 0(	0%
	8. FORRADO (5)		16/12/2024	%
UA1-T71	8.1. Instalación estructura liviana para muro...	3 días	16/12/2024 0(	0%
UA1-T73	8.3. Instalación aislante	1 día	24/12/2024 0(	0%
UA1-T74	8.4. Instalación de placas de drywall, PVC, ...	1 día	26/12/2024 0(	0%
UA1-T75	8.5. Estucado, incluye cinta papel, cinta filo...	2 días	27/12/2024 0(	0%
UA1-T76	8.6. Lijado estuco	1 día	30/12/2024 0(	0%
	9. INSTALACIÓN DE PISO (7)		10/12/2024	%
UA1-T62	9.1. Reparación de piso	1 día	10/12/2024 0(	0%
UA1-T63	9.2. Aplicación de hueso duro	1 día	18/12/2024 0(	0%
UA1-T64	9.3. Lijado hueso duro	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T66	9.5. Instalación eterboard	1 día	20/12/2024 0(	0%
UA1-T67	9.6. Aplicación pegante PL	1 día	30/12/2024 0(	0%
UA1-T68	9.7. Instalación tapete	1 día	30/12/2024 0(	0%
UA1-T69	9.8. Instalación guardaescoba	1 día	30/12/2024 0(	0%
	10. ACABADOS INTERNOS (3)		28/12/2024	%
UA1-T59	10.1. Alistamiento superficia	1 día	28/12/2024 0(	0%
UA1-T60	10.2. Empapelado superficie	1 día	28/12/2024 0(	0%
UA1-T61	10.3. Aplicación pintura final	1 día	30/12/2024 0(	0%
	11. ACABADOS EXTERNOS (3)		18/12/2024	%
UA1-T56	11.1. Alistamiento superficie	1 día	18/12/2024 0(	0%
UA1-T57	11.2. Empapelado superficie	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T58	11.3. Aplicación pintura final	2 días	20/12/2024 0(	0%
	13. REMATES Y VARIOS (5)		31/12/2024	%
UA1-T49	13.2. Sikado	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T50	13.3. Instalación cerraduras	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T51	13.4. Aseo final	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T54	13.7. Instalación placa de producto en venta	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T55	13.8. Serial local	1 día	31/12/2024 08	0%
	15. PRUEBAS (1)		31/12/2024	%
UA1-T47	15.1. Pruebas de calidad	1 día	31/12/2024 08	0%
	BODEGA 20FT		05/12/2024	Produccion John Rubio T
	2. RESTAURACIÓN (4)		05/12/2024	%
UA1-T2	2.1. Latonería	1 día	05/12/2024 0(	0%
UA1-T3	2.2. Grateado	1 día	06/12/2024 0	0%
UA1-T4	2.3. Aplicación hueso duro	2 días	07/12/2024 0(	0%
UA1-T5	2.4. Lijado hueso duro	1 día	09/12/2024 0	0%
	3. DETALLADO (3)		10/12/2024	%
UA1-T6	3.1. Fondeo con anticorrosivo	1 día	10/12/2024 0(	0%
UA1-T7	3.2. Aplicación masilla roja	1 día	11/12/2024 08	0%
UA1-T8	3.3 Lijado masilla roja	1 día	12/12/2024 08	0%
	4. ESTRUCTRUACIÓN PUERTAS Y VE... (8)		12/12/2024	%
UA1-T9	4.1. Cimbrado y cortes de vanos puertas y v...	1 día	12/12/2024 08	0%
UA1-T10	4.2. Fabricación de marcos	2 días	13/12/2024 08	0%
UA1-T11	4.3. Instalación marcos	1 día	16/12/2024 0(	0%
UA1-T12	4.4. Resoldado de marcos	1 día	17/12/2024 08	0%
UA1-T13	4.5. Fabricación puerta	1 día	16/12/2024 0(	0%
UA1-T14	4.6. Instalación puerta	1 día	17/12/2024 08	0%
UA1-T15	4.7. Instalación ventanas	-		0%
UA1-T16	4.8. Revisión	-		0%
	5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS (5)		16/12/2024	%
UA1-T17	5.1. Instalación de cajas y soportes	1 día	16/12/2024 0(	0%
UA1-T18	5.2. Instalación tubería	1 día	17/12/2024 08	0%
UA1-T19	5.3. Cableado	1 día	18/12/2024 0(	0%
UA1-T20	5.4. Instalación caja de circuitos	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T21	5.5. Instalación apartaos y luminarias	1 día	28/12/2024 0(	0%
	9. INSTALACIÓN DE PISO (6)		17/12/2024	%
UA1-T23	9.1. Reparación de piso	1 día	17/12/2024 08	0%
UA1-T24	9.2. Aplicación de hueso duro	1 día	18/12/2024 0(	0%
UA1-T25	9.3. Lijado hueso duro	1 día	19/12/2024 0(	0%
UA1-T27	9.5. Instalación eterboard	1 día	20/12/2024 0(	0%
UA1-T28	9.6. Aplicación pegante PL	1 día	23/12/2024 0(	0%
UA1-T29	9.7. Instalación tapete	1 día	24/12/2024 0(	0%
	10. ACABADOS INTERNOS (3)		23/12/2024	%
UA1-T32	10.1. Alistamiento superficia	1 día	23/12/2024 0(	0%
UA1-T33	10.2. Empapelado superficie	1 día	26/12/2024 0(	0%
UA1-T34	10.3. Aplicación pintura final	2 días	27/12/2024 0(	0%
	11. ACABADOS EXTERNOS (3)		24/12/2024	%
UA1-T35	11.1. Alistamiento superficie	1 día	24/12/2024 0(	0%
UA1-T36	11.2. Empapelado superficie	1 día	26/12/2024 0(	0%
UA1-T37	11.3. Aplicación pintura final	2 días	27/12/2024 0(	0%
	13. REMATES Y VARIOS (5)		31/12/2024	%
UA1-T39	13.2. Sikado	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T40	13.3. Instalación cerraduras	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T41	13.4. Aseo final	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T44	13.7. Instalación placa de producto en venta	1 día	31/12/2024 08	0%
UA1-T45	13.8. Serial local	1 día	31/12/2024 08	0%
	15. PRUEBAS (1)		31/12/2024	%
UA1-T46	15.1. Pruebas de calidad	1 día	31/12/2024 08	0%

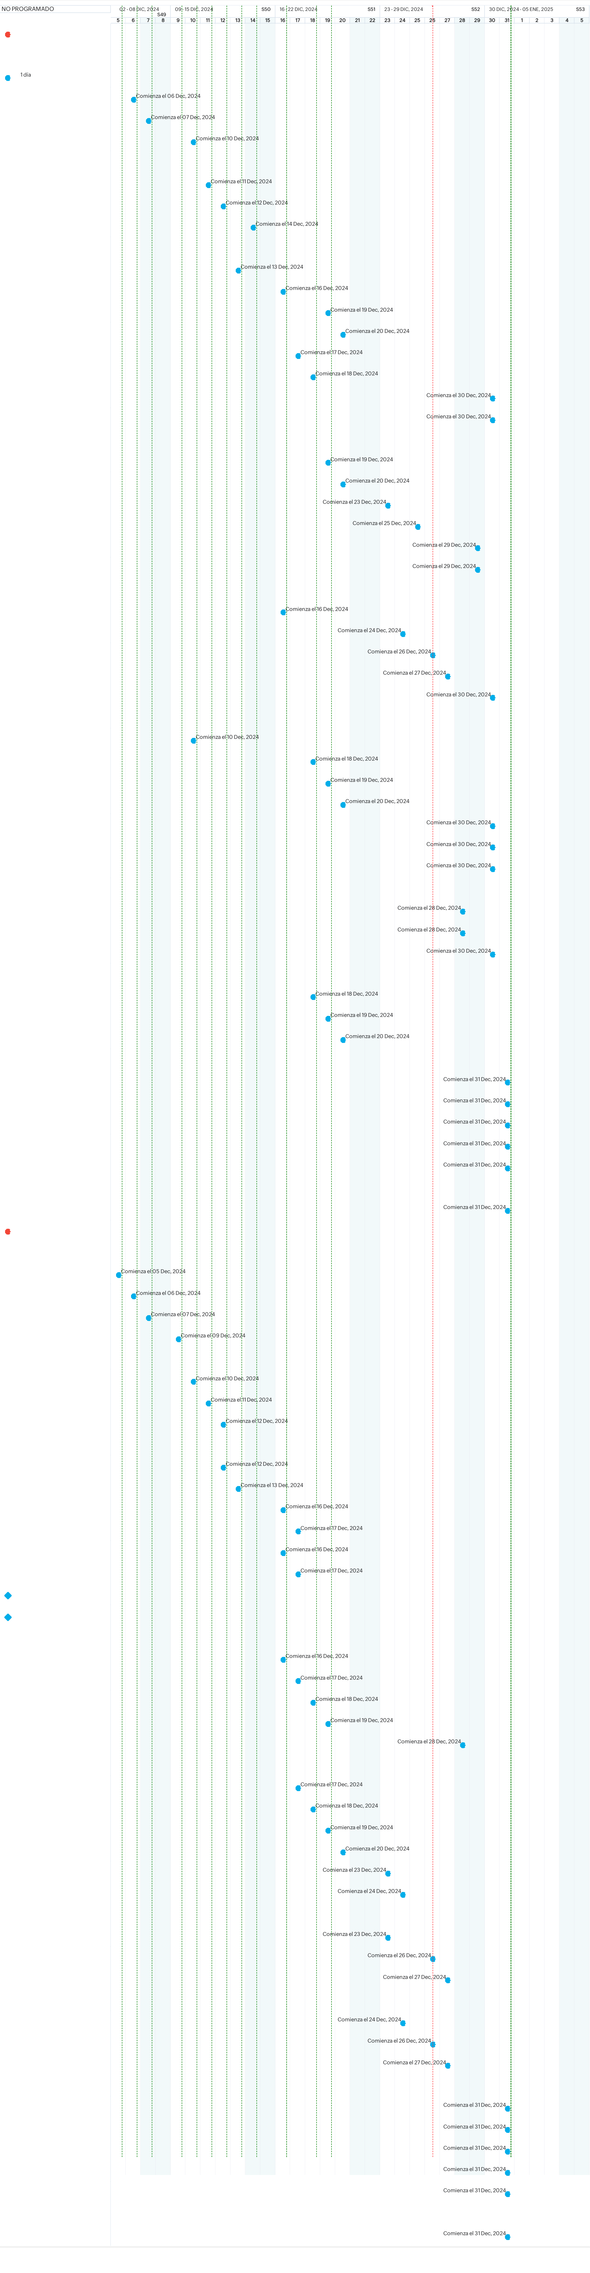

Leyendas

Hito
Listas de tareas
Tarea
Subtarea
Tarea con duración cero
Línea de fondo
Línea base y retraso
Ruta crítica
Retraso de Tarea
Tareas de consolidación
Subtareas de remonte
Tarea cerrada puntualmente
Tarea cerrada con retraso
Tarea cerrada antes del inicio

*Los colores de las barras de Tarea se pueden personalizar.
