ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES

ICSSI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 125

INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES
Nit: 900819482-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CLL 24 3A 12 NEIVA HUILA Tel. 8646779

Adquiriente MUNICIPIO DE PAICOL **Identific.** NIT 891180194-4 **Tels:**6088378031 **Direccion** MCP DE PAICOL ALCALDIA MUNICIPAL PAICOL - HUILA		**Fecha** Dic-30-2024 **Vencimiento** Dic-30-2024	**Infomacion de pago** **Forma** CREDITO CUENTAS POR **Medio**

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	011	Plan de manejo de transito (PTM)		0	1.00	739,442.00	739,442.00
2	006	COSTO DIRECTO		0	1.00	26,745,407.12	26,745,407.12
3	005	ADMINISTRACION		0	1.00	6,686,351.78	6,686,351.78
4	004	IMPREVISTO		0	1.00	1,337,270.36	1,337,270.36
5	003	UTILIDAD		0	1.00	534,908.14	534,908.14

CONTRATO NO. 198 DE 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOLY SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES "

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	36,043,379.40
		IVA 0.00%	36,043,379.40	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764083882246 de Nov-22-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-22-2025 Rango: FE 123-1000

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS mcte.

TOTAL COP$ 36,043,379.40

	OBJETO:	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES									
	CONTRATO N°:	NO. 198 DE 2024	CONTRATISTA:	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FECHA INICIO:	24 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO INICIAL:	10 DIAS	VALOR TOTAL:	$36.043.379	
	TIPO CONTRATO:	DE OBRA	NIT:	900.819.482	OTRO SI N° 01:	N/A	PRÓRROGA N° 1:	N/A	ACTA N°:	1	
	MODALIDAD:	MINIMA CUANTIA	REPRES. LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO	SUSPENSIÓN N° 1:	N/A	PRÓRROGA N° 2:	N/A	FECHA ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024.	
	PÓLIZA CUMPLIMI:	61-44-101057373	C.C.	1.075.265.062	REINICIO:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A	VALOR ACTA:	$36.043.379,40	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PÓLIZA R. CIVIL:	61-40-101020815	INTERVENTOR:	N/A	OTRO SI N° 02	N/A	VALOR INICIAL:	$36.043.379	% EJECUTADO:	100%	
	CDP:	2024000539 del 10/10/2024	REPRES. LEGAL:	N/A	FECHA TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024.	VALOR ADICIONAL 1:	N/A	SALDO POR PAGAR	$0,00	
NIT: 891.180.194-4	RP:	2024000936 del 20/12/2024	SUPERVISOR:	MIGUEL ALBERTO DURÀN SALAS			VALOR ADICIONAL 2:	N/A			

ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES ORIGINALES DEL PROYECTO						AJUSTE 1 - 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT. FINAL	VALOR TOTAL	CANT. FINAL	VALOR TOTAL
1,1	Localizacion y replanteo	M/L	10,00	$5.459,00	$54.590,00		$ 0	10,00	$54.590,00		$ 0,00	10,00	$ 54.590,00	10,00	$54.590,00
1,2	Excavacion mecanica en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	60,50	$80.212,00	$4.852.826,00		$ 0	60,50	$4.852.826,00		$ 0,00	60,50	$ 4.852.826,00	60,50	$4.852.826,00
1,3	Suministro e instalación de solado e= 0,05 mts de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2)	M2	10,90	$73.468,00	$800.801,20		$ 0	10,90	$800.801,20		$ 0,00	10,90	$ 800.801,20	10,90	$800.801,20
1,4	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	7,80	$1.081.394,00	$8.434.873,20		$ 0	7,80	$8.434.873,20		$ 0,00	7,80	$ 8.434.873,20	7,80	$8.434.873,20
1,5	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m	M/L	10,00	$771.037,00	$7.710.370,00		$ 0	10,00	$7.710.370,00		$ 0,00	10,00	$ 7.710.370,00	10,00	$7.710.370,00
1,6	Suministro e instalacion material seleccionado.	M3	54,00	$156.732,00	$8.463.528,00		$ 0	54,00	$8.463.528,00		$ 0,00	54,00	$ 8.463.528,00	54,00	$8.463.528,00
2,1	Suministro de tuberia en concreto f= 24", l=1m	und	11,00	$453.359,00	$4.986.949,00		$ 0	11,00	$4.986.949,00		$ 0,00	11,00	$ 4.986.949,00	11,00	$4.986.949,00
SUB TOTAL COSTOS					$ 35.303.937,40		$ 0		$ 35.303.937,40		$ 0		$ 35.303.937,40		$ 35.303.937,40
Plan de manejo de trasnito (PMT)					$739.442		$ 0		$ 739.442,00				$739.442,00		$739.442,00
VALOR TOTAL OBRA					$ 36.043.379,40		$ 0		$ 36.043.379,40		$ -	$ -	$36.043.379,40		$ 36.043.379,40

INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES
CARLOS FELIPE AGUDELO
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNCIPIO DE PAICOL

CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS VEREDALES	UBICACIÓN	UNIDAD	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	AREA TOTAL
Localizacion y replanteo	Vereda san marcos	ML	1	5		1	5
	Vereda san matias	ML	1	5		1	5
TOTAL							**10**
Excavacion mecanica en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	Vereda san marcos	M3	1,95	7,5	1,9305	1	28,2
	Vereda san matias	M3	1,75	7,5	2,45	1	32,2
TOTAL							**60,4**
Suministro e instalación de solado e= 0,05 mts de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2)	Vereda san marcos	M2			5	1,1	5,5
	Vereda san matias	M2			4,909090909	1,1	5,4
TOTAL							**10,9**
Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	**SAN MARCOS**						
	aletas	M3	0,2	1,49	1,3	2	0,77
	piso de salida		0,2		5,8	1	
	muro de salida		0,2	1,8	1,8	1	0,65
	cajillas de entrada		0,2	5,2	2,1	1	2,18
	piso de entrada		0,2	1,3	1,3	1	0,34
Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	**SAN MATIAS**						
	aletas	M3	0,2	1,49	1,3	2	0,77
	piso de salida		0,2		5,8	1	
	muro de salida		0,2	1,8	1,8	1	0,65
	cajillas de entrada		0,2	5,2	2,016	1	2,1
	piso de entrada		0,2	1,3	1,3	1	0,34
TOTAL							**7,8**
Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m	Vereda san marcos	ML	1	5		1	5
	Vereda san matias	ML	1	5		1	5
TOTAL							**10**
Suministro e instalacion material seleccionado.	general	M3	1,95	8,099	1,9305	1	30,49
	Ocupacion tuberia	M3	-1	5	0,65	1	-3,25
	general	M3	1,75	7	2,45	1	30,01
	Ocupacion tuberia	M3	-1	5	0,65	1	-3,25
TOTAL							**54,00**

SUMINISTRO DE MATERIALES CONTINGENICA	UBICACIÓN	UNIDAD	ANCHO	LONGITUD	ALTO	ALTURA	AREA TOTAL
Suministro de tuberia en concreto f= 24", l=1m	Bodega alcaldia	Und				11	11
TOTAL							**11**

ICSSI SAS
CARLOS FELIPE AGUDELO
CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL
MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
SUPERVISOR

INFORME DE CONTRATISTA DE ACTA DE RECIBO FINAL

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 198 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
CONTRATISTA:	INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.
NIT	900.819.482-8
REPRESÉNTATE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA C.C. NO. 1.075.265.062
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL RESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($36.043.379,40) M/CTE IVA INCLUIDO.
SUPERVISOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL
FECHA DE INICIO:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS
FECHA FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

EL presente informe corresponde a las actividades desarrolladas, inconvenientes presentados, control presupuestal e informe de seguridad laboral para la ejecución del contrato de **OBRA PÚBLICA No 198 DE 2024** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES,** celebrado entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL y la empresa INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS, en el periodo comprendido entre el dia 24 de diciembre y el 30 de diciembre del 2024.


2. ALCANCE Y OBJETIVOS


EL presente documento tiene como principal objetivo informar y servir de medio de control a la entidad contratante y a la supervision de las diferentes actividades que se desarrollaron en el contrato de **OBRA PÚBLICA No 198 DE 2024** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES.**

Ademas de lo anteriormente informado el presente informe corresponde a la entrega final del proyecto en cuestión, incluido la respectiva revisión y soporte de los imprevistos presentado en la ejecución de actividades.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL proyecto queda ubicado en las veredas San Marcos y San Matias en el Municipio de Paicol, Departamento de la Huila.

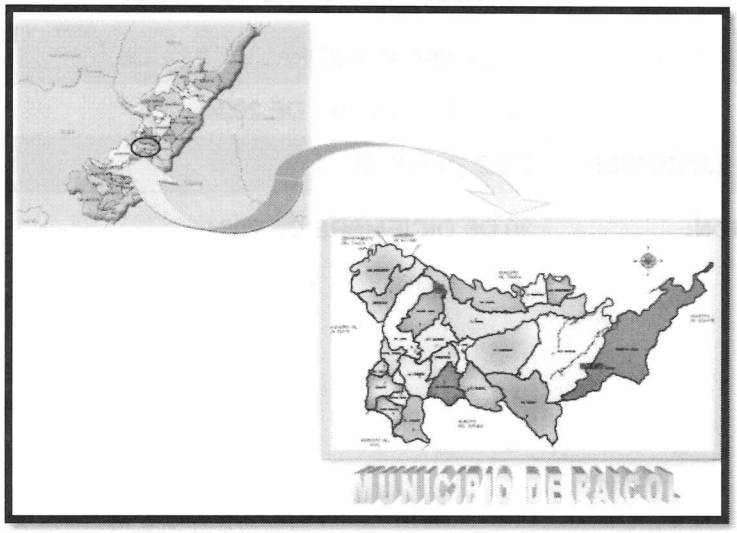

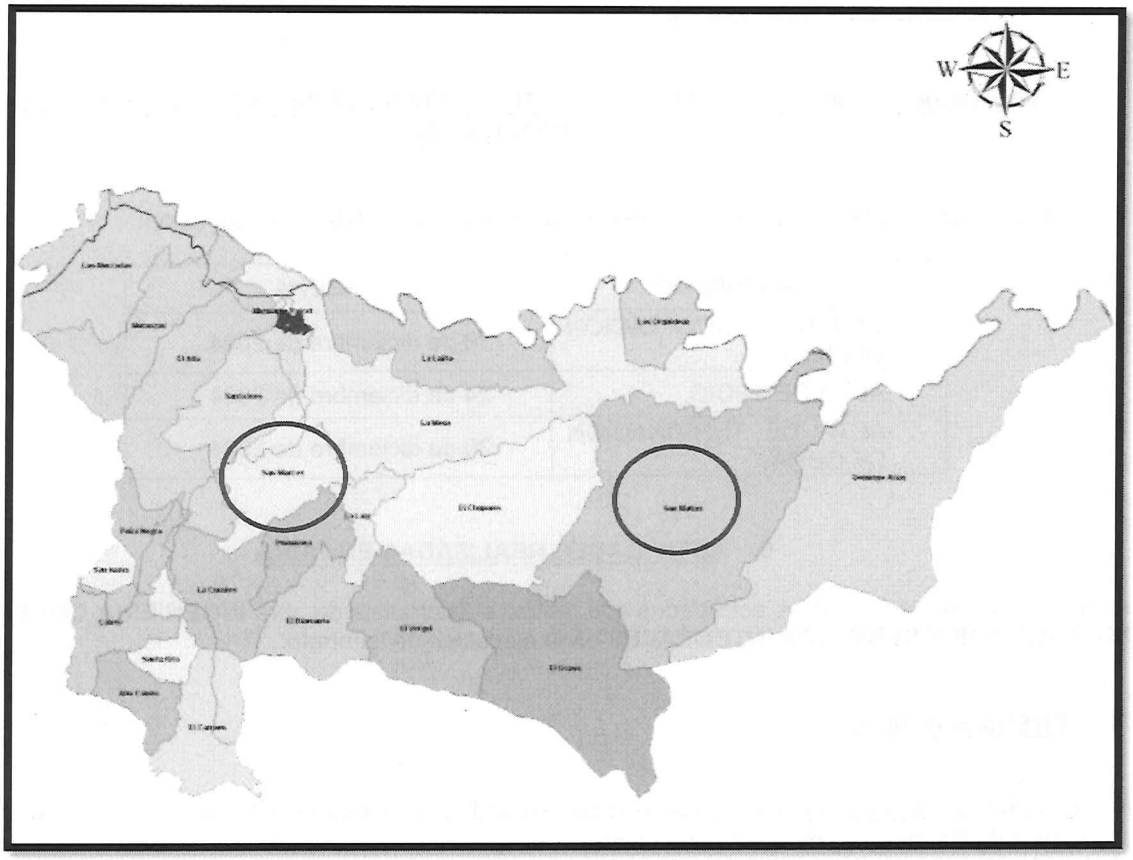

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

EL objeto del presente proyecto es la **CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES,** y este se dividido en dos frentes de trabajo, los cuales son los siguientes:

- **VEREDA SAN MARCOS:**
    - Localizacion y replanteo
    - Exvacaciones y rellenos
    - Construccion de alberca y cabezote de alcantarillas en concreto de 3000 psi
    - Instalacion de tubería de 36"
- **VEREDA SAN MATIAS:**
    - Localizacion y replanteo
    - Exvacaciones y rellenos
    - Construccion de alberca y cabezote de alcantarillas en concreto de 3000 psi

- Instalacion de tubería de 36"

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO – ACTAS SUSCRITAS E INFORME DE ACTAS REALIZADAS

Durante la ejecución del contrato se han suscrito las actas relacionadas acontinuacion:

ACTIVIDAD	FECHA
CARTA ACEPTACION OFERTA	19 de diciembre de 2024
ACTA DE INICIO	24 de diciembre de 2024
ACTA DE TERMINACION DE OBRA	30 de diciembre de 2024

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

Acontinuacion se describen las actividades que realizo el contratista de obra **INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES** en la ejecución del contrato:

VEREDA SAN MARCOS:

- 1,1 Localizacion y replanteo esta actividad corresponde a la ubicación de los lugares donde se construira la alcantarilla, ademas de la toma de niveles.

- 1,2 Excavacion mecanica en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.) esta actividad corresponde a la excavación mecánica para posterior instalacion de la tubería de 36", ademas de la colocación del material sobrante en un predio vecino, el cual necesitaba un relleno.

- 1,3 suministro e instalación de solado e= 0,05 mts de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2) Esta actividad corresponde a la aplicación del solado de limpieza de la tubería de 36"

- 1,4 suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas. Esta actividad corresponde a la instalación de los cabezotes de ingreso y salida de aguas lluvias, las cuales son guiadas por la tubería de 36".

- 1,5 suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m corresponde a la instalación de la tubería de 36" que será la encargada de encauzar las aguas lluvias.

- 1,6 suministro e instalacion material seleccionado. Esta actividad corresponde al llenado y compactación de material seleccionado sobre las excavaciones que se realizaron para la instalación de las alcantarillas.

VEREDA SAN MATIAS:

- 1,1 Localizacion y replanteo esta actividad corresponde a la ubicación de los lugares donde se construira la alcantarilla, ademas de la toma de niveles.

- 1,2 Excavacion mecanica en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.) esta actividad corresponde a la excavación mecánica para posterior instalacion de la tubería de 36", ademas de la colocación del material sobrante en un predio vecino, el cual necesitaba un relleno.

- 1,3 suministro e instalación de solado e= 0,05 mts de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2) Esta actividad corresponde a la aplicación del solado de limpieza de la tubería de 36"

- 1,4 suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas. Esta actividad corresponde a la instalación de los cabezotes de ingreso y salida de aguas lluvias, las cuales son guiadas por la tubería de 36".

- 1,5 suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m corresponde a la instalación de la tubería de 36" que será la encargada de encauzar las aguas lluvias.

- 1,6 suministro e instalacion material seleccionado. Esta actividad corresponde al llenado y compactación de material seleccionado sobre las excavaciones que se realizaron para la instalación de las alcantarillas.

ENTREGA DE SUMINISTRO:

- 2,1 suministro de tuberia en concreto f= 24", l=1m. Esta actividad corresponde al suministro de 11 tubos de 24" de concreto, los cuales fueron puestos en las instalaciones de la alcaldía Municipal.

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE SU EJECUCION

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	Se realiza revisión del presupuesto del contrato, lo anterior en búsqueda de garantizar una buena ejecución del contrato de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	Se realiza ensayo de toma de muestras de concreto de los cabezotes de las alcantarillas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	El contrato no presenta anticipo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	Actualmente ICSSI posee un departamento de gestión humana, el cual garantiza un correcto desempeño en los procesos de contratación del personal de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Actualmente la ICSSI posee un departamento de SISOMA, el cual garantiza un correcto desempeño en los procesos de control de maquinaria.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Actualmente la ICSSI posee un en su nómina un almacenista de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	ICSSI realiza entrega de las diferentes planillas de SS y de pagos de parafiscales del mes correspondiente.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO, INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA Y LEGALIZACION DE IMPREVISTOS

En la ejecución de obra se presentaron los siguientes inconvenientes o situaciones que no fueron previstos inicialmente, los cuales son los siguientes:

- Retiro y reintalacion de material seleccionado: Debido a la fuerte ola invernal que se presenta en la zona, en el momento que se estaba realizando la instalación del material seleccionado, inicio una fuerte precipitación, situación que genero que el material que estaba colocado, pero no compactado se saturara, situación que daño el material, por ende, fue necesario su retiro y reinstalación de material nuevo, dicha situación paso en la vereda San Marcos.

- Daño de tubería de 36" de concreto: Debido a que el transporte de la tubería de 36" de concreto se realizo por caminos veredales, los cuales no son los mejores, a 2 tubos que se dirigían a la vereda san marcos presentaron fisuración, situación por la cual la supervisión solicito el cambio de dicha tubería, por ende, el contratista tuvo que volver a adquirir dicha tubería afectada.

- Excavacion en roca: En el proceso de excavación mecánica en la vereda San Matias se encontró una roca de gran tamaño, situación que genero retrasos en las actividades, aparte de mayor gasto de horas de maquinaria, las cuales fueron asumidas por los imprevistos de obra.

CUANTIFICACION DE AFECTACIONES:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Retiro y suministro de material seleccionado	m3	8,5	$156.732,00	$ 1.332.222,00
Remplazo de tuberia de 36" en concreto	ml	2	$771.037,00	$ 1.542.074,00
Excavacion en roca	m3	0,4	$143.230,00	$ 57.292,00
TOTAL				**$ 2.931.588,00**

9. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO	**61-44-101057373**	**2**	**24 de diciembre de 2024**	Cumplimiento del contrato	**24/12/2024**	**04/05/2025**
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	**24/12/2024**	**03/01/2028**
				Estabilidad y Calidad de Obras	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO	**61-40-101-020-815**	**2**	**24 de diciembre de 2024**	24-12-24	01-01-25

10. PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA – BALANCE Y EJECUTADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL PROYECTO						ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. FINAL	VALOR TOTAL
1,1	Localizacion y replanteo	ML	10,00	$5.459,00	$54.590,00	10,00	$54.590,00
1,2	Excavacion mecanica en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	60,50	$80.212,00	$4.852.826,00	60,50	$4.852.826,00
1,3	Suministro e instalación de solado e= 0,05 mts de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2)	M2	10,90	$73.468,00	$800.801,20	10,90	$800.801,20
1,4	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	7,80	$1.081.394,00	$8.434.873,20	7,80	$8.434.873,20

1,5	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m	ML	10,00	$771.037,00	$7.710.370,00	10,00	$7.710.370,00
1,6	Suministro e instalacion material seleccionado.	M3	54,00	$156.732,00	$8.463.528,00	54,00	$8.463.528,00
2,1	Suministro de tuberia en concreto f= 24", l=1m	und	11,00	$453.359,00	$4.986.949,00	11,00	$4.986.949,00
SUB TOTAL COSTOS					**$ 35.303.937,40**		**$ 35.303.937,40**
Plan de manejo de trasnito (PMT)					$739.442		$739.442,00
VALOR TOTAL OBRA					**$ 36.043.379,40**		**$ 36.043.379,40**

11. EQUIPOS EN OBRA

Los equipos usados en la ejecución de obra fueron los siguientes:

- Retroexcavadora enllantada.
- Volqueta sencilla.
- Mezcladora de concreto.
- Vibrador de concreto.
- Compactador mecanico.
- Pulidora.
- Equipos menores.

12. PERSONAL DE OBRA

Acontinuacion se relaciona el personal que trabajo en la obra.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA	1.075.265.062	INGENIERO CIVIL
3	SERGIO ALEJANDRO PEREZ	1.075.265.032	OBRA CIVIL
4	OLIVERIO ORDOÑEZ GUAPENDO	1.075.274.122	OBRA CIVIL
5	JHON JAIRO RINCON COMETA	17.673.422	OBRA CIVIL
6	YEISON FAVIAN GALINDO MUÑOZ	1.075.264.688	OBRA CIVIL

13. SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

En búsqueda de cumplimiento de la normativa colombiana, se han llevado acabo las siguientes actividades:

- Charlas diarias de capacitacion de trabajo seguro.
- Charla de capacitacion en uso de pulidora.
- Uso de EPP de personal operativo.
- Entrega de EPP al total del personal.
- Señalización de obra.
- Contratacion de personal para control de trafico.
- Adquisicion de paletas, cinta de seguridad y demarcaciones viales para el control del trafico.
- Informacion mediante perifoneo y radio local sobre cierre vial para ejecución de actividades.



CARLOS FELIPE AGUDELO
R.L. ICSSI SAS
CONTRATISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion mecanica



Excavacion mecanica



Excavacion mecanica



Instalacion tuberia




Instalacion tuberia




Instalacion relleno seleccionado




Instalacion tuberia

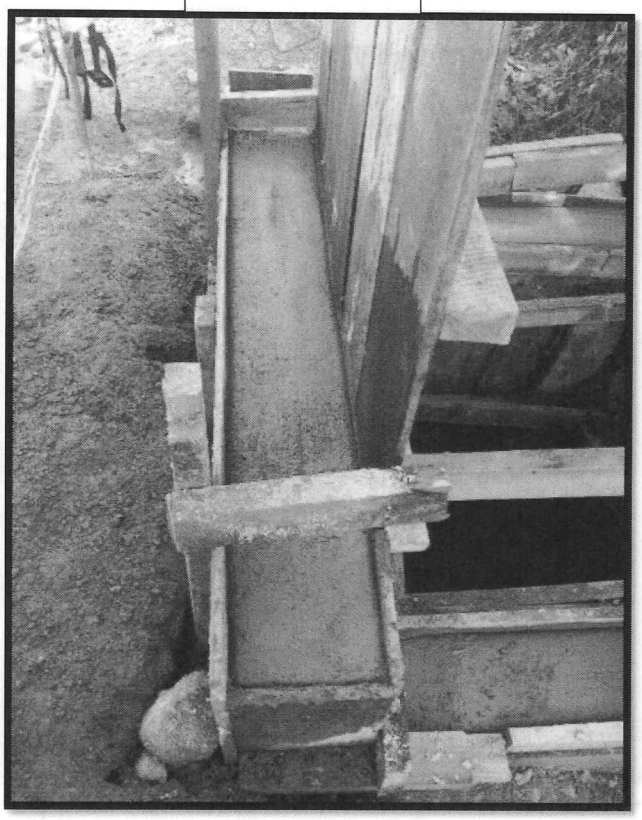


Fundicion concreto

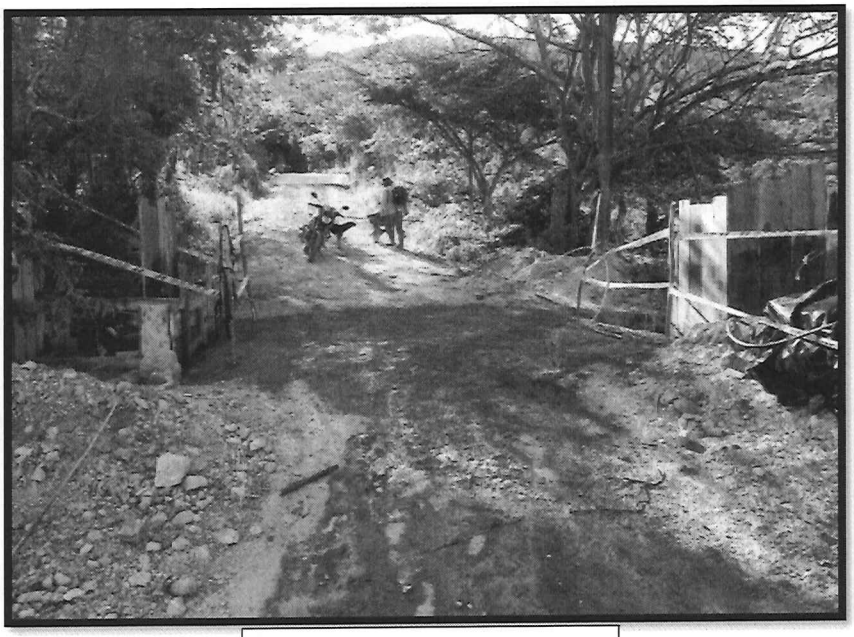


Instalacion relleno seleccionado

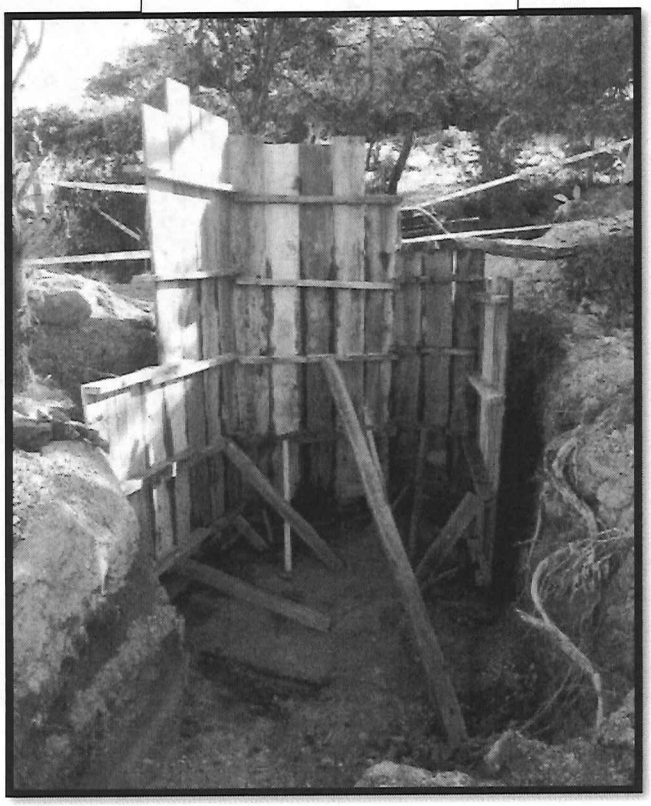


Fundicion concreto

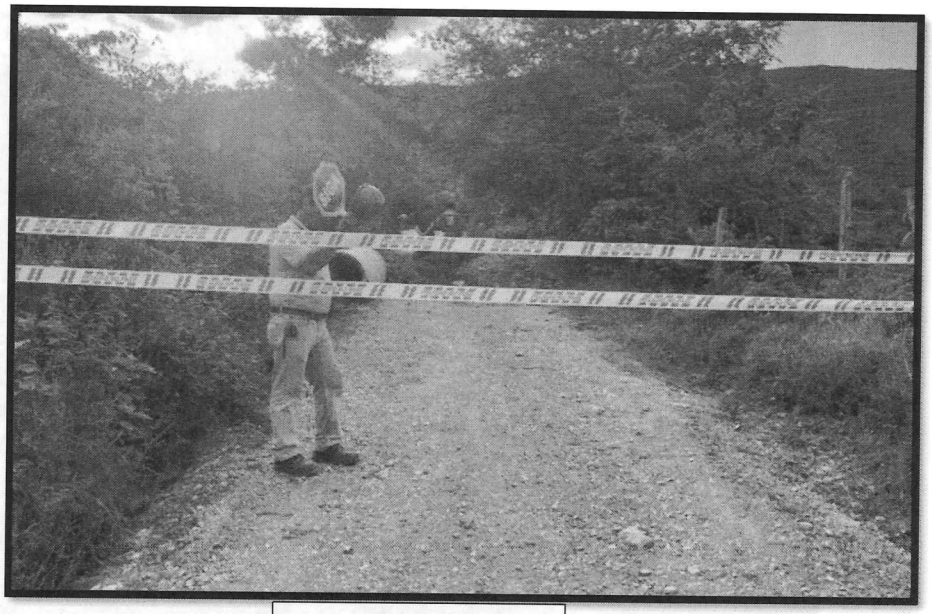

Implementacion PMT

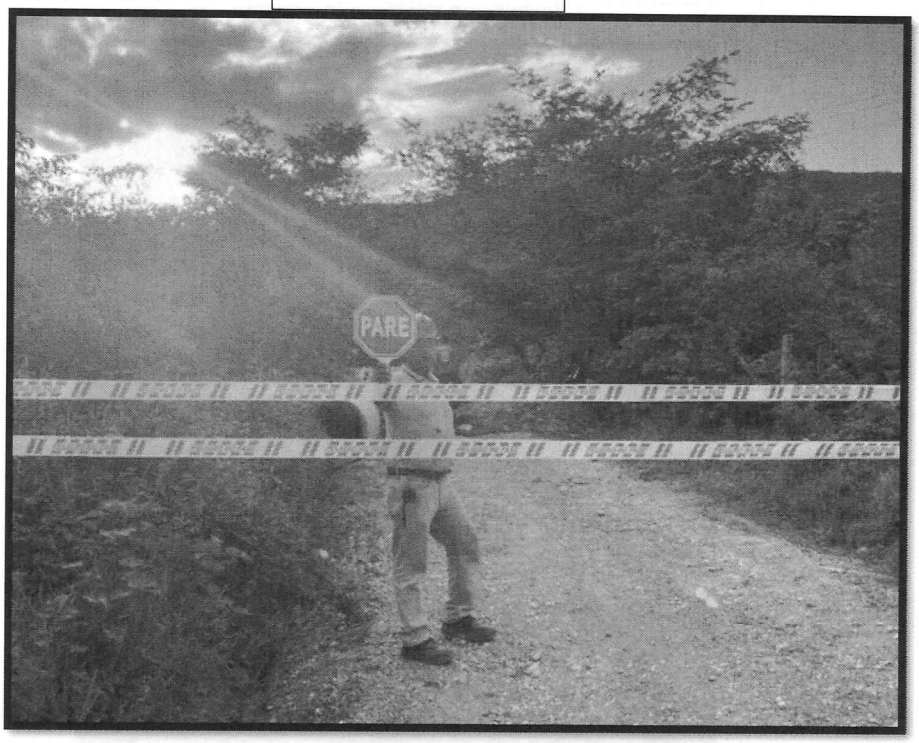

Implementacion PMT

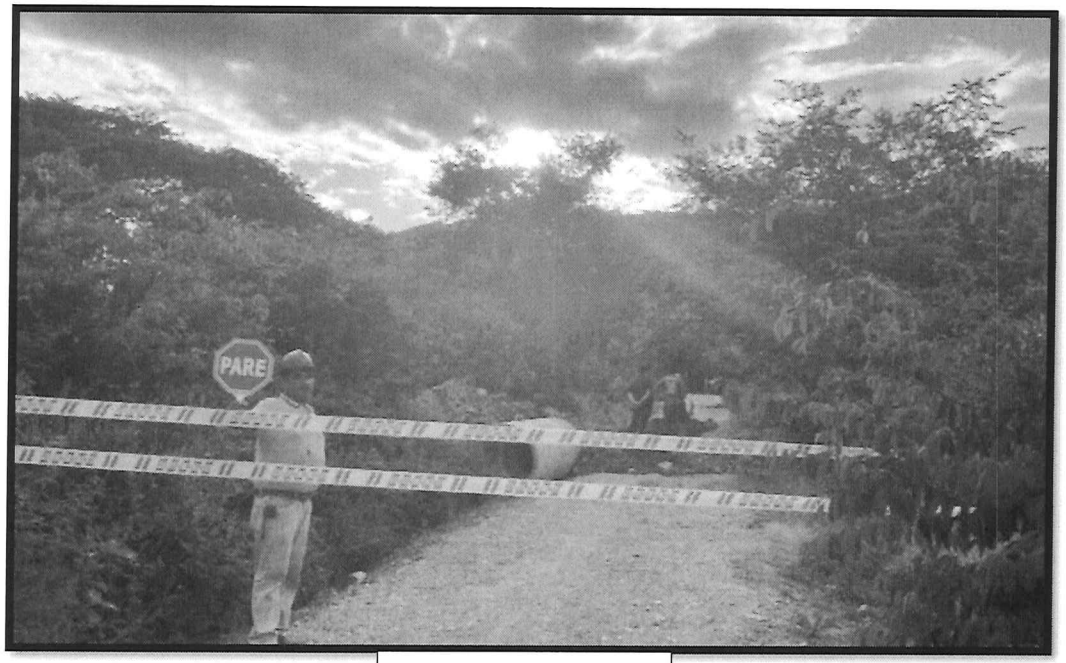

Implementacion PMT



Excavacion en roca

BITACORA DE OBRA	
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
FECHA	24 de diciembre de 2024
CLIMA	Lluvia
PERSONAL	Ingeniero residente, personal obra civil, operador maquinaria
EQUIPOS	Mezcladora, retroexcavadora, apisonador, vibrador de concreto, herramienta menor
ACTIVIDADES	
	En la vereda San martin y San Marcos se procede a realizar las excavaciones mecanicas, par luego realizar la instalacion de la tuberia y posterior instalacion de material seleccionado, lo anterior para poder disminuir la afectacion en la via publica
OBSERVACIONES	
	La supervision solicita al contratista realice el remplazo de material seleccionado debido a saturacion del mismo, lo anterior para garantizar la calidad de los rellenos.
	Debido al transporte de la tuberia de 36" se evidencio la fractura de algunos tubos, por ende, la supervision solicita el cambio de los mismos.
	El contratista implementa el PMT para el cierre vial para la posterior instalacion de la tuberia.

CONTRATISTA



BITACORA DE OBRA	
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
FECHA	25 de diciembre de 2024
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Ingeniero residente, personal obra civil, operador maquinaria
EQUIPOS	Mezcladora, retroexcavadora, apisonador, vibrador de concreto, herramienta menor
ACTIVIDADES	
	Se realiza la fundicion de los cabezotes y albercas de la alcantarilla de la vereda San Marcos
OBSERVACIONES	
	Se evidencia la existencia de zona rocosa en la parte inferior de la alcantarilla, situacion no prevista, por ende, el contratista procede a realizar el retiro de la misma.

CONTRATISTA



BITACORA DE OBRA	
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
FECHA	26 de diciembre de 2024
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Ingeniero residente, personal obra civil, operador maquinaria
EQUIPOS	Mezcladora, retroexcavadora, apisonador, vibrador de concreto, herramienta menor
ACTIVIDADES	
	Se realiza la fundicion de los cabezotes y albercas de la alcantarilla de la vereda San Matias; se realiza la entrega del suministro de tuberia de 24" en las instalaciones de la alcaldia de paicol
OBSERVACIONES	

CONTRATISTA



BITACORA DE OBRA	
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
FECHA	27 de diciembre de 2024
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Ingeniero residente, personal obra civil, operador maquinaria
EQUIPOS	Mezcladora, retroexcavadora, apisonador, vibrador de concreto, herramienta menor
ACTIVIDADES	
	Se realiza retiro de formaleta de cabezotes y organización final de cada uno para entrega, ademas se realiza la aplicación de anti-sol
OBSERVACIONES	
	se verifica la cantidad de tuberia suministrada por el contratista y el recibimiento a satisfaccion de la misma.

CONTRATISTA



ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS
Y SERVICIOS INTEGRALES

Paicol, 27 de diciembre de 2024

Señores

Ing Miguel Alberto Duran
Supervisor
Paicol - Huila

Referencia: Contrato de obra No. 198 de 2024 cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES**

Asunto: Entrega de esquema de planos record.

Cordial Saludo,


Por medio de la presente se realiza la entrega de los esquemas de los planos record que guiaron la construcción de las alcantarillas de la vereda San Marcos y San Matías en la zona veredal del municipio, lo anterior en cumplimiento de los compromisos adquiridos en contrato cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES.**

Cordialmente,


CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
RI Ingeniería, Consultoría, Suministros y Servicios Integrales S.A.S.
Contratista

Calle 57ª No. 18C-45
B. Villa Carolina / Neiva – Huila
Tel: 862 2833 / Cel. 318 860 3540
e-mail: icssi@hotmail.com

ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS
Y SERVICIOS INTEGRALES

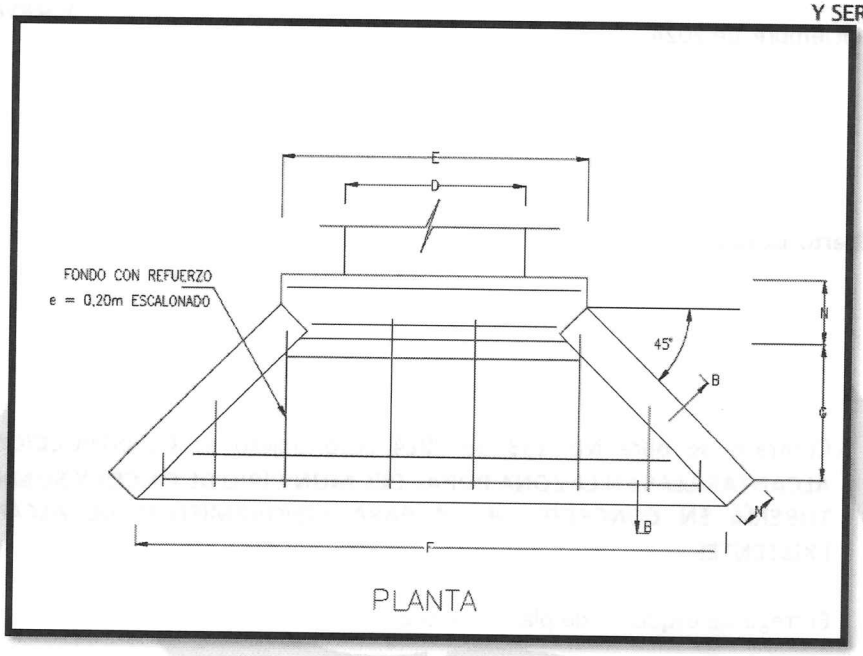

PLANTA

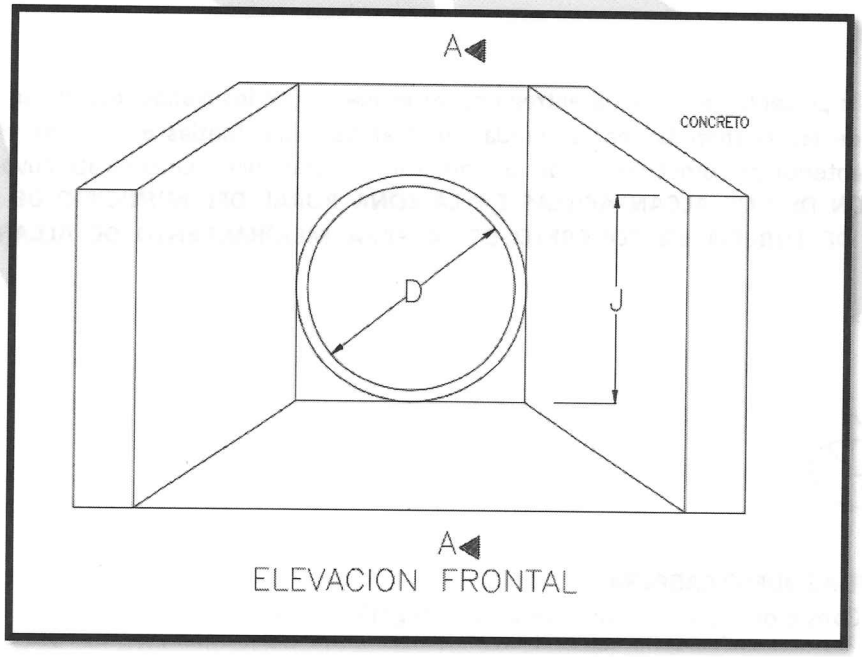

ELEVACION FRONTAL

Calle 57ª No. 18C-45
B. Villa Carolina / Neiva – Huila
Tel: 862 2833 / Cel. 318 860 3540
e-mail: icssi@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900819482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1123376442	9478892843	E	2024/12/19	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$2,544,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (20 Afiliados)						$8,843,336	$1,415,200			$8,973,336	$359,200			$8,973,336	$359,200			$8,973,336	$411,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (16 Afiliados)						$5,513,336	$882,400			$5,643,336	$226,000			$5,643,336	$226,000			$5,643,336	$393,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (16 Afiliados)						$5,513,336	$882,400			$5,643,336	$226,000			$5,643,336	$226,000			$5,643,336	$393,500		$0	$0
1	CC	1075265062	AGUDELO CARLOS	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
2	CC	84062048	CALDERON EDGAR	230301	3	$130,000	$20,800	EPSIC4	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
3	CC	1010071930	CERA LUIS	230301	3	$130,000	$20,800	EPSIC4	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC	73316519	DE ANGEL GLOSMAN	231001	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
5	CC	72148739	ECHEVERRIA JUAN		0	$0	$0	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
6	CC	1075264688	GALINDO YEISON	230301	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
7	CC	73377144	GALVAN LUIS	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
8	CC	15206402	GUETTE JIMY	230301	2	$86,667	$13,900	EPSIC4	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
9	CC	7731160	GUEVARA HUGO	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	PT	6809181	MARTINEZ EURO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
11	PT	6813125	MENDOZA ALEXANDER	230301	3	$130,000	$20,800	CCFC33	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
12	CC	92522346	MONTALVO SAMIT	230301	2	$86,667	$13,900	EPSIC4	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
13	CC	1124004751	MORELO LUIS	230201	2	$86,667	$13,900	EPSIC1	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
14	CC	1075274122	ORDOÑEZ OLIVERIO	230201	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
15	CC	1075265032	PEREZ SERGIO	230301	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF32	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
16	PT	5208218	SANCHEZ RICHARD	230301	3	$130,000	$20,800	CCFC55	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						$3,330,000	$532,800			$3,330,000	$133,200			$3,330,000	$133,200			$3,330,000	$17,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)						$3,330,000	$532,800			$3,330,000	$133,200			$3,330,000	$133,200			$3,330,000	$17,500		$0	$0
17	CC	36304693	GUEVARA LUZ	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$700	3	$0	$0
18	CC	1075311710	GUEVARA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	1127074384	PARRA JUAN	230301	12	$600,000	$96,000	EPS037	12	$600,000	$24,000	CCF32	12	$600,000	$24,000	14-11	12	$600,000	$3,200	12	$0	$0
20	CC	12132028	TRUJILLO MILTON	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$8,843,336	$1,415,200			$8,973,336	$359,200			$8,973,336	$359,200			$8,973,336	$411,000		$0	$0

2024/12/13 11:29 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900819482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1123376442	9478892843	E	2024/12/19	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$2,544,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$1,415,200	$0	$0	$1,415,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$228,800	$0	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$863,100	$0	$0	$863,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$323,300	$0	$0	$323,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$411,000	$0	$0	$411,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$411,000	$0	$0	$411,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$359,200	$0	$0	$359,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	$359,200	$0	$0	$359,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$359,200	$0	$0	$359,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	4	$17,400	$0	$0	$17,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$5,200	$0	$0	$5,200
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$3,500	$0	$0	$3,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$5,200	$0	$0	$5,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$13,900	$0	$0	$13,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$117,200	$0	$0	$117,200
TOTAL				20	$2,544,600	$0	$0	$2,544,600

2024/12/13 11:29 AM

EDINSON SUAZA HENDEZ
Contador Público Universidad CUN
T.P. 174246 -T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

QUE:

La empresa **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - ICSSI S.A.S.,** identificado con NIT. **900.819.482-88**, da dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar y está exonerado del pago de los aportes parafiscales (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de acuerdo a lo reglamentado por la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024

ÉDINSON SUAZA HENDEZ
C.C. 1.075.251.099 de Neiva Huila
T.P. 174246-T
Revisor fiscal

Carrera 12 No 14 – 44
Cel. 3204231582

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.251.099

SUAZA HENDEZ

APELLIDOS

EDWSON

NOMBRES

EDWSON GOMEZ H

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1991

ALGECIRAS

(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAR-2009 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1900100-00157649-M-1075251099-20090527 0011822466A 1 30971852

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174246-T



EDINSON
SUAZA HENAO
C.C. 1075251005
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD CUC

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185087

FIRMA DEL TITULAR

102469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 5 2 0 5 A 0 F 2 0 E 0 7 F 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON SUAZA HENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251099 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 174246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES

Neiva, 30 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección Territorial HUILA
dthuila@mintrabajo.gov.co

Ref.: Solicitud Paz y Salvo del "CONTRATO DE OBRA No. 198 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTE".

Respetados señores:

En calidad de representante legal de la empresa **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.**, solicito amablemente el certificado de PAZ Y SALVO por todo concepto con destino al **MUNICIPIO DE PAICOL,** con el objeto de la terminación del contrato de obra No 198 de 2024, cuyo objeto es, **"CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 24 PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTE"**, el mencionado contrato tuvo fecha de inicio el día 24 de diciembre de 2024 y fecha de terminación es del 30 de diciembre de 2024.

En virtud a lo anterior anexo los siguientes documentos:

- Certificado de existencia y representación legal
- Registro Único Tributario
- Carta de aceptación de la oferta
- Acta de inicio
- Acta de terminación

Agradezco su amable atención a la presente.

Atentamente,

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
Representante Legal ICSSI S.A.S.
NIT. 900.819.482-8

Calle 24 No. 3 A - 12
B/Los Samanes / Neiva – Huila
Tel: 8646779 / Cel. 318 860 3540
e-mail: icssi@hotmail.com

De: ICSSI Sas
Para: dthuila@mintrabajo.gov.co
Cc: Licitaciones Icssi
hoy, 12:32 p.m.

Solicitud de Certificado de Paz y Salvo - Dirección territorial Huila

Cordial saludo,

Señor
Dr. Camilo Chicue Collazos
MINISTERIO DE TRABAJO
Direccion Territorial Huila

Por medio del presente solicito amable y respetuosamente al Ministerio, analizar, revisar y certificar que nos encontramos a Paz y Salvo respecto al contrato en cuestión, con el fin de liquidar el contrato No. 198 entre ICSSI S.A.S. y el Municipio de Paicol.

Agradeciendo su amable gestión.

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
Rep. legal ICSSI S.A.S.

Neiva, 30 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección Territorial HUILA
dthuila@mintrabajo.gov.co

ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

HUILA, NEIVA, 18/12/2024

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS** con **NIT 9008194828** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900571846

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128173769

(415)7707212489984(8020) 000014112817376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 4 8 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ICSSI SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Paicol 5 1 8

41. Dirección principal
CR 6 5 19

42. Correo electrónico icssi@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 3 4 2 1 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 1 5 0 2 1 2	4 2 9 0	2 0 1 5 0 2 1 2	4 6 6 3	4 7 5 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 24 / 10 : 27: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO CABRERA CARLOS FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128173769

(415)7707212489984(8020) 000014112817376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 4 8 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 6 5 2 5 9	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 1 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128173769

(415)7707212489984(8020) **000014112817376 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 4 8 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 1 0 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 6 5 0 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AGUDELO	CABRERA	CARLOS	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 1 0 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 3 1 1 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	CABRERA	HUGO	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128173769

(415)7707212489984(8020) 000014112817376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 4 8 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 5 1 0 9 9		1 7 4 2 4 6

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAZA	HENDEZ	EDINSON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.265.062

AGUDELO CABRERA

APELLIDOS

CARLOS FELIPE

NOMBRES

Carlos F. Agudelo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1992

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-SEP-2010 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1900100-00259390-M-1075265062-20101008 0024311655A 1 34816384
