Acta de reunión de seguimiento inicial – Contrato 236-2024

IPSE-20241560004446
20241560004446

REUNIÓN No.	01	FECHA	1 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:00 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m.

LUGAR: Reunión presencial instalaciones del IPSE.

ASISTENTES

PROINSO S.F. S.A.S (CONTRATISTA)	**IPSE**
Harold Ayala	**Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez** *Supervisor del contrato 236-2024* *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
Diana Herrera	
Mauricio Henríquez	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
Nydia Cristina Durante	
	Ing. Laura Marcela Garcés Delgado *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Profesional Especializado.*
	Ing. Valentina Muñoz Críales *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista*

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Seguimiento inicial del contrato.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Primera reunión de seguimiento del contrato 236-2024, suscrito entre el IPSE y PROINSO S.F S.A.S., cuyo objeto es **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO",** el objetivo de la reunión se enfocó en dar a conocer cada una de las obligaciones generales y especificas del contrato en mención y establecer a su vez, los parámetros para el cabal cumplimiento de cada una de las actividades.

2. Seguimiento inicial del contrato.

Inicialmente se llevó a cabo la presentación de los asistentes de la reunión por parte de PROINSO S.F. S.A.S. e IPSE.

Una vez realizado lo anterior, por parte del ingeniero Oscar Arbeláez, se llevó a cabo la lectura del objeto del contrato 236-2024 y de cada una de las obligaciones generales y especificas del mismo,


Acta de reunión de seguimiento inicial – Contrato 236-2024

IPSE-20241560004446
20241560004446

REUNIÓN No.	01	FECHA	1 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:00 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m.


con la finalidad establecer los parámetros para el cabal cumplimiento de estas, así como resolver dudas e inquietudes presentadas por parte del personal de PROINSO S.F. S.A.S.

Así mismo, por parte de la ingeniera Nydia Durante se llevó a cabo la presentación de un cronograma inicial para la ejecución del contrato, el cual fue revisado entre la supervisión del IPSE y el personal de PROINSO S.F. S.A.S.

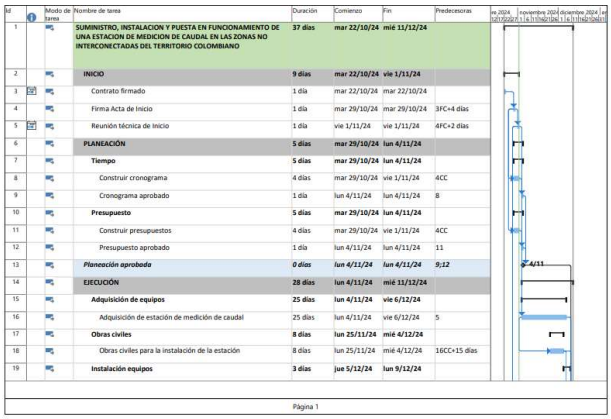

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACION DE MEDICION DE CAUDAL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO**	**37 días**	**mar 22/10/24**	**mié 11/12/24**	
2		**INICIO**	**9 días**	**mar 22/10/24**	**vie 1/11/24**	
3		Contrato firmado	1 día	mar 22/10/24	mar 22/10/24	
4		Firma Acta de Inicio	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	3FC+4 días
5		Reunión técnica de Inicio	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	4FC+2 días
6		**PLANEACIÓN**	**5 días**	**mar 29/10/24**	**lun 4/11/24**	
7		**Tiempo**	**5 días**	**mar 29/10/24**	**lun 4/11/24**	
8		Construir cronograma	4 días	mar 29/10/24	vie 1/11/24	4CC
9		Cronograma aprobado	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	8
10		**Presupuesto**	**5 días**	**mar 29/10/24**	**lun 4/11/24**	
11		Construir presupuestos	4 días	mar 29/10/24	vie 1/11/24	4CC
12		Presupuesto aprobado	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	11
13		***Planeación aprobada***	***0 días***	***lun 4/11/24***	***lun 4/11/24***	***9;12***
14		**EJECUCIÓN**	**28 días**	**lun 4/11/24**	**mié 11/12/24**	
15		**Adquisición de equipos**	**25 días**	**lun 4/11/24**	**vie 6/12/24**	
16		Adquisición de estación de medición de caudal	25 días	lun 4/11/24	vie 6/12/24	5
17		**Obras civiles**	**8 días**	**lun 25/11/24**	**mié 4/12/24**	
18		Obras civiles para la instalación de la estación	8 días	lun 25/11/24	mié 4/12/24	16CC+15 días
19		**Instalación equipos**	**3 días**	**jue 5/12/24**	**lun 9/12/24**	

Página 1

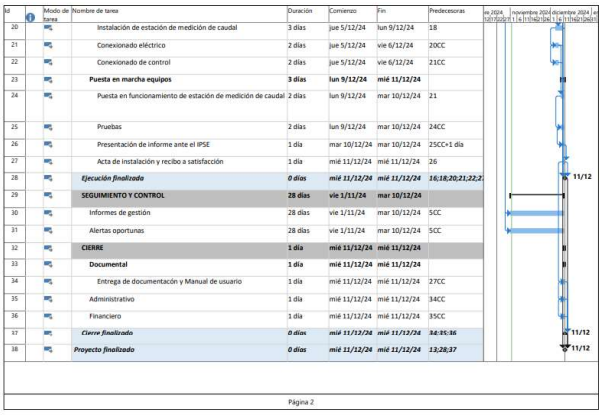

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
20		Instalación de estación de medición de caudal	3 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	18
21		Conexionado eléctrico	2 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24	20CC
22		Conexionado de control	2 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24	21CC
23		**Puesta en marcha equipos**	**3 días**	**lun 9/12/24**	**mié 11/12/24**	
24		Puesta en funcionamiento de estación de medición de caudal	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24	21
25		Pruebas	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24	24CC
26		Presentación de informe ante el IPSE	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24	25CC+1 día
27		Acta de instalación y recibo a satisfacción	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	26
28		***Ejecución finalizada***	***0 días***	***mié 11/12/24***	***mié 11/12/24***	***16;18;20;21;22;2***
29		**SEGUIMIENTO Y CONTROL**	**28 días**	**vie 1/11/24**	**mar 10/12/24**	
30		Informes de gestión	28 días	vie 1/11/24	mar 10/12/24	5CC
31		Alertas oportunas	28 días	vie 1/11/24	mar 10/12/24	5CC
32		**CIERRE**	**1 día**	**mié 11/12/24**	**mié 11/12/24**	
33		**Documental**	**1 día**	**mié 11/12/24**	**mié 11/12/24**	
34		Entrega de documentacón y Manual de usuario	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	27CC
35		Administrativo	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	34CC
36		Financiero	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	35CC
37		***Cierre finalizado***	***0 días***	***mié 11/12/24***	***mié 11/12/24***	***34;35;36***
38		***Proyecto finalizado***	***0 días***	***mié 11/12/24***	***mié 11/12/24***	***13;28;37***

Página 2

En concordancia con lo anterior, la ingeniera Valentina Muñoz dio una serie de pautas y recomendaciones respecto a la etapa de instalación de la estación, la cual se encuentra contemplada dentro del cronograma, con la finalidad de que el contratista las tuviera en cuenta para organizar la logística y transporte tanto de los equipos como del personal a la zona del proyecto y evitar algún tipo de imprevisto, ya que no se va a llevar a cabo una visita previa por parte de PROINSO S.F. S.A.S.

Así mismo, se recalcó la necesidad de iniciar procesos de adquisición de equipos, los cuales cumplan con las características mínimas establecidas en el Anexo Técnico del contrato con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma y en el Plazo de Ejecución del contrato, para

IPSE - Sede Principal:
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54, Torre 3, Piso 14, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 639 7888 – Correo Electrónico: ipse@ipse.gov.co
IPSE - Sede Centro Nacional de Monitoreo:
Dirección: Carrera 12 No. 84 – 12, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 610 1130 – Correo Electrónico: cnm@ipse.gov.co

Acta de reunión de seguimiento inicial – Contrato 236-2024

IPSE-20241560004446
20241560004446

REUNIÓN No.	01	FECHA	1 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:00 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m.

lo cual por parte de PROINSO S.F. S.A.S, se informó que a la fecha se encuentran realizando cotizaciones para la adquisición y cumplimiento de lo anterior.

Finalmente, se estableció entre las partes organizar una reunión de seguimiento del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y el componente Ambiental para el cumplimiento de estos y se resolvieron dudas e inquietudes que hayan surgido.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Envió cronograma de trabajo contrato 236-2024.	PROINSO S.F. S.A.S.	1 noviembre 2024
Reunión componente SST y Ambiental	IPSE	Noviembre

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

PROINSO S.F. S.A.S. (CONTRATISTA)

Mauricio Henriquez
Firmado digitalmente por Mauricio Henriquez
Fecha: 2024.11.14 12:03:04 -05'00'

Mauricio Henríquez

Nydia Durante Pretelt
Firmado digitalmente por Nydia Durante Pretelt
Fecha: 2024.11.13 13:41:43 -05'00'

Nydia Cristina Durante

IPSE

Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez
Supervisor del contrato 236-2024
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Valentina Muñoz Criales
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista

Expediente No: 2024139120310236E
