INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 28 de octubre de 2024 Al: 3 de noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PLATO SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	37,53%	84,67%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	75.895.322,49	171.224.539,16

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ING SAMAR 2024
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 202.225.746
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA SAS BIC
Contrato No.	DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.824.284
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA

CONSORCIO ING SAMAR 2024

IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Se realiza instalación de pisatecho y manto asfáltico
2. Se realiza aplicación de anticorrosivo y esmalte de toda la estructura de cubierta.
3. Se realiza instalación de red eléctrica
4. Se realiza Instalación de enchape de muro
5. Se realiza Instalación de cielo raso
6. Se realiza instalación de tablero eléctrico

IMAGENES AVANCE



1. Se realiza instalación de pisatecho y manto asfáltico



2. Se realiza aplicación de anticorrosivo y esmalte de toda la estructura de cubierta.




3. Se realiza instalación de red eléctrica



4. Se realiza Instalación de enchape de muro



5. Se realiza Instalación de cielo raso

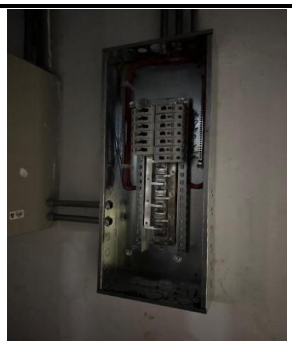

6. Se realiza instalación de tablero eléctrico

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma_____ Nombre : JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ Matrícula No.: 121037-0615932 NTS
