- Continuación
  Cuenta Final

MEMORIAS DE ACTA FINAL

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA FINAL


DEPARTAMENT	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
1,01	TRAMO 1			25,00	3,50	87,50	1,00	87,50
	TRAMO 2			25,00	3,50	87,50	1,00	87,50
TOTAL ÍTEM								175,00
ACUMULADO ANTERIOR								0,00
PRESENTE ACTA								175,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	FECHA 8/11/2024





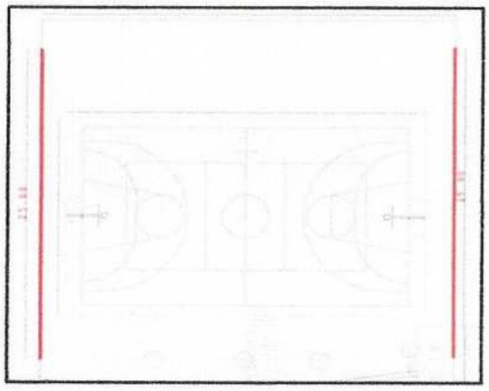

CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES		SUBCAPITULO		
ITEM	1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
1,02		BAÑO HOMBRE						6,00	6,00
		BAÑO MUJER						6,00	6,00
TOTAL ÍTEM									12,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									12,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR	FECHA 8/11/2024

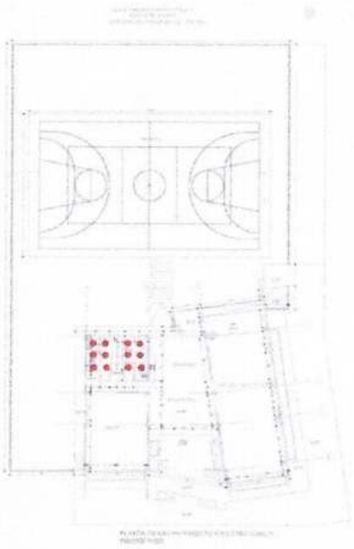



CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPITULO			
ITEM	2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,01										
		TRAMO 1				25,15	0,80	20,12	1,00	20,12
		TRAMO 2				30,00	0,40	12,00	1,00	12,00
		TRAMO 3				48,66	0,40	19,46	1,00	19,46
TOTAL ÍTEM										51,58
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										51,58

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	FECHA 8/11/2024

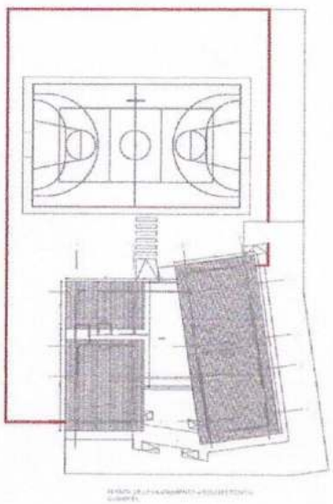





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPITULO			
ITEM	2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE		UNIDAD	M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,02		TRAMO 1			4,12			1,00	4,12
		TRAMO 2			24,85			1,00	24,85
		TRAMO 3			30,00			1,00	30,00
		TRAMO 4			48,66			1,00	48,66
		TRAMO 5			7,00			1,00	7,00
TOTAL ÍTEM									114,63
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									114,63

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE	FECHA 8/11/2024

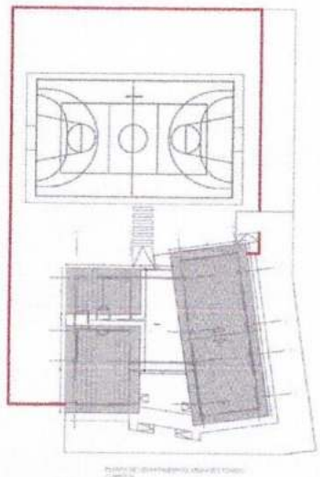



CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,03		FACHADA LATERAL IZQUIERDA					64,88	1,00	64,88
		FACHADA FRONTAL					64,13	1,00	64,13
		FACHADA LATERAL DERECHA					71,00	1,00	71,00
		MUROS SOBRE PLACA					25,81	1,00	25,81
							16,20	1,00	16,20
							7,28	1,00	7,28
							10,50	1,00	10,50
							20,00	1,00	20,00
							24,00	1,00	24,00
		FACHADA POSTERIOR					51,00	1,00	51,00
		MURO CERRAMIENTO							
		CARA INTERIOR							
		CARA SUPERIOR			114,67		1,05	1,00	120,40
		CARA EXTERIOR							
TOTAL ÍTEM									475,20
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									475,20

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	2,03 PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	FECHA 8/11/2024



CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPÍTULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPÍTULO	
ÍTEM	2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	UNIDAD 2,04

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,04	SALON 1				8,66	3,00	25,98	1,00	25,98
					6,73	3,00	20,18	1,00	20,18
					7,06	3,00	21,18	1,00	21,18
					1,20	3,00	3,60	1,00	3,60
	RECEPCION				8,27	3,00	24,81	1,00	24,81
					8,58	3,00	25,74	1,00	25,74
	COMEDOR				9,60	3,00	28,80	1,00	28,80
	SALON MULTIPLE				18,50	3,00	55,50	1,00	55,50
					18,27	3,00	54,81	1,00	54,81
					6,71	3,00	20,13	1,00	20,13
					14,46	3,00	43,38	1,00	43,38
					5,04	3,00	15,13	1,00	15,13
	BAÑO MUJER				16,14	2,00	32,28	1,00	32,28
	ALMACEN 2				4,92	3,00	14,76	1,00	14,76
	BAÑO HOMBRE				13,74	2,00	27,48	1,00	27,48
	ALMACEN 1				6,98	3,00	20,94	1,00	20,94
TOTAL ÍTEM									434,70
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									434,70

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	FECHA 8/11/2024

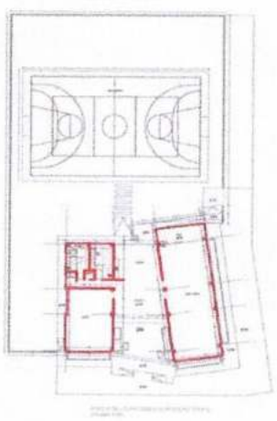





CONTRATISTA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -	NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA		FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES	SUBCAPITULO			
ITEM	2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,05		SALON 1			3,00	2,48	7,44	3,00	22,32
		SALON MULTIPLE			2,00	2,48	4,96	1,00	4,96
					3,00	2,48	7,44	2,00	14,88
					1,50	2,48	3,72	2,00	7,44
		RECEPCION			7,46	2,96	22,08	1,00	22,08
		COMEDOR			5,85	2,96	17,32	1,00	17,32
		ALMACEN 1			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
		BAÑO HOMBRE			1,50	0,60	0,90	2,00	1,80
		BAÑO MUJER			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL ÍTEM									92,60
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									92,60

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES	FECHA 8/11/2024

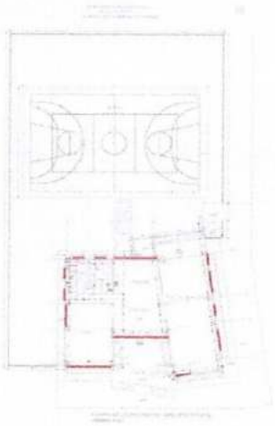





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPITULO			
ITEM	2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,06	PLACA CANCHA				16,00	26,00	416,00	1,00	416,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA	SUBCAPITULO			
ITEM	2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL		UNIDAD	M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
2,07		DEMARCACION DE LINEAS				328,56		0,00	1,00	328,56

1410

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	EQUIPAMIENTOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)		UNIDAD	M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
3,01		TRAMO 1				25,00			1,00	25,00
		TRAMO 2				25,00			1,00	25,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	EQUIPAMIENTOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,02	S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
3,02	VIDRIO							1,00	1,00
									0,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,01		MANTENIMIENTO VENTILADOR							13,00	13,00
										0,00


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE		UNIDAD	M2

# ÍTEM:	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,02		TRAMO 1				7,46	1,55	11,56	1,00	11,56
		TRAMO 2				5,00	3,10	15,50	1,00	15,50
		TRAMO 3				9,78	3,10	30,32	1,00	30,32
		TRAMO 4				30,00	1,55	46,50	1,00	46,50
		TRAMO 5				10,00	1,55	15,50	1,00	15,50
		TRAMO 6				28,52	1,55	44,21	1,00	44,21
		TRAMO 7				8,05	1,55	12,48	1,00	12,48
TOTAL ÍTEM										176,06
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										176,06

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,02	NIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y E	FECHA 8/11/2024

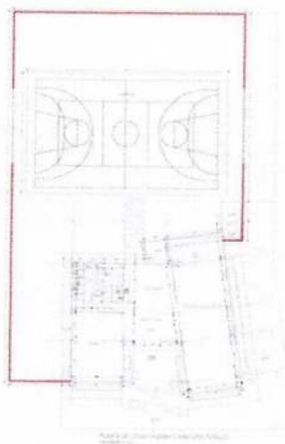







CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO		
ITEM	4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,03		SALON 1 - VENTANA			3,00	2,48	7,44	3,00	22,32
		PERSIANA			3,00	0,60	1,80	2,00	3,60
		SALON MULTIPLE - VENTANA			2,00	2,48	4,96	1,00	4,96
		VENTANA			3,00	2,48	7,44	2,00	14,88
		VENTANA			1,50	2,48	3,72	2,00	7,44
		PERSIANA			2,00	0,60	1,20	6,00	7,20
		RECEPCION - VENTANA			7,46	2,96	22,08	1,00	22,08
		COMEDOR - VENTANA			5,85	2,96	17,32	1,00	17,32
		ALMACEN 1 - VENTANA			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
		BAÑO HOMBRE - VENTANA			1,50	0,60	0,90	2,00	1,80
		PERSIANA			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
		BAÑO MUJER - VENTANA			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
		PERSIANA			1,50	0,60	0,90	1,00	0,90
TOTAL ÍTEM									105,20
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									105,20

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	FECHA 8/11/2024







CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

7416

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,04		SALON 1			1,20	2,10	2,52	1,00	2,52
		SALON MULTIPLE			1,20	2,10	2,52	2,00	5,04
					1,10	2,10	2,31	1,00	2,31
		RECEPCION			2,00	2,40	4,80	1,00	4,80
		COMEDOR			1,46	2,40	3,50	1,00	3,50
		BAÑO HOMBRE			0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
		BAÑO MUJER			0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
		ALMACEN 1			0,90	2,10	1,89	1,00	1,89
		ALMACEN 2			0,66	2,10	1,39	1,00	1,39
				TOTAL ÍTEM					25,23
				ACUMULADO ANTERIOR					0,00
				PRESENTE ACTA					25,23

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO	FECHA 8/11/2024







CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

7417

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,05	REPARACIÓN DE PORTERÍAS, INCLUYE TUBERÍA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,05										
		PORTERIA 1							1,00	1,00
		PORTERIA 2							1,00	1,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,06	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA		UNIDAD	M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,06									
		BARANDA			12,30			1,00	12,30

7419

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,07									
		SANITARIO WC HOMBRES						2,00	2,00
		SANITARIO WC DAMAS						3,00	3,00

1420

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,08										
		SANITARIO WC HOMBRES							3,00	3,00
		SANITARIO WC DAMAS							3,00	3,00

1421

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,09	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA		UNIDAD	UND.

# ITEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,09										
		LAVAPLATOS							1,00	1,00

1422

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,10										
		ORINAL							1,00	1,00
TOTAL ÍTEM										1,00
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										1,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FECHA 8/11/2024



CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE		UNIDAD	UND.

# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,11									
		SILLAS						13,00	13,00
TOTAL ÍTEM									13,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									13,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	FECHA 8/11/2024







CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	MANTENIMIENTO	SUBCAPITULO			
ITEM	4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
4,12									
		MESAS						14,00	14,00
TOTAL ÍTEM									14,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									14,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	FECHA 8/11/2024

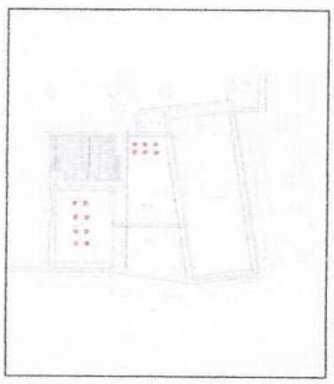









CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

1425


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,01	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
5,01									
	S/I VENTILADORES							3,00	3,00
TOTAL ÍTEM									3,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									3,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
5,01	R DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUN	FECHA 8/11/2024

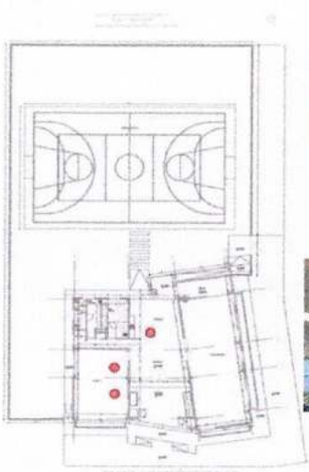







CONTRATISTA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -	NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA		FIRMA	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

1420

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
5,02									
	PANEL LED WC HOMBRES							6,00	6,00
	PANEL LED WC MUJERES							6,00	6,00

TOTAL ÍTEM	12,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	12,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA	FECHA 8/11/2024

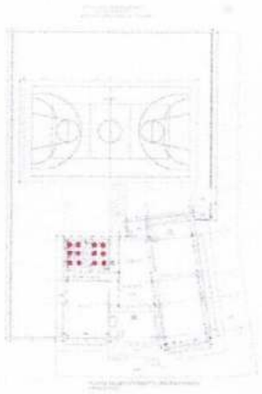





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SUBCAPITULO		
ITEM	6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
6,01										
		ASCIENTO PARA SANITARIOS							5,00	5,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SUBCAPITULO			
ITEM	6,02	S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA		UNIDAD	UNO.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
6,02										
		S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA							4,00	4,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SUBCAPITULO		
ITEM	6,03	S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
6,03									
		S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS						2,00	2,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	URBANISMO Y PAISAJISMO		SUBCAPITULO		
ITEM	7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
7,01									
		PATIO					590,00	1,00	590,00
		JARDINERAS Y EXTERIOR					4,80	1,00	4,80
							1,26	1,00	1,26
							2,48	1,00	2,48
							4,80	1,00	4,80
							11,90	1,00	11,90
							37,18	1,00	37,18

TOTAL ÍTEM	652,42
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	652,42

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	FECHA 8/11/2024













CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	URBANISMO Y PAISAJISMO	SUBCAPITULO			
ITEM	7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES		UNIDAD	M3

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m):	A (m2)		
7,02										
		ALREDEDOR DE LA CANCHA					0,06	340,00	1,00	20,40
		PARQUE					0,06	101,50	1,00	6,09
		JARDINERAS					0,06	4,80	1,00	0,29
							0,06	1,26	1,00	0,08
							0,06	2,48	1,00	0,15
							0,06	4,80	1,00	0,29
							0,06	11,90	1,00	0,71
TOTAL ÍTEM										28,00
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										28,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES	FECHA 8/11/2024

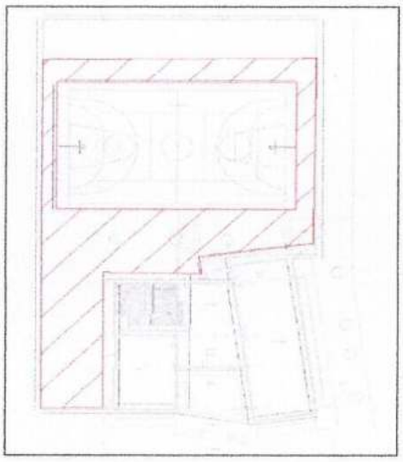





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	URBANISMO Y PAISAJISMO	SUBCAPITULO			
ITEM	7,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
7,03									
		SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES						6,00	6,00
TOTAL ÍTEM									6,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									6,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7,03	ADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁ	FECHA 8/11/2024





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	URBANISMO Y PAISAJISMO	SUBCAPITULO		
ITEM	7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
	TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
7,04									
	SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES							4,00	4,00
TOTAL ÍTEM									4,00
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									4,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
7,04	FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁN	FECHA 8/11/2024





CONTRATISTA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -	NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA		FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMEN	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	URBANISMO Y PAISAJISMO	SUBCAPITULO			
ITEM	7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)		UNIDAD	UND.

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
7,05										
		SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES								0,00
		CROTOS X35							2,00	2,00
		CROTO TORNILLO							1,00	1,00
		VERANERAS							6,00	6,00
		CANCION DE LA INDIA							2,00	2,00
		LAUREL							1,00	1,00
		SHEFLERA							2,00	2,00
										0,00
										0,00
		MATERA #3 RESINA							1,00	1,00
		ALOCACIA CORAZON							1,00	1,00
		VERANERO FINO							5,00	5,00
		FIAR X35							1,00	1,00
		DIANELA							2,00	2,00
TOTAL ÍTEM										24,00
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										24,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	7,05 TRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO OR	FECHA 8/11/2024









CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPÍTULO	ITEM NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO		
ITEM	NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL. ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
NP-1		RECEPCION + COMEDOR	A1				64,10	1,00	64,10
		SALON 1	A2				58,00	1,00	58,00
		PASILLO + C. ASEO	A3				16,00	1,00	16,00
		SALON MULTIPLE	A4				126,00	1,00	126,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL ÍTEM									264,10
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									264,10

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	FECHA 8/11/2024

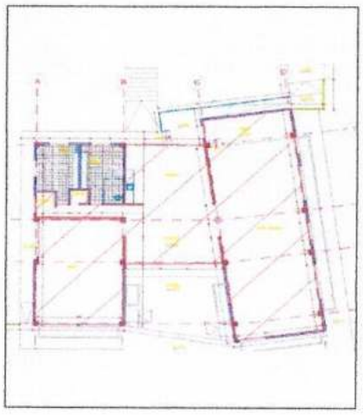





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

1436


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	8/11/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS		SUBCAPITULO		
ITEM	NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
NP-2		PLACA DE CUBIERTA					65,48	1,00	65,48
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL ÍTEM									65,48
ACUMULADO ANTERIOR									0,00
PRESENTE ACTA									65,48

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER	FECHA 8/11/2024

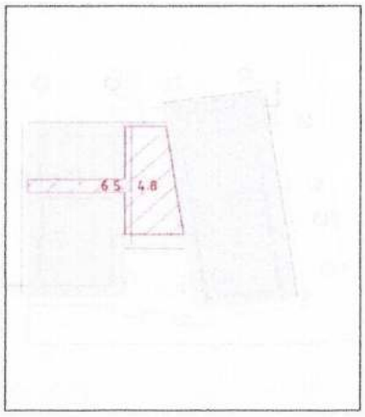

CONTRATISTA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -	NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA		FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	11/08/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS	SUBCAPITULO			
ITEM	NP-3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA		UNIDAD	M

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
NP-3		CERRAMIENTO	L1			2,40			1,00	2,40
			L2			2,50			1,00	2,50
			L3			4,80			1,00	4,80
			L4			3,70			1,00	3,70
			L5			30,00			1,00	30,00
			L6			5,00			1,00	5,00
			L7			17,00			1,00	17,00
			L8			7,00			1,00	7,00
TOTAL ÍTEM										72,40
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										72,40

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
NP-3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA	FECHA 11/08/2024

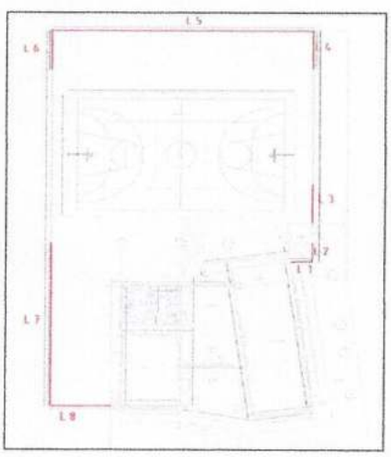





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA FINAL

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	11/08/2024
CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS		SUBCAPITULO		
ITEM	NP-4	LIMPIEZA Y/O RESTAURACION DE PISO EN GRANITO, INCLUYE APLICACIÓN DE EMULSION		UNIDAD	M2

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	VOL ACUMULADO
		TRAMO	DESCRIPCIÓN	ABSCISAS		LONGITUD (m)	H (m)	A (m2)		
NP-4		AREA DE PISO -ACCESO	A1					31,26	1,00	31,26
TOTAL ÍTEM										31,26
ACUMULADO ANTERIOR										0,00
PRESENTE ACTA										31,26

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA FINAL
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
NP-4	LIMPIEZA Y/O RESTAURACION DE PISO EN GRANITO, INCLUYE APLICACIÓN DE EMULSION	FECHA 11/08/2024

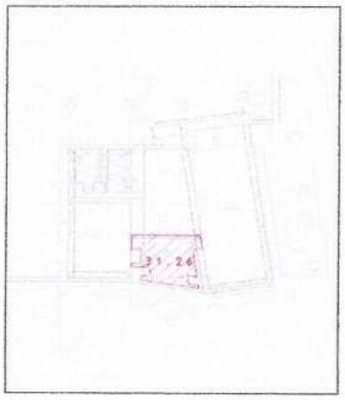





CONTRATISTA	
NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. -
FIRMA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE	IRIS M. SPATH CAMAÑO
FIRMA	

Espacio para Logo Corporativo

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES
NIT 901.613.617-3
CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO
Tel: (604) 3007310531
Montelíbano - Colombia
oficinaegv826@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. GEZ 10

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 7924545 - Ext. 000
Dirección	CL 27 CR3 ESQ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 15:37
Expedición	19/11/2024, 15:37
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	129,956,531.00
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	35,088,263.00
3	UTILIDAD 5%	1.00	6,497,827.00
4	PGIO	1.00	6,972,367.00

Total items: 4

Total Bruto	178,514,988.00
Total a Pagar	178,514,988.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho millones quinientos catorce mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 178,514,988.00

Observaciones:
ACTA FINAL CONTRATO No. SA-SIM-030-2024 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066114280 aprobado en 20240223 prefijo GEZ desde el número 4 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5405dd63812ecf16fe1a1e3e41c75a065bdc51fdc18856abfd90f2ab70c5e71166f92718d9750cf2173e99b92bbe1ea7

BITACORA

BITACORA DE OBRA

FECHA: 8/10/2024

HOJA: 1

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR	6,00	UND.

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficio Varios	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

Se inician las labores con el desmonte de malla eslabonada y estructura metálica.

Desmonte de luminarias

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7440

BITACORA DE OBRA	FECHA: 9/10/2024	HOJA: 2

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	23,50	M2
1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR	12,00	UND.

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficio Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA

FECHA: 10/10/2024

HOJA: 3

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	17,50	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1442

BITACORA DE OBRA

FECHA:	11/10/2024

HOJA:	4

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	35,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1443

BITACORA DE OBRA

FECHA: 12/10/2024

HOJA: 5

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna		
Lluvia Fuerte	X	

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	52,50	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 13/10/2024	HOJA: 6

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	70,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoria	N/A		13 DE OCTUBRE DE 2024 (INFORME SEMANAL N° 1)

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7445

BITACORA DE OBRA	FECHA: 14/10/2024	HOJA: 7

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	87,50	M2
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	25,79	M2
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE	38,21	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	26,30	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7446

BITACORA DE OBRA

FECHA:	15/10/2024
HOJA:	8

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	105,00	M2
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	51,58	M2
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE	76,42	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	52,60	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoria	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

4444

BITACORA DE OBRA	FECHA: 16/10/2024	HOJA: 9

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	122,50	M2
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE	114,63	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	78,90	M2
4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO	25,23	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7448

BITACORA DE OBRA

FECHA: 17/10/2024

HOJA: 10

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	140,00	M2
4	**MANTENIMIENTO**		
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	105,20	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

bhnl

BITACORA DE OBRA	FECHA: 18/10/2024	HOJA: 11

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	157,50	M2
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	23,47	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		08 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herraminetas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA

FECHA: 19/10/2024

HOJA: 12

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna		
Lluvia Fuerte	X	

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	175,00	M2
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)	11,25	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	46,95	M2
4,06	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA	12,30	M
4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	13,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Mejana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7451

BITACORA DE OBRA

FECHA: 20/10/2024

HOJA: 13

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Item	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)	22,50	M
3,02	S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M	1,00	UND
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	70,42	M2
4,05	REPARACIÓN DE PORTERÍAS, INCLUYE TUBERÍA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	2,00	UND
4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	14,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cleta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios .	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		20 DE OCTUBRE DE 2024 (INFORME SEMANAL N° 2)

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta

7452

BITACORA DE OBRA	FECHA: 21/10/2024	HOJA: 14

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)	36,25	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	96,83	M2
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	100,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMARO	

1453

BITACORA DE OBRA

FECHA: 22/10/2024

HOJA: 15

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
3	**EQUIPAMIENTOS**		
3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)	50,00	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	123,24	M2
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	200,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado B	Estado R	Estado M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1454

BITACORA DE OBRA	FECHA: 23/10/2024	HOJA: 16

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna		
Lluvia Fuerte	X	

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	149,65	M2
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	300,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 24/10/2024	HOJA: 17

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	88,16	M2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	69,77	M2
4	**MANTENIMIENTO**		
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	176,06	M2
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	400,00	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS . MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1954

BITACORA DE OBRA	FECHA: 7/11/2024	HOJA: 31

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	211,28	M2
NP-3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA	72,40	M

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		08 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7459

BITACORA DE OBRA

FECHA: 26/10/2024

HOJA: 19

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	264,48	M2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	209,31	M2
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES	46,30	M2
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
5,01	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	3,00	UND
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA	6,00	UND
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES	11,00	M3

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

6. DOCUMENTOS APROBADOS

		SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la ST MM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024

7. TEMAS

6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1460

BITACORA DE OBRA

FECHA:	27/10/2024

HOJA:	20

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	352,64	M2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	279,09	M2
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES	92,60	M2
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA	12,00	UND
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES	22,00	M3

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		27 DE OCTUBRE DE 2024 (INFORME SEMANAL N° 3)

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7461

BITACORA DE OBRA	FECHA: 28/10/2024	HOJA: 21

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	413,92	M2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	356,89	M2
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	83,20	M2
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	65,71	M
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES	28,00	M3

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 29/10/2024	HOJA: 22

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	475,20	M2
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	434,70	M2
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	166,40	M2
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	131,42	M

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 30/10/2024	HOJA: 23

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	249,60	M2
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	197,14	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,50	UND
4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

706

BITACORA DE OBRA

FECHA: 31/10/2024

HOJA: 24

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna		
Lluvia Fuerte	X	

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	332,80	M2
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	262,05	M
4	**MANTENIMIENTO**		
4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5,00	UND
4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6,00	UND
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	6,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoria	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDAOONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta

1465

BITACORA DE OBRA	FECHA: 1/11/2024	HOJA: 25

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
2	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	416,00	M2
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	328,56	M
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	4,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Pintura			
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 2/11/2024	HOJA: 26

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
4	**MANTENIMIENTO**		
4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)	6,50	UND
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS	2,50	UND
6,02	S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA	4,00	UND
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)	12,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

746

BITACORA DE OBRA

FECHA:	3/11/2024
HOJA:	27

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
4	**MANTENIMIENTO**		
4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)	13,00	UND
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS	5,00	UND
6,03	S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	2,00	UND
7	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)	24,00	UND

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		03 DE NOVIEMBRE DE 2024 (INFORME SEMANAL N° 4)

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

1468

BITACORA DE OBRA	FECHA: 4/11/2024	HOJA: 28

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado	X	
Llovizna		
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	52,82	M2
NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER	32,74	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		08 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		08 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS	OBSERVACIONES
6	Cerramiento	SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACION, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.
7	Equipos y herramientas	TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA
8	EPP Trabajadores.	SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

7469

BITACORA DE OBRA	FECHA: 5/11/2024	HOJA: 29

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	105,64	M2
NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER	65,48	M2

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		08 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

BITACORA DE OBRA	FECHA: 6/11/2024	HOJA: 30

1. DATOS GENERALES CONTRACTUALES

Contrato Obra No. SA-SIM-030-2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2. ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO		HORA
Soleado		
Llovizna	X	
Lluvia Fuerte		

CONTRATISTA: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA

3. ACTIVIDADES EJECUCIÓN

Ítem	Descripción	Porcentaje Acumulado avanzado a la fecha	Unidad
	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	158,46	M2
NP-3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA	36,20	M

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado		
	B	R	M
Cinta			
Conos			

5. PERSONAL Y MANO DE OBRA

Técnicos	Cant
Oficios Varios	7

	6. DOCUMENTOS APROBADOS	SI	NO	FECHA
1	PMT aprobado por la STMM		X	
2	Cronograma de obra aprobado	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
3	Planos aprobados	X		06 DE OCTUBRE DE 2024
4	Ultimo Informe semanal firmado de interventoría	N/A		08 DE NOVIEMBRE DE 2024

	7. TEMAS
6	Cerramiento
7	Equipos y herramientas
8	EPP Trabajadores.

OBSERVACIONES

SE HAN HECHO LOS CERRAMIENTOS PREVENTIVOS CON SEÑALIZACIÓN, CINTAS , MANTENIENDO LA ZONA INTERVENIDA TOTALMENTE ACORDONADA.

TRABAJANDO DE MANERA OPTIMA

SE LE HACE ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

9. FIRMAS

Revisó: Jaime Navarro Alonso - Apoyo a la supervisión	Contratista de Obra - Yesid Manuel Majana Acosta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: IRIS M. SPATH CAMAÑO	
Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-049	01	23/01/2024

ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS No. 1

CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($178.514.988,00)
No. CDP	24001883 del 15 de agosto de 2024
No. CRP	24002018 del 02 de octubre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA FINAL	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL ACTA FINAL	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Montería, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2024 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **GRUPO EVG CONSTRUCCIONES S.A.S.**, representado legalmente por **YESID MANUEL MAJANA ACOSTA,** identificado con cedula de ciudadanía 73.570.472, la Secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y el apoyo a la supervisión designado **JAIME E. NAVARRO ALONSO,** con el propósito de justificar el gasto de los imprevistos que hacen parte del presupuesto de obra del contrato en mención.

De acuerdo con la propuesta económica presentada, que incluyó un imprevisto del 1.0% del valor total, correspondiente a Un millón doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte ($1.289.794,00), se acuerda mediante la presente acta la utilización de dicho rubro para cubrir parcialmente las mayores cantidades de obra surgidas durante la ejecución del proyecto. Estas cantidades adicionales justificadas, son indispensables para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la eficiencia de la obra.

El costo adicional de la actividad 'SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES' corresponde a 12 metros cúbicos, con un valor de Un millón ochocientos veintidós mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte. ($1.822.188,00). Del total necesario, se utilizará el monto

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	FORMATO ACTA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-049		01	23/01/2024

completo del rubro de imprevistos aprobado, equivalente a Un millón doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($1.289.794,00), para cubrir parcialmente esta actividad

A continuación, se especifica la actividad que será financiada a través del rubro destinado a imprevistos.

Relación de Actividades para Rubro de Imprevistos							
ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*UND*	*CANT*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*	*FINANCIACIÓN*	*OBSERVACIÓN*
7.01	*SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES*	*M3*	*12*	*$ 151.849*	*$ 1.822.188*	*1% de imprevisto equivalente a $ 1.289.794*	*Tras la medición en campo, se determinó una mayor área de patio que requiere ser cubierta, lo que explica el incremento en la cantidad, garantizando así la adecuación del espacio a las condiciones reales del proyecto*

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

GRUPO EVG CONSTRUCCIONES S.A.S
YESID MANUEL MAJANA ACOSTA

JAIME NAVARRO ALONZO
Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Luis Fernando Mendoza – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1474

Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos

Caja de Compensación Familiar de Córdoba

Nueva Solicitud / Consultar Solicitud

Verificación y Seguimiento de Solicitudes

Ingrese el código de identificación de la solicitud realizada, para verificar el estado en que esta se encuentra.

Código de solicitud:	212385	Buscar

Número de Radicado	212385
Fecha de Radicación	08/11/2024 09:32 PM
Estado de la Solicitud	Derivación
Tipo de Solicitud	**CERTIFICADO PAZ Y SALVO**
Fecha de Respuesta	
Medio de Envío de la Respuesta	Correo electrónico

Señor usuario, si requiere mayor información acerca de su solicitud, por favor comuníquese a nuestras líneas de atención y con gusto le suministraremos toda la información requerida.

Regresar al Inicio

1475

Caja de Compensación Familiar de Córdoba

Montería - Córdoba

Dirección: Carrera 9 # 12-01

Centro de Atención al Cliente

Correo electrónico: atencionalcliente@comfacor.com.co

Código Postal: 230001

Línea Gratuita : 01 8000 413 758

Horarios de Atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

7476

comfacor

LA GERENTE DE SUBSIDIO FAMILIAR DE
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CORDOBA "COMFACOR"
NIT 891.080.005-1

CERTIFICA:

Que la empresa **GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S nit. 901.613.617-3** representado legalmente por **Yesid Manuel Majana Acosta**, realizó Aportes Parafiscales del 4%, por los períodos que se detallan a continuación:

Periodo Pago	Fecha Pago	Aportes	Valor Mora	Total Aportes	Nro Planilla
202410	01/11/2024	168.000	0	168.000	9474607844
202411	01/11/2024	54.000	0	54.000	9476617614
Totales======>>>>>		**222.000**	**0**	**222.000**	

Se le aclara al peticionario que, los datos aquí suministrados, **pertenecen a la vigencia requerida por el peticionario (202410 hasta 202411),** donde la relación de los aportes recibidos, son los que el aportante ha declarado por ellos mismos en el pago de los aportes pilas recibidos; valores sobre los cuales podría surgir cualquier inconsistencia, una vez la Caja aplique su función de verificación en el pago de los aportes del 4%, por medio del cual se hace el control de las contribuciones parafiscales de la protección social; en esta función de verificación se pueden encontrar inconsistencias en sus aportes por algún trabajador, generándose entonces una Inexactitud u Omisión; lo cual traería como consecuencia el cobro de esa cartera por inexactitud u omisión. Esto según Decreto 3033 de 2013, y resolución 205 de 2024

Este certificado se expide para fines netamente fiscales, en el cual se hace constar que el empleador pagó determinado monto de aportes en los periodos que aquí se especifican, sin que por eso se convierta en paz y salvo para efectos de afiliarse a otras Cajas de Compensación. Se expide sin perjuicio de las acciones y competencias de determinación y cobro de aportes por parte de las administradoras y la UGPP. Este certificado no es válido para efecto de afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

La anterior constancia se expide a solicitud del señor **Yesid Manuel Majana Acosta,** en su calidad de representante legal del **"GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S"** con Nit **901.613.617-3**, a los 22 días del mes de noviembre de 2024, teniendo en cuenta lo requerido en la **PQR ID: 212385**.

MARISOL MORENO MUÑOZ

Proyectó: Aldair Diaz
Revisó: Arturo Agamez
Aprobó: Madyn Morales
Líder de Aportes

VIGILADO SuperSubsidio

1477

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CORDOBA
Grupo Financiero (Cordoba)
CLASIFICADA

43500

Al contestar cite este número

Radicado No:
20244350000091681

Monteria, 2024-11-13

Señor (a)
YESID MANUEL MAJANA ACOSTA
Representante Legal Grupo EGV Construcciones Zomac Sas
oficinaegv826l@hotmail.com
Carrera 52 No.40-06 Bario San Gregorio
Montelibano - Córdoba

RESPUESTA RADICADO No.20244340000085922 DEL 12 - 11 - 2024

Cordial saludo;

En respuesta a la solicitud radicada con el No. 20244340000085922 de fecha 12 de noviembre del presente año, nos permitimos informarle que, revisado nuestro Sistema de Información, se pudo constatar que la empresa que usted representa no se encuentra registrado en ellos, es decir, no ha efectuado pagos por concepto de aportes parafiscales en la Regional Córdoba (NIT inexistente).

Lo anterior debido a que los pagos hechos por usted al SGSS según planillas PILA No.9474607844 y 9476617614 correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024, respectivamente manifiestan estar exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del ICBF, dicha planillas corresponden a la ejecución del contrato No.SA-SIM-030-2024 suscrito con el Municipio de Montería.

Estaremos atentos a sus inquietudes.

Atentamente;

CARMEN TATIANA PERALTA LOPEZ
Coordinadora Grupo Financiero ICBF Regional Córdoba

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CORDOBA
Grupo Financiero (Cordoba)
CLASIFICADA

Revisó: Robert A. Martinez A. - Grupo Financiero - Responsable Oficina Recaudo
Anexos:

1479

Redeban

NOV 12 2024 17:16:15 REDES 8.90

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL NUESTRO MONT
11 29 20 337 C C NUEST
Caja 02
AUTO: 307033518 TER: 11422615
RECIBO: 129507 RRN: 199788
APRO: 631519

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7628534

VALOR $ 162.500

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios financieros por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 3000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ecaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7628534

MENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 120068016		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
11	11	2024
FECHA VENCIMIENTO		
16	11	2024

aprendizaje

899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

SRUPO EGV — NIT o C.C. 901613617

CR 52 40 06 — Teléfono +57,300

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
- FIC		
-04-43		
CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 162,500.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 162,500.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7628534(3900)000000162500(96)20241116

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 120068016

Ciudad | D | M | A | NIT 901613617 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: GRUPO EGV

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

1480

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS identificado con el NIT 901613617, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SA-SIM-030-2024	MEJORAMIENTO CASA LUDICA	MONTERIA	162,500	2024-10	12-NOV-2024	120068016
		Total	162,500			

Expedido por el SENA, a los trece (13) dias del mes de Noviembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-11-13

Generado por : Eduardo Anselmo Cervantes

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 63527828 - 340663

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682


www.sena.edu.co

Ministerio del Trabajo
Sede administrativa
Dirección: Carrera 7 No. 31-10
Pisos: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19,

Atención presencial
Con cita previa en cada Dirección Territorial o Inspección Municipal del Trabajo

Línea nacional gratuita, desde teléfono fijo:
018000 112518

1482

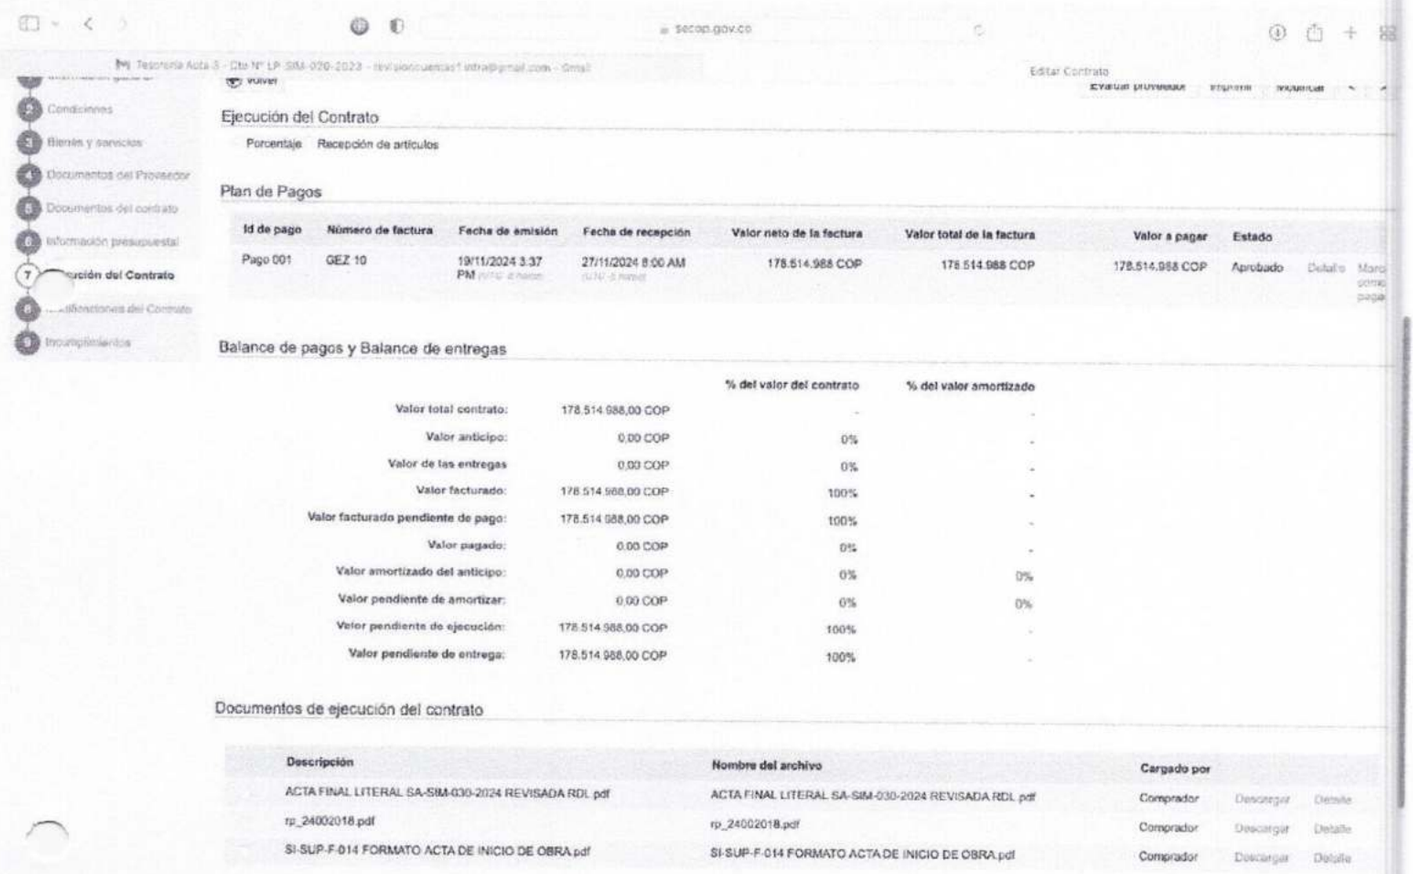

secop.gov.co

Tesoreria Acta 3 - Cto N° LP-SIM-020-2023 - revisioncuentas1.intra@gmail.com - Gmail

Editar Contrato

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

5 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Adiciones del Contrato

9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	GEZ 10	19/11/2024 3:37 PM (UTC -5 Hora)	27/11/2024 8:00 AM (UTC -5 Hora)	178.514.988 COP	178.514.988 COP	178.514.988 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	178.514.988,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	178.514.988,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	178.514.988,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	178.514.988,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	178.514.988,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA FINAL LITERAL SA-SIM-030-2024 REVISADA RDL.pdf	ACTA FINAL LITERAL SA-SIM-030-2024 REVISADA RDL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
rp_24002018.pdf	rp_24002018.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SI-SUP-F-014 FORMATO ACTA DE INICIO DE OBRA.pdf	SI-SUP-F-014 FORMATO ACTA DE INICIO DE OBRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 13-11-2024 10:42

Id de la garantía CO1.WRT.15618691

Referencia de la garantía POLIZA ACTA FINAL

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza 400058689

Tomador GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	17.978.453 COP	8/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	17.978.453 COP	8/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	17.978.453 COP	8/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Póliza Actualizada Acta Final

1484

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 13-11-2024 16:42

Id de la garantía CO1.WRT.15618691

Referencia de la garantía POLIZA ACTA FINAL

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza 400058689

Tomador GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	17.978.453 COP	8/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	17.978.453 COP	8/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	17.978.453 COP	8/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
174593	BOGOTA		11			30	400058689	4
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
13 / 11 / 2024	8 / 11 / 2024	00:00	8 / 11 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S	NIT	901.613.617 - 3
DIRECCIÓN	CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO, MONTELIBANO, CORDOBA	TELÉFONO	3007310531

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S	NIT	901.613.617 - 3
DIRECCIÓN	CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO, MONTELIBANO, CORDOBA	TELÉFONO	3007310531

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO No. SA-SIM-030-2024 .
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/10/2024	08/03/2025	17.978.453.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/10/2024	08/11/2027	17.978.453.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	08/11/2025	17.978.453.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 14/11/2024	901613617

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 53.935.359,00	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
01/09/2022|13-7|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL|S|D01
01/04/2020|13 -7|P|05|CL-CUMP-ESTATAL|I|D01
YBENAVIDES

1486

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400058689	4	BOGOTA	13 /11 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 8 /11 /2024	00:00 Horas del 8 /11 /2027	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÈFONO	7463219

TOMADOR	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S	NIT	901.613.617 - 3
DIRECCIÓN	CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO, MONTELIBANO, CORDOBA	TELÉFONO	3007310531
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº SA-SIM-030-2024, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE PERIODO DE LIQUIDACION DE 4 MESES AL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO DE LA PRESENTE POLIZA ES MUNICIPIO DE MONTERÍA IDENTIFICADO CON NIT 800096734-1

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

TO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No SA-SIM-030-2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

********** **FIN PÓLIZA** **********

1488

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400058689, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S
NIT : 901.613.617 - 3
Asegurado : MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT : 800.096.734 - 1

Se expide la presente certificación a los 13 días del mes de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

1489

Alcaldía de MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	24002168
CDP No.	24001883
jueves 15 agosto 2024	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2024 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3301068	54129	$ 179.779.496,00	$ 179.779.496,00
				Totales...	$ 179.779.496,00	$ 179.779.496,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: CIENTO SETENTA y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos

El certificado No. 24001883 se emite en Monteria el dia jueves 15 de agosto de 2024 como requisito previo a:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Especializado

Solicito : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: DHOYOS	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250, 10.0.0.218

1490

Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 24002018

RP No.	24002018
miércoles 02 octubre 2024	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901613617 - GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. **NIT:** 901613617

No. del Certificado de disponibilidad 24001883 **Contrato No:** SA-SIM-030-2024

Tiempo de Ejecucion: UN (1) MES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	CPC	Valor R.P.
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3301068	54129	$ 178.514.988,00
				Total Reserva..	$ 178.514.988,00

CON SITUACION DE FONDO

tal reserva en letras: CIENTO SETENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos

Objeto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Especializado

Solicito: HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250, 172.70.255.38,

7491

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042908931

(415)7707212489984(8020) 000014104290893 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montelíbano 4 6 6

41. Dirección principal
CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO

42. Correo electrónico oficinaegv826@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 3 1 0 5 3 1	3 0 1 6 4 2 0 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 6 3 0	7 1 1 2	2 0 2 2 0 6 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 27 / 14 : 57: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MAJANA ACOSTA YESID MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-05-2024 02:57:49PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1492

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042908931

(415)7707212489984(8020) **000014104290893 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	1 9 8 8 2 7	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 7 1 5		-
2	4 9	2 0 2 2 0 7 1 5		-
	9 1	2 0 2 2 0 7 1 5		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-05-2024 02:57:49PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042908931

(415)7707212489984(8020) 000014104290893 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 6 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 5 7 0 4 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MAJANA	ACOSTA	YESID	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 6 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 0 9 3 8 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABRALES	GARRIDO	LUCIA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1494

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042908931

(415)7707212489984(8020) 000014104290893 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 9 4 5 1 5 6	0	3 2 0 9 2 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GAMARRA	MARTINEZ	JHONY	RAFAEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 6 7 2 9 6	1	1 5 7 6 0 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARIZA	ENNIS	VICTOR	ALFONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.
NIT: 901613617-3
MATRICULA MERCANTIL: 198827
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 30/06/2022
NÚMERO DEL PROPONENTE: 6314
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 01/11/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 22/04/2024
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30/06/2022
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO: NA
FECHA DEL DOCUMENTO: 08/06/2022
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA DE CONSTITUCION
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: MAJANA ACOSTA YESID MANUEL
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 73570472
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:CABRALES GARRIDO LUCIA INES
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 50938143
CARGO:SUPLENTE

FACULTADES:

Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos de cualquier monto, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO
MUNICIPIO:23466 - MONTELIBANO
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1:3007310531
CORREO ELECTRÓNICO:oficinaegv826@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO
MUNICIPIO:23466 - MONTELIBANO
DEPARTAMENTO:CORDOBA
CORREO ELECTRÓNICO:oficinaegv826@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10 15 19 00 : SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 15 21 00 : RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS
10 15 22 00 : SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 17 00 : HERRAMIENTAS DE PESCA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 11 00 : SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20 14 20 00 : REGENERADORES DE GLICOL
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES

23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 12 16 00 : VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS
70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70 14 19 00 : COSECHA DE CULTIVOS
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 16 16 00 : FLORA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.231.252.866,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.231.252.866,00
PASIVO CORRIENTE	:	$20.843.000,00
PASIVO TOTAL	:	$20.843.000,00
PATRIMONIO	:	$2.210.409.866,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$332.524.999,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ	:	107,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO H2O - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIAGUAS S.A.E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :23131,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO MONTERIA 2010 - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5768,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DRAGADOS DE LA SABANA - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6441,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEGAPARQUES - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3105,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONEXIÓN VERDE - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10165,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 13 16 00 : PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6144,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - EDUARDO ALFREDO GHISAYS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5310,02

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	:	BARRO Y TIERRA
20	14	33	00	:	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	18	00	:	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	20	00	:	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25	10	16	00	:	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26	12	16	00	:	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	22	00	:	PLANCHA
30	10	24	00	:	VARILLAS
30	10	29	00	:	PILARES
30	10	31	00	:	RIELES
30	11	16	00	:	CEMENTO Y CAL
30	11	19	00	:	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	:	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	18	00	:	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	:	BLOQUES
30	13	17	00	:	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	:	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	17	00	:	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	:	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	:	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	20	00	:	CERCADO
30	16	15	00	:	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	19	18	00	:	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30	24	16	00	:	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
47	10	15	00	:	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56	10	19	00	:	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70	11	17	00	:	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	17	15	00	:	DESARROLLO
70	13	15	00	:	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	16	00	:	VIGILANCIA
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	:	EXTRACCIÓN
71	12	11	00	:	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	:	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	:	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	15	00	:	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	18	00	:	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	27	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72	10	15	00	:	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS DEL SINU Y DEL SAN JORGE - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24108,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
10 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIAGUAS S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1233,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/08/2024 - 08:28:40
Recibo No. S001005139, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pVCje1mFR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

1530

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS identificado(a) con NIT 9016136173 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 880087820 desde el 13 de enero de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ELABORADO POR:
JAIME ENRIQUE NAVARRO ALONSO
CONTRATISTA SIM

PERIODO DEL INFORME
08/10/2024 – 08/11/2024

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ____ 3

1.1 ZONA A INTERVENIR ____ 4

1.2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIÓN DEL PROYECTO ____ 6

2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO ____ 7

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA ____ 7

2.2 SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES ____ 8

2.3 SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA ____ 8

3 COMPONENTE TÉCNICO ____ 10

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS. ____ 10

3.2 ÍTEM NO PREVISTOS ____ 12

4 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE ____ 13

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ____ 13

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ____ 13

4.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ____ 13

5 COMPONENTE JURIDICO ____ 14

5.1 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA ____ 14

6 CONCLUSIONES Y/ O RECOMENDACIONES ____ 19

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será consideráda como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INTRODUCCIÓN

De conformidad a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 *"Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, la Ley 1150 de 2007 *"por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993"* y Ley 1474 de 2011 *"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del presente contrato el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato CMC-SIM-023-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

Este informe presenta un resumen integral del avance físico y desarrollo de la obra, control de calidad, y aspectos técnicos, financieros, administrativos y contractuales del proyecto, así como temas ambientales, de salud ocupacional y seguridad industrial. Abarca el periodo entre el 08 de octubre al 08 de noviembre de 2024, en el marco del contrato de obra No. SA-SIM-030-2024. Incluyendo las actividades realizadas, y el estado financiero y contable del proyecto, garantizando la coherencia de los datos con las secciones administrativas, técnicas y de seguimiento contractual.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física **DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**, esta consiste en pintura interior, pintura exterior, adecuación de cerramiento en malla eslabonada, adecuación y pintura de muro de cerramiento, mantenimiento de aparatos sanitarios y suministro de griferías y accesorios, suministro y mantenimiento de ventiladores de techo, suministro de luminarias, pintura demarcativa para placa de cancha, mantenimiento de redes eléctricas, pinturas rejas y protectores, poda de árboles, ornamentación limpieza general, con el fin de mejorar la infraestructura física estas actividades están encaminadas a realizar el mantenimiento general y correctivo de los elementos de la edificación, al igual que el mantenimiento de las redes eléctricas internas.

1.1 ZONA A INTERVENIR


El municipio de Montería considera prioritario realizar inversiones para mejorar los espacios públicos destinados a la atención de la niñez, los cuales presentan una infraestructura deficiente e inadecuada. Los espacios actuales, utilizados también para la atención al público general, no garantizan condiciones óptimas para los niños beneficiados, lo que puede dificultar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y generar problemas de comportamiento. Este proyecto es de importancia estratégica debido a la escasa oferta de actividades deportivas y recreativas para la niñez en el municipio. La Casa Lúdica, en particular, requiere mejoras en cielos rasos, pintura interior y exterior de muros, carpintería metálica, instalaciones eléctricas y luminarias, así como la sustitución de aparatos sanitarios, los cuales no están en condiciones adecuadas para su uso. Estas intervenciones buscan garantizar un entorno seguro, funcional y acogedor para los niños, funcionarios y visitantes:






La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

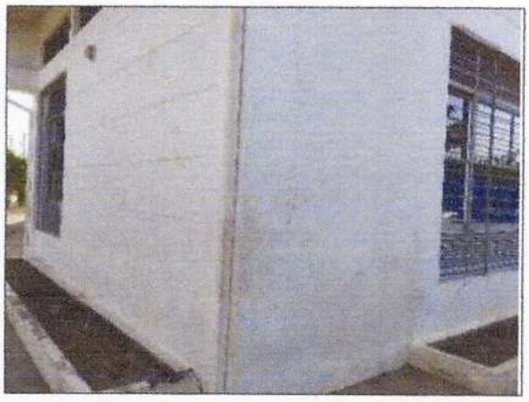





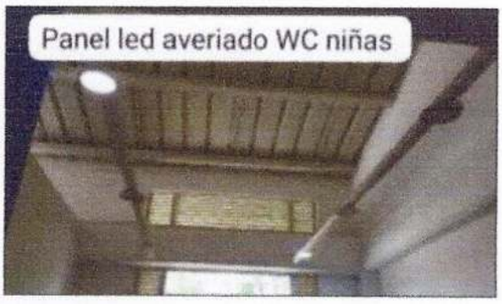





La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

1.2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Casa Lúdica se localiza en el barrio Vereda Tropical de la ciudad de Montería, el cual se tiene la siguiente información geográfica:

PUNTO DE REFERENCIA	COORDENADAS	
CASA LÚDICA	LATITUD	LONGITUD
	8°43'31".00" N	-75°52'29".14" O



Figura 1.1. Localización
imagen tomada de Google EARTH

Registro fotográfico del área del proyecto a intervenir:

2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El proyecto finalizo el 31 de mayo de 2024. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto.

CONTRATO DE OBRA						
CODIGO BPIN	2024230010129					
No. PROCESO	SA-SIM-030-2024					
MODALIDAD DE CONTRATO	Selección abreviada. SA-SIM-030-2024					
RECURSOS	**PROPIOS**		**SGR**		**OTRO**	X
FUENTE DE FINANCIACION	SPG PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION					
CONTRATO No.	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. NIT 901.613.617					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2024					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA					
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MANUEL MAJANA ACOSTA CC. 73.570.472					
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.					
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y OCHO MCTE ($178.514.988,00)					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un mes (01)					
FECHA DE INICIO:	08/10/2024					
FECHA TERMINACION INICIAL:	08/11/2024					
ACTA FINAL	08/11/2024					
FECHA TERMINACION ACTUAL:	08/11/2024					
ESTADO	Finalizado					
ALCANCE	Edificaciones: 1					
SUPERVISOR	IRIS M. SPATH CAMAÑO					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100%
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	100%

2.2 SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

ACTAS DE CONTRATO DE OBRA	
ACTAS	**FECHA SUSCRIPCIÓN**
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	04/10/2024
ACTA DE INICIO DE OBRA	08/10/2024
ACTA FINAL	08/11/2024

2.3 SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA

COMITÉS DE OBRA		
No. COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
Comité No 1	14/10/2024	En la primera reunión del comité del contrato, realizada en la Secretaría de Infraestructura de Montería, se revisaron los compromisos establecidos, los avances semanales y aspectos clave de la intervención. El contratista propuso incluir actividades adicionales, como mantenimiento del cielo raso, refuerzo de la impermeabilización, mejora de la seguridad perimetral y restauración del piso de granito, buscando garantizar mayor durabilidad y estética. Por su parte, el municipio enfatizó el cumplimiento de las cláusulas relacionadas con el uso de mano de obra local y medidas de seguridad, promoviendo un enfoque preventivo ante posibles accidentes. Como resultado, se pactó elaborar un pre-balance de obra como tarea principal.
Comité 2	31/10/2024	El segundo comité, realizado en las oficinas de la interventoría, se centró en la entrega y evaluación del pre-balance N°1. Se reportó un avance del

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

		70.71%, superando la programación estimada de 67.87%. El contratista aseguró haber cumplido los compromisos pendientes y confirmó que las actividades adicionales no afectarían el presupuesto. Por su parte, el municipio verificó que el pre-balance cumpliera con los objetivos del proyecto y la documentación correspondiente. Como resultado, la Secretaría de Infraestructura asumió el compromiso de aprobarlo de manera inmediata.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

3 COMPONENTE TÉCNICO

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS.

Acumulado final de actividades ejecutadas de informes semanales reportaos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES EJECUTAS
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA	M2	175,00
1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR	UND.	12,00
2,00	**PAÑETE Y PINTURA**		
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	51,58
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE	M	114,63
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS	M2	475,20
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR	M2	434,70
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES	M2	92,60
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO	M2	416,00
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	M	328,56
3,00	**EQUIPAMIENTOS**		
3,01	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)	M	50,00
3,02	S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M	UND..	1,00
4,00	**MANTENIMIENTO**		
4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)	UND.	13,00
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	176,06
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO	M2	105,20
4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO	M2	25,23
4,05	REPARACIÓN DE PORTERÍAS, INCLUYE TUBERÍA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	UND.	2,00
4,06	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA	M	12,30
4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	UND.	5,00
4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	UND.	6,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

4,09	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	UND.	1,00
4,10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA	UND.	1,00
4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	UND.	13,00
4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	UND.	14,00
5,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
5,01	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND.	3,00
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA	UND.	12,00
6,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS	UND.	5,00
6,02	S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA	UND.	4,00
6,03	S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	UND.	2,00
7,00	**URBANISMO Y PAISAJISMO**		
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	652,42
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES	M3	28,00
7,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	6,00
7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	4,00
7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)	UND.	24,00
	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3	M2	264,10
NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER	M2	65,48
NP-3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA	M	72,40
NP-4	LIMPIEZA Y/O RESTAURACION DE PISO EN GRANITO, INCLUYE APLICACIÓN DE EMULSION	M2	31,26

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

3.2 ÍTEM NO PREVISTOS

Durante el desarrollo del contrato, el contratista de obra identificó la necesidad de ejecutar actividades no previstas, las cuales fueron discutidas en los comités N°1 del 14 de octubre de 2024, N°2 del 30 de octubre de 2024. En estos comités, el contratista presentó un balance: el primer balance, aprobado por parte de la secretaria de infraestructura.

Como consecuencia, el contratista presentó y justificó los ítems adicionales para su revisión por parte del municipio. Estos ítems fueron analizados, avalados y aprobados por la Secretaría de Infraestructura tras un estudio técnico y económico, y posteriormente remitidos a la entidad contratante para su ejecución dentro del contrato, según consta en el acta de pactación de precios fechada el 31 de octubre de 2024.

NP. 1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWAL, INCLUYE REPARACIÓN DE CINTAS, ALISTADO DE SUPERFICIE Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 3
NP. 2	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCLUYE REFUERZO EN MEMBRANA TIPO POLIESTER
NP.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONCERTINA
NP.4	LIMPIEZA Y/O RESTAURACION DE PISO EN GRANITO, INCLUYE APLICACIÓN DE EMULSION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1543

4 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
OBRA	24001883	2024-08-15	$ 179.779.496,00

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
OBRA	24002018	2024-10-02	$ 178.514.988,00

4.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Con respecto al contrato de obra a la fecha no se tiene anticipo y no se ha cobrado actas parciales

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 178.514.988,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 178.514.988,00			
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0.00	$ 0.00	
SALDO POR PAGAR		$ 178.514.988,00	$ 0.00	En tramite
TOTAL	$ 178.514.988,00	$ 178.514.988,00	$ 0.00	$ 178.514.988,00

APORTANTE / CONVENIENTE	NO. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR	DECRETO / CONVENIO RECURSOS APORTANTE / CONVENIENTE	VALOR
MONTERIA					
GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	24001883	2024-09-15	$ 179.779.496,00	SPG	$ 179.779.496,00

BPIN y Nombre: 2024230010129 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA LUDOTECA Y LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

5 COMPONENTE JURIDICO

5.1 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

En el periodo no se han realizado modificaciones al contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
N.A.	N.A.	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	VALOR	
N.A.	N.A.	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
ACTA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024	
ACTA FINAL	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	CLAUSULA NO.	DESCRIPCION
N.A.	N.A.	N.A.
CESIONES		
CEDENTE	CESIONARIO	
N/A	N/A	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	ACTO ADMINISTRATIVO	(CLASE DE SANCIÓN)
N.A.	N.A.	N.A.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

PÓLIZAS

- **Pólizas Contrato de obra**

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS		
NUMERO DE PÓLIZA	400058689		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN	
ANEXO No 3	ACTA DE INICIO	10/10/2024	
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/10/2024	08/03/2025	$ 17.978.453.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/10/2024	08/11/2027	$ 17.978.453.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	08/11/2025	$ 17.978.453.00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	SECOP II		
	11/10/2024		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

5.REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baranda



Llaves de baño



Lámparas de baño



Mesas



Inodoros



jardineras

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

	
Malla de impacto	Malla de impacto
	
Pintura	Cerramiento

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

6 CONCLUSIONES Y/ O RECOMENDACIONES

El día 8 de octubre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. SA-SIM-030-2024, con el objeto de llevar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la casa lúdica en el municipio de montería. Este contrato fue pactado con una duración de un (01) mes a partir de la fecha de inicio, con las respectivas garantías actualizadas y ajustadas según los términos contractuales.

El 08 de noviembre de 2024, se reunieron los representantes de las partes involucradas en la ejecución del proyecto para suscribir el acta de recibo final de las actividades realizadas conforme al contrato. Los asistentes fueron:

El GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S., encargado de la ejecución de la obra, implementó durante este periodo todos los controles establecidos en el componente ambiental del proyecto, conforme a lo estipulado en su Plan de Gestión Integral con fecha final de 08 de octubre de 2024 – PGIO. Se identificaron los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades constructivas a desarrollar, con el fin de establecer las medidas de manejo necesarias para prevenir el deterioro del medio ambiente durante la ejecución del proyecto. Además, el apoyo a la supervisión recibió el informe final correspondiente del PGIO, verificando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas las cuales son: Política Integral de la Gestión, Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de Gestión Ambiental, Política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, Política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Cuyas actividades ejecutadas fueron:

El informe final del Plan de Calidad destaca la implementación de actividades clave como la planificación y seguimiento del cronograma de obras, control de calidad en materiales y procesos constructivos mediante inspección y ensayos específicos, y manejo adecuado de materiales con medidas de preservación en frentes de trabajo. Además, se realizaron capacitaciones al personal en calidad, seguridad y manejo ambiental, y se gestionaron registros documentales para evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión. También se identificaron y trataron productos no conformes mediante acciones correctivas y preventivas, y se evaluaron indicadores de gestión para garantizar mejoras continuas, cumpliendo con normativas aplicables.

En conclusión, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la casa lúdica en el municipio de montería se completó exitosamente, cumpliendo con el cronograma previsto y con las certificaciones técnicas exigidas. Además, el contratista ejecutó correctamente el plan de calidad propuesto por el contratista, tal como se estipuló en los documentos contractuales.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Jaime Navarro Alonso – Contratista SIM
Revisó: Ingris Villadiego– Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

GRUPO EGV CONTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATO No. SA-SIM-030-2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL FINAL

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

CONTENIDO

INTRODUCCION **3**
OBJETIVOS **4**
ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL **5**
INFORMACIÓN DEL PROYECTO **6**
INFORMACION GENERAL 6
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO **8**
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS **9**
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL **10**
1. IMPLEMENTACIÓN PGIO - AMBIENTAL 10
CONCLUSIONES **13**
ANEXOS **14**

INTRODUCCION

La implementación del Plan de Gestión Ambiental por parte del **GRUPO EGV CONTRUCCIONES ZOMAC S.A.S,** en la ejecución del contrato de obra No. SA-SIM-030- 2024. Contrato de obra dentro del proceso de selección abreviada – SIM -030 de 2024 cuyo objeto: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

El presente documento el cual conlleva el informe final del plan de gestión ambiental, correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 08 de noviembre de 2024, en el que se refleja las actividades desarrolladas por el contratista de obra con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los componentes ambientales del proyecto.

OBJETIVOS

Presentar los soportes solicitados por la supervisora, donde se detallan las actividades de cumplimiento y ejecución en el proyecto de obra, y las actividades ejecutadas del Plan de gestión Ambiental.

OBJETIVOS GENERALES

1. Presentar las actividades ejecutadas de los ejes de Manejo Ambiental.
2. Dar a conocer las actividades realizada para prevenir la afectación al medio ambiente.
3. Presentar las actividades ejecutadas dando cumplimiento con la normatividad nacional vigente en temas de Manejo Ambiental.

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El presente Plan de Manejo Ambiental tiene como alcance establecer las estrategias, planes, programas y mecanismos que se requieran para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generen en las actividades MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

INFORMACION GENERAL

En la Tabla N° 1 se describe la información general que identifica el consorcio y el proyecto.

Tabla N° 1: Información General del consorcio y el proyecto.

CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S
REP LEGAL	YESID MANUEL MAJANA ACOSTA
NIT	901.613.617-3
TELEFONO	3007310531
EMAIL	Oficinaegv826@gmail.com
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
MUNICIPIO:	MONTERIA
PLAZO EJECUCIÓN:	1 MES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización de MONTERÍA en Córdoba (Colombia)

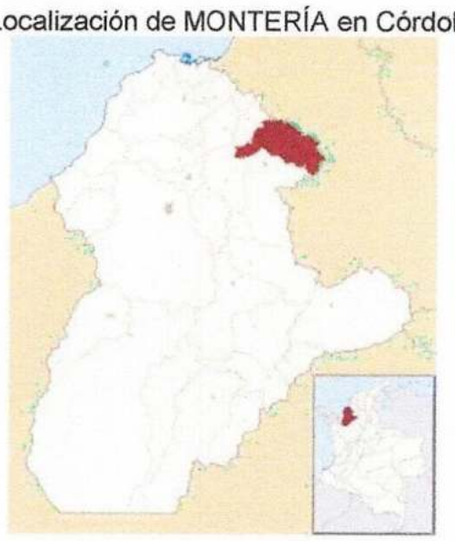


Ilustración 2. Localización zona de obra



1557

GRUPO EGV CONTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA
1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR
2,00	**PAÑETE Y PINTURA**
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL
3,00	**EQUIPAMIENTOS**
3,01	CERRAMIENTO ANTI-IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)
3,02	S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M
4,00	**MANTENIMIENTO**
4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO
4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO
4,05	REPARACIÓN DE PORTERÍAS, INCLUYE TUBERÍA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS
4,06	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA
4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,09	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
5,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**
5,01	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA
6,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**
6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS
6,02	S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA
6,03	S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA, INCLUYE ACCESORIOS
7,00	**URBANISMO Y PAISAJISMO**
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES
7,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)
	PGIO

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, se ha solicitado mano de obra contratada de la zona y de lugares cercanos a la misma.

Cargo	Dedicación	Nombre y apellido	Cedula	Salud	Pensión	ARL
Director de obra	30%	Jaime Elías Berrocal Rangel	78.714.813	EPS Sanitas	Colpensiones	Sura
Residente de obra	100%	Jose Antonio Monterrosa Galarcio	1.067.964.856	Nueva EPS	Colpensiones	Sura

P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. IMPLEMENTACIÓN PGIO - AMBIENTAL

Se presentarán a continuación los diferentes implementos que lleva el eje ambiental.

Kit para desperdicios sólidos.
Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la intemperie, de fácil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm.




Lavado de Herramientas.
Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.



Kit aseo de obra.
El kit de aseo consta de pica, pala con mango, escoba, balde plástico 12 litros, carretilla (tipo boggy con llanta neumática), como mínimo de H:45cm, cepillo carretero.



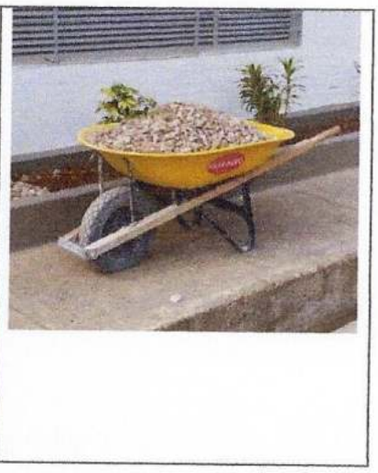

Brigada de aseo.
Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementación y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional (1 persona)





Kit de derrames pequeños.

El kit consta de un maletín de tela, desengrasante biodegradable, cinta de seguridad, recogedor plástico, bolsas rojas, monogafas, par de guantes, tapabocas clásico, almohadilla, paños y/o materiales absorbentes y barrera absorbente.






Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

CONCLUSIONES

La empresa GRUPO EGV CONTRUCCIONES ZOMAC S.A.S, adjunta los soportes de los ejes de Manejo Ambiental, con evidencias de lasactividades de cumplimiento de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, ejecutadas en el proyecto de obra de la CONTRATO No. SA-SIM-030-2024 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Que corresponden al informe del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL.

Elaborador por: Yesid Manuel Majana Acosta
Firma 

ANEXOS

Anexo N° 1 planilla de entrega EPP.

Anexo N° 2 Planilla de seguridad.

Anexo N° 3 Acta de inicio.

Anexo N° 4 Plan ambiental.

Anexo N° 5 Plan de gestión integral de obra.

Anexo N° 1 planilla de entrega EPP.

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

1564

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

FECHA DE ENTREGA:	NRO. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APLELLIDOS	CARGO	EPP: SERVICIOS GENERALES (Marcar X)					FIRMA DE RECIBIDO
				CASCO	GAFAS	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	CAMISA	
8-oct-24	1003157732	BELLO AVILEZ DANIEL ENRIQU	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	1067958658	NAVARRO GHISAYS JOS	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	11106767	GOMEZ TEJADA ANTONIO MANUEL	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	1335029974	GHISAYS SIERRA DANIEL EDUARDO	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	50938143	CABRALES GARRIDO LUCIA INES	OPERATIVO	X	X	X	X	X	
8-oct-24	73570472	MAJANA ACOSTA YESID MANUEL	OPERATIVO	X	X	X	X	X	

DATOS DE QUIEN ENTREGA		
	Nombres y apellidos	NABIL FUENTES VASQUEZ
	Cargo:	RESIDENTE DE OBRA
	Firma:	

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el EPP durante la jornada de trabajo laboral.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Anexo N° 2 Planilla de seguridad.

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901013617	3	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	cr 52 40-06 san gregorio	MONTERIA-CORDOBA	7895557	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1019953595	94746078 44	E	2024/11/07	2024/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,300,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	78714813	BERROCAL MANUEL JAIME ELIAS	X																	25-14	28	$1,400,000	$224,000	CCF50	28	$1,400,000	$56,000	CCF50	28	$1,400,000	$70,000	14-11	28	$1,400,000	$37,800	28	$0	$0	SI	$400,000
2	CC	93080936	FUENTES VASQUEZ NEBEL FERNANDO	X																	25-14	28	$2,800,000	$448,000	CCF50	28	$2,800,000	$112,000	CCF50	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$114,400	28	$0	$0	SI	$904,400
Total Afiliados(2)																							$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$182,000			$4,200,000	$152,400		$0	$0		$1,300,400

2024/11/01 10:50 AM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.108.134.94
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9474607844
Valor:	1,300,400
Periodo de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1019953595
Fecha:	2024/11/01
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901613617	3	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	cr 52 40-06 san gregorio	MONTERIA-CORDOBA	7895857	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1019953595	94746078 44	E	2024/11/07	2024/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,300,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$672,000	$0	$0	$672,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$292,400	$0	$0	$292,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$292,400	$0	$0	$292,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$168,000	$0	$0	$168,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$168,000	$0	$0	$168,000
E[illegible]NISTRADORAS: 2)				2	$168,000	$0	$0	$168,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$112,000	$0	$0	$112,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$0	$0	$56,000
TOTAL				2	$1,300,400	$0	$0	$1,300,400

2024/11/01 10:50 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901613017	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		GRUPO BSV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S	
CONDOMINIO/CRPO:	MONTELIBANO DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CR 23 NRO. 45-58 BRR SAN GREGORIO TELÉFONO:	7777777	
SPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	CAMPYME MONOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2042 - ADMINISTRATIVOS	
APORTANTE ENCABEZADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		1110633011	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)		20241168			

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-01	23-01 - COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
23-14	23-14 - COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
23-50	23-50 - PORVENIR	1	$ 414.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000	$ 0	$ 414.000
23-51	23-51 - PROTECCION	1	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 1.404.000**	**$ 0**	**$ 1.404.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS10	EPS010-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000
EPS05	EPS005-SURA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESS02	ESS024-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 364.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 364.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	MAQUILA OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-17	14-17 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 4.500	$ 627.000	$ 0	$ 0	$ 631.500
SUBTOTALES:										**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 631.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF55	CCF055-COMFACOR	7	$ 364.000	$ 0	$ 364.000
SUBTOTALES:			**$ 364.000**	**$ 0**	**$ 364.000**

LIQUIDACIÓN ESTALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: CENTRO COSTOS	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PEN	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	IBC	DÍAS COTIZADOS	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	MECANISMO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	ADMIN	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	CCF TOTAL APORTE
1	CC 1102813713	WILLIS DANIEL GARCIA GARCIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-50 - PORVENIR	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067169648	SAMUEL DAVID MEJIA MEJIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1067121103	VALENTINA SOFIA GARCIA MEJIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1112067571	JUAN JOSE GARCIA MEJIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1234529910	DANIEL ALEJANDRO GARCIA MEJIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-51 - PROTECCION	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1067129143	SAMUEL DAVID GARCIA GARCIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1067129473	SOFIA GARCIA MEJIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-01 - COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-17 - ARL SURA	$ 1.300.000	001	$ 92.000	$ 1.300.000	23-CCF55 - COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.817.500**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.108.134.94
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9476617614
Valor:	418.100
Periodo de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1019960813
Fecha:	2024/11/01
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

1570

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901613617	3	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	cr 52 40-06 san gregorio	MONTERIA-CORDOBA	7895857	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1019960813	9476617614	E	2024/12/05	2024/11/01	BANCO DAVIVIENDA		$418,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	78714813	BERROCAL RANGEL JAIME ELIAS		X																	25-14	9	$450,000	$72,000	EPS025	9	$450,000	$58,000	CCF10	9	$450,000	$58,000	14-11	9	$450,000	$21,600	9	$0	$0	SI	$129,600
2	CC	1090936	FUENTES VASQUEZ HABIL FERNANDO		X																	25-14	9	$900,000	$144,000	EPS025	9	$900,000	$58,000	CCF14	9	$900,000	$58,000	14-11	9	$900,000	$42,700	9	$0	$0	SI	$278,700
Total			Afiliados(2)																					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$64,300			$0		$408,300

2024/11/01 10:52 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901613617	3	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	cr 52 40-06 san gregorio	MONTERIA-CORDOBA	7895857	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1019960813	9476617614	E	2024/12/05	2024/11/01	BANCO DAVIVIENDA		$418,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$216,000	$0	$216,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$216,000	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,100	$0	$94,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$94,100	$0	$94,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$54,000	$0	$54,000
[illegible]ACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$54,000	$0	$54,000
E[illegible]NISTRADORAS: 2)				2	$54,000	$0	$54,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,000	$0	$36,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,000	$0	$18,000
TOTAL				2	$418,100	$0	$418,100

2024/11/01 10:52 AM

Anexo N° 3 Acta de inicio.

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

1572

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-014	01	08/05/2024

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	SA-SIM-030-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($178.514.988,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA FINAL	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ADJUDICACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. CDP	24001883 del 15 de agosto de 2024.
No. CRP	24002018 del 04 de octubre de 2024.
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Montería a los ocho días (08) días del mes octubre del año 2024 los suscritos a saber: el contratista **GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.**, representado legalmente por YESID MANUEL MAJANA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía 73.570.472, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS M. SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **JAIME E. NAVARRO ALONSO** proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

1.Acta de socialización	Se anexa
2.Hojas de vida y Afiliación del personal requerido, salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación.	Si **(X)** No___

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-014	01	08/05/2024

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	FP	Dedicación %	Salario afiliación	Fecha afiliación	Salud	Pensión	ARL
1	JAIME ELIAS BERROCAL RANGEL	78.714.813	Director de Obra	$ 5.000.000	1.6	30%	$1.500.000	3/10/2024	EPS Sanitas	Colpensiones	Sura
2	NABIL FERNANDO FUENTES VASQUEZ	10.980.936	Residente de obra	$ 3.000.000	1.61	100%	$ 3.000.000	3/10/2024	Nueva EPS	Colpensiones	Sura

Soporte: Se anexan certificados de afiliación y hojas de vida aprobadas, los cuales CUMPLEN con los requisitos mínimos exigidos en el anexo técnico del proceso.

3.Relación del equipo mínimo obligatorio exigido en el anexo técnico del proceso, para el cual el contratista de obra certifica la disponibilidad de maquinaria y equipos que se relacionan a continuación.

Si **(X)** No___ No Aplica___

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
1	JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	ARRIENDO
2	TABLON DE MADERA 3m PARA ANDAMIO	1	ARRIENDO
3	EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR)	1	ARRIENDO
4	EQUIPO DE SOLDADURA	1	ARRIENDO
5	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIOS	1	ARRIENDO
6	TROZADORA 14"	1	ARRIENDO
7	HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	1	ARRIENDO
8	MOTOSIERRA	1	ARRIENDO

4.Póliza del contrato y recibo de pago — No. 400058689 de 01/10/2024

5.Aprobación de Póliza del contrato — Se realiza aprobación de la póliza a través del portal SECOP II el día 08/10/2024

6.PGIO- AIU — Si **(X)** No___ No Aplica___

7.Plan de calidad — Si **(X)** No___ No Aplica___

8.Plan de ambiental — Si **(X)** No___ No Aplica___

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-014	**01**	**08/05/2024**

9.Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Si **(X)** No___ No Aplica___
10.Plan de manejo de tránsito PMT	Si___ No__ No Aplica **(X)**
11.Licencia de construcción aprobada por curaduría.	Si___ No__ No Aplica **(X)**
12.Otros Permisos o licencias que apliquen ¿Cuáles? _____	Si___ No__ No Aplica **(X)**
13.Documento de Constitución de la fiducia	Si___ No__ No Aplica **(X)** Fecha Fiducia: dd/mm/aaaa
14.Cronograma de la obra debidamente aprobado	Si **(X)** No___ No Aplica___ Se anexa
15.Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (si se incluye esta modalidad)	Si **(X)** No___ No Aplica___
16.Demás requisitos a que haya lugar y que puedan exigirse en el pliego de condiciones.	Si **(X)** No__ No Aplica__
Plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018	Si **(X)** No__ No Aplica__

Para efecto de las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato se establecen por parte del contratista de obra y del supervisor del contrato los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto:

Dirección de Correspondencia del contratista de obra: CR 52 40 06 BRR SAN GREGORIO, MONTELIBANO.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-014	**01**	**08/05/2024**

Nombre y Apellidos	Cargo	No. de celular	Correo electrónico
YESID MANUEL MAJANA ACOSTA	REPRESENTANTE LEGAL	3003347469	grupoegvcasaludica@gmail.com
IRIS SPATH CAMAÑO	SUPERVISOR	3168331665	s.infraestructura@monteria.gov.co
JAIME NAVARRO	APOYO A LA SUPERVISION	3006030213	infranavarroalonso@gmail.com

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato, se da inicio al mismo a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.
R.L. YESID MAJANA ACOSTA
Contratista de Obra

JAIME NAVARRO ALONSO
Apoyo a la supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisión

Elaboró: Jaime Navarro – Contratista SIM
Revisó: Andrés Berrio - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Anexo N° 4 Plan ambiental.

Carrera 52 #40-06 Barrio San Gregorio - Tel: 3007310531
Email: oficinaegv826@gmail.com Montelíbano - Córdoba

1596

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Código: P-01
		Versión: 01

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DELA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA:

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Fecha de Elaboración: 30/09/2024

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**Código:** P-01
		Versión: 01

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4
3.1. INFORMACION GENERAL 4
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO 5
3.4. POLITICAS 8
3.4.1. POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 8
3.4.2. POLITICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 8
3.5. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 90
3.6. RECURSOS 10
3.6.1. RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 10
3.6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL 10
3.6.3. HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS 11
3.6.4. SUSTANCIAS QUIMICAS 11
3.6.5. RECURSOS FÍSICOS – INFRAESTRUCTURA 12
4. LICENCIA, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES 12
4.1. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 14
4.2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 14
4.3. Evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales 18
4.4. Establecimiento de los impactos considerados severos y críticos. 20
5. PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES 21
5.1. PROGRAMA 1: ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS 21
5.2. PROGRAMA N°2: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 24
5.3. PROGRAMA N°3: MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 27
5.4. PROGRAMA N°4: OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 28
5.5. PROGRAMA 5: MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 32
5.6. PLAN DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 334
5.7. PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL 35
5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 35
5.9. CONTROL DE CAMBIOS 35

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**Código:** P-01
		Versión: 01

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger los componentes del ecosistema natural que constituye el entorno donde se realizarán actividades relacionadas con la prestación de los servicios de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA que puedan generar impactos ambientales adversos.

El PMA está desarrollado en función de la Legislación Ambiental vigente y proporciona una conexión esencial entre los impactos que se generan y las medidas de mitigación especificadas, entre los resultados del análisis de impactos y las actividades operativas. El PMA precisa medidas ambientales de prevención, mitigación, control y contingencia laboral, dentro de una serie de planes, las cuales deben ser cumplidas por todos los colaboradores de la organización, con la finalidad de cumplir con el marco legal ambiental colombiano.

Finalmente, el Plan de Manejo Ambiental debe ser entendido como una herramienta dinámica, la cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que se vayan implementando las actividades contempladas en nuestro objeto social. Esto implica mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales por parte del personal de la organización.

2. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El presente Plan de Manejo Ambiental tiene como alcance establecer las estrategias, planes, programas y mecanismos que se requieran para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generen en las actividades MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

3.1. INFORMACION GENERAL

En la Tabla N° 1 se describe la información general que identifica el consorcio y el proyecto.

Tabla N° 1: Información General del consorcio y el proyecto.

CONTRATISTA:	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S
REP LEGAL	YESID MANUEL MAJANA ACOSTA
NIT	901.613.617-3
TELEFONO	3007310531
EMAIL	Oficinaegv826@gmail.com
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
MUNICIPIO:	MONTERÍA
PLAZO EJECUCIÓN:	1 MES

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización de MONTERÍA en Córdoba (Colombia)


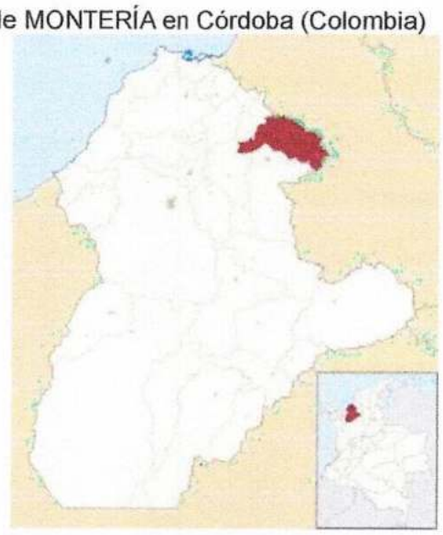


Ilustración 2. Localización zona de obra

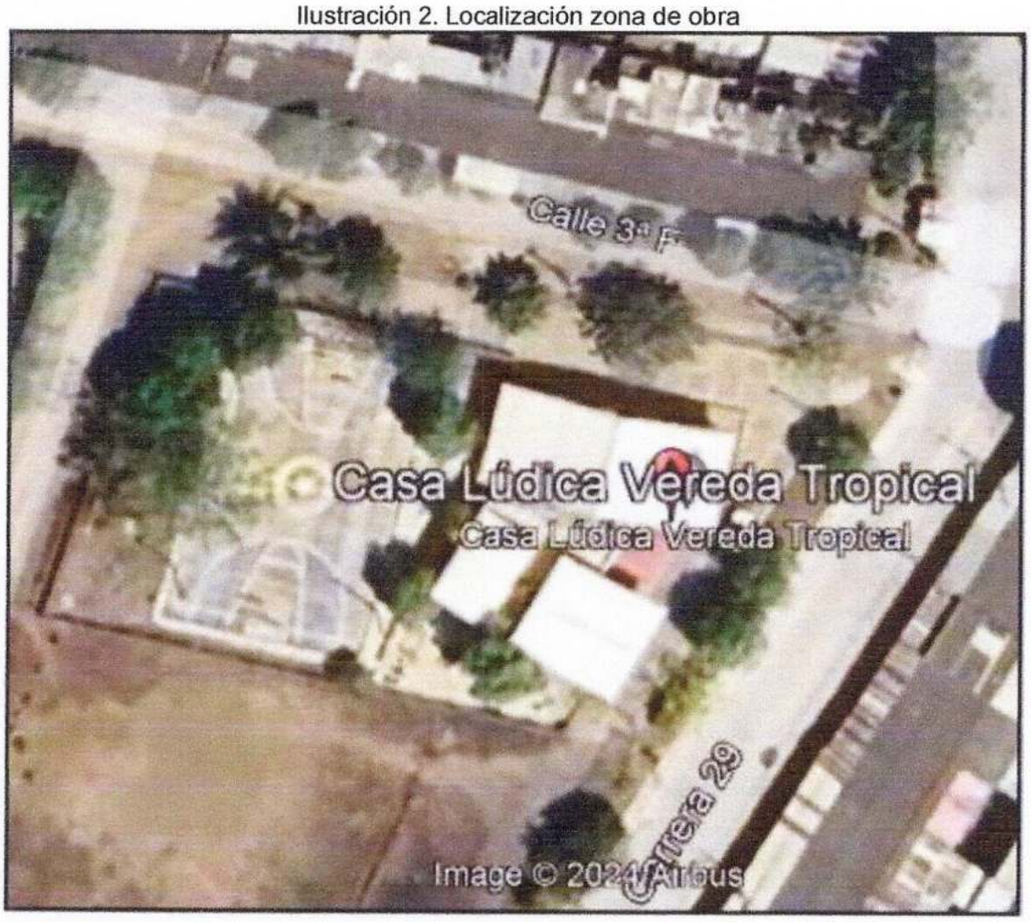

4.

4.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

En aras de comprender las actividades que se realizarán durante el proyecto, en la tabla Nº 2 se resume las actividades constructivas a realizar:

Tabla 2. Actividades del proyecto.

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Código: P-01
		Versión: 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**
1,01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA
1,02	DESMONTE DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR
2,00	**PAÑETE Y PINTURA**
2,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4
2,02	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE
2,03	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS
2,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR
2,05	PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES
2,06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO
2,07	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL
3,00	**EQUIPAMIENTOS**
3,01	CERRAMIENTO ANTI-IMPACTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)
3,02	S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M
4,00	**MANTENIMIENTO**
4,01	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACIÓN LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)
4,02	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
4,03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSIANAS EN ALUMINIO
4,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO
4,05	REPARACIÓN DE PORTERÍAS, INCLUYE TUBERÍA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS
4,06	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA
4,07	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,09	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
4,11	MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
4,12	MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
5,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**
5,01	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5,02	S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA
6,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**
6,01	S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS
6,02	S/I PORTA PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA
6,03	S/I DE GRIFERÍA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS
7,00	**URBANISMO Y PAISAJISMO**
7,01	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
7,02	SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES
7,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
7,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)
	PGIO

4.2. POLITICAS

4.2.1. POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S reconoce la importancia de implementar acciones y medidas del componente ambiental, para dar cumplimiento al componente ambiental del Sistema Integral de Gestión del proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA; y por ello, destina los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico y del talento humano para proteger el ambiente, independiente de su forma de contratación o vinculación, y manifiesta su compromisocon:

- Identificar los aspectos ambientales y valorar los impactos de cada una de las actividades que se realizarán en el proyecto y establecer los respectivos controles, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos o efectos ambientales.

- Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de gestión ambiental y los demás requisitos aplicables.

- Mejorar continuamente.

- Fomentar en los trabajadores la cultura ambientalista a través de la formación continua en materia de gestión ambiental.

Todos los trabajadores, deben asumir la responsabilidad y compromiso de contribuir al logro de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental, y cumplir con las normas y procedimientos aplicables. También, tienen la responsabilidad de notificar oportunamente todas las condiciones que puedan representar un impacto negativo al ambiente.

4.2.2. POLITICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S, reconoce la importancia de implementar un Plan deemergencias y evacuaciones medicas como elemento fundamental del Sistema Integral de Gestión del proyecto de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA para preparar a todo los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, para responder de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia, y mitigar los efectos y daños causados por eventos esperados e inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento con la legislación vigente en Colombia sobre lo pertinente, se compromete a:

Mantener y garantizar condiciones de trabajo seguras para sus trabajadores e implementar las actividades y procedimientos necesarios que promueva, facilite y proteja la integridad física de los trabajadores, procesos e instalaciones físicas.

Identificar y analizar la vulnerabilidad de las amenazas para establecer las medidas de atención frente a emergencias y desastres, así como los recursos necesarios.

Desarrollar procesos de capacitación y entrenamiento a todos sus trabajadores y capacitación específica a los integrantes de las distintas brigadas de emergencia con el fin de controlar y minimizar los riesgos inherentes a cada una de las actividades del proyecto y que puedan ser una amenaza para el mismo y sus trabajadores.

Destinar los recursos previstos en el plan de emergencias para su implementación.

Todos los trabajadores, independiente de su forma de vinculación, deben asumir la responsabilidad y compromiso de contribuir al logro de los objetivos del Plan de emergencias, y cumplir con las normas y procedimientos aplicables para llevar a cabo sus trabajos de una manera segura. También, tienen la responsabilidad de notificar oportunamente todas las condiciones que puedan representar una amenaza de emergencia.

Socialización y publicación de las políticas.

Las Políticas del componente ambiental deben ser socializadas por el Coordinador HSEQ a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación, durante la inducción, reinducción y en cualquier otro momento del proyecto en que se considere pertinente. Además, debe ser publicada con la firma del Representante Legal, en mínimo dos lugares visibles, utilizando los medios que sean más adecuados al sitio de publicación que se seleccione, como cartelera, pendón, etc.

Control de cambios y actualización de las Políticas

Como parte del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integral de Gestión del proyecto, las Políticas deben ser revisadas por lo menos una vez al año y deben actualizarse en la medida en que aparezcan modificaciones grandes en los procesos, se incluyan nuevos o se generen cambios en la infraestructura que varíen de manera significativa los riesgos.

Para esto deberá ser reportada al Coordinador HSEQ, los planes de cambio o de introducción de nuevos procesos por los mecanismos internos de comunicación.

Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe analizar su impacto sobre el medio ambiente y se determinara la necesidad de establecer una directriz dentro de las políticas.

Este procedimiento se aplicará cada vez que se planee e implemente un cambio en algún proceso o se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera significativa los riesgos asociados.

Los cambios que surjan en las políticas, deberán quedar documentados en el ítem de control de cambios de este documento, especificando la fecha y cambio realizado.

4.3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S establece los siguientes objetivos de la Gestión ambiental, conforme a la política de gestión integral y la política de Gestión ambiental:

1. Disminuir los impactos o efectos ambientales generados al ambiente.
2. Fortalecer en los trabajadores los conocimientos en materia ambiental, mediante la implementación del plan de capacitaciones, como estrategia para fomentar la educación ambiental.
3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación, evaluación y valoración de los aspectos e impactos ambientales.
4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de gestión ambiental.
5. Mejorar continuamente a partir de la implementación de acciones correctivas y preventivas.

4.4. RECURSOS

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S se compromete a proveer los recursos necesarios para laimplementación del Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo a las actividades a realizar establecidas en este plan se determinó los costos de los recursos necesarios para establecer el presupuesto que se requiere para la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

El personal debe de manera oportuna, realizar la solicitud de los recursos que se requieren para que se realice la gestión de su consecución.

En caso de requerirse la compra de un recurso se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para Compras y Contratación de Servicios.

4.4.1. RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Para la ejecución de las actividades del proyecto, se contará con un equipo de trabajo conformado por personal profesional, técnico y no calificado multidisciplinario, los cuales pueden estar vinculados directamente con el Contratista.

En Listado de personal, se relacionará el personal que hará parte del proyecto en la medida que vaya siendo contratado, y en el cual se realizará el control al estado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Todo el personal que trabaje en el proyecto independiente de su forma de vinculación, deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social.

Los trabajadores que por sus responsabilidades deban estar en obra deberán ser afiliados a Riesgos Laborales en nivel de riesgo V, y el personal administrativo que no ejecuta sus funciones y responsabilidades en la obra se afiliará en nivel de riesgo I.

4.4.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL

Las Funciones, responsabilidades y autoridades de los profesionales mínimos exigidos para el proyecto se establecieron utilizando el Perfil de cargos y funciones. A continuación, se establecen las funciones y responsabilidades asociadas al componente Ambiental, del personal administrativo y trabajadores que estarán en obra:

FUNCIONES DE TODO EL PERSONAL ASOCIADAD A LA GESTIÓN AMBIENTAL

A pesar de que el Trabajador es la razón final de la gestión ambiental y el mayor

beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la responsabilidad. Es obligación del Trabajador independiente de su forma de vinculación:

- ✓ Procurar el cuidado del ambiente.
- ✓ Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Plan de Manejo Ambiental.
- ✓ Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental.
- ✓ El seguimiento estricto de la normativa ambiental.
- ✓ Cumplir las normas y procedimientos en materia ambiental que establezca el proyecto.
- ✓ Informar a sus superiores o al responsable del Plan de Manejo Ambiental, sobre cualquier tipo de aspecto que pueda generar un impacto al ambiente.
- ✓ Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación en materia ambiental.

4.4.3. HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

Para la realización de las actividades constructivas se requiere de la utilización de herramientas, máquinas y equipos de los cuales se derivan peligros de origen mecánico y no mecánicos, por lo tanto, deben ser identificados para establecer las medidas de control necesarias para que no se materialicen los riesgos.

Durante la ejecución de la etapa de construcción del proyecto, se utilizará el listado de máquinas, para llevar un control y la relación de las máquinas que se van utilizando en el proyecto.

Por otro lado, se utilizará el Listado de Herramientas y equipos menores, para relacionar las herramientas y equipos que son utilizados en el proyecto.

Estos formatos deben actualizarse de manera mensual por el técnico y verificarse por el Coordinador HSEQ.

4.4.4. SUSTANCIAS QUIMICAS

Debido a las características propias de las sustancias químicas, tales como la facilidad para ser absorbida por el organismo a través de las diferentes vías de entrada y su capacidad de producir daños, están relacionadas con estas distintos tipos de riesgos que actúan sobre las personas y los materiales que tomen contacto con ellas, por lo tanto, se debe determinar las actividades del proyecto en las que intervienen sustancias químicas, en los que se producen los residuos peligrosos y en qué puestos de trabajo puede tener lugar la exposición de los trabajadores/as, con el fin de tomar las medidas de control necesarias para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Para la identificación de las sustancias químicas se utilizará el Listado de sustancias químicas, el cual deberá ser verificado y actualizado de manera mensual por el Coordinador HSEQ.

Una vez identificadas las sustancias químicas que se utilizan en el proyecto, se debe obtener la información toxicológica de dichas sustancias, que nos permitan conocer sus efectos sobre la salud, normas de seguridad para el uso, transporte y almacenamiento, etc. Normalmente esta información es aportada por el proveedor de las sustancias y figura en el etiquetado y en las fichas de seguridad.

4.4.5. RECURSOS FÍSICOS – INFRAESTRUCTURA

Se determina, proporciona y mantiene la infraestructura definida según la propuesta presentada al cliente, cumpliendo así, los objetivos previstos para la ejecución del proyecto. De acuerdo a los requisitos y necesidades de funcionamiento del proyecto y del cliente la infraestructura se compone de:

- Equipos de cómputo.
- Teléfono, Internet.
- Equipos y Herramientas

El Campamento se construirá antes del inicio de las obras y servirá de oficina provisional, para la protección en casos de lluvias, sitio de reunión, centro de archivo de especificaciones, planos y demás documentos requeridos en obra.

5. LICENCIA, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES Tabla 3.

Licencias, permisos y/o Autorizaciones ambientales

DESCRIPCION	REQUIERE (SI/NO)	OBSERVACION
Licencia Ambiental	No	El proyecto, según su alcance, no requiere licencia ambiental de acuerdo al decreto 2820 del 2010.
Aprobación diseño paisajístico	No	Dentro del alcance de las actividades a realizar en el proyecto no se implica diseño paisajístico.
Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación de árboles	No	En el tramo a intervenir hasta el momento no se tiene contemplado la tala árboles.
Salvoconductos para la movilización de la madera proveniente de los tratamientos realizados a la vegetación.	No	Las actividades que se realizarán en el proyecto no requieren la movilización de madera que demande de permisos especiales.

Permiso de vertimientos	No	El alcance del proyecto no requiere permiso de vertimientos.
Permiso de emisiones atmosféricas	No	El alcance del proyecto no requiere permiso de emisiones atmosféricas.
Permiso para operación de equipos de construcción o demolición, generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	No	No se realizarán trabajo en horario restringido.
Permisos relacionados con patrimonio arqueológico o histórico, si el proyecto afecta alguna zona con estas características	No	No se realizará uso de patrimonio arqueológico o histórico.

5.1. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación, evaluación y valoración de los aspectos e impactos ambientales se estableció un procedimiento el cual viene indicado por los siguientes pasos:

- Identificación de aspectos e impactos ambientales
- Evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales
- Establecimiento de los impactos considerados críticos.

Los anteriores pasos sirven como base para la toma de decisiones y establecimiento de medidas preventivas, de mitigación y de control de los impactos ambientales considerados críticos durante la valoración.

5.2. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Se debe identificar los aspectos e impactos asociados a los recursos de cada componente ambiental, de acuerdo a las condiciones y características del área de influencia directa e indirecta del proyecto identificadas en la línea base.

En la Tabla N° 4, se consolidan los aspectos e impactos de cada recurso de los componentes ambientales y una descripción del impacto.

Tabla 4. Identificación general de aspectos e impactos ambientales.

Recurso	Aspecto	Impacto	Descripción
Hídrico	Alteración de la calidad del agua	Contaminación del agua	Este impacto se refiere a la alteración en la calidad del agua susceptible de generarse por las actividades a realizarse cerca de las corrientes y por la generación de residuos provenientes de las actividades de obra.
	Vertimiento de residuos líquidos y solidos	Contaminación del agua	

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**Código:** P-01
		Versión: 01

Morfología	Alteraciones en las condiciones y formas del terreno	Degradación del suelo	Este impacto se refiere a los cambios en las condiciones, forma y estructura del suelo por las actividades de excavaciones
		Contaminación visual	
Atmosférico	Emisiones de gases	Contaminación del aire	Este impacto está dado por las emisiones de gases provenientes de los vehículos utilizados
	Emisión de material particulado	Contaminación del aire	Se refiere a la generación y emisión de material particulado por el tránsito de vehículos.
Suelo	Perdida de suelo	Disminución de los recursos naturales	Se refiere al volumen de suelo que debe ser retirado por la actividad de excavaciones.
	Alteración de las condiciones del suelo	Degradación del suelo	Se refiere a la modificación de las condiciones físicas y químicas del suelo por las actividades de excavaciones y compactación del suelo.

	Generación de residuos sólidos y líquidos	Contaminación del suelo	Se refiere a la contaminación del suelo generada por la disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos en el suelo generados por las actividades del proyecto
	Derrame de sustancias químicas	Contaminación del suelo	Se refiere a la contaminación del suelo generada por los derrames de combustibles o ACPM proveniente de los vehículos.
Flora	Alteración a la cobertura vegetal	Modificación del paisaje	Este impacto se refiere a la modificación en las condiciones naturales del paisaje provocado por las actividades de excavaciones
	Generación de residuos solidos	Contaminación visual	Este impacto se refiere a la generación de alteración visual del paisaje por la generación de residuos a causa de las excavaciones y podas.

La tabla anterior nos muestra una identificación a modo general de los aspectos e impactos ambientales que pueden presentarse durante la ejecución del proyecto, sin embargo, se debe realizar un desglose de las actividades a ejecutar y para cada una de estas identificar qué aspectos e impactos se pueden presentar de los establecidos a nivel general del proyecto, para esto se utilizará la Matriz Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales.

5.3. Evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales

La valoración de los impactos ambientales, se realizó aplicando la metodología de Conesa Simplificado. Este método utiliza una matriz para determinar la importancia Ambiental, la cual refleja la evaluación y calificación de los criterios considerados por esta metodología.

En la Matriz Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, se describen las características de los criterios de evaluación y valoración de impactos ambientales.

$$I = (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)$$

Donde;

IN= Intensidad
EX= Extensión
MO= Momento
PE= Persistencia
RV= Reversibilidad
SI= Sinergia
AC= Acumulación
AF= Efecto
PR= Periodicidad
MC= Recuperabilidad

Ahora bien, para la asignación de los valores de cada uno de los criterios, se tuvo en cuenta lo dispuesto en la siguiente tabla:

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Código: P-01
		Versión: 01

Tabla 9. Rangos para el cálculo de la importancia ambiental (Método Conesa)

CRITERIO	CALIF	CRITERIO	CALIF
NATURALEZA Impacto benéfico Impacto Perjudicial	 + -	**INTENSIDAD (IN) (Grado de destrucción)** Baja Media Alta Muy Alta Total	 1 2 4 8 12
EXTENSIÓN Puntual Parcial Extensa Total Critica	 1 2 4 8 (+4)	**MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación)** Largo Plazo Medio Plazo Inmediato Critico	 1 2 4 (+4)
PERSITENCIA (PE) Fugaz Temporal Permanente	 1 2 4	**REVERSIBILIDAD (RV)** Corto Plazo Medio Plazo Irreversible	 1 2 4
SINERGIA (SI) Sin sinergismo (simple) Sinérgico Muy sinérgico	 1 2 4	**ACOMULACIÓN (AC)** Simple Acumulativo	 1 4
EFECTO (EF) Indirecto (secundario) Directo	 1 4	**PERIODICIDAD (PR)** Irregular Periódico Continuo	 1 2 3
RECUPERABILIDAD (MC) Recuperable inmediato Recuperable a medio Mitigable o compensable Irrecuperable	 1 2 4 8	**IMPORTACIA (I)** ***I= (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)***	

De acuerdo con los valores asignados a cada criterio, la importancia del impacto puede variar entre 13 y 100 unidades, por lo que se establece la siguiente significancia (ver tabla 10).

Tabla 10. Significancia del impacto.

Rango del I	Calificación del Impacto	Significado
<25	Irrelevante	Monitorear las actividades que generan impactos irrelevantes, para tomar medidas de manejo en caso de se conviertan en impactos de mayor calificación.
25-50	Moderado	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

50-75	Severos	Corregir y adoptar medidas de manejo en las actividades de que generan impactos ambientales adversos. En caso, que el nivel del impacto está por encima de 65, se sugiere la suspensión de la actividad hasta tomar la medida correctiva.
>75	Críticos	Suspender actividades hasta que se tomen medidas correctivas de los aspectos ambientales, que generan impactos negativos. Intervención urgente.

Teniendo la metodología mostrada, se realizó el análisis de los aspectos e impactos, para cada una de las actividades desarrolladas por el proyecto: " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA los resultados se registran en la Matriz de evaluación y valoración de impactos ambientales.

5.4. Establecimiento de los impactos considerados severos y críticos.

Para definir los impactos que ameritan medidas de manejo ambiental, se tuvieron en cuenta, aquellos que después de la valoración dieron Severos y Críticos, pues estos impactos son los que representan un riesgo para el ambiente. A continuación, se describen los impactos ambientales significativos asociados a las actividades a ejecutar durante el proyecto:

Contaminación de Aire:

- Cuando se realiza excavaciones, se genera material particulado (polvo) que afecta la salud de las personas que se encuentran en el Área del proyecto, y se altera las condiciones naturales del ambiente (Sedimentación de recurso agua y obstrucción de los poros de la vegetación).
- Cuando se realizan las actividades de obra, que requieren de uso de vehículos para trasporte de materiales, se pueden generar emisiones atmosféricas (gases de efecto invernadero) y material particulado que contaminan el aire y representan un riesgo para la salud del personal que se encuentra dentro del Área del proyecto.

Contaminación Auditiva:

- Cuando se realizan excavaciones y trabajos de altura, se genera ruido a partir de la utilización de equipos menores y vehículos.

Contaminación de suelo

- En la obra se requieren sustancias químicas, las cuales por un

almacenamiento
y manejo inadecuado, pueden contaminar el suelo a causa de derrames y por la mala disposición de los recipientes que las contienen.

Degradación de suelo

- Al realizar las excavaciones del proyecto se pueden alterar las condiciones estructurales del suelo y ocasionar la degradación del mismo.

Contaminación del agua

- Al realizar el lavado equipos y maquinaria se pueden generar vertimientos (Aceites, combustible y detergentes) a los cuerpos de agua, que pueden alterarlas características fisicoquímicas del recurso hídrico.
- En la ejecución de actividades se requieren sustancias químicas, las cuales, por un almacenamiento y manejo inadecuado, pueden contaminar el agua a causa de derrames y por la mala disposición de los recipientes que las contienen.

6. PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES

Los programas de manejo que se relacionan en este capítulo, se diseñaron teniendo en cuenta los resultados de la valoración de aspectos e impactos ambientales realizados previamente. Aquellas actividades cuyo impacto negativo es moderado y grave, se le establecieron medidas de manejo en aras de mitigar, compensar y reducir su afectación.

A continuación, se relacionan los programas asociados al Plan de Manejo Ambiental del proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

6.1. PROGRAMA 1: ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

OBJETIVO

Tener herramientas conceptuales para prevenir, evitar y minimizar los impactos asociados a la ocurrencia de las amenazas susceptibles de presentarse en el área de intervención; y así mismo, conocer las estrategias de reacción y control ante la ocurrencia de estos eventos.

ETAPA DE APLICACIÓN

Ejecución del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Prevención y Control.

LUGAR DE APLICACIÓN

Montería
Departamento de Córdoba

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**Código:** P-01
		Versión: 01

RESPONSABLES

- Coordinador HSEQ
- Auxiliar HSEQ
- Auxiliar SST

NORMATIVIDAD

- Ley 1523 - 24 de abril del 2012.
- Decreto 2672 - 20 de noviembre del 2013
- Decreto 1974 - 11 de septiembre de 2013.
- Decreto 4147 - 3 de noviembre 2011.

IMPACTOS A MANEJAR

- Desplazamientos de personas, pérdida de cultivos y animales.
- Afectación de redes eléctricas,
- Interrupción del flujo vial.
- Afectación de la flora y fauna.
- Daños en la infraestructura y edificaciones,
- Pérdida de vidas.
- Contaminación del suelo y agua.
- Daños en la salud en las personas

MEDIDAS DE MANEJO

Se implementará un instrumento denominado **ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS** para determinar a partir de un análisis del riesgo de desastres, los niveles de riesgo más relevantes en relación a las diferentes amenazas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, con el fin establecer acciones que permitan, la adecuada gestión de los desastres que puedan presentarse en el área influencia del proyecto. A continuación, se describen las características generales de este Plan:

Establecimiento del contexto a partir de las características del proyecto, localización, identificación de área de influencia directa y el establecimiento dela metodología para el análisis de riesgos.

- **Identificación del riesgo** mediante la identificación de las fuentes del riesgo, las áreas de impacto, sus causas y consecuencias potenciales.
- El **análisis del riesgo** mediante la identificación de las Amenazas, sus consecuencias (Impacto) y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir (Nivel de riesgo).
- Evaluación del riesgo mediante la comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios del riesgo, para estimar la magnitud del mismo.
- **Tratamiento del riesgo** mediante el establecimiento de las medidas de intervención, a través de acciones que permitan la correcta atención y respuesta ante una emergencia.

Todas las actividades y procedimientos relacionados con el **Análisis de Riesgos y**

Plan de Contingencias se evidencian en el Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias.

CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

Como parte del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integral de Gestión del proyecto, el plan de Emergencias debe actualizarse en la medida en que aparezcan modificaciones grandes en los procesos, se incluyan nuevos o se generen cambios en la infraestructura que varíen de manera significativa las amenazas y vulnerabilidad del proyecto. Para esto deberá ser reportada al Coordinador HSEQ los planes de cambio o de introducción de nuevos procesos por los mecanismos internos de comunicación.

Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe proceder a realizar modificaciones sobre la planeación y diseño inicial, con el objeto de mitigar al máximo los posibles riesgos que puedan asociarse desde la fuente misma, para de esta manera posteriormente poder hacer un análisis de vulnerabilidad que será incluido dentro del plan de emergencias.

Este procedimiento se aplicará cada vez que se planee e implemente un cambio en algún proceso o se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera significativa los riesgos asociados. Además, deberá estar documentado dentro del formato de control de cambios del plan de emergencias, generando un plan de intervención a los peligros identificados.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Nombre del indicador	ejecución de medidas propuestas para el manejo de emergencia en relacion a las amenzas identificadas.		
Formula del indicador:	**Ind = (MEJ/ MP) * 100** MEJ = Medidas ejecutadas MP= Medidas propuestas		
Fuente:	Registros de implementación de las medidas propuestas.		
Meta:	Ind. = 100%	77% ≤ Ind. ≤ 99%	Ind. < 77%
Frecuencia de cálculo y análisis	Mensual	Responsable:	Coordinador HSEQ

6.2. PROGRAMA N°2: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

- Definir las pautas que se deben seguir en las actividades de disposición, manejo, transporte, selección y clasificación de los residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto y disminuir la generación de impactos a causa de la generación de residuos peligrosos.

- Generación de residuos peligrosos
- Alteración del paisaje.
- Contaminación de cuerpos de agua.
- Contaminación del suelo.
- Aumento en la generación de residuos.
- Alteración del paisaje.
- Invasión u ocupación del espacio público.
- Evitar molestias en la población que transita por el sector.
- Contaminación visual.
- Contaminación de cuerpos de agua.

MEDIDAS DE MANEJO:

- Se realizarán capacitaciones en cuanto a la gestión integral de los residuos. Estas capacitaciones resaltarán la importancia que representa el adecuado manejo de los residuos; se explicarán los impactos ambientales que puede generar el inadecuado manejo de estos y se dará a conocer los procedimientos que se deben seguir desde el momento en que se generan los residuos hasta que se realiza su disposición final.
- La limpieza general se realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado la zona de trabajo, y semanalmente se programará una jornada general de orden y limpieza. Los residuos sólidos se colocarán en canecas o contenedores donde se haga selección de acuerdo al tipo de residuo, y se dispondrá, si es necesario temporalmente en un sitio previsto para tal efecto, hasta ser recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos. Las canecas o contenedores deberán permanecer tapadas para evitar dispersión de olores y proliferación de vectores (ratas, mosquitos, zancudos, etc.)
- El transporte de los residuos se realizará en horarios de bajo tráfico vehicular, minimizando el transporte durante las horas pico.
- Los residuos ordinarios serán entregados a la empresa de aseo seleccionada por el contratista.
- Se prohíbe desechar los residuos de aceites, grasas y combustibles sobre los cuerpos de agua o el suelo. Estos deben ser almacenados en recipientes rígidos y deben ser almacenados en un sitio que se encuentre señalizado, donde se pueda identificar el tipo de residuo peligroso y deben colocarse sobre estibas.
- Las canecas que contengan sustancias deben reutilizarse para almacenamientos posteriores siempre y cuando sea de la misma sustancia, evitando la generación de residuos peligrosos.
- Se debe establecer un punto de acopio para los residuos peligrosos generados, que cuente con su señalización, y recipientes de tipo rígido para la disposición de los residuos
- Se realizará la correcta segregación de los residuos generados. Este proceso se apoyará con los programas de educación ambiental. Se prohíbe desechar los residuos por fuera de los contenedores designados o peor aún sobre los cuerpos de agua.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

Nombre del indicador	IPCR - Indicador personal capacitado en manejo de residuos.		
Formula del indicador:	**IPCR= (PC/ PT) * 100** PC = Personal Capacitado PT= Personal total del proyecto		
Fuente:	Registros de asistencia a capacitaciones en manejo de residuos y listado de personal en obra.		
Meta:	Ind. = 100%	90% ≤ Ind. ≤ 99%	Ind. < 90%
Frecuencia de cálculo y análisis	Mensual	Responsable:	Coordinador HSEQ

Nombre del indicador	Ejecución de medidas propuestas para el manejo y disposición de residuos.		
Formula del indicador:	**Ind = (MEJ/ MP) * 100** MEJ = Medidas ejecutadas MP= Medidas propuestas		
Fuente:	Registros de implementación de las medidas propuestas.		
Meta:	Ind. = 100%	77% ≤ Ind. ≤ 99%	Ind. < 77%
Frecuencia de cálculo y análisis	Mensual	Responsable:	Coordinador HSEQ

6.3. PROGRAMA N°3: MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

OBJETIVO

- Realizar un manejo y cuidado adecuado de la cobertura vegetal ubicada sobre el corredor vial a intervenir y sobre los frentes de obras que son fijos.

ETAPA DE APLICACIÓN

- Ejecución del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

- Prevención y control.

LUGAR DE APLICACIÓN

-

RESPONSABLES:

- Coordinador HSEQ

NORMATIVIDAD:

- Las diferentes actividades que componen el Programa de Manejo de la Vegetación sobre el tramo a intervenir, se enmarcan bajo la Ley 99/93, la cual reglamenta la normatividad y jurisdicción ambiental en el manejo de los recursos naturales.
- El Decreto 1791/96, el cual establece el régimen de aprovechamiento forestal en Colombia, definiendo clases de aprovechamiento y aduce la necesidad de solicitar o no el permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental con jurisdicción.

IMPACTOS A MANEJAR

- Alteración en el paisaje urbano
- Afectación en la calidad del suelo
- Afectación en la calidad del aire
- Alteración en los niveles de ruido
- Cambio cromático
- Cambio en la visibilidad
- Cambio en la calidad del hábitat

MEDIDAS DE MANEJO:

- Los trabajos de descapote deberán limitarse solamente en las áreas requeridas para las obras del proyecto y deberán ser aprobadas previamente por la interventoría.
- No se permite el procedimiento de desmonte mediante quema, así sea controlada, ni el uso de herbicidas, sin previo aviso a la autoridad ambiental.
- Seguir normas de seguridad en cuanto a señalización y salud ocupacional.
- Con el fin de no entorpecer otras actividades se tendrán en cuenta la demarcación y aislamiento del área, la señalización adecuada durante la ejecución, el control de contaminación, la disposición adecuada de residuos y programación adecuada para el retiro.
- No se puede arrojar basuras ni escombros en las zonas verdes.
- No se debe parquear vehículos o equipos en las zonas verdes.
- De manera preventiva, se tomarán todas las medidas de control durante los movimientos de maquinaria y equipos, señalizando aquellos individuos de la flora que puedan verse afectados por estas maniobras y así evitar aproximaciones.
- Se prohíbe utilizar los árboles que queden en pie para colocar avisos de señalización u otro tipo de cartel.
- Sobre los árboles que permanecerán en pie se prohíbe ejecutar cualquier tipo de construcción provisional, su uso como percheros, o para la instalación de hamacas y similares.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

Nombre del indicador	ejecución de medidas propuestas para el manejo de cobertura vegetal		
Formula del indicador:	**Ind = (MEJ/ MP) * 100** MEJ = Medidas ejecutadas MP= Medidas propuestas		
Fuente:	Registros de implementación de las medidas propuestas.		
Meta:	Ind. = 100%	77% ≤ Ind. ≤ 99%	Ind. < 77%
Frecuencia de calculo	Mensual	Responsable:	Coordinador HSEQ

6.4. PROGRAMA N°4: OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

OBJETIVO

- Establecer los procedimientos y controles que se deben seguir durante la etapa de construcción para prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos.

ETAPA DE APLICACIÓN

- Ejecución del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

- Prevención y Control

LUGAR DE APLICACIÓN

- Monteria

RESPONSABLES:

- Coordinador HSEQ

NORMATIVIDAD:

- Decreto 948 de 1995 (MAVDT) Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, y sus actualizaciones
- Resolución 0910 de 2008 (Minambiente y Mintransporte) Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o Diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.
- Ley 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del suelo.
- Normas locales de Tránsito y Transporte.
- Ley 491/99 define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se
