INFORME MENSUAL DE OBRA No. # 4

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 4
1. DATOS GENERALES 5
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA ..... :.5
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 6
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 6
5. ACTIVIDADES DEL MES 7
5.1. Seguimiento al plan de compras 12
5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 12
5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 17
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 18
5.5 Informes semanales 18
5.6 Actualización del aplicativo de gestión de proyectos 18
5.7 Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe 19
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 19
6.1. Plan de Calidad 19
6.1.1. Control de inspección y ensayos 19
6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo: 19
6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 19
6.3. Plan de gestión de riesgos 19
6.4. Plan ambiental 20
6.5. Plan de gestión social 20
7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 20
8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES <*Cuando aplique*> 20
9. CONTROL DE PERSONAL 21
10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 21
11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 21
12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 21
13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 22
14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 22
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 50

16. COMPLEMENTARIOS.....50
17. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 51

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría y ejerciendo el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato de obra 083 de 2024, además de la verificación y el cumplimiento de las condiciones pactadas que se ejecutarán en las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C, se presenta a continuación mediante informe de interventoría el seguimiento realizado durante el periodo del presente informe.

A continuación, se permite enumerar las sedes: Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente. Dicho contrato tendrá una duración del 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra y como consecuencia de ello la interventoría está facultada para solicitar informes, aclaraciones en lo relacionado a afiliaciones del todo el personal, tanto directo como de Subcontratistas, en cuanto a construcción se solicitara aplicar los criterios de construcción sostenible en las obras que se desarrollen en la Rama Judicial, se velara por la ejecución de las obras en armonía con la zona de influencia donde se desarrollen, sin generar impactos sociales ni ambientales negativos, también se verificara que el contratista cumpla con los requerimientos de información contractual necesaria para las obras Pliego de Condiciones con sus adendas, su propuesta con sus anexos, planos, Especificaciones, Contrato, PGAS, SG-SST, Plan de Calidad y todas las normas citadas dentro de las Especificaciones

A la fecha está planeado la intervención en el edificio la Bolsa calle 12 No 7-65 con ejecución en primera medida de los baños de piso No 6 y No 8 del edificio la Bolsa y posteriormente intervención en el piso No 8, edificio Dinner´s se está trabajando en la zona de baños de primer y segundo piso, para el edificio Almacén en Paloquemao con actividades en primer y tercer piso para la zona de baños. En el Palacio fue entregado por supervisión la Sala Plena del Palacio de Justicia en donde se está realizando mantenimiento de mobiliario en madera y enchapes de muros en el mismo material e intervención de la Comisión de disciplina en piso 7 y 8

1. DATOS GENERALES

FECHA:	30 de noviembre de 2024	**INFORME No.**	**4**

PERIODO No.	01 de noviembre	**DEL**:	**2024**	**AL**:	**30 de noviembre de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	Obra
CONTRATO No.:	083 / 3 de julio de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024 -CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S. 40% -DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS 50% -ICS GROUP SAS – 10% INTERVENTORIA: 2L PROYECTOS S.A.S. BIC
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto.

CONTRATO DE:	Obra
PLAZO TRANSCURRIDO:	63 días
VALOR INICIAL:	7000´000.000
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	7000.000.000

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	091 / 18 de julio de 2024
CONTRATISTA:	2L PROYECTOS S.A.S. BIC
PLAZO INICIAL:	124 DIAS
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	124
PLAZO TRANSCURRIDO:	63
VALOR INICIAL:	333.243.408
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	333.243.408

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha no se presenta novedades en el contrato.

5. ACTIVIDADES DEL MES

Las actividades ejecutadas a la fecha a continuación se relacionan por edificio:

PALACIO


Se realiza actividades en el Palacio de Justicia concretamente en el Consejo superior de la Judicatura, En la Corte Suprema, y Consejo de Estado

Para las oficinas se realizó la restauración de fachada puerta ventana en vidrio marcos en madera

En la zona de los despachos se revisó la restauración de bibliotecas empotradas, despacho en madera se realizó la restauración de marco en madera y la aplicación de tintilla.

Antepechos madera y ventana fachada: En los despachos s existe esta estructura la cual se revisó la restauración la cual incluyo la protección requerida, el lijado el masillado y restauración de área en madera afectada.

También se realizo la restauración de Antepecho madera ventana fachada, pueta tipo acceso a despacho, tipo puerta baño.

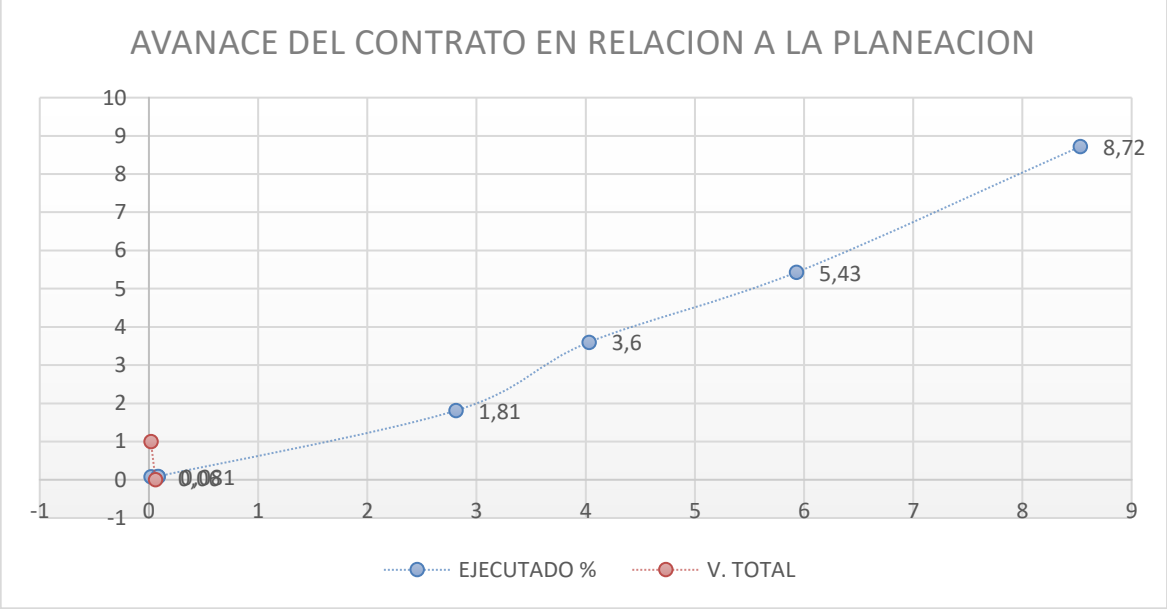

5.1. Seguimiento al plan de compras

N/A

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

A la fecha se ha presentado factores de atrasos debido a las demoras en las entregas de los espacios teniendo en cuenta que se existe situaciones que son del manejo de las partes supervisión e interventoría, además, el contratista se ha tomado tiempo en la entrega de los informes.

El Consorcio Rama Judicial 2024 remitió a la interventoría la programación mediante correspondencia del 03 de septiembre de 2024 con numeración interna CRJ -005-2024 y posteriormente remitió nuevo comunicado de fecha 05 de septiembre de 2024 CJR -006 -2024 Presupuesto Bolsa; también se recibió programación para sala Plena, edificio almacén, edificio Dinners.

Cronograma de Almacén
Fue remitida por el contratista a las partes el 05 septiembre de 2024 mediante comunicado CRJ-007-2024 PROGRAMACION EDIFICIO contemplando las siguientes actividades
Presupuesto global:

- Presupuesto baño de hombres piso 1
- Presupuesto baño de mujeres piso 3
- Presupuesto cielo raso piso 1
- Presupuesto lockers (aplica para piso 1 y piso 3)
- Presupuesto baño de mujeres piso 2
- Presupuesto baño de hombres piso 2
- Presupuesto cielo raso piso 2

Está pendiente la aprobación del ajuste a los diseños para la cubierta del parqueadero

En cuanto al mantenimiento de la escalera de emergencia se da inicio a las actividades

Para dar cumplimiento al cronograma el contratista incluyo dos cuadrillas al mismo tiempo cumpliendo para este mes con la programación.

EDIFICIO DINNERS

Ala fecha se ha dado cumplimiento a las actividades de desmontes y demoliciones dentro de los tiempos establecidos para remodelaciones de los baños del primer y segundo piso.
Se dio inicio a las actividades como son.

- Baño piso 1 tipo 1
- Baño piso 1 tipo 2
- Baño piso 1 tipo 3
- Baño piso 2 tipo 1
- Baño piso 2 tipo 2
- Baño piso 2 tipo 3
- Baño piso 2 tipo 4

SALA PLENA PALACIO DE JUSTICIA

Se ha venido realizando actividades de restauración de la sala plena del palacio de justicia de

acuerdo a observaciones presentadas por la supervisión.

En el Palacio se adelantan actividades de en:

- Piso 8 Palacio de Justicia
- Piso 7 palacio de justicia
- Aire acondicionado
- Cambio de pisos en diferentes oficinas
- Restauración de carpintería en oficinas 312, 313, 410, 412, 413, 414, 307, 310, 312, 314, 316, 401, 403, 406, 408, 410, 411, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 701, 702, 703, 801, 802, 803 y 804.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Teniendo en cuenta los puntos entregados por la supervisión el contratista remitió presupuestos y programación de algunos puntos los cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VR PARCIAL PRELIMINAR OBRA	VR PARCIAL PRELIMINAR MOBILIARIO	VR TOTAL UNITARIO	CANT.	VR TOTAL ESTIMADO	
PALACIO DE JUSTICIA					**$ 2.629.457.440,95**	**38%**
Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	$ 79.020.054,00		$ 79.020.054,00	1	$ 79.020.054,00	**1%**
AIRES ACONDICIONADOS	$ 8.000.000,00		$ 8.916.988,00	2	$ 17.833.976,00	**0%**
Restauracion de madera	$ 222.117.980,00		$ 222.117.980,00	1	$ 222.117.980,00	**3%**
cambio de marquesina	$ 124.951.600,00		$ 124.951.600,00	1	$ 124.951.600,00	**2%**
Cambio de policarbonato MACIZO	$ 319.702.240,00		$ 319.702.240,00	1	$ 319.702.240,00	**5%**
Piso 7 Comisión Nacional de Disciplina Judicial	$ 89.338.491,00	$ 213.651.838,00	$ 302.990.329,00	1	$ 302.990.329,00	**4%**
Piso 8 Comisión Nacional de Disciplina Judicial	$ 111.470.018,00	$ 280.738.821,55	$ 392.208.839,55	1	$ 392.208.839,55	**6%**
Cambio reflectores fachada interna Piso 5 Palacio	$ 52.500.000,00		$ 52.500.000,00	1	$ 52.500.000,00	**1%**
Bodega cerramiento desmontable	$ 7.188.908,00		$ 7.188.908,00	1	$ 7.188.908,00	**0%**
Despacho Magistrado - Solo Cambio de pisos	$ 12.966.406,00		$ 12.966.406,00	6	$ 77.798.436,00	**1%**
Despacho Magistrado - Solo Recuperación carpintería madera fija. (Inlcuye fachada 2 caras)	$ 44.116.652,00		$ 44.116.652,00	3	$ 132.349.956,00	**2%**

Despacho Magistrado - Cambio de pisos y Recuperación carpintería madera fija. (Inlcuye fachada 2 caras)	$ 57.083.058,00		$ 57.083.058,00	14	$ 799.162.812,00	**11%**
Despacho Magistrado - Solo Fachada 2 caras.	$ 7.834.226,40		$ 7.834.226,40	11	$ 86.176.490,40	**1%**
Despacho Magistrado- restauracion de piso	$ 7.727.910,00		$ 7.727.910,00	2	$ 15.455.820,00	**0%**
						0%
						0%
SEDE ANEXA					**$ 6.617.899,68**	**0%**
Impermeabilización cuarto planta eléctrica	$ 6.617.899,68		$ 6.617.899,68	1	$ 6.617.899,68	**0%**
						0%
						0%
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA					**$ 1.189.804.370,38**	**17%**
Adecuación piso 8 CENDOJ	$ 171.969.482,00	$ 445.146.062,00	$ 617.115.544,00	1	$ 617.115.544,00	**9%**
Cableado estructurado piso 8	$ 91.000.000,00		$ 91.000.000,00	1	$ 91.000.000,00	**1%**
Black out PISO 8	$ 44.696.825,00		$ 44.696.825,00	1	$ 44.696.825,00	**1%**
Baterías de baños hombres edificio Bolsa de Bogotá (P4 - 9)	$ 40.564.648,87		$ 40.564.648,87	6	$ 243.387.893,22	**3%**
Baterías de baños mujeres edificio Bolsa de Bogotá (P4 - 9)	$ 31.457.921,36		$ 31.457.921,36	6	$ 188.747.528,16	**3%**
Impermeabilización piso planta eléctrica sótano 2	$ 4.856.580,00		$ 4.856.580,00	1	$ 4.856.580,00	**0%**
						0%
						0%
ALMACÉN CALLE 18					**$ 417.833.785,00**	**6%**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 33.275.044,00		$ 33.275.044,00	1	$ 33.275.044,00	**0%**

Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 32.550.956,00		$ 32.550.956,00	1	$ 32.550.956,00	**0%**
Baños hombres Almacén Calle 18 (P2)	$ 26.258.167,00		$ 26.258.167,00	1	$ 26.258.167,00	**0%**
Baños mujeres Almacén Calle 18 (P2)	$ 24.875.159,00		$ 24.875.159,00	1	$ 24.875.159,00	**0%**
Adecuación vestieres baños (P1)	$ 33.275.044,00		$ 33.275.044,00	1	$ 33.275.044,00	**0%**
Adecuación vestieres baños (P3)	$ 32.550.956,00		$ 32.550.956,00	1	$ 32.550.956,00	**0%**
Redes de iluminación P1	$ 20.820.945,00		$ 20.820.945,00	1	$ 20.820.945,00	**0%**
Redes de iluminación P2	$ 33.967.052,00		$ 33.967.052,00	1	$ 33.967.052,00	**0%**
Redes de iluminación P4	$ 40.760.462,00		$ 40.760.462,00	1	$ 40.760.462,00	**1%**
Cubierta parqueadero	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00	1	$ 120.000.000,00	**2%**
Mantenimiento de escalera de emergencia	$ 19.500.000,00		$ 19.500.000,00	1	$ 19.500.000,00	**0%**
						0%
DINNERS Calle 64			**$ 126.166.699,97**		**$ 13.500.000,00**	**0%**
Puerta acceso parqueadero	$ 13.500.000,00		$ 13.500.000,00	1	$ 13.500.000,00	**0%**
						0%
TOTAL			**$ 1.572.900.897,40**		**$ 4.257.213.496,01**	**61%**
						0%
VALOR CONTRATO					**$ 7.000.000.000,00**	**100%**
SALDO POR PROYECTAR					**$ 2.742.786.503,99**	**39%**

VALOR CONTRATO	7.000.000.000,00	**valor por adjudicar**	**$ 4.682.166.598,06**

Al cierre de este informe el Contratista Rama Judicial 2024, presento acta de corte No 4 de fecha 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 por un valor de $ 485´972.041,78 cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientos setenta y dos mil cuarentas y un pesos con setenta y ocho centavos M/CTE

A la fecha acta de corte no presentan ningún desembolso

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

La interventoría de acuerdo al contrato 091 de 2024 se establecen los cobros para interventoría en dos grandes partidas por costo fijo y costo variable las cuales se relacionan a continuación

VALOR CONTRATO		$ 333.243.408,00	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	TOTAL COSTO CORTE	VR CORTE OBRA
VALOR MENSUAL	6,00000	$ 55.540.568,00	30%	70%	100%	
29-ago a 30-sep-2024	32	$ 59.243.272,53	$ 17.772.982,00	$ 3.307.173,00	$ 21.080.155,00	$ 99.241.973,00
1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 4.042.925,00	$ 4.042.925,00	$ 121.320.474,00
1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 16.662.170,00	$ 12.983.494,00	$ 29.645.664,00	$ 389.609.923,00
1-nov al 30 de nov de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 16.194.698,00	$ 16.194.698,00	$ 485.972.041,78

- Costo fijo por un valor de: $ 0
- Costo variable por un valor: $ 16´194.689,00

- Para un total de: $ 16´194.689,00

5.5 Informes semanales

A continuación, se relacional los informes semanales elaborados durante el periodo suscritos por el director de interventoría.

Semanal	Fecha
Semanal No 9	28 de octubre de 2024 al 03 de noviembre de 2024
Semanal No 10	4 de noviembre de 2024 al 10 noviembre de 2024
Semanal No 11	11 de noviembre de 2024 al 17 de noviembre de 2024
Semanal No 12	18 de noviembre al 24 de noviembre de 2024

Se anexan

5.6 Actualización del aplicativo de gestión de proyectos

Secop II, se ha realizado la alimentación con el acta de inicio y las pólizas actualizadas
Y los informes

5.7 Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe

N/A

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

6.1.1. Control de inspección y ensayos:

A la fecha no se ha realizado, protocolos y ensayos durante el periodo del informe, por lo tanto, debe adjuntar no se adjuntan certificados expedidos por el laboratorio

No se ha requerido certificados de calibración de los equipos de medición cuando sea necesario se solicitarán los expedidos por un laboratorio debidamente acreditado ante la ONAC.

6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo:

La interventoría realiza el control de ingreso y uso de la maquinaria y equipo utilizado por el contratista, es importante precisar que para el periodo reportado se registro el ingreso de herramienta menor, equipos de demolición y pulidoras, frente al uso de los mismos la interventoría genera recomendaciones de manera verbal

6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

En cumplimiento de los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y normas complementarias, la interventoría solicito al contratista la remisión del SGSST y/o plan SST aplicado al proyecto Se realiza revisión del plan SST con observaciones en espera de subsanación de las mismas.
La interventoría por su parte realiza el proceso de implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo ajustándolo a las necesidades del proyecto y a los lineamientos normativos. Es importante precisar que esta interventoría solicito al contratista la remisión del informe de gestión mensual SST SGA con los componentes requeridos de acuerdo a los lineamientos contractuales, se efectúa la revisión. y se generan las observaciones respectivas

6.3. Plan de gestión de riesgos:

N/A

6.4. Plan ambiental:

La interventoría solicita al contratista el PGAS de acuerdo a los lineamientos de la entidad contratante, el Consorcio Rama Judicial, remite el plan el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, así mismo con el fin de dar cumplimiento al Decreto 507 de 2023, se efectúa la remisión del Programa de manejo de residuos de Construcción y Demolición, el cual es presentado por el contratista

6.5. Plan de gestión social:

Se recibieron las actas de vecindad del edificio la Bolsa

7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo a las medidas de manejo requeridas para los residuos de construcción y/o demolición, el Contratista presenta el Programa de manejo ambiental de RCD (PMARCD), la interventoría efectúa la revisión respectiva generando observaciones frente a la falta de información, diligenciamiento incompleto de formatos, el contratista efectúa la subsanación respectiva, la interventoría remite el PMARCD a la supervisión con el fin de realizar el proceso de apertura de registro como generador de RCD, ante el aplicativo web de la SDA, el procedimiento se efectúa asignando al proyecto en número de PIN 26376 el 23 de septiembre del 2024.Asi mismo se solicita al contratista la remisión de las licencias y permisos ambiental de los gestores encargados del tratamiento y/o disposición final de residuos de construcción y demolición.

8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se identificaron los Np´s pendientes por entregar se numeran a continuación:

1 restauración de pisos en madera (sala plena)
2 cenefa superior nueva, remate, para tapar cableado estructurado (sala plena)
3 cambio de piezas por orificios de micrófonos en escritorios (sala plena)
4 corte de piso por cableado estructurado (sala plena)
5 columnetas para muros (edificio almacén)
6 saca núcleos por cm (edificio almacén)
7 estructura metálica con soportes en concreto en muros para mesones de mármol (bolsa, almacén, Dinners)
8 restauración de madera de cubierta (palacio de justicia)
9 policarbonato macizo de 8 mm (palacio de justicia)
10 marquesina en vidrio laminado 5+5 (palacio de justicia)
11 luminarias reflectores palacio en cubierta (palacio de justicia)
12 aire acondicionado para sala plena (palacio de justicia)
13 lamina fenólica para divisiones de baño (Bolsa, almacén, Dinners) citado

- Acta de mayores y menores cantidades (N/A)
- Acta de aprobación de ítems no previstos (N/A)

GES-FO-022 Análisis de precios unitarios, a la fecha o se han remitido.

9. CONTROL DE PERSONAL

La interventoría 2L cumplió con el personal mínimo requerido

CARGO	NOMBRE
Director de interventoría	Luis Carlos Velasco
Residente de interventoría	Carolina Pérez
Residente ambiental	Yohan Bermúdez
Residente de seguridad y salud ocupacional	Lizbeth Londoño
Inspector	Manuel Osorio

10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se relaciona el personal mínimo requerido y se anexan planillas de pago de interventoría

11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El balance presupuestal no ha cambiado debido a que no se ha suscitado cambios en el contrato y a la fecha.

12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

POLIZA No	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICION	APROBACION
1	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
1	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
1	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	

1	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BASICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	30/06/2024	66648681,60	24/09/2024	
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios, prestaciones e ind	30/12/2017	33´324.340,80	24/09/2024	
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del servicio	31/12/2029	66´648.681,60	24/09/2024	
11-44-101224630	Seguros del estado	Seriedad		33324342	07/05/2024	

13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

A continuación, se numeran los comités realizados dentro del periodo del 29 de agosto de 2024 al 30 septiembre de 2024.

Comité No 7 del 07 de noviembre de 2024
Comité No 8 del 15 de noviembre de 2024
Comité No 9 del 23 de noviembre de 2024

Se adjuntan actas de comité

14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA 2L PROYECTOS S.A.S. B.I.C RECIBIDA

LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA 2L PROYECTOS S.A.S. B.I.C ENVIADA

FECHA (mes/dd/año)	ENTIDAD	CONSECUTIVO	NUMERO COMUNICACIÓN	ASUNTO	EMISOR	RECEPTOR ENTIDAD
29/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	64	Oficio 2L-C091-2024-081 Seguimiento del contrato	Seguimiento del contrato	Interventoría	Contratista
29/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	63	Oficio 2L-C091-2024-080 Rta a comunicado de fecha 28 de noviembre de 2024 Contrato 091-2024 Observaciones seguimiento y control de interventoría	Rta a comunicado de fecha 28 de noviembre de 2024 Contrato 091-2024 Observaciones seguimiento y control de interventoría	Interventoría	Supervisor
29/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	62	Oficio 2L-C091-2024-079 Insumos y mobiliario	Insumos y mobiliario	Interventoría	Contratista
29/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	61	Correo Autorización actividades 30 de noviembre y 01 de diciembre	Autorización actividades 30 de noviembre y 01 de diciembre	Interventoría	Supervisor
29/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	60	Correo Relación de personal Actividades Diciembre de 2024	Relación de personal Actividades Diciembre de 2024	Interventoría	Supervisor
29/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	59	Correo Estructura informes de gestión mensual ambiental y SST	Estructura informes de gestión mensual ambiental y SST	Interventoría	Contratista
29/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	58	Correo Acta comité SST-Ambiental No 01	Acta comité SST-Ambiental No 01	Interventoría	Contratista

27/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	57	Oficio 2L-C091-2024-077 Ejecución de actividades	Ejecución de actividades	Interventoría	Contratista
27/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	56	Oficio 2L-C091-2024-076 APU Contractual	APU Contractual	Interventoría	Contratista
26/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	55	Correo solicitud autorización ingreso a obra	solicitud autorización ingreso a obra	Interventoría	Supervisor
26/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	54	Contratos 083 y 091-2024. Obligaciones ambientales	Contratos 083 y 091-2024. Obligaciones ambientales	Interventoría	Contratista
25/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	53	Oficio 2L-C091-2024-076 AJUSTES ADICION V3	AJUSTES ADICION V3	Interventoría	Supervisor
25/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	52	Correo solicitud autorización ingreso a obra Edificio Bolsa del 25 de noviembre a 30 de noviembre de 2024	solicitud autorización ingreso a obra Edificio Bolsa del 25 de noviembre a 30 de noviembre de 2024	Interventoría	Supervisor
25/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	51	Oficio 2L-C091-2024-076 ajuste solicitud de adición calle 73	ajuste solicitud de adición calle 73	Interventoría	Supervisor
25/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	50	Correo Contratos 083 y 091-2024. Almacenamiento y disposición de RCDs	Contratos 083 y 091-2024. Almacenamiento y disposición de RCDs	Interventoría	Contratista
25/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	49	Oficio 2L-C091-2024-076 Adición calle 72	Adición calle 72	Interventoría	Supervisor
23/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	48	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Visita ambiental y RCDs Palacio.”	“Contratos 083 y 091 de 2024. Visita ambiental y RCDs Palacio.”	Interventoría	Contratista
23/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	47	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Observación ruidos en Bolsa.”	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observación ruidos en Bolsa.”	Interventoría	Contratista

22/11/2024	Mobiliario k10design	46	Correo cotización	cotización	Interventoría	Proveedores
22/11/2024	Mobiliario k10design	45	Correo SOLICITUD DE COTIZACION	SOLICITUD DE COTIZACION	terventoría	Proveedores
21/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	44	Correo Solicitud ingreso de personal	Solicitud ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
21/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	43	Correo solicitud autorización de ingreso fin de semana (23 y 24 de noviembre de 2024)	solicitud autorización de ingreso fin de semana (23 y 24 de noviembre de 2024)	Interventoría	Supervisor
20/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	42	Correo Solicitud Mesa de Trabajo SST y Ambiental.	Solicitud Mesa de Trabajo SST y Ambiental.	Interventoría	Contratista
20/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	41	Oficio 2L-C091-2024-075 solicitud presupuesto diligenciamiento	solicitud presupuesto diligenciamiento	Interventoría	Contratista
19/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	40	Oficio 2L-C091-2024-074 Aprobacion de Np ´s	Aprobacion de Np ´s	Interventoría	Contratista
18/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	39	Correo Informe técnico y SST firmado	Informe técnico y SST firmado	Interventoría	Supervisor
17/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	38	Correo Autorización ingreso personal	Autorización ingreso personal	Interventoría	Supervisor
16/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	37	Correo CORTE N°01 DEFINITIVO	CORTE N°01 DEFINITIVO	Interventoría	Supervisor
16/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	36	Oficio 2L-C091-2024-073 “Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 3 Corte No 1.”	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 3 Corte No 1.”	Interventoría	Supervisor
15/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	35	Correo acta revision	acta revision	Interventoría	Contratista
14/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	34	Correo Solicitud Permiso actividades laborales del 16 al 17 de	Solicitud Permiso actividades laborales del 16 al 17 de	Interventoría	Supervisor

			noviembre del 2024	noviembre del 2024		
14/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	33	Correo Solicitud autorización permiso de fin de semana (16 y 17 de noviembre de 2024)	Solicitud autorización permiso de fin de semana (16 y 17 de noviembre de 2024)	Interventoría	Contratista
14/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	32	Correo Autorización de ingreso personal	Autorización de ingreso personal	Interventoría	Supervisor
14/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	31	Correo Autorización ingreso personal	Autorización ingreso personal	Interventoría	Supervisor
13/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	30	Respuesta revisión informe SST No 02	Respuesta revisión informe SST No 02	Interventoría	Contratista
13/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	29	Correo Respuesta revisión Informe Ambiental Octubre 2024	Respuesta revisión Informe Ambiental Octubre 2024	Interventoría	Contratista
12/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	28	Correo entrega d oficinas	entrega d oficinas	Interventoría	Supervisor
12/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	27	Correo RENDER CUBIERTA EDIFICIO ALMACÉN CALLE 18	RENDER CUBIERTA EDIFICIO ALMACÉN CALLE 18	Interventoría	Supervisor
11/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	26	Correo Respuesta Ficha de Datos de seguridad - sustancias quimicas	Respuesta Ficha de Datos de seguridad - sustancias quimicas	Interventoría	Contratista
11/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	25	Correo Autorización ingreso vehículo Sede Bolsa	Autorización ingreso vehículo Sede Bolsa	Interventoría	Supervisor
11/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	24	Correo Autorización de ingreso	Autorización de ingreso	Interventoría	Supervisor
11/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	23	Correo Respuesta Solicitud retiro material sede bolsa y palacio de justicia	Respuesta Solicitud retiro material sede bolsa y palacio de justicia	Interventoría	Contratista

8/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	22	Oficio 2L-C091-2024-068 plan de contingencia	plan de contingencia	Interventoría	Contratista
8/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	21	Correo Remisión acta N°01 CRJ-2024 e Interventoría 2L Proyectos SAS BIC	Remisión acta N°01 CRJ-2024 e Interventoría 2L Proyectos SAS BIC	Interventoría	Supervisor
7/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	20	Correo Permiso retiro de material - sede bolsa	Permiso retiro de material - sede bolsa	Interventoría	Supervisor
7/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	19	Correo Autorización actividades del 09 al 11 de noviembre	Autorización actividades del 09 al 11 de noviembre	Interventoría	Supervisor
7/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	18	Correo Solicitud ingreso técnicos	Solicitud ingreso técnicos	Interventoría	Supervisor
7/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	17	Correo INGRESO PERSONAL - ELECTRICOS EPG	INGRESO PERSONAL - ELECTRICOS EPG	Interventoría	Contratista
7/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	16	Correo Autorización de ingreso	Autorización de ingreso	Interventoría	Supervisor
7/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	15	Correo SOLICITUD REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL - CARPINTC	SOLICITUD REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL - CARPINTC	Interventoría	Contratista
6/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	14	Oficio 2L-C091-2024-071 REQUERMIENTOS SST	Comunicado Requerimientos SST	Interventoría	Contratista
6/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	13	Oficio 2L-C091-2024-070 Requerimientos Ambientales	Comunicado Requerimientos Ambientales	Interventoría	Contratista
5/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	12	Oficio 2L-C091-2024-069 Almacén- gotera – tercer piso	Almacén- gotera – tercer piso	Interventoría	Contratista
5/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	11	Oficio 2L-C091-2024-066 información avance Oficina	información avance Oficina 414 corte Suprema.	Interventoría	Contratista

			414 corte Suprema.			
5/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	10	Correo FACTURA	FACTURA	Interventoría	Supervisor
5/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	9	Correo Contratos 083 y 091-2024. Cuadro Proyección cortes 2 y 3.	Contratos 083 y 091-2024. Cuadro Proyección cortes 2 y 3.	Interventoría	Supervisor
5/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	8	Oficio 2L-C091-2024-068 Respuesta revisión SGSST	Comunicado 2L-C091-2024-068, Respuesta revisión SGSST	Interventoría	Contratista
4/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	7	Correo Autorización ingreso de personal técnico	Autorización ingreso de personal técnico	Interventoría	Contratista
4/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	6	Correo SOLICITUD INGRESO PERSONAL - TIBOCHE	SOLICITUD INGRESO PERSONAL - TIBOCHE	Interventoría	Contratista
2/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	5	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO LUNES 4 DE NOVIEMBRE	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO LUNES 4 DE NOVIEMBRE	Interventoría	Supervisor
1/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	4	Oficio 2L-C091-2024-067 Remisión de presupuesto aproximado $ 4.255.379.520,01	Remisión de presupuesto aproximado	Interventoría	Supervisor
1/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	3	Oficio 2L-C091-2024-065 del Proyecto Calle 73.	Contratos 083 y 091-2024. Proyecto Calle 73.	Interventoría	Contratista
1/11/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	2	Oficio 2L-C091-2024-064 inicio de actividades oficinas 314 y 316	inicio de actividades oficinas 314 y 316	Interventoría	Contratista
1/11/2024	Consejo Superior de la Judicatura	1	Oficio 2L-C091-2024-063 Remisión de programación	Programación del piso 7 y piso 8 Palacio de Justicia	Interventoría	Supervisor

LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA 2L PROYECTOS S.A.S. B.I.C

RECIBIDA

FECHA	TIPO	NUMERO COMUNICACIÓN	ASUNTO	EMISOR
(dd/mes/año)				
29/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Citación a reunión 2-dic-2024	110	Contratos 083 y 091-2024. Citación a reunión 2-dic-2024	Supervisor
29/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Seguimiento personal y avance intervenciones.	109	Contratos 083 y 091-2024. Seguimiento personal y avance intervenciones.	Supervisor
29/11/24	Correo Autorización actividades 30 de noviembre y 01 de diciembre	108	Autorización actividades 30 de noviembre y 01 de diciembre	Supervisor
29/11/24	Correo Acta numero 2 subsanada 28-11-2024	107	Acta numero 2 subsanada 28-11-2024	Contratista
28/11/24	Oficio Contratos 083 y 091-2024. Observaciones avance intervenciones.	106	Contratos 083 y 091-2024. Observaciones avance intervenciones.	Supervisor
28/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Remisión programación pisos 7 y 8 CNDJ.	105	RV: Contratos 083 y 091-2024. Remisión programación pisos 7 y 8 CNDJ.	Supervisor
28/11/24	Oficio Solicitud revisión del personal y vehículos para ingreso del mes de Diciembre	104	Solicitud revisión del personal y vehículos para ingreso del mes de Diciembre	Contratista
28/11/24	Oficio Contrato 091-2024. Observaciones seguimiento interventoría	103	Contrato 091-2024. Observaciones seguimiento interventoría	Supervisor
27/11/24	Correo Reiteración. RV: Contratos 083 y 091-2024.	102	Reiteración. RV: Contratos 083 y 091-2024. Esquema Cerramiento bodega Palacio	Supervisor

	Esquema Cerramiento bodega Palacio			
27/11/24	Correo ACTA NUMERO 2 27-11-2024	101	ACTA NUMERO 2 27-11-2024	Contratista
27/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Señalización tipo Bolsa, Almacén y Calle 64.	100	Contratos 083 y 091-2024. Señalización tipo Bolsa, Almacén y Calle 64.	Supervisor
27/11/24	Correo Permiso de trabajado del 30 de noviembre a 1 de diciembre de 2024	99	Permiso de trabajado del 30 de noviembre a 1 de diciembre de 2024	Contratista
27/11/24	Correo Subsanación observaciones de informe mes de octubre	98	Subsanación observaciones de informe mes de octubre	Contratista
27/11/24	Oficio Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones equipos Piso 8 Bolsa y otros.	97	Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones equipos Piso 8 Bolsa y otros.	Supervisor
27/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Esquemas ajustados Centro de memoria y otros.	96	Contratos 083 y 091-2024. Esquemas ajustados Centro de memoria y otros.	Supervisor
26/11/24	CorreoRespuesta revisión Informe Ambiental Octubre 2024	95	Respuesta revisión Informe Ambiental Octubre 2024	Contratista
26/11/24	Correo soportes para ingreso de personal	94	soportes para ingreso de personal	Contratista
26/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Obligaciones ambientales	93	Contratos 083 y 091-2024. Obligaciones ambientales	Contratista
26/11/24	Correo solicitud autorización ingreso a obra	92	solicitud autorización ingreso a obra	Supervisor
26/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de	91	“Contratos 083 y 091 de 2024. Visita ambiental y RCDs Palacio.”	Contratista

	2024. Visita ambiental y RCDs Palacio.”			
25/11/24	Correo CRJ-044-2024-SOLICITUD DE ADICIÓN SUBSANADA	90	CRJ-044-2024-SOLICITUD DE ADICIÓN SUBSANADA	Contratista
25/11/24	Correo Documentación adición calle 73	89	Documentación adición calle 73	Contratista
25/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Almacenamiento y disposición de RCDs	88	Contratos 083 y 091-2024. Almacenamiento y disposición de RCDs	Contratista
25/11/24	Correo NO PREVISTOS SUBSANADOS CON FIRMA	87	NO PREVISTOS SUBSANADOS CON FIRMA	Contratista
25/11/24	Oficio CRJ-044-2024 DOCUMENTACIÓN ADICIÓN CALLE 73	86	DOCUMENTACIÓN ADICIÓN CALLE 73	Contratista
23/11/24	Correo solicitud autorización ingreso a obra Edificio Bolsa del 25 de noviembre a 30 de noviembre de 2024	85	solicitud autorización ingreso a obra Edificio Bolsa del 25 de noviembre a 30 de noviembre de 2024	Contratista
23/11/24	Correo SOLICITUD ADICION NPS Y PRESUPUESTO CALLE 73	84	SOLICITUD ADICION NPS Y PRESUPUESTO CALLE 73	Contratista
22/11/24	Oficio CRJ-043-2024 NO PREVISTO Y CUADRO COMPARATIVO LUMINARIA EXTERIOR PALACIO	83	NO PREVISTO Y CUADRO COMPARATIVO LUMINARIA EXTERIOR PALACIO	Contratista
21/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Inicio intervenciones Centro de memoria y otras.	82	Contratos 083 y 091-2024. Inicio intervenciones Centro de memoria y otras.	Supervisor

21/11/24	Correo Autorización de ingreso	81	Autorización de ingreso	Supervisor
21/11/24	Correo NPS CALLE 73 21 -11-2024	80	NPS CALLE 73 21 -11-2024	Contratista
21/11/24	Correo solicitud autorización de ingreso fin de semana (23 y 24 de noviembre de 2024)	79	solicitud autorización de ingreso fin de semana (23 y 24 de noviembre de 2024)	Contratista
21/11/24	Correo Solicitud ingreso de personal	78	Solicitud ingreso de personal	Supervisor
21/11/24	Correo PRESUPUESTO CALLE 73 21-11-2024	77	PRESUPUESTO CALLE 73 21-11-2024	Contratista
20/11/24	Correo Solicitud Mesa de Trabajo SST y Ambiental.	76	Solicitud Mesa de Trabajo SST y Ambiental.	Contratista
20/11/24	Oficio CRJ-042 2L-C091-2024-070, Requerimientos Ambientales	75	Comunicado 2L-C091-2024-070, Requerimientos Ambientales	Contratista
20/11/24	Correo NO PREVISTOS 10-12-14	74	NO PREVISTOS 10-12-14	Contratista
20/11/24	Correo solicitud de verificación de documentos Auxiliares Ing. civil	73	solicitud de verificación de documentos Auxiliares Ing. civil	Contratista
19/11/24	Correo Aprobacion de Np ´s	72	Aprobacion de Np ´s	Contratista
19/11/24	Correo APus CONTRACTUALES CONSORCIO RAMA	71	APus CONTRACTUALES CONSORCIO RAMA	Contratista
19/11/24	Correo PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE de 2024	70	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE de 2024	Contratista
19/11/24	Correo NPS SUBSANADOS 19-11-2024	69	NPS SUBSANADOS 19-11-2024	Contratista

19/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Observación ruidos en Bolsa.”	68	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observación ruidos en Bolsa.”	Contratista
19/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Centro de memoria. Esquema ajustado 18-nov-2024.”	67	“Contratos 083 y 091 de 2024. Centro de memoria. Esquema ajustado 18-nov-2024.”	Contratista
18/11/24	Correo Póliza actualización acta de inicio contrato 091 de 2024	66	Póliza actualización acta de inicio contrato 091 de 2024	Supervisor
18/11/24	Correo NPS SUBSANADOS 01-02-03-04-09-11	65	NPS SUBSANADOS 01-02-03-04-09-11	Contratista
18/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Corte 1 remitido para trámite de pago.”	64	“Contratos 083 y 091 de 2024. Corte 1 remitido para trámite de pago.”	Supervisor
18/11/24	Correo Contrato 091-2024. Cumplido Corte 1. RE: Informe técnico y SST firmado	63	Contrato 091-2024. Cumplido Corte 1. RE: Informe técnico y SST firmado	Supervisor
18/11/24	Correo Solicitud ingreso de personal del 18 a 30 noviembre de 2024	62	Solicitud ingreso de personal del 18 a 30 noviembre de 2024	Contratista
18/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Formatos presentación presupuesto Calle 73 y NPs.	61	Contratos 083 y 091-2024. Formatos presentación presupuesto Calle 73 y NPs.	Supervisor
16/11/24	Correo ACLARACIÓN. RV: Contratos 083 y 091-2024. Despacho 313 Consejo Superior. Inicio 16-dic-2024.	60	ACLARACIÓN. RV: Contratos 083 y 091-2024. Despacho 313 Consejo Superior. Inicio 16-dic-2024.	Supervisor
15/11/24	Correo CORTE DE OBRA NUMERO 2 RAMA JUDICIAL	59	CORTE DE OBRA NUMERO 2 RAMA JUDICIAL	Contratista

15/11/24	Correo SOLICITUD REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL - CARPINTC	58	SOLICITUD REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL - CARPINTC	Contratista
15/11/24	Correo Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas Proyecto Centro Memoria.”	57	Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas Proyecto Centro Memoria.”	Supervisor
15/11/24	Correo Soportes para revision e ingreso de personal a obra del 16 a 30 de noviembre de 2024	56	Soportes para revision e ingreso de personal a obra del 16 a 30 de noviembre de 2024	Contratista
15/11/24	Correo Solicitud Permiso actividades laborales del 16 al 17 de noviembre del 2024	55	Solicitud Permiso actividades laborales del 16 al 17 de noviembre del 2024	Supervisor
15/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Calle 73. Presupuesto proyectado ajustado.	54	Contratos 083 y 091-2024. Calle 73. Presupuesto proyectado ajustado.	Supervisor
14/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despacho. Of. 303 Corte Suprema.	53	Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despacho. Of. 303 Corte Suprema.	Supervisor
14/11/24	Correo DOCUMENTACIÓN PARAFISCALES Y CERTIFICACIONES DE CONTADORES	52	DOCUMENTACIÓN PARAFISCALES Y CERTIFICACIONES DE CONTADORES	Contratista
14/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 3 Corte No 1.”	51	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 3 Corte No 1.”	Supervisor
14/11/24	Correo Solicitud autorización permiso de fin de	50	Solicitud autorización permiso de fin de semana (16 y 17 de noviembre de 2024)	Contratista

	semana (16 y 17 de noviembre de 2024)			
14/11/24	Correo Contratos 083 y 091 de 2024. Detalles y acabados Pisos 7 y 8 CNDJ.”	49	Contratos 083 y 091 de 2024. Detalles y acabados Pisos 7 y 8 CNDJ.”	Supervisor
14/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. solicitud corrección Corte 1 obra.	48	Contratos 083 y 091-2024. solicitud corrección Corte 1 obra.	Supervisor
14/11/24	Correo Autorización de ingreso personal	47	Autorización de ingreso personal	Supervisor
14/11/24	Correo Autorización ingreso personal	46	Autorización ingreso personal	Supervisor
13/11/24	Oficio CRJ-041-2024 CARGUE DE SDA COMPONENTE AMBIENTAL	45	CARGUE DE SDA COMPONENTE AMBIENTAL	Contratista
13/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Despacho 313 Consejo Superior. Inicio 16-dic-2024.	44	Contratos 083 y 091-2024. Despacho 313 Consejo Superior. Inicio 16-dic-2024.	Supervisor
13/11/24	Correo CORRECCIONES ACTA NUMERO 1	43	CORRECCIONES ACTA NUMERO 1	Contratista
13/11/24	Correo Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones equipos Piso 8 Bolsa y otros.	42	Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones equipos Piso 8 Bolsa y otros.	Supervisor
12/11/24	Correo Solicitud ingreso personal	41	Solicitud ingreso personal	Contratista
12/11/24	Correo Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 2 Corte No 1.	40	Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 2 Corte No 1.	Supervisor
12/11/24	Correo solicitud ingreso personal	39	solicitud ingreso personal	Contratista
12/11/24	Correo Autorización	38	Autorización ingreso vehículo Sede Bolsa	Supervisor

	ingreso vehículo Sede Bolsa			
12/11/24	Correo Autorización de ingreso	37	Autorización de ingreso	Supervisor
09/11/24	Correo Anexo Ficha de Datos de seguridad - sustancias quimicas	36	Anexo Ficha de Datos de seguridad - sustancias quimicas	Contratista
09/11/24	Correo Solicitud retiro material sede bolsa y palacio de justicia	35	Solicitud retiro material sede bolsa y palacio de justicia	Contratista
08/11/24	Correo FACTURA SUBSANADA CORTE DE OBRA NUMERO 1 RAMA JUDICIAL	34	FACTURA SUBSANADA CORTE DE OBRA NUMERO 1 RAMA JUDICIAL	Contratista
08/11/24	Correo Permiso retiro de material - sede bolsa	33	Permiso retiro de material - sede bolsa	Supervisor
08/11/24	Correo Autorización actividades del 09 al 11 de noviembre	32	Autorización actividades del 09 al 11 de noviembre	Supervisor
07/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Intervención Despachos pisos 5, 6, 7 y 8 Palacio.”	31	“Contratos 083 y 091 de 2024. Intervención Despachos pisos 5, 6, 7 y 8 Palacio.”	Supervisor
07/11/24	Correo DOCUMENTOS FALTANTES PARA CORTE DE OBRA NUMERO 1	30	DOCUMENTOS FALTANTES PARA CORTE DE OBRA NUMERO 1	Contratista
07/11/24	Correo Solicitud aprobación ingreso de vehiculo - edificio bolsa	29	Solicitud aprobación ingreso de vehiculo - edificio bolsa	Contratista
07/11/24	Correo Ingreso personal	28	Ingreso personal	Contratista
07/11/24	Correo solicitud permiso de	27	solicitud permiso de trabajo fin de semana	Contratista

	trabajo fin de semana			
07/11/24	Correo Autorización de ingreso	26	Autorización de ingreso	Supervisor
07/11/24	Correo Solicitud ingreso técnicos	25	Solicitud ingreso técnicos	Supervisor
07/11/24	Oficio CRJ-038, CORRECCIONES DE CORTE NUMERO 1 RAMA JUDICIAL	24	CORRECCIONES DE CORTE NUMERO 1 RAMA JUDICIAL	Contratista
06/11/24	Correo Comunicado 2L-C091-2024-071 Requerimientos SST	23	Comunicado 2L-C091-2024-071 Requerimientos SST	Supervisor
06/11/24	Correo SOLICITU PERMISO INGRESO A OBRA - TECNICOS	22	SOLICITU PERMISO INGRESO A OBRA - TECNICOS	Contratista
06/11/24	Correo INGRESO PERSONAL - ELECTRICOS EPG	21	INGRESO PERSONAL - ELECTRICOS EPG	Contratista
06/11/24	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO FIN DE SEMANA (9 A 11 DE NOVIEMBRE 2024)	20	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO FIN DE SEMANA (9 A 11 DE NOVIEMBRE 2024)	Contratista
06/11/24	Correo Informe Ambiental Octubre 2024	19	Informe Ambiental Octubre 2024	Contratista
05/11/24	Correo INFORME SST - MES OCTUBRE	18	INFORME SST - MES OCTUBRE	Contratista
05/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Archivo proyección ajustado y despachos con cronograma	17	Contratos 083 y 091-2024. Archivo proyección ajustado y despachos con cronograma	Supervisor
05/11/24	Correo FACTURA	16	FACTURA	Supervisor
05/11/24	Correo Contrato 091-2024. Cuadro ajustado cálculo	15	Contrato 091-2024. Cuadro ajustado cálculo valor cortes interventoría.	Supervisor

	valor cortes interventoría.			
05/11/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 2 Corte No 1.”	14	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 2 Corte No 1.”	Supervisor
05/11/24	Oficio Contratos 083 y 091-2024. Solicitud Inspección filtraciones Almacén Calle 18.	13	Contratos 083 y 091-2024. Solicitud Inspección filtraciones Almacén Calle 18.	Supervisor
05/11/24	Oficio CRJ-037, Correo Contratos 083 y 091-2024. Solicitud información avance Of. 414 Corte Suprema.	12	Contratos 083 y 091-2024. Solicitud información avance Of. 414 Corte Suprema.	Contratista
05/11/24	Correo SOLICITUD INGRESO PERSONAL - TIBOCHE	11	SOLICITUD INGRESO PERSONAL - TIBOCHE	Contratista
05/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Solicitud Inspección filtraciones Almacén Calle 18.	10	Contratos 083 y 091-2024. Solicitud Inspección filtraciones Almacén Calle 18.	Supervisor
05/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Cuadro Proyección cortes 2 y 3.	9	Contratos 083 y 091-2024. Cuadro Proyección cortes 2 y 3.	Supervisor
05/11/24	Correo ACTA DE CORTE NUMERO 2 RAMA JUDICIAL + MEMORIAS	8	ACTA DE CORTE NUMERO 2 RAMA JUDICIAL + MEMORIAS	Contratista
02/11/24	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO LUNES 4 DE NOVIEMBRE	7	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO LUNES 4 DE NOVIEMBRE	Supervisor
01/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Programación Despachos Consejo de Estado 314 y 316.	6	Contratos 083 y 091-2024. Programación Despachos Consejo de Estado 314 y 316.	Supervisor

01/11/24	Correo PROGRAMACIÓN PISO 7 Y 8 COMISIÓN DE DISCIPLINA PALACIO DE JUSTICIA	5	PROGRAMACIÓN PISO 7 Y 8 COMISIÓN DE DISCIPLINA PALACIO DE JUSTICIA	Contratista
01/11/24	Correo CORTE DE OBRA NÚMERO 2 CONSORCIO RAMA JUDICIAL	4	CORTE DE OBRA NÚMERO 2 CONSORCIO RAMA JUDICIAL	Contratista
01/11/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Proyecto Calle 73.	3	Contratos 083 y 091-2024. Proyecto Calle 73.	Supervisor
01/11/24	orreo Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 1 Corte No 1.	2	Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones 1 Corte No 1.	Supervisor

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta registro fotográfico:

Palacio de Justicia – Consejo de Estado

Foto N°01 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°02 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de fachadas piso 3°	Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 3°

Foto N°03 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°04 Palacio de Justicia – Consejo de Estado

	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 3°	Restauración de carpintería en madera de Mueble inferior de ventana piso 3°

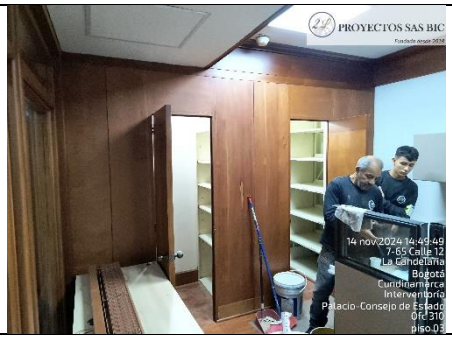
Foto N°05 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°06 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Archivo piso 3°	Restauración de carpintería de madera en marcos y puertas del piso 3°

Foto N°07 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°08 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de fachadas piso 4°	Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 4°

Foto N°09 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°10 Palacio de Justicia – Consejo de Estado

	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 4°	Restauración de carpintería en madera de Mueble inferior de ventana piso 4°

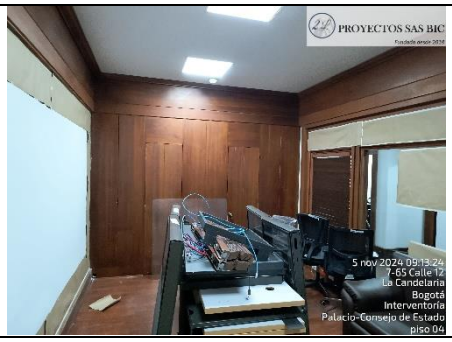
Foto N°11 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°12 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Archivo piso 4°	Restauración de carpintería de madera en marcos y puertas del piso 4°
Foto N°13 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°14 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de fachadas piso 5°	Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 5°

Foto N°15 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°16 Palacio de Justicia – Consejo de Estado

	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Biblioteca piso 5°	Restauración de carpintería en madera de Mueble inferior de ventana piso 5°

Foto N°17 Palacio de Justicia – Consejo de Estado	Foto N°18 Palacio de Justicia – Consejo de Estado
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de Archivo piso 5°	Restauración de carpintería de madera en marcos y puertas del piso 5°

Foto N°19 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena	Foto N°20 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de marcos y puertas piso 5°	Restauración de carpintería de madera en muros piso 5°

Foto N°21 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena	Foto N°22 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena

	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería de madera en muros piso 5°	Restauración de carpintería de madera en muros piso 5°

Foto N°23 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena	Foto N°24 Palacio de Justicia – Consejo de Estado – Sala Plena
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Restauración de carpintería en madera de mesas piso 5°	Restauración de carpintería en madera de mesas piso 5°

16. COMPLEMENTARIOS

Nota: Para el informe final de interventoría se debe incluir contenido del manual de mantenimiento entregado por el contratista y la respectiva aprobación de la interventoría.

17. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Observaciones:

Es necesaria la coordinación al interior de los encargados de las diferentes sedes para entrega de los espacios y con ello lograr el aprovechamiento de los mismo y por ende el tiempo de ejecución de actividades

Recomendaciones

La interventoría recomienda realizar un acercamiento entre la entidad el contratista e interventoría

Conclusiones

Es importante la entrega de los presupuestos, flujo de caja y programación a cargo del contratista dentro de los tiempos contractuales, teniendo en cuenta que es un insumo necesario para la presentación de informes.

Se requiere mayor formalidad de parte del contratista para la presentación del personal que va a ingresar a las sedes, es un requisito establecido por la supervisión.

Es de vital importancia realizar la entrega de actividades semanalmente para la alimentación de los informes y desde luego del acta de cobro.

De acuerdo al funcionamiento del contrato se requiere tener stock de materiales en las diferentes obras para dar continuidad y evitar los posibles atrasos

Se debe dar cumplimiento a las medidas de gestión para el manejo, acopio de Residuos de construcción y demolición

Durante el periodo reportado no se registran accidentes ni incidentes

El contratista debe mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, frente al mejoramiento de condiciones de orden ya aseo, señalización, demarcación, uso adecuado de EPP y dotación.

Aprobado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
LUIS CARLOS GALVIS	LAURA TRIANA	CAROLINA PEREZ

director interventoría	R.L de interventoría	Residente
2L PROYECTOS SAS BIC	2L PROYECTOS SAS BIC	2L PROYECTOS SAS BIC

ANEXOS:

- ANEXO 1 Informe Semanal de Interventoría
- ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
- ANEXO 3 Balance. (Ver numeral 03 de lista de chequeo).
- ANEXO 4 Acta de aprobación de ítems no previstos (Pendiente).
- ANEXO 5 Análisis de precios unitarios (Pendiente**).**
- ANEXO 6 Equipos de Medición y Ensayo.
- ANEXO 7 Control de Maquinaria y Equipos.
- ANEXO 8 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (Ver informe SST)
- ANEXO 9 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental. (Ver informe técnico numeral 6.4 pág 20).
- ANEXO 10 Control de Personal. (Ver informe técnico numeral 9 pág 21).
- ANEXO 11 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. (Ver informe técnico numeral 10 pág 21).
- ANEXO 12 Pólizas.
- ANEXO 13 Relación de Correspondencia Enviada-Recibida. (Ver informe técnico numeral 14 pág 22).
- ANEXO 14 Factura. (Ver numeral 08 de lista de chequeo).
- ANEXO 15 RUT, autorización de facturación, certificación bancaria y pagos de seguridad. (Ver numeral 09 de lista de chequeo).
- ANEXO 16 Acta de obra. (Ver numeral 05 de lista de chequeo).
- ANEXO 17 Acta de interventoría. (Ver numeral 06 de lista de chequeo).
- ANEXO 18 Actas de comité.

ANEXO 19 Informe de gestión SST y ambiental
