Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **10**
PERIODO: **8/11/2024 AL 16/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		4,76%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC		CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024	
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024		CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024	
VALOR INICIAL:	$ 333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$ 7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ -	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 333.243.408,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 7.000.000.000,00**	
PLAZO INICIAL:	**124,00**		PLAZO INICIAL:	**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:	**114**		PLAZO ACTUALIZADO:	**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	
FECHA DE REINICIACIÓN:	-		FECHA DE REINICIACIÓN:	-	
FECHA DE INICIACIÓN:	**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:	**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$ 45.506.700,00**	**13,66%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 955.898.588,39**	**13,66%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 287.736.708,00**	**86,34%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 6.044.101.411,61**	**86,34%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	17,43%	11,98%	-5,45%
Acumulado semana anterior	5,96%	1,68%	4,28%
Acumulado Actual	23,39%	13,66%	-9,73%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

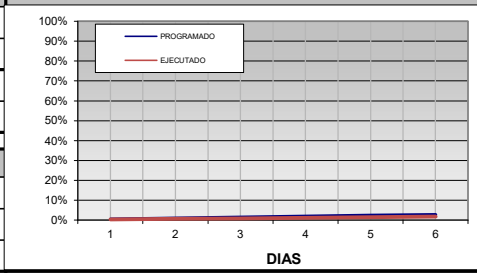

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-0,97

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$ 0,61	$RECURSO PROGRAMADO	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 4	$ 0,41	$ 16.631.506,04		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 4	$ 0,41	$ 12.897.747,76		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 5	$ 0,43	$ 17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 5	$ 0,43	$ 13.526.906,18		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 6	**$ 1,00**	$ 40.564.648,87	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 1,00	$ 31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$ 0,43	$ 17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 7	$ 0,43	$ 13.526.906,18		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 1,00	$ 40.564.648,87	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 8	$ 1,00	$ 31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09

BAÑO HOMBRES PISO 9	$ 0,43	$ 17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 9	$ 0,43	$ 13.526.906,18		$ 0,00
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	$ 0,26	$ 160.450.041,71		$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	$ -	$ -		$ 0,00
BLACK OUT BOLSA	$ -	$ -		$ 0,00
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	$ -	$ -		$ 0,00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	$ 0,63	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 0,75	$ 59.265.040,89	100%	$ 79.020.054,52
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	$ 0,26	$ 101.974.298,40	10%	$ 39.220.884,00
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	$ 0,26	$ 78.777.486,06	10%	$ 30.299.033,10
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	$ -	$ -		$ 0,00
AIRES ACONDICIONADOS	$ 0,78	$ 12.480.000,00	100%	$ 16.000.000,00
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	**$** -	$ -		$ 0,00
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	$ -	$ -		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 102 CS	$ -	$ -		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 103 CS	$ -	$ -		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 306 CS	$ -	$ -		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 307 CS	**$ 1,00**	$ 12.966.406,00	100%	$ 12.966.406,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	$ -	$ -		$ 0,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 313 CS	$ -	$ -		$ 0,00
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	$ -	$ -		$ 0,00
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	$ -	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	**$ 1,00**	$ 57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	**$ 1,00**	$ 57.083.058,00	80%	$ 45.666.446,40
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	**$ 1,00**	$ 57.083.058,00	70%	$ 39.958.140,60
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	**$ 1,00**	$ 57.083.058,00	80%	$ 45.666.446,40
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	**$ 1,00**	$ 57.083.058,00	50%	$ 28.541.529,00
CAMBIO DE PISO 307 CE	**$ 1,00**	$ 12.966.406,00		$ 0,00

CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$	**0,90**	$ 51.374.752,20	10%	$ 5.708.305,80
CAMBIO DE PISO 311 CE	$	-	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CE	$	-	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CE	$	**0,71**	$ 40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CE	$	**0,71**	$ 40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CE	$	**0,33**	$ 18.837.409,14	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CE	$	-	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CE	$	**0,71**	$ 40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$	**1,00**	$ 57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CE	$	-	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CE	$	-	$ -		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$	**1,00**	$ 57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$	**0,14**	$ 7.991.628,12		$ 0,00

EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$**	**0,58**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	**$**	**1,00**	$ 20.280.487,24	65%	$ 13.182.316,71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	**$**	**1,00**	$ 22.515.064,18	65%	$ 14.634.791,72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	**$**	**1,23**	$ 28.726.005,42		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	**$**	**1,23**	$ 14.275.038,06		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	**$**	**0,64**	$ 7.333.382,40	30%	$ 3.437.523,00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	**$**	**0,64**	$ 6.940.058,24	30%	$ 3.253.152,30
BAÑO PISO 2 TIPO 4	**$**	-	$ -		$ 0,00
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	**$**	-	$ -		$ 0,00
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$**	**0,60**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	**$**	**1,00**	$ 33.275.044,00	50%	$ 16.637.522,00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	**$**	**1,00**	$ 32.550.956,00	50%	$ 16.275.478,00
BAÑO PISO 2 MUJERES	**$**	**0,35**	$ 8.706.302,15		$ 0,00
BAÑO PISO 2 HOMBRES	**$**	**0,35**	$ 9.199.808,45		$ 0,00
CIELO RASO PISO 1	**$**	-	$ -		$ 0,00
CIELO RASO PISO 2	**$**	-	$ -		$ 0,00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	**$**	**0,67**	$ 22.294.279,48	46%	$ 15.306.520,24
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	**$**	**0,67**	$ 22.294.279,48	46%	$ 15.306.520,24
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**$**	-	$ -		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**$**	-	$ -		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**$**	-	$ -		$ 0,00
CUBIERTA PARQUEADERO	**$**	-	$ -		$ 0,00
MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	**$**	-	$ -		$ 0,00
SEDE ANEXA	**$**	-	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	**$**	-	$ -		$ 0,00
CALLE 73	**$**	-	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**

SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	$ -	$ -	$ 0,00

% PROGRAMADO	23,39%
% EJECUTADO	13,66%

OBRA	INTERVENTORÍA
	
FERNEY PEÑA	LUIS CARLOS GALVIS
Director de Obra	Director de Interventoría
RAZÓN SOCIAL	2I PROYECTOS SAS BIC
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1,



Fuente: consorcio rama judicial

Desmonte de aparatos sanitarios

FOTO 2,



Fuente: consorcio rama judicial

desmonte de cerramiento planta de la bolsa

FOTO 3,



Fuente: consorcio rama judicial

construccion de muros de mamposteria

FOTO 4,



Fuente: consorcio rama judicial

restauracion de madera en fachadas
