Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **11**
PERIODO: **15/11/2024 AL 23/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC			CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 333.243.408,00			VALOR INICIAL:	$ 7.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN 1:	$ -			VALOR ADICIÓN 1:	$ -		
VALOR ADICIÓN 2:	$ -			VALOR ADICIÓN 2:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 333.243.408,00**			**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 7.000.000.000,00**		
PLAZO INICIAL:	124,00			PLAZO INICIAL:	124		
PLAZO ACTUALIZADO:	114			PLAZO ACTUALIZADO:	23/04/1900		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-			FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		
FECHA DE REINICIACIÓN:	-			FECHA DE REINICIACIÓN:	-		
FECHA DE INICIACIÓN:	29/08/2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29/08/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024		
VALOR EJECUTADO:	$ 61.313.520,00	18,40%		VALOR EJECUTADO:	$ 1.287.931.380,09	18,40%	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 271.929.888,00	81,60%		VALOR POR EJECUTAR:	$ 5.712.068.619,91	81,60%	

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,39%	13,66%	-9,73%
Acumulado semana anterior	5,84%	4,74%	1,10%
Acumulado Actual	29,23%	18,40%	-10,83%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-1,08

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

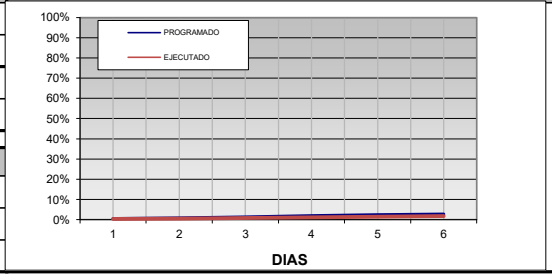

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	67%	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 4	$ 21.904.910,39	54%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 4	$ 16.987.277,53	54%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 5	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 5	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 7	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10

BAÑO MUJERES PISO 8	$ 31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 9	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 9	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	$ 234.503.907,12	38%		$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	$ -	0%		$ 0,00
BLACK OUT BOLSA	$ -	0%		$ 0,00
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	$ -	0%		$ 0,00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**69%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 65.586.645,25	83%	100%	$ 79.020.054,52
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	$ 149.039.359,20	38%	20%	$ 78.441.768,00
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	$ 115.136.325,78	38%	20%	$ 60.598.066,20
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	$ -	0%		$ 0,00
AIRES ACONDICIONADOS	$ 13.760.000,00	86%	100%	$ 16.000.000,00
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	$ -	0%		$ 0,00
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	$ 4.529.012,04	63%	100%	$ 7.188.908,00
CAMBIO DE PISO 102 CS	$ -	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 103 CS	$ -	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 306 CS	$ -	0%	100%	$ 12.966.406,00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$ 12.966.406,00	100%	100%	$ 12.966.406,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	$ -	0%	100%	$ 57.083.058,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 313 CS	$ -	0%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	$ -	0%	100%	$ 44.116.652,00
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	$ -	0%	100%	$ 44.116.652,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00

RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$ 57.083.058,00	100%	50%	$ 28.541.529,00	
CAMBIO DE PISO 307 CE	$ 12.966.406,00	100%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$ 57.083.058,00	100%	10%	$ 5.708.305,80	
CAMBIO DE PISO 311 CE	$ -	0%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CE	$ -	0%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CE	$ 54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CE	$ 54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CE	$ 32.537.343,06	57%	100%	$ 57.083.058,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CE	$ -	0%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CE	$ 54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CE	$ -	0%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CE	$ -	0%		$ 0,00	
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00	

RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y	$ 17.695.747,98	31%		$ 0,00
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$RECURSO PROGRAMADO**	**65%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$ 20.280.487,24	100%	65%	$ 13.182.316,71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$ 22.515.064,18	100%	65%	$ 14.634.791,72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	$ 14.479.775,09	62%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	$ 18.801.269,64	162%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$ 8.135.471,10	71%	30%	$ 3.437.523,00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$ 7.699.127,11	71%	30%	$ 3.253.152,30
BAÑO PISO 2 TIPO 4	$ -	0%		$ 0,00
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	$ -	0%		$ 0,00
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$RECURSO PROGRAMADO**	**66%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 33.275.044,00	100%	50%	$ 16.637.522,00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 32.550.956,00	100%	50%	$ 16.275.478,00
BAÑO PISO 2 MUJERES	$ 11.940.071,52	48%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 HOMBRES	$ 12.616.880,16	48%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 1	$ -	0%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 2	$ -	0%		$ 0,00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 24.623.532,56	74%	46%	$ 15.306.520,24
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 24.623.532,56	74%	46%	$ 15.306.520,24
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$ -	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$ -	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$ -	0%		$ 0,00
CUBIERTA PARQUEADERO	$ -	0%		$ 0,00
MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	$ -	0%		$ 0,00
SEDE ANEXA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**

IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	$ -	0%		$ 0,00
CALLE 73	**$RECURSO PROGRAMADO**	**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	$ -	0%		$ 0,00

% PROGRAMADO	**29,23%**
% EJECUTADO	**18,40%**

OBRA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
RAZÓN SOCIAL
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Fuente: consorcio rama judicial
Demolicion de materas

FOTO 3

Fuente: consorcio rama judicial
restauracion de carpinteria en madera

FOTO 2

Fuente: consorcio rama judicial
Enchape de baños

FOTO 4

Fuente: consorcio rama judicial
desmonte de pisos en despachos
